CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

INFORME DEL ACTA No 1



	RESPONSABLE	DEPENDENCIA
Realizado por	WILLIAM ANDRES CAVIEDES CAHUEÑO	Residente de obra
Revisado por	JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ	Director de obra

CONTENIDO


1. **CONDICIONES GENERALES** 3
2. **LOCALIZACION DEL PROYECTO** 4
3. **DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO** 5
4. **ACTIVIDADES EJECUTADAS** 6

1. CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO	032-SG-2023
CLASE DE CONTRATO	OBRA PÚBLICA
CONTRATANTE	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
CONTRATISTA	CONSORCIO TECNISALI
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($488.534.550,16) incluido IVA y AIU.
FECHA DE INICIO	18 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO	DOS COMO TREINTA Y SEIS (2,36) MESES
FECHA DE TERMINACION	29 DE FEBRERO DE 2024

2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del distritoo de Barranquilla, dentro del barrio Los Andes.

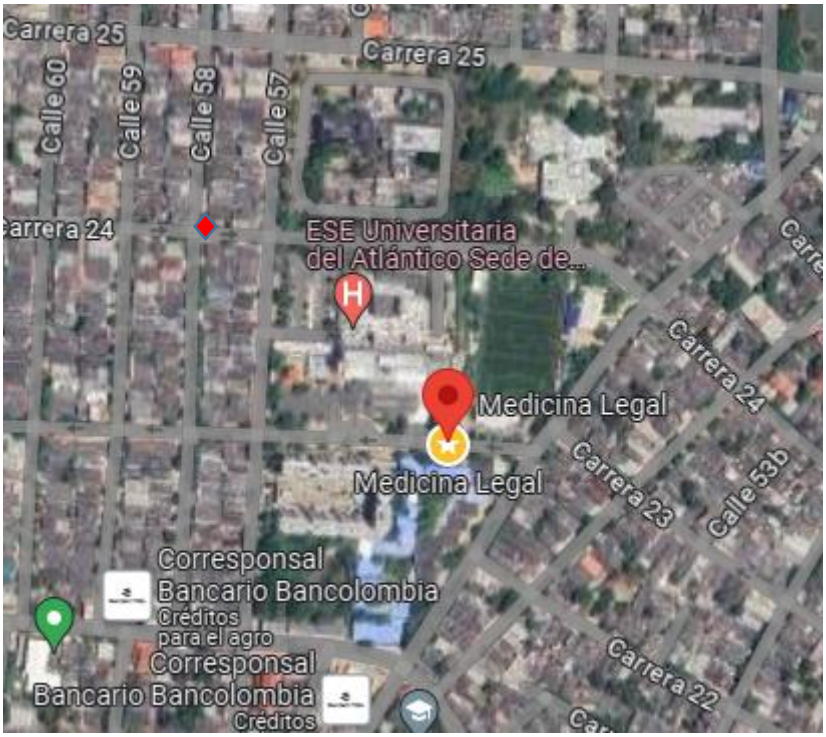

Fuente: Google Maps

3. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

La sede Regional Norte – Barranquilla, está compuesta por tres edificaciones o bloques independientes, los cuales se identifican como: edificio antiguo, construido por el ministerio de justicia alrededor del año 1990, edificio de atención al menor maltratado, construido por el Instituto en el año 2007 y edificio de antropología adecuado en el año 2010, con los cuales se busca satisfacer las necesidades de apoyo a la justicia en la región, ofreciendo a los usuarios espacios dignos para la atención y consecución de los servicios médico legales, así como mejorar las condiciones de trabajo y operación de los servidores del Instituto.

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 9 de enero y 28 de enero de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades:

1,1 Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, incluye muebles de oficina, cajoneras, mesones, escritorios, gabinetes, estantería, equipos y demás elementos que se encuentren en el área y deban ser retirados, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (piso 2).

Esta actividad corresponde al movimiento de todo mobiliario de oficina que se encuentra en la zona de trabajo y toca desplazar, organizar y volver a colocar donde indique el instituto de Medicina Legal.

Se hace el movimiento del mobiliario de oficina en la indicación dada por el instituto con la ayuda del personal operativo de manera física.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:


Herramientas menores.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,1	Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, incluye muebles de oficina, cajoneras, mesones, escritorios, gabinetes, estantería, equipos y demás elementos que se encuentren en el área y deban ser retirados, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (piso 2)	M2	76,00

Registro fotográfico de la actividad:

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

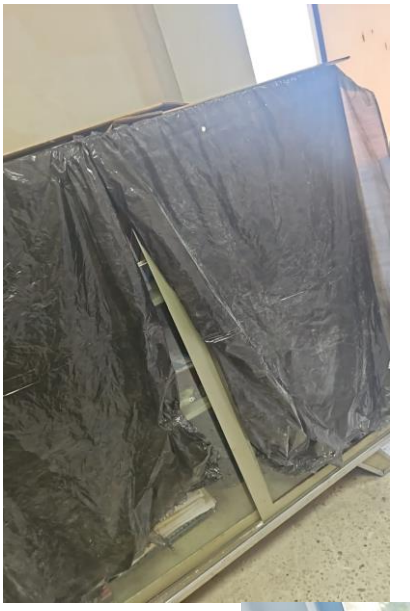





Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

1,2 Desmonte, almacenaje y reinstalación de cabina de extracción, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (piso 2).

Esta actividad corresponde al desmonte y reinstalación de las cabinas de extracción en las zonas de trabajo.

El desarrollo de la actividad comienza cuando en el espacio de trabajo hay cabinas de extracción que obstruyan el desarrollo correcto de la obra y por ende se hace el respectivo movimiento y desmonte para luego de terminar reinstalarlo.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,2	Desmonte, almacenaje y reinstalación de cabina de extracción, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (piso 2)	UN	1

Registro fotográfico de la actividad:



1,3 Desmonte, de cielorraso existente bajo placa y/o cubierta, incluye retiro de perfilería, retiro de amarres, tensores, casetones y demás elementos existentes, desconexión y aislamiento de puntos eléctricos, cargue, retiro y disposición final en las areas indicadas por el Instituto y retiro de escombros en botadero autorizado (piso 2).

Esta actividad corresponde al desmonte y retiro del cielorraso.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para quitar el cielorraso.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,3	Desmonte, de cielorraso existente bajo placa y/o cubierta, incluye retiro de perfilería, retiro de amarres, tensores, casetones y demás elementos existentes, desconexión y aislamiento de puntos eléctricos, cargue, retiro y disposición final en las areas indicadas por el Instituto y retiro de escombros en botadero autorizado (piso 2)	M2	99,58

Registro fotográfico de la actividad:





1,4 Demolicion de acabado de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural o nivel de instalación de nuevo acabado, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado (piso 2).

Esta actividad corresponde al desmonte y retiro del piso indicado por la entidad contratante.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para quitar el piso requerido.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Especialmente herramienta menor como martillo, puntero, etc.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,4	Demolicion de acabado de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural o nivel de instalación de nuevo acabado, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado (piso 2)	M2	58,38

Registro fotográfico de la actividad:





1,5 Desmonte, demolición de gargolas existentes en mal estado, incluye retiro de escombros y disposicion final hasta botadero autorizado.

Esta actividad corresponde al desmonte y retiro de las gárgolas que se encuentran en las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para desmontar las gárgolas requeridas.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,5	Desmonte, demolición de gargolas existentes en mal estado, incluye retiro de escombros y disposicion final hasta botadero autorizado	UN	10

Registro fotográfico de la actividad:



1,8 Desmonte y/o demolición de alfajía en mal estado debe incluir limpieza bajada de residuos, disposición final de escombros en botadero autorizado.

Esta actividad corresponde al desmonte y demolición de alfajías que se encuentran en las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para demoler las alfajías requeridas.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,8	Desmonte y/o demolición de alfajía en mal estado debe incluir limpieza bajada de residuos, disposición final de escombros en botadero autorizado	UN	123

Registro fotográfico de la actividad:





1,12 Raspado raqueteado de graniplast en areas deterioradas, incluye limpieza retiro de residuos, retiro de escombros en botadero autorizado.

Esta actividad corresponde al raspado y raqueteado de zonas afectadas de la pintura exterior que se encuentran en las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la inspección de las zonas afectadas para luego ejecutar el raspado y raqueteado sobre la zona especifica.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores, y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1,12	Raspado raqueteado de graniplast en areas deterioradas, incluye limpieza retiro de residuos, retiro de escombros en botadero autorizado	M2	50

Registro fotográfico de la actividad:





2,1 Muro en lamina de Superboard de 8 mm doble cara, 10 cm de espesor, incluye metros lineales, vanos y carteras de puertas y ventanas, perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible y primeriado, boquillera en aluminio para soporte de puertas, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.

Esta actividad corresponde a la instalación de muro en lamina Superboard en las especificaciones requeridas donde indique la entidad.

El desarrollo de la actividad comienza con la indicación de la entidad contratante para colocar el muro, así mismo, despejar la zona para luego con las herramientas adecuadas instalar muro.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramienta menor, pulidora y herramientas de fijación.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
2,1	Muro en lamina de Superboard de 8 mm doble cara, 10 cm de espesor, incluye metros lineales, vanos y carteras de puertas y ventanas, perfilería, platinas de soporte, cintas, tornillos, masilla, cordón sellante flexible y primeriado, boquillera en aluminio para soporte de puertas, todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento	M2	2,34

Registro fotográfico de la actividad:





5,1 Reparación de cornisa y alares, Consta de escarificación, Tratamiento del acero, aplicación de sikadur 32 puente de adherencia y resane con cocnreto, incluye andamios y equipos trabajo

Esta actividad corresponde a la reparación de todas las cornisas y alares ubicadas en el edificio principal antiguo debido al deterioro por el pasar del tiempo y de la humedad.

El desarrollo de la actividad comienza con la localización de todas las zonas deterioradas, para que así mismo esas zonas sean reparadas y corregidas en su totalidad.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramienta menor, pulidora y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5,1	Reparación de cornisa y alares, Consta de escarificación, Tratamiento del acero, aplicación de sikadur 32 puente de adherencia y resane con cocnreto, incluye andamios y equipos trabajo	ML	72

Registro fotográfico de la actividad:





5,3 Elaboracion de alfajías ,con refuerzo en acero, parte externa de ventanería y remate de paredes edificio

Esta actividad corresponde a la reparación de todas las cornisas y alares ubicadas en el edificio principal antiguo debido al deterioro por el pasar del tiempo y de la humedad.

El desarrollo de la actividad comienza con la localización de todas las zonas deterioradas, para que así mismo esas zonas sean reparadas y corregidas en su totalidad.

Equipo empleado:


Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramienta menor, pulidora y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5,3	Elaboracion de alfajías ,con refuerzo en acero, parte externa de ventanería y remate de paredes edificio	ML	123

Registro fotográfico de la actividad:

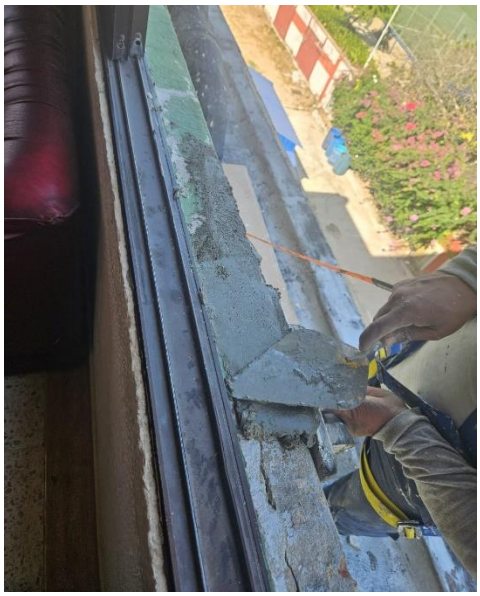



5,4 Pañete impermeabilizado 1:3 para recubrimiento de muros o en zonas afectadas por humedad o deterioradas o resane de pasemuros. Incluye filos, dilataciones, medidas inferiores a un metro, carteras de vanos, puertas y ventanas, resanes de regatas. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

Esta actividad corresponde a la reparación de todos los muros con mas daño por la humedad, en los cuales ya el muro ha sido afectado en su estructura, o por lo menos para rellenar las partes que indique la entidad.

El desarrollo de la actividad comienza con la localización de todas las zonas deterioradas fuertemente por la humedad, para que así mismo esas zonas sean pañetadas, o por lo menos sea una zona indicada por la entidad.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
5,4	Pañete impermeabilizado 1:3 para recubrimiento de muros o en zonas afectadas por humedad o deterioradas o resane de pasemuros. Incluye filos, dilataciones, medidas inferiores a un metro, carteras de vanos, puertas y ventanas, resanes de regatas. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	15

Registro fotográfico de la actividad:





6,2 Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.

Esta actividad corresponde a la instalación del piso en las zonas donde se hizo el respectivo desmonte y retiro.

El desarrollo de la actividad comienza con la instalación de los pisos en las zonas desmontadas con las respectivas especificaciones de la entidad.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:


Herramientas menores.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,2	Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado	M2	58,38

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

Registro fotográfico de la actividad:

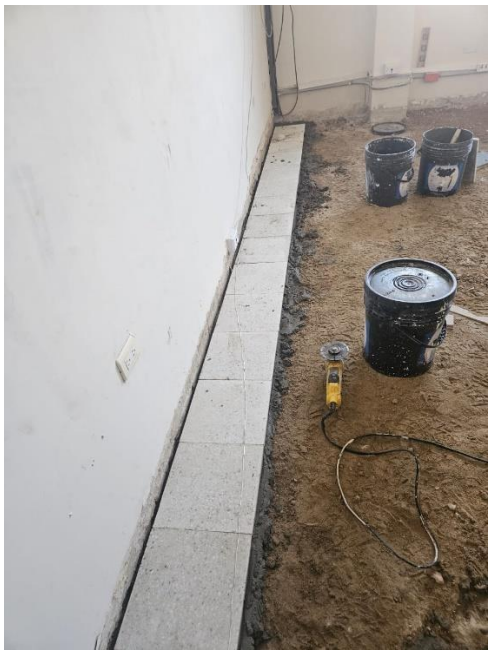



Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

6,3 Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.

Esta actividad corresponde a la instalación de guarda escoba en las zonas donde se instaló el piso del mismo material.

El desarrollo de la actividad comienza con la instalación de guarda escoba en las zonas donde se instaló el piso con las respectivas especificaciones de la entidad.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
6,3	Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado	ML	52,49

Registro fotográfico de la actividad:

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ



Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

7,1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de súper board 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. Masillado, juntas de control plásticas ("Z" y "U"), lijado, refuerzo en estructura y corte de lamina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.

Esta actividad corresponde a la instalación del cielorraso en las zonas donde se hizo el desmonte de acuerdo a las especificaciones de la entidad contratante.

El desarrollo de la actividad comienza con la instalación de la estructura del cielorraso en las zonas donde hubo el desmonte del cielorraso, para luego instalar la lámina super board.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:


Herramientas menores, pulidora, herramientas de fijación y de alturas.


Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
7,1	Suministro e instalación de cielorraso en lámina de súper board 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. Masillado, juntas de control plásticas ("Z" y "U"), lijado, refuerzo en estructura y corte de lamina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.	M2	99,58

Registro fotográfico de la actividad:

CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

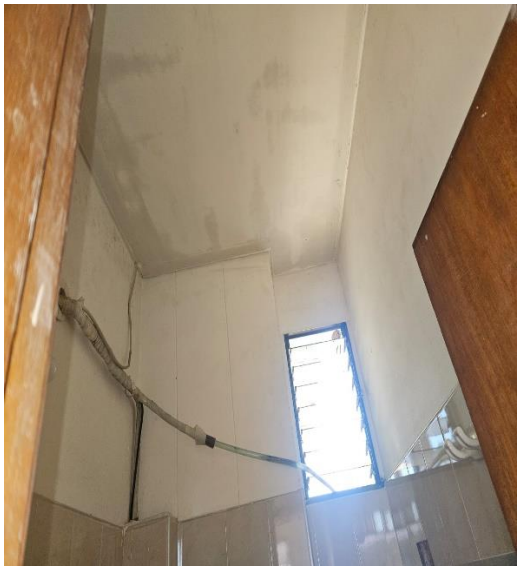

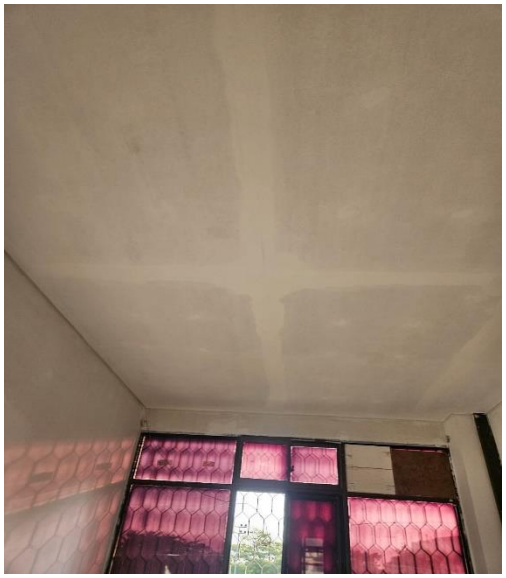

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com

9,1 Resane en estuco plástico para muros. Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

Esta actividad corresponde al resane requerido sobre toda la pintura interior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la inspección de los muros donde se va instalar la pintura interior, para luego corregir con el resane en estuco todas las zonas que puedan afectar la instalación y calidad de la pintura interior por la falta de estuco.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9,1	Resane en estuco plástico para muros. Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	356

Registro fotográfico de la actividad:





9,2 Resane de paredes en graniplast Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

Esta actividad corresponde al resane requerido sobre toda la pintura exterior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la inspección de las fachadas donde se va instalar la pintura exterior, para luego corregir con el resane en graniplast todas las zonas que puedan afectar la instalación y calidad de la pintura exterior por la falta de graniplast.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9,2	Resane de paredes en graniplast Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	50

Registro fotográfico de la actividad:





9,3 Pintura lavable tipo 1 a dos manos, Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura interior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura, para luego pintar sobre los muros interiores de cada edificio del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:


Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:


Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9,3	Pintura lavable tipo 1 a dos manos, Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	1.704,77

Registro fotográfico de la actividad:

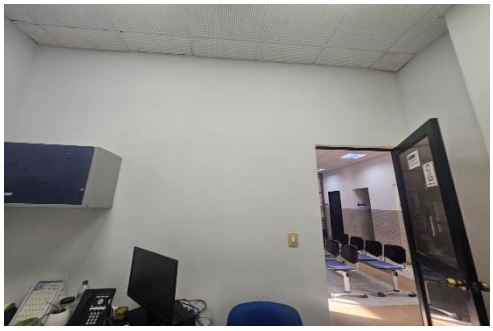

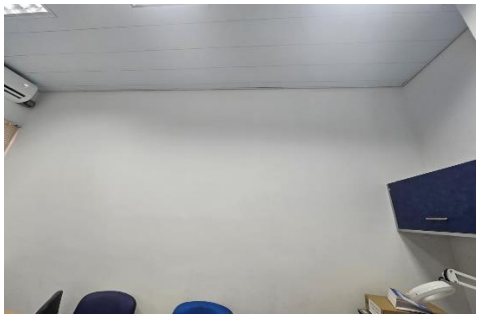



9,4 Pintura tipo Koraza 10 años, tres (3) manos Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura exterior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura, para luego pintar sobre las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9,4	Pintura tipo Koraza 10 años, tres (3) manos Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.	M2	3.489,31

Registro fotográfico de la actividad:





9,5 Suministro y aplicación de pintura marina antiincrustante para cerramiento Incluye raqueteada, lijada y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (cerramiento, puertas, barandas rampa etc.)

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura de cerramiento, puertas, barandas rampa y portones del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura, para luego pintar sobre el cerramiento, puertas, barandas rampa y portones del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:


Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9,5	Suministro y aplicación de pintura marina antiincrustante para cerramiento Incluye raqueteada, lijada y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (cerramiento, puertas, barandas rampa etc.)	M2	452,7

Registro fotográfico de la actividad:

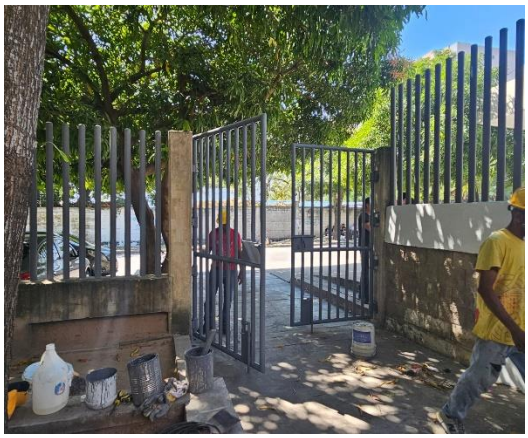



9,6 Suministro y aplicación de pintura lavable a base de aceite, acabado semi-brillante a dos manos para muros y cielos rasos (color blanco). Incluye medidas menores a 1.00 m., incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástico y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. (menor maltratado)

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura interior lavable a base de aceite de cada edificio del predio de Medicina Legal de acuerdo a lo requerido por la entidad estatal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura lavable a base de aceite, para luego pintar donde indique la entidad estatal sobre los muros interiores de cada edificio del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
9,6	Suministro y aplicación de pintura lavable a base de aceite, acabado semi-brillante a dos manos para muros y cielos rasos (color blanco). Incluye medidas menores a 1.00 m., incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástico y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. (menor maltratado)	M2	53,45

Registro fotográfico de la actividad:





12,1 Desmonte, embalaje, adecuacion reinstalacion de muebles especiales de laboratorio, incluye desconexión y reconexion a puntos eléctricos y/o hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el equipo), la adecuacion de los muebles se debe realizar con los mismos materiales y acabados existentes.

Esta actividad corresponde al movimiento de todo mobiliario especial que se encuentra en la zona de trabajo y toca desplazar, organizar y volver a colocar donde indique el instituto de Medicina Legal.

Se hace el movimiento del mobiliario especial en la indicación dada por el instituto con la ayuda del personal operativo de manera física.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores.

Cantidad ejecutada en la presente acta:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
12,1	Desmonte, embalaje, adecuacion reinstalacion de muebles especiales de laboratorio, incluye desconexión y reconexion a puntos eléctricos y/o hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el equipo), la adecuacion de los muebles se debe realizar con los mismos materiales y acabados existentes	M2	9,48

Registro fotográfico de la actividad:



CONSORCIO TECALINAS
NIT. 901.776.945-3
R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ



JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
C.C 17.344.965 de Villavicencio
R.L CONSORCIO TECALINAS
DIRECTOR DE OBRA

Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta
Tel: 3107664373
Email: accionyservicios09@hotmail.com
