**CONSORCIO TECALINAS**
**NIT. 901.776.945-3**
**R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ**

## INFORME DEL ACTA No 2




| | RESPONSABLE | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| Realizado por | _____<br>WILLIAM ANDRES CAVIEDES CAHUEÑO | Residente de obra |
| Revisado por | _____<br>JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ | Director de obra |

# CONTENIDO


1. **CONDICIONES GENERALES** ..... 3
2. **LOCALIZACION DEL PROYECTO** ..... 4
3. **DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO** ..... 5
4. **ACTIVIDADES EJECUTADAS** ..... 6

## 1. CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | 032-SG-2023 |
| **CLASE DE CONTRATO** | OBRA PÚBLICA |
| **CONTRATANTE** | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES |
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO TECNISALI |
| **OBJETO** | REALIZAR MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE LA SEDE REGIONAL NORTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA |
| **VALOR** | QUINIENTOS VENTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($521.973.209,00) incluido IVA y AIU. |
| **FECHA DE INICIO** | 18 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **PLAZO** | CUATRO COMA CUATRO (4,4) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION** | 30 DE ABRIL DE 2024 |

## 2. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en la zona urbana del distritoo de Barranquilla, dentro del barrio Los Andes.

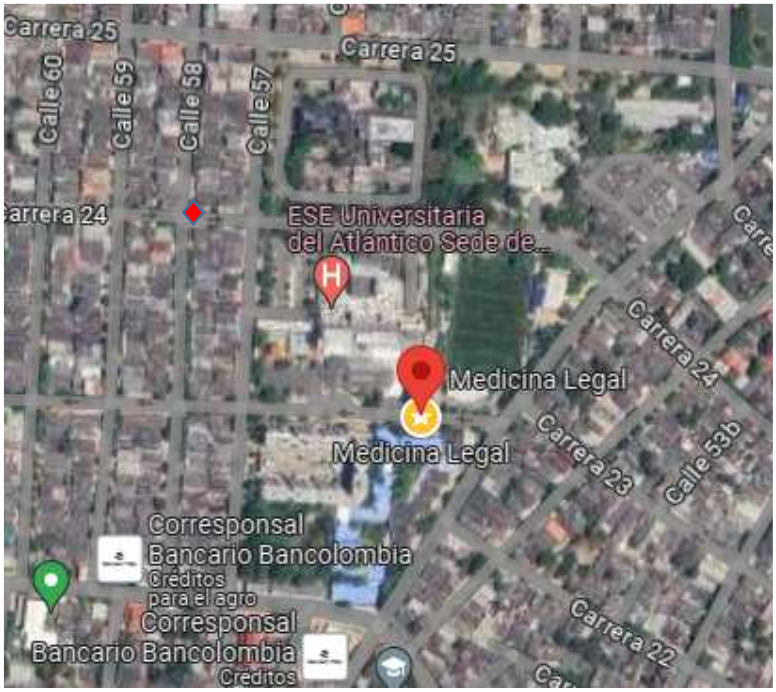


Fuente: Google Maps

## 3. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL PROYECTO

La sede Regional Norte – Barranquilla, está compuesta por tres edificaciones o bloques independientes, los cuales se identifican como: edificio antiguo, construido por el ministerio de justicia alrededor del año 1990, edificio de atención al menor maltratado, construido por el Instituto en el año 2007 y edificio de antropología adecuado en el año 2010, con los cuales se busca satisfacer las necesidades de apoyo a la justicia en la región, ofreciendo a los usuarios espacios dignos para la atención y consecución de los servicios médico legales, así como mejorar las condiciones de trabajo y operación de los servidores del Instituto.

## 4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y 29 de febrero de 2024 se ejecutaron las siguientes actividades:

**1,1 Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, incluye muebles de oficina, cajoneras, mesones, escritorios, gabinetes, estantería, equipos y demás elementos que se encuentren en el área y deban ser retirados, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (**piso 2**).**

Esta actividad corresponde al movimiento de todo mobiliario de oficina que se encuentra en la zona de trabajo y toca desplazar, organizar y volver a colocar donde indique el instituto de Medicina Legal.

Se hace el movimiento del mobiliario de oficina en la indicación dada por el instituto con la ayuda del personal operativo de manera física.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores.


**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **1,1** | Desmonte, almacenaje y reinstalación de mobiliario y equipos existentes, incluye muebles de oficina, cajoneras, mesones, escritorios, gabinetes, estantería, equipos y demás elementos que se encuentren en el área y deban ser retirados, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (piso 2) | M2 | 125 |

**Registro fotográfico de la actividad:**

**CONSORCIO TECALINAS**
**NIT. 901.776.945-3**
**R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ**



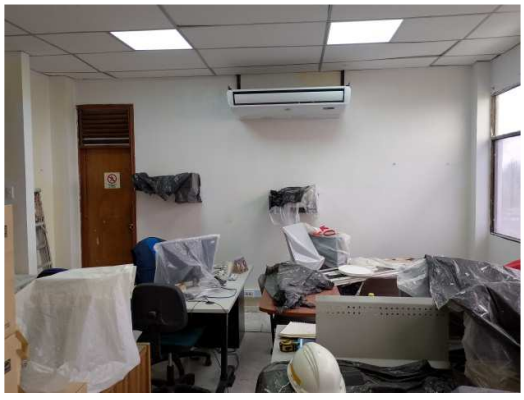



**Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta**
**Tel: 3107664373**
**Email: accionyservicios09@hotmail.com**

**1,2 Desmonte, almacenaje y reinstalación de cabina de extracción, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (piso 2).**

Esta actividad corresponde al desmonte y reinstalación de las cabinas de extracción en las zonas de trabajo.

El desarrollo de la actividad comienza cuando en el espacio de trabajo hay cabinas de extracción que obstruyan el desarrollo correcto de la obra y por ende se hace el respectivo movimiento y desmonte para luego de terminar reinstalarlo.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a

continuación: Herramientas menores.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **1,2** | Desmonte, almacenaje y reinstalación de cabina de extracción, incluye desconexión y aislamiento de puntos eléctricos y/o sellado de puntos hidrosanitarios (si se requiere al desmontar el mueble), incluye cargue, retiro y traslado al sitio definido por el instituto (piso 2) | UN | 1 |

**Registro fotográfico de la actividad:**



**1,3 Desmonte, de cielorraso existente bajo placa y/o cubierta, incluye retiro de perfilería, retiro de amarres, tensores, casetones y demás elementos existentes, desconexión y aislamiento de puntos eléctricos, cargue, retiro y disposición final en las áreas indicadas por el Instituto y retiro de escombros en botadero autorizado (piso 2).**

Esta actividad corresponde al desmonte y retiro del cielorraso.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para quitar el cielorraso.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **1,3** | Desmonte, de cielorraso existente bajo placa y/o cubierta, incluye retiro de perfilería, retiro de amarres, tensores, casetones y demás elementos existentes, desconexión y aislamiento de puntos eléctricos, cargue, retiro y disposición final en las áreas indicadas por el Instituto y retiro de escombros en botadero autorizado (piso 2) | M2 | 105,81 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**1,4 Demolición de acabado de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural o nivel de instalación de nuevo acabado, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado (piso 2).**

Esta actividad corresponde al desmonte y retiro del piso indicado por la entidad contratante.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para quitar el piso requerido.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Especialmente herramienta menor como martillo, puntero, etc.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **1,4** | Demolición de acabado de piso existente, incluye demolición de mortero de nivelación hasta encontrar placa estructural o nivel de instalación de nuevo acabado, cargue, retiro y disposición final de escombros en botadero autorizado (piso 2) | M2 | 53,92 |

**Registro fotográfico de la actividad:**







**1,8 Desmonte, demolición de gargolas existentes en mal estado, incluye retiro de escombros y disposicion final hasta botadero autorizado.**

Esta actividad corresponde al desmonte y retiro de las gárgolas que se encuentran en las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para desmontar las gárgolas requeridas.


Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación: Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **1,8** | Desmonte, demolición de gargolas existentes en mal estado, incluye retiro de escombros y disposicion final hasta botadero autorizado | UN | 11 |

**Registro fotográfico de la actividad:**

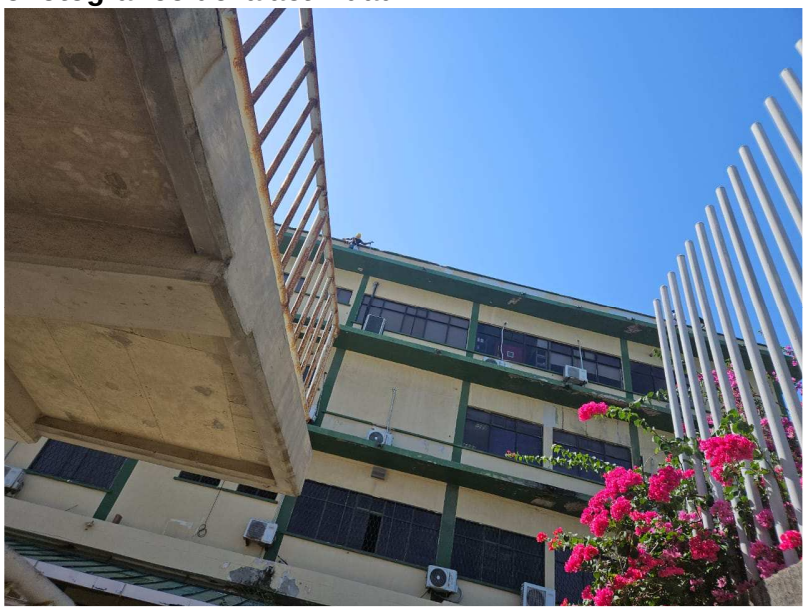

**1,12 Raspado raqueteado de graniplast en areas deterioradas, incluye limpieza retiro de residuos, retiro de escombros en botadero autorizado.**

Esta actividad corresponde al raspado y raqueteado de zonas afectadas de la pintura exterior que se encuentran en las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la inspección de las zonas afectadas para luego ejecutar el raspado y raqueteado sobre la zona especifica.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación: Herramientas menores, y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **1,12** | Raspado raqueteado de graniplast en areas deterioradas, incluye limpieza retiro de residuos, retiro de escombros en botadero autorizado | M2 | 1.807 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**3,3 Desmonte y reinstalación de luminaria panel 60x60; (incluye cable encauchetado 3x16 AWG, conectores para empalme, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).**

Esta actividad corresponde al desmonte y la reinstalación de lámparas tipo panel de 60x60.

El desarrollo de la actividad comienza con la desinstalación de las lámparas, previamente al desmonte del anterior cielo raso y se reinstalan luego de la colocación del nuevo cielo raso.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramienta menor, escalera, andamios, y herramientas de fijación.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **3,3** | Desmonte y reinstalación de luminaria panel 60x60; (incluye cable encauchetado 3x16 AWG, conectores para empalme, elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación) | UND | 43 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**5,2 Suministro e instalación de gárgolas (goteros) en cornisa, incluye obra civiles para su correcta instalacion y funcionamiento.**

Esta actividad corresponde a la instalacion de las gárgolas desmontadas en las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con las herramientas requeridas para la instalación de las gargolas gárgolas requeridas.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación: Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **5,2** | Suministro e instalación de gárgolas (goteros) en cornisa, incluye obra civiles para su correcta instalacion y funcionamiento. | UN | 21 |

**Registro fotográfico de la actividad:**



**6,2 Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.**

Esta actividad corresponde a la instalación del piso en las zonas donde se hizo el respectivo desmonte y retiro.

El desarrollo de la actividad comienza con la instalación de los pisos en las zonas desmontadas con las respectivas especificaciones de la entidad.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **6,2** | Suministro e instalación de piso en tablón de granito vibro prensado de 0.30 m. x 0.30 m. ó 0.33 m. 0.33 m. a junta perdida, color blanco Huila Grano 1. Incluye corte con pulidora, juntas en PVA con cemento blanco concretero y marmolina blanca o carbonato de calcio, destrocado, pulido, sellado, brillado y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado | M2 | 71,92 |



**Registro fotográfico de la actividad:**





**CONSORCIO TECALINAS**
**NIT. 901.776.945-3**
**R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ**



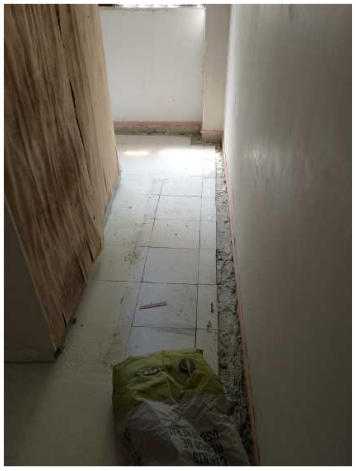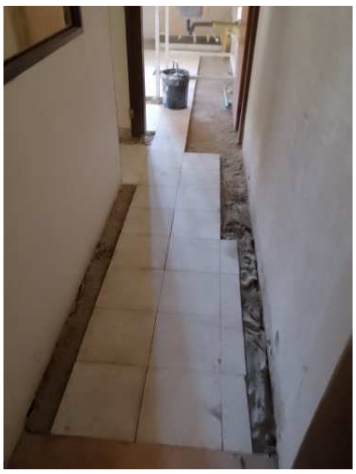



**Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta**
**Tel: 3107664373**
**Email: accionyservicios09@hotmail.com**

**6,3 Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado.**

Esta actividad corresponde a la instalación de guarda escoba en las zonas donde se instaló el piso del mismo material.

El desarrollo de la actividad comienza con la instalación de guarda escoba en las zonas donde se instaló el piso con las respectivas especificaciones de la entidad.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores.


**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **6,3** | Construcción de guarda escoba media caña en granito pulido de 0,10 m. x 0,10 m., R=0,02 m. embebida en muros y piso, con terminado a ras de muro y piso, espesor mínimo de 2.5 cm. color igual o similar al color del piso. Incluye dilatación en PVC, cortes con pulidora, pulida, sellada y brillada y todos los trabajos, materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye cargue y retiro de sobrantes a botadero autorizado | ML | 62,51 |

**Registro fotográfico de la actividad:**

**CONSORCIO TECALINAS**
**NIT. 901.776.945-3**
**R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ**



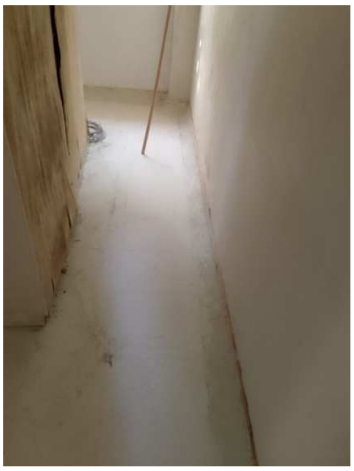


**Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta**
**Tel: 3107664373**
**Email: accionyservicios09@hotmail.com**

**7,1 Suministro e instalación de cielorraso en lámina de súper board 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. Masillado, juntas de control plásticas ("Z" y "U"), lijado, refuerzo en estructura y corte de lámina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento.**

Esta actividad corresponde a la instalación del cielorraso en las zonas donde se hizo el desmonte de acuerdo a las especificaciones de la entidad contratante.

El desarrollo de la actividad comienza con la instalación de la estructura del cielorraso en las zonas donde hubo el desmonte del cielorraso, para luego instalar la lámina super board.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores, pulidora, herramientas de fijación y de alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **7,1** | Suministro e instalación de cielorraso en lámina de súper board 6mm. Incluye perfilería de soporte con estructura de acero galvanizado, rolado en frio calibre 26. Masillado, juntas de control plásticas ("Z" y "U"), lijado, refuerzo en estructura y corte de lámina para claraboyas de inspección de 0,60*0,60 m y todos los materiales, accesorios y obras necesarias para su correcta instalación y funcionamiento | M2 | 94,81 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**CONSORCIO TECALINAS**
**NIT. 901.776.945-3**
**R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ**










**Dirección: Calle 47 A No. 45-60 Villavicencio Meta**
**Tel: 3107664373**
**Email: accionyservicios09@hotmail.com**

**9,1 Resane en estuco plástico para muros. Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.**

Esta actividad corresponde al resane requerido sobre toda la pintura interior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la inspección de los muros donde se va instalar la pintura interior, para luego corregir con el resane en estuco todas las zonas que puedan afectar la instalación y calidad de la pintura interior por la falta de estuco.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **9,1** | Resane en estuco plástico para muros. Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 832,07 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**9,2 Resane de paredes en graniplast Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.**

Esta actividad corresponde al resane requerido sobre toda la pintura exterior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la inspección de las fachadas donde se va instalar la pintura exterior, para luego corregir con el resane en graniplast todas las zonas que puedan afectar la instalación y calidad de la pintura exterior por la falta de graniplast.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación: Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **9,2** | Resane de paredes en graniplast Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 1.807 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**9,3 Pintura lavable tipo 1 a dos manos, Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.**

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura interior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura, para luego pintar sobre los muros interiores de cada edificio del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **9,3** | Pintura lavable tipo 1 a dos manos, Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 440,37 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**9,4 Pintura tipo Koraza 10 años, tres (3) manos Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución.**

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura exterior de cada edificio del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura, para luego pintar sobre las fachadas de cada edificio del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **9,4** | Pintura tipo Koraza 10 años, tres (3) manos Incluye filos, dilataciones, carteras y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. | M2 | 124,69 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**9,5 Suministro y aplicación de pintura marina antiincrustante para cerramiento Incluye raqueteada, lijada y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (cerramiento, puertas, barandas rampa etc.)**

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura de cerramiento, puertas, barandas rampa y portones del predio de Medicina Legal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura, para luego pintar sobre el cerramiento, puertas, barandas rampa y portones del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación: Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **9,5** | Suministro y aplicación de pintura marina antiincrustante para cerramiento Incluye raqueteada, lijada y medidas inferiores a un metro. Incluye todos los trabajos y materiales necesarios para su correcta ejecución. (cerramiento, puertas, barandas rampa etc.) | M2 | 182,3 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**9,6 Suministro y aplicación de pintura lavable a base de aceite, acabado semi-brillante a dos manos para muros y cielos rasos (color blanco). Incluye medidas menores a 1.00 m., incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástico y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. (menor maltratado)**

Esta actividad corresponde a la instalación de la pintura interior lavable a base de aceite de cada edificio del predio de Medicina Legal de acuerdo a lo requerido por la entidad estatal.

El desarrollo de la actividad comienza con la preparación de la pintura lavable a base de aceite, para luego pintar donde indique la entidad estatal sobre los muros interiores de cada edificio del predio de Medicina Legal.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores y equipamientos de trabajo en alturas.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **9,6** | Suministro y aplicación de pintura lavable a base de aceite, acabado semi-brillante a dos manos para muros y cielos rasos (color blanco). Incluye medidas menores a 1.00 m., incluye filos y dilataciones. Incluye resanes en estuco plástico y todos los materiales y trabajos necesarios para su correcta ejecución. (menor maltratado) | M2 | 175,55 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**13,7 Repulida de piso en granito, incluye sellada y brillo.**

Esta actividad corresponde a la repulida del piso en las zonas donde no hubo cambio de piso del segundo piso y que contiene el mismo formato de piso en granito incluyendo sellada y brillo.

El desarrollo de la actividad comienza con la implementación de herramientas menores y equipos para brillar el piso en las respectivas especificaciones de la entidad.

Equipo empleado:

Esta actividad se lleva a cabo con el equipo relacionado a continuación:

Herramientas menores.
Brilladora industrial.

**Cantidad ejecutada en la presente acta:**

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **13,7** | Repulida de piso en granito, incluye sellada y brillo | M2 | 68,03 |

**Registro fotográfico de la actividad:**





**CONSORCIO TECALINAS**
**NIT. 901.776.945-3**
**R.L JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ**



JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ
C.C 17.344.965 de Villavicencio
R.L CONSORCIO TECALINAS
DIRECTOR DE OBRA
