ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

Valledupar, Ciudad de los Santos Reyes, 13 de Junio de 2023 **VA-SOPM-0651-2023**

Para: **CARLOS ALFONSO ARAUJO CASTRO**
Secretario de Hacienda Municipal

DE: **CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE**
Supervisor del contrato

Asunto: **Remisión de cuenta de cobro.**

ALCALDIA DE VALLEDUPAR
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO 15 JUN 2023
RECIBIDO

Cordial Saludo:

Comedidamente y en atención al asunto de la referencia, me permito remitir los documentos necesarios para la realización del pago del Acta de Cobro Parcial de Obra No. 001, es decir, la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 ($517.744.913,00) M. L., correspondiente al Contrato No. **0011-SOP DE 2023,** cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR**.

Para los efectos se envía:

- Copia de *minuta* del respectivo contrato.
- Informe de supervisión e Interventoría.
- Acta de Cobro Parcial de Obra No. 001.
- Cuenta de Cobro.
- Certificación Bancaria.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
- Registro Presupuestal de Compromiso.
- Constancia del pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
- Recibos de pago correspondiente a los impuestos municipal, (Estampilla pro cultura, Estampilla pro anciano y estampilla pro universidad y copia de pago de los impuestos Departamentales).
- Copia de *Pólizas* y resolución de aprobación.

Lo anterior se envía para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE
Secretario de Obras Públicas Municipal

Proyectó: Arq. **GELSIN FERNANDO PICAZA MONTERO**
Profesional Universitario - Apoyo de la Supervisión
Secretaria de Obras Públicas Municipal

Arq. EDUARDO ANDRÉS MONSALVO RODRIGUEZ
Contratista - Apoyo de la Supervisión
Secretaria de Obras Públicas Municipal

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
NIT 901.676.760-9
CL 36 A 5 F 103 MZ E CA 7 B
Tel: (605) 3013769846
Valledupar - Colombia
consorciocerramientojc2022@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE 3

Señores	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR		
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(605) 5842444
Dirección	CR 5 15 69	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2023, 11:04
Expedición	09/06/2023, 11:04
Vencimiento	09/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA N ° 01 DEL CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA N° 001-SOP DE 2023 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	1.00	393,536,189.00	0.00	393,536,189.00
2	ADMINISTRACIÓN	1.00	94,448,685.00	0.00	94,448,685.00
3	IMPREVISTOS	1.00	3,935,362.00	0.00	3,935,362.00
4	UTILIDAD	1.00	19,676,809.00	0.00	19,676,809.00
5	PLAN MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE APLICACIÓN DEL PAPSO	1.00	6,147,868.00	0.00	6,147,868.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos diecisiete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos trece pesos m/cte

Total Bruto	517,744,913.00
Total a Pagar	**517,744,913.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-09 por $ 517,744,913.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764048738281 aprobado en 20230509 prefijo FE desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10 x mil
CUFE: a5784c1816c693a7d4518a7c286a65180d0e13957f9d2c0ff6589e3a738b48e6b3757f682a7133615312619241 9d2ab7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS Nit 830.048.145.8 Nombre Software: Siigo Nube Firma electrónica ver en el XML

CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

ACTA PARCIAL DE COBRO No. 01 DE LA OBRA Y MEMORIAS DE CALCULO

consorciocerramientojc2022@gmail.com

ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 1

CONTRATO N°	001-SOP DE 2023	POLIZAS			VIGENCIA		ACTA DE OBRA No 1
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR CESAR	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT: 901 676 760-9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101406164	$ 213.505.286,00	2/03/2023	2/12/2023	
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT 901.680.408-6	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101406164	$ 320.257.929,00	2/03/2023	2/12/2023	
VALOR CONTRACTUAL:	MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 1.067.526.429,61) INCLUIDO AIU	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101406164	$ 320.257.929,00	5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2023	PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101406164	$ 53.376.321,50	2/03/2023	2/06/2026	PERIODO ACTA
FECHA DE INICIO:	02 DE MARZO 2023						
ADICIÓN DE TIEMPO:	N/A					FECHA	02/03/2023 al 08/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023					8/05/2023	

En el municipio de valledupar, a los 08 días del mes de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores (a) GREYS JUDITH VILLACOB RIOS como Representante Legal del CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 Contratista de Obra, JUAN CARLOS VARON MEDINA como Representante Legal de la UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ Apoyo de la Supervision, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta modificatoria de obras del CONTRATO a cual se relacionan así:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						ACTA No 1		ACTA No 2		ACUMULADO TOTAL FINAL EJECUTADO		
ITEM No	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	AVANCE % FINAL
1	**PRELIMINARES**											
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	ML	1.187,60	$ 3.035,25	$ 3.604.674,58	1.152,14	$ 3.497.044,27		$ 0,00	1.152,14	$ 3.497.044,27	97%
1,2	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMUN	M3	240,15	$ 32.827,85	$ 7.883.808,18	76,24	$ 2.502.916,75		$ 0,00	76,24	$ 2.502.916,75	32%
1,3	RETIRO SOBRANTES HASTA 20 KM	M3	240,16	$ 47.628,90	$ 11.438.556,62	139,24	$ 6.632.024,26		$ 0,00	139,24	$ 6.632.024,26	58%
1,4	SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN	M3	176,02	$ 84.664,20	$ 14.902.592,58		$ 0,00		$ 0,00	-	$ 0,00	0%
Subtotal					**$ 37.829.431,97**		**$ 12.631.985,28**		**$ 0,00**		**$ 12.631.985,28**	
2	**CIMENTACIONES**											
2,1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	63,98	$ 582.681,72	$ 37.279.976,13	35,84	$ 20.883.312,67		$ 0,00	35,84	$ 20.883.312,67	56%
2,2	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	11,96	$ 879.866,79	$ 10.523.206,81	2,86	$ 2.517.518,85		$ 0,00	2,86	$ 2.517.518,85	24%
2,3	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	142,51	$ 783.091,49	$ 111.598.367,53	79,22	$ 62.034.001,55		$ 0,00	79,22	$ 62.034.001,55	56%
Subtotal					**$ 159.401.550,46**		**$ 85.434.833,07**		**$ 0,00**		**$ 85.434.833,07**	
3	**ESTRUCTURAS**											
3.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI	M3	23,26	$ 487.133,13	$ 11.330.716,60	14,40	$ 7.012.281,41		$ 0,00	14,40	$ 7.012.281,41	62%
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	18.979,80	$ 8.353,29	$ 158.543.773,54	5.100,00	$ 42.601.779,00		$ 0,00	5.100,00	$ 42.601.779,00	27%
Subtotal					**$ 169.874.490,15**		**$ 49.614.060,41**		**$ 0,00**		**$ 49.614.060,41**	
4	**CARPINTERIA METÁLICA**											
4.1	MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO AGUAS NEGRAS CAL 80 DE 2", ANGULO DE 1- 1/2" X 1/8", PLATINAS 1/2" X 3/16"-INCLUYE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.20MT Y APOYOS CADA 3MT	ML	950,00	$ 386.170,28	$ 366.861.768,60	636,65	$ 245.855.310,64		$ 0,00	636,65	$ 245.855.310,64	67%

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 1

CONTRATO N°	001-SOP DE 2023	POLIZAS			VIGENCIA		ACTA DE OBRA No 1
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT: 901.676 760-9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101406164	$ 213.505.286,00	2/03/2023	2/12/2023	
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT: 901 680 408-8	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101406164	$ 320.257.929,00	2/03/2023	2/12/2023	
VALOR CONTRACTUAL:	MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 1.067.526.429,61) INCLUIDO AIU	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101406164	$ 320 257 929,00	5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2023	PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101406164	$ 53.376.321,50	2/03/2023	2/06/2026	PERIODO ACTA
FECHA DE INICIO:	02 DE MARZO 2023						
ADICIÓN DE TIEMPO:	N/A					FECHA	02/03/2023 al 08/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023					8/05/2023	

En el municipio de valledupar, a los 08 dias del mes de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores (a) GREYS JUDITH VILLACOB RIOS como Representante Legal del CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022, Contratista de Obra, JUAN CARLOS VARON MEDINA como Representante Legal de la UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS, EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ Apoyo de la Supervision, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta modificatoria de obras del CONTRATO la cual se relacionan así:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						ACTA No 1		ACTA No 2		ACUMULADO TOTAL FINAL EJECUTADO		
ITEM No	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	AVANCE % FINAL
4.2	MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO AGUAS NEGRAS CAL 80 DE 2", ANGULO DE 1- 1/2" X 1/8", PLATINAS 1/2" X 3/16"-INCLUYE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.50MT Y APOYOS CADA 3MT	ML	237,60	$ 325.993,49	$ 77.456.052,16		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	0%
Subtotal					$ 444.317.620,96		$ 245.855.310,64		$ 0,00		$ 245.855.310,64	
	SUBTOTAL DE OBRAS				$ 811.423.293,54		$ 393.536.189,00		$ -		$ 393.536.189,00	
	ADMINISTRACION			24%	$ 194.741.590,45		$ 94.448.685,00		$ -		$ 94.448.685,00	
	IMPREVISTOS			1%	$ 8.114.232,94		$ 3.935.362,00		$ -		$ 3.935.362,00	
	UTILIDAD			5%	$ 40.571.164,68		$ 19.676.809,00		$ -		$ 19.676.809,00	
	TOTAL A.I.U.			30%	$ 243.426.988,06		$ 118.060.856,00		$ -		$ 118.060.856,00	
	TOTAL OBRAS + A.I.U.				$ 1.054.850.281,61		$ 511.597.045,00		$ -		$ 511.597.045,00	48,50%
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)											
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) Y PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)	UN	1,00	$ 12.676.148,00	$ 12.676.148,00	0,48	$ 6.147.868,00		$ -	0,48	$ 6.147.868,00	
	SUBTOTAL DE OBRAS				$ 1.067.526.429,61		$ 517.744.913,00		$ -		$ 517.744.913,00	48,50%

ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRA No: 1

CONTRATO N°	001-SOP DE 2023	POLIZAS			VIGENCIA		ACTA DE OBRA No 1
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT: 901.676.760-9	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101406164	$ 213.505.286,00	2/03/2023	2/12/2023	
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT: 901.680.408-6	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	21-44-101406164	$ 320.257.929,00	2/03/2023	2/12/2023	
VALOR CONTRACTUAL:	MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 1.067.526.429,61) INCLUIDO AIU	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	21-44-101406164	$ 320.257.929,00	5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 01 DE JUNIO DE 2023	PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101406164	$ 53.376.321,50	2/03/2023	2/06/2026	PERIODO ACTA
FECHA DE INICIO:	02 DE MARZO 2023						
ADICIÓN DE TIEMPO:	N/A					FECHA	02/03/2023 al 08/05/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	01 DE JUNIO DE 2023					8/05/2023	

En el municipio de valledupar, a los 08 dias del mes de mayo de 2023, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, los señores (a) GREYS JUDITH VILLACOB RIOS como Representante Legal del CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022, Contratista de Obra, JUAN CARLOS VARON MEDINA como Representante Legal de la UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS, EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ Apoyo de la Supervision, GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Apoyo de la Supervision y CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE Supervisor , como Secretario de obras públicas del municipio de valledupar, con el objeto de revisar la presente acta modificatoria de obras del CONTRATO la cual se relacionen así:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						ACTA No 1		ACTA No 2		ACUMULADO TOTAL FINAL EJECUTADO		
ITEM No	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	AVANCE % FINAL

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100%	$ 1.067.526.429,61
VALOR DEL ANTICIPO 30%	30%	$ 0,00
VALOR EJECUTADO ACTA #1	48%	$ 517.744.913,00
VALOR EJECUTADO ACTA #2	65%	$ 0,00
AMORTIZACION (30%) ANTICIPO ACTA #1	30%	$ 0,00
AMORTIZACION (30%) ANTICIPO ACTA #2	30%	$ 0,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA #2		$ 517.744.913,00

SON: QUINIENTOS DIECISIÉTE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS MCTE

NOTA: LA INTERVENTORIA SUSCRIBE EL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICANDO LAS CANTIDADES AQUÍ RELACIONADAS

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
ALCALDIA DE VALLEDUPAR

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION
ALCALDIA DE VALLEDUPAR

GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO
APOYO A LA SUPERVISION
ALCALDIA DE VALLEDUPAR

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CERTIFICA:

Que **GREY JUDITH VILLACOB RIOS,** Representante Legal del Contratista **"CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022",** identificada con **CC. 1.102.810.077 – NIT. No. 901.676.760-9,** ha ejecutado parcialmente las labores pactadas en el Contrato de Obras No. **001-SOP DE 2023** cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.**

La ejecución de dichas labores se realizaron en el periodo comprendido entre el Tres (3) del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023) y el Ocho (8) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Es preciso señalar que el Impuesto Departamental (pro-desarrollo fronterizo), presentado se encuentran a paz y salvo por parte del contratista; igualmente, el contratista suscribió acta de compromiso para que conforme al Acuerdo No. 022 del 21 de diciembre de 2021 y el Decreto No 000252 del 25 de marzo de 2022, según parágrafo del artículo segundo se descuente en cada cuenta de cobro de acuerdo al porcentaje de avance el valor correspondiente a los impuestos (estampilla pro cultura, estampilla bienestar adulto mayor, estampilla universidad popular del cesar y estampilla pro deporte y recreación).

Igualmente, se deja constancia del cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral, frente a los Aportes Parafiscales y demás obligaciones derivadas del contrato.

Se expide esta certificación para trámite de cuenta de Acta Parcial No. 001.

Para constancia, se firma la presente Certificación, en Valledupar, Cesar, a los Trece (13) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE
Secretario de Obras Públicas Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	001-SOP DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
NIT N°	901.676.760-9
REPRESENTANTE LEGAL	GREY JUDITH VILLACOB RIOS
C.C. N°	1.102.810.077
SUPERVISOR:	ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA Secretario de Obras Públicas Municipal
APOYO A LA SUPERVISION:	GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Profesional Universitario adscrito a la SOPM
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION:	EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ Contratista Secretaría de Obras Públicas Municipal
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
NIT N°	901.680.408-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VARON MEDINA
C.C. N°	5.820.660
VALOR INICIAL:	El presente contrato tiene un valor de **MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 61/100 ($ 1´067.526.429,61) M/L,** AIU INCLUIDO.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	TRES MESES.
DOMICILIO:	las actividades previstas en el presente contrato tienen como domicilio el Municipio de Valledupar (Cesar).
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	Dos (2) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).
FECHA TERMINACIÓN:	Hasta el Primero (1°) del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023)
PRORROGA No. 1:	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN No. 2:	Primero (1°) del mes de Julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

De acuerdo con lo contemplado en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte integral del Contrato de Obras No. 001-SOP DE 2023, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato (constitución y aprobación de la garantía única del contrato y registro presupuestal), Presentación de la Cuenta Bancaria y Constancia del pago de Aportes al Sistema de Seguridad Social, Impuesto Departamental, impuesto a la Sobretasa Deportiva para el fomento del

deporte y la recreación INDER y Parafiscales, documentos que se exigen para proceder al pago parcial No. 001 del Contrato de Obras, los cuales fueron entregados en medio físico a satisfacción de la Secretaría de Obras públicas; por consiguiente, se puede proceder al pago del Acta de Cobro Parcial de Obra No. 001, es decir, la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON 00/100 ($517.744.913,00) M. L.

TOTAL COSTO NETO		**517.744.913,00**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	**30%**	**00,00**
TOTAL NETO A PAGAR		**517.744.913,00**

La ejecución de dichas labores se realizaron en el periodo comprendido entre el Tres (3) del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023) y el Ocho (8) días del mes de Mayo del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Para constancia, se firma en Valledupar, Cesar, a los Trece (13) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

ING. CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE
Secretario de Obras Públicas Municipal

Proyectó: Arq. GERINFERNANDO PICAZA MONTERO
Profesional Universitario - Apoyo de la Supervisión
Secretaría de Obras Públicas Municipal

Arq. EDUARDO ANDRÉS MONSALVO RODRIGUEZ
Contratista - Apoyo de la Supervisión
Secretaría de Obras Públicas Municipal

INFORME DE SUPERVISIÓN DE APOYO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	001-SOP DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
NIT N°	901.676.760-9
REPRESENTANTE LEGAL	GREY JUDITH VILLACOB RIOS
C.C. N°	1.102.810.077
SUPERVISOR:	ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA Secretario de Obras Públicas Municipal
APOYO A LA SUPERVISION:	GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO Profesional Universitario adscrito a la SOPM
APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISION:	EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ Contratista Secretaria de Obras Públicas Municipal
INTERVENTORIA:	UNIÓN TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
NIT N°	901.680.408-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VARON MEDINA
C.C. N°	5.820.660
VALOR INICIAL:	El presente contrato tiene un valor de **MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 61/100 ($ 1 067.526.429,61) M/L,** AIU INCLUIDO.
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	TRES MESES.
DOMICILIO:	las actividades previstas en el presente contrato tienen como domicilio el Municipio de Valledupar (Cesar).
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	Dos (2) dias del mes de Marzo del año Dos Mil Veintitrés (2023).
FECHA TERMINACIÓN:	Hasta el Primero (1°) del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023)
PRORROGA No. 1:	UN (1) MES
FECHA TERMINACIÓN No. 2:	Primero (1°) del mes de Julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Mediante la presente el supervisor de Apoyo deja constancia que de acuerdo con las especificaciones técnicas de los items relacionados en la propuesta presentada por el Contratista, la cual hace parte de este contrato, y dichas especificaciones se encuentran descritas en el Acta de Recibo Parcial de Obras No. 01, suscrita por las partes, la cual es la constancia que los

trabajos ejecutados parcialmente se recibieron a satisfacción por el señor JUAN CARLOS VARON MEDINA, Representante Legal del Contratista Interventoria "UNIÓN TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS", quien certifica que el CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 ha ejecutado a satisfacción las cantidades de obras de cada una de las actividades descrita en la respectiva Acta de Recibo Parcial No. 001, tal como lo contempla el Contrato en mención y las cantidades de obras realmente ejecutadas, que son necesarias para la normal y correcta ejecución de los trabajos contemplados en el objeto del contrato.

El contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones derivadas del contrato No. 001-SOP DE 2023, de acuerdo al Acta de Recibo Parcial No. 01 del contrato; por consiguiente, se deja constancia que las obligaciones contractuales de las partes se vienen desarrollando y se está cumpliendo de manera satisfactoria con el objeto del contrato.

Se deja constancia que el recibo parcial de las obras que se protocoliza mediante la presente Acta de Recibo Parcial No. 01, no releva al Contratista de las responsabilidades y obligaciones previstas en las normas legales y en el Contrato.

Para constancia, se firma el presente Informe de Supervisión de Obras, en Valledupar, Cesar, el Trece (13) días del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Arq. CERIN FERNANDO PICAZA MONTERO
Profesional Universitario - Apoyo de la Supervisión
Secretaria de Obras Públicas Municipal

Arq. Arq. EDUARDO ANDRÉS MONSALVO RODRIGUEZ
Profesional Universitario - Apoyo de la Supervisión
Secretaria de Obras Públicas Municipal

Asunto 901676760; CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 01 00; FE3; 01; CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

De CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 <facturacion@isiigo.com>

Para obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co <obraspublicas@valledupar-cesar.gov.co>

Fecha viernes, 9 de junio de 2023 11:05:23

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

Señor (a) **CARLOS ALBERTO DE LA OSSA LACOUTURE**

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 le informa que se generó la siguiente factura

Número de factura	**FV-2-3**
A nombre de	**MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**
Total a pagar	**$ 517.744.913**

Ver factura o Enviar comentarios

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
consorciocerramientojc2022@gmail.com
- (3013769846)

Factura elaborada y enviada a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad Contáctenos

Archivos adjuntos
z09016767600082300000004.zip (98.2 kB)

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA PARCIAL	1
FECHA	8/05/2023

DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2021 NIT: 901.676.760-9	CONTRATO No	001-SOP DE 2023. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT 901.680.408-6	CONTRATO No	002-SOP DE 2023 : INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD







ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
1	PRELIMINARES							
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO	ML	1.187,60					
	PISTA BMX							
	LADO NORTE - VILLA DARIANA							
	k0+000 - k0+205				205,00			205,00
	LADO ESTE - TERRAPLEN							
	k0+000 - k0+261				261,00			261,00
	LADO SUR - MERCABASTO							
	k0+000 - k0+231				231,00			231,00
	LADO OESTE - AVENIDA							
	k0+000 - k0+192,30				192,30			192,30
	VOLEYBOL							
	CANCHA TIPO 1 - 1				93,48			93,48
	CANCHA TIPO 1 - 2				93,46			93,46
	CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO				75,90			75,90
	TOTAL CONTRATADA							1187,60
	TOTAL EJECUTADA							1152,14
	CANTIDAD POR EJECUTAR							35,46

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA


JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA PARCIAL	1		
FECHA	8/05/2023		
DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT: 901.676.760-9	CONTRATO No	001-SOP DE 2023 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT: 901.680.408-6	CONTRATO No	002-SOP DE 2023- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD

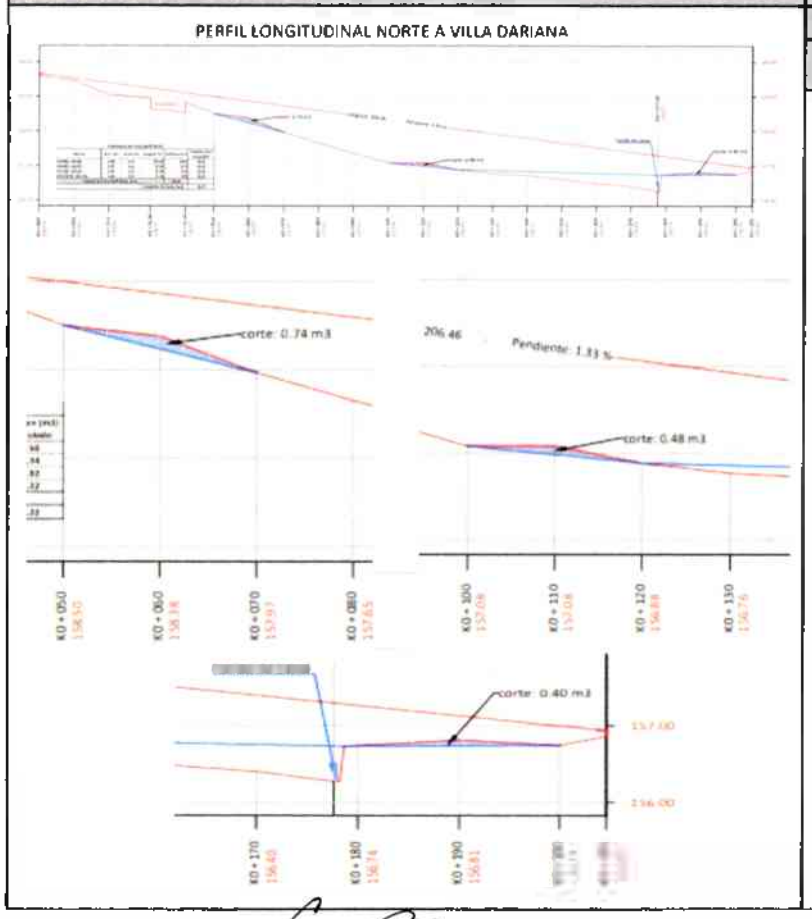

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	PROFUNDIDAD	TOTAL
1	**PRELIMINARES**							
1.2	**EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMUN**	M3	240,15					
		LONGITUD TRAMO						
	PISTA BMX	889,30						
	LADO NORTE - VILLA DARIANA							
	k0+000 - k0+205	205,00						
	CORTES DE TERRENO NATURAL							
	k0+050 - k0+070				20,00	0,07	0,50	0,74
	k0+100 - k0+120				20,00	0,05	0,50	0,48
	k0+178,70 - k0+200				21,30	0,04	0,50	0,40
	ZAPATA							
	K0+000 - K0+205	205,00		69,00	0,80	0,80	0,65	28,70
	LADO OESTE - AVENIDA							
	VIGA							
	k0+000 - k0+192,30	192,30			140,80	0,30	0,25	10,56
	ZAPATA							
	k0+000 - k0+192,30	192,30		65,00	0,80	0,80	0,85	35,36
	VOLEYBOL							
	CANCHA TIPO 1	0,00	NOTA: SE PRESENTO TERRENO ROCOSO					
	CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO	0,00						
	NOTA GENERAL: VER ANEXO LOS PERFILES TOPOGRAFICOS							
	TOTAL CONTRATADA							**240,15**
	TOTAL EJECUTADA							**76,24**
	CANTIDAD POR EJECUTAR							**163,91**

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA PARCIAL	1		
FECHA	8/05/2023		
DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT 901 676 760-9	CONTRATO No	001-SOP DE 2023: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT: 901.680 408-6	CONTRATO No	003-SOP DE 2023: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD



CANCHA VOLEIBALL





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
1	**PRELIMINARES**							
1,3	**RETIRO SOBRANTES HASTA 20 KM**	M3	240,16					
		LONGITUD TRAMO						
	PISTA BMX	**889,30**						
	LADO NORTE - VILLA DARIANA							
	K0+000 - K0+205	205,00						
	CORTES DE TERRENO NATURAL							
	K0+050 - K0+070				20,00	0,07	0,50	0,74
	K0+100 - K0+120				20,00	0,05	0,50	0,48
	K0+178,70 - K0+200				21,30	0,04	0,50	0,40
	ZAPATA							
	K0+000 - K0+205	205,00		69,00	0,80	0,80	0,65	28,70
	LADO OESTE - AVENIDA							
	K0+000 - K0+192,30	192,30			140,80	0,30	0,25	10,56
	ZAPATA							
	K0+000 - K0+192,30	192,30		65,00	0,80	0,80	0,85	35,36
	VOLEIBOLL	**282,84**						
	CANCHA TIPO 1 - 1	93,48						
	ZAPATAS			32,00	0,80	0,80	0,70	14,00
	VIGAS			1,00	68,20	0,30	0,40	8,00
	CANCHA TIPO 1 - 2	93,45						
	ZAPATAS			32,00	0,80	0,80	0,70	14,00
	VIGAS			1,00	68,20	0,30	0,40	8,00
	CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO	75,90						
	ZAPATAS			26,00	0,80	0,80	0,70	13,00
	VIGAS			1,00	52,65	0,30	0,40	6,00

NOTA GENERAL: 1. EN LAS EXCAVACIONES DE LAS CANCHAS DE VOLEIBALL SE PRESENTO EXCAVACION ROCOSA GENERANDO EXCAVACIONES MAS GRANDES DE LO PLANTEADO EN DISEÑO
2 VER ANEXO ESPACIAMIENTO CANCHA VOLEIBALL, CANCHA TIPO 1 Y CANCHA TIPO 2 (CALENTAMIENTO) A CADA 2,75MTS

TOTAL CONTRATADA	240,16
TOTAL EJECUTADA	139,24
CANTIDAD POR EJECUTAR	100,92

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR


MEMORIAS DE CALCULO

ACTA PARCIAL	1
FECHA	8/05/2023


DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT: 901.676.760-9	CONTRATO No	001-SGP DE 2023: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT: 901.680.408-5	CONTRATO No	002 SGP DE 2023: INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD

CANCHA BMX



CANCHA VOLEIBALL

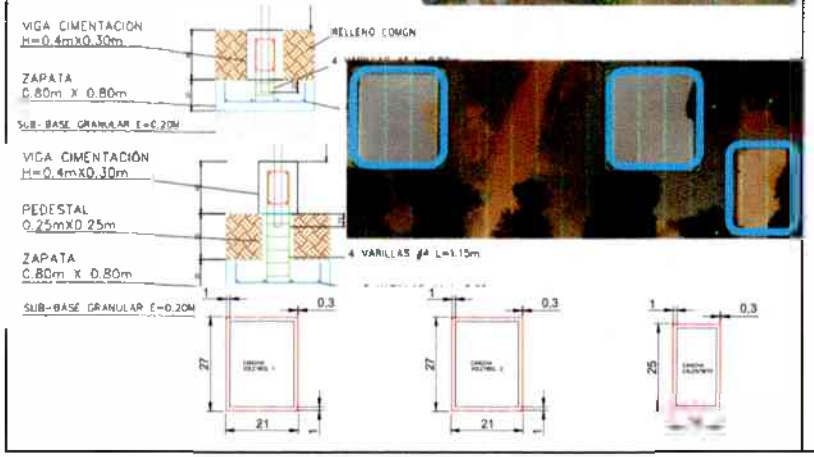

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
2	CIMENTACIONES							
2.1	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	63,98					
		LONGITUD TRAMO						
	PISTA BMX	889,30						
	LADO NORTE - VILLA CARIANA							
	k0+000 - k0+205	205 00		69.00	0,80	0,80	0,25	11,04
	LADO OESTE - AVENIDA							
	k0+000 - k0+192 30	192 30		65.00	0,80	0,80	0,25	10,40
	VOLEYBOL	283,84						
	CANCHA TIPO 1 - 1	93 46						
	ZAPATAS			32,00	0 80	0,80	0,25	5,12
	CANCHA TIPO 1 - 2	93,46						
	ZAPATAS			32 00	0 80	0,80	0,25	5,12
	CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO	75,90						
	ZAPATAS			26,00	0,80	0,80	0,25	4 16
	TOTAL CONTRATADA							63,98
	TOTAL EJECUTADA							35,84
	CANTIDAD POR EJECUTAR							28,14

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA


ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

MEMORIAS DE CALCULO

ACTA PARCIAL	1
FECHA	8/05/2023

DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO 3C 2022 NIT: 901 676 760-9	CONTRATO No	001-SOP DE 2023: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT: 901 680 408-6	CONTRATO No	002-SOP DE 2023 : INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD

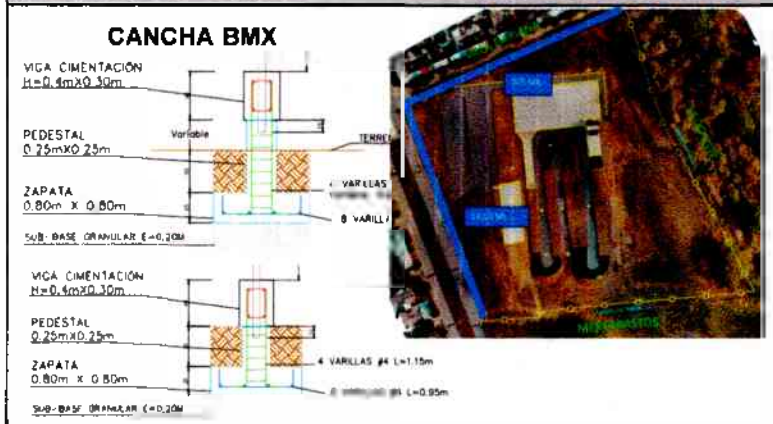

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
2	CIMENTACIONES							
2,1	PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	11,96					
	PISTA BMX	889,30						
	LADO NORTE - VILLA DARIANA							
	K0+000 - K0+120	120,00		41,00	0,35	0,25	0,25	1,00
	K0+120 - K0+140	20,00		8,00	0,08	0,25	0,25	0,04
	K0+140 - K0+160	20,00		8,00	0,19	0,25	0,25	0,10
	K0+160 - K0+177,65	17,65		7,00	0,19	0,25	0,25	0,08
	K0+177,65 - K0+205	27,35		10,00	0,35	0,25	0,25	0,22
	LADO OESTE - AVENIDA							
	K0+000 - K0+192,30	192,30		65,00	0,35	0,25	0,25	1,42
	VOLEYBOL	282,84						
	NOTA GENERAL VER ANEXO DISEÑOS - NO SE PRESENTA PEDESTALES PARA EL CERRAMIENTO DE LAS CANCHAS DE VOLEIBALL							
	TOTAL CONTRATADA							11,96
	TOTAL EJECUTADA							2,86
	CANTIDAD POR EJECUTAR							9,10

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO 3C 2022
CONTRATISTA

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ACTA PARCIAL	1		
FECHA	8/05/2023		
DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT: 901.676.760-9	CONTRATO No	001-SOP DE 2023: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS N.I.T: 901 660 408-6	CONTRATO No	002-SOP DE 2023: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD

CANCHA BMX



CANCHA VOLEIBALL

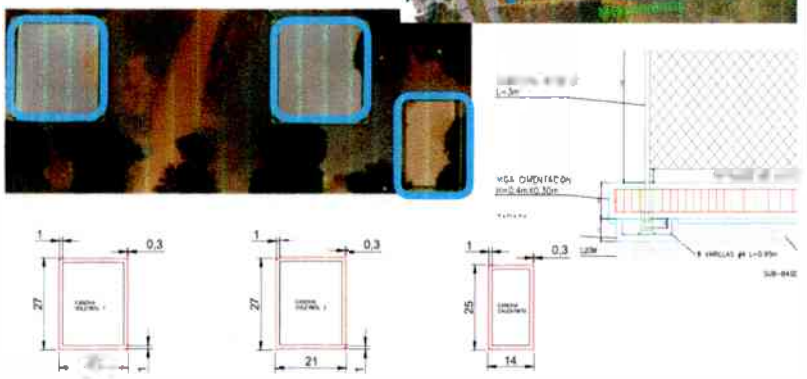

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL
2	CIMENTACIONES							
2.3	VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	142,51					
	PISTA BMX	689,30						
	LADO NORTE - VILLA DARIANA							
	k0+000 - k0+205	205,00			205,00	0,30	0,40	24,60
	LADO OESTE - AVENIDA							
	k0+000 - k0+192,30	192,30			192,30	0,30	0,40	23,08
	VOLEYBOL	262,84						
	CANCHA TIPO 1				93,48	0,30	0,40	11,22
	CANCHA TIPO 1 - 2				93,46	0,30	0,40	11,22
	CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO				75,90	0,30	0,40	9,11
	TOTAL CONTRATADA							142,51
	TOTAL EJECUTADA							79,22
	CANTIDAD POR EJECUTAR							63,29

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CALCULO

ACTA PARCIAL	1		
FECHA	8/05/2023		
DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 NIT 901 676 760-9	CONTRATO No	001-SOP DE 2023- CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT 901 580 408-6	CONTRATO No	002-SOP DE 2023 -INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR


REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD



CANCHA BMX



CANCHA VOLEIBALL





ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	LARGO	PROFUNDIDAD	TOTAL
3	ESTRUCTURAS								
31	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI	M3	23,26						
	PISTA BMX	889,30							
	LADO NORTE - VILLA DARIANA								
	ZAPATAS K0+000 - K0+205	205,00		69,00		0,80	0,80	0,05	2,21
	VIGAS				149,60	0,30		0,05	2,24
	LADO OESTE - AVENIDA								
	ZAPATAS K0+000 - K0+197,30	192,30		65,00		0,80	0,80	0,05	2,08
					140,80	0,30		0,05	2,11
	VOLEYBOL	282,84							
	CANCHA TIPO 1	93,48		32,00		0,80	0,80	0,05	1,02
					68,20	0,30		0,05	1,02
	CANCHA TIPO 1 - 2	93,46		32,00		0,80	0,80	0,05	1,02
					66,20	0,30		0,05	1,02
	CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO	75,90		26,00		0,80	0,80	0,05	0,83
					55,00	0,30		0,05	0,83
									0,00
	TOTAL CONTRATADA								23,26
	TOTAL EJECUTADA								14,40
	CANTIDAD POR EJECUTAR								8,87

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA


JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO


ALCALDÍA DE VALLEDUPAR

ACTA PARCIAL	1		
FECHA	8/05/2023		
DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO IC 2022 NIT 901.676.760-9	CONTRATO No	001 SCP DE 2023 CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS NIT 901 580 408-6	CONTRATO No	002-SCP DE 2023 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR


REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDAD




CANCHA BMX



CANCHA VOLEIBALL

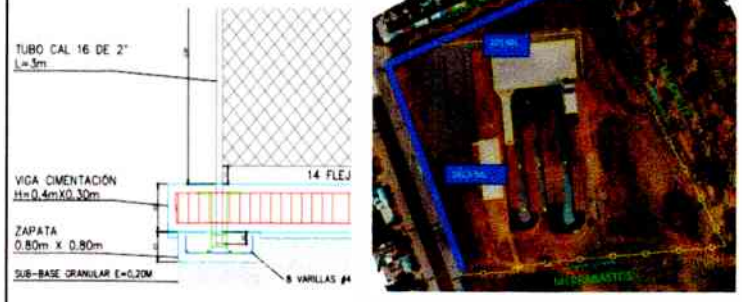

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	LONGITUD	Cantidad #	Tot/Long		TOTAL
3	ESTRUCTURAS								
3.2	ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI	KG	18.979,80						
	PISTA BMX	889,30							
	LADO NORTE - VILLA DARIANA								
	K0+000 - K0+205	205,00							
	ZAPATAS			69,00	0,95	8,00	524,40	0,99	519,00
	PEDESTAL								
	K0+000 - K0+120	120,00		41,00	1,15	4,00	188,60	0,99	187,00
	Estribos			41,00	0,80	5,00	164,00	0,56	92,00
	K0+120 - K0+140	20,00		8,00	1,23	4,00	39,36	0,99	39,00
	Estribos			8,00	0,80	6,00	38,40	0,56	22,00
	K0+140 - K0+160	20,00		8,00	1,26	4,00	40,32	0,99	40,00
	Estribos			8,00	0,80	6,00	38,40	0,56	22,00
	K0+160 - K0+177,85	17,85		7,00	1,26	4,00	35,28	0,99	35,00
	Estribos			7,00	0,80	6,00	33,60	0,56	19,00
	K0+177,66 - K0+205	27,35		10,00	1,15	4,00	46,00	0,99	46,00
	Estribos			10,00	0,80	5,00	40,00	0,56	22,00
	VIGAS			19,98	6,00	4,00	479,53	0,99	475,00
	ESTRIBOS			823,29	1,00	1,00	823,29	0,56	461,00
									0,00
	LADO OESTE - AVENIDA								
	K0+000 - K0+192,30	192,30							

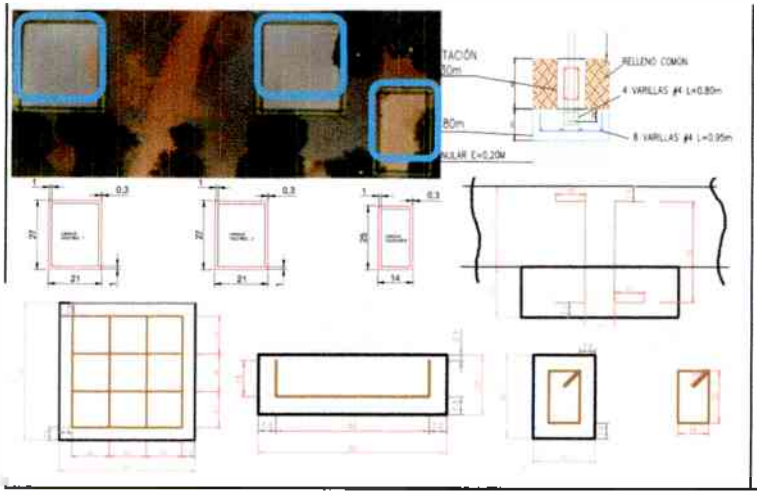

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA


VOLEYBALL	262,84							
CANCHA TIPO 1 - 1	93,48							
ZAPATAS			32,00	0,95	8,00	243,20	0,99	241,00
VIGAS			17,31	6,00	4,00	415,47	0,99	411,00
ESTRIBOS			623,20	1,00	1,00	623,20	0,56	349,00
GANCHOS UNION ZAPATAS CON VIGA			32,00	0,80	4,00	102,40	0,99	101,00
CANCHA TIPO 1 - 2	93,46							
ZAPATAS			32,00	0,95	8,00	243,20	0,99	241,00
VIGAS			17,31	6,00	4,00	415,38	0,99	411,00
ESTRIBOS			623,07	1,00	1,00	623,07	0,56	349,00
GANCHOS UNION ZAPATAS CON VIGA			32,00	0,80	4,00	102,40	0,99	101,00
CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO	75,90							
ZAPATAS			29,00	0,95	8,00	220,40	0,99	218,00
VIGAS			14,06	6,00	4,00	337,33	0,99	334,00
ESTRIBOS			506,00	1,00	1,00	506,00	0,56	283,00
GANCHOS UNION ZAPATAS CON VIGA			26,00	0,80	4,00	83,20	0,99	82,00
TOTAL CONTRATADA								18979,80
TOTAL EJECUTADA								5100,00
CANTIDAD POR EJECUTAR								13879,80

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CALCULO

			1
			8/05/2023
		001-SOP DE 2023: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	
		002-SOP DE 2023: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR	







ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	ALTO	TOTAL
3	CARPINTERIA METÁLICA							
3.1	MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO AGUAS NEGRAS CAL 30 DE 2", ANGULO DE 1- 1/2" X 1/8", PLATINAS 1/2" X 3/16"-INCLUYE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.20MT Y APOYOS CADA 3MT	ML	950,00					
	PISTA BMX	689,30						
	LADO OESTE - AVENIDA							
	K0+000 - K0+192,30	192,30			192,30			192,30
	LADO NORTE - VILLA DARIANA							
	K0+000 - K0+205	205,00			181,51			181,51
	VOLEYBOL	262,84						
	CANCHA TIPO 1				93,48			93,48
	CANCHA TIPO 1 - 2				93,46			93,46
	CANCHA TIPO 2 - CALENTAMIENTO				75,90			75,90
	TOTAL CONTRATADA							950,00
	TOTAL EJECUTADA							636,65
	CANTIDAD POR EJECUTAR							313,35

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA

JUAN CARLOS VARON MEDINA
R/L UNION TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
INTERVENTORIA

CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

ANEXOS ACTA
PARCIAL No 01

consorciocerramientojc2022@gmail.com

Calculo de volumenes de corte cimentacion cerramiento Parque BMX					
Volumenes de corte perfil Norte					
Abscisa	prof. (m)	ancho (m)	longitud (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3) acumulado
k0+000 - k0+205			205,00	0,00	0,00
k0+050 - k0+070	0,07	0,50	20,00	0,74	0,74
k0+100 - k0+120	0,05	0,50	20,00	0,48	1,22
k0+178.70 - k0+200	0,04	0,50	21,30	0,40	1,62
Volumen de Corte Perfil Norte (m3) :				1,62	
			Volumen de Corte (m3) :		1,62

Volumenes de corte perfil Este					
Abscisa	prof. (m)	ancho (m)	longitud (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3) acumulado
k0+000 - k0+261			261,00	0,00	1,62
k0+023.30 - k0+033.67	0,87	4,96	10,37	44,73	46,35
k0+045.50 - k0+065.70	1,05	5,90	20,20	125,58	171,93
k0+185.70 - k0+233.80	0,64	5,08	48,10	156,55	328,48
Volumen de Corte Perfil Este (m3) :				326,86	
Volumen de Corte Acumulado (m3) :					328,48

Volumenes de corte perfil Sur					
Abscisa	prof. (m)	ancho (m)	longitud (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3) acumulado
k0+000 - k0+231			231,00	0,00	328,48
k0+078.05 - k0+134	0,18	0,50	55,95	4,95	333,44
k0+144 - k0+179.88	0,09	0,50	35,88	1,65	335,09
k0+207.68 - k0+231.00	0,33	3,24	23,32	24,63	359,72
Volumen de Corte Perfil Sur (m3) :				31,23	
Volumen de Corte Acumulado (m3) :					359,72

Volumenes de corte perfil Oeste					
Abscisa	prof. (m)	ancho (m)	longitud (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3) acumulado
k0+000 - k0+192.30	0,20	0,30	192,30	11,54	371,26
Volumen de Corte Perfil Oeste (m3) :				11,54	
Volumen de Corte Acumulado (m3) :					371,26

Volumenes de Relleno perfil Sur					
Abscisa	prof. (m)	ancho (m)	longitud (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3) acumulado
k0+000 - k0+13.70	0,50	2,40	13,70	16,44	16,44
k0+179.90 - k0+207.68	0,50	2,40	27,78	27,78	44,22
Volumen de relleno Perfil Sur (m3) :				16,44	
Volumen de relleno Acumulado (m3) :					44,22



DATOS DEL PREDIO

DEPARTAMENTO:	CESAR
MUNICIPIO:	VALLEDUPAR
PROYECTO:	CERRAMIENTO PARQUE BMX
CONTIENE:	PLANTA PERFIL
ÁREA	LAS INDICADAS

INFORMACIÓN DE REFERENCIA

DATUM - MAGNA SIRGAS	MAGNA-SIRGAS
PROYECCION	COMFORME DE GAUSS
LATITUD.	04° 35' 46,3215" N
LONGITUD	74° 04' 39,0285" W
FALSO NORTE.	1'000 000 m
FALSO ESTE:	1'000 000 m

DATOS DEL TOPOGRAFO

NOMBRE COMPLETO	JAVIER ALMENAREZ ALMENAREZ
MATRICULA PROFESIONAL	01-13866 C.P.N.T
CALCULÓ:	JAVIER ALMENAREZ ALMENAREZ
DIBUJÓ:	JAVIER ALMENAREZ ALMENAREZ
[illegible]	18 - 04 - 2023
FIRMA TOPÓGRAFO:	


ESCALA	1 . 5000
REVISÓ:	RAFAEL JIMÉNEZ GUTIÉRREZ
APROBÓ:	
FECHA	19 - 04 - 2023

PERFIL LONGITUDINAL NORTE A VILLA DARIANA




Volumenes de corte perfil Norte					
Abscisa	prof. (m)	ancho (m)	longitud (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3) acumulado
KD+000 - KD+205	0.40	0.50	205.00	34.69	34.69
KD+050 - KD+070	0.07	0.50	20.00	0.74	35.43
KD+100 - KD+125	0.06	0.50	25.00	0.48	35.92
KD+170.70 - KD+200	0.04	0.50	21.30	0.40	36.32
Volumen de Corte Perfil Norte (m3) :				36.32	
Volumen de Corte (m3) :					36.32

ESCALA H 1 / 10.000
V: 1/ 1.000

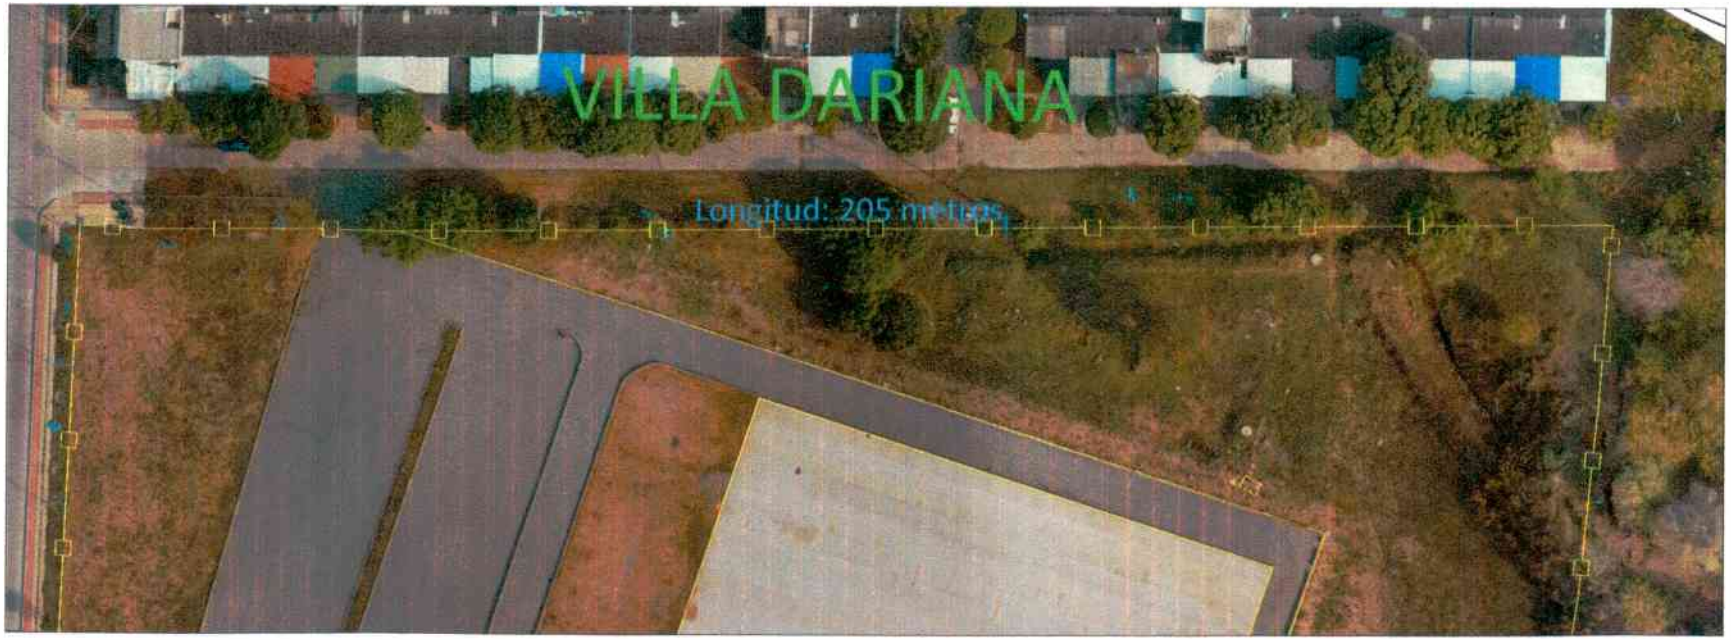

PERFIL LONGITUDINAL LADO ESTE

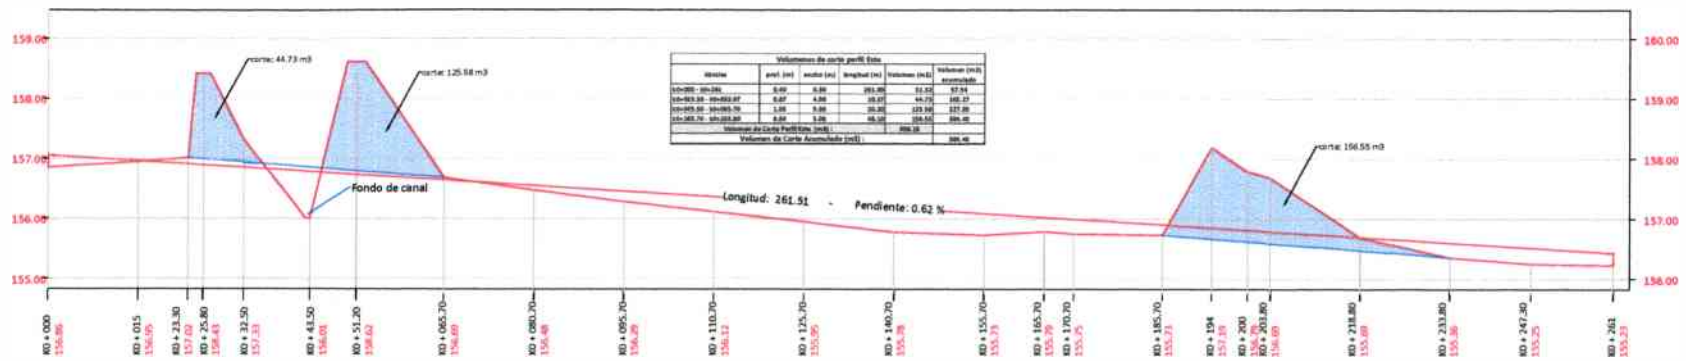


Volumenes de corte perfil Este					
Abscisa	prof. (m)	ancho (m)	longitud (m)	Volumen (m3)	Volumen (m3) acumulado
0+000 - 0+041	0.49	0.80	161.86	51.52	57.54
0+043.10 - 0+052.97	0.87	4.00	15.27	44.73	102.27
0+055.00 - 0+065.70	1.59	5.00	21.35	125.58	227.85
0+068.70 - 0+203.80	0.64	3.06	48.10	166.55	394.40
Volumen de Corte Perfil Este (m3) :				388.38	
Volumen de Corte Acumulado (m3) :					394.40

ESCALA H: 1 / 12.500
V: 1/ 1.250




PERFIL LONGITUDINAL LADO SUR A MERCABASTOS

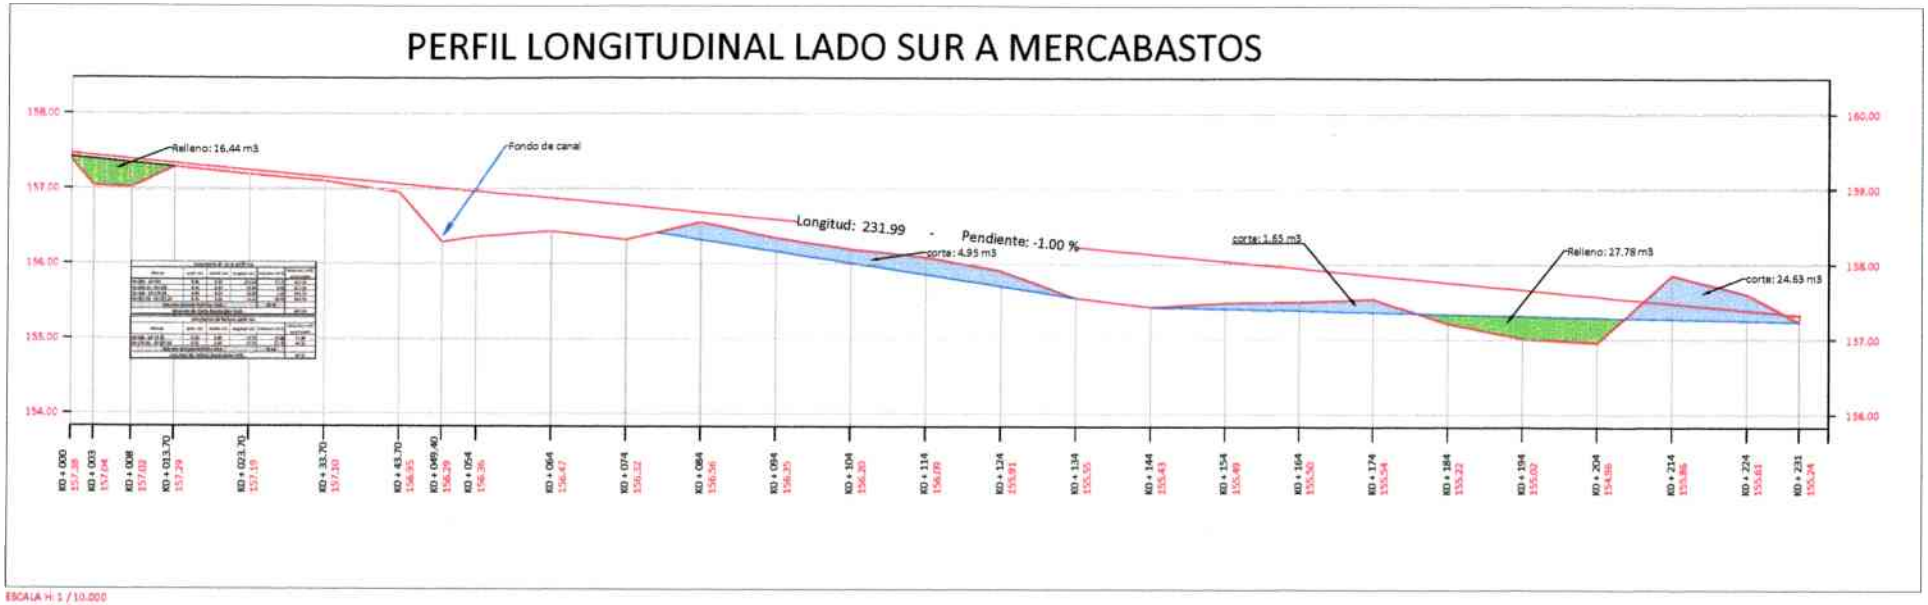


ESCALA H: 1 / 10.000
V: 1/ 1.000



ESPACIAMIENTO CANCHA VOLEIBALL – TIPO 1

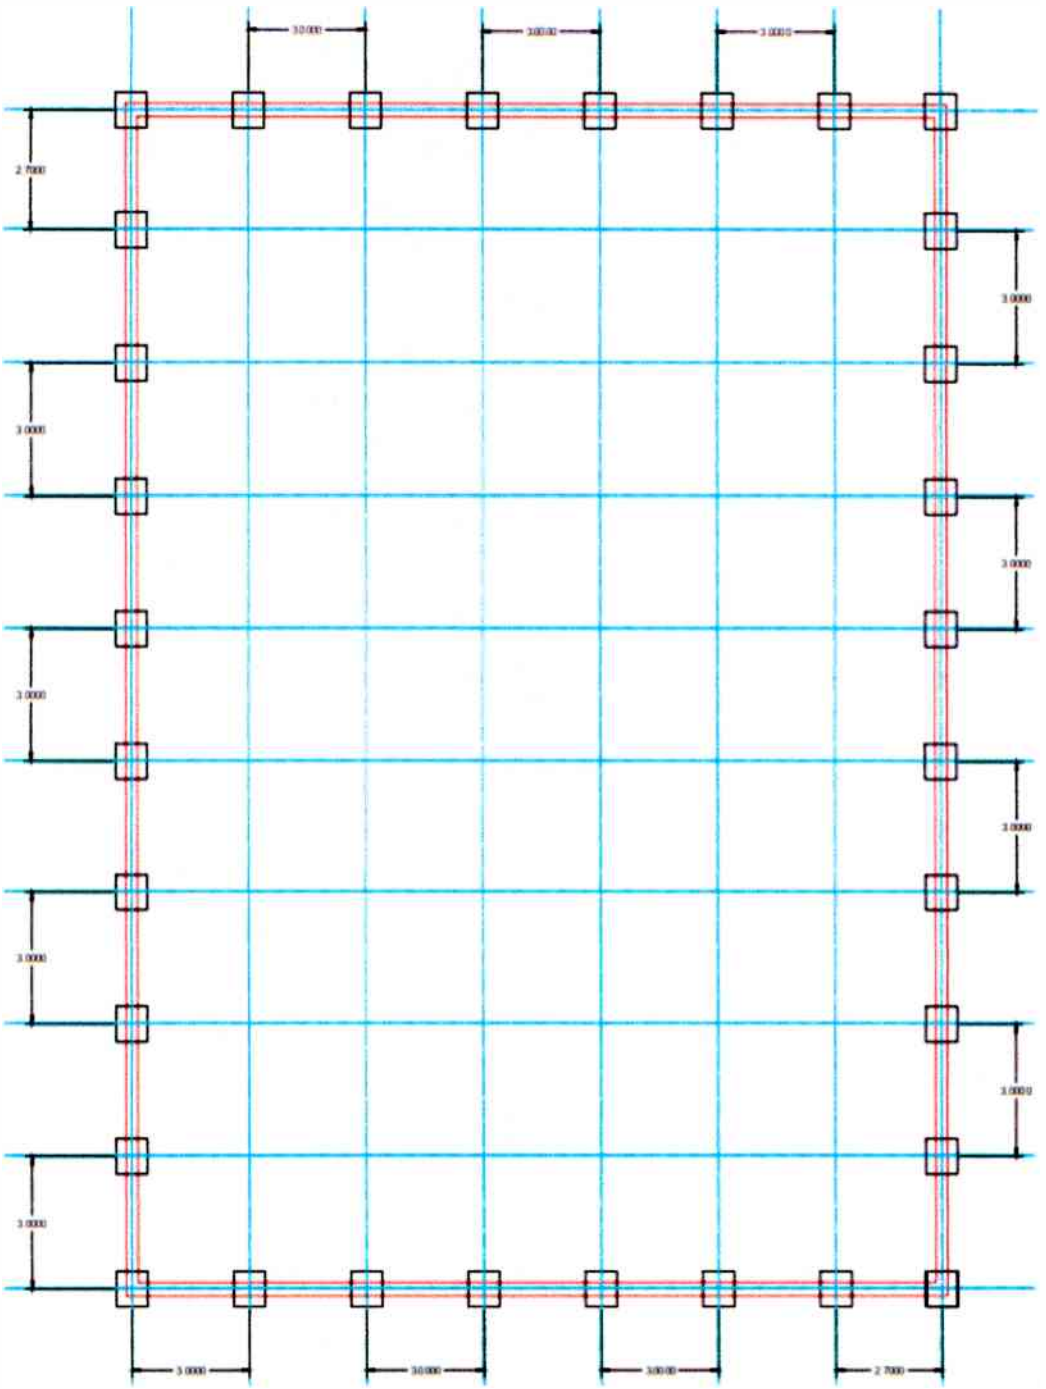

ESPACIAMIENTO CANCHA VOLEIBALL – TIPO 2 (CALENTAMIENTO)

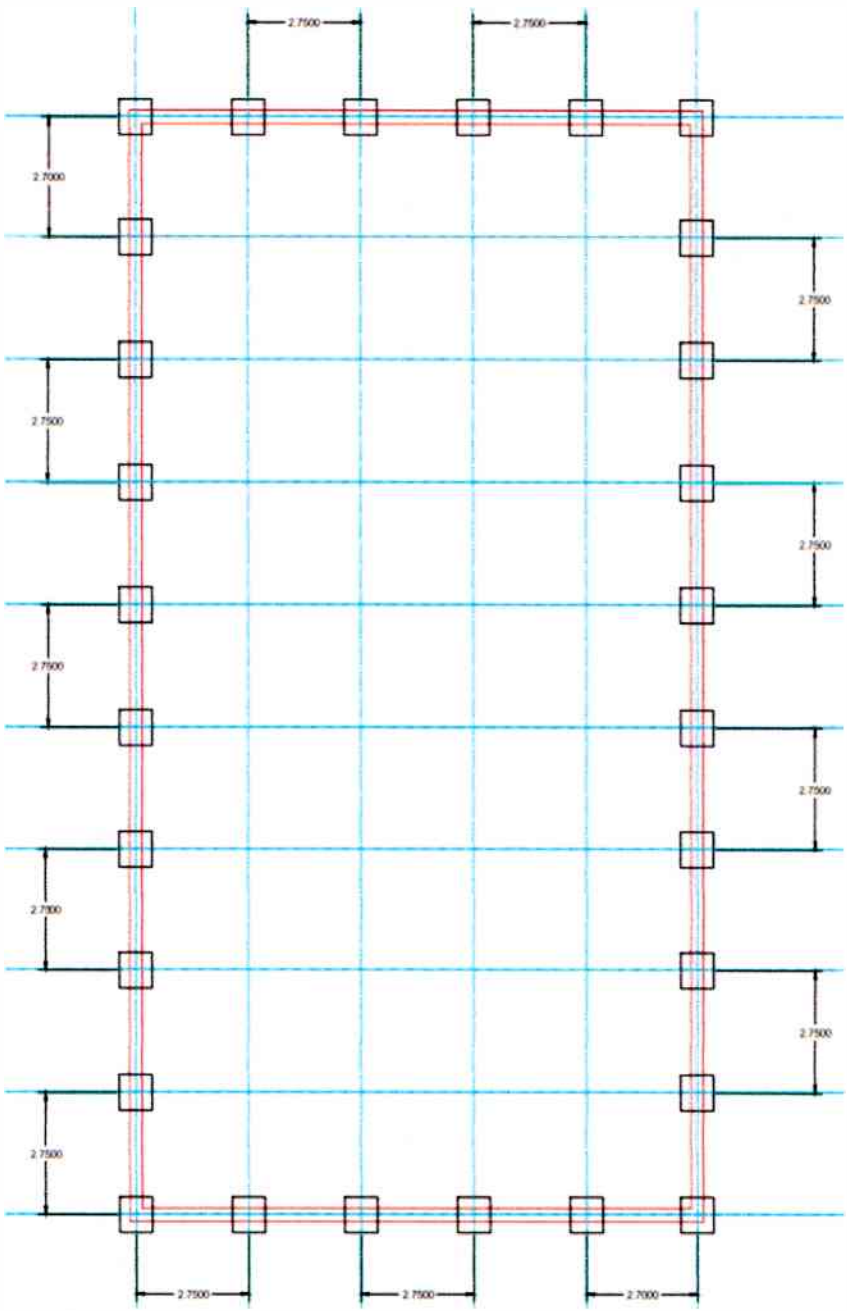

CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

CERTIFICACION DE DE LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

consorciocerramientojc2022@gmail.com

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

CERTFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

GREY JUDITH VILLACOB RIOS, identificado con cedula de ciudadania No. 1.102.810.077 de Sincelejo, en mi condición de representante legal del CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022, identificada con el NIT 901676760-9, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de la expedición de este certificado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Valledupar, a los 08 días del mes de mayo de 2023.

Atentamente;

GREY JUDITH VILLACOB RIOS
C.C. 1.102.810.077 de Sincelejo
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022



CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

consorciocerramientojc2022@gmail.com

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676760	9	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 36A 5F 103 MZ E CA 78	VALLEDUPAR-CESAR	3197499188	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2082894693	9450918911	E	2023/04/18	2023/05/16	BANCOLOMBIA	28	$356,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vet	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	52712390	ARZUAGA MARIA	X																	230301	4	$266,667	$42,700	EPS002	4	$266,667	$33,400	CCF15	4	$266,667	$10,700	14-23	4	$266,667	$18,600	4	$266,667	$13,500	No	$118,900
2	CC	49699891	RUBIO MARYURIS	X																	230301	4	$173,334	$27,800	EPS002	4	$173,334	$21,700	CCF15	4	$173,334	$7,080	14-23	4	$173,334	$12,100	4	$173,334	$8,800	No	$77,480
3	CC	77161118	ZABALETA JOSE	X																	231001	4	$333,334	$53,400	EPS002	4	$333,334	$41,700	CCF15	4	$333,334	$13,400	14-23	4	$333,334	$23,300	4	$333,334	$16,800	No	$148,600
Total Afiliados(3)																							$773,335	$123,900			$773,335	$96,800			$773,335	$31,100			$773,335	$54,000		$773,335	$39,100		$344,900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676760	9	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 36A 5F 103 MZ E CA 78	VALLEDUPAR-CESAR	3197499188	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2082894693	9450918911	E	2023/04/18	2023/05/16	BANCOLOMBIA	28	$356,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$123,900	$4,300	$0	$128,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$53,400	$1,900	$0	$55,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$70,500	$2,400	$0	$72,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$54,000	$1,900	$0	$55,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$54,000	$1,900	$0	$55,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$31,100	$1,100	$0	$32,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$31,100	$1,100	$0	$32,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$96,800	$3,300	$0	$100,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$96,800	$3,300	$0	$100,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$23,500	$800	$0	$24,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$23,500	$800	$0	$24,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$15,600	$600	$0	$16,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$15,600	$600	$0	$16,200
TOTAL				3	$344,900	$12,000	$0	$356,900

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676760	9	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 36A 5F 103 MZ E CA 7B	VALLEDUPAR-CESAR	3197499188	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2082900274	9450921855	E	2023/05/15	2023/05/16	BANCOLOMBIA		$2,582,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	82713290	ARZUAGA MARIA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$250,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-23	30	$2,000,000	$139,200	30	$2,000,000	$100,000	No	$889,200
2	CC	49699891	RUBIO MARYURIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
3	CC	77161118	ZABALETA JOSE																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$312,500	CCF15	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
Total	**Afiliados(3)**																						$5,800,000	$928,000			$5,800,000	$725,000			$5,800,000	$232,000			$5,800,000	$403,700		$5,800,000	$290,000		$2,578,700

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676760	9	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CL 36A 5F 103 MZ E CA 78	VALLEDUPAR-CESAR	3197499188	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2082900274	9450921855	E	2023/05/15	2023/05/16	BANCOLOMBIA		$2,582,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$928,000	$1,200	$0	$929,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$500	$0	$400,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$528,000	$700	$0	$528,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$403,700	$500	$0	$404,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$403,700	$500	$0	$404,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$232,000	$300	$0	$232,300
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$232,000	$300	$0	$232,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$725,000	$900	$0	$725,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$725,000	$900	$0	$725,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$174,000	$300	$0	$174,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$174,000	$300	$0	$174,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$116,000	$200	$0	$116,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$116,000	$200	$0	$116,200
TOTAL				3	$2,578,700	$3,400	$0	$2,582,100

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

SUBCONTRATO DE MANO DE OBRA	
CONTRATO N°:	**No. 001-SOP DE 2022**
OBRA:	*"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR"*
CONTRATANTE:	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
CONTRATISTA:	MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA
LUGAR Y FECHA:	Valledupar - Cesar 02/Marzo/2022

Entre los suscritos a saber **CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022** identificado con el NIT: 901676760-9 representado por **GREY JUDITH VILLACOB RIOS** identificado con la C. C. No. 1.102.810.077 de Sincelejo, quién en adelante y para efectos del presente contrato se llamará EL CONTRATANTE, y MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA identificada con C. C. No. 52.712.290-4, quien en adelante y para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, y quienes en conjunto se denominan las "Partes", hemos decidido celebrar el presente subcontrato de ejecución de obra (en adelante el "CONTRATO ACTUAL"), que se regirá previo las siguientes consideraciones:

I. CONSIDERACIONES

1. EL CONTRATANTE es adjudicatario del proceso de contratación No. LOP-SOP-013-2022 pública cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR"; según, contrato de adjudicación de Fecha 07/02/2023 de la que es propietario CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 identificado con el NIT: 901676760-9 representada legalmente por GREY JUDTH VILLACOB RIOS identificado con la C. C. No. 1.102.810.077 de Sincelejo por valor MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 1.067.526.429,61) INCLUIDO AIU.
2. La empresa CONTRATISTA cuenta con amplia experiencia en la ejecución de esta clase trabajos de mantenimiento y conservación.

3. El CONTRATISTA es especializada que cuenta con los medios, el personal y la maquinaria necesaria para ejecutar de forma eficiente las actividades de la forma especificada en el Contrato Principal sus apéndices y anexos, así como en el presente Contrato.
4. Para todos los efectos asociados al presente Contrato, cada una de las Partes estará representada por la persona que suscribe el presente documento o por el suplente que esta designe (los "Representantes de las Partes")
5. Teniendo en cuenta lo anterior, las Partes acuerdan celebrar el presente Contrato para que el Contratista, por su cuenta y riesgo, ejecute la **MANO DE OBRA** que se requiera dentro del contrato de "**CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR**" en la Ciudad de Valledupar. Para la ejecución del contrato, EL CONTRATANTE se obliga a suministrar a EL CONTRATISTA, los medios y las condiciones, especificaciones, estipulaciones, y demás información relevante que rigen la ejecución del CONTRATO PRINCIPAL, los cuales harán parte integrante de este contrato.

II. DEFINICIONES

- Contrato: es el presente documento
- Contrato Principal: Tiene el significado que se le otorga en los considerandos del presente Contrato. Toda referencia al Contrato Principal se entenderá hecha así mismo a sus apéndices, anexos, modificaciones y cualquier otro documento suscrito entre las partes del Contrato Principal con ocasión del mismo.
- Días Calendario: Se refiere a cualquier día del año.
- Días Hábiles: Se refiere a los días lunes a viernes excepto por los días festivos en la República de Colombia.
- Especificaciones Técnicas: Se refiere a las especificaciones técnicas exigidas bajo el Contrato Principal y que deberán ser compartidas por EL CONTRATANTE al CONTRATISTA para la ejecución del Contrato.
- Interventoría: Se refiere a la interventoría contratada por la Empresa para realizar seguimiento a la ejecución del Contrato Principal.
- SMLMV: Hace referencia al Salario Mínimo Legal Diario Vigente en la República de Colombia.

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

CLAUSULAS

PRIMERA: **OBJETO DEL CONTRATO.** En virtud del presente Contrato El CONTRATISTA se obliga con EL CONTRATANTE, por su cuenta y riesgo, en calidad de empresario independiente y con autonomía técnica y administrativa, al desarrollo de **MANO DE OBRA** que se requiera dentro del contrato cuyo objeto es " "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR" - en el municipio de Valledupar, de acuerdo con las normas generales y especificaciones técnicas para la realización del proyecto y los exigidos por EL PROPIETARIO DE LA OBRA y la Interventoría de la obra.

SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO. EL CONTRATISTA deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el CONTRATANTE mediante documentos físicos o por medio electrónico.

TERCERA. NATURALEZA DEL CONTRATO. El presente es un contrato de **MANO DE OBRA**, bajo la modalidad de precios unitarios reajustables y contiene las obligaciones básicas a cargo de cada una de las Partes. Se ejecuta bajo el supuesto de la buena fe.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO. El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será hasta el 01 de junio del 2023, no obstante, lo anterior, de prorrogarse o adicionarse el Contrato Principal, el plazo será el estipulado en las prórrogas, o adiciones que suscriba el CONTRATANTE con el PROPIETARIO DE LA OBRA.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO. El valor estimado del Contrato es la suma de CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($106.752.642,96).

Parágrafo: En el evento de una adición, se restructurará de acuerdo al total adicionado por EL PROPIETARIO DE LA OBRA.

SEXTA: FORMA DE PAGO. EL CONTRATANTE se obliga a pagar a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante actas parciales mensuales de acuerdo con las cantidades de obra ejecutadas a los precios unitarios acordados entre las partes. El pago de las facturas se hará dentro de los QUINCE días siguientes a la recepción y aceptación de las mismas por parte de EL CONTRATANTE y una vez

EL PROPIETARIO DE LA OBRA haga efectivo el pago del acta mensual correspondiente a EL CONTRATANTE.

SEPTIMA. INTERVENTORÍA. La Supervisión de la obra estará a cargo de la empresa designada por EL PROPIETARIO DE LA OBRA (Municipio de Valledupar). EL CONTRATISTA *deberá* colaborar con la Supervisión para facilitar el cumplimiento de sus funciones, entregando información oportuna sobre materiales, procedimientos, recursos asignados para el desarrollo de las obras e información pertinente para la elaboración de las actas de obra.

OCTAVA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

Obligaciones de EL CONTRATANTE

1. Pagar las sumas a favor del CONTRATISTA que se adeuden a título de remuneración conforme a los términos de la cláusula Quinta del presente Contrato.
2. Poner a disposición del CONTRATISTA oportunamente los materiales y equipos que sean necesaria para la ejecución del presente Contrato.
3. Transmitir oportunamente al CONTRATISTA las observaciones que sean realizadas por la Interventoría o LA PROPIETARIA DE LA OBRA en relación con sus obligaciones.
4. Todas las demás actividades inherentes a la debida ejecución y cumplimiento del presente Contrato.
5. Informar oportunamente al CONTRATISTA sobre cualquier cambio, otrosí, adición o modificación en el Contrato Principal que considere que pueda afectar la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA, o cambie los plazos y los valores del Contrato Principal.
6. Revisar, aprobar o hacer observaciones a la información técnica que el Contratista someta a consideración del Contratante en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles.
7. Dar respuesta oportuna a las comunicaciones remitidas por EL CONTRATISTA.
8. Dar respuesta en un término prudencial de las solicitudes de adición, ampliación y/o suspensión y reinicio del contrato con la respectiva justificación tanto ante EL PROPIETARIO DE LA OBRA, como ante EL CONTRATISTA
9. Solicitar expresamente y por escrito a EL CONTRATISTA la ejecución de alcances adicionales. Los valores adicionales deberán ser aceptados previamente por EL CONTRATISTA.
10. Efectuar el acompañamiento necesario en la elaboración y suministro de los soportes que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.

11. Revisar y aprobar oportunamente las actas de pago, de acuerdo con los términos establecidos en la Cláusula Quinta del presente Contrato.

***Obligaciones del* CONTRATISTA:** El Contratista ejecutará las siguientes obligaciones en las cantidades, precios unitarios y con el alcance establecido en los Anexos del Presente Contrato y del Contrato Principal (No. 001-SOP DE 2023).

1. Ejecutar la construcción de las Obras, en las condiciones de calidad.
2. Cumplir con los tiempos de entrega de las Obras.
3. Ejecutar los trabajos materia del contrato, ceñido a las especificaciones y directrices suministradas por el Interventor y/o supervisor del contrato por parte del PROPIETARIO DE LA OBRA.
4. Asegurar las condiciones de calidad de la obra a partir del cumplimiento de la normatividad vigente, de la realización de los ensayos y las mediciones que según las especificaciones técnicas de construcción y/o la interventoría defina.
5. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza EL SUPERVISOR. atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones y requerimientos que realicen
6. Elaborar y presentar para aprobación de EL PROPIETARIO DE LA OBRA y/o supervisor las respectivas actas de obra, adjuntando las memorias de cálculo y demás documentación técnica necesaria.
7. Mantener en el sitio de las obras y en buen estado, los recursos suficientes para ejecutar la obra y evitar demoras o interrupciones y solicitar aprobación de la Interventoría para la utilización de maquinaria e insumos no previstos
8. Emplear, personal suficiente, idóneo y calificado para cumplir con el objeto del contrato, de manera que el contrato se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser fácilmente identificable por la supervisión de EL PROPIETARIO DE LA OBRA.
9. Cumplir con las disposiciones contempladas en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en material de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Cumplir con los protocolos de bioseguridad para el sector de la construcción emitidos por el Ministerio de Salud y protección Social, implementados por el CONTRATANTE dentro del Contrato Principal. Cumplir y hacer respetar por todos sus trabajadores las normas de seguridad industrial que se tengan establecidas por parte del CONTRATANTE en la obra

10. Participar en las reuniones y Comités Técnicos programados por la Dirección del proyecto, a través del Ingeniero Residente o el director de obra, y el personal calificado.
11. NOVENA. GARANTÍAS. EL CONTRATISTA No está obligado a constituir a favor de EL CONTRATANTE ninguna garantía.

NOVENA. TERMINACIÓN. El presente contrato podrá terminar poralgunas de las siguientes causales:

- Vencimiento del término de duración, conforme a lo expuesto en la Cláusula Cuarta.
- Mutuo acuerdo entre las partes, en cuyo caso se suscribirá un acta en la que conste dicha situación.
- El impedimento de cualquiera de las Partes, ajeno a su voluntad y debidamente certificado, para continuar con la ejecución del Contrato. En este caso, las partes de mutuo acuerdo podrán:
- Suspender la ejecución del Contrato por el término que dure la causal de impedimento; en cuyo caso se suscribirá un acta en la que conste dicha situación y las condiciones particulares del caso.
- Terminar definitivamente la ejecución del Contrato, sin lugar a indemnización o sanción alguna; en cuyo caso se suscribirá un acta en la que conste dicha situación. No obstante, si se trata de una autorización o permiso que se debió conseguir por parte del PROPIETARIO DE LA OBRA o del SUPERVISOR, habrá Lugar al pago de la Cláusula Penal en favor del CONTRATISTA.
- Incumplimiento de alguna de las Partes, frente a cualquiera de las obligaciones derivadas del Contrato. En este caso, la parte cumplida podrá:
- Terminar unilateralmente el contrato, emitiendo notificación previa y escrita a la otra parte, con un término no inferior a treinta (30) días calendario. Nos obstante, la Parte cumplida, antes de terminar de forma unilateral deberá enviar un comunicado a la Parte incumplida para que esta en el término de 30 días, de cumplimiento a la obligación incumplida.
- Solicitar a la otra parte que subsane el incumplimiento presentado y continuar con la ejecución del contrato.
- Lo anterior, sin perjuicio del reconocimiento de la sanción establecida en la Cláusula Penal y de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la parte cumplida.
- Decisión unilateral e injustificada de cualquiera de las partes, en cuyo

caso deberá reconocerse a la otra parte, la sanción establecida en la Cláusula Penal y la respectiva indemnización por los perjuicios ocasionados con la terminación anticipada.

DÉCIMA. INDEPENDENCIA DE EL CONTRATISTA. Por la naturaleza de este contrato, las partes expresamente reconocen que ninguna de las obligaciones establecidas genera algún vínculo adicional entre éstas, y será única y exclusivamente de carácter comercial, por lo tanto, EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía e independencia, y su personal no estará sometido a subordinación laboral con EL CONTRATANTE.

EL CONTRATISTA es una entidad independiente del Contratante y no es su representante, agente o mandatario.

Ninguna de las Partes, tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la otra Parte, ni de tomar decisiones o iniciar acciones.

EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con el objeto del Contrato con su propio personal, de forma independiente y autónoma, sin que exista relación de subordinación o dependencia entre éste y el Contratante.

EL CONTRATISTA será responsable del pago de los salarios, prestaciones sociales, honorarios, contraprestaciones y contribuciones correspondientes al personal que utilice en la ejecución del presente Contrato, por lo cual, el Contratante no adquiere con el Contratista, ni con las personas que ocupe para la ejecución del Contrato, ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo.

DÉCIMA PRIMERA. ORIGEN DE INGRESOS. Las Partes declaran que sus ingresos no provienen de actividades ilícitas, y que ellas, sus asociados y sus representantes, no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, o en listados de financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dinero, o en general, de cualquier actividad ilícita. De igual manera, EL CONTRATISTA manifiesta que los ingresos que se generen por la ejecución del contrato, no se destinarán a ninguna de las actividades anteriormente descritas.

PARÁGRAFO 1. Será justa causa de terminación del contrato, la inclusión de alguna de las partes, de sus asociados o de sus representantes, en los listados de la Officeof Foreign Assets Control (OFAC) del Gobierno de los Estados Unidos o los listados de cualquier autoridad local, extranjera o internacional sobre personas sospechosas de incurrir en cualquiera de las actividades descritas en el inciso anterior.

PARÁGRAFO 2. En caso de que la información declarada por alguna de las partes en esta cláusula sea incorrecta o inexacta, deberá responder a la otra parte por todos los daños y/o perjuicios causados.

DÉCIMA SEGUNDA. CESIÓN DEL CONTRATO. Queda prohibida para las Partes, la cesión parcial o total del contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la otra Parte. EL CONTRATANTE, manifiesta que, en caso de tener intención de ceder se posición contractual dentro del Contrato Principal, le otorgará la primera opción para ser cesionario del mismo al CONTRATISTA o la empresa que este disponga.

DÉCIMA TERCERA. VIGILANCIA DEL CONTRATO. EL CONTRATANTE supervisará la ejecución del presente Contrato y podrá formular las observaciones del caso, con el fin de ser analizadas conjuntamente con EL CONTRATISTA y efectuar las modificaciones o correcciones a que hubiere lugar.

DECIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL.

- El incumplimiento grave total o parcial de cualquiera de las obligaciones por una de las Partes, dará derecho a la Parte Cumplida a exigir al Parte Incumplida a título de pena aplicable, el pago de una suma de hasta el 1 por ciento (1%) del valor total del Contrato, la cual será exigible directamente o por las vías legales sin necesidad de requerimiento o constitución en mora.
- Procedimiento para la aplicación de la Cláusula Penal
- La Parte Cumplida le transmitirá a la Parte Incumplida lo siguiente.' (i) la obligación
- u obligaciones incumplidas, (ii) las razones por las cuales se considera que se encuentran incumplidas, (iii) los hechos que soportan sus afirmaciones, (iv) la tasación de los perjuicios y (v) los informes y las demás pruebas que sustentan el posible incumplimiento.
- La Parte incumplida tendrá quince (15) Días Hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la comunicación remitida por la Parte Cumplida, para exponer y justificar por escrito las razones por las cuales está incumpliendo y en general para que se pronuncie sobre las imputaciones de incumplimiento, para lo cual podrá rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Parte Cumplida.
- La Parte Cumplida analizará las explicaciones y justificaciones presentadas y enviará a la Parte Incumplida, y enviará una comunicación escrita en la que le informará si en su concepto hay o no lugar a la aplicación de la Cláusula Penal, las razones en que sustenta su posición y el cálculo de los

perjuicios causados a la fecha.

DECIMA QUINTQ. PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013, se manifiesta que los *datos* de carácter personal a los que se tenga acceso a raíz de la relación comercial, serán almacenados en una base de datos para cumplir con las finalidades señaladas en la política de tratamiento de datos personales de clientes y/o proveedores, y serán tratados conforme a los procedimientos establecidos para el tratamiento de los mismos. Cualquier solicitud, denuncia, reclamo o sugerencia frente a los datos recolectados y tratados, se podrá elevar a través de los siguientes correos electrónicos:

EL CONTRATISTA: majaarzuaga@hotmail.com

EL CONTRATANTE: consorciocerramientojc2022@gmail.com

DÉCIMA SEXTA. CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este Contrato, que no pueda ser resuelta directamente por las Partes, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1563 de 2012 y demás normas que lo modifiquen y/o complementen, de acuerdo con las siguientes reglas:(I) El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros; (II) Losárbitros serán designados por las Partes de común acuerdo dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la notificación de alguna de las Partes a la otra Parte respecto de su intención de acudir a la justicia arbitral. En caso de que no fuere posible su designación de común acuerdo, serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Valledupar, a solicitud de cualquiera de Las Partes. (III) Los árbitros decidirán en derecho. (IV) La sede será el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Valledupar.

DÉCIMA OCTAVA. DOMICILIO CONTRACTUAL. Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de Valledupar, y para notificación o comunicación entre las partes se tendrá:

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

EL CONTRATANTE: CL 36 A #5F-103, Conjunto Argentina MZ E Casa 7B.

EL CONTRATISTA: Carrera 5B, #43-74, Barrio panamá, Valledupar.

PARÁGRAFO 1. Cualquier cambio de dirección debe ser informado oportunamente a la otra parte, mediante comunicación escrita, dirigida a la última dirección registrada por cada parte.

DÉCIMA NOVENA. Este contrato es Ley para las partes y estas estarán sujetas al cumplimiento de lo establecido en este documento, así como a las disposiciones que por mutuo acuerdo se incorporen al mismo.

Para constancia se firma por las partes en la ciudad de Valledupar, el día 02 de marzo del 2023.

EL CONTRATANTE	EL CONTTRATISTA
GREY JUDIH VILLACOB RIOS **C.C. 1.102.810.077 de Sincelejo** **R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022**	**MARÍA A. ARZUAGA PADILLA** **C.C. 52.712.290 de Bogota**

MES DE MARZO

MAARIA ALEJANDRA

	ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDO	DIAS LABORADO	CARGO	CEDULA DE CIUDADANIA	CELULAR	DIRECCION	CORREO ELECTRONICO	SALARIO	DEDICACION	COSTO TOTAL MENSUAL
OK	7	JESUS ALBERTO CORTES ALMENDRALES	9	AYUDANTE	1.045.727.535	316562975	CR 43A#3C-43	consociocerramientojc2022@gmail.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	11	DEIVER ENRIQUE GRANADOS VALENCI	1	MAESTRO DE OBRA	1.129.496.605	3042227297	APT # 403 LOS MAESTROS	consociocerramientojc2022@gmail.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	1	JHON CARLOS GUTIERREZ PINZON	1	AYUDANTE	1.002.996.156	3128751353	MZ 2 CASA 12 VILA PASCUALA	[redacted]	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
OK	8	IRISON CERVANTES VIDEZ	9	AYUDANTE	1.003.334.942	3044543153	CLL 57 # 18GI-37	consociocerramientojc2022@gmail.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
OK	12	WILFRIDO MEJIA FRANCO	9	AYUDANTE	77.014.004	3015502492	CLL 30 CRA 22-48	consociocerramientojc2022@gmail.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	5	JHAN CARLOS POLO ROJANO	1	AYUDANTE	1.235.338.167	3042275382	MZ B K9 20-2DA ETAPA	consociocerramientojc2022@gmail.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	2	MARIO JOSE DE CRUZ LEON	1	AYUDANTE	5.848.845		MZ 2 CASA #16	consociocerramientojc2022@gmai.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
OK	3	JOSBEL MIGUEL ALVAREZ GALUE	9	AYUDANTE	5.738.868	3013814749	CRA 29 CLL 30-29	consociocerramientojc2022@gmai.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
OK	4	EDINSON DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ	30	MAESTRO DE OBRA	1.102.827.240	3027500340	DIG 18A #25A-46	consociocerramientojc2022@gmai.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	9	LUIS ERNESTO PETIT ANDRADE	1	AYUDANTE	5.466.598	3013814749	CRA 29 CLL 30-29	consociocerramientojc2022@gmai.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
OK	10	SANDRO RAFAEL CARDENAS ROMERO	9	AYUDANTE	19.706.177	3218784610	CRA 43A CLL 13 KS 35	consociocerramientojc2022@gmai.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
OK	9	BLADIMIR TOMAS VEGA ROJAS	9	AYUDANTE	84.009.153	3225903327	CRA 41 # 3E-56	consociocerramientojc2022@gmai.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
OK	13	JOSE GREGORIO GUERRA ARAGON	9	AYUDANTE	1.065.813.199	3165629775	CLL 5A # 46-4 2	consociocerramientojc2022@gmai.com	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00

CONSORCIO CERRAMIENTO
PROFESIONALES

MARIA ALEJANDRA ARZUAGA	5	DIRECTORA	52712290	4.000.000	50%	
JOSE ALBERT ZABALETA	5	RESIDENTE	77161118	2.500.000	100%	
MARYORI	5	SISO	49699891	1.300.000	100%	

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52712290		MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MANZANA E CASA 7 B CONJUNTO ARGENTINA	VALLEDUPAR-CESAR	3123129411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2082916402	9450921955	E	2023/04/25	2023/05/16	BANCOLOMBIA	21	$1,450,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (11 Afiliados)							$3,712,001	$594,100			$3,712,001	$464,200			$3,712,001	$149,200			$3,712,001		$20,300		$3,712,001	$186,500		$1,414,300
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)							$3,712,001	$594,100			$3,712,001	$464,200			$3,712,001	$149,200			$3,712,001		$20,300		$3,712,001	$186,500		$1,414,300
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)							$3,712,001	$594,100			$3,712,001	$464,200			$3,712,001	$149,200			$3,712,001		$20,300		$3,712,001	$186,500		[illegible]
1	CC	1102827240	ALVAREZ EDINSON		23030	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF15	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$1,160,000	$58,000	No	$441,100
2	CC	5738868	ALVAREZ JOSBEL		23030	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$43,500	CCF15	9	$348,000	$14,000	14-23	9	$348,000	0.522%	$1,900	9	$348,000	$17,500	No	$132,600
3	CC	19708177	CARDENAS SANDRO	X	23100	9	$348,000	$55,700	EPS041	9	$348,000	$43,500	CCF15	9	$348,000	$14,000	[illegible]	9	$348,000	0.522%	$1,900	9	$348,000	$17,500	No	$132,600
4	CC	1003334942	CERVANTES IRINSON		23020	9	$348,000	$55,700	EPS017	9	$348,000	$43,500	CCF15	9	$348,000	$14,000	14-23	9	$348,000	0.522%	$1,900	9	$348,000	$17,500	No	$132,600
5	CC	1045727535	CORTES JESUS		23100	9	$348,000	$55,700	CCFC5	9	$348,000	$43,500	CCF15	9	$348,000	$14,000	14-23	9	$348,000	0.522%	$1,900	9	$348,000	$17,500	No	$132,600
6	CC	1129496605	GRANADOS DEIVER		23030	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$4,900	CCF15	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$38,667	$2,000	No	$15,000
7	CC	1065813199	GUERRA JOSE		23030	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$43,500	CCF15	9	$348,000	$14,000	14-23	9	$348,000	0.522%	$1,900	9	$348,000	$17,500	No	$132,600
8	CC	1002996158	GUTIERREZ JHON		23030	1	$38,667	$6,200	ESSC24	1	$38,667	$4,900	CCF15	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$38,667	$2,000	No	$15,000
9	CC	77014004	MEJIA WILFRIDO		23100	9	$348,000	$55,700	EPS017	9	$348,000	$43,500	CCF15	9	$348,000	$14,000	14-23	9	$348,000	0.522%	$1,900	9	$348,000	$17,500	No	$132,600
10	CC	1235338167	POLO JHAN		23030	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$4,900	CCF15	1	$38,667	$1,600	14-23	1	$38,667	0.522%	$300	1	$38,667	$2,000	No	$15,000
11	CC	8409153	VEGA BLADIMIR		23020	9	$348,000	$55,700	EPS002	9	$348,000	$43,500	CCF15	9	$348,000	$14,000	14-23	9	$348,000	0.522%	$1,900	9	$348,000	$17,500	No	$132,600
Total			**Afiliados(11)**				$3,712,001	$594,100			$3,712,001	$464,200			$3,712,001	$149,200			$3,712,001		$20,300		$3,712,001	$186,500		$1,414,300

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52712290		MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MANZANA E CASA 7 B CONJUNTO ARGENTINA	VALLEDUPAR-CESAR	3123129411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	2082916402	9450921955	E	2023/04/25	2023/05/16	BANCOLOMBIA	21	$1,450,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$594,100	$15,200	$0	$609,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$167,100	$4,300	$0	$171,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$315,600	$8,000	$0	$323,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$111,400	$2,900	$0	$114,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$20,300	$600	$0	$20,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$20,300	$600	$0	$20,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$149,200	$3,800	$0	$153,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$149,200	$3,800	$0	$153,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	$464,200	$12,000	$0	$476,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$43,500	$1,100	$0	$44,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$4,900	$200	$0	$5,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$87,000	$2,200	$0	$89,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$4,900	$200	$0	$5,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$3,700	$0	$148,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$91,900	$2,400	$0	$94,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$87,000	$2,200	$0	$89,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$111,900	$2,900	$0	$114,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$111,900	$2,900	$0	$114,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$74,600	$1,900	$0	$76,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$74,600	$1,900	$0	$76,500
TOTAL				**11**	**$1,414,300**	**$36,400**	**$0**	**$1,450,700**

MES

	ÍTEM	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO
OK	7	JESUS ALBERTO CORTES ALMENDRALES	AYUDANTE
	11	DEIVER ENRIQUE GRANADOS VALENCI	MAESTRO DE OBRA
	1	JHON CARLOS GUTIERREZ PINZON	AYUDANTE
OK	8	IRISON CERVANTES VIDEZ	AYUDANTE
OK	12	WILFRIDO MEJIA FRANCO	AYUDANTE
	5	JHAN CARLOS POLO ROJANO	AYUDANTE
VENE	2	MARIO JOSE DE CRUZ LEON	AYUDANTE
OK	3	JOSBEL MIGUEL ALVAREZ GALUE	AYUDANTE
OK	4	EDINSON DE JESUS ALVAREZ MARTINEZ	MAESTRO DE OBRA
VENE	6	LUIS ERNESTO PETIT ANDRADE	AYUDANTE
OK	10	SANDRO RAFAEL CARDENAS ROMERO	AYUDANTE
OK	9	BLADIMIR TOMAS VEGA ROJAS	AYUDANTE
OK	13	JOSE GREGORIO GUERRA ARAGON	AYUDANTE

PROFESIONALES

MARIA ALEJANDRA ARZUAGA	DIRECTORA
JOSE ALBERT ZABALETA	RESIDENTE
MARYORI	SISO

DE ABRIL

	DIAS LABORADO	CEDULA DE CIUDADANIA	SALARIO	DEDICACION	COSTO TOTAL MENSUAL
	20	1.045.727.535	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	1	1.129.496.605	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	1	1.002.996.158	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	20	1.003.334.942	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	20	77.014.004	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	1	1.235.338.167	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	1	5.848.645	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	20	5.738.868	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	20	1.102.827.240	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	1	5.466.598	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	20	19.708.177	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	20	84.009.153	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00
	20	1.065.813.199	$ 1.160.000,00	100%	$ 1.160.000,00

30
30
30

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52712290		MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MANZANA E CASA 7 B CONJUNTO ARGENTINA	VALLEDUPAR CESAR	3123129411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	208315725	9450923452	E	2023/05/23	2023/05/18	BANCOLOMBIA	0	$3,754,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing sln vst avp vsp cor sln ige lma vac avp ler irl avp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (11 Afiliados)							$12,760,011	$1,792,500			$12,760,011	$1,344,100			$12,760,011	$258,700			$12,760,011		$34,500		$12,760,011	$324,600		$3,754,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (11 Afiliados)							$12,760,011	$1,792,500			$12,760,011	$1,344,100			$12,760,011	$258,700			$12,760,011		$34,500		$12,760,011	$324,600		$3,754,400
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)							$12,760,011	$1,792,500			$12,760,011	$1,344,100			$12,760,011	$258,700			$12,760,011		$34,500		$12,760,011	$324,600		$3,754,400
1	CC	1102827240	ALVAREZ EDINSON		23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
2	CC	1102827240	ALVAREZ EDINSON	X	23030 1	20	$773,334	$92,900	EPS037	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
3	CC	5738868	ALVAREZ JOSBEL		23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
4	CC	5738868	ALVAREZ JOSBEL	X	23030 1	20	$773,334	$92,900	EPS041	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
5	CC	19708177	CARDENAS SANDRO		23100 1	10	$386,667	$61,900	EPS041	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
6	CC	19708177	CARDENAS SANDRO	X	23100 1	20	$773,334	$92,900	EPS041	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
7	CC	1003334942	CERVANTES IRINSON		23020 1	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
8	CC	1003334942	CERVANTES IRINSON	X	23020 1	20	$773,334	$92,900	EPS017	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
9	CC	1045727535	CORTES JESUS		23100 1	10	$386,667	$61,900	CCFC5 5	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
10	CC	1045727535	CORTES JESUS	X	23100 1	20	$773,334	$92,900	CCFC5 5	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
11	CC	1129496605	GRANADOS DEIVER	X	23030 1	1	$38,667	$4,700	EPS041	1	$38,667	$3,300	CCF15	1	$38,667	$0	14-23	1	$38,667	0.000%	$0	1	$38,667	$0	No	$8,000
12	CC	1129496605	GRANADOS DEIVER		23030 1	29	$1,121,334	$179,500	EPS041	29	$1,121,334	$140,200	CCF15	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	0.522%	$5,900	29	$1,121,334	$56,200	No	$426,700
13	CC	1065813199	GUERRA JOSE		23030 1	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
14	CC	1065813199	GUERRA JOSE	X	23030 1	20	$773,334	$92,900	EPS002	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
15	CC	1002996158	GUTIERREZ JHON	X	23030 1	1	$38,667	$4,700	ESSC24	1	$38,667	$3,300	CCF15	1	$38,667	$0	14-23	1	$38,667	0.000%	$0	1	$38,667	$0	No	$8,000
16	CC	1002996158	GUTIERREZ JHON		23030 1	29	$1,121,334	$179,500	ESSC24	29	$1,121,334	$140,200	CCF15	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	0.522%	$5,900	29	$1,121,334	$56,200	No	$426,700
17	CC	77014004	MEJIA WILFRIDO		23100 1	10	$386,667	$61,900	EPS017	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
18	CC	77014004	MEJIA WILFRIDO	X	23100 1	20	$773,334	$92,900	EPS017	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
19	CC	1235338167	POLO JHAN	X	23030 1	1	$38,667	$6,200	ESSC07	1	$38,667	$3,300	CCF15	1	$38,667	$0	14-23	1	$38,667	0.000%	$0	1	$38,667	$0	No	$9,500
20	CC	1235338167	POLO JHAN		23030 1	29	$1,121,334	$179,500	ESSC07	29	$1,121,334	$140,200	CCF15	29	$1,121,334	$44,900	14-23	29	$1,121,334	0.522%	$5,900	29	$1,121,334	$56,200	No	$426,700
21	CC	84009153	VEGA BLADIMIR		23020 1	10	$386,667	$61,900	EPS002	10	$386,667	$48,400	CCF15	10	$386,667	$15,500	14-23	10	$386,667	0.522%	$2,100	10	$386,667	$19,500	No	$147,400
22	CC	84009153	VEGA BLADIMIR	X	23020 1	20	$773,334	$92,900	EPS002	20	$773,334	$65,800	CCF15	20	$773,334	$0	14-23	20	$773,334	0.000%	$0	20	$773,334	$0	No	$158,700
Total Afiliados(11)							$12,760,011	$1,792,500			$12,760,011	$1,344,100			$12,760,011	$258,700			$12,760,011		$34,500		$12,760,011	$324,600		$3,754,400

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52712290		MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	MANZANA E CASA 7 B CONJUNTO ARGENTINA	VALLEDUPAR-CESAR	3123129411	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2083155725	9450923452	E	2023/05/23	2023/05/16	BANCOLOMBIA	0	$3,754,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,792,500	$0	$0	$1,792,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$464,400	$0	$0	$464,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,018,500	$0	$0	$1,018,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$309,600	$0	$0	$309,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$34,500	$0	$0	$34,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	11	$34,500	$0	$0	$34,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$258,700	$0	$0	$258,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$258,700	$0	$0	$258,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				11	$1,344,100	$0	$0	$1,344,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$114,200	$0	$0	$114,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$143,500	$0	$0	$143,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$228,400	$0	$0	$228,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$143,500	$0	$0	$143,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$114,200	$0	$0	$114,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$371,900	$0	$0	$371,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$228,400	$0	$0	$228,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$194,700	$0	$0	$194,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$194,700	$0	$0	$194,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$129,900	$0	$0	$129,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$129,900	$0	$0	$129,900
TOTAL				11	$3,754,400	$0	$0	$3,754,400

2023/05/15 08:15 PM

CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

COPIA DE CERTIFICACION BANCARIA

consorciocerramientojc2022@gmail.com

Certificado
Bancario

Valledupar, 02 de Marzo de 2023

Señores
A quien pueda interesar.
Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022** identificado (a) con **NIT N° 901676760** a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No producto:	ESTADO	FECHA APERTURA
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	19700005703	ACTIVA	2023/03/02

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Para verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los [illegible] - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local (57-5) 361 85 89 Cali - Local (57-2) 554 05 05 - Resto del país 01800 09 12345 Sucursales Telefónicas en el exterior España (34) 900 995 717 Estados Unidos (1) 1 866 329 97 14

Bancolombia

Powered by CamScanner

CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

COPIA DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO

consorciocerramientojc2022@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913103807

(415)7707212489984(8020) 000001491310380 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 7 6 0	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 2 0	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 1 0 2 0	
81. Hasta	2 0 2 4 0 1 2 0	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 1 3 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913103807

(415)7707212489984(8020) 000001491310380 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 7 6 0	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 1 0 2 8 1 0 0 7 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VILLACOB	RIOS	GREY	JUDITH

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 0 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 9 3 0 0 7 9 1		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	SALAZAR	JOSE	IVAN

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio [illegible]

100. Tipo de documento	101. Número de identificacion	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO FIEL

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14913103807

(415)7707212489984(8020) 000001491310380 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 7 6 0	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 3 0 0 7 9 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GOMEZ	SALAZAR	JOSE	IVAN

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	7 0	2 0 2 2 1 0 2 0	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 3 5 0 3 8 2	4	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: CONSTRUCCION DISEÑOS E INTERVENTORIAS INGENIEROS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 0	2 0 2 2 1 0 2 0	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4 Número de formulario 14913103807

(415)7702124899984(8020) 000001491310380 7

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 6 7 6 0	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal
CL 36 A 5 F 103 MZ E CA 7 B

42. Correo electrónico consorciocerramientojc2022@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 3 7 6 9 8 4 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 2 1 0 2 0							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	5	5																			

07- Retención en la fuente a título de renta
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros																						Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																								57. Modo			
																								58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 05 - 09 / 10 : 36: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

984. Nombre VILLACOB RIOS GREY JUDITH
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-05-2023 10:37:04AM

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

09 de junio del 2023, Valledupar – Cesar

CO- 001-SOP DE 2023- 017

Señores
Secretaria de Obras
Alcaldía Municipal De Valledupar
Valledupar-Cesar

REFERENCIA: RENUNCIA DE ANTICIPO del Contrato de Obra No 001-SOP DE 2023, cuyo objeto es: *"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR"*

Estimados señores:

GREY JUDITH VILLACOB RIOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.102.810.077 de Sincelejo, actuando como representante legal del CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022, por medio de la presente me permito hacer entrega del Acta Parcial No. 21 del contrato de obra No 001-SOP DE 2023, cuyo objeto es: "CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR", acompañada por cada uno de los anexos requeridos para estos tipos de trámites.

No siendo otro el motivo y agradeciendo su comprensión.

Atentamente;

GREY JUDITH VILLACOB RIOS
C.C. 1.102.810.077 de Sincelejo
R/L CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764048738281

(415)7707212489984(8020) 001876404873828 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 7 6 0	9				

11. Razón social
CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Valledupar — Cód. 2 4

24. Dirección
CL 36 A 5 F 103 MZ E CA 7 B

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Cesar	Valledupar

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2023-05-09 / 08:54:30 AM
Fecha Acuse de Recibo
- Firmado -

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres VILLACOB RIOS GREY JUDITH
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1102810077 1004. DV 3
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

997. Fecha formalización 2 0 2 3-0 5-0 9/0 8:5 4:3 0

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764048738281

(415)7707212489984(8020) 001876404873828 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 7 6 0	9				

11. Razón social: CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 CL 36 A 5 F 103 MZ E CA 7 B	FACTURA ELECTRÒNICA DE VENTA	4	FE	1	50	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO



CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

COPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

consorciocerramientojc2022@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO 1.102.810.077

VILLACOB RIOS
APELLIDOS

GREY JUDITH
NOMBRES

Grey Villacob Rios
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1987
SINCELEJO
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

09-SEP-2005 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2800100-62143521-F-1102810077-20051212 0220805346A 02 185654410

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

INFORME MENSUAL No. 01 Y 02

consorciocerramientojc2022@gmail.com

INFORME MENSUAL N°1

PERIODO: DESDE EL 02/03/2023 HASTA EL 01/04/2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.

ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE OBRA No. 001-SOP DE 2023

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

NIT. 901.678.760-9

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CONTENIDO

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 5

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGALES 6

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6

3.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS 7

3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 7

3.3.1. MANO DE OBRA CALIFICADA 7

3.3.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8

3.4 NECESIDAD DE EMPLEO A FUTURO 8

- MANO DE OBRA CALIFICADA 8
- MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8

3.5. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS, Y EQUIPOS EN LA OBRA 8

4. ACTAS DE INICIO, SUSPENCIÓN, REINICIO Y COMITÉ DE OBRAS 9

4.1. COMITES DE OBRA Y REUNIONES 9

4.2. CORRESPONDENCIA 9

4.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 9

4.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 10

5. ASPECTO FINANCERO 10

5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 10

5.2. AVANCE DE OBRA – REGISTRO FOTOGRAFICO ..... **¡Error! Marcador no definido.**

CONCLUSIONES 11

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Valledupar a través de la secretaria general inicia el proceso de contratación bajo la modalidad de LICITACION DE OBRA PUBLICA, resuelve adjudicar el contrato que tiene por objeto **"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR."**. Al contratista CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 con NIT: 901.676.760-9, representado legalmente por GREYS JUDITH VILLACOB RIOS identificado con 1.102.810.077 de Sincelejo, **por valor de MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 1.067.526.429,61) INCLUIDO AIU**

El presente documento corresponde al Informe No.01 de actividades correspondiente al periodo del 02/03/2023 hasta el 01/04/2023; este informe contiene toda la información necesaria para que la interventoria y el supervisor del contrato pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones en lo relativo a la ejecución física, siendo esto una parte de las obligaciones contractuales del contratista CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022, adquiridas bajo el contrato de OBRA No. 001-SOP DE 2023 Con el Municipio de Valledupar.

Este informe mantiene un esquema de organización de acuerdo al orden en que se tratan los temas durante los comités de seguimiento, se presenta el avance de obra, aspectos técnicos, de calidad de obra y seguridad Industrial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


Este proyecto denominado CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR, "Segregación recreativa y deportiva para acceder al disfrute de esos derechos" Los planteamientos de la problemática en cuanto a la oferta recreativa y deportiva se establecen de acuerdo a varias dimensiones, entre las que se encuentran baja participación de la población del municipio en la oferta deportiva y de actividad física, la falta de cultura recreo deportiva que conlleve al uso adecuado del tiempo libre por parte de los habitantes de municipio, actividades culturales, recreo-deportivas de tipo masivo o metropolitano a las cuales la comunidad pueda acceder; lo que redunda en la necesidad de generar y adecuar espacios deportivos y de actividad física que permitan la participación de diferentes sectores poblacionales contribuyendo así a combatir la segregación, condiciones de desigualdad y discriminación. Los escenarios deportivos han sido blanco en reiteradas ocasiones de invasión por parte de jóvenes desadaptados, expendedores de drogas y atracadores, que ingresan a los predios y amenazan con la seguridad y el bienestar de los deportistas y visitantes ya que los escenarios deportivos no cuenta con un cerramiento adecuado para este tipo de espacios convirtiéndose en blanco de delincuentes.

La justificación del este proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR", está dada en mejorar las condiciones físicas de la infraestructura deportiva en el Municipio de Valledupar, especialmente lo relacionado con cerramiento perimetral e interno, lo que genera unos ambientes de inseguridad para todos los deportistas y visitantes

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollara El Municipio de Valledupar, el municipio de Valledupar se encuentra ubicado 10º 29' de latitud Norte y 73º 15' de longitud Oeste. Limitada al Norte con los departamentos de Magdalena y la Guajira; al Sur con los municipios de San Diego, La Paz y el Paso; al Este con la Guajira y los municipios de San Diego y la Paz y por el Oeste con el Magdalena y los municipios de Bosconia y el Copey.

Ilustración 1. *Localización Valledupar (Cesar).* ***Fuente.*** *Google Maps*

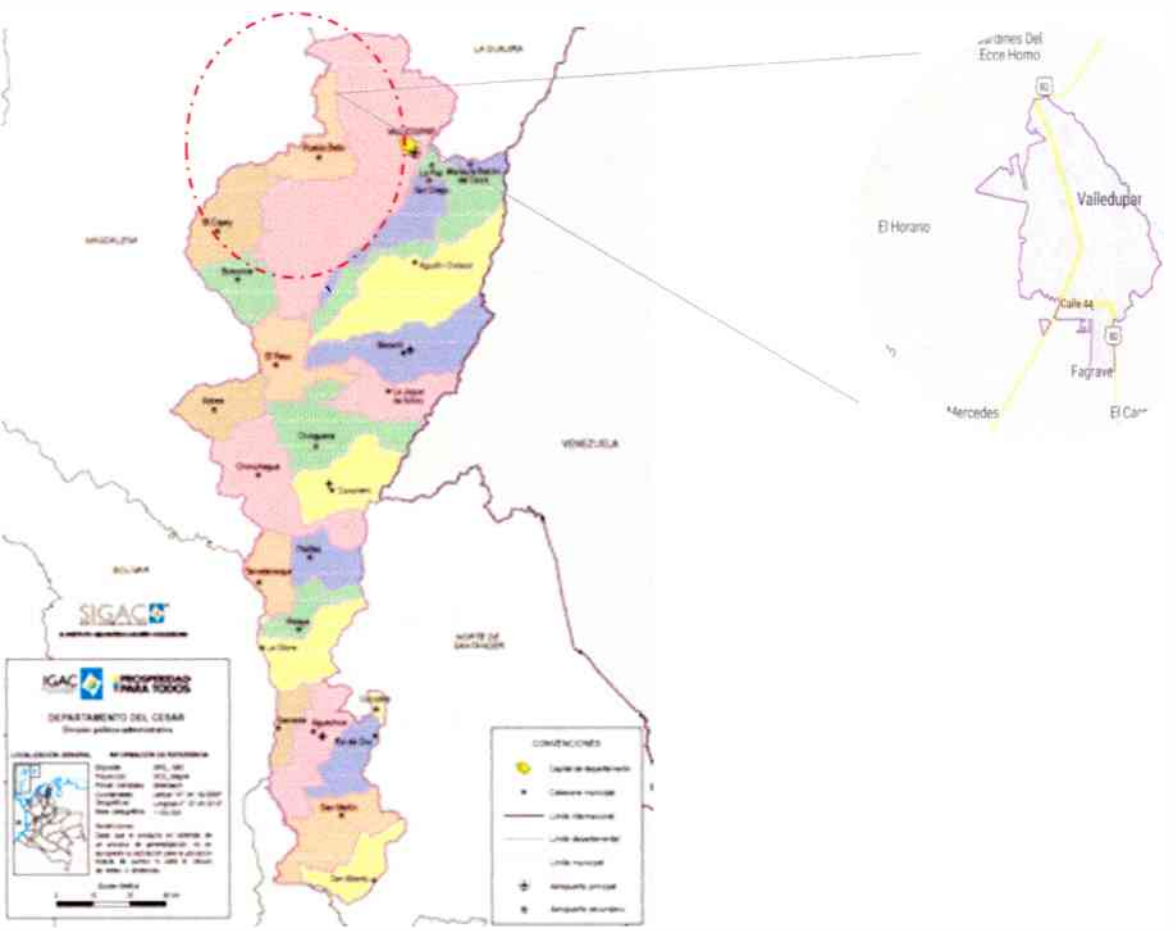

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto en mención, cuyo objeto es el **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR"**, abarcara los escenarios deportivos:

Ubicación especifica del proyecto

Pista de BMX



Voleibol Playa



3. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGALES

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. *Información General del contrato.* ***Fuente.*** *Contrato de Obra No.* ***001-SOP DE 2023***

CONTRATO DE OBRA	001-SOP DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
NIT.	901.676.760-9
REPRESENTANTE LEGAL	GREY JUDITH VILLACOB RIOS
C.C.	1.102.810.077
VALOR	MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 61/100 ($ 1 067.526.429,61) M/L, AIU INCLUIDO
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
NIT	901.680.408-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VARON MEDINA
PÒLIZAS	Cumplimiento
	Buen Manejo de Anticipo
	Salario y Prestaciones. Sociales
	Estabilidad y calidad de la obra
	Responsabilidad Civil Extracontractual
DURACIÓN INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	02 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	01 DE JUNIO DE 2023
SUSPENSION N°1	N/A
REINICIO N°1	N/A
ADICION EN TIEMPO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
SUPERVISOR	EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERNERA
APOYO A LA SUPERVISION	EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ (Profesional Universitario)
APOYO A LA SUPERVISION	GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO (Profesional Universitario)

3.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

Las correspondientes pólizas fueron aprobadas mediante resolución

Tabla 2. *Estado de pólizas.* ***Fuente.*** *Documento Pólizas.*

CONTROL DE PÓLIZAS			COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
ÍTEM	AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No:	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
1	Cumplimiento del contrato	$213.505.286,00	21-44-101406164	2/03/2023	2/12/2023
2	Buen Manejo de Anticipo	$320.257.929,00	21-44-101406164	2/03/2023	2/12/2023
3	Salario, Prestaciones Sociales	$53.376.321,5	21-44-101406164	2/03/2023	2/06/2026
4	Estabilidad y calidad de la obra	$320.257.929	21-44-101406164	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y - 0 DIA	
5	Responsabilidad Civil		21-44-101406164	2/03/2023	

3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO

EL CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 cuenta con personal administrativo idóneo requerido de acuerdo a los compromisos contractuales.

3.3.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

Durante este periodo del 02/03/2023 hasta el 01/04/2023 fue requerido el personal encargado de realizar los estudios y diseños para llevar a cabo cada una de las actividades programadas.

Tabla 3. *Personal administrativo social.*

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	JOSE ALVERT ZABALETA	INGENIERO CIVIL
TRABAJADOR SOCIAL	MARYORI RUBIO	SISO

3.3.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Durante este periodo para llevar a cabo las actividades programadas fue necesario personal de mano de obra no calificada: Ayudantes de obra para realizar excavaciones, cimentación, y estructura. Oficial y ayudantes para fundida de cimentacion, zapatas, pedestal, vigas, operadores de equipos y operadores de volquetas.

3.4 NECESIDAD DE EMPLEO A FUTURO

Para el periodo que comprende desde 02/03/2023 hasta terminación del contrato, se necesitara el siguiente personal para desarrollar las diferentes actividades programadas:

- Preliminares
- Cimentaciones
- Estructuras
- Carpintería Metálica

- **MANO DE OBRA CALIFICADA**

Grupo de profesionales para la ejecución y control de la obra, director de obra, Residentes de obra, Topógrafos y maestros de obra.

- **MANO DE OBRA NO CALIFICADA**

Durante este periodo para llevar a cabo las actividades programadas fue necesario personal de mano de obra no calificada: Ayudantes de obra para realizar actividades de cortes, demoliciones, desmontes, y retiro de materiales sobrantes. Oficial y ayudantes para fundida de zapatas, pedestales, vigas y cerramiento en mallas eslabonadas, operadores de equipos y operadores de volquetas.

3.5. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS, Y EQUIPOS EN LA OBRA.

Se hará uso de los siguientes equipos y maquinaria para realizar las actividades a futuro en la ejecución del proyecto:

- Dos (2) Volquetas.
- Rana compactadora
- Pajarita
- Concretadoras
- Vibrador de concreto
- Herramienta menor: Tronzadora, almádana, palas, picos, barra de punta, palas, carretillas, etc.

4. ACTAS DE INICIO, SUSPENCIÓN, REINICIO Y COMITÉ DE OBRAS

El acta de inicio del presente contrato de obra fue suscrita el 02 de marzo de 2023.

4.1. COMITES DE OBRA Y REUNIONES

Se ha realizado comité en las instalaciones de la secretaria de obras municipal entre contratista y supervisor para revisar y firmar el acta de inicio correspondiente al presente contrato de obra, así mismo con interventoria para revisión general del presupuesto, definir temas de diseños, reajustes de cronogramas y programación de visitas a las diferentes instituciones.
Adicionalmente, se realizó comité técnico para definir localización, y puntos críticos como lo son en la zona Este (Terraplen) y zona Norte (Mercabasto), una vez superado esto se continuo con la topografía

4.2. CORRESPONDENCIA

4.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**NUMERO DE OFICIO**	**ASUNTO**
6/02/2023	CO-013-SOP DE 2022- 001	Solicitud de diseños
1/03/2023	CO-013-SOP DE 2022- 002	Entrega de pago de impuesto departamental
2/03/2023	CO-013-SOP DE 2022- 003	Entrega de hojas de vida de profesionales
2/03/2023	CO-013-SOP DE 2022- 004	Entrega de Apus, desglose de AIU y Programación
9/03/2023	CO-013-SOP DE 2022- 005	Entrega de plan de inversión de Anticipo
10/03/2023	CO-013-SOP DE 2022- 006	Entrega de protocolo de Bioseguridad
13/03/2023	CO-013-SOP DE 2022- 007	Convocatoria a comité técnico
21/03/2023	CO-013-SOP DE 2022- 009	Respuesta a Oficio COM 006 Interventoria

4.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**NUMERO DE OFICIO**	**ASUNTO**
16/03/2023	COM-004	Respuesta a comunicado CO- 001-SOP DE 2023- 003- Aprobacion de Hojas de Vida
16/03/2023	COM-005	Respuesta comunicado CO-001-SOP DE 2023- 006 de asunto-entrega de Protocolo de Bioseguridad.
21/03/2023	COM-006	Solicitud de APU, PLAN DE CALIDAD y CRONOGRAMA DE OBRA
23/03/2023	COM-007	Convocatoria Comité de seguimiento No. 001
28/03/2023	COM-008	Verificación de APU

5. ASPECTO FINANCERO

5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Durante el periodo que comprende desde el 02/03/2023 hasta el 01/04/2023, se han realizado las siguientes actividades:

5.1.1. Localización y replanteo: se realizó levantamiento topográfico en las canchas de Vóleibol y Pista BMX, se tomaron niveles y se realiza seguimiento continuo para la alineación de la tubera para la póstuma instalación de malla eslabonada

5.1.2. Excavaciones: se realizaron excavaciones en los siguientes escenarios:
PISTA BMX: se realizó excavación en la zona oeste – Avenida, de zapatas, pedestales y vigas
CANCHA VOLEIBOL: se realizó excavación en CANCHA TIPO 1 el cual presenta una longitud total de 96 ml para zapatas y vigas.

5.1.3. Zapatas: se fundió zapatas en concreto de 0,80x0,80x0,25 cm en los siguientes escenarios deportivos
CANCHA VOLEIBOL: En la CANCHA TIPO 1 el cual presenta un total de 33 unidades, en cada una de las zapatas se dejó los tubos instalados a una profundidad de 10cm con forme a diseños para la póstuma instalación de la malla eslabonada

5.1.4. Pedestales: se fundió pedestales en concreto de 0,25x0,25x0,35 cm en los siguientes escenarios deportivos
CANCHA VOLEIBOL: según diseño en esta cancha no lleva pedestales

5.1.5. Vigas: se fundio vigas en concreto de 0.30x0.40cm en los siguientes escenarios deportivos
CANCHA VOLEIBOL: se formaleteo, y se fundió las vigas de cimentación para la CANCHA TIPO 1 para un total de 96 ml de longitud

5.1.6. Solado: se fundió solados con un espesor de 0,05cm en los siguientes escenarios deportivos
PISTA BMX: Se fundió solado para zapatas con una dimensión correspondiente a 0,8x0,8cm
CANCHA VOLEIBOL: Se fundió solado para zapatas con una dimensión correspondiente a 0,8x0,8cm para un total 33 unidades de zapatas, además en el área de las vigas con un ancho de 0,3cm en toda la longitud correspondiente a 96 ml en la CANCHA TIPO 1

5.1.7. Acero: se figuro y armó acero para las actividades correspondientes a zapatas, pedestales y vigas tanto para la PISTA DE BMX y CANCHA DE VOLEIBOL

5.2 CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas durante este periodo se realizaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades en conjunto con la interventoria y la entidad contratante, el cual se dio inicio una vez superados todos los inconvenientes encontrados durante las visitas técnicas.

Realizando intervención de los escenarios deportivos:

- PISTA BMX

-CANCHA DE VOLEIBALL PLAYA

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
C.C. N° 1.102.810.077 de Sincelejo
Representante Legal
CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
Contratista

5.3. AVANCE DE OBRA – REGISTRO FOTOGRAFICO

PISTA BMX



Foto N° 1: *Cerramiento provisional en tela verde*



Foto N° 2: *Levantamiento Topografico*



Foto N° 3: *Excavación Manual*



Foto N° 4: *Armado y Figurado de Acero*

CANCHA VOLEIBALL PLAYA



Foto N° 5: *Cerramiento provisional en tela verde*



Foto N° 6: *Excavación Manual*



Foto N° 7: *Zapatas en Concreto.*



Foto N° 8: *Vigas en Concreto.*



Foto N° 9. Armado y Figurado de Acero

INFORME MENSUAL N°2

PERIODO: DESDE EL 02/04/2023 HASTA EL 01/05/2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR.

ALCALDÍA
DE VALLEDUPAR

CONTRATO DE OBRA No. 001-SOP DE 2023

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

NIT. 901.676.760-9

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CONTENIDO

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 3

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 4

2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO 5

3. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGALES 6

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 6

3.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS 7

3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO 7

3.3.1. MANO DE OBRA CALIFICADA 8

3.3.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8

3.4 NECESIDAD DE EMPLEO A FUTURO 8

- MANO DE OBRA CALIFICADA 8
- MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8

3.5. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS, Y EQUIPOS EN LA OBRA 9

4. ACTAS DE INICIO, SUSPENCIÓN, REINICIO Y COMITÉ DE OBRAS 9

4.1. COMITES DE OBRA Y REUNIONES 9

4.2. CORRESPONDENCIA 9

4.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 9

4.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 10

5. ASPECTO FINANCERO 10

5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 10

5.2 CONCLUSIONES 11

5.3 AVANCE DE OBRA – REGISTRO FOTOGRAFICO 12

1. INTRODUCCIÓN

El municipio de Valledupar a través de la secretaria general inicia el proceso de contratación bajo la modalidad de LICITACION DE OBRA PUBLICA, resuelve adjudicar el contrato que tiene por objeto **"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR."**. Al contratista CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 con NIT: 901.676.760-9, representado legalmente por GREYS JUDITH VILLACOB RIOS identificado con 1.102.810.077 de Sincelejo, **por valor de MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/L ($ 1.067.526.429,61) INCLUIDO AIU**

El presente documento corresponde al Informe No.01 de actividades correspondiente al periodo del 02/03/2023 hasta el 01/04/2023: este informe contiene toda la información necesaria para que la interventoría y el supervisor del contrato pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones en lo relativo a la ejecución física, siendo esto una parte de las obligaciones contractuales del contratista CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022, adquiridas bajo el contrato de OBRA No. 001-SOP DE 2023 Con el Municipio de Valledupar.

Este informe mantiene un esquema de organización de acuerdo al orden en que se tratan los temas durante los comités de seguimiento, se presenta el avance de obra, aspectos técnicos, de calidad de obra y seguridad Industrial.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


Este proyecto denominado. CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR, "Segregación recreativa y deportiva para acceder al disfrute de esos derechos" Los planteamientos de la problemática en cuanto a la oferta recreativa y deportiva se establecen de acuerdo a varias dimensiones, entre las que se encuentran baja participación de la población del municipio en la oferta deportiva y de actividad física, la falta de cultura recreo deportiva que conlleve al uso adecuado del tiempo libre por parte de los habitantes de municipio, actividades culturales, recreo-deportivas de tipo masivo o metropolitano a las cuales la comunidad pueda acceder; lo que redunda en la necesidad de generar y adecuar espacios deportivos y de actividad física que permitan la participación de diferentes sectores poblacionales contribuyendo así a combatir la segregación, condiciones de desigualdad y discriminación. Los escenarios deportivos han sido blancos en reiteradas ocasiones de invasión por parte de jóvenes desadaptados, expendedores de drogas y atracadores, que ingresan a los predios y amenazan con la seguridad y el bienestar de los deportistas y visitantes ya que los escenarios deportivos no cuentan con un cerramiento adecuado para este tipo de espacios convirtiéndose en blanco de delincuentes.

La justificación del este proyecto denominado "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR", está dada en mejorar las condiciones físicas de la infraestructura deportiva en el Municipio de Valledupar, especialmente lo relacionado con cerramiento perimetral e interno, lo que genera unos ambientes de inseguridad para todos los deportistas y visitantes

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará El Municipio de Valledupar, el municipio de Valledupar se encuentra ubicado 10º 29' de latitud Norte y 73º 15' de longitud Oeste. Limitada al Norte con los departamentos de Magdalena y la Guajira; al Sur con los municipios de San Diego, La Paz y el Paso; al Este con la Guajira y los municipios de San Diego y la Paz y por el Oeste con el Magdalena y los municipios de Bosconia y el Copey.

Ilustración 1. *Localización Valledupar (Cesar).* ***Fuente.*** *Google Maps.*

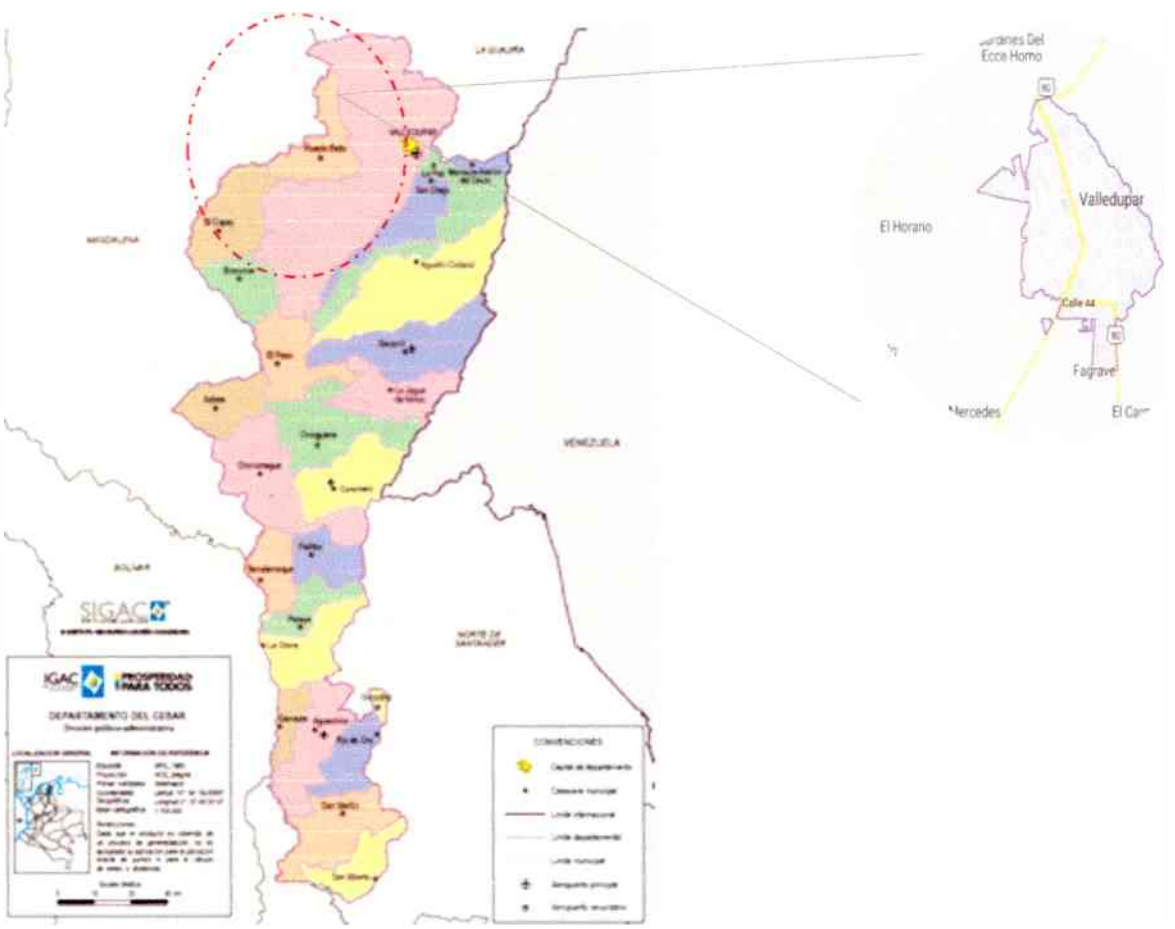

2.2. UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto en mención, cuyo objeto es el **"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR"**, abarcara los escenarios deportivos:

Ubicación especifica del proyecto

Pista de BMX



Voleibol Playa



3. ASPECTO ADMINISTRATIVO Y LEGALES

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. Información General del contrato. ***Fuente.*** *Contrato de Obra No.* ***001-SOP DE 2023***

CONTRATO DE OBRA	001-SOP DE 2023
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA	CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
NIT.	901.676.760-9
REPRESENTANTE LEGAL	GREY JUDITH VILLACOB RIOS
C.C.	1.102.810.077
VALOR	MIL SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 61/100 ($ 1 067.526.429,61) M/L, AIU INCLUIDO
INTERVENTOR	UNIÓN TEMPORAL INTERCERRAMIENTOS
NIT	901.680.408-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS VARON MEDINA
PÒLIZAS	Cumplimiento

	Buen Manejo de Anticipo
	Salario y Prestaciones. Sociales
	Estabilidad y calidad de la obra
	Responsabilidad Civil Extracontractual
DURACIÓN INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIO	02 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	01 DE JUNIO DE 2023
SUSPENSION N°1	N/A
REINICIO N°1	N/A
ADICION EN TIEMPO	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION	N/A
SUPERVISOR	EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERNERA
APOYO A LA SUPERVISION	EDUARDO ANDRES MONSALVO RODRIGUEZ (Profesional Universitario)
APOYO A LA SUPERVISION	GERIN FERNANDO PICAZA MONTERO (Profesional Universitario)

3.2. ESTADO DE LAS PÓLIZAS

Las correspondientes pólizas fueron aprobadas mediante resolución

Tabla 2. *Estado de pólizas.* ***Fuente.*** *Documento Pólizas.*

CONTROL DE PÓLIZAS			**COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
ÍTEM	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No:**	**VIGENCIA**	
				DESDE	**HASTA**
1	Cumplimiento del contrato	$213.505.286,00	21-44-101406164	2/03/2023	2/12/2023
2	Buen Manejo de Anticipo	$320.257.929,00	21-44-101406164	2/03/2023	2/12/2023
3	Salario, Prestaciones Sociales	$53.376.321,5	21-44-101406164	2/03/2023	2/06/2026
4	Estabilidad y calidad de la obra	$320.257.929	21-44-101406164	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y - 0 DIA	
5	Responsabilidad Civil		21-44-101406164	2/03/2023	

3.3. PERSONAL ADMINISTRATIVO

EL CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022 cuenta con personal administrativo idoneo requerido de acuerdo a los compromisos contractuales.

3.3.1. MANO DE OBRA CALIFICADA

Durante este periodo del 02/03/2023 hasta el 01/04/2023 fue requerido el personal encargado de realizar los estudios y diseños para llevar a cabo cada una de las actividades programadas.

Tabla 3. *Personal administrativo social.*

CARGO	NOMBRE	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA	INGENIERO CIVIL
RESIDENTE DE OBRA	JOSE ALVERT ZABALETA	INGENIERO CIVIL
TRABAJADOR SOCIAL	MARYORI RUBIO	SISO

3.3.2. MANO DE OBRA NO CALIFICADA

Durante este periodo para llevar a cabo las actividades programadas fue necesario personal de mano de obra no calificada: Ayudantes de obra para realizar excavaciones. cimentación. y estructura. Oficial y ayudantes para fundida de cimentación, zapatas, pedestal, vigas, operadores de equipos y operadores de volquetas.

3.4 NECESIDAD DE EMPLEO A FUTURO

Para el periodo que comprende desde 02/03/2023 hasta terminación del contrato, se necesitara el siguiente personal para desarrollar las diferentes actividades programadas:

- Preliminares
- Cimentaciones
- Estructuras
- Carpintería Metálica

- **MANO DE OBRA CALIFICADA**

Grupo de profesionales para la ejecución y control de la obra, director de obra, Residentes de obra, Topógrafos y maestros de obra.

- **MANO DE OBRA NO CALIFICADA**

Durante este periodo para llevar a cabo las actividades programadas fue necesario personal de mano de obra no calificada: Ayudantes de obra para realizar actividades de cortes, demoliciones, desmontes, y retiro de materiales sobrantes. Oficial y ayudantes para fundida de zapatas. pedestales. vigas y cerramiento en mallas eslabonadas, operadores de equipos y operadores de volquetas.

3.5. MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS, Y EQUIPOS EN LA OBRA.

Se hará uso de los siguientes equipos y maquinaria para realizar las actividades a futuro en la ejecución del proyecto:

- Dos (2) Volquetas.
- Rana compactadora
- Pajarita
- Concretadoras
- Vibrador de concreto
- Herramienta menor: Tronzadora, almádana, palas, picos, barra de punta, palas, carretillas, etc.

4. ACTAS DE INICIO, SUSPENCIÓN, REINICIO Y COMITÉ DE OBRAS

El acta de inicio del presente contrato de obra fue suscrita el 02 de marzo de 2023.

4.1. COMITES DE OBRA Y REUNIONES

Se ha realizado comité en las instalaciones de la secretaria de obras municipal entre contratista y supervisor para revisar y firmar el acta de inicio correspondiente al presente contrato de obra, asi mismo con interventoria para revisión general del presupuesto, definir temas de diseños, reajustes de cronogramas y programación de visitas a las diferentes instituciones.
Adicionalmente, se realizó comité técnico para definir localización, y puntos criticos como lo son en la zona Este (Terraplen) y zona Norte (Mercabasto), una vez superado esto se continuo con la topografía

4.2. CORRESPONDENCIA

4.2.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

CORRESPONDENCIA ENVIADA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**NUMERO DE OFICIO**	**ASUNTO**
10/04/2023	CO-013-SOP DE 2022- 010	Entrega de Garantía conforme a acta de inicio
4/05/2023	CO-013-SOP DE 2022- 011	Requerimiento
10/05/2023	CO-013-SOP DE 2022- 012	Entrega de informe de resistencia a la Comprensión de Cilindros de Concreto

4.2.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA		
FECHA DE EXPEDICIÓN	**NUMERO DE OFICIO**	**ASUNTO**
3/04/2023	COM-011	Aprobación APU
12/04/2023	COM-012	Solicitud de Estudios y Diseños Nuevos del Cerramiento.
3/05/2023	COM-014	Solicitud de Acta Modificatoria

5. ASPECTO FINANCERO

5.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

Durante el periodo que comprende desde el 02/04/2023 hasta el 01/05/2023, se han realizado las siguientes actividades:

5.1.1. Localización y replanteo: se realizó levantamiento topográfico en las canchas de Voleibol y Pista BMX, se tomaron niveles y se realiza seguimiento continuo para la alineación de la tubera para la póstuma instalación de malla eslabonada

5.1.2. Excavaciones: se realizaron excavaciones en los siguientes escenarios:
PISTA BMX: se realizó excavación en la zona norte - Villadariana, de zapatas, pedestales y vigas
CANCHA VOLEIBOL: se realizó excavación en la segunda cancha CANCHA TIPO 1 el cual presenta una longitud total de 96 ml para zapatas y vigas.

5.1.3. Zapatas: se fundió zapatas en concreto de 0,80x0,80x0,25 cm en los siguientes escenarios deportivos
PISTA BMX: se formaleteo y fundió zapatas a lo largo de la zona oeste – Avenida y en la zona Norte - Villadariana
CANCHA VOLEIBOL: En la CANCHA TIPO 2 el cual presenta un total de 33 unidades, en cada una de las zapatas se dejó los tubos instalados a una profundidad de 10cm con forme a diseños para la póstuma instalación de la malla eslabonada

5.1.4. Pedestales: se fundió pedestales en concreto de 0,25x0,25x0,35 cm en los siguientes escenarios deportivos
PISTA BMX: se formaleteo y fundió pedestales a lo largo de la zona oeste – Avenida y en la zona Norte – Villadariana, según diseño el tubo galvanizado se deja incrustado a una profundidad de 10 cm, mediante el cual se deja nivelado y alineado, para el póstumo instalación de la malla eslabonada
CANCHA VOLEIBOL: según diseño en esta cancha no lleva pedestales

5.1.5. Vigas: se fundió vigas en concreto de 0,30x0,40cm en los siguientes escenarios deportivos
PISTA BMX: se formaleteo y fundió vigas a lo largo de la zona oeste – Avenida dejando 20 cm enterrado y 20cm a la vista según diseños y en la zona Norte – Villadariana 40cm sobre el terreno natural

CANCHA VOLEIBOL: se formaleteo, y se fundió las vigas de cimentación a una profundidad de 40cm para la segunda CANCHA TIPO 1 para un total de 96 ml

5.1.6. Solado: se fundió solados con un espesor de 0,05cm en los siguientes escenarios deportivos
PISTA BMX: Se fundió solado para zapatas con una dimensión correspondiente a 0,8x0,8cm en la zona Norte - Villadariana
CANCHA VOLEIBOL: Se fundió solado para zapatas con una dimensión correspondiente a 0,8x0,8cm para un total 33 unidades de zapatas, además en el área de las vigas con un ancho de 0,3cm en toda la longitud correspondiente a 96 ml en la segunda CANCHA TIPO 1

5.1.7. Acero: se figuro y armó acero para las actividades correspondientes a zapatas, pedestales y vigas tanto para la PISTA DE BMX y CANCHA DE VOLEIBOL
5.1.8. Se arman módulos de las mallas eslabonadas para la postuma instalación
5.1.9. Se realizan tomas de muestras a los concretos tanto en la PISTA DE BMX como en la CANCHA DE VOLEIBOL

5.2 CONCLUSIONES

Las actividades desarrolladas durante este periodo se realizaron de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades en conjunto con la interventoría y la entidad contratante, pese a las festividades, dias santos y actividades presentadas tales como torneos el rendimiento y la ejecución de las actividades se evidencio un avance significativo.

Realizando intervención de los escenarios deportivos:

- PISTA BMX

-CANCHA DE VOLEIBALL PLAYA

GREYS JUDITH VILLACOB RIOS
C.C. N° 1.102.810.077 de Sincelejo
Representante Legal
CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022
Contratista

5.3. AVANCE DE OBRA – REGISTRO FOTOGRAFICO

PISTA BMX







Foto Nº 1: *Excavación Manual*



Foto Nº 2: *Cimentación e instalación de tubos galvanizados*



Foto N° 4: *Armado y Figurado de Acero*



Foto N° 5: *Tomas de Muestras de Concreto*

CANCHA VOLEIBALL PLAYA



Foto N° 6: *Excavación Manual*



Foto N° 7: *Cimentación e instalación de tubos Galvanizados*



Foto N° 8: Armado y Figurado de Acero



Foto N° 9: *Tomas de Muestras de Concreto*

CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

INFORME DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

consorciocerramientojc2022@gmail.com

SOAL INGENIERIA S.A.S NIT: 901.039.284-2 Calle 3 No. 8-07 Int 2 Valledupar - Cesar Tel: +57 (5) 5839215 Cel: +57 301 3211231 gerencia123@soalingenieria.com	INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMAS DE ENSAYO I.N.V. E-410 EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673	VERSIÓN 01 VIGENCIA: 31 DIC 2023


PAG 1 DE 1

CONSECUTIVO No. CL_M200319423

NOMBRE DEL CLIENTE:	*CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022*	LOCALIZACIÓN ARENA	*RIO CESAR*	
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	*CALLE 36A #5F - 103 - Mz E Casa 7 Valledupar - cesar*	LOCALIZACIÓN GRAVA	*CANTERA GEICAR (TRAMACUA)*	
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	*CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO DE LA PISTA DE BMX EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR*	TIPO DE CEMENTO	*CEMEX USO GENERAL*	
				DISEÑO
RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA	*CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022*	ADITIVO UTILIZADO	NO	*3000 PSI*

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	ZAPATAS Y VIGAS DE CERRAMIENTO	19-abr-23	26-abr-23	7	PISTA BMX	28.27	293.5	2334.1	16.1	C	3541.9	24.4
2	ZAPATAS Y VIGAS DE CERRAMIENTO	19-abr-23	03-may-23	14	PISTA BMX	28.27	385.4	3064.9	21.1	C	3555.3	24.5
3	ZAPATAS Y VIGAS DE CERRAMIENTO	19-abr-23	17-may-23	28	PISTA BMX	28.27						

TIPOS DE ROTURA



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Informes de Laboratorio sin firmas originales del Director Técnico y sello del Laboratorio("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen Validez.
2. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos
3. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite
4. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados
5. El laboratorio no da fe que el (los) especimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

OBSERVACIONES

Elaborado por:	
Nombre:	Imer Lobo
Cargo:	Laboratorista
Aprobado por:	
Nombre:	Ing. Milciades Soto Balan
Cargo:	Gerente

SOAL

FIN DEL INFORME

SOAL INGENIERIA S.A.S NIT: 901.039.284-2 Calle 3 No. 8-07 Int 2 Valledupar - Cesar Tel: +57 (5) 5839215 Cel: +57 301 3211231 gerencia123@soalingenieria.com	INFORME DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NORMAS DE ENSAYO I.N.V. E-410 EQUIVALENTES : ASTM C 39, AASHTO T 22, NTC 673	VERSIÓN 01 VIGENCIA: 31 DIC 2023


CONSECUTIVO No. CL_M20030822

NOMBRE DEL CLIENTE:	*CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022*	LOCALIZACIÓN ARENA	*RIO CESAR*	
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	*CALLE 36A # 5F - 103 - Mz E Casa 7 Valledupar - cesar*	LOCALIZACIÓN GRAVA	*CANTERA GEICAR (TRAMACUA)*	
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	*CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LAS CANCHAS DE VOLEY PLAYA EN EL PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - CESAR*	TIPO DE CEMENTO	*CEMEX USO GENERAL*	
				DISEÑO
RESPONSABLE DE LA TOMA DE MUESTRA	*CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022*	ADITIVO UTILIZADO	NO	*3000 PSI*

CILINDRO No	ESTRUCTURA	FECHA DE FUNDIDA	FECHA DE ROTURA	EDAD (Días)	LOCALIZACIÓN	ÁREA DEL CILINDRO (Pul²)	LECTURA DEL ENSAYO (KN)	RESISTENCIA		TIPO DE ROTURA	PROYECCIÓN A LOS 28 DÍAS	
								P.S.I.	MPa		P.S.I	MPa
1	ZAPATAS Y VIGAS DE CERRAMIENTO	03-abr-23	10-abr-23	7	PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA	28.27	265.8	2113.8	14.6	A	3263.2	22.5
2	ZAPATAS Y VIGAS DE CERRAMIENTO	03-abr-23	17-abr-23	14	PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA	28.27	362.8	2885.2	19.9	C	3346.8	23.1
3	ZAPATAS Y VIGAS DE CERRAMIENTO	03-abr-23	01-may-23	28	PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA	28.27	421.5	3352.0	23.1	C	3352.0	23.1

TIPOS DE ROTURA

TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E



CLASIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL CONCRETO SEGÚN EL ASENTAMIENTO(SLUMP) DEL MISMO

CONSISTENCIA	SECA	SEMI SECA	MEDIA	HUMEDA	MUY HUMEDA
ASENTAMIENTO (mm)	20 -35	35 - 50	50 - 100	100 - 150	150 o más

1. Los Informes de Laboratorio sin firmas originales del Director Técnico y sello del Laboratorio("DOCUMENTO CONTROLADO"), no tienen Validez.
2. Los Resultados contenidos en este Informe se refieren al momento y condiciones en que se realizaron los Ensayos.
3. Este informe expresa fielmente los resultados obtenidos. No podrá ser reproducido parcialmente, excepto cuando se haya obtenido permiso previamente del laboratorio que lo emite.
4. El Laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los Resultados.
5. El laboratorio no da fe que el (los) especimen (es) de concreto al que se le realizó este ensayo corresponda a la obra, ubicación y fecha de fundida expresado en este informe

OBSERVACIONES

Elaborado por:	
Nombre:	Imer Lobo
Cargo:	Laboratorista
Aprobado por:	
Nombre:	Ing. Milciades Soto Balan
Cargo:	Gerente

FIN DEL INFORME

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

CONTRATISTA:
CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME MENSUAL N°1

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

PERIODO: DESDE EL 02/03/2023 HASTA EL 01/04/2023

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto: ***CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR***, es un componente básico y contractual, que comprende las medidas de manejo ambiental necesarias a fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan generar en el desarrollo del proyecto.

La metodología para la formulación del plan de manejo ambiental (PMA) incluye la recopilación de información de las características del medio ambiente y de las actividades de construcción del proyecto, con el fin de realizar una evaluación cuantitativa del deterioro ambiental y social que podrían causar dichas actividades.

El plan de manejo ambiental tiene como objeto formular las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante las actividades de construcción del proyecto.

Dentro del alcance del plan de manejo ambiental encontramos: identificación de las principales actividades de construcción del proyecto, identificación y evaluación de los impactos ambientales que se puedan producir por el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

1. METODOLOGIA

1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO


El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR. CESAR" tiene como objetivo afianzar el tejido social y contribuir al programa de todas las regiones del país. Los beneficios físicos del deporte conocidos por todos en etapa de desarrollo. En el territorio los espacios deportivos son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para desarrollar actividades deportivas. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. La situación está dada en mejorar las condiciones de infraestructura de los espacios deportivos, que permita que los niños, niñas y jóvenes se dediquen en sus tiempos libres a actividades deportivas.

1.2 LOCALIZACION

Localización del proyecto: El proyecto se ejecutará en la República de Colombia, en el Departamento del César, más específicamente en el municipio de Valledupar.
Valledupar, también llamada Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es un municipio colombiano, capital del departamento del Cesar. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 4493 km2, 443 414 habitantes y junto a su área metropolitana reúne 662 9413 habitantes; está conformado por 25 corregimientos y 102 veredas. Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al Oeste y la serranía del Perijá al Este. El proyecto se ejecutará en Valledupar, en la Comuna 4 en lo que corresponde al área de cesión del Barrio Rafael Escalona.

Valledupar, es un municipio colombiano, capital del departamento del Cesar. Es la cabecera del municipio homónimo, conformado por 25 corregimientos y 102 veredas. Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al Oeste y la serranía del Perijá al Este.

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

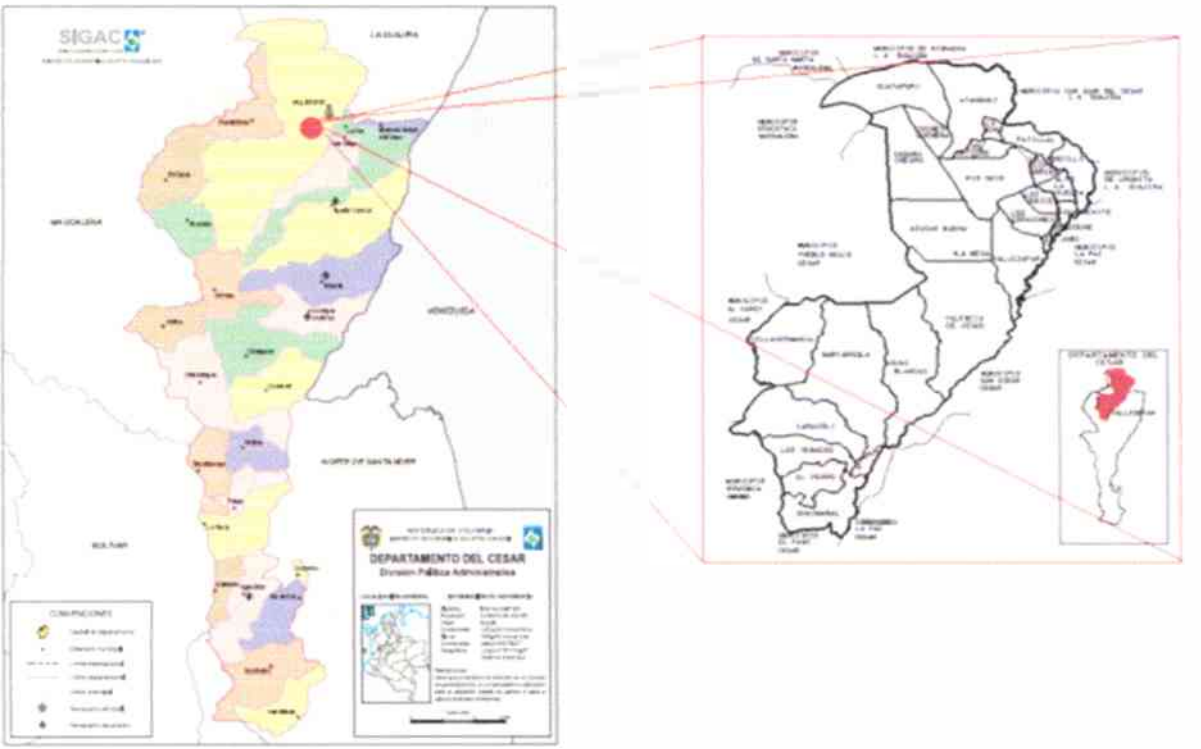


Ubicación especifica del proyecto

Ubicación especifica del proyecto

Pista de BMX



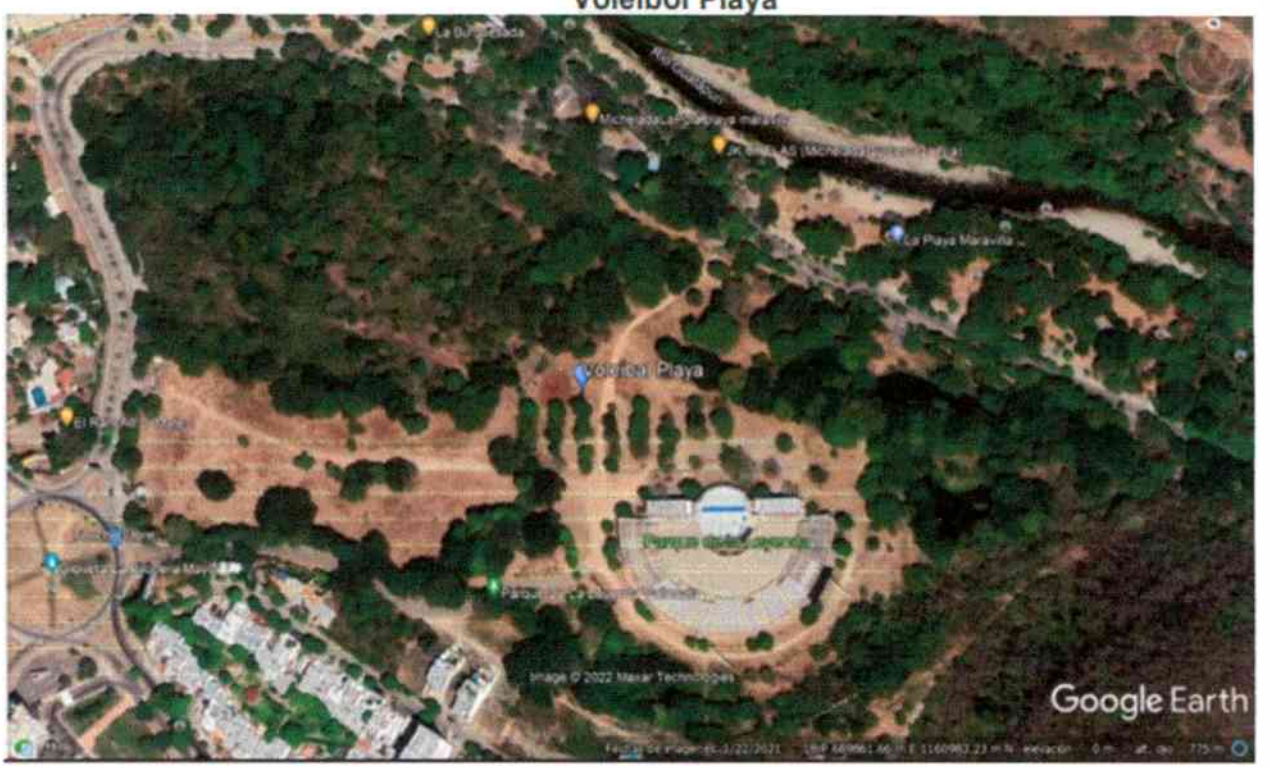

1.3 METODOLOGIA DEL PROYECTO

Para la valoración de los impactos ambientales se empleó la metodología EPM *(Metodología Arboleda)*. Se identificó el impacto ambiental en la pre - construcción de las actividades el cual se pudo observar que el impacto que se generara es mínimo, que durante el desarrollo de las actividades se han venido controlando, previniendo y controlando durante el desarrollo constructivo.

La disposición de residuos de construcción tales como bolsas de cemento y sobrantes de excavación están siendo debidamente almacenadas, clasificadas y llevadas como disposición final a sitios certificados, tales como rellenos sanitarios, entre otras.

Si bien las distintas etapas y actividades de una obra de construcción generan impacto ambiental en el medio abiótico, es importante, de la misma manera, observar el efecto que se presenta en el medio biótico, es decir, en la flora y la fauna. La caracterización de este impacto incluye la mirada de las ciudades como un ecosistema susceptible a ser transformado por la actividad humana,comprendida por medios naturales urbanos como las calles arborizadas, los parques, los bosques urbanos y cursos de agua que generan beneficios para los habitantes, tales como regulación de gases, reducción de ruido y generación de cultura por el cuidado del medioambiente, entre otros. De lo anterior describiremosalgunos de los impactos ambientales que se generan en obra.

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

MEDIO	COMPONENTE	AREA DE ESTUDIO
FISICO	SUELO	No se Presenta alteración fundamental por los residuos sólidos generados en la obra y que están asociados a actividades de excavaciones
	AGUA	No se alteran los cuerpos de agua
	AIRE	No se afecta principalmente en la comuna 4 area de la obra, por la generación de polvo, ruido, emisiones de CO2, debido a que las actividades no se emplea el uso de combustibles fósiles, operación de máquinas y herramientas.
	PAISAJE	No se afecta el paisaje en el sitio de obra, puesto que los procesos de descapote y construcción no producen un gran impacto visual
BIOTICO	VEGETACION	No se genera perdida en la Arborización y cobertura vegetal: debido a que las adecuaciones del terreno cuentan con las condiciones necesarias y no es necesaria la perdida de ningún tipo de arbol
	FAUNA	No se afecta las migraciones forzadas de animales silvestre producto de las obras de construcción
SOCIAL	DEMOGRAFICO	No se ve alterada la comuna 4 del municipio, debido a que no contamos con alto flujo de entrada y salida de equipos, maquinarias y volquetas. No es Constante
	ECONOMICO	
	CULTURAL	

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

4.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

Durante el periodo comprendido desde el 02/03/2023 HASTA EL 01/04/2023 se realizaron las siguientes actividades: OBRAS PRELIMINARES (Trazado y replanteo, Descapote), EXCAVACIONES Y RELLENO (Excavación manual, zapatas, Excavación viga cimiento, Retiro de material procedente de la excavación, Relleno con material de excavación), CONCRETOS (Concreto 3.000 psi para zapatas, Concreto 3.000 psi para pedestales, Concreto 3.000 psi para viga de piso, Concreto 2.500 psi para solado, Acero de refuerzo 60.000 psi), CARPINTERIA MÉTALICA (Malla eslabonada 60MM-Tubos aguas negras), ASEO Y LIMPIEZA.

PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMUN
RETIRO SOBRANTES HASTA 20 KM
SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN

CIMENTACIONES
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI
PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI
VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI

CONSORCIO CERRAMIENTO JC

ESTRUCTURAS
SOLADO CONCRETO 2.500 PSI
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI

CARPINTERIA METÁLICA
MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO AGUAS NEGRAS CAL 80 DE 2", ANGULO DE 1- 1/2" X 1/8", PLATINAS 1/2" X 3/16"-INCLUYE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.20MT Y APOYOS CADA 3MT
MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO AGUAS NEGRAS CAL 80 DE 2", ANGULO DE 1- 1/2" X 1/8", PLATINAS 1/2" X 3/16"-INCLUYE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.50MT Y APOYOS CADA 3MT

5.1 ANALISIS:

Tabla. Identificación impactos relevantes – Etapa construcción

ETAPA CONSTRUCCION	
Generación de residuos y sobrantes de construcción	• Para este periodo no se genera la producción de residuos de construcción (Escombros y material de relleno). • Se genera desechos sólidos tales como bolsas de cemento, residuos sólidos tales como desperdicios de Aceros y alambre para la construcción.
Pérdida de capa orgánica del suelo	• No se genera Pérdida de material orgánico producto de las actividades propias de construcción de la obra.
Contaminación de suelos	• Se genera mínima Contaminación de los suelos en la zona del proyecto, debido al aporte de sustancias contaminantes (aceites y combustibles) debido a derrames accidentales causados por el mantenimiento de maquinaria y equipos, tales como mezcladoras de concreto
Aumento niveles de ruido	• No se genera aumento en los niveles de ruido, ya que no se emplea el uso de Maquinarias.
Emisiones de gases	• No se genera emisiones de gases debido al no uso de maquinarias para este tipo de construcción
Vertimiento de residuos líquidos	• No se Aporta sustancias líquidas a las redes de alcantarillado, principalmente residuos líquidos
Generación de aguas residuales	• No se aporta de aguas residuales al sistemade desagüe
Calidad paisajística	• No se realiza remoción de cobertura vegetal e implantación del diseño paisajístico

3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Con base a la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales se formularon los programas de manejo ambiental. donde se establecieron las medidas para prevenir, mitigar, compensar y controlar los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de la construcción delproyecto.

Estas medidas son detalladas en el Plan de Manejo Ambiental mediante laelaboración de fichas de fácil aplicación para los programas propuestos, estas fichas contienen lo siguiente:

A continuación, se describen los programas ambientales:

Tabla. Programas Ambientales

PROGRAMAS	
PROGRAMA 1	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)
PROGRAMA 2	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
PROGRAMA 3	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA 4	CONTROL CIMENTACION ESTRUCTURAL
PROGRAMA 5	CONTROL MATERIAL CARPINTERIA METALICA
PROGRAMA 6	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 1	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS *(ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)*		
OBJETIVOS	**Residuos Sólidos Ordinarios y Reciclables** • Minimizar la generación de residuos sólidos en la obra. • Mejorar la manipulación de residuos sólidos generados en la obra. • Definir los criterios para separar los residuos y optimizar su recuperación. **Manejo de Residuos de Construcción y Demolición** • Manejar los residuos RCD de manera • Separar los residuos en la fuente y depositarlos de manera adecuada. **Manejo de Residuos Peligrosos** • Manejar adecuadamente de Residuos Peligrosos • Prevenir accidentes. • Evitar contingencias		
ETAPA	Construcción	TIPO DE MEDIDA	Prevención / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Generación de emisiones atmosféricas.
- Generación de ruido.
- Generación y aporte de sólidos tanto en las redes de alcantarillado como en corrientes superficiales.
- Contaminación del suelo y del agua.
- Disposición inadecuada de residuos sólidos convencionales

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS

a. Residuos Sólidos Ordinarios

Los residuos domésticos son recolectadas y entregados a la empresa recolectora en las mismas condiciones que los residuos domésticos.

b. Residuos Reciclables

Los materiales que comúnmente se pueden reutilizar obra o reciclar son entregados al recuperador de la zona, son papel, carton, plastico, vidno y metal, siempre ycuando esten limpios y secos.

c. Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Los residuos de construcción y demolición inertes (RCD) también denominados escombros, son entre otros

- ✓ Concretos: se realiza el aprovechamiento máximo de los concretos
- ✓ Carpintería Metálica: esta actividad es realizada en taller, haciendo su póstuma entrega final a los diferentes puntos de ejecución del proyecto, por lo tanto, no la generación de impacto ambiental es muy minima

d. Residuos Peligrosos

Productos de características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana. No son utilizados en la ejecución del proyecto para este penodo

Dentro de los cuales pueden ejecutarse en este proyecto como residuos peligrosos:

- ✓ Envases de productos químicos
- ✓ Pinturas

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

Manejo de Residuos Solidos Ordinarios y Reciclables

El Almacenamiento de los residuos se hace recipientes para los residuos ordinarios y "RECICLABLES" para el material reciclable.

Se instruye a todo el personal que labora en la obra, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en las canecas o contenedores y no apilar o dejar los residuos desprotegidosen otras áreas no autorizadas.

Diariamente, al finalizar la jornada, se realiza una limpieza general de la zona donde se realizan las obras, se recogen todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el área.

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición

Debido al tipo de proyecto para este periodo no se almacena escombros ni se apila ningún tipo de sedimentos en sitios que interfieran con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben estar apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes, ya que no se ha genera este tipo de contaminación.

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)
* Interventoria (Residente de Interventoria, Experto Ambiental)

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 2	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS		
OBJETIVOS	• Controlar la generación de polvo • Disminuir afectaciones a la salud • Mitigar la alteración de la calidad del aire • Controlar la generación de ruido		
ETAPA	Construcción	TIPO DE MEDIDA	Prevencion / Mitigación / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Alteración de la calidad del aire
- Emisión de partículas y gases,
- Generación de ruido
- Afectación de la población, Alteración del paisaje
- Incomodidades a la comunidad

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- ✓ No se realiza ningun tipo de quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las obras.
- ✓ Los vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra cuenten con elrespectivo certificado de emisiones de gases vigente.
- ✓ Se realiza periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos y maquinaria que son usados enlas diferentes actividades de las obras.

RUIDO

- ✓ No se cuenta con equipos muy sonoros, a más de 80 dB
- ✓ No se cuenta con vehículos que trabajen en la obra el uso bocinas, salvo la alarma de reversa.
- ✓ El horario para el cargue y descargue de materiales, son planificados en horas de la mañana con el fin de no tener inconvenientes con la comunidad.

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)
* Interventoria (Residente de Interventoria, Experto Ambiental)

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 3	***PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACION DE VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS***		
OBJETIVOS	• Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos de agua Residual generada en la obra.		
ETAPA	Construcción	**TIPO DE MEDIDA**	Mitigación / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del agua
- Afectación a cuerpo de Agua
- Contaminación de redes de alcantarillado

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

- ✓ Se cuenta con una bodega para el almacenamiento de materiales lo más alejado posible del cuerpo de agua, el cual evita la dispersión del material a causa dela acción erosiva del viento y/o del agua.
- ✓ En cada frente de obra se cuenta con una batería sanitaria, con sus respectivos lavamanos.
- ✓ Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta se realiza sobre un sobre un geotextil de un calibre que garantiza su aislamiento del suelo, de talforma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se recoge y dispone de manera inmediata. La zona donde se presenta el derrame se limpia de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)
* Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 4	*CONTROL CIMENTACION ESTRUCTURAL*		
OBJETIVOS	• Mejorar el almacenamiento y distribución de los materiales dentro de la obra buscando optimizar los recursos.		
ETAPA	Construcción	**TIPO DE MEDIDA**	Prevención / Mitigación / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del suelo
- Disposición inadecuada de residuos sólidos.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

- ✓ Los materiales se encuentran almacenados de tal manera que no tenga contacto con humedad y en lo posible tener un piso aislante del piso de tierra. (Plástico, bloque, recebo, estibas); y debe ser protegido con capa protectora, se recomienda el uso de polisombrala cual actúa como barrera cortavientos y protege el material de fisuras y daños.
- ✓ Se utiliza el uso de carretillas planas para el traslado del material. lo cual reduciría el maltrato del Material evitando fisuras y daños.

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

CONTRATISTA:
CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME MENSUAL N°2

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR

PERIODO: DESDE EL 02/04/2023 HASTA EL 01/05/2023

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto: ***CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR***, es un componente básico y contractual, que comprende las medidas de manejo ambiental necesarias a fin de prevenir, mitigar, compensar y controlar los impactos negativos que se puedan generar en el desarrollo del proyecto.

La metodología para la formulación del plan de manejo ambiental (PMA) incluye la recopilación de información de las características del medio ambiente y de las actividades de construcción del proyecto, con el fin de realizar una evaluación cuantitativa del deterioro ambiental y social que podrían causar dichas actividades.

El plan de manejo ambiental tiene como objeto formular las medidas de prevención, control, mitigación y compensación de los impactos ambientales previstos durante las actividades de construcción del proyecto.

Dentro del alcance del plan de manejo ambiental encontramos: identificación de las principales actividades de construcción del proyecto, identificación y evaluación de los impactos ambientales que se puedan producir por el desarrollo del proyecto.

1. METODOLOGIA


1.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL E INTERNO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, CESAR" tiene como objetivo afianzar el tejido social y contribuir al programa de todas las regiones del país. Los beneficios físicos del deporte conocidos por todos en etapa de desarrollo. En el territorio los espacios deportivos son insuficientes e inadecuados para la población que está en capacidad para desarrollar actividades deportivas. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. La situación está dada en mejorar las condiciones de infraestructura de los espacios deportivos, que permita que los niños, niñas y jovenes se dediquen en sus tiempos libres a actividades deportivas.

1.2 LOCALIZACION

Localización del proyecto: El proyecto se ejecutará en la República de Colombia, en el Departamento del César, más específicamente en el municipio de Valledupar.
Valledupar, también llamada Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar, es un municipio colombiano, capital del departamento del Cesar. Es la cabecera del municipio homónimo, el cual tiene una extensión de 4493 km2, 443 414 habitantes y junto a su área metropoiitana reúne 662 9413 habitantes; está conformado por 25 corregimientos y 102 veredas. Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al Oeste y la serranía del Perijá al Este. El proyecto se ejecutará en Valledupar, en la Comuna 4 en lo que corresponde al área de cesión del Barrio Rafael Escalona.


Valledupar, es un municipio colombiano, capital del departamento del Cesar. Es la cabecera del municipio homónimo, conformado por 25 corregimientos y 102 veredas. Está ubicada al nororiente de la Costa Atlántica colombiana, a orillas del río Guatapurí, en el valle del río Cesar formado por la Sierra Nevada de Santa Marta al Oeste y la serranía del Perijá al Este.

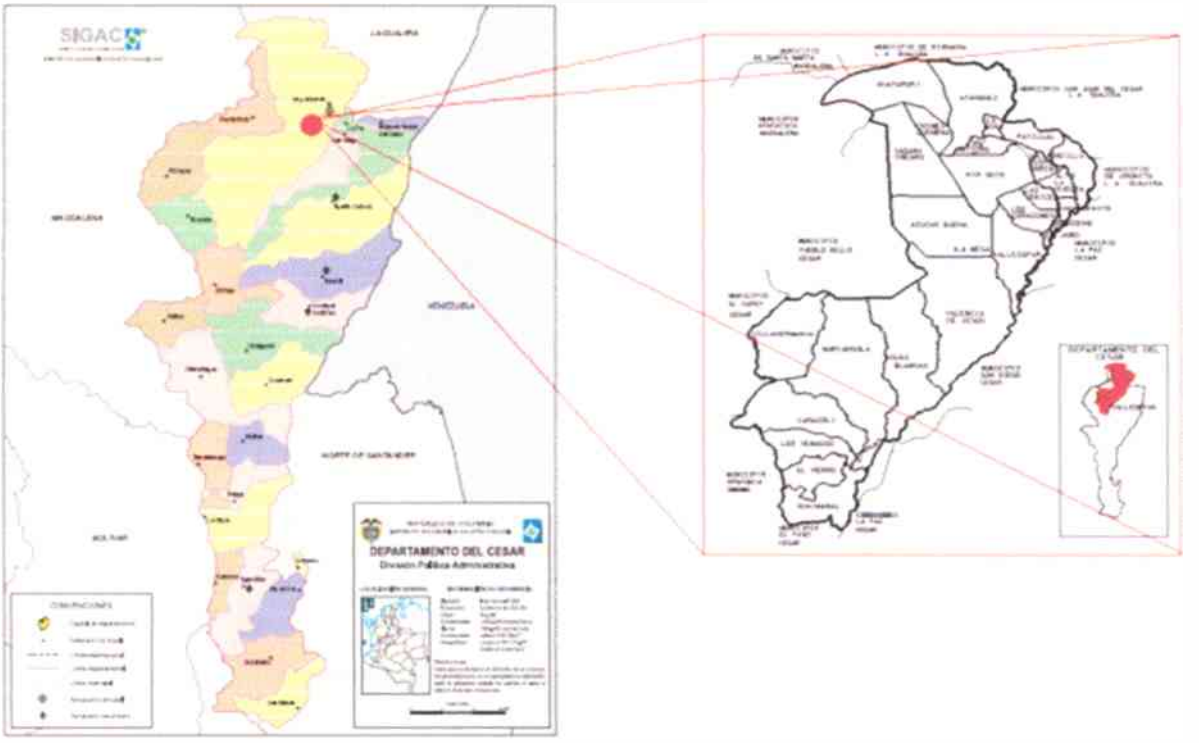

Ubicación especifica del proyecto

Ubicación especifica del proyecto

Pista de BMX

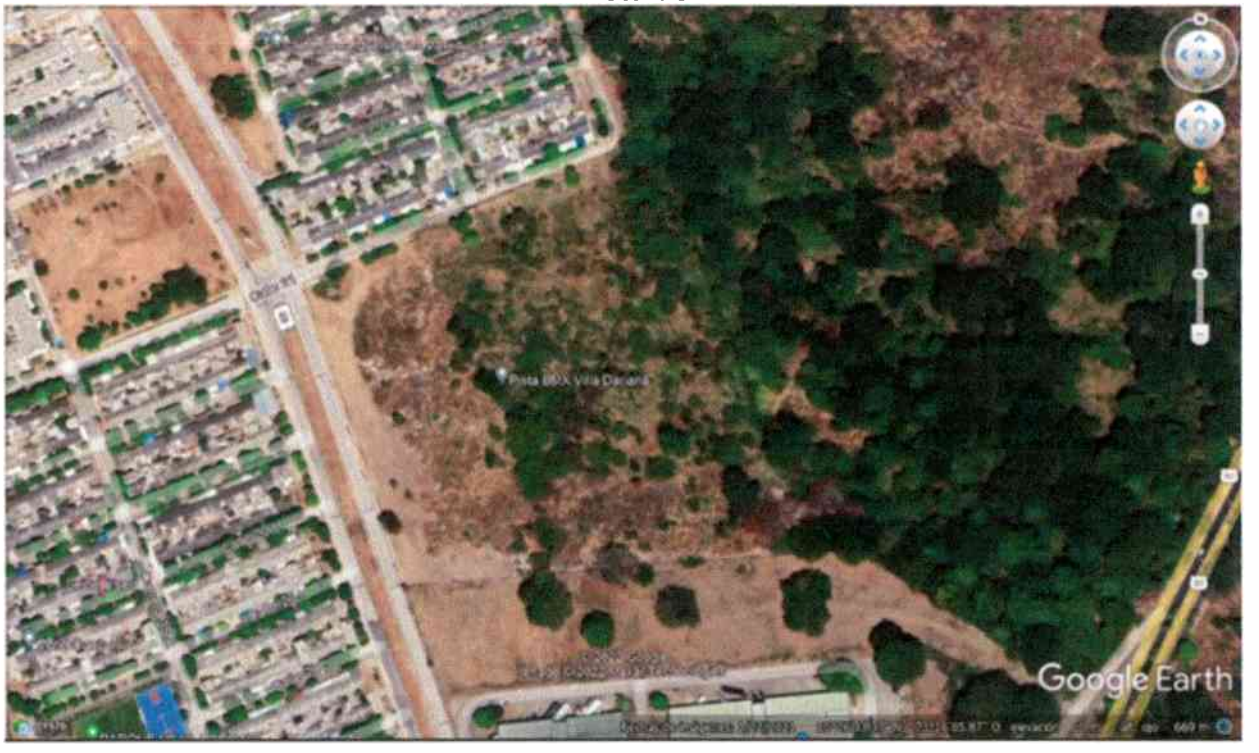



1.3 METODOLOGIA DEL PROYECTO

Para la valoración de los impactos ambientales se empleó la metodología EPM *(Metodología Arboleda).*

La disposición de residuos de construcción tales como bolsas de cemento y sobrantes de excavación están siendo debidamente almacenadas, clasificadas y llevadas como disposición final a sitios certificados, tales como rellenos sanitarios, entre otras.

Si bien las distintas etapas y actividades de una obra de construcción generan impacto ambiental en el medio abiótico, es importante, de la misma manera, observar el efecto que se presenta en el medio biótico, es decir, en la flora y la fauna. La caracterización de este impacto incluye la mirada de las ciudades como un ecosistema susceptible a ser transformado por la actividad humana,comprendida por medios naturales urbanos como las calles arborizadas, los parques, los bosques urbanos y cursos de agua que generan beneficios para los habitantes, tales como regulación de gases, reducción de ruido y generación de cultura por el cuidado del medioambiente, entre otros. De lo anterior describiremosalgunos de los impactos ambientales que se generan en obra.

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

MEDIO	COMPONENTE	AREA DE ESTUDIO
FISICO	SUELO	No se Presenta alteración fundamental por los residuos sólidos generados en obra y que están asociados a actividades de excavaciones
	AGUA	No se alteran los cuerpos de agua.
	AIRE	No se afecta principalmente en la comuna 4 área de la obra, por la generación de polvo, ruido, emisiones de CO2, debido a que las actividades no se emplea el uso de combustibles fósiles, operación de máquinas y herramientas
	PAISAJE	No se afecta el paisaje en el sitio de obra, puesto que los procesos de descapote y construcción no producen un gran impacto visual y no sufren ningún cambio a lo encontrado actualmente
BIOTICO	VEGETACION	No se genera perdida en la Arborización y cobertura vegetal, debido a que las adecuaciones del terreno cuentan con las condiciones necesarias y no es necesaria la perdida de ningún tipo de árbol
	FAUNA	No se afecta las migraciones forzadas de animales silvestre producto de las obras de construcción
SOCIAL	DEMOGRAFICO	No se ve alterada la comuna 4 del municipio, debido a que no contamos con alto flujo de entrada y salida de equipos, maquinarias y volquetas. Es ocasional.
	ECONOMICO	
	CULTURAL	

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

4.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

Durante el periodo comprendido desde el 02/04/2023 HASTA EL 01/05/2023 se realizaron las siguientes actividades: OBRAS PRELIMINARES (Trazado y replanteo, Descapote), EXCAVACIONES Y RELLENO (Excavación manual, zapatas, Excavación viga cimiento, Retiro de material procedente de la excavación, Relleno con material de excavación), CONCRETOS (Concreto 3.000 psi para zapatas, Concreto 3.000 psi para pedestales, Concreto 3.000 psi para viga de piso, Concreto 2.500 psi para solado, Acero de refuerzo 60.000 psi), CARPINTERIA MÉTALICA (Malla eslabonada 60MM-Tubos aguas negras), ASEO Y LIMPIEZA.

PRELIMINARES
LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO
EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMUN
RETIRO SOBRANTES HASTA 20 KM
SUB-BASE GRANULAR, INCL. SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN

CIMENTACIONES
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI
PEDESTALES EN CONCRETO 3.000 PSI
VIGA DE PISO EN CONCRETO 3.000 PSI

ESTRUCTURAS
SOLADO CONCRETO 2.500 PSI
ACERO DE REFUERZO DE 60.000 PSI

CARPINTERIA METÁLICA

MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO AGUAS NEGRAS CAL 80 DE 2", ANGULO DE 1- 1/2" X 1/8", PLATINAS 1/2" X 3/16"-INCLUYE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 2.20MT Y APOYOS CADA 3MT
MALLA ESLABONADA 60MM-TUBO AGUAS NEGRAS CAL 80 DE 2", ANGULO DE 1- 1/2" X 1/8", PLATINAS 1/2" X 3/16"-INCLUYE PINTURA SUMINISTRO Y COLOCACION-PARA ALTURA DE 1.50MT Y APOYOS CADA 3MT

5.1 ANALISIS:

Tabla. Identificación impactos relevantes – Etapa construcción

ETAPA CONSTRUCCION	
Generación de residuos y sobrantes de construcción	• Para este periodo no se genera la producción de residuos de construcción (Escombros y material de relleno). • Se genera desechos sólidos tales como bolsas de cemento, residuos sólidos tales como desperdicios de Aceros y alambre para la construcción
Pérdida de capa orgánica del suelo	• No se genera Pérdida de material orgánico producto de las actividades propias de construcción de la obra.
Contaminación de suelos	• Se genera mínima Contaminación de los suelos en la zona del proyecto, debido al aporte de sustancias contaminantes (aceites y combustibles) debido a derrames accidentales causados por el mantenimiento de maquinaria y equipos, tales como mezcladoras de concreto
Aumento niveles de ruido	• No se genera aumento en los niveles de ruido, ya que no se emplea el uso de Maquinarias.
Emisiones de gases	• No se genera emisiones de gases debido al no uso de maquinarias para este tipo de construcción
Vertimiento de residuos líquidos	• No se Aporta sustancias líquidas a las redes de alcantarillado, principalmente residuos líquidos
Generación de aguas residuales	• No se aporta de aguas residuales al sistemade desagüe
Calidad paisajística	• No se realiza remoción de cobertura vegetal e implantación del diseño paisajístico

3. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Con base a la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales se ejecutan los programas de manejo ambiental, donde se establecen las medidas para prevenir, mitigar, compensar y controlar los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de la construcción delproyecto.

Estas medidas son detalladas en el Plan de Manejo Ambiental mediante la elaboración de fichas de fácil aplicación para los programas propuestos, estas fichas contienen lo siguiente:

A continuación, se describen los programas ambientales:

Tabla. Programas Ambientales

PROGRAMAS	
PROGRAMA 1	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)
PROGRAMA 2	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS
PROGRAMA 3	PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROGRAMA 4	CONTROL CIMENTACION ESTRUCTURAL
PROGRAMA 5	CONTROL MATERIAL CARPINTERIA METALICA
PROGRAMA 6	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 1	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS *(ordinarios, orgánicos, reciclables, escombros y peligrosos)*		
OBJETIVOS	**Residuos Sólidos Ordinarios y Reciclables** • Minimizar la generación de residuos sólidos en la obra. • Mejorar la manipulación de residuos sólidos generados en la obra. • Definir los criterios para separar los residuos y optimizar su recuperación. **Manejo de Residuos de Construcción y Demolición** • Manejar los residuos RCD de manera • Separar los residuos en la fuente y depositarlos de manera adecuada. **Manejo de Residuos Peligrosos** • Manejar adecuadamente de Residuos Peligrosos • Prevenir accidentes. • Evitar contingencias		
ETAPA	Construcción	TIPO DE MEDIDA	Prevención / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Generación de emisiones atmosféricas
- Generación de ruido
- Generación y aporte de sólidos tanto en las redes de alcantarillado como en corrientes superficiales.
- Contaminación del suelo y del agua.
- Disposición inadecuada de residuos sólidos convencionales

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

CLASIFICACION DE RESIDUOS SOLIDOS

a. Residuos Sólidos Ordinarios

Los residuos domésticos son recolectados y entregados a la empresa recolectora en las mismas condiciones que los residuos domésticos.

b. Residuos Reciclables

Los materiales que comúnmente se pueden reutilizarobra o reciclar son entregados al recuperador de la zona, son papel, cartón, plástico, vidrio y metal, siempre ycuando estén limpios y secos.

c. Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Los residuos de construcción y demolición inertes (RCD) también denominados escombros, son entre otros:

- ✓ Concretos: se realiza el aprovechamiento máximo de los concretos
- ✓ Carpintería Metálica: esta actividad es realizada en taller, haciendo su póstuma entrega final a los diferentes puntos de ejecución del proyecto, por lo tanto, no la generación de impacto ambiental es muy mínima

d. Residuos Peligrosos

Productos de características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgo a la salud humana o deteriorar la calidad ambiental hasta niveles que causen riesgo a la salud humana.

Dentro de los cuales pueden ejecutarse en este proyecto como residuos peligrosos:

- ✓ Envases de productos químicos
- ✓ Pinturas

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

Manejo de Residuos Solidos Ordinarios y Reciclables

El Almacenamiento de los residuos se hace recipientes para los residuos ordinarios y "RECICLABLES" para el material reciclable.

Se instruye a todo el personal que labora en la obra 15 min antes de iniciar actividades, sobre la obligatoriedad de depositar los residuos en las canecas o contenedores y no apilar o dejar los residuos desprotegidosen otras áreas no autorizadas.

Diariamente, al finalizar la jornada, se realiza una limpieza general de la zona donde se realizan las obras, se recogen todos los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en el area.

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición

Debido al tipo de proyecto para este periodo no se almacena escombros ni se apila ningún tipo de sedimentos en sitios que interfieran con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben estar apilados, bien protegidos y ubicados para evitar tropiezos y/o accidentes, ya que no se ha genera este tipo de contaminación.

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)
* Interventoria (Residente de interventoria, Experto Ambiental)



CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 2	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS		
OBJETIVOS	• Controlar la generación de polvo • Disminuir afectaciones a la salud • Mitigar la alteración de la calidad del aire • Controlar la generación de ruido		
ETAPA	Construcción	TIPO DE MEDIDA	Prevención / Mitigación / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Alteración de la calidad del aire
- Emisión de particulas y gases,
- Generación de ruido
- Afectación de la población, Alteración del paisaje
- Incomodidades a la comunidad

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

- ✓ No se realiza ningún tipo de quemas a cielo abierto, en los sitios donde se adelantan las obras.
- ✓ Los vehículos que carguen y descarguen materiales en la obra cuenten con elrespectivo certificado de emisiones de gases vigente.
- ✓ Se realiza periódicamente mantenimiento adecuado a los equipos y maquinaria que son usados enlas diferentes actividades de las obras.

RUIDO

- ✓ No se cuenta con equipos muy sonoros, a más de 80 dB
- ✓ No se cuenta con vehículos que trabajen en la obra el uso bocinas, salvo la alarma de reversa.
- ✓ El horario para el cargue y descargue de materiales, son planificados en horas de la mañana con el fin de no tener inconvenientes con la comunidad.

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)
* Interventoría (Residente de Interventoría, Experto Ambiental)

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 3	***PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DE VERTIMIENTOS EN CUERPOS DE AGUA Y REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS***		
OBJETIVOS	• Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por vertimientos de agua Residual generada en la obra.		
ETAPA	Construcción	**TIPO DE MEDIDA**	Mitigación / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del agua
- Afectación a cuerpo de Agua
- Contaminación de redes de alcantarillado

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

- ✓ Se cuenta con una bodega para el almacenamiento de materiales lo más alejado posible del cuerpo de agua, el cual evita la dispersión del material a causa dela acción erosiva del viento y/o del agua.
- ✓ En cada frente de obra se cuenta con una batería sanitaria, con sus respectivos lavamanos.
- ✓ Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta se realiza sobre un sobre un geotextil de un calibre que garantiza su aislamiento del suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se recoge y dispone de manera inmediata. La zona donde se presenta el derrame se limpia de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)
* Interventoría (Residente de interventoría, Experto Ambiental)

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 4	*CONTROL CIMENTACION ESTRUCTURAL*		
OBJETIVOS	• Mejorar el almacenamiento y distribución de los materiales dentro de la obra buscando optimizar los recursos.		
ETAPA	Construcción	**TIPO DE MEDIDA**	Prevención / Mitigación / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del suelo
- Disposición inadecuada de residuos sólidos.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

- ✓ Los materiales se encuentran almacenados de tal manera que no tenga contacto con humedad y en lo posible tener un piso aislante del piso de tierra. (Plástico, bloque, recebo, estibas); y debe ser protegido con capa protectora, se recomienda el uso de polisombrala cual sirve como barrera contra lluvia y protege el material de fisuras y daños.
- ✓ Se utiliza el uso de carretillas planas para el traslado del material, lo cual reduciría el maltrato del Material evitando fisuras y daños.

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 5	*CONTROL MATERIAL CARPINTERIA METALICA*		
OBJETIVOS	• Mejorar el almacenamiento y distribución de los materiales de Carpintería Metálica dentro dela obra buscando optimizar los recursos.		
ETAPA	Construcción	**TIPO DE MEDIDA**	Prevención / Mitigación / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Contaminación del suelo
- Disposición inadecuada de residuos sólidos.

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

- ✓ Se ubican los productos sobre madera, estibas entre otros separándolo del suelo
- ✓ Los materiales son transportados de manera adecuada, con el fin de no presentar golpes ni fisura, manteniendo el buen estado.
- ✓ Las actividades son realizadas en taller

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)



CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

PROGRAMA 6	*SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*		
OBJETIVOS	• Salvaguardar la integridad física de los trabajadores durante las labores de construcción del proyecto y de la comunidad presen te en las zonas aledañas a la remodelación del establecimiento.		
ETAPA	Construcción	**TIPO DE MEDIDA**	Prevención / Control

IMPACTOS A MANEJAR

Los impactos a controlar con la implementación de medidas de manejo son los siguientes:

- Riesgos laborales e inseguridad industrial
- Incremento de los niveles de ruido
- Emisión de gases, polvo y partículas

MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

✓ A los trabajadores y técnicos de equipos de protección personal, EPP:
(a) CARETAS/GAFAS.
(b) CASCOS.
(c) GUANTES.
(d) MASCARILLAS.

✓ Se cuenta con todo el personal afiliado al Seguro Social, Riesgos Profesionales y Parafiscales

RESPONSABLES

* Contratista de Obra (MARIA ALEJANDRA ARZUAGA PADILLA, JOSE ZABALETA)

4. CONCLUSIONES

- La comunidad se encuentra conforme con el manejo y avance de la obra, manifestando que hasta ahora se ha cumplido con lo propuesto y no se han observado mayor afectación a la comunidad a causa de las actividades de la misma, se cuenta con constante comunicación con la comunidad y con la junta de acción comunal del sector

- Se realiza el seguimiento conforme a la normatividad legal (politicas generales, emisiones atmosféricas, aguas, manejo de escombros y materiales de construcción, residuos sólidos), ya que el incumplimiento de esta generaría la cancelación y evolución del proyecto trayendo como consecuencia multas para la empresa.

- Conforme a la evaluación ambiental se realiza a través de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales, donde se identifican las actividades con su respectivo aspecto, impacto y valoración del riesgo. Por el cual se puede observar que los impactos son minimos, indicándonos que no se presenta un riesgo ambiental en el proyecto.

RODOLFO LUIS SANCHEZ PADILLA
ING. AMBIENTAL
C.C. 1.065.645.635 de Valledupar

CONSORCIO CERRAMIENTO JC 2022

BITACORA

consorciocerramientojc2022@gmail.com



CONSORCIO CERRAMIENTO JC
2022

INFORME RESISTENCIA DE CONCRETO

consorciocerramientojc2022@gmail.com

Jueves | 02 | marzo | 2023
Hora inicio = 7:00am Hora final = 03:00pm
Clima = Soleado lugar de trabajo: Pista de Bmx Actividad a realizar = Se inicio levantamiento topografico. En la Cancha de Voleibol playa se inicio levantamiento topografico

Viernes | 03 | marzo | 2023
Hora inicio = 7:00am hora final = 03:00pm
Clima = Soleado lugar de trabajo = pista de Bmx Actividad a realizar = la comisión de topografia realizo levantamiento topografico. En la Cancha de Voleibol playa la comisión de topografia realizo levantamiento topografico

Lunes | 06 | marzo | 2023
Hora inicio = 7:00am hora final = 04:00pm Clima = Soleado lugar de trabajo = pista de Bmx Actividad a realizar = la comisión de topografia realizo levantamiento topografico. En la Cancha de Voleibol playa la comisión de topografia realizo levantamiento topografico

martes | 07 | marzo | 2023
Hora inicio = 7:00am hora final = 04:00pm

Powered by CamScanner

Clima= Soleado lugar de trabajo = pista de Bmx Actividad a realizar= la Comision de topografia realizo levantamiento topografico. En la cancha de Udeasol playa la comisión de topografia realizo levantamiento topografico.

Miercoles | 08 | marzo | 2023
hora inicio 7:00am hora final 04:00pm Clima Soleado lugar de trabajo= pista de Bmx Actividad a realizar= la comisión de topografia realizo levantamiento topografico. En la cancha de Udeasol playa la Comisión de topografia realizo levantamiento topografico.

Jueves | 09 | marzo | 2023
hora inicio= 7:00am hora final 04:00pm clima Soleado lugar de trabajo pista de Bmx Actividad a realizar la Comisión de topografia realizo levantamiento topografico. En la cancha de Udeasol la Comision de topografia realizo levantamiento topografico

Viernes | 10 | marzo | 2023
hora inicio 7:00am hora final= 04:00pm clima Soleado= lugar de trabajo pista de Bmx

Powered by CamScanner

4

Actividad a realizar= la comisión de topografía realizo levantamiento topográfico en la cancha de Voleibol playa la comisión de topografía realizo levantamiento topografico.

lunes | 13 | marzo | 2023
hora inicio= 7:00am hora final= 04:00pm Clima= Soleado lugar de trabajo= pista de Bmx Actividad a realizar= la comisión de topografía realizo levantamiento topográfico. En la cancha de Voleibol playa la comisión de topografía realizo levantamiento topografic

Martes | 14 | marzo | 2023
hora inicio= 7:00am hora final= 04:00pm clima= lluvioso: lugar de trabajo = pista de Bmx Actividad a realizar= la comisión de topografía realizo levantamiento topográfico. En la cancha de Voleibol playa la comisión de topografía realizo levantamiento topografico

Miercoles | 15 | marzo | 2023
hora inicio= 7:00am hora final= 04:00pm clima= Soleado lugar de trabajo pista de Bmx

Powered by CamScanner

Actividad a realizar= la comisión de topografía realizo levantamiento topografico. En la cancha de voleibol playa la comisión de topografía realizo levantamiento topografico.

Jueves |16| marzo| 2023
hora inicio= 7:00am hora final= 04:00pm Clima= lluvioso lugar de trabajo= pista de Bmx Actividad a realizar= la Comisión de topografía realizo levantamiento topografico. En la Cancha de voleibol playa la Comisión de topografía realizo levantamiento topografico

Viernes |17| mayo |2023
hora inicio=07:00 am hora final=04:00pm Clima= lluvioso lugar de trabajo= pista de Bmx Actividad a realizar= la comisión de topografía realizo levantamiento topografico. En la cancha de voleibol playa.

Sabado | 18 |marzo |2023
hora inicio= 7:00am hora final 01:00pm clima Soleado lugar de trabajo= pista de Bmx Actividad a realizar= Excavación para Cerramiento en tela Verde. En la Cancha de voleibol playa

Powered by CamScanner

6

no se realizaron labores

lunes | 20 | marzo | 2023
hora inicio = 7:00 am hora final = 01:00 pm
Clima = Soleado lugar de trabajo = Pista de Bmx
Actividad a realizar = Excavación para Cerramiento en tela verde. en la cancha de Voleibol playa no se realizaron labores.

Martes | 21 | marzo | 2023
hora inicio = 7:00 am hora final 5:00 pm Clima Soleado lugar de trabajo = pista de Bmx
Actividad a realizar = Cerramiento en tela Verde En la cancha de Voleibol playa.

Miercoles | 22 | Marzo | 2023
hora inicio = 7:00 am hora final: 5:00 pm
Clima = Soleado lugar de trabajo = pista de Bmx Actividad a realizar = la comisión de topografía se encuentra delimitando el perímetro tambien Continuamos Con la actividad de cerramiento en tela verde. en la cancha de Voleibol playa no se realizaron labores.

Powered by CamScanner

23/marzo/2023 al 27/marzo/2023
Conjunto Con la interventoria, supervicion y topografia se determino los puntos criticos del lado este (terraplan) y norte (mercabasto) Con el fin de definir la ubicacion del cerramiento que pasara por estos puntos dun asi Superado lo anteriormente dicho se inicio levantamiento topografico.

Martes | 28 | marzo | 2023
hora inicio = 7:00am hora final = 5:00pm Clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de Voleibol playa Actividad a realizar = se iniciaron Excavación para las zapatas. En la pista de Bmx, Cerramiento en tela Verde, se inicio armado y figurado de acero

Miercoles | 29 | marzo | 2023.
hora inicio = 7:00am hora final = 5:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de voleibol Actividad a realizar = Excavación de zapata y viga, En la pista de Bmx se hizo armado y figurado de acero.

Jueves | 30 | marzo | 2023
hora inicio = 7:00am hora final = 5:00pm Clima soleado lugar de trabajo = cancha de voleibol

Powered by CamScanner

8


playa Actividad a realizar= Excavación de zapata y viga, armado y Figurado de acero. En la pista de BMX se Continuo Con el armado y Figurado de acero.





Viernes / 31 / marzo / 2023
hora inicio= 7:00am hora Final= 5:00pm Clima Soleado lugar de trabajo= Cancha de Voleibol playa Actividad a realizar= armado y Figurado de acero, Se inicio Funeficia de zapata y viga, Se colocaron tubos en la pista de Bmx Se inicio Excavación y se Continuo Con el armado y Figurado del acero.





Sabado / 01 / Abril / 2023
hora inicio= 7:00 am hora Final= 5:00pm Clima= Soleado lugar de trabajo= Cancha de Voleibol Playa Actividad a realizar= Funeficia de zapata y viga, se colocarón tubos, armado y Figurado de acero. En la pista de Bmx. Se Continuo Excavación de zapata y armado y Figurado de acero.





Powered by CamScanner

lunes | 3 | abril | 2023
hora inicio= 7:00am hora final= 5:00pm
Clima = Soleado lugar de trabajo= cancha de voleibol playa Actividad a realizar = se fundio zapata y viga, se colocarón tobos, se hizo armado y figurado de acero. En la pista de Bmx continuarón excavando las zapatas y armado y figurado de acero.

Martes | 4 | abril | 2023
hora inicio= 7:00 am hora final= 5:00pm
Clima= Soleado lugar de trabajo = cancha de voleibol playa actividad a realizar = fundida de zapata y viga, se colocarón los tobos, armado y figurado de acero. En la pista de Bmx se continuo con el armado y figurado de acero y la excavación de la zapata.

Miercoles | 5 | abril | 2023
hora inicio= 7:00am hora final= 5:00pm
Clima= Soleado lugar de trabajo= cancha de voleibol playa Actividad a realizar = fundida de zapata y viga, se colocaron tobos, armado y figurado de acero. En la pista de Bmx se continuo excavand zapata.

Powered by CamScanner

•desde el 06/abril/2023 hasta el 09/abril/2023 no se realizara ningun tipo de labor por motivo de dias Santos (Semana santa)

lunes | 10 | abril | 2023.
hora inicio= 7:00 am hora Final= 5:00 pm Clima= Soleado /lugar de trabajo= Cancha de Voleibol/ actividad a realizar= armado y Figurado de acero. En la pista de Bmx se hizo Excavación de zapata.

martes | 11 | abril | 2023
hora inicio= 7:00 am hora final= 5:00 pm Clima= Soleado lugar de trabajo= cancha de voleibol Playa. actividad a realizar= fundida de zapata y viga, se colocaron tubos, armado y figurado de acero. En la pista de Bmx se hizo armado y figurado de acero, Excavación de zapata.

miercoles | 12 | abril | 2023
hora inicio= 7:00 am hora Final= 5:00 pm Clima = soleado lugar de trabajo= Cancha de voleibol playa actividad a realizar= Fundida de zapata, armado y figurado de acero, se colocaron tubos. En la pista

Powered by CamScanner


c/e Bmx se hizo armado y figurado de acero.


Jueves | 13 | abril | 2023
hora inicio = 7:00am hora final = 5:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = cancha de Voleibol playa actividad a realizar = Excavación de zapata en cancha de calentamiento, se funcio zapata y viga en la cancha N°1, armado y figurado de acero. en la pista de Bmx se hizo excavación de tapata, armado y figurad c/e acero.

Viernes | 14 | abril | 2023
hora inicio = 7:00am hora final = 5:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de Voleibol playa actividad a realizar = armado de malla es labonada en la cancha N°1, Excavación de zapata y viga en la cancha de calentamiento y armado y figurado de acero. en la pista de Bmx se hizo armado y figurado de acero y se continuo excavación de zapata y viga.


Powered by CamScanner

Sabado | 15 | abril | 2023
hora inicio= 7:00am hora final= 2:00 pm
lugar de trabajo= Cancha de voleibol playa
Actividad a realizar= Excavación de zapata y viga en cancha de calentamiento, armado de malla eslaborada en la cancha N°1, armado y figurado de acero. en la pista de Bmx se hizo fundida de zapata y se colocaron tubos tambien. Se hizo armado y figurado de acero.





Lunes | 17 | abril | 2023
Hora inicio = 7:00am Hora final 5:00 pm
Clima= nublado lugar de trabajo Cancha de voleibol playa Actividad a realizar armado de malla eslaborada en la cancha N°1, se hizo fundida de ~~zapata~~ y viga en la cancha de calentamiento, se hizo armado y figurado de acero tambien se continuo Excavación de zapata y viga. En la pista de Bmx se continuo Excavación de zapata y viga y armado y figurado de acero.





Martes | 18 | abril | 2023
Hora inicio= 7:00 am hora final= 5:00 Am
Clima= nublado lugar de trabajo= Cancha de voleibol playa actividad a realizar=

Powered by CamScanner

armado de malla es laborada en la cancha N° 1, Excavación de zapata y viga, fundida de zapata y viga, Se Colocaron tubos, y armado y figurado de acero. en la pista de Bmx se hizo armado y figurado de acero Excavación de zapata y viga.

Miercoles | 19 | abril | 2023
hora inicio = 7:00am hora Final = 5:00pm Clima Soleado lugar de trabajo = Cancha de voleibol playa actividad a realizar = Excavación de zapata y viga en la cancha de calentamiento, Fundida de zapata y viga Se colocaron tubos armado de mallas es laborada en la cancha N° 1 armado y figurado de acero. En la pista de Bmx se hizo armado y figurado de acero y Excavación de zapata y viga

Jueves | 20 | abril | 2023
hora INICIO = 7:00am hora Final 5:00pm
Clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de Voleibol playa actividad a realizar = armado de malla es laborada en la cancha N° 1, Excavación de zapata y viga, Fundida de zapata y viga y se Colocaron tubos. en la pista de Bmx se inicio Fundida de zapata y viga y se Colocaron tubos


Powered by CamScanner


Viernes / 21 / abril / 2023
Hora inicio = 7:00 am Hora final = 5:00 pm
Clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de voleibol playa actividad a realizar = armado de malla esfabricada en la cancha N° 1 fundida de zapata y viga, se colocaron todos en la cancha de calentamiento también se excavo zapata y viga, se hizo armado y figurado de acero. en la pista de Bmx se fundio pedestal y se continuo excavando zapata y viga y pedestal

Sabado / 22 / abril / 2023
Hora inicio = 7:00am hora final = 2:00pm
Clima = nublado lugar de trabajo = Cancha de voleibol playa actividad a realizar = armado y figurado de acero, armado de malla Esfabricada en la cancha N° 1, fundida de zapata y viga, se colocaron todos, excavacion de zapata y viga en la cancha de calentamiento . en la pista de Bmx se continuo con la excavación de zapata y viga, se fundio pedestal

Powered by CamScanner


Domingo | 23 | abril | 2023
Hora inicio = 7:30am Hora final 1900pm clima nublado lugar de trabajo = cancha de voleibol playa actividad a realizar = armado de malla eslaborada en la cancha N° 1, Excavación de zapata y viga, fundida de zapata y viga se colocaron los tubos, armado y figurado de acero. En la pista de Bmx se hizo Excavación de zapata y viga.





Lunes | 24 | abril | 2023
Hora inicio = 7:30am Hora final = 5:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de voleibol playa actividad a realizar = armado de malla eslaborada en la cancha N°1, Excavación de zapata y viga, Fundida de zapata y viga, Se colocarón tubos. En la pista de Bmx se hizo armado de formaleta para fundir viga., se hizo Excavación de zapata y viga, armado y Figurado de acero.





Martes | 25 | abril | 2023
Hora inicio = 7:30 am Hora final = 5:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = cancha de voleibol playa actividad a realizar = armado de malla eslaborada en la cancha N°1, Excavación de zapata y viga Fundida de zapata y viga. Se colocarón tubos en la cancha de calentamiento armado y Figurado de acero. en la pista de Bmx se Fundio Viga

Powered by CamScanner

se Colocarón tubos, se hizo Excavación de zapata y viga.

Miercoles | 26 | abril | 2023
Hora inicio = 7:00am Hora final = 5:00pm Clima Soleado lugar de trabajo = cancha de voleibol playa actividad a realizar = armado de malla eslaborado en la cancha N°1, fundida de zapata y viga y se colocarón tubos. en la pista de Bmx se hizo armado y figurado de acero, se fundió Viga se colocarón tubos

el Consorcio Cerramiento jc 2022 Suspende actividades por motivos de fiestas Municipales Fest. Vallenato local reanudara labores el día 02 | mayo | 2023.

Martes | 02 | mayo | 2023
Hora inicio = 7:00am Hora final = 2:00pm
Clima = Soleado lugar de trabajo = cancha de Voleibol actividad a realizar = armado y figurado de acero. en la pista de Bmx se hizo armado y figurado de acero

Powered by CamScanner


Miercoles /03 /mayo /2023
Hora inicio = 7:00am Hora Final = 5:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de Voleibol playa actividad a realizar = Excavación de cancha N°2 Zapata, armado de malla es laborada en la cancha de calentamiento. en la pista de Bmx se hizo Excavación de zapata y viga.

Jueves /04 /mayo /2023
Hora inicio = 7:00am Hora Final = 5:00pm Clima = Soleado lugar de trabajo = Pista de Bmx Actividad a realizar = Armado de Fibraleta para las vigas, Fundida de Viga, Armado y Figurado de acero Excavación de zapata y viga.
Nota = en la cancha de Voleibol playa no se van a realizar labores porque se esta realizando un torneo de 2 Dias, el encargado del torneo tiene en sus manos un permiso Solicitado a Inder (Instituto municipal de recreación y deporte) el cual mostro el primer dia de inicio del torneo Cabe resaltar que el Consorcio cerramiento JC 2022 no se hara responsable de ningun tipo de afectación a la salud de las personas ... que estan en actividad de dicho torneo por que las canchas estan en Construcción. Por lo cual se reanudara labores el dia 06/ mayo /2023

Powered by CamScanner


Viernes 05 /mayo/2023
Hora Inicio = 7:00am Hora final = 5:00pm Clima = Soleado lugar de trabajo = Pista de Bmx actividad a realizar = se fundió zapata y se hizo armado de formaleta para Viga armado y figurado de acero






Sabado /06 /mayo /2023
Hora Inicio = 7:00 am Hora final = 1:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = cancha de Voleibol playa actividad a realizar = Excavación de zapata y Viga en la cancha N°2, armado de malla elaborada en la cancha de calentamiento armado y figurado de acero. en la pista de Bmx se excavo zapata, y se fundió Viga, se colo. tubos.





domingo / 07 / mayo / 2023
Hora inicio = 7:00am Hora final = 1:00pm clima = Soleado lugar de trabajo = Cancha de Voleibol playa actividad a realizar = armado de malla elaborada en la cancha de calentamiento, armado y figurado de acero. en la pista de Bmx no se realizaron labores






Powered by CamScanner

lunes / 08 / mayo / 2023
Hora inicio= 7:00am Hora Final= 5:00pm Clima= Soleado lugar de trabajo= Cancha de Voleibol actividad a realizar= armado de malla eslaborada en la cancha de Calentamiento, Excavacion de zapata y Viga en la cancha N° 2, armado y figurado de Acero. en la pista de Bmx fundieron Viga y colocaron tubos.





martes / 09 / mayo / 2023
Hora inicio= 7:00am Hora Final= 5:00pm Clima= Soleado lugar de trabajo= cancha de Voleibol playa 1 Actividad a realizar= armado de malla eslaborada en la cancha de Calentamiento, Excavación de zapata y Viga. en la pista de Bmx Se Fundio pedestal armado y figurado de acero, Fundieron Viga y colocación tubos.





miercoles / 10 / mayo / 2023
Hora inicio= 7:00 am Hora Final= 5:00pm Clima= nublado lugar de trabajo= cancha de Voleibol Playa actividad a realizar= armado de malla eslaborada en la cancha de Calentamiento, fundida de zapata y Viga se Colocaron tubos. en la pista de Bmx se armo formaleta para Viga y se Fundio Viga.

Powered by CamScanner
