Bogotá D.C. diciembre 11 de 2018.
CDP-177-2018.

CODIPRO LTDA.
Ingeniería & Arquitectura

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
Atn: Ingeniero LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor de Contrato
Popayán (Cauca)

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: Tomo-1,
RADICACION 107971 13/12/2018 11:13:25 am
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

Referencia: **CONTRATO No. 921 de 2018 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".**

Asunto: **Acta de Costos de Interventoría No. 4.**

Cordial Saludo:

Con el presente estamos adjuntando la documentación requerida para el trámite del Acta de Costos de Interventoría No. 4 del contrato de la referencia.
Los documentos que se anexan son:

- Hoja de Ruta (MINFRA-MN-IN-8-FR-2 versión 1).
- Acta de Costos de Interventoría No. 4 (MINFRA-MN-IN-8-FR-1 versión 1).
- Formato de Afectación Presupuestal de las Obligaciones (AFINCO-FR-12 versión 1).
- Formato de Identificación Contractual (AFINCO-FR-13 versión 1).
- Informe Financiero y presupuestal contrato de Interventoría (MINFRA-MN-IN-15-FR-9 versión 1).
- Control aportes Legales y Seguridad Social (MINFRA-MN-15-FR-13)
- Certificado de pago parafiscales.
- Formato Garantías Contrato de Interventoría (MINFRA-MN-IN-15-FR-16)
- Soportes de pago de Parafiscales.
- Soportes Acta de Costos No. 4.

Quedamos atentos a cualquier observación o pronunciamiento.

Sin otro particular,

Atentamente,

JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
CODIPRO INGENIERIA LTDA.

Se anexa lo anunciado en ( ) folios.

CODIPRO LTDA.
Ingeniería & Arquitectura

Bogotá D.C. Diciembre 4 de 2018.
CDP-170-2018.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: Tomo-1,
RADICACION 104379 04/12/2018 02:51:16 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

Ingeniero:
LUIS EDUARDO LEDEZMA
Supervisor de Contrato
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
Popayán (Cauca)

Referencia: CONTRATO No. 921 de 2018
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Asunto: Informe Mensual de Interventoría No 4.

Cordial Saludo:

Para efectos de información y/o para el archivo correspondiente, con gusto estamos radicando el informe mensual de Interventoría No.4 de los Municipios de Balboa, Florencia, Mercaderes y Santa Rosa, que contienen las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la propia Interventoría, en los periodos comprendidos entre el uno (1) y el treinta (30) de noviembre de 2018.

Quedamos atentos a cualquier observación o aclaración que bien pueda presentarse.

Atentamente,

Ing. Luis Samuel Orduz
Director de Interventoría
Contrato 921 de 2018
CODIPRO INGENIERIA LTDA

Anexos: Informe Mensual No.4 en Físico un (1) volumen y en Medio Magnético.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL No. 4 **MES O PERIODO:** NOVIEMBRE 2018

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización		X		4
2.2	Inventario y estado inicial de la vía		X		4
2.3	Características técnicas del proyecto		X		4
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		X		24
3.1	Información general del contrato		X		24
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		X		25
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		X		30
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		X		30
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		X		31
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		31
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		31
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		31
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		31
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		31
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11	X		32
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		32
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		39
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		39
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17	X		39
4.11	Otros documentos seguimiento mensual		X		39
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	X		39
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2	X		39
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		40
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2	X		40
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		40
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		40
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		40
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato		X		41
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		X		42
5.3	Informes especialistas		X		43
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		X		43
5.5	Información otros programas y aplicativos		X		43
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		44
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		44
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		44
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		44
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		44
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	X		45
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		45
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2	X		45
7	**Conclusiones y recomendaciones**		X		45
8	**Anexos**		X		46
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		X		46
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		X		47
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales		X		47

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL N° 04 DE INTERVENTORIA
CONTRATO N° 0921 DE 2018

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONTRATISTA:

FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
CONTRATO DE OBRA N° 0495 de 2018

INTERVENTOR:

CODIPRO INGENIERIA LTDA

BOGOTA D.C., NOVIEMBRE DE 2018

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Tabla De Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 24
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 31
5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 41
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 44
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 45
8. ANEXOS. 46

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto describir las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra y el Interventor, durante el cuarto (4°) período de labores comprendido entre el 1° al 30 de noviembre de 2018. Se informa sobre el avance de la obra y en general del seguimiento al proyecto en cumplimiento de las funciones delegadas a CODIPRO INGENIERIA LTDA, con el acompañamiento de la Supervisión Técnica del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, TERRITORIAL CAUCA y la SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA.

Se incluyen las actividades desarrolladas en cumplimiento del Contrato de Obra No 495 de 2018, celebrado entre el Contratista LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, contrato éste que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

Las actividades de Interventoría incluidas en este informe son adelantadas por CODIPRO INGENIERIA LTDA, quien fue favorecido con la adjudicación del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-057-2018, mediante Contrato N° 921 de 2018 con objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto motivo del presente Informe cuyo objeto del contrato de obra es **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**, está localizado en el departamento del Cauca, vías terciarias de gran importancia para los Municipios favorecidos con las obras.

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS ha considerado hacer el Mejoramiento y Mantenimiento de estas vías, enfocado en la ejecución de obras para la atención de los sectores de mayor afectación, con el objetivo de atender las necesidades de mantenimiento preventivo o rehabilitación, dentro del alcance físico y los recursos presupuestales asignados a cada municipio, construyéndose algunas obras de arte, drenaje y seguridad vial. En el caso particular del Departamento del Cauca los sectores beneficiados por la construcción de obras, corresponden a los municipios de Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes.

Dentro de las metas físicas consideradas en los anexos técnicos para los Municipios anteriormente mencionados se encuentra que para el municipio de Santa Rosa se prevé la construcción de 249.30 ml de placa huella, 249.30 ml de Cunetas y 4 alcantarillas de 36"; en el Municipio de Balboa se han proyectado 767,60 ml de placa huella, 767.60 ml de cunetas, un muro de contención y 14 alcantarillas de 36", en el municipio de Florencia se estima la construcción de 124,50 ml de placa huella, 124,50 ml de cuneta y 14 alcantarillas de 36"; y por último para el Municipio de Mercaderes se prevé la construcción de 580 ml de placa huella, 580 ml de Cunetas, 2 box coulvert y 8 alcantarillas de 36".

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

2.1 LOCALIZACIÓN

El Proyecto de " **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017**", objeto del contrato, se encuentra localizado en ese departamento al sur del país, en los municipios de Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes del bajo Cauca.

SANTA ROSA

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Santa Rosa**.

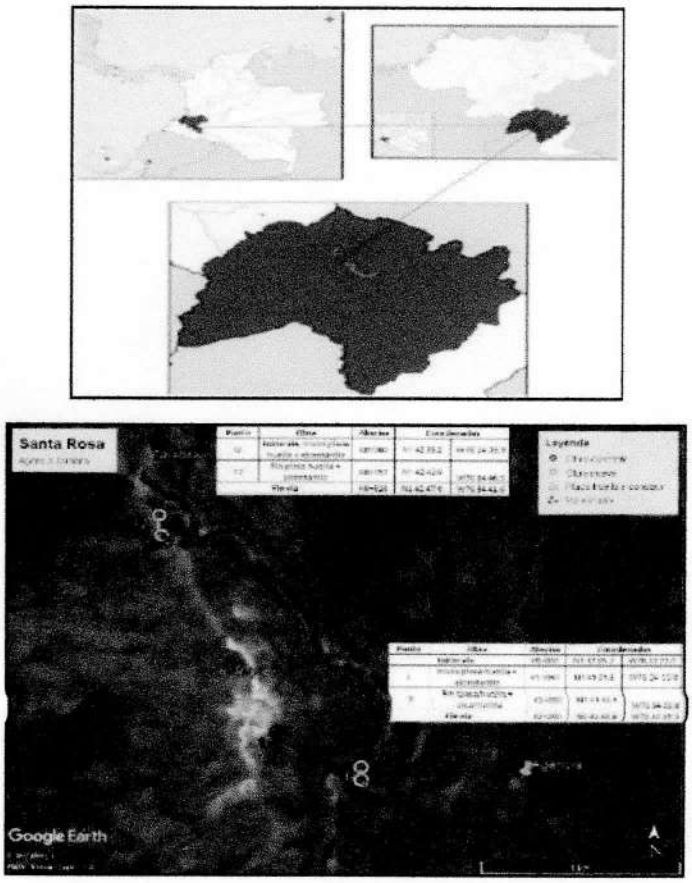


Figura N°1 Localización de la red terciaria, (Vía Agencia Tarabita).
Fuente: Anexo Técnico.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

A continuación presentamos los nuevos esquemas de localización actualizados de las obras en los tramos Cabecera Municipal-Agencia y Cruce de la Virgen-Tarabita:

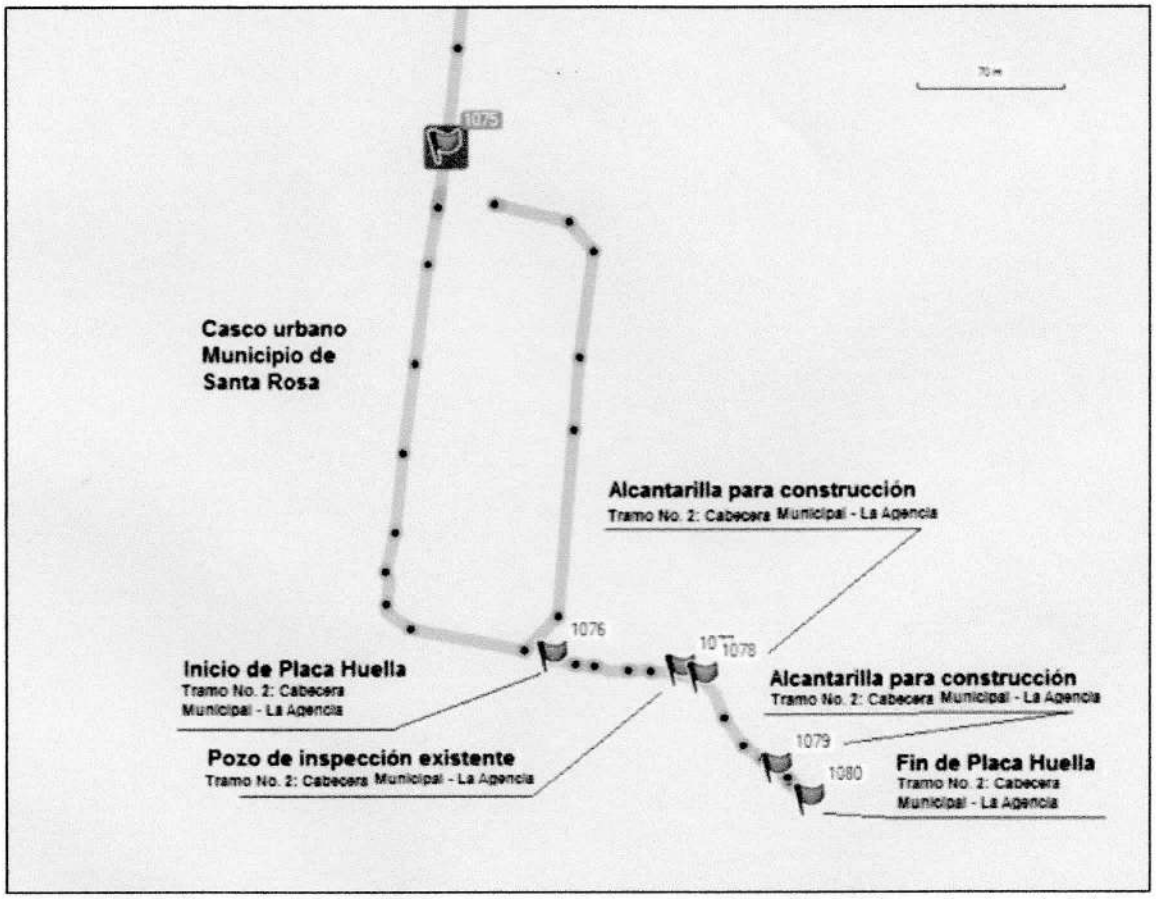


Figura N°2 Localización actualizada de placa huella y obras de arte para Tramo Casco Urbano – La Agencia; Inicio: K0+000, Fin: K0+159.3, longitud 159, 3 m.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

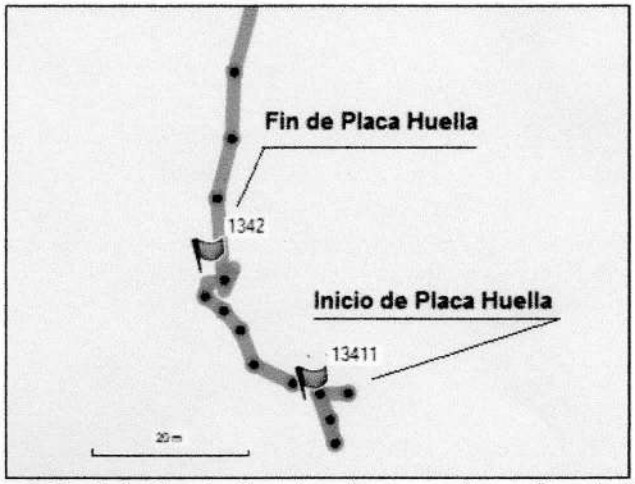


Figura N°3 Localización actualizada de placa huella y obras de arte para Tramo Cruce La Virgen – Tarabita; Inicio: K0+000, Fin: K0+090, longitud 90 m.

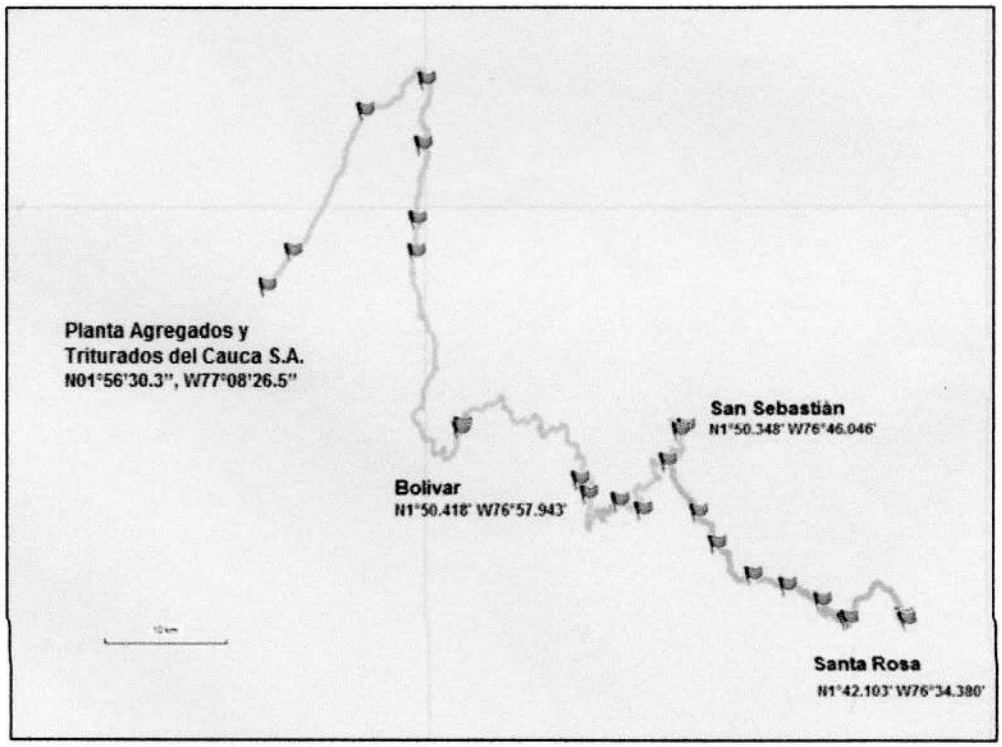


Figura N°4 Localización actualizada del recorrido desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta: Cabecera Municipal de Santa Rosa. Longitud de acarreo = 185Km.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

BALBOA

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Balboa**.

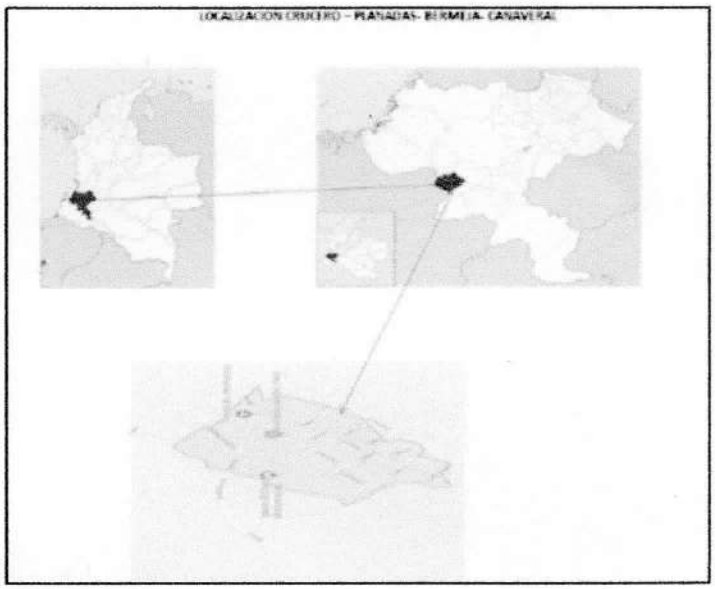


Figura N°5 Localización general del proyecto.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

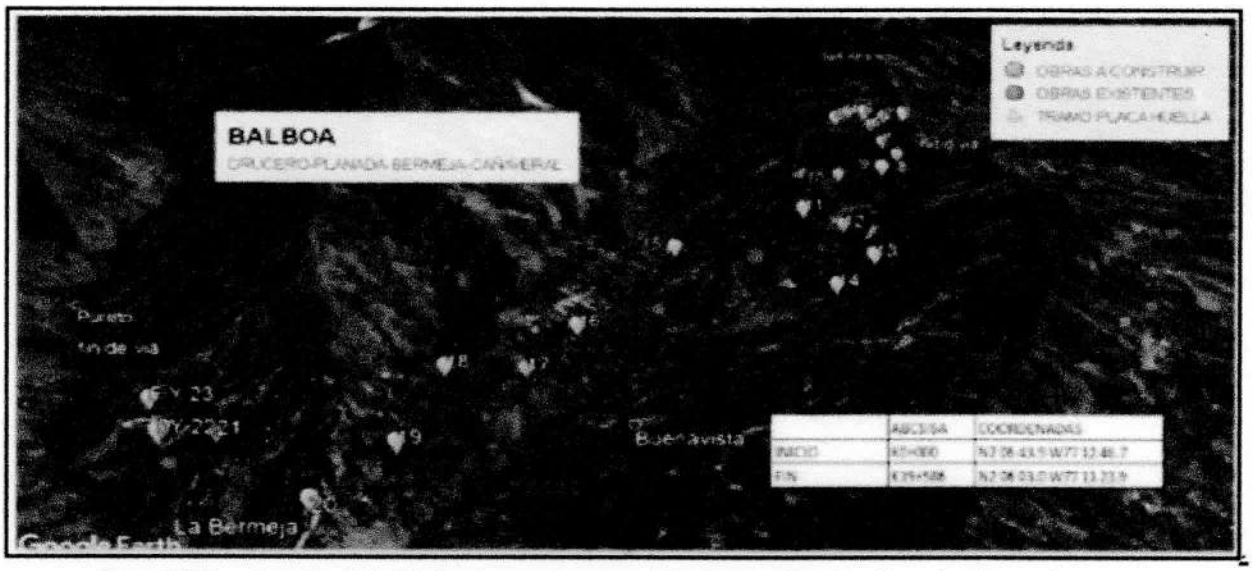


Figura N°6 Localización inicial de las obras en la red terciaria Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral.

A continuación presentamos los nuevos esquemas de localización actualizados de las obras en el tramo, Vía Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral:

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

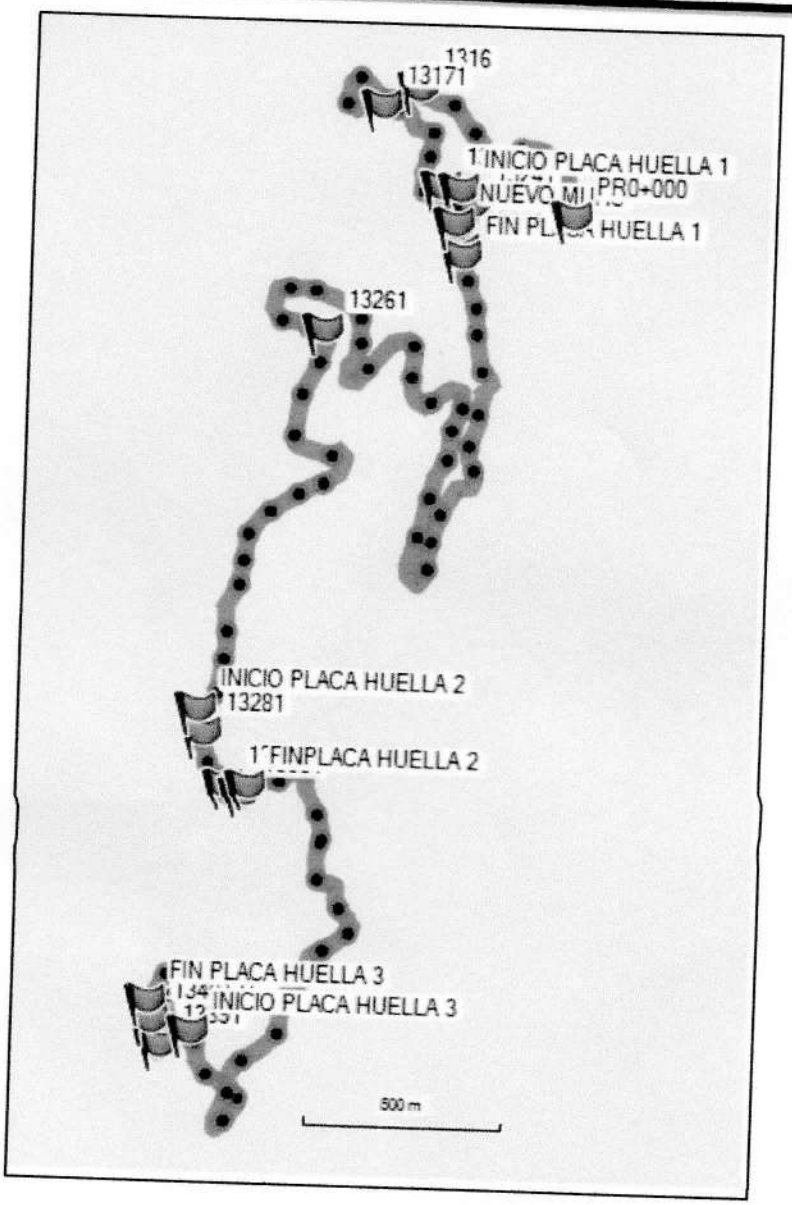


Figura N°7 Localización general actualizada de Placa Huella Tramo No. 1: Cruce La Planada-La Planada (Inicio K1+550, Fin K1+680), Tramo No. 2: La Planada- Versalles Bajo (Inicio K6+060, Fin k5+706.4), Tramo No. 3: La Cabaña-Escuela La Cabaña (Inicio K7+800, Fin K8+084)

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

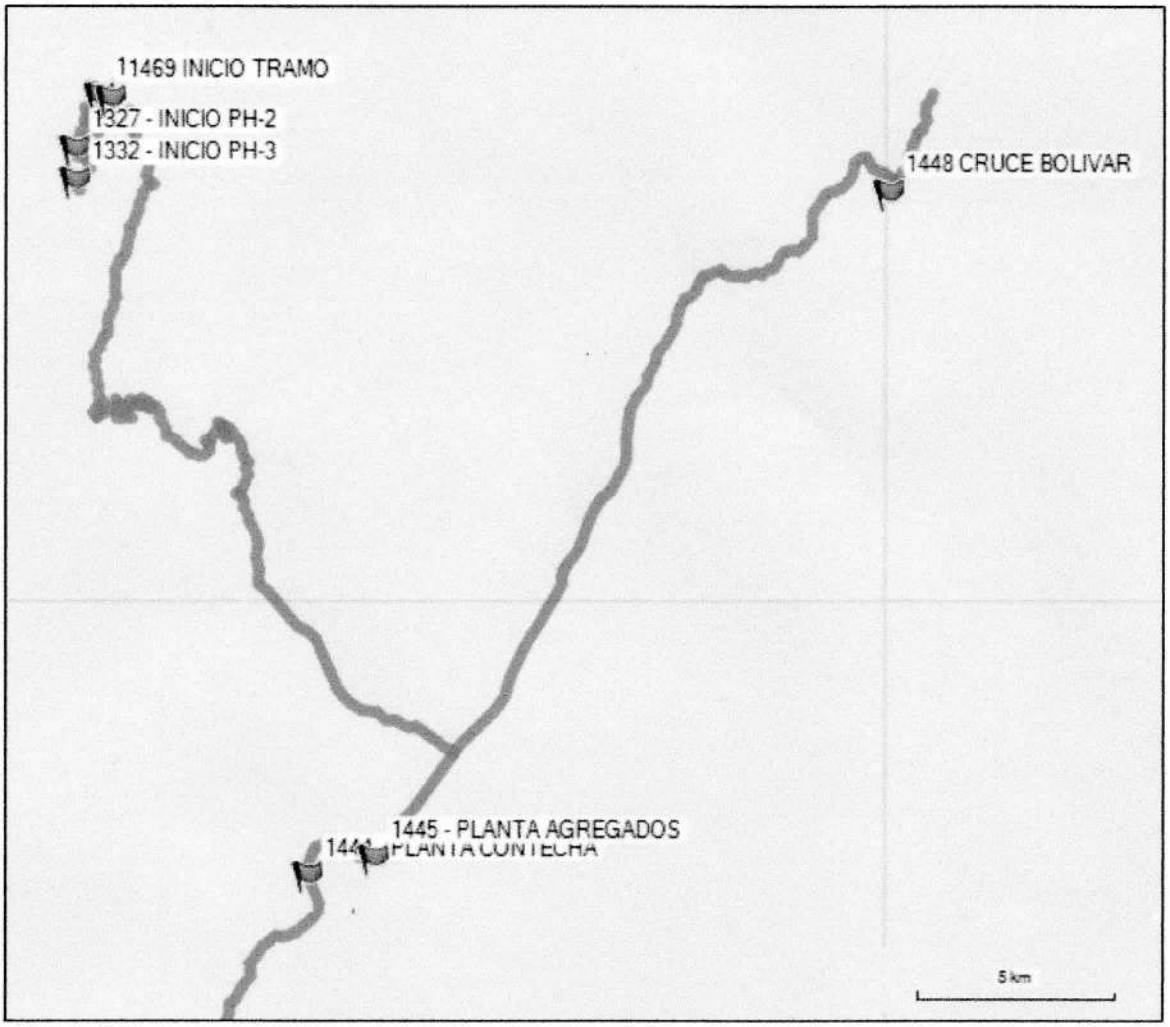


Figura N°8 Localización actualizada de recorrido desde Cantera hasta Tramo 1 Cruce La Planada-La Planada, longitud de acarreo = 40 Km; desde cantera hasta Tramo 2 La planada - Versalles Bajo, longitud de acarreo = 44Km; desde cantera hasta Tramo 3 La Cabaña-Escuela La Cabaña, longitud de acarreo = 46Km.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

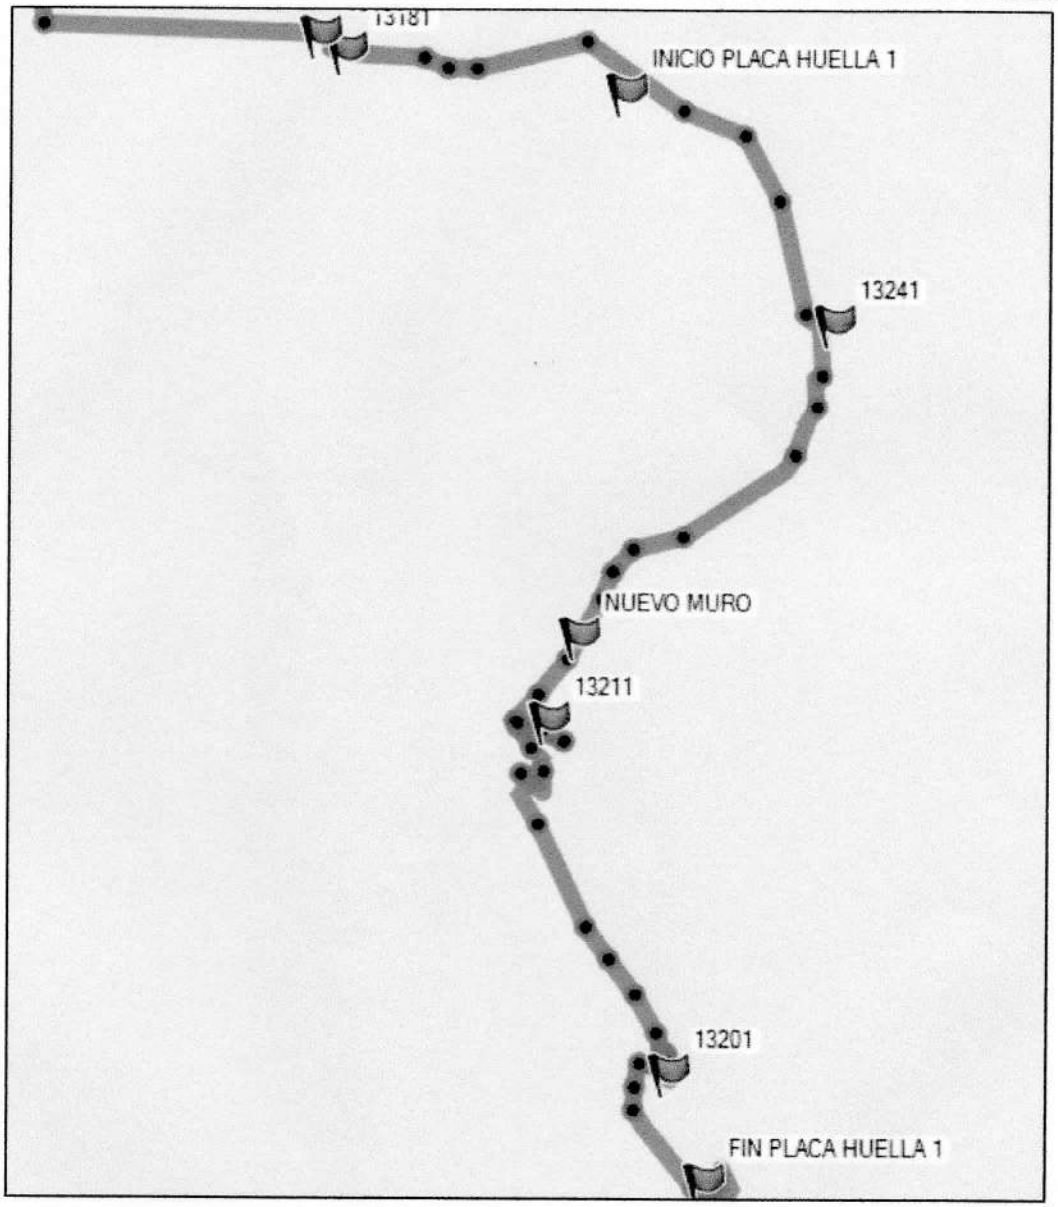


Figura N°9 Localización actualizada de Placa Huella Tramo No. 1: Cruce La Planada-La Planada, Inicio K1+550, Fin K1+680, Longitud = 130 m.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

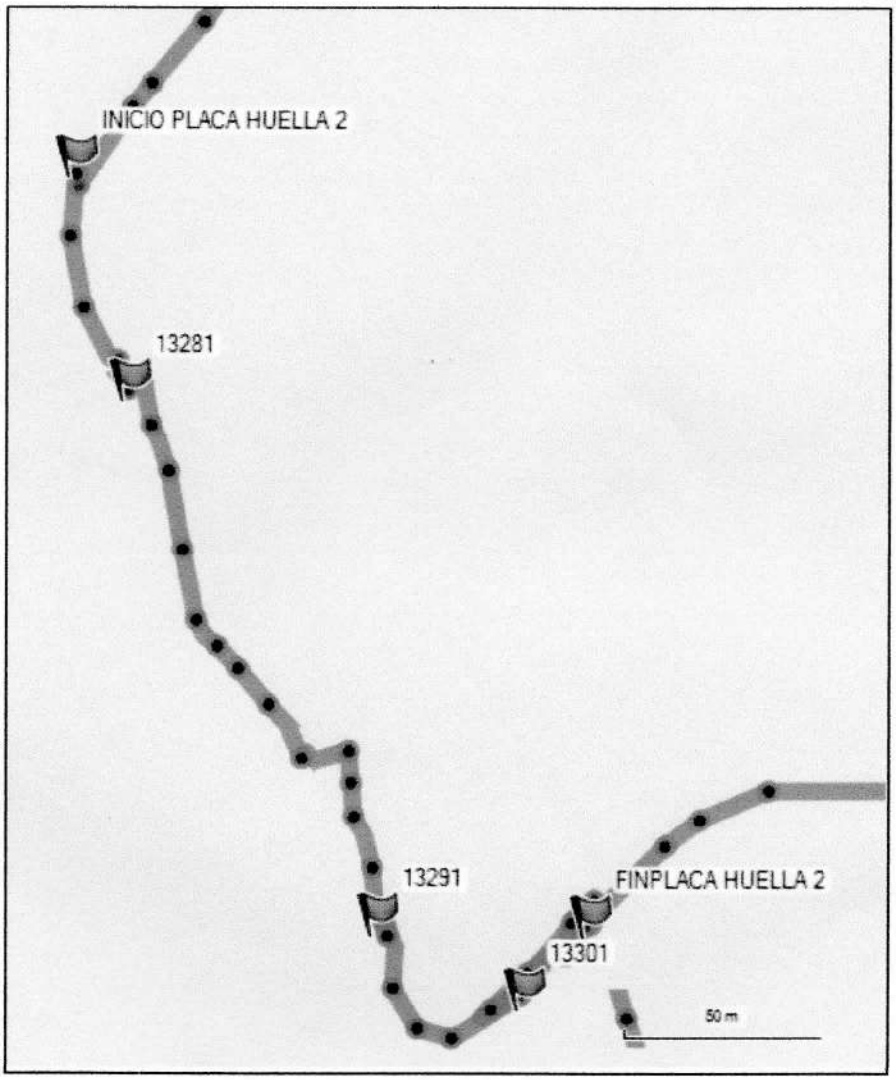


Figura N°10 Localización actualizada de Placa Huella Tramo No. 2 La planada- Versalles Bajo: Inicio K6+060, Fin K5+706.4, Longitud = 353.6 m.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

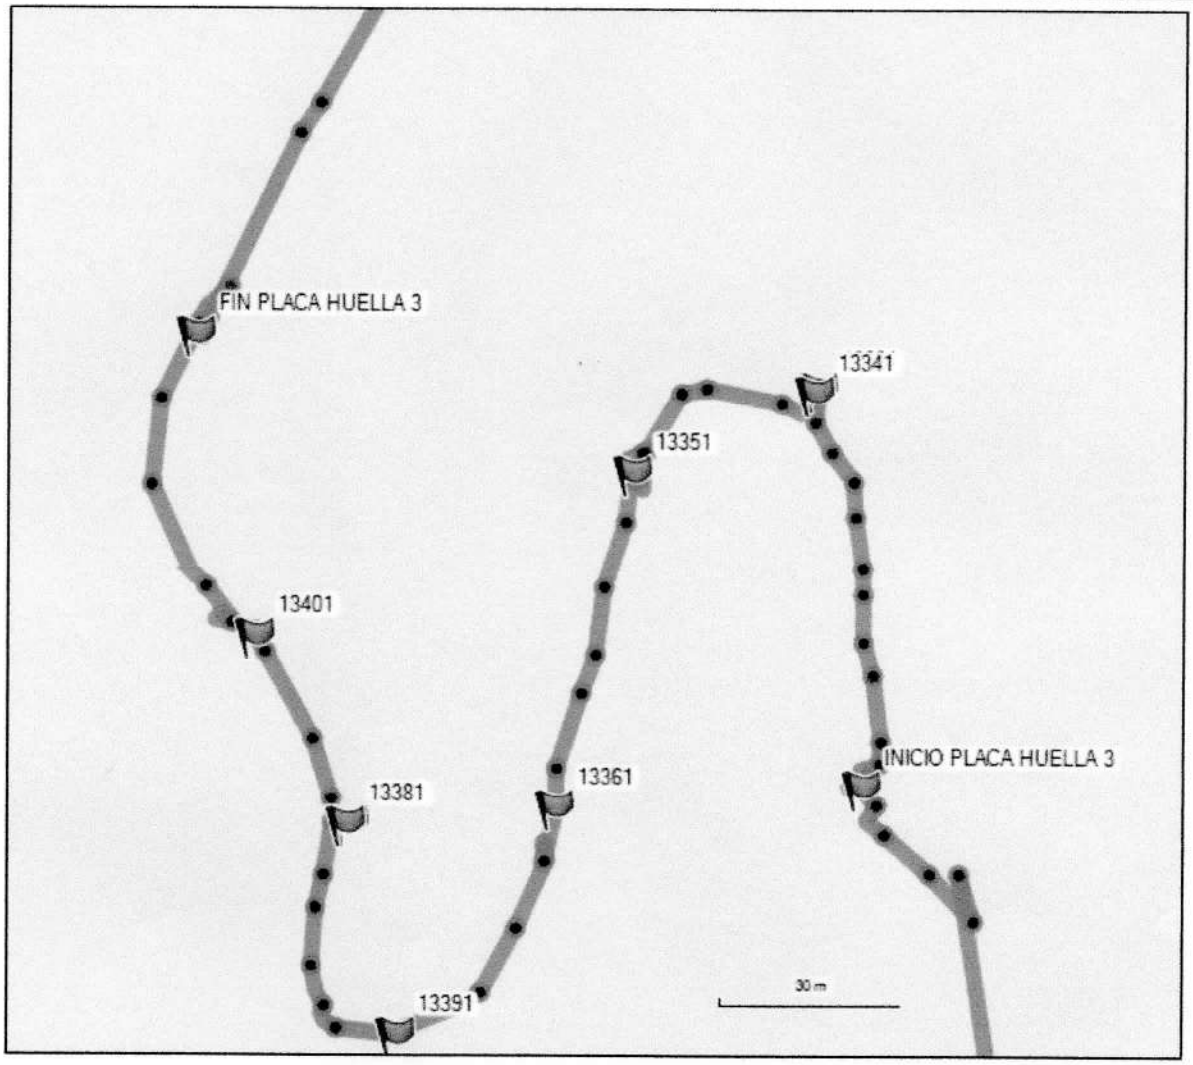


Figura N°11 Localización actualizada de Placa Huella Tramo No. 3 La Cabaña-Escuela La Cabaña: Inicio K7+800, Fin K8+084, Longitud = 284 m.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

FLORENCIA

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Florencia**.

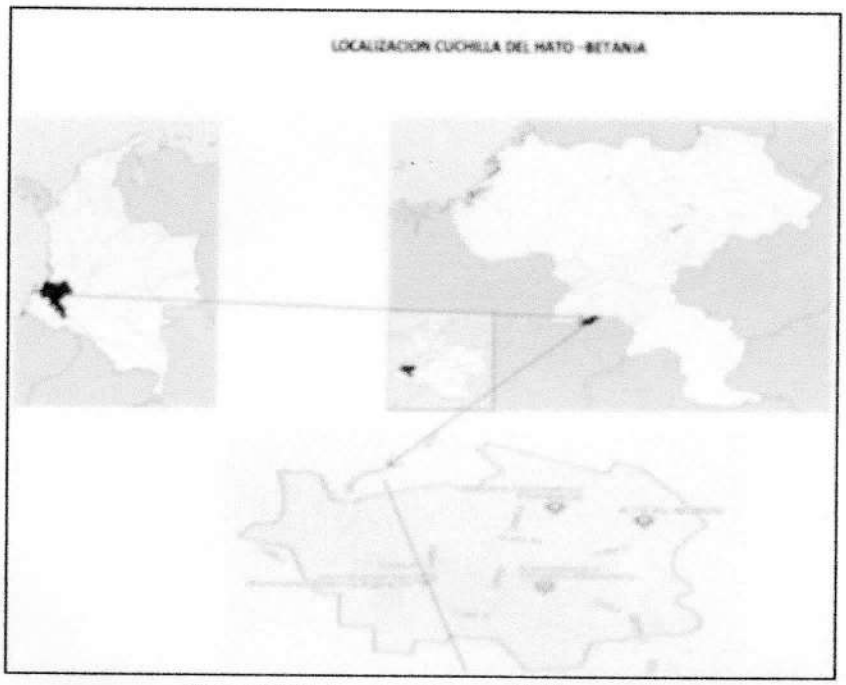


Figura N°12 Localización general del proyecto

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

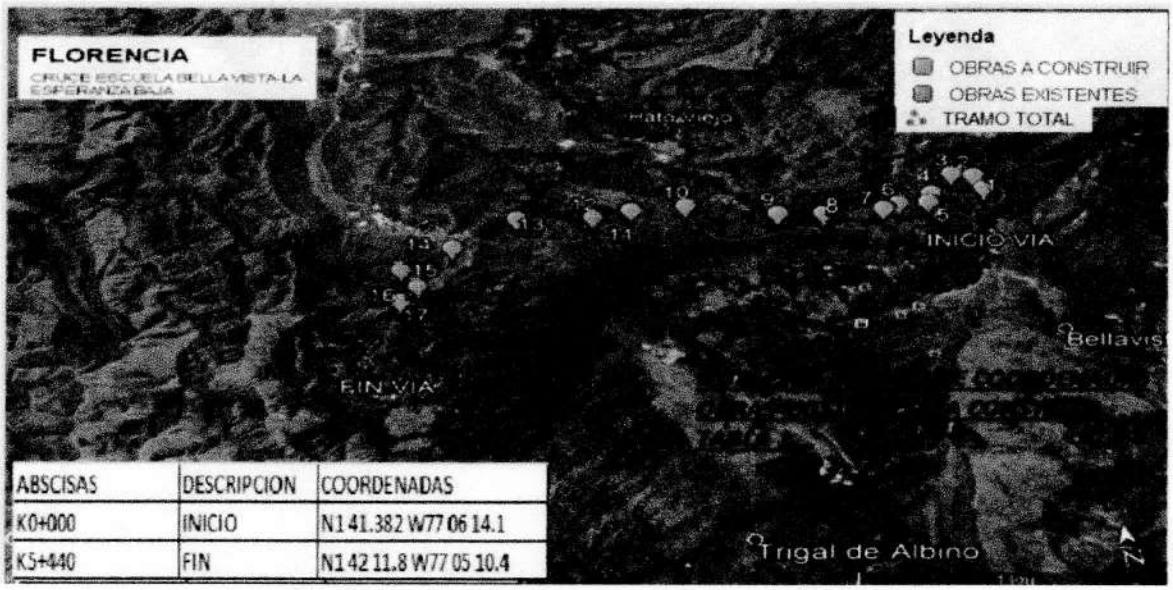


Figura N°13 Localización de la red terciaria, (Vía Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja). Alcantarilla inicial K0+820, Alcantarilla final K5+400



Figura N°14 Localización inicial de la red terciaria, (Cuchilla del Hato – Betania). Tramo a intervenir K1+300 a K1+425, longitud a intervenir 124,5 m.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

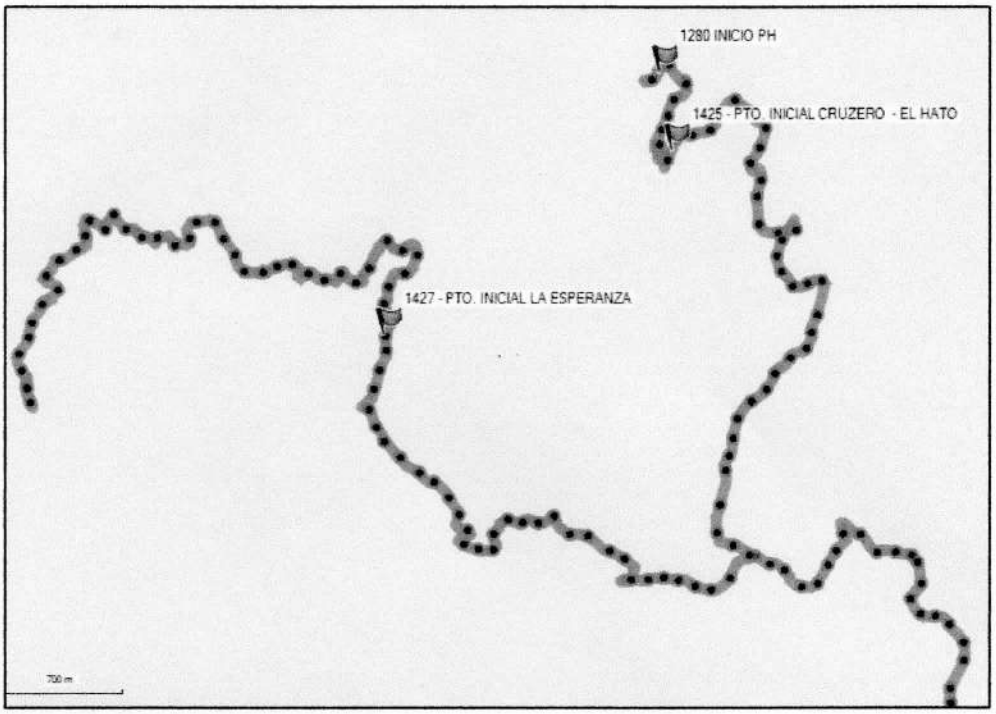


Figura N°15 Localización actualizada de tramos a intervenir, Sector 1: Alcantarilla inicial K0+830, Alcantarilla final K5+135; Sector 2 Cuchilla del Hato – Betania: Inicio K1+194,5 Fin K1+319, Longitud = 124,5.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

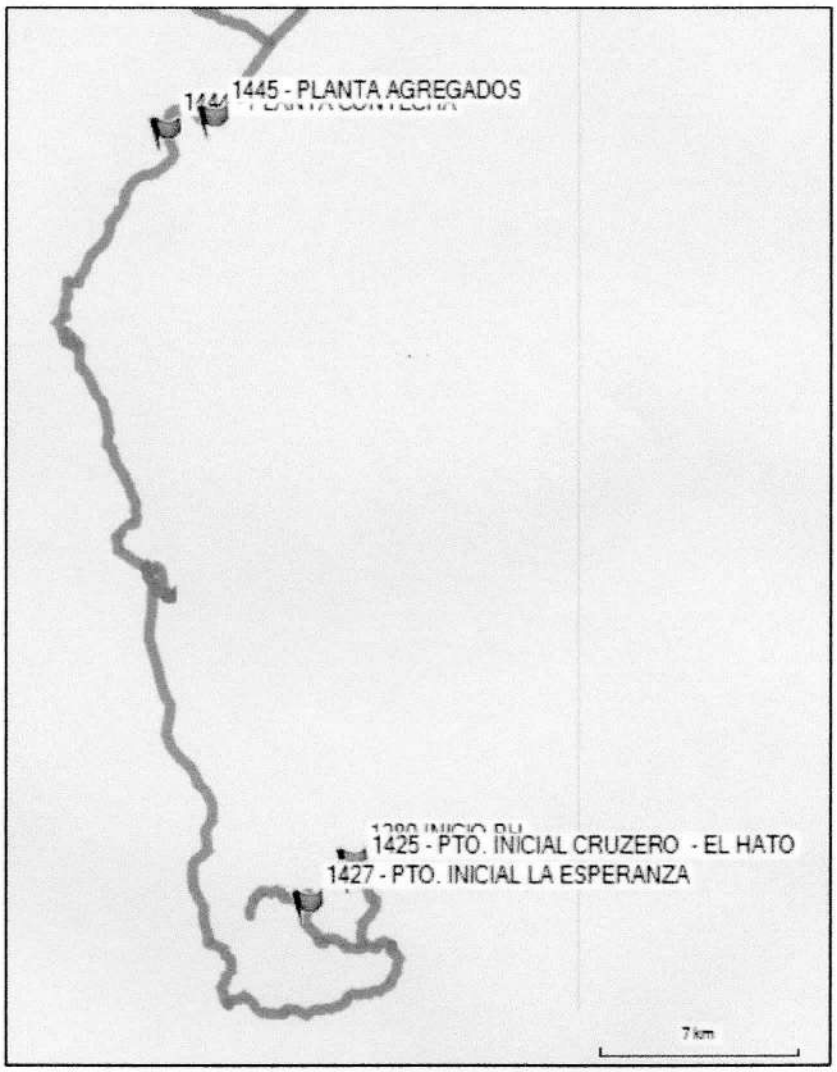


Figura N°16 Localización actualizada de distancia desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta Sector 1 Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja: 65,00 Km; desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta Sector 2 Vía Cuchilla Del Hato – Betania: 63,00 Km.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

MERCADERES

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Mercaderes**.

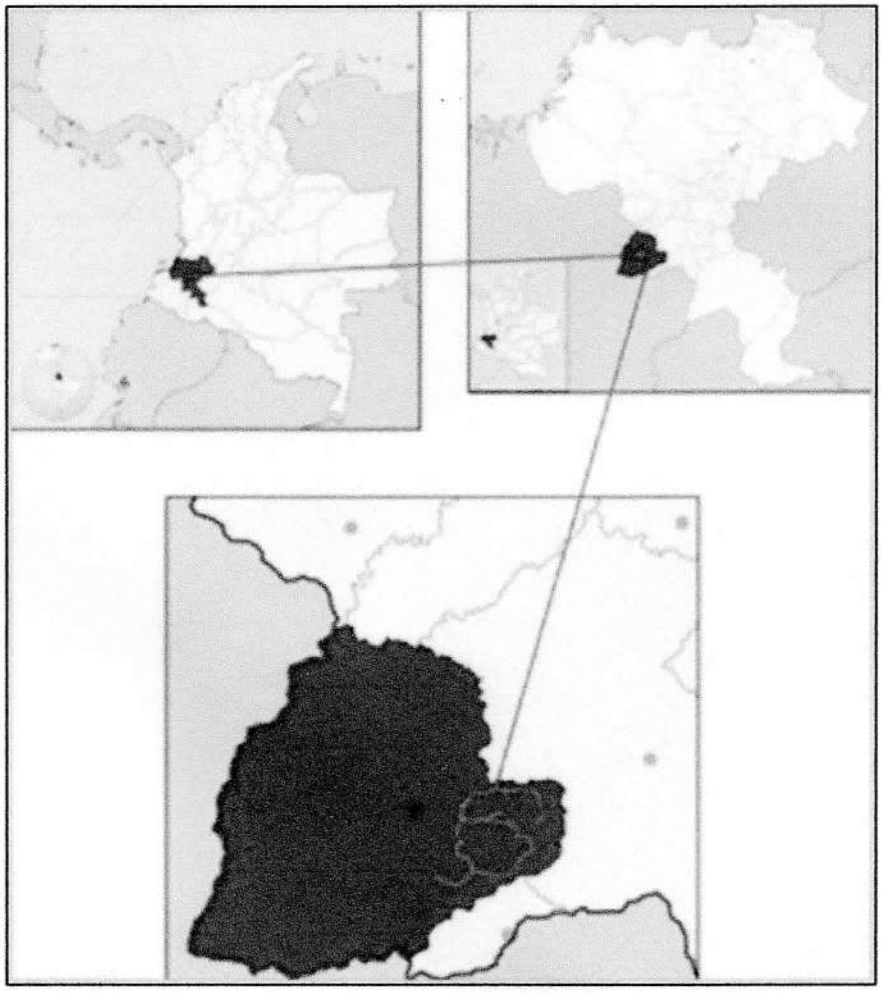


Figura N°17 Localización general del proyecto.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

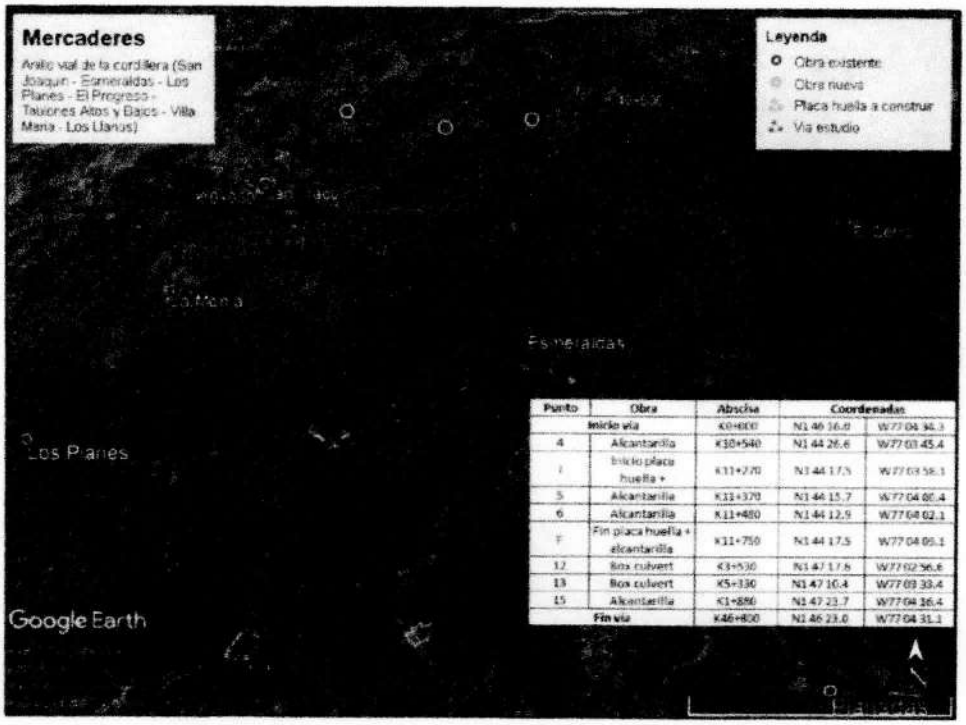


Figura N°18 Localización inicial del proyecto, anillos viales No. 1 y No. 2.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

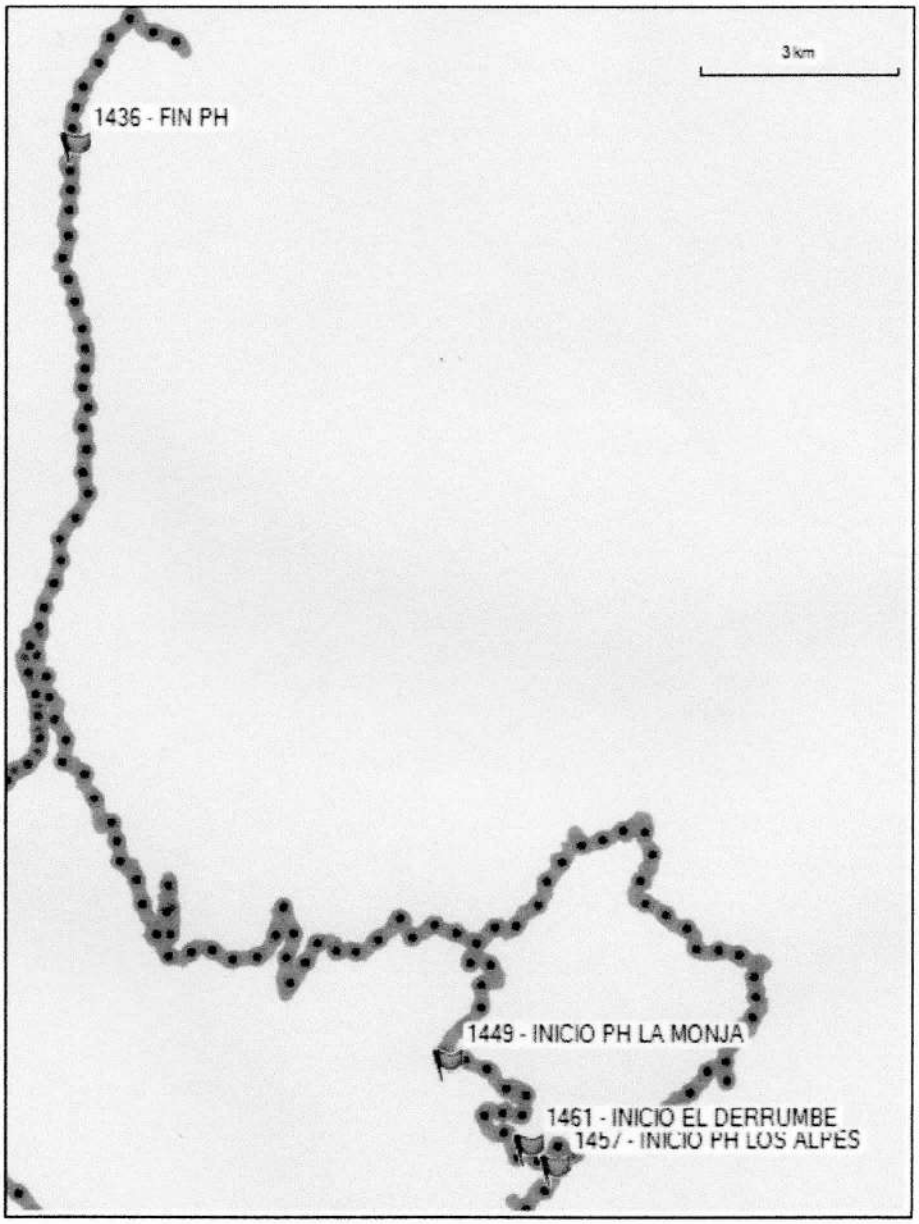


Figura N°19 Localización actualizada del proyecto. Sector 1 Anillo Vial de La Cordillera: Tramo No. 1 San Joaquín – La Monja: Inicio K3+100, Fin K3+250, longitud 150 m; Tramo No. 2 Los Alpes: Inicio K7+870, Fin K8+090, longitud 220 m; Tramo No. 3 Cruce Los Alpes: Inicio K9+630, Fin K9+690, longitud 60 m. Sector 2 Anillo Vial La Curva – El Pilón: Tramo No. 1 Los Medios: Inicio K8+585, Fin K8+735, longitud 150 m.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

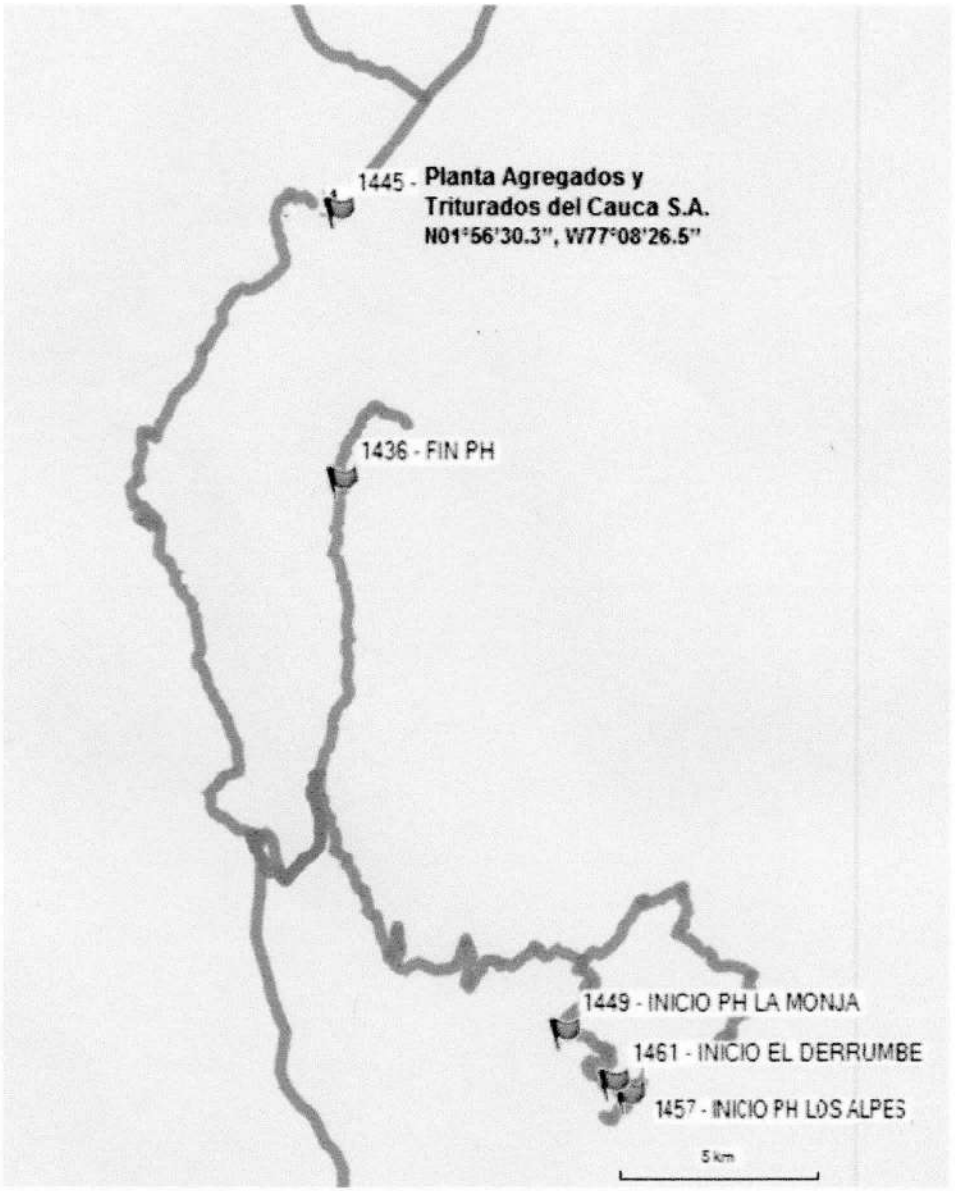


Figura N°20 Localización actualizada del recorrido desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta: Sector 1 Anillo Vial de La Cordillera: Tramo No. 1 San Joaquín – La Monja: 54 Km; hasta Tramo No. 2 Los Alpes: 59 Km; hasta Tramo No. 3 Cruce Los Alpes: 61 Km. Hasta Sector 2 Anillo Vial La Curva – El Pilón: Hasta Tramo No. 1 Los Medios: 41 Km.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

Las condiciones que presentan actualmente las vías en los sitios y tramos identificados en la evaluación de la red terciaria, realizada con criterio técnico por los profesionales enviados para el efecto por la Federación Nacional de Cafeteros y relacionados en el Anexo Técnico para su intervención, son vías con altas pendientes que generan un lavado continuo de los materiales finos por ausencia de obras de drenaje, representando en tiempos de invierno, inestabilidad en las vías de acceso y dificultad en la conectividad terrestre de las zonas rurales de cada municipio (Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes), disminuyendo la capacidad y nivel de servicio, y perjudicando la comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

Teniendo en cuenta lo descrito en el Anexo Técnico del Contrato No 495 de 2018, las obras proyectadas para ejecución son producto de los informes técnicos donde se determinan las necesidades de **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017".**

Igualmente se define que estas necesidades pueden variar una vez se elaboren los estudios y diseños de los puntos a intervenir en la vía, y los correspondientes cálculos de los componentes geotécnicos, hidráulicos, estructurales y ambientales, que presentó el Contratista a la Interventoría para su aprobación.

Para esta primera etapa se contempló un plazo de un (01) mes para la elaboración, entrega, revisión, ajustes y aprobación por parte de Interventoría de los Estudios y Diseños, y que incluyen los levantamientos topográficos, diseños geométrico, geotécnico, hidráulico, y finalmente los diseños estructurales de las soluciones definidas, todos ellos con sus respectivos informes.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

En el plazo restante se programó la etapa de ejecución de las obras de mantenimiento y construcción definidas para los sitios críticos, previa a la aprobación de diseños y presupuestos de obra.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL (Incluye seguimiento, garantías contractuales)

N° DEL CONTRATO	0495-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	25 DE ENERO DEL 2018
OBJETO	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
CONTRATISTA	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT	860.007.538-2
DEPARTAMENTO	CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.026.230.310,94 Moneda Corriente para todo el Departamento del Cauca.
BALBOA	$ 880.158.717,25 COSTO DIRECTO
FLORENCIA	$ 432.186.167,24 COSTO DIRECTO
SANTA ROSA	$ 446.261.456,21 COSTO DIRECTO
MERCADERES	$810.012.503,31 COSTO DIRECTO
PLAZO DE EJECUCIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
ORDEN DE INICIO PARA FEDERACION DE CAFETEROS	22 DE MAYO DE 2018
FECHA TERMINACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ACTAS PARCIALES	N/A

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Durante este periodo se realizaron trabajos en conjunto con personal designado por la Federación Nacional de Cafeteros en cada uno de los municipios, para atender la documentación necesaria y formalizar el cambio de ubicación de coordenadas en las obras proyectadas para cada sector.

A continuación, se describen las actividades realizadas en cada Municipio:

Santa Rosa

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoría el día 7 de noviembre del 2018, para tratar temas relacionados con Estudios y Diseños, modificación a la localización de las obras, presupuestos y costos de actividades, contando con la asistencia de los ingenieros Adrián Valencia, María de los Ángeles Ceballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoría los ingenieros Luis Orduz y Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos de entrega por parte del contratista, tal como la justificación técnica de los sectores Cruce de La Virgen-Tarabita y Cabecera- La Agencia, APU aprobado, actas de aprobación de presupuestos, acta de aprobación de estudios y diseños, AZ de estudios y diseños, planos de detalle, programación de obra, programa de inversión, flujo de caja, acta de aprobación de presupuesto y cuadro para modificación de costos en la ficha MGA. Actividades que se desarrollaron en mesas de trabajo entre personal de la Federación Nacional de Cafeteros e interventoría durante los días posteriores a la reunión para su entrega y aprobación, los documentos fueron radicados el día 16 de noviembre del 2018 en el Invias.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Se realiza la reunión de socialización el día 24 de noviembre de 2018, con la participación del ingeniero Lindón Tintinango secretario de la oficina de planeación Municipal como representante de la Alcaldía de Santa Rosa, los señores Fernando Gómez, Holmes Ruiz y Eduer Guamangoa como presidentes de la JAC, líderes y comunidad en general. La profesional Claudia Macías residente social introduce a la comunidad a los aspectos generales del proyecto y sociales de la presentación, para posteriormente dar participación al ingeniero Javier Martínez residente de obra en los temas técnicos de las obras a ejecutarse en los dos sectores del Cruce de la Virgen-La Tarabita y Cabecera-La Agencia, ambos profesionales representando a la Federación Nacional de Cafeteros.

Una vez concluida la presentación, la comunidad manifiesta interés relacionado con los temas de mano de obra y contratación de personal no calificado, por último, se establecen compromisos para la constitución del comité de veeduría ciudadana en días posteriores a esta jornada ya que no se contó con la participación de todos los representantes de las veredas aledañas.

Balboa

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoría el día 7 de noviembre del 2018, para tratar temas relacionados con estudios y diseños, modificación a la localización de las obras, presupuestos y costos de actividades, contando con la asistencia de los ingenieros Adrián Valencia, María de los Ángeles Ceballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoría los ingenieros Luis Orduz y Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos de entrega por parte del contratista, tal como la justificación técnica del sector Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral, APU aprobado, actas de aprobación de presupuestos, acta de aprobación de estudios y diseños, AZ de estudios y diseños, planos de detalle, programación de obra, programa de inversión, flujo de caja, acta de aprobación de presupuesto y cuadro para modificación de costos en la ficha MGA. Actividades que

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

se desarrollaron en mesas de trabajo entre personal de la Federación Nacional de Cafeteros e interventoría durante los días posteriores a la reunión para su entrega y aprobación, los documentos fueron radicados el día 16 de noviembre del 2018 en el Invias.

Continuando con las actividades sociales previas al inicio de obra en compañía con la residente social Claudia Macías y el ingeniero Otoniel Ledezma se tramitaron durante los días 14 y 15 de noviembre del 2018, 2 permisos de agua, 2 permisos de baño, 1 autorización para disposición de materiales sobrantes de excavación, 3 permisos de intervención en los tres sectores de placa huella localizados en el tramo Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral y adicionalmente 8 actas de vecindad; 1 acta en el tramo Crucero-La planada, 3 actas en La Planada-Versalles Bajo y 4 actas en La Cabaña-La Escuela La Cabaña.

Para la fecha del 19 de noviembre del 2018 se convocaron a representantes de Alcaldía, presidentes de las JAC, líderes sociales y comunidad en general para participar en la reunión de socialización del proyecto, que se llevó a cabo en la caseta comunal del corregimiento de la Planada, donde la residente social Claudia Macías en representación de la FNC dio inicio a la presentación e introducción a los antecedentes y temas sociales en compañía del ingeniero Oscar Ojeda, residente de obra quien además intervino en los temas técnicos de la socialización y reubicación de las obras.

Finalizada la intervención de los representantes de la FNC, la comunidad manifestó la inconformidad de las condiciones en las que se presentan actualmente las vías alternas por lo cual, se establecen unos compromisos en conjunto con la representante social Viviana Burbano de la Alcaldía de Balboa. Por último, para esta misma jornada se constituye el comité de veeduría ciudadana según Ley 850 del 2003 y Ley 1757 de 2015, con el fin de vigilar el contrato.

Florencia

En cumplimiento con formatos y gestión de calidad del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) se solicitó al contratista hacer uso de los formatos INVIAS para

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

documentar las actas de vecindad en los dos sectores Cruce Escuela de La Virgen- La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato- Betania. Ya que actualmente el contratista presentó 14 formatos de actas complementarias y anexo registro fotográfico.

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoría el día 7 de noviembre del 2018, para tratar temas relacionados con estudios y diseños, modificación a la localización de las obras, presupuestos y costos de actividades, contando con la asistencia de los ingenieros Adrián Valencia, María de los Ángeles Ceballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoría los ingenieros Luis Orduz y Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos de entrega por parte del contratista, tal como la justificación técnica de los sectores Cruce Escuela de la Virgen – La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania, APU aprobado, actas de aprobación de presupuestos, acta de aprobación de estudios y diseños, AZ de estudios y diseños, planos de detalle, programación de obra, programa de inversión, flujo de caja, acta de aprobación de presupuesto y cuadro para modificación de costos en la ficha MGA. Actividades que se desarrollaron en mesas de trabajo entre personal de la Federación Nacional de Cafeteros e interventoría durante los días posteriores a la reunión para su entrega y aprobación, los documentos fueron radicados el día 16 de noviembre del 2018 en el Invias.

El día 27 de noviembre de 2018, la residente social Gloria Quintero convoca a la comunidad en general para participar en la conformación de la veeduría ciudadana y la instalación del punto de atención a la comunidad en las instalaciones de la FNC sede Florencia.

Mercaderes

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoría el día 7 de noviembre del 2018, para tratar temas relacionados con estudios y diseños,

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

modificación a la localización de las obras, presupuestos y costos de actividades, contando con la asistencia de los ingenieros Adrián Valencia, María de los Ángeles Ceballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoría los ingenieros Luis Orduz y Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos de entrega por parte del contratista, tal como la justificación técnica de las vías: Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón), APU aprobado, actas de aprobación de presupuestos, acta de aprobación de estudios y diseños, AZ de estudios y diseños, planos de detalle, programación de obra, programa de inversión, flujo de caja, acta de aprobación de presupuesto y cuadro para modificación de costos en la ficha MGA. Actividades que se desarrollaron en mesas de trabajo entre personal de la Federación Nacional de Cafeteros e interventoría durante los días posteriores a la reunión para su entrega y aprobación, los documentos fueron radicados el día 16 de noviembre del 2018 en el Invias.

Los días 15 y 16 de noviembre de 2018, se adelantaron las siguientes actividades:
1. Radicación PMT en la Alcaldía de Mercaderes.
2. Radicación invitación a reunión de socialización inicio de obra en la Alcaldía de Mercaderes.
3. Levantamiento de (5) actas de vecindad.
4. Permisos de intervención (6).
5. Permisos de uso de baño (4).
6. Permisos utilización de agua (6)
7. Permiso material de excavación (5)

Se llevó a cabo la socialización el día 23 de noviembre de 2018 así:
Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) se contó con la asistencia del ingeniero Jhoan Cárdenas y Luis Felipe Bedoya por parte de la Federación de Cafeteros, Diana Paz de interventoría, Sigifredo Diaz Criollo y Flanklin Pinta por parte de la Alcaldía de Mercaderes, Gentil Castillo Presidente JAC Los Alpes, Luis

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Gonzalo Luna Presidente JAC La Monja, Duvar Alexis Paz Presidente JAC Tablones Bajos, Olmedo Muñoz Fiscal JAC Esmeraldas, Líderes sociales y comunidad en general.

En cuanto al Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón): se contó con la asistencia del ingeniero Jhoan Cárdenas y Luis Felipe Bedoya por parte de la Federación de Cafeteros, Diana Paz de interventoría, Sigifredo Diaz Criollo por parte de la Alcaldía de Mercaderes, Anderson Vega Rivera presidente de la JAC Los Medios, Líderes sociales y comunidad en general.

Adicionalmente, el día 23 de noviembre de 2018 se conformaron (2) las veedurías ciudadanas: una para el Anillo vial de la Cordillera con (6) integrantes y otra para el Anillo vial la Curva con (4) integrantes.

3.2.1 Avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato.

Tanto La Federación Nacional de Cafeteros, como la Interventoría, estamos atentos a la actualización del Gesproy para poder dar inicio a la ejecución física de las obras en todos los cuatro (4) Municipios.

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

La Interventoría mediante Oficio CDP-146-2018 radicó los presupuestos con los respectivos APUs, correspondientes a las actividades a desarrollar para la localización definitiva de las obras, por lo que no se puede advertir por el momento acerca de la eventual aparición de APUs no previstos.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

La Interventoría solicitará al Contratista dar cumplimiento a la ejecución de las actividades de acuerdo a la Programación de Obra presentada con fecha de inicio de obras 20 de Noviembre del 2018 para los tramos localizados en los municipios de Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes, puesto que estas corresponden a la fase siguiente a la aprobación de estudios y diseños.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Personal de la Interventoría aprobado por INVIAS Subdirección Red Terciaria y Férrea, ha venido laborando desde el inicio de las actividades y lo continuará haciendo hasta el 31 de diciembre de 2018 según lo pactado contractualmente.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

N/A

4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3. Revisar Anexos.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 Revisar Anexos.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se presenta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 donde se relaciona el personal en obra utilizado. Revisar Anexos.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. Revisar Anexos

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10. Revisar Anexos.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11. Cabe aclarar que en este periodo no hubo Ensayos de laboratorio ya que el Proyecto se encuentra en fase de Complementación y ajustes a Estudios y Diseños. Revisar Anexos.

4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 con la relación de personal en obra. Revisar Anexos.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2018-10
Periodo Salud : 2018-11

Se certifica que en la fecha 2018-11-09 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificacion NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SOLARTE LLANTEN ADRIANA ISABEL identificado con CC-25397502, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		**Razón Social**		
NI-860007538		FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS		
Datos Planilla				
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**	
13714086	E	2018-11-09	0,0696	
Datos Administradoras				
Tipo	**NIT**	**Codigo**	**Nombre**	**Dias**
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	30
ARL	800256161	14-28	ARL SURA	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2018-10
Periodo Salud : 2018-11

Se certifica que en la fecha 2018-11-09 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RAMOS GALINDO LINDA ESTER TABITA identificado con CC-1061749004, dirigido a las siguientes entidades administradoras.

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
NI-860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
13714086	E	2018-11-09	0.0696

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	814000337	ESSC18	Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Nariño EMSSANAR E.S.S	30
ARL	800256161	14-28	ARL SURA	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2018-10
Período Salud : 2018-11

Se certifica que en la fecha 2018-11-09 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MACIAS MACIAS CLAUDIA YOHANA identificado con CC-1010168763, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
NI-860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
13714086	E	2018-11-09	0,01044

Datos Administradoras				
Tipo	**NIT**	**Código**	**Nombre**	**Dias**
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	901097473	EPS044	MEDIMAS EPS S.A.S.	30
ARL	800256161	14-28	ARL SURA	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2018-10
Período Salud : 2018-11

Se certifica que en la fecha 2018-11-09 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado QUINTERO MANRIQUE GLORIA PATRICIA identificado con CC-52837113, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
NI-860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
13714086	E	2018-11-09	0.01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	901097473	EPS044	MEDIMAS EPS S.A.S.	30
ARL	800256161	14-28	ARL SURA	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2018-09
Período Salud : 2018-10

Se certifica que en la fecha 2018-10-08 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SANCHEZ GERRERO JAVIER MARTIN identificado con CC-93378931, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
NI-860007538	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
13595131	E	2018-10-08	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Dias
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	28
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28
ARL	800256161	14-28	ARL SURA	28
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	28
SENA	899999034	PASENA	SENA	28
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	28

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2018-10
Período Salud : 2018-11

Se certifica que en la fecha 2018-11-09 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CHACON PENAGOS FERNANDO NICOLAS identificado con CC-10303488, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		**Razón Social**		
NI-860007538		FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS		
Datos Planilla				
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**	
13714086	E	2018-11-09	0,0696	
Datos Administradoras				
Tipo	**NIT**	**Código**	**Nombre**	**Dias**
AFP	900336004	25-14	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	800256161	14-28	ARL SURA	30
CCF	891500182	CCF14	Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA	30
SENA	899999034	PASENA	SENA	30
ICBF	899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

4.8 INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14. Revisar Anexos.

4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-IN-15-FR-15. Revisar Anexos.

4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17. Revisar Anexos.

4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjuntan los Formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y MINFRA-MN-IN-2-FR-2. Revisar Anexos.

2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjuntan los Formatos PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-2. Revisar Anexos.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

3. ACTAS DEL CONTRATO

- **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.**

  Formato MINFRA-IN-14-FR-1. Durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2018 se realizaron los Comités de Obra semanales, que se indican en el documento adjunto. Revisar Anexos.

- **ACTA DE REUNIÓN**

En el periodo correspondiente del 1° al 30 de noviembre de 2018, se elaboraron actas de socialización y puntos de atención al usuario. Revisar anexos.

- **INFORMES SEMANALES**

Correspondientes al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjuntan los informes semanales en formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Revisar Anexos.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

N° DEL CONTRATO	921 DEL 2018
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	28 JUNIO DEL 2018
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTRATISTA	CODIPRO INGENIERIA LTDA
NIT	800.172.033-2
INTEGRANTES DEL CONSORCIO	N/A
DEPARTAMENTO	CAUCA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 464.788.915 INCLUIDO IVA
PLAZO DE EJECUCION	5 MESES
ORDEN DE INICIO	9 DE AGOSTO 2018
FECHA TERMINACION	31 DE DICIEMBRE DEL 2018
ACTAS PARCIALES	Se tramitaron las Actas de Costos No. 1, 2 y 3.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.

Las actividades que se han ejecutado en el presente periodo son:

Operativas: Se realizó trabajo en conjunto con el personal del Contratista con el objeto de verificar las actividades a ejecutar en el objeto contractual y detectar los posibles cambios y dificultades que puedan presentarse. Se impartieron las aclaraciones técnicas respectivas para el esclarecimiento oportuno de las actividades programadas como avance y desarrollo de las obras de intervención previstas.

Legales: Revisión de los aspectos legales establecidos en el Contrato y su cumplimiento durante el proceso de ejecución. La Interventoría realizó seguimiento de lo contratado, y en cuanto a los procedimientos para el logro del objeto contractual que se ajusten enteramente a la ley y a lo pactado, dando el especial trato que merece por ser un Proyecto con recursos OCAD.

Técnicas: En esta etapa de Consultoría se ha estado atentos en las actividades para la determinación de los puntos críticos en los tramos y los ajustes pertinentes para la presentación de los diseños en cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada ítem de obra.

Se ha interactuado con los funcionarios delegados como Supervisores y Gestores del INVIAS así como con el Contratista, para lograr un desarrollo armónico del "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BALBOA, FLORENCIA Y MERCADERES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Administrativas: Las actividades Administrativas desarrolladas por la Interventoría han sido las siguientes:

1- Revisión del cumplimiento de todos los aspectos relativos al numeral 7.5 de los pliegos de condiciones.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

2- Ejecución de Comités de seguimiento de acuerdo al Manual de Interventoría.

3- Elaboración de los diferentes informes de acuerdo al Manual de Interventoría y a los solicitados por la Entidad.

4- Elaboración de oficios varios, dirigidos tanto al INVIAS como al Contratista, referente a diversos aspectos en este periodo del Proyecto.

5- Coordinación de Comités de seguimiento y elaboración de las respectivas actas.

5.2.1 INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018 se anexa al presente informe mensual No. 04, el Informe ejecutivo mensual del Director de Interventoría. Revisar Anexos.

5.3 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018, se anexan los informes por parte de los especialistas para los Estudios y Diseños entregados. Ver anexos.

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC

N/A.

5.5 INFORME DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

N/A.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Revisar Anexos.

6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. Revisar Anexos.

6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9. Revisar Anexos.

6.4 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-13. Revisar Anexos.

6.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Revisar Anexos.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO.**

Correspondiente al período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2. Revisar Anexos.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se continuará con el seguimiento por parte de la Interventoría para que el Contratista cumpla la programación radicada en el Instituto Nacional de Vías en particular con las actividades de gestión social relacionadas con la constitución de veedurías ciudadanas, instalación de puntos de atención al ciudadano e instalación de buzones en los tramos.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

8. ANEXOS.

OFICIOS ELABORADOS POR LA INTERVENTORÍA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	DIRIGIDO A	ASUNTO
1 de noviembre de 2018	CDP-129-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - DIRECCION TERRITORIAL CAUCA	Acta de Costos de Interventoría No. 2
1 de noviembre de 2018	CDP-137-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA	Acta de Costos de Interventoría No. 1
1 de noviembre de 2018	CDP-138-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA	Revisión Hoja de Vida Profesional Social.
9 de noviembre de 2018	CDP-124-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS	Concepto Especialista Estructural a Estudios y *diseños Municipio de Balboa.*
13 de noviembre de 2018	CDP-144-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA	Informe Mensual de Interventoría No. 2
13 de noviembre de 2018	CDP-145-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA	Acta de Costos de Interventoría No. 2
14 de noviembre de 2018	CDP-146-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA	Remisión de documentos, estudios y diseños contrato 0495 de 2018 para los municipios de BALBOA,FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA
26 de noviembre de 2018	CDP-164-2018	CONTRATO No. 921 DE 2018	INGENIERO LUIS LEDEZMA - SUPERVISOR DEL CONTRATO	Voluntad de renunciar a utilizar los recursos por concepto de anticipo.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

OFICIOS RADICADOS POR EL CONTRATISTA

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	ASUNTO
NOVIEMBRE 13 DE 2018	CDS18C00757	CONTRATO 0495 DE 2018	Remisión de documentos estudios y diseños contrato 0495 de 2018 para los municipios de Balboa, Mercaderes, Florencia y Santa Rosa
NOVIEMBRE 23 DE 2018	CDS18C00804	CONTRATO 0495 DE 2018	Entrega de hojas de vida-personal obra

OFICIOS RADICADOS POR EL INVIAS

FECHA	CONSECUTIVO	REFERENCIA	ASUNTO

8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES

En el período comprendido del 1° al 30 de noviembre de 2018, se realizaron las actividades relacionadas en el documento anexo.

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Correspondiente al período comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**BALBOA-CAUCA**
UNIDAD EJECUTORA:	**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS**
CONTRATO No.:	**495/2018**

FOTOGRAFÍA (1)



Foto 1. MESAS DE TRABAJO - CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FOTOGRAFÍA (2)

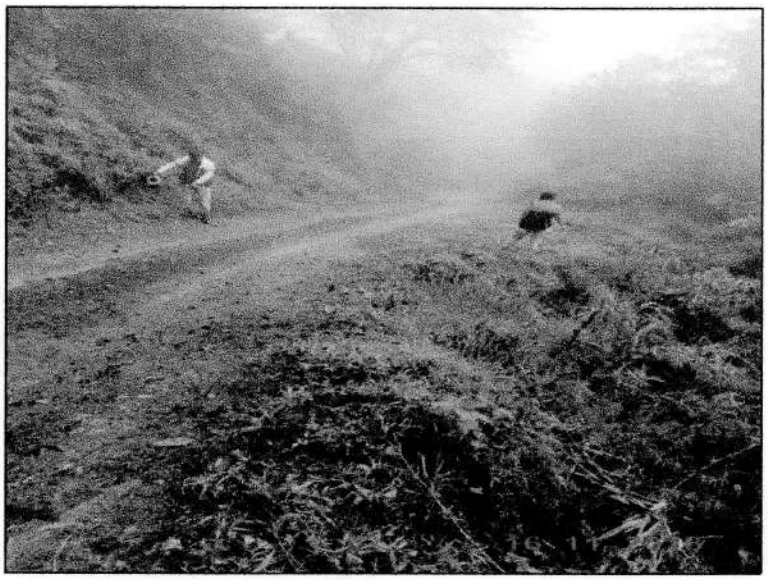


Foto 2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO CRUCE LA PLANADA - LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (3)



Foto 3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA PLANADA - VERSALLES BAJOS

FOTOGRAFÍA (4)

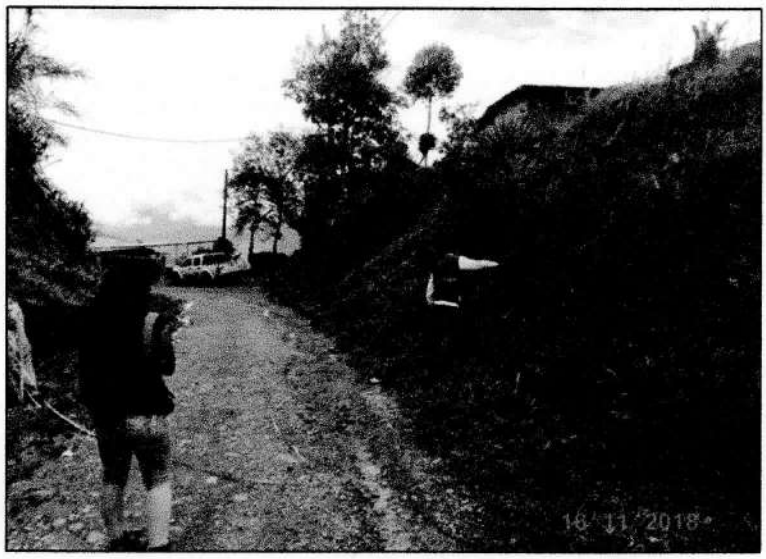


Foto 4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA PLANADA - VERSALLES BAJOS

FOTOGRAFÍA (5)

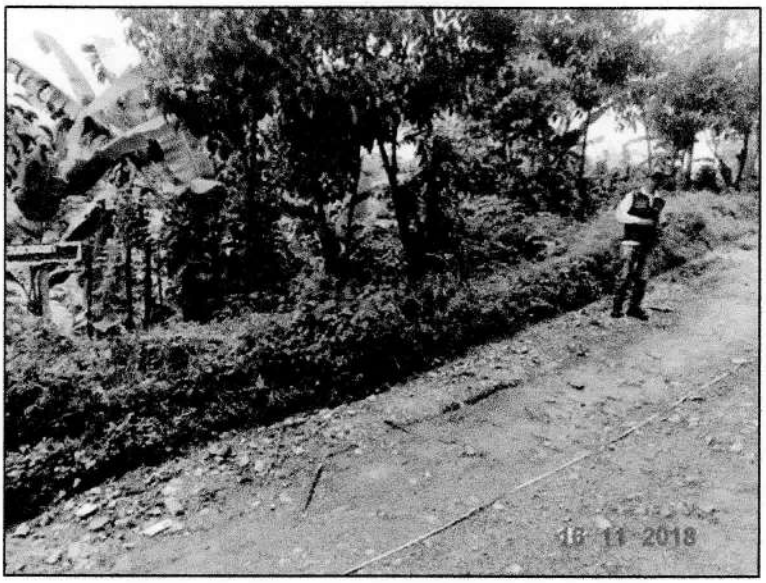


Foto 5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA CABAÑA - ESCUELA LA CABAÑA

FOTOGRAFÍA (6)



Foto 6.SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (7)

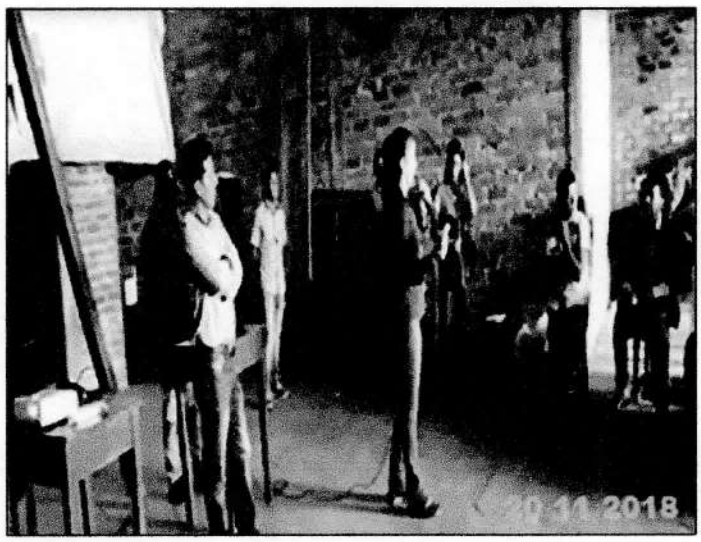


Foto 7. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (8)



Foto 8. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (9)



Foto 9. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (10)



Foto 10. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (11)



Foto 11. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (12)

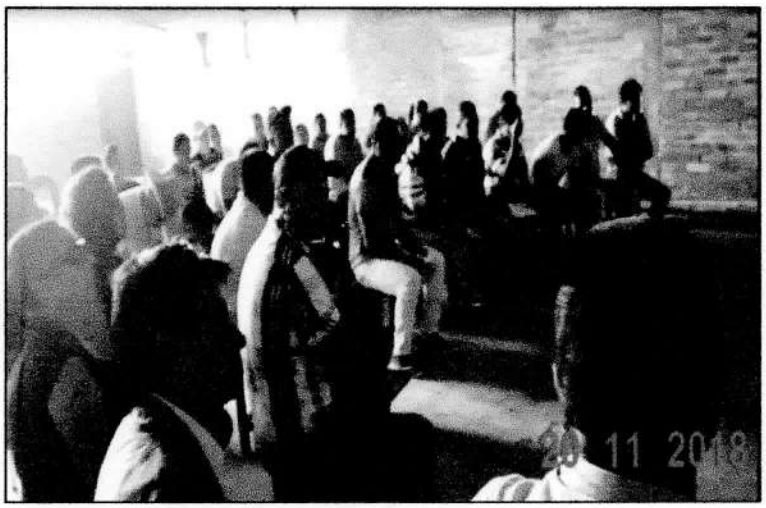


Foto 12. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (13)



Foto 13. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (14)



Foto 14. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

FOTOGRAFÍA (15)



Foto 15. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

REGISTRO FOTOGRAFICO

Correspondiente al período comprendido del 1 de Noviembre al 30 de noviembre de 2018.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**SANTA ROSA-CAUCA**
UNIDAD EJECUTORA:	**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS**
CONTRATO No.:	**495/2018**

FOTOGRAFÍA (1)



Foto 1. MESAS DE TRABAJO - CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FOTOGRAFÍA (2)



Foto 2.REUNION DE SOCIALIZACION CASA COMUNAL SANTA ROSA-CAUCA

FOTOGRAFÍA (3)



Foto 3. INTERVENCION TEMAS TECNICOS INGENIERO JAVIER MARTINEZ

FOTOGRAFÍA (4)



Foto 4. INTERVENCION PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL CLAUDIA MACIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Correspondiente al período comprendido del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**FLORENCIA-CAUCA**
UNIDAD EJECUTORA:	**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS**
CONTRATO No.:	**495/2018**

FOTOGRAFÍA (1)

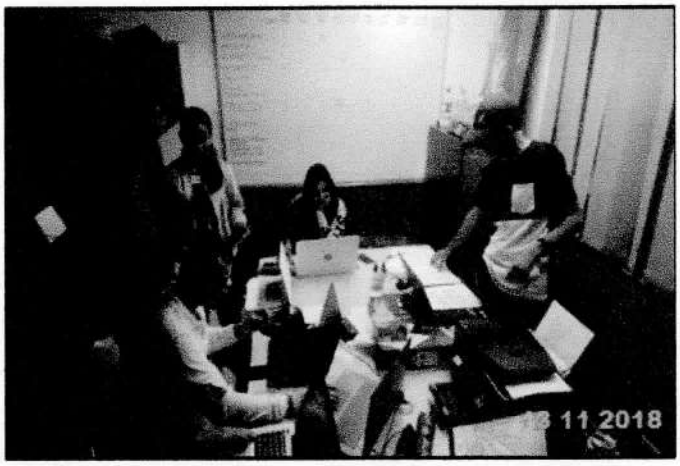


Foto 1. MESAS DE TRABAJO - CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FOTOGRAFÍA (2)



Foto 2. REUNION CONSTITUCION DE VEEDURIA CIUDADANA

FOTOGRAFÍA (3)



Foto 3. PARTICIPACION DE LOS PRESIDENTES DE JAC TRAMOS CUCHILLA DEL HATO-BETANIA Y CRUCE ESCUELA BELLA VISTA- LA ESPERANZA BAJA

FOTOGRAFÍA (4)

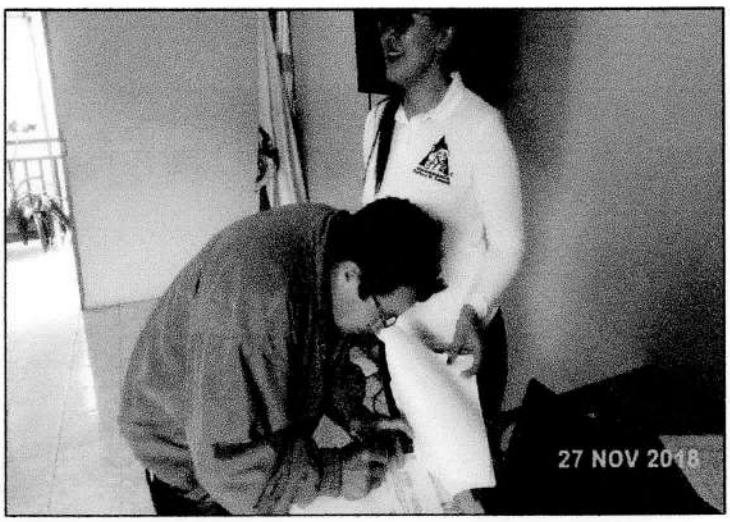


Foto 4. FIRMA DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS

FOTOGRAFÍA (5)



Foto 5. INSTALACION DEL PUNTO DE ATENCION AL USUARIO

REGISTRO FOTOGRAFICO

Correspondiente al período comprendido del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2018.

NOMBRE DEL PROYECTO:	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**MERCADERES-CAUCA**
UNIDAD EJECUTORA:	**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS**
CONTRATO No.:	**495/2018**

FOTOGRAFÍA (1)

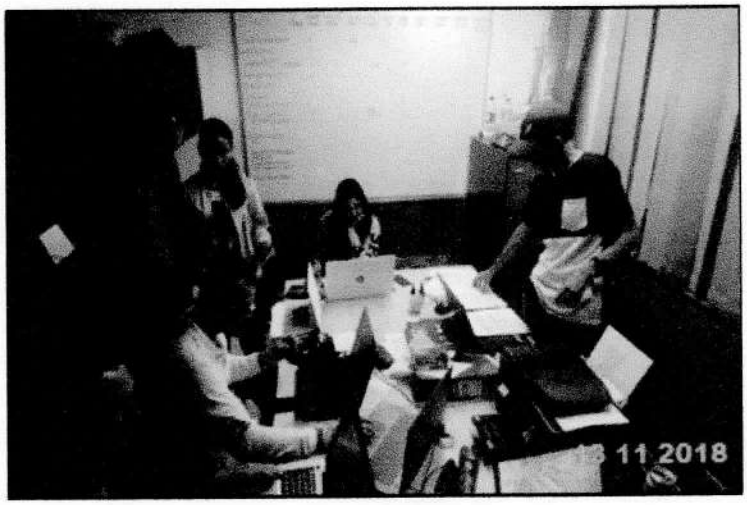


Foto 1. MESAS DE TRABAJO - CONTRATISTA E INTERVENTORIA

FOTOGRAFÍA (2)



FOTO 2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON.

FOTOGRAFÍA (3)



FOTO 3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA SAN JOAQUIN- LA MONJA-SAN JUAQUIN-LOS ALPES - TABLONES ALTOS Y BAJOS

FOTOGRAFÍA (4)

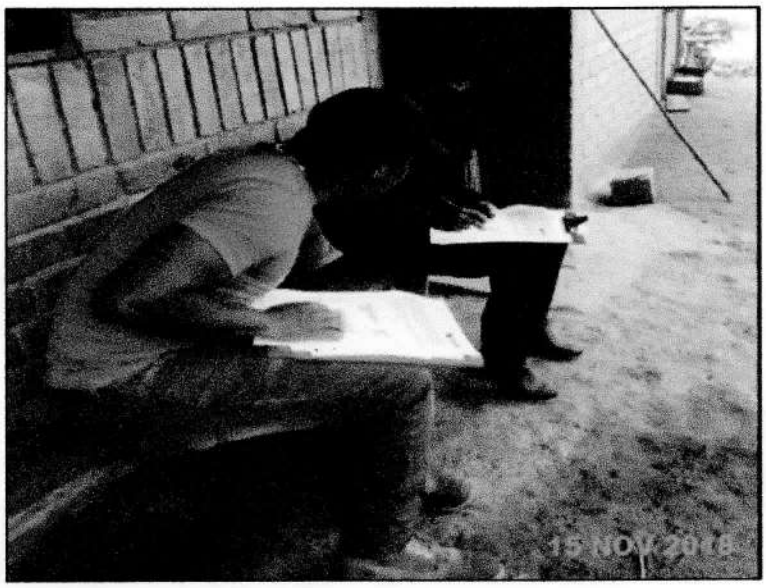


FOTO 4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA SAN JOAQUIN- LA MONJA-SAN JUAQUIN-LOS ALPES - TABLONES ALTOS Y BAJOS.

FOTOGRAFÍA (5)



FOTO 5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA SAN JOAQUIN- LA MONJA.

FOTOGRAFÍA (6)



FOTO 6. SOCIALIZACIÓN EN LOS MEDIOS - ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

FOTOGRAFÍA (7)

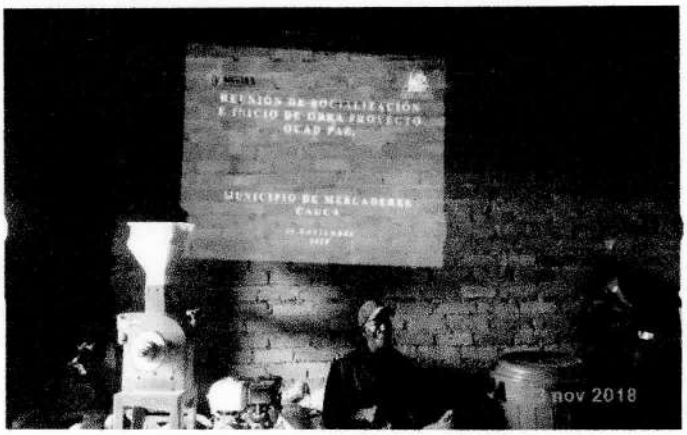


FOTO 7. SOCIALIZACIÓN EN LOS MEDIOS - ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

FOTOGRAFÍA (8)

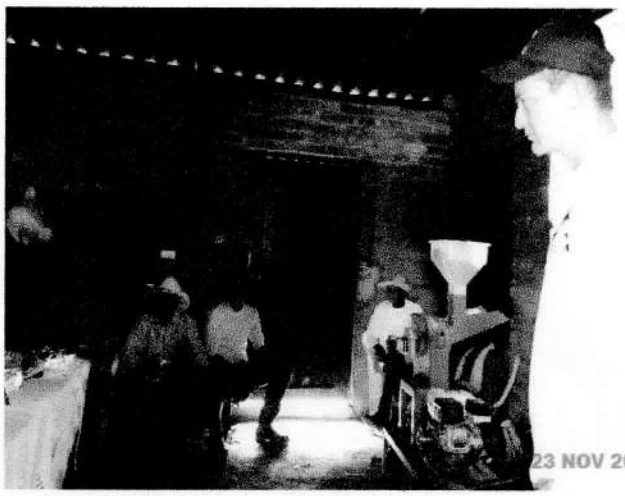


FOTO 8. SOCIALIZACIÓN EN LOS MEDIOS - ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

FOTOGRAFÍA (9)



FOTO 9. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA SAN JOAQUIN- LA MONJA.

FOTOGRAFÍA (10)



FOTO 10. SOCIALIZACIÓN EN LOS ALPES - ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS).

FOTOGRAFÍA (11)



FOTO 11. SOCIALIZACIÓN EN LOS ALPES - ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS.

FOTOGRAFÍA (12)



FOTO 12. SOCIALIZACIÓN EN LOS ALPES - ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS).

FOTOGRAFÍA (13)



FOTO 13. SOCIALIZACIÓN EN LOS ALPES - ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS).

ACTAS DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 27 (Día) 11 (Mes) 18 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Cauca.

CONTRATO DE OBRA No. 495 **DE** 2018

CONTRATISTA: Federación Nacional de Cafeteros

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Proyecto de Mejoramiento, Mantenimiento y/o Rehabilitación de Vías Terciarias en el Marco del PDAE PAZ en el Departamento del Cauca de conformidad con el decreto 1601 1534 del 15 de Septiembre de 2017

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. ____ **DE** ____

INTERVENTOR: ____

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
José Francisco Zamora	Tesorero Municipal	Alcaldía Municipal
Simón Bolívar Fernández	Presidente JAC. Vereda Comunidad	Comunidad JAC
José Eduardo Castillo	Presidente JAC. La Esperanza	JAC. Vereda La Esperanza
Victor Fernández Ortega	Residente Obra Interventoría	Consorcio
José Gerson Ramírez	Profesional de Apoyo	Federación Nacional Cafeteros
Diana Ruz Labrada		
Gloria Patricia Montero		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

General espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación de la veeduría ciudadana en el Municipio de Florencia.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Constatación de Asistencia
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea y Secretarios
3. Explicación del Objeto de la Reunión
4. Intervención del Funcionario Público
5. Designación de las veedores Ciudadanos
6. Clausura de la Asamblea

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se dio inicio a la reunión siendo las 10:15 a.m. en la sala de reuniones de la Alcaldía Municipal de Florencia Cauca, se dio la Bienvenida a cada uno de los Asistentes y se procedió a constatar la lista de asistencia.

1. En el desarrollo del primer punto se constato la Presencial de 14 personas residentes en el Municipio de Florencia, Veredas Zelanda, la Esperanza, y Brillavista, Veredas ubicadas en los Tramos a intervenir.

2. En el desarrollo del este punto Mediante elección se nombro el Presidente de la Asamblea al Señor Simon Bolivar Fernandez y como Secretario al Señor José Gerson Ramirez

3. El desarrollo del Tercer punto el Presidente de la Asamblea y el Personero Municipal intervinieron explicando el Objeto de la Reunion y la importancia de conformar la Veeduria Ciudadana, durante este espacio el Personero Municipal Menciono que las personas Asistentes a la reunion tenian conocimiento y ya habian hecho parte de veedurias anteriores. por lo Anterior se dio Ligar al siguiente punto.

4. El Señor Personero Municipal José Francisco Zamora, dicto una

una breve charla sobre la ley 850 de 2003 veedurías ciudadanas; se fortaleció en las funciones de los veedores y las inhabilidades.

5. Luego de la anterior charla se procedió a realizar la designación de los veedores para los tramos cuchilla de Hato - Betania y Escuela Bellavista la Esperanza, postulándose los señores José Rodrigo Castillo, Victor Hernández, Oney Fuentes, Sesio Fernández, Fabio Fernández Díaz, Luis Andrés Jiménez y Emilio Fernández Ortega. quienes fueron elegidos por el tiempo que dure la ejecución de las obras.

Luego de realizar la capacitación de la veeduría, los veedores manifestaron que tenían más sobre el contrato de obra por lo cual se acordó que se agendaría una reunión con los veedores para dar las aclaraciones y/o inquietudes referentes al proyecto, mediante correo electrónico indicando los temas que quieren se les explique en la próxima reunión.

6. El presidente de la Asamblea da por terminada la reunión siendo las once y dieciocho (11:18)am. del día de hoy.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	3	DE	3

FECHA: 27 (Día) 11 (Mes) 18 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Reunión con Veedores	Por Confirmar	Residente Social

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

____ (Día) ____ (Mes) ____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Jose Francisco Zapata B	
Simon B. Fernandez N.	
Josi Rodrigo Castillo	Josi Rodrigo Castillo
Victor Fuentes Ortega	
Didier Paz Cabrera	
Gloria Patricia Alvarez	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO
MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAUCA
PERSONERIA MUNICIPAL

Por Nuestros Derechos en pro del bienestar social y colectivo

RESOLUCION Nº. 041
(27 de noviembre 2018)

"POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE LA INSCRIPCION DE UNA VEEDURIA CIUDADANA.

EL SUSCRITO PERSONERO MUNICIPAL DE FLORENCIA CAUCA.

En uso de sus facultades constitucionales y legales, especial las conferidas en la ley 1622 de 2013, 850 del 2003 y 136 de 1994 y

CONSIDERANDO

Que como mecanismo de participación, el municipio de Florencia debe crear los comités de veeduría ciudadana para que ejerzan vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión pública a fin de mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos.

Que el día 27 del mes de Noviembre de 2018, se realizo reunión para la conformación de la veeduría ciudadana para el contrato 495 PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIASEN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, TRAMOS: CUCHILLA DEL HATO – BETANIA Y ESCUELA BELLAVISTA – LA ESPERANZA BAJA, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA.

Que el señor JOSE RODRIGO CASTILLO FUENTES, identificado con cedula de ciudadanía número 10590736, vocero coordinador del comité de veeduría de contrato 495 PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIASEN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, TRAMOS: CUCHILLA DEL HATO – BETANIA Y ESCUELA BELLAVISTA – LA ESPERANZA BAJA, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA, constituida en forma plural, la cual fue radicada en este despacho.

Que una vez revisada el acta de constitución la veeduría contrato 495 PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIASEN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, TRAMOS: CUCHILLA DEL HATO – BETANIA Y ESCUELA BELLAVISTA – LA ESPERANZA BAJA, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA. cuya inscripción se solicita, ante la Personería Municipal.

RESUELVE.

ARTICULO PRIMERO; Aceptar la inscripción de veeduría ciudadana contrato 495 PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIASEN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, TRAMOS: CUCHILLA DEL HATO – BETANIA Y ESCUELA BELLAVISTA – LA ESPERANZA BAJA, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA, constituida en forma plural, formulada

Correo electrónico: personeria@florencia-cauca.gov.co
Calle 4ª Nº 3 – 34 Celular: 3116000340.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO PÚBLICO
MUNICIPIO DE FLORENCIA - CAUCA
PERSONERIA MUNICIPAL

Por Nuestros Derechos en pro del bienestar social y colectivo

por JOSE RODRIGO CASTILLO FUENTES, identificado con cedula de ciudadanía número 10590736, vocero coordinador del comité de veeduría, quedando radicada en la Personería Municipal de Florencia cauca, con fecha 27 de noviembre de 2018.

ARTICULO SEGUNDO; Ordenar la inscripción en el registro público bajo el número 002 de 2018 del acta de constitución de la veeduría presentada así.

NOMBRE	IDENTIFICACION	E - MAIL	CELULAR
Jose Rodrigo Castillo Fuentes	10590736		3127789301
Víctor Fernandez ortega	76258596		3188228166
Orbey Fuentes Ortega	1106363729		3214556045
Jesus Fernandez	76258609		3184224010
Fabio Ferney Diaz Fernandez	1061017626		3158417028
Luis Andres Jimenez Meneses	1058786638		3214551339
Emiro Fernandez Ortega	10593118		3173970081

OBJETO DE LA VIGILANCIA;. Contrato numero 495 PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIASEN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, TRAMOS: CUCHILLA DEL HATO – BETANIA Y ESCUELA BELLAVISTA – LA ESPERANZA BAJA, EN EL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAUCA

NIVEL TERRITORIAL; Florencia – Cauca.

ARTICULO TERCERO; En firme la presente procédase a la inscripción en el registro público de veedurías de personería de Florencia Cauca.

ARTICULO CUARTO; Contra la presente resolución proceden los recursos de reposición apelación de conformidad con el código contencioso administrativo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Florencia – Cauca a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre del 2018.

JOSE FRANCISCO ZARAMA BURBANO
Personero Municipal

Proyecto: Gloria M.

Correo electrónico: personería@florencia-cauca.gov.co
Calle 4ª Nº 3 – 34 Celular: 3116000340.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DE VEEDURIA CIUDADANAMUNICIPIO DEFLORENCIA CAUCA.

En el Municipio de Florencia Cauca, a los veintisiete (27) días del mes de Noviembre del 2018, se reunieron integrantes de la comunidad del Municipio de Florencia, con el fin de crear una veeduría ciudadana cuyo objeto es el **Contrato 495: PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. Tramos: Cuchilla del Hato-Betania y Escuela Bellavista-La Esperanza Baja, en el Municipio de Florencia Cauca**. Para la vigilancia de la gestión en la administración municipal; Vigilar los procesos de planeación, para que conforme a la constitución y la Ley se de participación a la comunidad. Vigilar que en las asignaciones de los presupuestos se prevean prioritariamente la solución de las necesidades básicas insatisfechas según criterio de celeridad, equidad y eficacia. Vigilar por que el proceso de contratación se realice de acuerdo con los criterios legales. Vigilar la calidad y ejecución de las obras, solicitar de los interventores, contratistas, autoridades contratantes los informes, presupuestos fichas técnicas que permitan conocer el cumplimiento de los contratos y programas. Remitir a las autoridades correspondientes los informes que se desprendan de la función de control y vigilancia en relación con los asuntos materia de veeduría, Denunciar ante las autoridades competentes los hechos o actuaciones irregulares de los funcionarios públicos, Comunicar a la ciudadanía mediante asamblea general o en reuniones los avances de los procesos de control y vigilancia que se estén desarrollando en el Municipio de Florencia Cauca. Su lugar de residencia es el respectivo Municipio de Florencia Tramos: Cuchilla del Hato-Betania y Cruce escuela Bellavista –la Esperanza baja.

La asamblea adopta el siguiente orden del día:

1. Constatación de asistencia
2. Nombramiento del Presidente de la Asamblea y Secretarios
3. Explicación del objeto de la reunión
4. Intervención del funcionario público
5. Designación de los veedores ciudadanos
6. Clausura de la asamblea

En desarrollo del primer punto se constata la presencia de 14 personas cuya residencia es el Municipio de Florencia Cauca.

En desarrollo del segundo punto de nombró como Presidente de la Asamblea a Simón Bolívar Fernández Navia identificado con C.C. No. 7.548.601 de Armenia y como secretario (a) José Gerson Ñañez Navia identificada con C.C. No. 10.591.219deMercaderes Cauca.

En desarrollo del tercer punto el presidente manifestó el objeto de la reunión que es la creación de una veeduría ciudadana para la vigilancia y control de la gestión pública en el Municipio de Florencia, invitando a los intervinientes a constituirla dada su importancia.En desarrollo del cuarto punto el Señor Personero Municipal de Florencia, José Francisco Zarama dictó una charla sobre ley 850 de 2003 veedurías ciudadanas.

En desarrollo del quinto punto se presentan las personas que han sido postuladas para ser veedores ciudadanos, Señores:

- José Rodrigo Castillo Fuentes C.C. No.10.590.736 de Mercaderes
- Víctor Fernández Ortega C.C. No. 76.258.596 de Mercaderes
- Orbey Fuentes Ortega C.C. No. 1.106.363.729 de Icononzo
- Jesús Fernández C.C. No. 76.258.609de Mercaderes

- Fabio Ferney DíazFernández C.C. No. 1.061.017.626 de Mercaderes
- Luis AndrésJiménez Meneses C.C. No. 1.058.786.638 de Rosas
- Emiro Fernández Ortega C.C. No. 10.593.118 de Mercaderes

Por unanimidad fueron elegidos.

Estos veedores ciudadanos fueron elegidos por el tiempo que dure la ejecución de las Obras.

El desarrollo del punto Sexto el Presidente de la asamblea da por terminada la reunión siendo las oncey dieciocho (11:18 a.m.) de la mañana del día de hoy.

Simón R. Fernández N.
C.C. No. 7.548.601
Presidente

José Gerson Nuñez Nuñez
C.C. No.10.591.219
Secretario (a)

REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de _____ Cauca

DEPARTAMENTO: Cauca MUNICIPIO: Florencia FECHA: 27 - Noviembre 2018

VEREDA /CORREGIMIENTO: LUGAR: Alcaldia Municipal.

ACTIVIDAD: Reunión conformación veeduría ciudadana

Ord	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO
1	Luis Andres Jimenez	1058786638	Betania.	Presidente	3214551339
2	Jose Rodrigo Castillo	10·590·736		Presidente	312·778·93·01
3	Fabio Diaz Fernandez	1061017626	La esperanza.	Fiscal	3158417038
4	Obey Fuentes Ortega	1106363729	Betania.	Veedor.	3214556045
5	[illegible]	4709.322			320
6	Emiro Fernandez	10.593·118.	La esperanza		317·3970081.
7	Victor Manuel Ortega	76258596	La Esperanza		3183128166
8	Jesus Fernandez	76258609	La esperanza	Veedor	3184224010
9	JoseGerson Muñoz Muñoz	3206075804	La esperanza	precidente	3206075804
10	Simón B. Fernández	7548·601	Alcaldia	Coor. de desarrollo comunitario	3147918355
11	[illegible]	5207026	[illegible]	[illegible]	3166002340
12	Julio Emiro Fuentes	7529740	Bellavista	JAC	[signature]
13	Didnal Paz Cabrera	27146836	codipro	Interventoria	3105991609
14	Gloria Patricia Quintero	32839113	Federación Nacional Cafetera	Profesional local de proyecto	3708293362
15					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	23	11	18
		(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 495 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Sigifredo Diaz	Coordinador Desarrollo Comunitario	Alcaldia Municipal de Mercaderes
Alirio Guerra		Vereda Los Medios
Jorge Delgado		Vereda Los Medios
James Valencia		Vereda Los Medios
Aderson Vega		Vereda Los Medios
José Gomez		Vereda Los Medios
Romil Peña		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización de inicio de obra y conformación de comité de veeduría ciudadana

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Bienvenida
2. Introducción proyectos OCAD PAZ
3. Presentación técnica del proyecto
4. Presentación social del proyecto
5. Preguntas de la comunidad
6. Conformación de veeduría.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El día 23 de noviembre de 2018, se realizó reunión de socialización de inicio de obra en el municipio de Mercaderes, Anillo vial La Curva - El Pilón (La curva - Los - Guácimos Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón), la cual se realizó en la casa de habitación del señor Alirio Guerra en la vereda Los Medios, con hora de inicio las 3:00 p.m; con el agradecimiento por la participación de la comunidad. Se hace la presentación del personal del contratista y de interventoria .

2. Luis Felipe Bedoya, residente social de apoyo, expone la introducción del proyecto y explica a la comunidad que a través de los acuerdos realizados en la Habana, estableció como punto importante de la Reforma Rural Integral, la creación de un Plan Nacional de vías terciarias, con el fin de contribuir al mejoramiento de vías en departamentos cafeteros con recursos del fondo de regalías, OCAD PAZ. Se suscribe el contrato 0495 de 2018, entre el Instituto Nacional de Vias (INVIAS) y la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DE SEPTIEMBRE DE 2017". ¿Qué es OCAD PAZ? Es un órgano Colegiado de administración y decisión (OCAD) responsable de la definición de proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). Creado por el Acto Legislativo No. 04 del 8 de septiembre de 2017 y reglamentado por el Decreto Ley 1534 de septiembre de 2017, específicamente destinado para la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto. Los territorios a intervenir dentro de este acuerdo, son 5 departamentos, 28 municipios: Cauca (12) municipios, Caldas (9) municipios, Quíndio (2) municipios, Risaralda (4) municipios y Valle del Cauca (1) municipio. En el departamento del Cauca, los municipios a intervenir son: Balboa, Florencia, Mercaderes, Santa Rosa, Buenos Aires, Corinto, Santander de Quilichao, Cajibio, Jambaló, El Tambo, López de Micay y Piamonte. Con una inversión total de $13.026.230.310,94 donde está contemplado realizar 8 alcantarillas, 580,2 mts de placa huella y 2 Box Coulvert para el municipio de Mercaderes.
El contrato inició a partir del 25 de Enero de 2018, donde en este periodo se realizó el proyecto y los estudios y diseños.

.

El organigrama de OCAD PAZ funciona de la siguiente manera: en el nivel superior se encuentra El Ministerio de Hacienda quien destina los recursos del Sistema General de Regalías, dichos recursos se los asigna a INVIAS, quien es la institución encargada de administrar los recursos, supervisar, controlar y vigilar, este

proceso lo hace a través de una interventoría, que para el municipio de Mercaderes es Codipro, la interventoría supervisa al contratista.

La Federación Nacional de Cafeteros como contratista esta conformado por un Director de obra, un residente de obra, quien tiene a su cargo un maestro de obra y ayudantes de obra; una residente social. Las funciones de INVIAS, quien es el supervisor del contrato es verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, apoyar el logro de los objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato, mantener en contacto a las partes del contrato, evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. Codipro, quien es la entidad interventora y está con contrato 921 de 2018 y cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en los municipios de Mercaderes, Balboa, Florencia y Santa Rosa del departamento del Cauca de conformidad con el Decreto Ley 1534 del 17 de septiembre de 2017 y dentro de sus funciones está a realizar control y vigilancia sobre la ejecución de la obra, supervisar el cumplimiento de las actividades que realice el contratista, verificar que todos los trabajadores se encuentren afiliados a la EPS y ARL. La Federación Nacional de Cafeteros, quien es la empresa contratista tiene como funciones ejecutar todas las actividades técnicas y logísticas necesarias para realizar la obra en el marco del cumplimiento de especificaciones técnicas, en especial las de INVIAS, plazos y correcta inversión de los recursos, para ello dispondrá de: contratación mano de obra calificada y no calificada, contratación de un ingeniero residente de obra, suminisro de todos los materiales, herramientas e insumos requeridos a través de proveedores, contratación de maquinaria y equipo requerido, acompañamiento social.

3. El ingeniero Johan Cardenas Quintero, residente de obra expone el componente técnico, donde habla sobre el proceso constructivo de los tramos a intervenir: (La La Monja, El derrumbe y Los Alpes), y la construcción de 2 Box Coulvert en la vereda Tablones.

El pavimento con placa huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de transito bajo con muy poco flujo vehicular

Los principales atributos de este tipo de pavimento son: ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias, mejoramiento del acceso a las veredas y un amplio periodo de servicio; no requiere acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales. Es una vía con una sección transversal de 5mts de ancho, con dos huellas construidas en concreto reforzado, cada huella es de 90 cms de ancho, entre la huella va una estructura confinada de piedra pegada con mezcla de concreto con un ancho de 45 cm, hacia la parte exterior de huellas va piedra y termina con unas cunetas y unos bordillos en concreto reforzado, el espesor de las huellas de piedra pagada serán de 15 cms y toda la estructura cuenta con una capa de sub base granular de 15 cm.

4. Felipe Bedoya, residente social, se refiere al componente social, donde se explica cada programa: - Atención a la comunidad, cuyo objetivo es brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad. Para ello, se estableció un punto de atención concertado con la comunidad en la vereda los Alpes en la casa de habitación del Señor Audelo Beltran, los días viernes con un horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm.

Con la instalación de un buzon satelite en la vereda Contador . El Programa de información y divulgación, cuyo objetivo es brindar información clara y oportuna a la comunidad del AID, Juntas de acción comunal y autoridades locales y regionales, involucradas en el proyecto, por lo tanto, se informará a la comunidad mediantes tres reuniones, una reunión de inicio de obra, que es la que se está llevando a cabo, una segunda reunión para informar sobre los avances de obra y una tercera reunión que se entregará la obra a la comunidad. Para convocar a dichas reuniones, se realizará mediante volantes y perifoneo.

- Programa Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos, cuyo objetivo es identificar y registrar a través de actas de vecindad el estado físico de las construcciones e infraestructura de todos los predios en vecindad a la obra antes de inciar las obras constructivas. Las actas de vecindad son un soporte para el contratista y el propietario, en caso de reportarse afectación en el predio. - Programa Cultura vial y participación comunitaria, cuyo objetivo es crear espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria del proyecto. Para ello, se les explica qué es el comité de veeduría ciudadana sus funciones y se les pregunta a los participantes quién está interesado en hacer parte de dicho comité, donde 6 personas de la comunidad se postulan, quedando conformado el comité de veeduría, con la aprobación de los asistentes. Así mismo se les explica que dentro de este programa está el realizar campañas preventivas de educación, sensibilización y sostenibilidad, orientadas a los cambios que generará en la movilidad el proyecto en la etapa de construcción;educación vial, normas para la seguridad del peatón en la vía. De igual forma, se habla sobre el plan de manejo de tránsito, donde se les informa que durante el proceso constructivo se realizará el cierre de vía por un promedio de dos meses y se implementará señalización durante la ejecución de la obra, se da a conocer las vías alternas, se les informa que antes de hacer cierre a la vía se da a conocer a través de los líderes sociales la fecha a cerrar a través de llamadas telefónicas y para la comunidad en general se hará a través de volantes y cuñas radiales.

Programa contratación mano de obra, cuyo objetivo es generar empleo en el área de Influencia Directa (AID), vinculando el 70% de la mano de obra no calificada del área de influencia, de no cumplirse con este indicador se tendrá en cuenta la comunidad del Área de Influencia Indirecta. Con el apoyo de los líderes de la comunidad se buscará la hoja de vida de los interesados, se darán los criterios para la selección de la mano de obra no calificada atendiendo a los lineamientos de la política de contratación laboral, se solicitará a las juntas de acción comunal el listado de las personas oferentes, se solicitará a la JAC o al personero municipal certificar la residencia habitual de la persona contratada.

5. Se da espacio para que la comunidad pregunte, el señor Jorge delgado expresa su preocupación por la circulación de vehiculos que transportan ganado porque para él en la curva se puede pueden presentar inconvenientes al girar los camiones, a lo que el ingeniero Johan le responde que no hay ningun problema, porque placa huella no sólo va en concreto la huella, sino que es una cosntrucción completa monolitica que abarca el ancho de la carretera.

Se le pregunta al ingeniero Manuel López, asistente a la reunión por parte del subcontratista que cuantas personas se requieren para trabajar en la obra de los 150 metr de placa huella y las dos alcantarillas, a lo que él responde que 4 aproximadamente.

Por último se invita a la conformación de la veeduría por parte de la comunidad y se finaliza la reunión de forma cordial.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	23	11	18
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de _____ Cauca

DEPARTAMENTO: CAUCA MUNICIPIO: Mercaderes FECHA: 23/11/2018

VEREDA /CORREGIMIENTO: los medios Vía Condagua LUGAR: Vivienda Alvio Guerra

ACTIVIDAD: Reunión de socialización inicio de obra

Ord	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO
1	Sigifredo Diaz	16661.180	Alcaldia	Desarrollo comunitario	
2	Alvio Guerra	16728505	los medios	3508093	
3	Romel Bonilla	10435150	Los medios		
4	Jorge Delgado	76257678	Los medios		Jorge Delgado
5	Jana Valencia Portilla	10597767	Los medios		Jana valencia
6	Anderson Vega Rivera	10594005	Los Medios	Presidente de la junta	
7	Jose Quiñonez	1482158	Los Medios		Jose Quiñonez
8	Jose Gomez	76257636	los medios		Jose Gomez
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	23	11	18
		(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 495 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Sigifredo Diaz	Coordinador Desarrollo Comunitario	Alcaldía Municipal de Mercaderes
Alirio Guerra		Vereda Los Medios
Jorge Delgado		Vereda Los Medios
James Valencia		Vereda Los Medios
Aderson Vega		Vereda Los Medios
José Gomez		Vereda Los Medios
Romil Peña		

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conformación de la Veeduia ciudadana del TramoAnillo vial de la Cordillera (San Joaquin - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa Maria - Los Llanos)

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Postulación y presentación de cada uno de los asistentes
2. Aprobación de la Veeduría Ciudadana por la comunidad en reunión de socialización.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Finalizada la reunión de socialización se invita a la comunidad a hacer parte de la *Veeduría ciudadana, recordandoles su funciones antes expuestas en el programa del* componente social, seguidamente las personas interesadas levantan la mano y se presentan, diciendo el nombre y la vereda que representan.

La veeduría queda conformada por las siguientes personas:

Alirio Guerra
Aderson Vega, presidente Junta de Acción Comunal de la vereda los Medios.
James Valencia
Romil Peña

Por último se aprueba por la comunidad los integrantes de la veeduría y se firma el acta en listado de asistencia.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Facilitar Copias de Cedúlas de Ciudadanía de los miembros de la veeduría		Miembros de la Veeduría.

proceso lo hace a través de una interventoría, que para el municipio de Mercaderes es Codipro, la interventoría supervisa al contratista.

La Federación Nacional de Cafeteros como contratista esta conformado por un Director de obra, un residente de obra, quien tiene a su cargo un maestro de obra y ayudantes de obra; una residente social. Las funciones de INVIAS, quien es el supervisor del contrato es verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, apoyar el logro de los objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato, mantener en contacto a las partes del contrato, evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. Codipro, quien es la entidad interventora y está con contrato 921 de 2018 y cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en los municipios de Mercaderes, Balboa, Florencia y Santa Rosa del departamento del Cauca de conformidad con el Decreto Ley 1534 del 17 de septiembre de 2017 y dentro de sus funciones está a realizar control y vigilancia sobre la ejecución de la obra, supervisar el cumplimiento de las actividades que realice el contratista, verificar que todos los trabajadores se encuentren afiliados a la EPS y ARL. La Federación Nacional de Cafeteros, quien es la empresa contratista tiene como funciones ejecutar todas las actividades técnicas y logísticas necesarias para realizar la obra en el marco del cumplimiento de especificaciones técnicas, en especial las de INVIAS, plazos y correcta inversión de los recursos, para ello dispondrá de: contratación mano de obra calificada y no calificada, contratación de un ingeniero residente de obra, suminisro de todos los materiales, herramientas e insumos requeridos a través de proveedores, contratación de maquinaria y equipo requerido, acompañamiento social.

3. El ingeniero Johan Cardenas Quintero, residente de obra expone el componente técnico, donde habla sobre el proceso constructivo de los tramos a intervenir: (La La Monja, El derrumbe y Los Alpes), y la construcción de 2 Box Coulvert en la vereda Tablones.

El pavimento con placa huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de transito bajo con muy poco flujo vehicular

Los principales atributos de este tipo de pavimento son: ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias, mejoramiento del acceso a las veredas y un amplio periodo de servicio; no requiere acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales. Es una vía con una sección transversal de 5mts de ancho, con dos huellas construidas en concreto reforzado, cada huella es de 90 cms de ancho, entre la huella va una estructura confinada de piedra pegada con mezcla de concreto con un ancho de 45 cm, hacia la parte exterior de huellas va piedra y termina con unas cunetas y unos bordillos en concreto reforzado, el espesor de las huellas de piedra pagada serán de 15 cms y toda la estructura cuenta con una capa de sub base granular de 15 cm.

4. Felipe Bedoya, residente social, se refiere al componente social, donde se explica cada programa: - Atención a la comunidad, cuyo objetivo es brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad. Para ello, se estableció un punto de atención concertado con la comunidad en la vereda los Alpes en la casa de habitación del Señor Audelo Beltran, los días viernes con un horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm.

Con la instalación de un buzon satelite en la vereda Contador . El Programa de información y divulgación, cuyo objetivo es brindar información clara y oportuna a la comunidad del AID, Juntas de acción comunal y autoridades locales y regionales, involucradas en el proyecto, por lo tanto, se informará a la comunidad mediantes tres reuniones, una reunión de inicio de obra, que es la que se está llevando a cabo, una segunda reunión para informar sobre los avances de obra y una tercera reunión que se entregará la obra a la comunidad. Para convocar a dichas reuniones, se realizará mediante volantes y perifoneo.

- Programa Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos, cuyo objetivo es identificar y registrar a través de actas de vecindad el estado físico de las construcciones e infraestructura de todos los predios en vecindad a la obra antes de inciar las obras constructivas. Las actas de vecindad son un soporte para el contratista y el propietario, en caso de reportarse afectación en el predio. - Programa Cultura vial y participación comunitaria, cuyo objetivo es crear espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria del proyecto. Para ello, se les explica qué es el comité de veeduría ciudadana sus funciones y se les pregunta a los participantes quién está interesado en hacer parte de dicho comité, donde 6 personas de la comunidad se postulan, quedando conformado el comité de veeduría, con la aprobación de los asistentes. Así mismo se les explica que dentro de este programa está el realizar campañas preventivas de educación, sensibilización y sostenibilidad, orientadas a los cambios que generará en la movilidad el proyecto en la etapa de construcción;educación vial, normas para la seguridad del peatón en la vía. De igual forma, se habla sobre el plan de manejo de tránsito, donde se les informa que durante el proceso constructivo se realizará el cierre de vía por un promedio de dos meses y se implementará señalización durante la ejecución de la obra, se da a conocer las vías alternas, se les informa que antes de hacer cierre a la vía se da a conocer a través de los líderes sociales la fecha a cerrar a través de llamadas telefónicas y para la comunidad en general se hará a través de volantes y cuñas radiales.

Programa contratación mano de obra, cuyo objetivo es generar empleo en el área de Influencia Directa (AID), vinculando el 70% de la mano de obra no calificada del área de influencia, de no cumplirse con este indicador se tendrá en cuenta la comunidad del Área de Influencia Indirecta. Con el apoyo de los líderes de la comunidad se buscará la hoja de vida de los interesados, se darán los criterios para la selección de la mano de obra no calificada atendiendo a los lineamientos de la política de contratación laboral, se solicitará a las juntas de acción comunal el listado de las personas oferentes, se solicitará a la JAC o al personero municipal certificar la residencia habitual de la persona contratada.

5. Se da espacio para que la comunidad pregunte, el señor Jorge delgado expresa su preocupación por la circulación de vehiculos que transportan ganado porque para él en la curva se puede pueden presentar inconvenientes al girar los camiones, a lo que el ingeniero Johan le responde que no hay ningun problema, porque placa huella no sólo va en concreto la huella, sino que es una cosntrucción completa monolitica que abarca el ancho de la carretera.

Se le pregunta al ingeniero Manuel López, asistente a la reunión por parte del subcontratista que cuantas personas se requieren para trabajar en la obra de los 150 metr de placa huella y las dos alcantarillas, a lo que él responde que 4 aproximadamente.

Por último se invita a la conformación de la veeduría por parte de la comunidad y se finaliza la reunión de forma cordial.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA	23	11	18
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	23	11	18
		(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 495 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Sigifredo Diaz	Coordinador Desarrollo Comunitario	Alcaldia Municipal de Mercaderes
Libio Gentil Castillo	Presidente JAC	Vereda Los Alpes
Luis Gonzalo Luna	Presidente JAC	Vereda La Monja
Franklin Pinta	Inspector	Alcaldia Municipal de Mercaderes
Duvar Alexis Paz	Presidente JAC	Vereda Tablones bajos
Olmedo Muñoz	Fiscal JAC	Vereda Esmeraldas
Edelfa Irene Burbano	Integrante JAC	Vereda Los Alpes
Gerardo Silva	Integrante de la JAC	Vereda El Placer

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socialización de inicio de obra y conformación de comité de veeduría ciudadana

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Bienvenida
2. Introducción proyectos OCAD PAZ
3. Presentación técnica del proyecto
4. Presentación social del proyecto
5. Preguntas de la comunidad
6. Conformación de Veeduría Ciudadana.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. El día 23 de noviembre de 2018, se realizó reunión de socialización de inicio de obra en el municipio de Mercaderes, Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeral - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) la cual se realizó en la escuela de la vereda Los Alpes, con hora de inicio a las 10:00 a.m; con el agradecimiento por la participación de la comunidad. Se hace la presentación del personal del contratista y de interventoria .
2. Luis Felipe Bedoya, residente social de apoyo, expone la introducción del proyecto y explica a la comunidad que a través de los acuerdos realizados en la Habana, estableció como punto importante de la Reforma Rural Integral, la creación de un Plan Nacional de vías terciarias, con el fin de contribuir al mejoramiento de vías en departamentos cafeteros con recursos del fondo de regalías, OCAD PAZ. Se suscribe el contrato 0495 de 2018, entre el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) y la Federación Nacional de Cafeteros, cuyo objeto es el "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILTACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DE SEPTIEMBRE DE 2017". ¿Qué es OCAD PAZ? Es un órgano Colegiado de administración y decisión (OCAD) responsable de la definición de proyectos de inversión financiados con recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). Creado por el Acto Legislativo No. 04 del 8 de septiembre de 2017 y reglamentado por el Decreto Ley 1534 de septiembre de 2017, específicamente destinado para la aprobación de proyectos de inversión relacionados con la implementación del Acuerdo Final para la terminación del Conflicto. Los territorios a intervenir dentro de este acuerdo, son 5 departamentos, 28 municipios: Cauca (12) municipios, Caldas (9) municipios, Quíndio (2) municipios, Risaralda (4) municipios y Valle del Cauca (1) municipio. En el departamento del Cauca, los municipios a intervenir son: Balboa, Florencia, Mercaderes, Santa Rosa, Buenos Aires, Corinto, Santander de Quilichao, Cajibio, Jambaló, El Tambo, López de Micay y Piamonte. Con una inversión total de $13.026.230.310,94 donde está contemplado realizar 8 alcantarillas, 580,2 mts de placa huella y 2 Box Coulvert para el municipio de Mercaderes.
El contrato inició a partir del 25 de Enero de 2018, donde en este periodo se realizó el proyecto y los estudios y diseños.

.

El organigrama de OCAD PAZ funciona de la siguiente manera: en el nivel superior se encuentra El Ministerio de Hacienda quien destina los recursos del Sistema General de Regalías, dichos recursos se los asigna a INVIAS, quien es la institución encargada de administrar los recursos, supervisar, controlar y vigilar, este

proceso lo hace a través de una interventoría, que para el municipio de Mercaderes es Codipro, la interventoría supervisa al contratista.

La Federación Nacional de Cafeteros como contratista esta conformado por un Director de obra, un residente de obra, quien tiene a su cargo un maestro de obra y ayudantes de obra; una residente social. Las funciones de INVIAS, quien es el supervisor del contrato es verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas, apoyar el logro de los objetivos contractuales, velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato, mantener en contacto a las partes del contrato, evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. Codipro, quien es la entidad interventora y está con contrato 921 de 2018 y cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en los municipios de Mercaderes, Balboa, Florencia y Santa Rosa del departamento del Cauca de conformidad con el Decreto Ley 1534 del 17 de septiembre de 2017 y dentro de sus funciones está a realizar control y vigilancia sobre la ejecución de la obra, supervisar el cumplimiento de las actividades que realice el contratista, verificar que todos los trabajadores se encuentren afiliados a la EPS y ARL. La Federación Nacional de Cafeteros, quien es la empresa contratista tiene como funciones ejecutar todas las actividades técnicas y logísticas necesarias para realizar la obra en el marco del cumplimiento de especificaciones técnicas, en especial las de INVIAS, plazos y correcta inversión de los recursos, para ello dispondrá de: contratación mano de obra calificada y no calificada, contratación de un ingeniero residente de obra, suminisro de todos los materiales, herramientas e insumos requeridos a través de proveedores, contratación de maquinaria y equipo requerido, acompañamiento social.

3. El ingeniero Johan Cardenas Quintero, residente de obra expone el componente técnico, donde habla sobre el proceso constructivo de los tramos a intervenir: (La La Monja, El derrumbe y Los Alpes), y la construcción de 2 Box Coulvert en la vereda Tablones.

El pavimento con placa huella constituye una solución para vías terciarias de carácter veredal que presentan un volumen de transito bajo con muy poco flujo vehicular

Los principales atributos de este tipo de pavimento son: ofrecer permanentemente condiciones de circulación satisfactorias, mejoramiento del acceso a las veredas y un amplio periodo de servicio; no requiere acciones de mantenimiento diferentes a la limpieza de las obras de drenaje y la rocería de las zonas laterales. Es una vía con una sección transversal de 5mts de ancho, con dos huellas construidas en concreto reforzado, cada huella es de 90 cms de ancho, entre la huella va una estructura confinada de piedra pegada con mezcla de concreto con un ancho de 45 cm, hacia la parte exterior de huellas va piedra y termina con unas cunetas y unos bordillos en concreto reforzado, el espesor de las huellas de piedra pagada serán de 15 cms y toda la estructura cuenta con una capa de sub base granular de 15 cm.

4. Felipe Bedoya, residente social, se refiere al componente social, donde se explica cada programa: - Atención a la comunidad, cuyo objetivo es brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad. Para ello, se estableció un punto de atención concertado con la comunidad en la vereda los Alpes en la casa de habitación del Señor Audelo Beltran, los días viernes con un horario de atención de 8:00 am a 5:00 pm.

Con la instalación de un buzon satelite en la vereda Contador . El Programa de información y divulgación, cuyo objetivo es brindar información clara y oportuna a la comunidad del AID, Juntas de acción comunal y autoridades locales y regionales, involucradas en el proyecto, por lo tanto, se informará a la comunidad mediantes tres reuniones, una reunión de inicio de obra, que es la que se está llevando a cabo, una segunda reunión para informar sobre los avances de obra y una tercera reunión que se entregará la obra a la comunidad. Para convocar a dichas reuniones, se realizará mediante volantes y perifoneo.

- Programa Manejo de la infraestructura de predios y servicios públicos, cuyo objetivo es identificar y registrar a través de actas de vecindad el estado físico de las construcciones e infraestructura de todos los predios en vecindad a la obra antes de inciar las obras constructivas. Las actas de vecindad son un soporte para el contratista y el propietario, en caso de reportarse afectación en el predio. - Programa Cultura vial y participación comunitaria, cuyo objetivo es crear espacios para la participación y control social a través de la conformación y consolidación del Comité de Participación Comunitaria del proyecto. Para ello, se les explica qué es el comité de veeduría ciudadana sus funciones y se les pregunta a los participantes quién está interesado en hacer parte de dicho comité, donde 6 personas de la comunidad se postulan, quedando conformado el comité de veeduría, con la aprobación de los asistentes. Así mismo se les explica que dentro de este programa está el realizar campañas preventivas de educación, sensibilización y sostenibilidad, orientadas a los cambios que generará en la movilidad el proyecto en la etapa de construcción;educación vial, normas para la seguridad del peatón en la vía. De igual forma, se habla sobre el plan de manejo de tránsito, donde se les informa que durante el proceso constructivo se realizará el cierre de vía por un promedio de dos meses y se implementará señalización durante la ejecución de la obra, se da a conocer las vías alternas, se les informa que antes de hacer cierre a la vía se da a conocer a través de los líderes sociales la fecha a cerrar a través de llamadas telefónicas y para la comunidad en general se hará a través de volantes y cuñas radiales.

Programa contratación mano de obra, cuyo objetivo es generar empleo en el área de Influencia Directa (AID), vinculando el 70% de la mano de obra no calificada del área de influencia, de no cumplirse con este indicador se tendrá en cuenta la comunidad del Área de Influencia Indirecta. Con el apoyo de los líderes de la comunidad se buscará la hoja de vida de los interesados, se darán los criterios para la selección de la mano de obra no calificada atendiendo a los lineamientos de la política de contratación laboral, se solicitará a las juntas de acción comunal el listado de las personas oferentes, se solicitará a la JAC o al personero municipal certificar la residencia habitual de la persona contratada.

5. Se da espacio para que la comunidad pregunte, el señor Victor Narvaez expone la situación de su predio el cual a sufrido afectación por la intervención de una máquin ya que al intentar ampliar el sobre ancho de vía, se derrumbo parte lateral sobre carretera de su predio, según él afectando la edificación de su vivienda, agrietandose algunas paredes, el señor Victor dice que posee oficio radicado en la administración Municipal, poniendo en conocimiento su caso, oficio firmado por testigos que asegur que lo dicho por don Victor es verdad; seguidamente el Coordinador de Desarrollo Comunitario y Rural, el señor Sigifredo Díaz comenta que el Alcalde ya tiene conocimiento del caso y que de forma verbal se compromete a poner materiales para la cosntrucción de lo más viable a realizarse para reparar el daño y dar inicio lo más pronto posible a la obra. Seguidamente el señor Livio Gentil Castillo, presidente de la Junta de Acción Comunal de Los Alpes expresa el compromiso de la comunidad para poner la mano de obra para la cosntrucción de un posible gavión de contención.

El ingeniero Johan Cardenas dice que se debe cumplir los compromisos para poder dar inicio a la obra.

Por último se conforma el Comité de Veeduría y Participación Ciudadana.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Realizar obra sobre la casa del señor Victor Narváez		Alcaldía Municipal y comunidad Los Alpes

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	23	11	18
	(Día)	(Mes)	(Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de Mercaderes Cauca

DEPARTAMENTO: CAUCA MUNICIPIO: Mercaderes FECHA: 23/noviembre/2018

VEREDA/CORREGIMIENTO: los Alpes LUGAR: Salón sistemas Escuela los Alpes

ACTIVIDAD: Reunión de socialización inicio de obra proyecto OCAD PAZ.

Ord	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO
1	Jerney Barbano Barbano	1061019264	los Alpes		3508769401
2	Antonio Muñoz	10430129	Los alpes		
3	Gelso Castillo B	10592831	Los Alpes		3501594567
4	Alexander castillo	10543512	Los alpes	ingeniero	~~3502567~~
5	Wilmer Castillo	10544672	Los alpes		3502547709
6	Faber Lasso	1144183802	Los Alpes		
7	Deily Muñoz B.	1061020548	Los Alpes		
8	Harmis Marquez B	10594627	Los Alpes		3203833496
9	Claudina Diaz	27307985	los alpes		
10	Pedro Beltrán	5339248	Los Alpes		319 637 1579
11	Adriana A Morales O.	1061087244	Los Alpes		3122118634.
12	Sigifredo Diaz.	16661.180	Alcaldia	Desarrollo comunitario	3148836937
13	Reclino Sogue	4710081	los planes		3165172157
14	Katy Yuliana Sánchez	34328971	Los alpes		3157198006
15	Elder Ñañez	76.215356	los ALPez		3137260739

REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de Mercaderes Cauca

DEPARTAMENTO: CAUCA MUNICIPIO: Mercaderes FECHA: 23/noviembre/2018

VEREDA /CORREGIMIENTO: Los Alpes. LUGAR: Salón internas Escuela los Alpes

ACTIVIDAD: Reunión de socialización inicio de obra proyecto OCAD PAZ

Ord	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO
1	Livio Gentil Castillo Pino	10 593 074	Los Alpes	Presidente J.A.C.	350 827 7772.
2	Miller Muñoz	10574566	Los Alpes		3175477946
3	Franco Montenegro	7087026437	Los alpes		
4	Jose victor narvaez	10430164	los Alpes		
5	Luis Gonzalo Muñoz	10.430172	La monja	presidente	3508458944
6	Gerardo Silva	10590487	El placer	comite de Cafeteros	3117082530
7	Francisco Pineda.	10592020	Alcaldia.	Inspector p.	3023893017.
8	DUVAR ALEXIS PAZ	1061017632	Tablones Bajos	Presidente J.A.C.	duvarpaz@gmail.com 3146294817
9	Pabilo Bolaños	4.941360	Tablones Altos	Concejal	3207202868
10	Edelfa Irene Burbano	34569957	Los Alpes	Representante, principal comite cafeteros	3185747240 3502528334.
11	Pedro Narvaez Benavidez.	70593770	Los Alpes		3126573948
12	Edil Zuñiga Paz	10592919	Tablones Bajos		3233824570
13	Jaime Zuñiga	4947356	tablones B		3162825484
14	Reinel Zuñiga	1061017788	Tablones B		3117712787
15	Olmedo Motoa samboni	10 6/0 20131	Esmeraldas	Fiscal J.A.C Esmeraldas	3155114280

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

	FECHA	23	11	18
		(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 495 **DE** 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Sigifredo Diaz	Coordinador Desarrollo Comunitario	Alcaldia Municipal de Mercaderes
Libio Gentil Castillo	Presidente JAC	Vereda Los Alpes
Luis Gonzalo Luna	Presidente JAC	Vereda La Monja
Franklin Pinta	Inspector	Alcaldia Municipal de Mercaderes
Duvar Alexis Paz	Presidente JAC	Vereda Tablones bajos
Olmedo Muñoz	Fiscal JAC	Vereda Esmeraldas
Edelfa Irene Burbano	Integrante JAC	Vereda Los Alpes
Gerardo Silva	Integrante de la JAC	Vereda El Placer

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Conformación de la Veeduría ciudadana del TramoAnillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos)

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Postulación y presentación de cada uno de los asistentes
2. Aprobación de la Veeduría Ciudadana por la comunidad en reunión de socialización.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Finalizada la reunión de socialización se invita a la comunidad a hacer parte de la Veeduría ciudadana, recordandoles su funciones antes expuestas en el programa del componente social, seguidamente las personas interesadas levantan la mano y se presentan, diciendo el nombre y la vereda que representan.

La veeduría queda conformada por las siguientes personas:

Livio Gentil Pino, Presidente de la Junta de acción Comunal de la Vereda los Alpes.
Olmedo Muñoz Samboni, fiscal de la junta de Acción Comunal de la vereda Esmeraldas
Edil Zuñiga Paz, Integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Tablones Bajos.
Reinel Zuñiga, Integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Tablones Bajos.
Adriana Morales, habitante de la Vereda Los Alpes
Luis Gonzalo Luna, Presidente de la Junta de Acción Comuna de la Vereda La Monja.

Por último se aprueba por la comunidad los integrantes de la veeduría y se firma el acta.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Facilitar Copias de Cedúlas de Ciudadanía de los miembros de la veeduría		Miembros de la Veeduría.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
	VERSIÓN	1		
	PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 24 (Día) 11 (Mes) 18 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: FNC DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca

CONTRATO DE OBRA No. 495 DE 2018

CONTRATISTA:

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacion de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en el dpto del Cauca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 DE 2018

INTERVENTOR: CONIPRO.

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Lindon Tintinago	Ing. Planeacion	Alcaldia M.pal
Luz Mila Mauras	Secretaria	Alcaldia M.pal
Javier Sanchez	Res. tecnico	FNC
Claudia Mauras	Res. social	FNC
Daniel Muñoz	Dla Rural	Alcaldia Municipal

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar reunion de socializacion e inicio de obra proyecto mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitacion de vias terciarias en el marco de la OCAD PAZ municipio de Sta Rosa (Cauca)

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Presentacion y Saludo
- Antecedentes proyecto
- Componente tecnico
- " social
- Pta a inquietudes.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

la reunion inicia a las 3:20 pm con participacion de comunidad del AID (Tarabita y la Agencia) y la administracion municipal se inicia con intervenciones y saludos de parte de FNC, delegado del alcalde y presidentes de las juntas de la Tarabita y la Agencia. Seguidamente se informa a la comunidad acerca de antecedentes del proyecto; asi como se dan a conocer las especificaciones tecnicas y sociales

Un punto que llama la atencion de la comunidad, es la contratacion de la mano de obra, inicio de obra y cierres de vias, para lo cual se da el respectivo argumento.

Es importante aclarar que la reunion fue aplazada en dos ocasiones la primera por sugerencia de la interventoria puesto que hubo ajustes en estudios y diseños. la segunda vez por peticion del alcalde municipal quien manifesto que queria hacer presencia por tal motivo la lider social Adriana Sarria el decidio postergar la reunion hasta el dia de hoy 24-4-18. Ante esta situacion se evidencio poca asistencia de la tarabita.

- Interventoria no asiste a reunión aunque fueron informados.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

FECHA: 24 (Día) | 11 (Mes) | 18 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Conformación y formalización de veeduría	30 NOV.	Comunidad Personería ENC.
Contacto entre maestro de obra y líderes comunitarios (También la Agencia) para recepción de H.V de posibles interesadas en el trabajo.	30 NOV.	ENC Maestro de obra.
Se establece como punto de atención la cabecera municipal, concretamente en la alcaldía municipal	Inicio de obra	Alcaldía. ENC.

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Al manifestar que el (la) residente social estará 50% de tiempo en municipio, los funcionarios de la alcaldía sugieren un tiempo considerado del social que permita atender oportunamente las situaciones que se presenten

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por sí solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Javier Sanchéz	
Claudia Macias	
Lindon Tintinago	
Daniel Mina	
Carlos Heinardo Carbajal Hoyos	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de _____ Cauca

DEPARTAMENTO: Cauca MUNICIPIO: Sta Rosa FECHA: 24-11-18.

VEREDA /CORREGIMIENTO: Sta Rosa. LUGAR: Salón Comunal

ACTIVIDAD: Reunión socialización e inicio de proyecto OCAD PAZ

Ord	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO
1	Jorge Samboni Urbano	1061642571	Los Andes	Tesorero.	318 8220777
2	Liliana Consuelo G.		La Agencia		
3	Edier Efren Guamanga	4767746	JAC Agencia	Presidente.	3202191334
4	Mario Muñoz	4763664	Agencia		3234335472
5	Didier Hurtado G.	1062754186	Agencia		
6	Silvio M Lara B	4763571	Encanto	- - -	
7	Luis Carlos Perez	1513297	Sta Rosa	Agricultor	3136902897
8	Abdulai Guamanga	1513374	Cumbalero	Agricultor	
9	Yineth Elsenel Giron.	25'670 622	Alcaldia.	Bibliotecaria	3226392014
10	Maria Estilda Males R.	26.553.367	Sector 1	Tesorera Comite Adulto	
11	Elias Victor Jimenez J	4763646	Agencia		3732405027
12	Reinel Jimenez	4763530	Santa Rosa	Agricultor	3147355565
13	Eileen Adriana Villegas	25670677	Sta Rosa	Enlace FA	3106423404
14	Claudia C Macias	1010168753	FNC	R. social	3187068781
15					

REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de Sta Rosa Cauca

DEPARTAMENTO: Cauca MUNICIPIO: Sta Rosa. FECHA: 24-11-18

VEREDA /CORREGIMIENTO: Sta Rosa LUGAR: Salon Comunal

ACTIVIDAD: Reunión socialización cierre proyecto OCAD PAZ

Ord	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN	CARGO	TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO
1	Hugli Jacqui Jacqui	1.061768444	Alcaldia Sta	Actron Sisben	3122201796
2	Tina Maria Tovar P.	1.061.745.599	Alcaldia	apoyo Oficina Desarrollo Rural	3225654387.
3	Alexander Gomez P.	76.315923	Cabecera Sta Rosa	Secretario	3205695070
4	Maria Procelina Mulcj	66856424	La Agencia	Ama de casa	
5	Jose Daly Erazo Perez	25.670.782	Alcaldia	Aux. Planeacion	3207315203
6	Maria Emilda Bar	25670334	Santa Rosa	Ama de casa.	3142327676
7	Fernando A. Q Gomez	7.062754558	V. Tarabita	Presidente	3205478805
8	Holmes Ruiz Joaqui	10302003	V. Carmelo	Presidente JAC	3135906314
9	Javier Eduardo Calvache B	4.763589	Alcaldia	Cor. Cultura	3234966101
10	Javier yamid joaqui	7.062754.0118	Agencia		3222540341
11	Edgar Muñoz	3207561618	Agencia		3907561618
12	Ana Maria Acosta	25316693	Vicepresidente Vereda Andes	Vicepresidente	3288701969.
13	Diomedes Jimenez	4769531	Cristalina	comite	3208307607
14	Alvaro Chicangana Mendez	4765084	Vice Presidente la Maquiza	Vicepresidente	3137639280
15	Ludivio Imbachi Jimenez	4062.754.427	Agencia		3233465743

INFORMES SEMANALES No 13, 14, 15 y 16 de cada Municipio.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRUMIN-15-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 8 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

TRAMO Y/O SECTOR(S): **MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL**

UNIDAD EJECUTORA: **RED TERCIARIA Y FERREA**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

SEMANA No.: **13** (Numeración consecutiva) del **01/11/2018** al **07/11/2018**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **Ing. ISOLIER ANDRES EGURS BENITEZ**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

FECHA DE INICIO: **09-ago-18**

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: **14 OBRAS DE ARTE, 767,6 M PLACA HUELLA Y 767,6 M DE CUNETAS 18,7 ML MURO**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: **CODIPRO INGENIERIA LTDA**

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

PLAZO INICIAL: 5 meses — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 77.055.876,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO: AGOSTO


VALOR FACTURA: $ 9.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	80%		80%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: **CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL** TRAMO 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN

PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.
VIA MOJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MEN-15-FR-0		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 8 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OTROS: 0

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

*

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se desarrolla comité se seguimiento entre: Invias, Contratista e Interventoria el dia 7 de noviembre de 2018, se cuenta con la asistencia de los ingenieros (Invias) Adrián Valencia, Maria De Los Angeles Ceballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma, (Contratista) Fernando Chacón, (Interventoria) Luis Orduz y Angélica Garzón. Revisión por parte de interventoria de los estudios y diseños para los tramos CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA, correspondiente a levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico, diseño de pavimento, diseño hidráulico y APU.
3. Elaboración de documentación para solicitud ante INVIAS de modificación por cambio de localización de las obras, de acuerdo a los estudios y diseños presentados por el Contratista de Obra.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):

1. Elaboración de documentación para solicitud de modificación por cambio de localización de las obras, de acuerdo a los estudios y diseños presentados por el Contratista de Obra.

2. Elaboración de inventario de predios, actas de vecindad y permisos de intervención para los tramos CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II

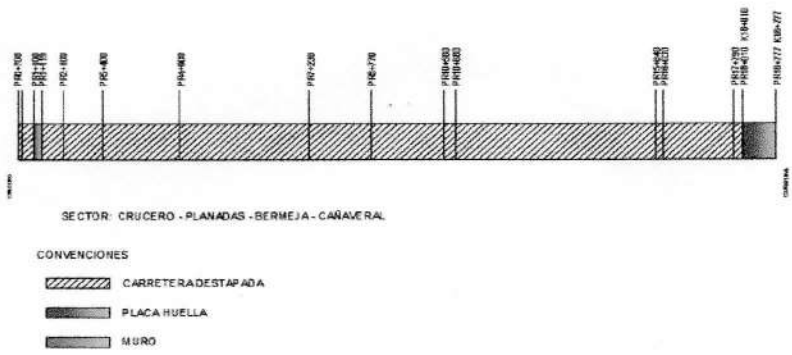

SECTOR: CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL

CONVENCIONES

- CARRETERA DESTAPADA
- PLACA HUELLA
- MURO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERA).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REVISIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA, DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DE DICHOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

FIRMA:

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT.: 20202-28306 CND

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

TRAMO Y/O SECTOR(S): **MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)**

UNIDAD EJECUTORA: **RED TERCIARIA Y FERREA**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

SEMANA No.: **13** (Numeración consecutiva) del **01/11/2018** al **07/11/2018**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

FECHA DE INICIO: **09-ago-18**

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: **8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **CODIPRO INGENIERIA LTDA**

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 77.055.876,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: AGOSTO


VALOR FACTURA: $ 8.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	80%		80%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: **ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)**

TRAMO 2: **ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)**

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN

PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A

VIA [illegible]ARRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA)

U N

PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA AUN NO HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACIÓN.

OBSERVACIONES:

El contratista no ha entregado Documento Ambiental atendiendo las observaciones realizadas por el Especialista Ambiental de Interventoria - Ing. Ricaurte Vargas.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OTROS: 0

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se desarrolla comité se seguimiento entre: Invías, Contratista e Interventoría el día 7 de noviembre de 2018, se cuenta con la asistencia de los ingenieros (Invías) Adrián Valencia, María De Los Angeles Caballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma, (Contratista) Fernando Chacón, (Interventoría) Luis Orduz y Angélica Garzón.

2. Corrección, revisión y aprobación de análisis de precios unitarios del contrato de obra para el municipio de Mercaderes.

3. Mesa de trabajo entre contratista e interventoría para el ajuste del proyecto, concerniente al municipio de Mercaderes.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS): 1. El contratista presentará diseños y resultados de estudios realizados en campo para determinar las respectivas correcciones y ajustes antes de su aprovación, Los análisis de precios unitarios del tramo se encuentran en ajuste por parte del contratista, Mesa de trabajo para Ajuste del Proyecto.

SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON): 1. El contratista presentará diseños y resultados de estudios realizados en campo para determinar las respectivas correcciones y ajustes antes de su aprovación, Los análisis de precios unitarios del tramo se encuentran en ajuste por parte del contratista, Mesa de trabajo para Ajuste del Proyecto.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II

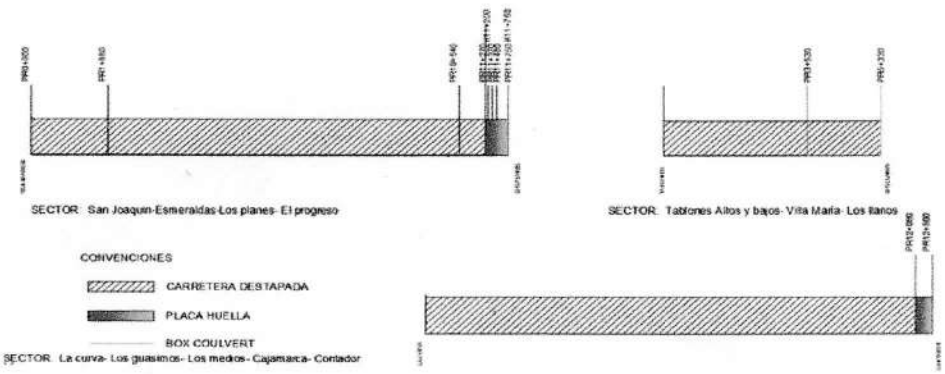

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS-LOS PLANES. EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y 2 (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.
UNA VEZ RECIBIDOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, REALIZAR LA CORRESPONDIENTE REVISION, PARA HACER FACTIBLE LA APROBACION, O EN SU DEFECTO REALIZAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28308 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	
		FECHA	8 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

TRAMO Y/O SECTOR(S): **MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)**

UNIDAD EJECUTORA: **RED TERCIARIA Y FERREA**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

SEMANA No.: **13** (Numeración consecutiva) del **01/11/2018** al **07/11/2018**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

FECHA DE INICIO: **09-ago-18**

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: **14 OBRAS DE ARTE, 124,5 M PLACA HUELLA Y 124,5 M DE CUNETAS**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	495 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	5 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	5 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
% DE OBRA EN % (B/A):		
INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		COMPLETAR
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		COMPLETAR

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 77.055.876,00 Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X


MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	80%		80%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: **CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA** TRAMO 2: **VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA**

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN

PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A

VIA MOJARRAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA)

UBICACION

PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN REVISION

OBSERVACIONES:

El contratista envio el documento el dia 17 de octubre del 2018 para revision y aprobación de los especialistas.
La interventoria entrego el documento para corregir algunas observaciones el dia 26 de Octubre del 2018.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se desarrolla comité se seguimiento entre: Invías, Contratista e Interventoría el día 7 de noviembre de 2018, se cuenta con la asistencia de los ingenieros (Invías) Adrián Valencia, Maria De Los Angeles Ceballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma, (Contratista) Fernando Chacón, (Interventoria) Luis Orduz y Angélica Garzón. 2. Se realizaron mesas de trabajo para verificar los formatos de APU, Cantidades de obra en Presupuesto general, Chequeo de Coordenadas finales para las obras y revision de los estudios y diseños por parte de los especialistas designados por interventoría, para los dos sectores Cruce Escuela Bella Vista- La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalacion de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalacion de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

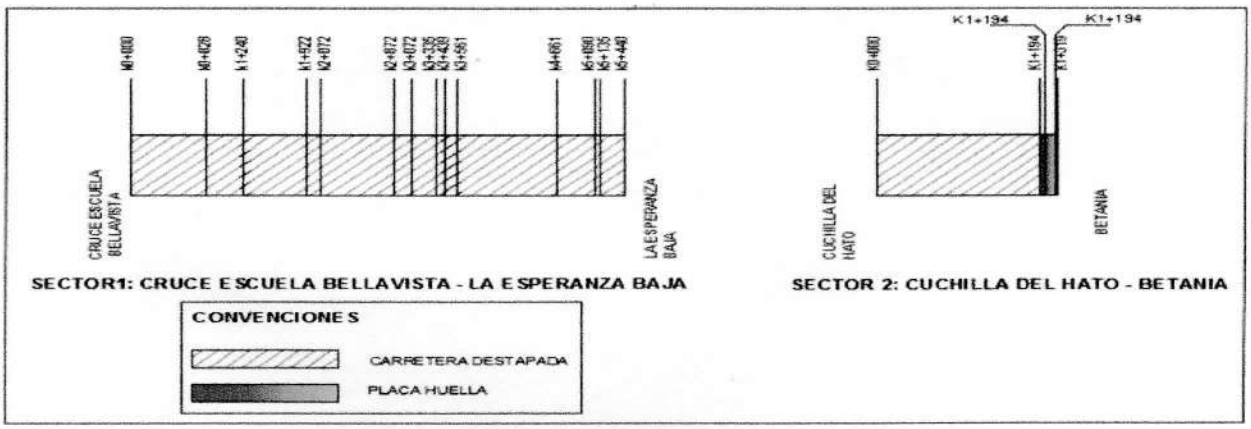

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).

XI. RECOMENDACIONES Y/O ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	
CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.	
UNA VEZ RECIBIDOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, REALIZAR LA CORRESPONDIENTE REVISION, PARA HACER FACTIBLE LA APROBACION, O EN SU DEFECTO REALIZAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.	FIRMA
	NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
	No. MAT: 25202-28808 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	INFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 8 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 13 (Numeración consecutiva) del 01/11/2018 al 07/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	495 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	5 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	5 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 77.055.875,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: AGOSTO


VALOR FACTURA: $ 9.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	80%		80%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA

TRAMO 2: LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN

PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.

VEREDA: EL BORDO

(MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL., POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	
EMISIONES:	SI		NO		N/A	
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:

SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se desarrolla comité se seguimiento entre: Invías, Contratista e Interventoría el día 7 de noviembre de 2018, se cuenta con la asistencia de los ingenieros (Invías) Adrián Valencia, María De Los Angeles Ceballos, Isolier Eguis, Luis Ledezma, (Contratista) Fernando Chacón, (Interventoría) Luis Orduz y Angélica Garzón 2. Se realiza revisión por parte de la Interventoría de estudios y diseños, presentada por el Contratista de Obra, corrrespondiente a levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico, diseño de pavimento, diseño hidráulico y APU. 3. Elaboración de documentación para solicitud ante INVIAS de modificación por cambio de localización de las obras, de acuerdo a los estudios y diseños presentados por el Contratista de Obra.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):

1. El contratista presentará a la Interventoría los estudios y diseños defintivos del proyecto.
2. Revisión por parte de la Interventoría los estudios y diseños defintivos del proyecto.
3. Radicar ante INVIAS la solicitud de modificación por cambio de localización de las obras.
4. Reprogramar socialización del proyecto con la comunidad.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II



SECTOR: CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA

SECTOR: CABECERA-LA AGENCIA

CONVENCIONES

CARRETERA DESTAPADA

PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMO No. 1 (LA CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA) Y No. 2 (CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA), DE ACUERDO A LA RADICACIÓN FORMAL DE DICHOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 15 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 14 (Numeración consecutiva) del 08/11/2018 al 14/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 767,6 M PLACA HUELLA Y 767,6 M DE CUNETAS 18,7 ML MURO

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA		INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA	
INTEGRANTES:	N/A		INTEGRANTES:	N/A	
CONTRATO No.	495 de 2018	VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES: $ -	PLAZO INICIAL:	5 meses	ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	5 meses	VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 86.354.181,00 Para los cuatro (4) Municipios

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%		100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

TRAMO 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION

PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.
VIA MOJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
PERMISO MINERO:	SI		NO	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:

SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OTROS: 0

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

*

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Revisión por parte de interventoría de los estudios y diseños para los tramos CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA, correspondiente a levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico, diseño de pavimento, diseño hidráulico y APU. 2. Radicación de documentación para solicitud ante INVIAS de modificación por cambio de localización de las obras, de acuerdo a los estudios y diseños presentados por el Contratista de Obra, lo cual comprende: justificación técnica, cuadro de localización inicial vs localización actualizada, presupuesto de obra actualizado, programación de obra, programa de inversión, flujo de caja, acta de aprobación de presupuesto, cuadro para modificación de costos en la ficha MG 3. Elaboración de inventario de predios, actas de vecindad y permisos de intervención para los tramos CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):

1.Socialización del proyecto con la comunidad, programda para el día 19 de noviembre de 2018.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II

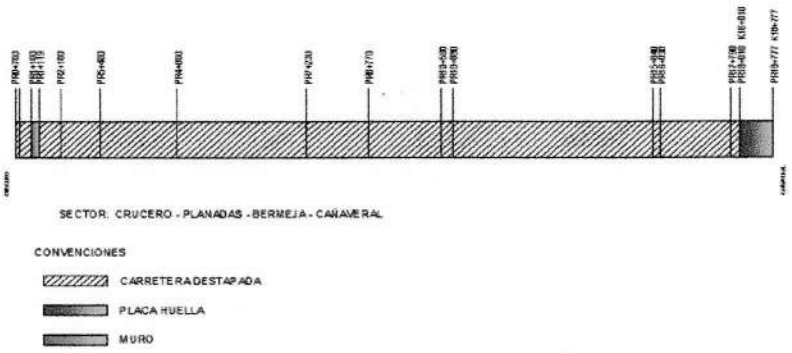

SECTOR: CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL

CONVENCIONES

- CARRETERA DESTAPADA
- PLACA HUELLA
- MURO

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERA).



FOTO 1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO CRUCE LA PLANADA - LA PLANADA



FOTO 2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA PLANADA - VERSALLES BAJOS



FOTO 3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA PLANADA - VERSALLES BAJOS



FOTO 4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN TRAMO LA CABAÑA - ESCUELA LA CABAÑA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

REVISIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA, DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DE DICHOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN EN LOS TRAMOS CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA

FIRMA:

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT.: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MNFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 15 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 14 (Numeración consecutiva) del 08/11/2018 al 14/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 124,5 M PLACA HUELLA Y 124,5 M DE CUNETAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	495 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	5 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	5 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
% DE OBRA EN % (B/A):		
INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		COMPLETAR
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		COMPLETAR

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 86.354.181,00 Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%		100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A
VIA MOJARRAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA)

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: EN REVISION

OBSERVACIONES:
El contratista envio el documento el dia 17 de octubre del 2018 para revision y aprobación de los especialistas.
La interventoria entrego el documento para corregir algunas observaciones el dia 26 de Octubre del 2018.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

2. Se realizaron mesas de trabajo para verificar los formatos de APU, Cantidades de obra en Presupuesto general, Chequeo de Coordenadas finales, justificación de cambios de localizacion de obras, cronogramas de actividades, flujos de caja , diagramas de inversión y anexos para las obras en los dos sectores **Cruce Escuela Bella Vista- La Esperanza Baja y Cuchilla del Hatio.**

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):
informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

1. Instalación de valla

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

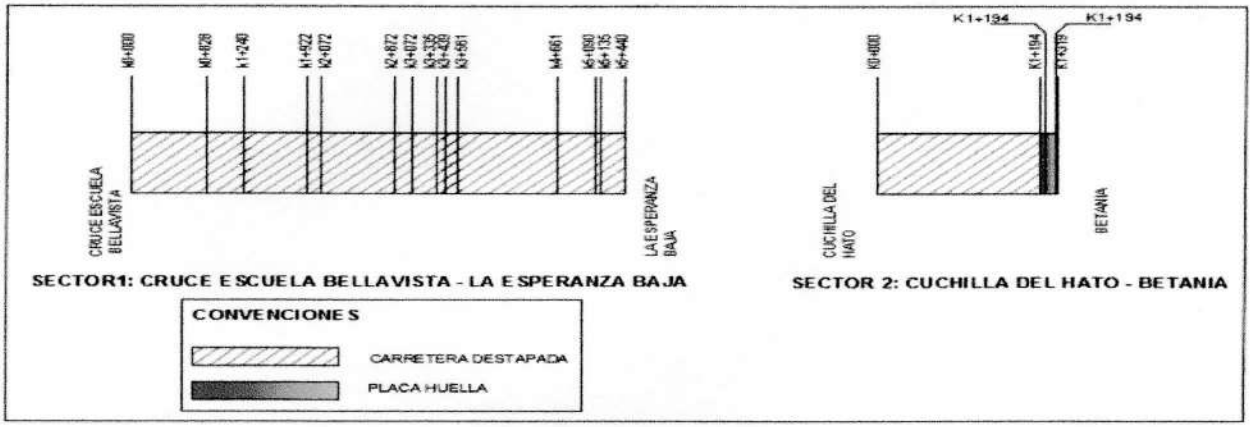

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

UNA VEZ RECIBIDOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, REALIZAR LA CORRESPONDIENTE REVISION, PARA HACER FACTIBLE LA APROBACION, O EN SU DEFECTO REALIZAR LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES.

FIRMA:

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

FECHA: 15 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 14 (Numeración consecutiva) del 08/11/2018 al 14/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
% DE OBRA EN % (B/A):
INVERSIONES EJECUTADAS:
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACIÓN: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)


INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 86.354.181,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%		100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mezcladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)

TRAMO 2: ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN

PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

...RRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA)
...ON
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:
EL CONTRATISTA AUN NO HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: EN ELABORACIÓN.

OBSERVACIONES:
El contratista no ha entregado Documento Ambiental atendiendo las observaciones realizadas por el Especialista Ambiental de Interventoría - Ricaurte Vargas.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se hacen mesas de trabajo entre contratista e interventoria para formalizar el ajuste del proyecto para el municipio de Mercaderes.

2. Se aprueban los analisis de precios unitarios y diseños para el municipio de Mercaderes.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS):

1. Radicación PMT e invitación a reunión de socialización inicio de obra, levantamiento actas de vecindad, se tramitan: los permisos de intervención, permisos de uso de baño, permisos utilización de agua, permiso material de excavación y formato de sobre ancho de vía.

SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON):

1. Radicación PMT e invitación a reunión de socialización inicio de obra, levantamiento actas de vecindad, se tramitan: los permisos de intervención, permisos de uso de baño, permisos utilización de agua, permiso material de excavación y formato de sobre ancho de vía.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

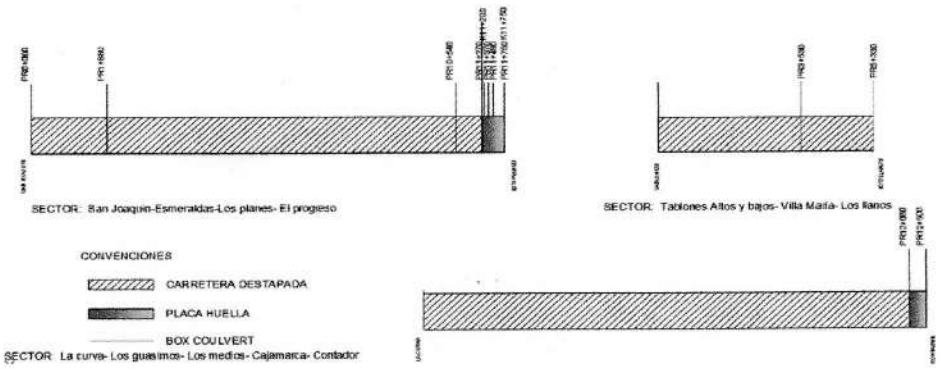

El esquema grafico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS-LOS PLANES. EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y 2 (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).





Mesas de Trabajo - Contratista e Interventoria.

XI. ...RIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT.: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-N-15-FR-3		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	4

FECHA: 15 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

TRAMO Y/O SECTOR(S): **MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)**

UNIDAD EJECUTORA: **RED TERCIARIA Y FERREA**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

SEMANA No.: **14** (Numeración consecutiva) del **09/11/2018** al **14/11/2018**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

FECHA DE INICIO: **09-ago-18**

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: **4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS**

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**			INTERVENTOR:	**CODIPRO INGENIERIA LTDA**		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	495 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	5 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	5 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
[illegible]E DE OBRA EN % (B/A):		
INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 86.354.181,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X


MES FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 9.994.120,00 FECHA FACTURA: 01/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%		100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: **EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA**

TRAMO 2: **LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA**

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACION

PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CA[illegible] S.A
T[illegible]ARRAS- EL BORDO
([illegible]OS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO:	SI	X	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Revisión por parte de interventoría de los estudios y diseños para los tramos CRUCE DE LA VIRGEN - LA TARABITA y CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA, correspondiente a levantamiento topográfico, estudio de suelos, diseño geométrico, diseño de pavimento, diseño hidráulico y APU.
2. Radicación de documentación para solicitud ante INVIAS de modificación por cambio de localización de las obras, de acuerdo a los estudios y diseños presentados por el Contratista de Obra, lo cual comprende: justificación técnica, cuadro de localización inicial vs localización actualizada, presupuesto de obra actualizado, programación de obra, programa de inversión, flujo de caja, acta de aprobación de presupuesto, cuadro para modificación de costos en la ficha MGA.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):

1. Socialización del proyecto con la comunidad, programada para realizarse el día 22 de noviembre de 2018.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II



SECTOR: CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA

SECTOR: CABECERA-LA AGENCIA

CONVENCIONES

CARRETERA DESTAPADA

PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMO No. 1 (LA CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA) Y No. 2 (CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA), DE ACUERDO A LA RADICACIÓN FORMAL DE DICHOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 22 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 15 (Numeración consecutiva) del 15/11/2018 al 21/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 767,6 M PLACA HUELLA Y 767,6 M DE CUNETAS 18,7 ML MURO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	495 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	5 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	5 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños. gestión predial. social. ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION EJECUTADA:		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 95.652.486,00 Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR	SI	NO
		X

MES FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 17.913.570,00 FECHA FACTURA: 15/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%		100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

TRAMO 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACION

"A AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA
AJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO:	SI	X	NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
PERMISO MINERO:	SI		NO
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL., POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES:

VI.

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2

TOTAL: 0

OBSERVACIONES:
*

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


1. Socialización del proyecto para los tramos CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA, para lo cual se convoca a la comunidad beneficiada, representantes de la administración municipal y líderes comunales.
2. De acuerdo a la programación de las actividades del proyecto radicada en las oficinas de INVIAS el 14 de Noviembre del 2018, se da inicio de obra el día 20 de Noviembre del 2018 para las obras realizadas en el Municipio de Balboa, sin embargo durante este periodo solo se adelantan las actividades de gestion social.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):

1.Ejecución de actividades previas para inicio de obra, lo cual comprende, entre otros, la instalación de campamento de obra, adquisición y disposición en sitio de insumos, contratación de personal (maestro de obra y ayudantes).

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



SECTOR: CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL

CONVENCIONES

- CARRETERA DESTAPADA
- PLACA HUELLA
- MURO

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERA).



FOTO 1. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA



FOTO 2. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA



FOTO 3. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

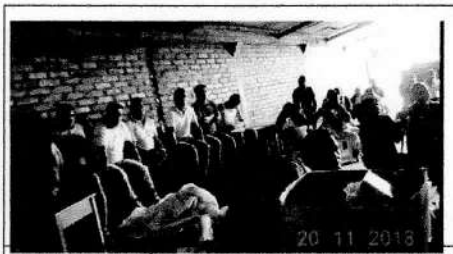


FOTO 4. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA



FOTO 5. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA



FOTO 6. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MSIPFA-MM-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2
		FECHA	22 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 7. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA



FOTO 8. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA



FOTO 9.SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA



FOTO 10. SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD EN CASETA COMUNAL DE LA PLANADA

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN Y EMISIÓN DE CONCEPTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA, DE ACUERDO A LOS COMPONENTES DE DICHOS ESTUDIOS Y DISEÑOS.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN EN LOS TRAMOS CRUCE LA PLANADA – LA PLANADA, PLANADAS - VERSALLES BAJO y LA CABAÑA – ESCUELA LA CABAÑA
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDOZ GOMEZ

No. MAT: 25202-29306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 22 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 15 (Numeración consecutiva) del 15/11/2018 al 21/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 124,5 M PLACA HUELLA Y 124,5 M DE CUNETAS

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.789.915,00
PLAZO INICIAL: 6 meses — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.789.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: COMPLETAR
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)
TOTAL INVERSION EJECUTADA: COMPLETAR

Para el Departamento del Cauca

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA


EJECUTADO ACUMULADO: $ 95.652.486,00

Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 17.913.570,00 PECHA FACTURA: 15/11/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%	100%	100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP			
Mezcladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA — TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACION

PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A
VIA MOJARRAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA)
UBICACION

PERMISO MINERO: SI [X] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [X] NO [ ]

PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:

. A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO: EN REVISION

OBSERVACIONES:
El contratista envio el documento el dia 17 de octubre del 2018 para revision y aprobación de los especialistas.
La interventoria entrego el documento para corregir algunas observaciones el dia 26 de Octubre del 2018.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realizaron mesas de trabajo para verificar los formatos de APU, Cantidades de obra en Presupuesto general, Chequeo de Coordenadas finales, justificacion de cambios de localización de obras, cronogramas de actividades, flujos de caja , diagramas de inversión y anexos para las obras en los dos sectores Cruce Escuela Bella Vista- La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato.
INVIAS el 14 de Noviembre del 2018, se da inicio de obra el dia 20 de Noviembre del 2018 para las obras realizadas en el Municipio de Florencia, sin embargo durante este periodo solo se adelantan las actividades de gestion social.
2. De acuerdo a la programación de las actividades del proyecto radicada en las oficinas de

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

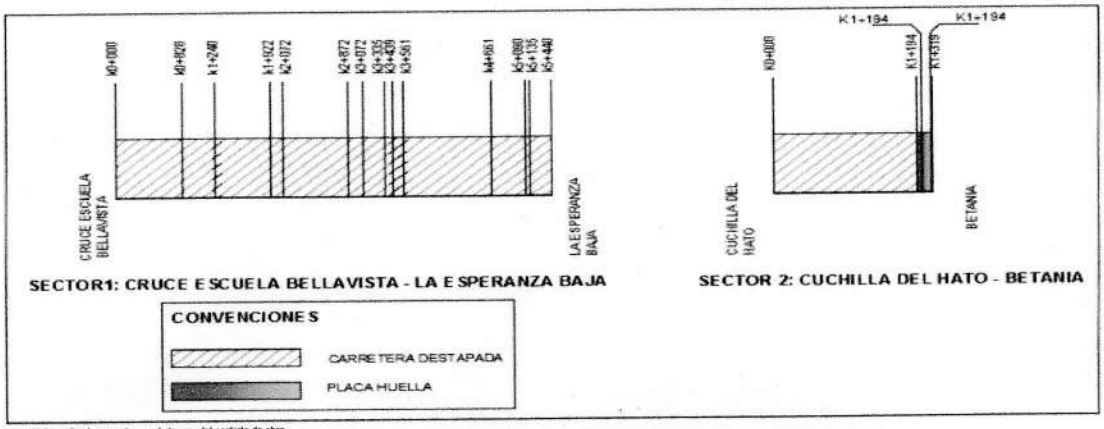

...ema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN EN LOS TRAMOS (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA LA ESPERANZA BAJA) Y (VIA CUCHILLA DEL HATO BETANIA).
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA: 22 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 15 (Numeración consecutiva) del 15/11/2018 al 21/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 95.852.486,00 Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO: SEPTIEMBRE


VALOR FACTURA: $ 17.913.570,00 FECHA FACTURA: 15/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%		100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA- LOS LLANOS)

TRAMO 2: ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A

PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ]

LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

UBICACIÓN: VIA MOJARRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA)

PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ]

LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

EL CONTRATISTA AUN NO HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN ELABORACIÓN.

OBSERVACIONES:

El contratista no ha entregado Documento Ambiental atendiendo las observaciones realizadas por el Especialista Ambiental de Interventoría - Ricaurte Vargas.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Los días 15 y 16 de noviembre de 2018 se desarrollan las siguientes actividades en el municipio de Mercaderes: Radicación PMT e invitación a reunión de socialización inicio de obra, levantamiento actas de vecindad, se tramitan: los permisos de intervención, permisos de uso de baño, permisos utilización de agua, permiso material de excavación y formato de sobre ancho de vía.

2. El contratista no inicia la ejecución de obras civiles.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS):
municipio de Mercaderes se programa para el día 23 de noviembre de 2018 en la Vereda Los Alpes. Instalación de valla. Localización y replanteo de las obras a construir. Excavaciones e instalación de tubería.


1. Socialización para el

SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON):

1. Socialización para el municipio de Mercaderes se programa para el día 23 de noviembre de 2018 en la Vía Contador - Los Medios. Instalación de valla. Localización y replanteo de las obras a construir. Excavaciones e instalación de tubería.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II

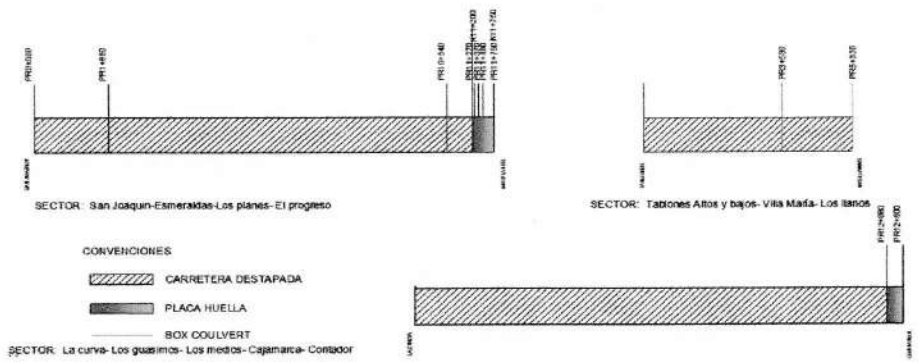

El e. ...ático será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS-LOS PLANES. EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y 2 (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).





Levantamiento de Actas de Vecindad





Levantamiento de Actas de Vecindad

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ANILLOS VIALES A INTERVENIR.

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA INICIE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2018, DEBIDO A QUE LA PRESENTE SEMANA NO HAY EJECUCIÓN Y PRESENTE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PARA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT.: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA: 22 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 15 (Numeración consecutiva) del 15/11/2018 al 21/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 20-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: 495 de 2018

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018

VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: 921 de 2018

PLAZO INICIAL: 5 meses

PLAZO ACUMULADO: 5 meses

VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

ADICIONES: $ -

VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00

VERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

VERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

Para el Departamento del Cauca

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ -

FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 95.652.486,00

Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: SEPTIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 17.913.570,00

FECHA FACTURA: 15/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%	100%	100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mezcladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA

TRAMO 2: LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN

PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.
VIA MOJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO: SI X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI NO N/A

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A

CONCESION DE AGUAS: SI NO N/A

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A

VERTIMIENTOS: SI NO N/A

EMISIONES: SI NO N/A

OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) SI NO N/A

OBSERVACIONES:

SE REGIRE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTION SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Realización de mesas de trabajo para definir actividades previas para inicio de activiades en obra, de acuerdo a lo consignado en la programación de obra.

2. De acuerdo a la programación de las actividades del proyecto radicada en las oficinas de INVIAS el 14 de Noviembre del 2018, se da inicio de obra el dia 20 de Noviembre del 2018 para las obras realizadas en el Municipio de Santa Rosa, sin embargo durante este periodo solo se adelantan las actividades de gestion social.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-18-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	22 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):

1. Ejecución de actividades previas para inicio de obra, lo cual comprende, entre otros, la instalación de campamento de obra, adquisición y disposición en sitio de insumos, contratación de personal (maestro de obra y ayudantes).
Reprogramación de socialización del proyecto con la comunidad, debido a solicitud realizada por el Secretario de Planeación del Municipio, con la cual se solicita que dicha socialización se realice el día 24 de noviembre de 2018.

2.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



SECTOR: CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA

SECTOR: CABECERA-LA AGENCIA

CONVENCIONES

CARRETERA DESTAPADA

PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMO No. 1 (LA CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA) Y No. 2 (CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA), DE ACUERDO A LA RADICACIÓN FORMAL DE DICHOS DOCUMENTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDOZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 29 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 16 del 22/11/2018 al 29/11/2018 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EQUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 767,6 M PLACA HUELLA Y 767,6 M DE CUNETAS 18,7 ML MURO

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	496 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	6 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	6 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 104.858.791,88 Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 39.849.861,00 FECHA FACTURA: 29/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%		100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL TRAMO 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN				
PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A. VIA MOJARRAS- EL BORDO (ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES:

SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:

SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES:

El contratista programo una visita para el dia 29 de Noviembre del 2018 , para verificar algunos puntos donde fuera necesario diligenciar nuevas actas de vecindad o permisos de intervención.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

-

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-VS-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)


VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Durante el dia 28 de Noviembre del 2018 se realizo una visita al tramo Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral para verificar las obras a ejecutar con el acompañamiento del ingeniero Johan Cardenas y el residente de obra Oscar Fernando Ojeda Rodriguez profesionales de la Federacion Nacional de Cafeteros.
2. Durante este periodo solo se adelantan las actividades de gestion social no se han realizado ninguna actividad de obra.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):
1. El contratista programo el dia 29 de noviembre de 2018 a la comunidad en general del tramos para participar en la reunión organizada en las instalaciones de la alcaldia municipal con el objetivo de instalar los puntos de atencion al ciudadano.
2. Ejecución de actividades para inicio de obra, lo cual comprende, entre otros, la instalación de campamento de obra, adquisición y disposición en sitio de insumos, contratación de personal (maestro de obra y ayudantes).

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

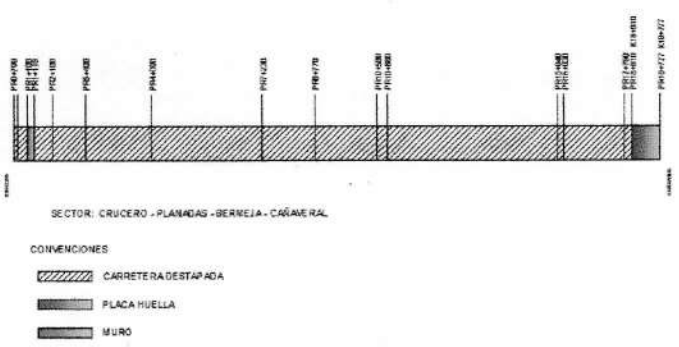

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERA).

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

FIRMA
NOMBRE: LUIS SAMUEL CABOZ GOMEZ
No. MAT 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MINTRA-MN-01-15-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 29 (Día) 11 (Mes) 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 16 (Numeración consecutiva) del 22/11/2018 al 28/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 124.5 M PLACA HUELLA Y 124.5 M DE CUNETAS

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No: 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,00
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No: 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA:	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO:	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ingresar valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Obra en Departamento del Cauca
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otros)		COMPLETAR
TOTAL INVERSION EJECUTADA:		COMPLETAR

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIN-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes, sírvase informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 104.950.791,00 Para los cuatro (4) Municipios
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [X] NO [ ]
MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.891,00 FECHA FACTURA: 28/11/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIN-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes, sírvase informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS., AJUST Y ACTUZAC ESTUD EXIST	100%	100%	100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACION			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA — TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadora llantas 120 HP			
Mezcladoras de concreto de un saco			
Compactador manual (saltarin)			

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACION: PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A (VIA MONTAÑAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA))
PERMISO MINERO: SI [X] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [X] NO [ ]

UBICACION:
PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI [ ] NO [ ] N/A [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ] N/A [ ]
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI [ ] NO [ ] N/A [ ]
CONCESION DE AGUAS: SI [ ] NO [ ] N/A [ ]
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI [ ] NO [ ] N/A [ ]
VERTIMIENTOS: SI [ ] NO [ ] N/A [ ]
EMISIONES: SI [ ] NO [ ] N/A [ ]
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA): SI [ ] NO [ ] N/A [ ]

OBSERVACIONES:
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL)
ESTADO: EN REVISION

OBSERVACIONES:
El contratista envio el documento el dia 17 de octubre del 2018 para revision y aprobación de los especialistas.
La interventoria entrego el documento para corregir algunas observaciones el dia 26 de Octubre del 2018.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS:	N/A
AVALUOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES

VI.

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
EMPLEOS INDIRECTOS (GENERADOS: DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS SEDE FLORENCIA-CAUCA
OTROS 0

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES

Se realizó la constitución de la veeduria ciudadana el dia 27 de noviembre del 2018 con la participación de la personeria municipal y los representantes de los dos tramos : Cruce Escuela Bella Vista- La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato- Betania.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se instaló el punto de atencion al ciudadano para los dos tramos de Cruce Escuela Bella Vista- La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato- Betania.
2. Se convocó a la comunidad en general de los dos tramos para participar en la reunión organizada en las instalaciones de la alcaldia municipal con el objetivo de constituir la veeduria ciudadana por parte de los representantes de los ambos tramos, que actuen como garantes del proyecto.
3. Durante este periodo solo se adelantan las actividades de gestion social no se han realizado ninguna actividad de obra.


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):
1. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
2. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

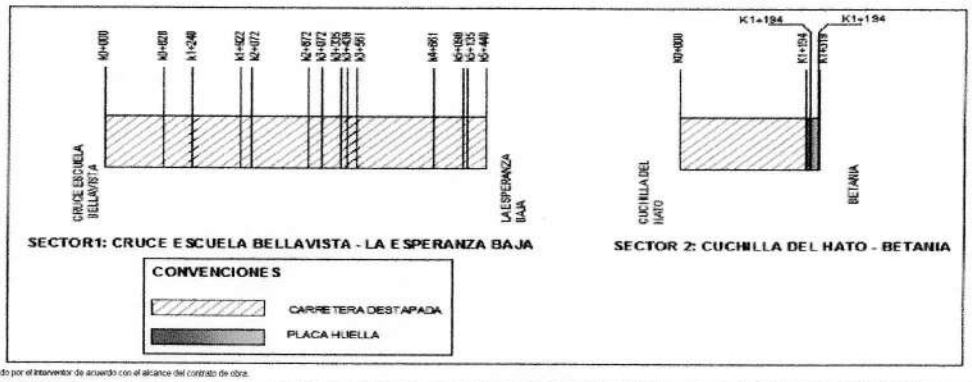

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).



FOTO 1 REUNION CONSTITUCION DE VEEDURIA CIUDADANA



FOTO 2 PARTICIPACIO DE LOS PRESIDENTES DE JAC TRAMOS CUCHILLA DEL HATO-BETANIA Y CRUCE ESCUELA BELLA VISTA- LA ESPERANZA BAJA



FOTO 3 FIRMA DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS



FOTO 4 INSTALACION DEL PUNTO DE ATENCION AL USUARIO

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA
CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

FIRMA:

NOMBRE: DIEGO SAMUEL CRUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-89-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 29 (Día) / 11 (Mes) / 2018 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 16 (Numeración consecutiva) del 22/11/2018 al 28/11/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA			INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA		
INTEGRANTES:	N/A			INTEGRANTES:	N/A		
CONTRATO No.	495 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 13.026.230.310,94	CONTRATO No.	921 de 2018	VALOR INICIAL:	$ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DIC 2018	ADICIONES:	$ -	PLAZO INICIAL:	5 meses	ADICIONES:	$ -
PLAZO ACUMULADO:	HASTA 31 DIC 2018	VALOR ACUMULADO:	$ 13.026.230.310,94	PLAZO ACUMULADO:	5 meses	VALOR ACUMULADO:	$ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCION DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

[illegible]CIA	2017	2018	2019	2020
[illegible]OS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
[illegible]/ADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(... ...r valores en pesos)

OBRA

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSION OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSION OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	0,00%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSION EJECUTADA:		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 104.950.791,00 Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
	X	

MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.881,00 FECHA FACTURA: 29/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%	100%	100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA

TRAMO 2: LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

[illegible]CION

[illegible]A AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.
VIA MOJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CALICA))

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

OBSERVACIONES:
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO:	N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS:	N/A
AVALÚOS APROBADOS:	N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:	

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:
OTROS: 0

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2	
		TOTAL: 0

OBSERVACIONES:
Se realiza la reunión de socialización el día 24 de Noviembre con la participación del ingeniero Lindón Tintinango Secretario de la oficina de planeación Municipal como representante de la alcaldía municipal de Santa Rosa, los señores Fernando Gómez, Holmes Ruiz y Eduer Guamangoa como presidentes de la JAC, líderes y comunidad en general. La profesional Claudia Macias residente social introduce a la comunidad a los aspectos generales del proyecto y sociales de la presentación, para posteriormente dar participación al ingeniero Javier Martinez residente de obra en los temas técnicos de las obras a ejecutarse en los dos sectores del Cruce de la Virgen-La Tarabita y Cabecera-La Agencia, ambos profesionales representando a la Federación Nacional de Cafeteros.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Reunión de socialización del proyecto con la comunidad, realizada el día 24 de noviembre del 2018 reprogramada debido a solicitud elevada por el Secretario de Planeación del Municipio de Santa Rosa.
Durante este periodo solo se adelantan las actividades de gestion social no se han realizado ninguna actividad de obra.

2.


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	7
		FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):

1. Instalación de Buzones y puntos de atención al usuario ademas de diligenciar los formatos de organización comunitaria.
2. Ejecución de actividades para inicio de obra, lo cual comprende, entre otros, la instalación de campamento de obra, adquisición y disposición en sitio de insumos, contratación de personal (maestro de obra y ayudantes).

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO



SECTOR: CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA

SECTOR: CABECERA-LA AGENCIA

CONVENCIONES

CARRETERA DESTAPADA

PLACA HUELLA

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).



FOTO 1.REUNION DE SOCIALIZACION CASA COMUNAL SANTA ROSA-CAUCA



FOTO 2. INTERVENCION TEMAS TECNICOS INGENIERO JAVIER MARTINEZ



FOTO 3. INTERVENCION PROFESIONAL RESIDENTE SOCIAL CLAUDIA MACIAS

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD
ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS
IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL *CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.*

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	2
		FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)

I. INFORMACION GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

TRAMO Y/O SECTOR(S): **MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)**

UNIDAD EJECUTORA: **RED TERCIARIA Y FERREA** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA** SEMANA No.: **16** del **22/11/2018** al **28/11/2018**
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"** FECHA DE INICIO: **09-ago-18**

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: **8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT**

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **CODIPRO INGENIERIA LTDA**
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2017	2018	2019	2020
RECURSOS POR VIGENCIA	$ -	$ 13.026.230.310	$ -	$ -
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 13.026.230.311,00	Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:		
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:		

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 191.660.701,00 Pago los meses (1) Mobilidad

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [X] NO [ ]
MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.981,00 FECHA FACTURA: 26/11/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FISICO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	ACUMULADO PROYECTO 1	2	TOTAL
REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST	100%	100%	100%
TOPOGRAFIA			
PLACA HUELLA			
CUNETAS			
ALCANTARILLA			
SEÑALIZACIÓN			
TRANSPORTE			
GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Retro cargadorde llantas 120 HP.			
Mescladoras de concreto de un saco.			
Compactador manual (saltarin)			

TRAMO 1: **ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)**

TRAMO 2: **ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)**

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES
UBICACIÓN
PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A
VIA MOJARRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA)
UBICACIÓN

PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]
PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EXPLOTACIÓN DE MATERIALES:	SI	NO	N/A
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:
EL CONTRATISTA AUN NO HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO: EN ELABORACIÓN.

OBSERVACIONES:
El contratista no ha entregado Documento Ambiental atendiendo las observaciones realizadas por el Especialista Ambiental de Interventoría - Ricaurte

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN Y/O PERIODO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1	CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2

TOTAL: 0

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	7
		FECHA	29 (Día)	11 (Mes)	2018 (Año)

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. El día 23 de noviembre de 2018, se llevo a cabo la socialización del Contrato de Obra No. 495 de 2018 en Los Alpes para el Anillo Vial de la Cordillera y en Los Medios para el Anillo vial la Curva, se cuenta con la presencia del personal del Contratista, Interventoria, líderes sociales del municipio de Mercaderes, Presidentes de las JAC de Los Alpes, Los Planes y Tablones Bajos y comunidad en general.

2. Conformación de (2) Veedurías ciudadanas: una para el Anillo vial de la Cordillera y otra para el Anillo vial la Curva.

3. El contratista no inicia la ejecución de obras civiles.

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS): 1. Instalación de valla. Localización y replanteo de las obras a construir. Excavaciones e instalación de tubería.

SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON): 1. Instalación de valla. Localización y replanteo de las obras a construir. Excavaciones e instalación de tubería.


IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II

ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)



ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS-LOS PLANES. EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y 2 (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).







Socialización en Los Medios - ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)







Socialización enLos Alpes - ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA(SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA ELABORACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD Y PERMISOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ANILLOS VIALES A INTERVENIR.
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD.
SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA INICIE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES LA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018, DEBIDO A QUE LA PRESENTE SEMANA NO HAY EJECUCIÓN Y PRESENTE LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PARA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL OREJUZ GOMEZ

No. MAT.: 25202-28306 CND

INFORME EJECUTIVO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INTERVENTOR:	CODIPRO INGENIERIA LTDA.
ÁREA DEL INFORME:	Dirección de Interventoría.
PERIODO DEL INFORME:	1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

- Durante el periodo del mes de noviembre de 2018, la Dirección de Interventoría ha dado término a la revisión de los Estudios y Diseños entregados por la Federación Nacional de Cafeteros e hizo factible la radicación de los ajustes de localización y presupuesto al INVIAS.

- En conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros y la interventoría se terminó la tarea de localización definitiva de las obras.

- Constantemente se viene revisando la información contractual, legislativa, normativa, acuerdos OCAD, Anexos Técnicos y demás información básica del Proyecto.

- Se han venido revisando los cuatro (4) Informes Semanales correspondientes al mes de noviembre, elaborados por el personal de campo de Interventoría, con el fin de enviarlos al Ingeniero Supervisor en Territorial Cauca, así como a la Subdirección Red Terciaria y Férrea, con la aprobación de esta Dirección.

- Durante los días 6 y 7 de noviembre se asistió de manera presencial, en Popayán, a la Reunión conjunta entre INVIAS (Planta Central y Territorial Cauca), Interventorías y Federación Nacional de Cafeteros.

- Se revisó el Informe Mensual No. 4 de Interventoría correspondiente al mes de noviembre de 2018 y se da aval para edición definitiva, con el propósito de enviarlo al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS para conocimiento y archivo en la Dirección Territorial Cauca, así como en la Planta Central.

- Se ha dado instrucción al personal de campo de la interventoría, para que se hagan cumplir las funciones expuestas en nuestro contrato y en el manual de Interventoría del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

Cordialmente,

LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
Director de Interventoría
Codipro Ingeniería Ltda.
M.P. 25202-28306 CND

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA DURANTE NOVIEMBRE DE 2018.
(1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE)

PROYECTO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA.
PROFESIONAL: Luis Samuel Orduz Gómez.
PERIODO DEL INFORME: 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018.

1/11/2018	Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer la directriz a seguir.
2/11/2018	Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer la directriz a seguir.
6/11/2018	Desplazamiento Bogotá – Popayán.
7/11/2018	Asistí a reunión en las Oficinas de Invias Popayán. Desplazamiento Popayán – Bogotá.
8/11/2018	Elaboración de Oficio de Remisión Concepto Especialista Estructural. Revisión informe semanal No 13 para cada Municipio.
9/11/2018	Dirección y coordinación en revisión de Estudios y Diseños elaborados por la Federación Nacional de Cafeteros.
13/11/2018	Dirección y coordinación en revisión de Estudios y Diseños elaborados por la Federación Nacional de Cafeteros.
14/11/2018	Revisión informe semanal No 14 para cada Municipio.
15/11/2018	Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer la directriz a seguir. Dirección y coordinación en revisión de Estudios y Diseños elaborados por la Federación Nacional de Cafeteros.
16/11/2018	Elaboración nueva distribución de recursos de Interventoría.
19/11/2018	Correcciones a nueva distribución de recursos de Interventoría.
20/11/2018	Correcciones a nueva distribución de recursos de Interventoría.
21/11/2018	Revisión informe semanal No 15 para cada Municipio.
22/11/2018	Elaboración Oficio de remisión y formatos pertinentes para oficializar la renuncia al Anticipo en la Territorial Cauca.
23/11/2018	Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer la directriz a seguir.
26/11/2018	Revisión y emisión de ajustes a Informe Mensual No. 4.
27/11/2018	Revisión justificación entregada por Federación Nacional de Cafeteros.
28/11/2018	Revisión informe semanal No 16 para cada Municipio.
29/11/2018	Revisión y aprobación de Informe Mensual No. 4.
30/11/2018	Revisión y aprobación de Informe Mensual No. 4.

LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
Director de Interventoría
Codipro Ingeniería Ltda.
M.P. 25202-28306 CND

INFORME DE ESPECIALISTAS

CODIPRO LTDA
Ingeniería & Arquitectura

Bogotá D.C. Diciembre 3 de 2018

CUENTA DE COBRO

PROYECTO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

DEBE A:

DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES
C.C. 80.467.714 de Villapinzón.

LA SUMA DE ========== $1.032.000.oo

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados en el Área **Geotecnia y/o Pavimentos** en el proyecto con Objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017", en el periodo del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2018.

SON: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

DIEGO EFRAIN PEDRAZA CHAVES
C.C. 80.467.714 de Villapinzón.

Girón, Noviembre 02 de 2018

Señores
CODIPRO INGENIERIA LTDA

REFERENCIA: Diseño de pavimento zona "Vía Cruce de la virgen – la tarabit MUNICIPIO DE BALBOA – DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

ASUNTO: Informe de revisión y diagnóstico

Respetados Señores:

Atendiendo a su solicitud, adjunto me permito enviar los comentarios, observaciones y recomendaciones surgidas de la revisión realizada a la información enviada vía correo electrónico el día Jueves 01 de Noviembre de 2018, correspondiente a los diseños de referencia.

Atento a sus comentarios

Cordialmente,

Diego Efraín Pedraza Chaves
Ing. Civil
Esp. Geotecnia Vial y Pavimentos

REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Informe Ejecutivo

CONRATISTA: CODIPRO INGENIERÍA SAS

CONTRATO: Mejoramiento de vías rurales, vías para la paz, en los Departamentos Cafeteros de Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca

LOCALIZACION: Vía Crucero – planadas. Municipio de Balboa. Departamento del Cauca.

Ing. Diego Efraín Pedraza Chaves
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA VIAL Y PAVIMENTOS
MP 25202-109359 CND

Noviembre de 2018

ANTECEDENTES

Se recibió de parte del contratista de interventoría la siguiente información relacionada con el proyecto:

1. VOLÚMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, ESTRUCTURAS DE DRENAJE OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PLACA HUELLA
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TARABITA, PR 0+000 – PR 0+090, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
3. Detalles placa huella (plano versión autocad)

No se realizó visita a campo

REVISION DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

1. VOLÚMEN IV ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE FUNDACIONES DE PUENTES, ESTRUCTURAS DE DRENAJE OTRAS ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y PLACA HUELLA

De acuerdo con la información proporcionada en el documento, para los 2 apiques y 2 CBR, se han encontrado estratos con características geomorfológicas buenas, clasificados como finos, sin presencia de nivel freático.

Los limites y humedades entran dentro del rango admisible para determinar como aceptable el suelo de soporte.

De acuerdo con el resultado del ensayo de CBR sumergido de diseño para la subrasante, supera el valor mínimo exigido por la GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA – HUELLAS del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), CAPITULO 1 numeral D, de 3%, por cuanto se consideran suelos admisibles para el uso destinado.

1. ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLACA HUELLA EN LA VÍA TARABITA, PR 0+000 – PR 0+090, MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEPARTAMENTO DEL CAUCA

Una vez revisado el documento, a continuación se realizan las observaciones del caso:

- No se encuentran dentro del documento recomendaciones geométricas respecto a los sobreanchos en las curvas; en cualquier caso se recomienda hacer uso de lo indicado en la GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA – HUELLAS del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), CAPITULO 1 numeral g.
- No se encuentran recomendaciones al respecto del diseño para mezcla de concreto; es importante tener especial precaución en la elección de los materiales a utilizar en la mezcla in situ, por lo anterior, se recomienda caracterizar muestras de agregados de canteras autorizadas, con el fin de elaborar un diseño de mezcla de concreto y seguir

recomendaciones respecto a la limpieza en la mezcla in situ, para materiales granulares GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA – HUELLAS del Instituto Nacional de Vias (INVIAS), CAPITULO 1 numeral h

Respecto al espesor de diseño, se determina que cumple con el mínimo exigido por GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA – HUELLAS CAPITULO 1 numeral e.

Así mismo, la recomendación del numeral 3.4.4. Concreto hidráulico, respecto al concreto a utilizar de 21 MPa de resistencia a la compresión está de acuerdo con la Guia del INVIAS, de la misma manera sucede con las recomendaciones de uso de materiales y diseño de refuerzo

1. **Detalles placa huella (plano versión autocad)**

La información contenida en los planos es clara, las escalas se indican de manera adecuada y en general corresponde a las solicitaciones mínimas contenidas en la GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA – HUELLAS, sin embargo, en caso de requerirse, se recomienda incluir las recomendaciones relacionadas con sobreanchos, con particularidad en zona de curva.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primera instancia es importante aclarar que las apreciaciones técnicas contenidas en el presente informe, fueron generadas a partir de documentación de oficina, por lo cual se desconocen las condiciones reales del sitio, por cuanto, se recomienda en caso de encontrar condiciones particularmente diferentes a las que se han descrito en el estudio de suelos, contar con la asesoría del profesional especializado.

Los resultados de la evaluación son los siguientes:

De manera resumida, se puede considerar que el diseño de pavimentos cumple con las condiciones mínimas establecidas dentro de la GUIA DE DISEÑO DE PAVIMENTOS CON PLACA – HUELLAS del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), sin embargo, se recomienda incluir las recomendaciones y observaciones plasmadas en el presente documento a fin de que se elimine la mayor cantidad posible de variables que pudieran afectar la transitabilidad o la vida útil de la estructura.

Cordialmente,



Ing. Diego Efraín Pedraza Chaves
MP 25202-109359 CND
Especialista en Geotecnia Vial y Pavimentos

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
CODIPRO LTDA – CONTRATO INTERVENTORIA 921 DE 2018	
INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°01	
Periodo: 01 Noviembre - 30 Noviembre 2018	
Localización proyecto: Departamento del Cauca.	Fecha elaboración: Diciembre 05 de 2018.

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

OBJETIVOS

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato de obra **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"".**
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

Principales Actividades realizadas por el Contratista e Interventoría:

- La interventoría realiza observaciones al PAGA Versión 1 presentado por el contratista para ser atendidas por La Federación de Cafeteros en la brevedad posible con miras a dar aprobación al documento que va servir como lineamiento al seguimiento al desempeño ambiental del contrato, Para los municipios de Florencia, Mercaderes, Balboa y Santa Rosa ubicados en el Departamento del Cauca.

- La última semana de noviembre el contratista remite a la Interventoria los documentos PAGA para los municipios de Mercaderes y Florencia para revisión por parte de la Interventoria.

- Los PAGAS mencionados anteriormente, se encuentran en revisión por la interventoría; una vez finalizada la revisión se proyectará oficio con aprobación u observaciones con miras a obtener el documento definitivo que va a ser implementado durante la ejecución del presente contrato.

Descripción de actividades del periodo:

Para este periodo se trataron básicamente tres temas los cuales se describen a continuación:

Permisos ambientales: La interventoría solicitó al contratista gestionar visita técnica por parte de la Corporación para informales sobre las obras a ejecutar dentro del presente contrato y así determinar la necesidad de abrir expedientes para el otorgamiento de permisos ambientales.

Aprobación PAGA: Se enviaron observaciones por parte de la interventoría, el contratista radica los PAGAS para revisión de los municipios de Florencia y Mercaderes. Al corte de este informe se encuentran en revisión por parte de la interventoría.

Seguimiento ambiental: La interventoría a través del residente técnico está presente en los distintos comités verificando temas ambientales los cuales son consultados con el especialista ambiental para su concepto y aprobación.

CONCLUSIONES

- *PAGA*. El PAGA para este periodo se encuentra en su segunda revisión por parte de la interventoría.

- **Permisos ambientales.** Está pendiente la visita de campo por parte de la corporación, para obtener concepto técnico si las obras a ejecutar requieren de permisos ambientales a solicitar ante la Autoridad Ambiental.

- *Transporte de Material.* El contratista cuenta con fuentes de materiales que cumplen con la legislación ambiental para su operación.

- *ZODMES*. Se presenta un ZODME el cual se encuentra en evaluación por parte de la interventoría para que cumpla de acuerdo a los requisitos legales que solicita la legislación colombiana en materia ambiental.

RECOMENDACIONES

- *PAGA*. Se solicita al contratista en la brevedad posible realizar las correcciones informadas por la interventoría; de tal forma, que el documento se ajuste a las necesidades ambientales que requiere la ejecución del presente contrato.

  Por otro lado, diligenciar los formatos que hacen parte del PAGA y recoger las firmas en original para proceder a sus correspondiente aprobación y posterior radicación ante la Subdirección de medio ambiente del INVIAS.

- **Permisos ambientales.** A la fecha, no se ha identificado la necesidad de permisos ambientales; sin embargo, hay que estar atentos a no generar pasivos ambientales dentro de la ejecución del presente contrato.

- **Transporte de Material.** La interventoría recomienda identificar los puntos críticos donde se van a realizar las obras de la vía, con el objeto de analizar la necesidad de establecer puntos de acopio temporal de materiales de construcción, teniendo en cuenta las distancias que conforman el presente contrato.

- ZODMES. Solo se presenta un ZODME, la interventoría recomienda gestionar varios puntos que cuenten con los permisos para disposición de material de derrumbes y/o excavación, verificando la documentación que aplica en materia ambiental para su legalización.



Ing. RICAURTE ROJAS VARGAS.
Especialista Ambiental
Codipro ltda.

FORMATOS MANUAL DE INTERVENTORIA.

Contrato de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No. 4 **MES:** NOVIEMBRE **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE OBRA No. 495 **DE** 2018

CONTRATO DE FIDUCIA No. _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

CUENTA BANCARIA No. _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

ANTICIPO OTORGADO: 0 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ - **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	N/A					

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	N/A					
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS N - **FECHA** - **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

OBSERVACIONES: No se tramitó anticipo

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Contratista
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Interventor
Matrícula No. 25202-28306 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	1	12	2018
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 495 **DE** 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. -
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: No se tramitó anticipo.
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoria.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso especifico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Contratista
Matricula No.: 19202-153851 CAU

(Firma)
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Interventor
Matricula No. 25202-28306 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** NOVIEMBRE 2018

CONTRATO DE OBRA No.: 495 de 2018

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRENDEN2018
FECHA DE INICIACION: 22/05/2018
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 13.026.230.310,94
VALOR ACUMULADO: $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DE DICIEMBRENDEN2018
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 921 de 2018 INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Obres de Arte	Unidad	39
Placa Huella	Metros	1721,1
Cunetas	Metros	1721,1
Box-coulvert	Unidad	2
Muro de contención	Metros	18,7

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento	Unidad	0
Construcción	Metros	0
Pavimentación	Metros	0

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N/A							
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N/A							
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
Total	

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	25-ene-18	01/07/2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25-ene-18	01/07/2019
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	25-ene-18	31/12/2021
Calidad de Estudios y Diseños	31-dic-18	31/12/2023
Estabilidad y Calidad de Obra	31-dic-18	31/12/2023

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	25/01/2018	31/12/2018
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: Póliza 2038648-0 SURAMERICANA, aprobada 21 Febrero 2018 por el Instituto.

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N/A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N/A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

POR EL MOMENTO NO SE HA DADO INICIO EN FIRME A LA OBRA, NO SE HAN APROBADO LOS APU'S Y SE HA DEFINIDO EL VALOR TOTAL PRESUPUESTADO PARA CADA MUNICIPIO INCLUYENDO LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE CADA SECTOR.

Firma
Luis Samuel Cadus Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-28366 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **CAUCA**

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

CARRETERA Y/O PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

MES DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2018 **CONTRATO No.** 495 DE 2018

SECTOR: MUNICIPIO DE BALBOA: Tramo 1: Cruce La Planada-La Planada, Tramo 2: La planada- Versalles Bajo, Tramo 3: La Cabaña-Escuela La Cabaña. MUNICIPIO DE MERCADERES: Sector 1 Anillo Vial de La Cordillera: Tramo No. 1: San Joaquín – La Monja, Tramo No. 2: Los Alpes, Tramo No. 3: Cruce Los Alpes; Sector 2 Anillo Vial La Curva – El Pilón: Tramo No. 1: Los medios. MUNICIPIO DE SANTA ROSA: Tramo No. 1 Cabecera Municipal – La Agencia, Tramo No. 2 Cruce La Virgen – La Tarabita. MUNICIPIO DE FLORENCIA: Sector 1: Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja, Sector 2: Vía Cuchilla Del Hato – Betania

(Abscisas alcance del contrato)

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
EQUIPO GEOFISICA																															
EQUIPO DE TOPOGRAFIA																															

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: NOVIEMBRE 2018

CONTRATO DE OBRA No. 495 DE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

SECTOR: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)-TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)-TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) Y TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 de 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

NOMBRE	CARGO	OCTUBRE																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGO	DIRECTOR DE OBRA	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
ADRIANA ISABEL SOLARTE LLANTEN	LIDER SOCIAL	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
LINDA ESTER TABITA RAMOS GALINDO	ASISTENTE DE ARCHIVOS	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
CLAUDIA YOHANA MACIAS	RESIDENTE SOCIAL	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
GLORIA PATRICIA QUINTERO	RESIDENTE SOCIAL	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
JAVIER MARTIN SANCHEZ GUERRERO	RESIDENTE DE OBRA	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Hasta la fecha no se ha presentado la relación de personal vinculado para el periodo, por parte del Contratista de Obra; por tanto se reporta con base en la identificación realizada por la interventoria.

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoria que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matricula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ortiz Gomez
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

SECTOR: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)-TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)- TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) Y TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
			TOTAL			

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
Para este periodo se realiza el proceso de ajuste, revisión y aprobación de APUs y presupuesto para cada municipio.														
TOTALES														

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Fernando Nicolás Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordoñez Ramírez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10		
		VERSIÓN			
		FECHA		DE	

FECHA: 1 (Día) / 12 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 495 de 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

SECTOR: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)-TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)- TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) Y TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	24	24	20	24	24	24	24	24	24	22	24	16	16	20	24	24	24	24	24	22	21	24	19	23	21	24	24	18	24	23		485
Lluvias moderadas	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	2	3	4	1	2	0	0	6	0	1		27
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0		3
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	16	16	24	24	24	24	24	24	24	24	27	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA		DE	

	FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 495 de 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2018

CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

SECTOR: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)-TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)- TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) Y TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación /Acciones

OBSERVACIONES: En el presente periodo no se hicieron ensayos de laboratorio.

NOTA:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

SECTOR: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)- TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)- TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) Y TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre	Cargo	Período laborado	No. Días mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																												EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Planilla	No. días cotizados		Planilla	No. días cotizados	Planilla	No. días cotizados	
FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGO	DIRECTOR DE OBRA	nov-18	30	10.303.488	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13714086	30	X	13714086	30	13714086	30	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	
ADRIANA ELIZABETH SOLARTE LLANTEN	LIDER SOCIAL	nov-18	30	25.397.502	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13714086	30	X	13714086	30	13714086	30	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	
LINDA ESTER TABITA RAMOS GALINDO	AUXILIAR DE ARCHIVO	nov-18	30	1.061.749.004	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13714086	30	X	13714086	30	13714086	30	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	
CLAUDIA YOHANA MACIAS	RESIDENTE SOCIAL	nov-18	30	101.068.753	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13714086	30	X	13714086	30	13714086	30	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	
GLORIA PATRICIA QUINTERO	RESIDENTE SOCIAL	nov-18	30	52.837.113	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13714086	30	X	13714086	30	13714086	30	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	
JAVIER MARTIN SANCHEZ GUERRERO	RESIDENTE DE OBRA	nov-18	30	93.378.931	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13714086	30	X	13714086	30	13714086	30	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.
2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.
3. **Hasta la fecha, el Contratista de Obra no ha sido presentada la información referente a Pago de Seguridad Social del personal vinculado, pese a la solicitud expresa por parte de la Interventoría.**

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matricula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordua Gomez
Director de Interventoría
Matricula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
VERSION	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 (Día) / 12 (Mes) / 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 4 **PERIODO MES:** NOVIEMBRE 2018 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No : 495 de 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
SECTOR: MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.
RUTA: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)-TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)-TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) Y TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)
TRAMO:

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIACIÓN: 22/05/2018
FECHA DE REANUDACIÓN: -
VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 13.026.230.310,94
VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: -
VALOR ADICIONALES: -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 921 DE 2018 INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
495 DE 2018	31-dic	31-dic	13.026.230.310,94	13.026.230.310,94

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2018	13.026.230.310,94
Total	13.026.230.310,94

ANTICIPOS

Otorgado $	-
Amortizado $	-
Saldo $	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
921 DE 2018	CINCO MESES	09/01/2019	464.788.915	464.788.915

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	N/A							
Acumulado:								

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	N/A							
Interventor:								

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	
Calzada:	
Bermas:	
Sub base:	
Base:	
Carpeta:	

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	
GESTIÓN PREDIAL	
GESTIÓN SOCIAL	
GESTIÓN AMBIENTAL	
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	
VALOR TOTAL	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

No se ha aprobado el presupuesto definitivo.
No se han aprobado Estudios ni Diseños.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MI-IN-15-FR-14		
		VERSION	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 (Día) / 12 (Mes) / 2018 (AÑo)

AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	PR 0 PR PR PR PR PR PR PR N	Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
							En el mes		Acumulado	
							Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
GPP1										
GPP2										
GPP3										
GPP4										
GPP5										
GPP6										
GPPn										

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma

Fernando Nicolas Cascon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma

Luis Samuel Ordúz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 495 DE 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA DE INICIO: 22/05/2018

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31 DICIEMBRE 2018
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ - NO SE HA APROBADO PRESUPUESTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 de 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	-	$ 1.302.623.031,00	25	1	2018	1	7	2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	$ 2.605.246.062,00	25	1	2018	1	7	2019
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	$ 2.605.246.062,00	25	1	2018	31	12	2021
Calidad de Estudios y Diseños	-	$ 233.936.383,00	31	12	2018	31	12	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	-	$ 3.907.869.093,00	31	12	2018	31	12	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2038848-0

Certificado de modificación o anexo No.: -
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	-	$ 651.311.516,00	21	1	2018	-	-	-
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533577-5 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: -
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

	FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	-	$ 1.302.623.031,00	25	1	2018	1	7	2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	$ 2.605.246.062,00	25	1	2018	1	7	2019
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	-	$ 2.605.246.062,00	25	1	2018	31	12	2021
Calidad de Estudios y Diseños	-	$ 233.936.383,00	31	12	2018	31	12	2023
Estabilidad y/o Calidad de Obra	-	$ 3.907.869.093,00	31	12	2018	31	12	2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 2038848-0

Certificado de modificación o anexo No.: -

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	-	$ 651.311.516,00	21	1	2018	-	-	-
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533577-5 **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

Certificado de modificación o anexo No. _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SURAMERICANA

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos: DC 7565 APROBACION

POLIZA CONTRATO PRINCIPAL 495 DE 2018, DEL21 DE FEBRERO DE 2018

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

Contrato de interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 **DE** 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. -
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN: LA INTERVENTORIA RENUNCIO A UTILIZAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO.
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							**100%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos, en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal
Interventor
Matricula No.: 2520233706 CND

(Firma)
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No. 19202-79853

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 1 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO [x] (Marque X si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** [ ] (Marque X si corresponde)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 921 **DE** 2018

CUENTA BANCARIA No.: - **BANCO** - SUCURSAL -

ANTICIPO OTORGADO: 0 %

VALOR DEL ANTICIPO: $ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM
	N/A					
LA INTERVENTORIA RENUNCIO A UTILIZAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO.						

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
	N/A					
LA INTERVENTORIA RENUNCIO A UTILIZAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO.						
	TOTALES					

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($): $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. - **FECHA** - **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

Firma
JESUS MARIA BERDUGO LEAL
Representante Legal
Interventor
Matrícula No. 2520233706 CND

Firma
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No. 19202-79853

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	1	12	2018
	(Dia)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

MES DE INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE 2018 **CONTRATO No.** 921 DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

INTERVENTORÍA: CODIPRO INGENIERIA LTDA **SECTOR:** FLORENCIA: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)- BALBOA: TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)- MERCADERES TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) - SANTA ROSA: TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Computador SAMSUNG	PC Oficina Core i5	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	
Telefono Celular	Movil marca NOKIA	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	
Vehículo cc 2000 4x4	Kia UUS007	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: N/A

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: N/A

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

Firma
Luis Samuel Ordaz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Firma
Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No. : 19202-79853

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

MES DEL INFORME: NOVIEMBRE 2018 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 DE 2018

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

CARRETERA Y/O PROYECTO: MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

SECTOR: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)- TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL)- TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) Y TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Luis Samuel Orduz Gomez (25%)	Director de Interventoria	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Diana Paz Cabrera (100%)	Residente de Interventoría	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	
Wilson Hernán Davila Ibarra (77%)	Residente de Interventoría	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X								
Angélica María Garzón Alayón (100%)	Residente de Interventoría	X	X				X	X	X	X				X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Firma
Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 19202-79853

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	1 (Día)	12 (Mes)	2018 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 921 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

FECHA DE INICIO: 9-ago-2018

PLAZO INICIAL: 5

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 9-ene-2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

VALOR ACUMULADO: $ 0,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta
Cumplimiento	10%	46.478.891,50	28	jun	2018	Hasta la Liquidación del contrato
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	78.115.784,00	28	jun	2018	Hasta la Liquidación del contrato
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	92.957.783,00	28	jun	2018	18 abr 2021
Calidad del servicio	30%	139.436.675,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275612

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día)	Desde (Mes)	Desde (Año)	Hasta (Día)	Hasta (Mes)	Hasta (Año)
Cumplimiento	10%	46.478.891,50	28	jun	2018	9	jul	2019
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100%	78.115.784,00	28	jun	2018	9	jul	2019
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	92.957.783,00	28	jun	2018	9	ene	2022
Calidad del servicio	30%	139.436.675,00	9	ene	2019	9	ene	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101275612

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
