CODIPRO LTDA.
Ingeniería & Arquitectura

Bogotá D.C. Marzo 21 de 2019.
CDP-096-2019.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: Tomo-1,
RADICACION 22784 27/03/2019 10:58:20 am
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

Ingeniero:
LUIS EDUARDO LEDEZMA
Supervisor de Contrato
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION TERRITORIAL CAUCA
Popayán (Cauca)

**Referencia:** CONTRATO No. 921 de 2018
"**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**".

**Asunto:** Informe Mensuales de Interventoría No 5.

Cordial Saludo:

Para efectos de información y/o para el archivo correspondiente, con gusto estamos radicando el informe mensual de Interventoría No.5 de los Municipios de Balboa, Florencia, Mercaderes y Santa Rosa, que contienen las actividades realizadas tanto por el Contratista de obra como por la propia Interventoría, en los periodos comprendidos entre el primero (1) y el treintaiuno (31) de diciembre de 2018.

Quedamos atentos a cualquier observación o aclaración que bien pueda presentarse.

Atentamente,

**Ing. Luis Samuel Orduz**
Director de Interventoría
Contrato 921 de 2018
CODIPRO INGENIERIA LTDA

*Anexos: Informe Mensual No.5 en Físico un (1) volumen y en Medio Magnético (1 CDs).*

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

**INFORME MENSUAL No. 5** **MES O PERIODO:** DICIEMBRE 2018

| No. | CONTENIDO | FORMATO | ADJUNTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | FOLIO |
| 1 | **INTRODUCCIÓN** | | X | | 1 |
| 2 | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | X | | 21 |
| 2.1 | Localización | | | | |
| 2.2 | Inventario y estado inicial de la vía | | | | |
| 2.3 | Características técnicas del proyecto | | | | |
| 3 | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | X | | 8 |
| 3.1 | Información general del contrato | | | | |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | | | |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | | | |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | | | |
| 4 | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | X | | 12 |
| 4.1 | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MINFRA-MN-IN-15-FR-3 | X | | 1 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | X | | 4 |
| 4.3 | Personal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | X | | 4 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 | X | | 1 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | X | | 4 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | X | | 4 |
| 4.7 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 | X | | 1 |
| 4.8 | Informe Avance Físico-Financiero | MINFRA-MN-IN-15-FR-14 | X | | 2 |
| 4.9 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-15 | X | | 2 |
| 4.10 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-17 | X | | 2 |
| 4.11 | Otros documentos seguimiento mensual | | | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MINFRA-MN-IN-2-FR-1 | X | | 1 |
| | | MINFRA-MN-IN-2-FR-2 | X | | 1 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | | | |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MINFRA-MN-IN-6-FR-1 | | | |
| | | MINFRA-MN-IN-6-FR-2 | | | |
| | • Actas de comité de obra | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | | |
| | • Acta de reunión | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | X | | 15 |
| | • Informe Semanal | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | X | | 33 |
| 5 | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | X | | 3 |
| 5.1 | Información general del contrato | | | | |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | | | |
| 5.3 | Informes especialistas | | | | |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | | | |
| 5.5 | Información otros programas y aplicativos | | | | |
| 6 | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | X | | 1 |
| 6.1 | Equipo Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-5 | X | | 1 |
| 6.2 | Personal Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-7 | X | | 1 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 | X | | 1 |
| 6.4 | Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | X | | 1 |
| 6.5 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | X | | 1 |
| 6.6 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MINFRA-MN-IN-15-FR-18 | X | | 8 |
| 6.7 | Otros documentos seguimiento mensual | | | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MINFRA-MN-IN-3-FR-1 | X | | 1 |
| | | MINFRA-MN-IN-3-FR-2 | X | | 1 |
| 7 | **Conclusiones y recomendaciones** | | X | | 1 |
| 8 | **Anexos** | | X | | 41 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | | | |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | | | |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales | | | | |

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

# INFORME MENSUAL N° 05 DE INTERVENTORIA
## CONTRATO N° 0921 DE 2018

## INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**CONTRATISTA:**

**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**
**CONTRATO DE OBRA N° 0495 de 2018**

**INTERVENTOR:**

**CODIPRO INGENIERIA LTDA**

**BOGOTA D.C., DICIEMBRE DE 2018**



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## Tabla De Contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 27
4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 1
5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 13
6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 16
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 17
8. ANEXOS. 18



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# 1.INTRODUCCION

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene por objeto describir las actividades desarrolladas por el Contratista de Obra y el Interventor, durante el quinto (5°) período de labores comprendido entre el 1° al 31 de diciembre de 2018. Se informa sobre el avance de la obra y en general del seguimiento al proyecto en cumplimiento de las funciones delegadas a CODIPRO INGENIERIA LTDA, con el acompañamiento de la Supervisión Técnica del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS- INVIAS, TERRITORIAL CAUCA y la SUBDIRECCION DE LA RED TERCIARIA Y FERREA.

Se incluyen las actividades desarrolladas en cumplimiento del Contrato de Obra No 495 de 2018, celebrado entre el Contratista LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA y el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS, contrato éste que tiene por objeto el "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

Las actividades de Interventoría incluidas en este informe son adelantadas por CODIPRO INGENIERIA LTDA, quien fue favorecido con la adjudicación del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-057-2018, mediante Contrato N° 921 de 2018 con objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017".



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# 2.DESCRIPCION DEL PROYECTO

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto motivo del presente Informe cuyo objeto del contrato de obra es **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**, está localizado en el departamento del Cauca, vías terciarias de gran importancia para los Municipios favorecidos con las obras.

El Instituto Nacional de Vías - INVIAS ha considerado hacer el Mejoramiento y Mantenimiento de estas vías, enfocado en la ejecución de obras para la atención de los sectores de mayor afectación, con el objetivo de atender las necesidades de mantenimiento preventivo o rehabilitación, dentro del alcance físico y los recursos presupuestales asignados a cada municipio, construyéndose algunas obras de arte, drenaje y seguridad vial. En el caso particular del Departamento del Cauca los sectores beneficiados por la construcción de obras, corresponden a los municipios de Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes.

Dentro de las metas físicas consideradas en los anexos técnicos para los Municipios anteriormente mencionados se encuentra que para el municipio de Santa Rosa se prevé la construcción de 249.30 ml de placa huella, 249.30 ml de Cunetas y 4 alcantarillas de 36"; en el Municipio de Balboa se han proyectado 767,60 ml de placa huella, 767.60 ml de cunetas, un muro de contención y 14 alcantarillas de 36", en el municipio de Florencia se estima la construcción de 124,50 ml de placa huella, 124,50 ml de cuneta y 14 alcantarillas de 36"; y por último para el Municipio de Mercaderes se prevé la construcción de 580 ml de placa huella, 580 ml de Cunetas, 2 box coulvert y 8 alcantarillas de 36".

A continuación esquematizamos la localización general de las obras en cada municipio, adjunto a ello la ubicación de los campamentos del contratista, interventoría y planta de materiales pétreos:



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

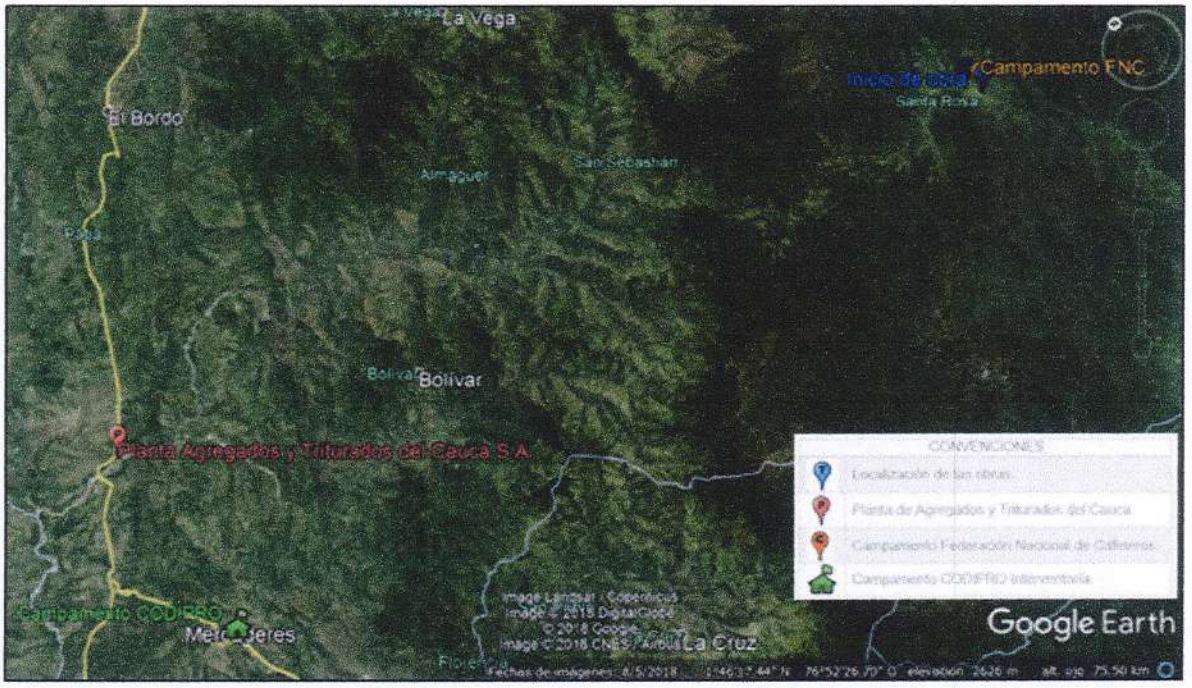



Figura N°1 Localización general obras en Municipio de Santa Rosa.

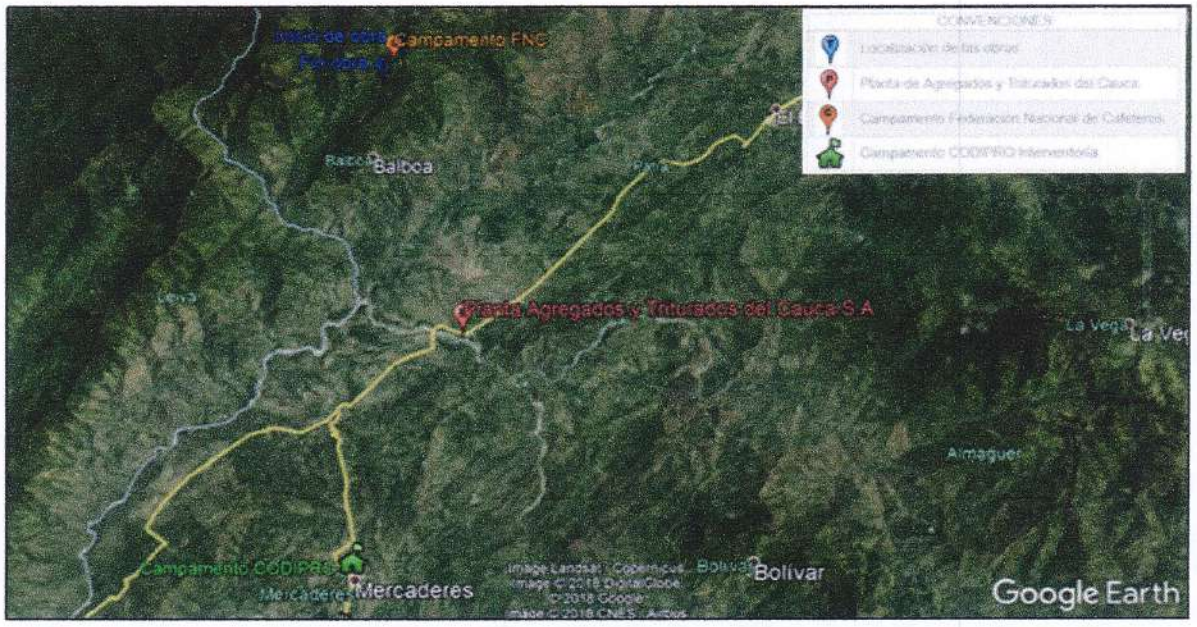



Figura N°2 Localización general obras en Municipio de Balboa.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

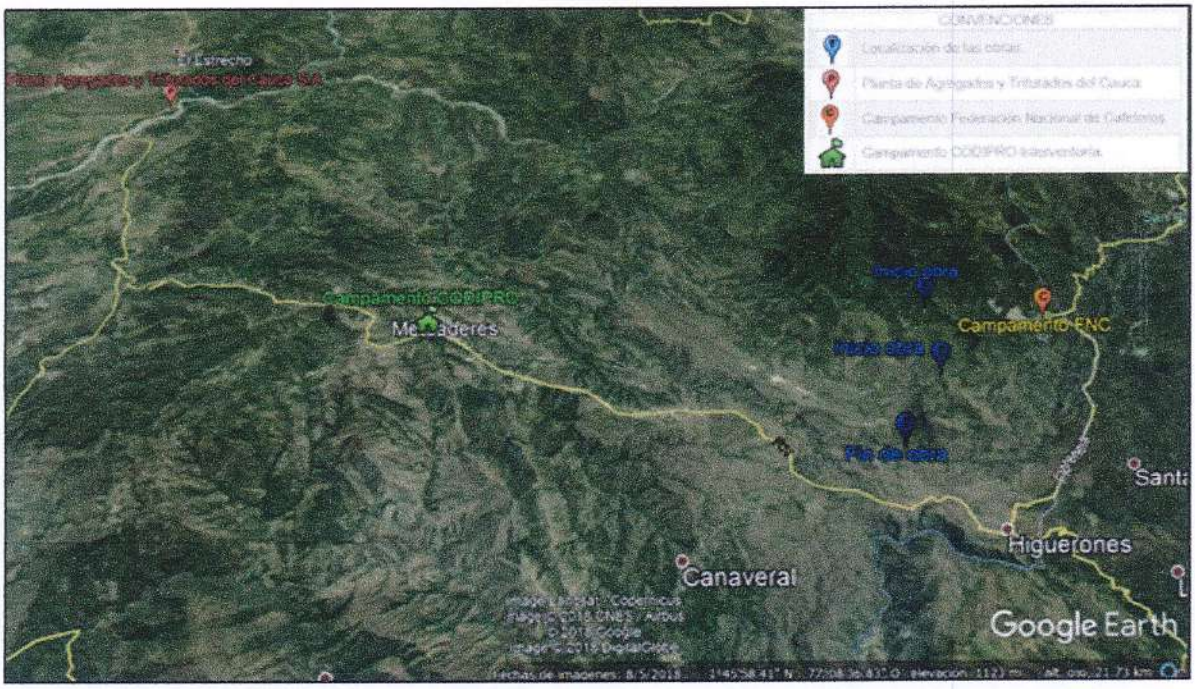



Figura N°3 Localización general obras en Municipio de Florencia.

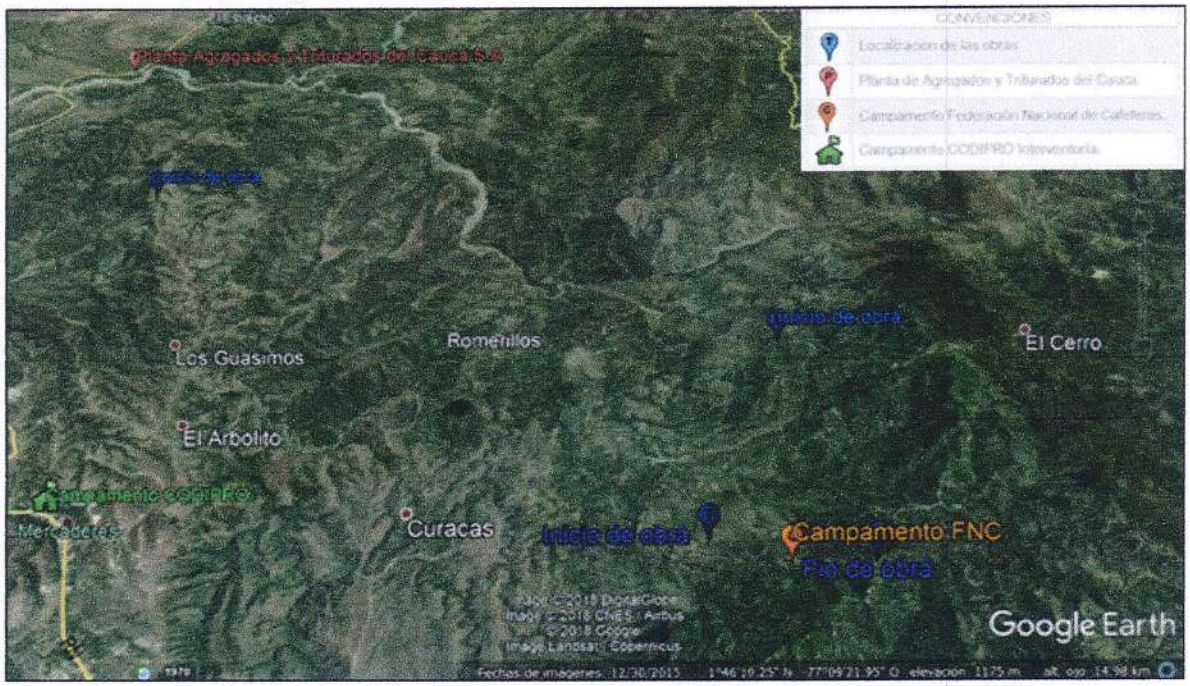



Figura N°4 Localización general obras en Municipio de Mercaderes.




Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## 2.1 LOCALIZACIÓN

El Proyecto de " **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017**", objeto del contrato, se encuentra localizado en ese departamento al sur del país, en los municipios de Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes del bajo Cauca.

**SANTA ROSA**

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Santa Rosa**.

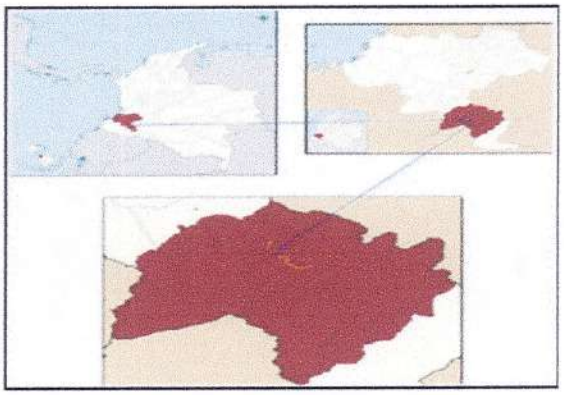






Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Figura N°5 Localización de la red terciaria, (Vía Agencia Tarabita).
Fuente: Anexo Técnico.

A continuación presentamos los nuevos esquemas de localización actualizados de las obras en los tramos Cabecera Municipal-Agencia y Cruce de la Virgen-Tarabita:

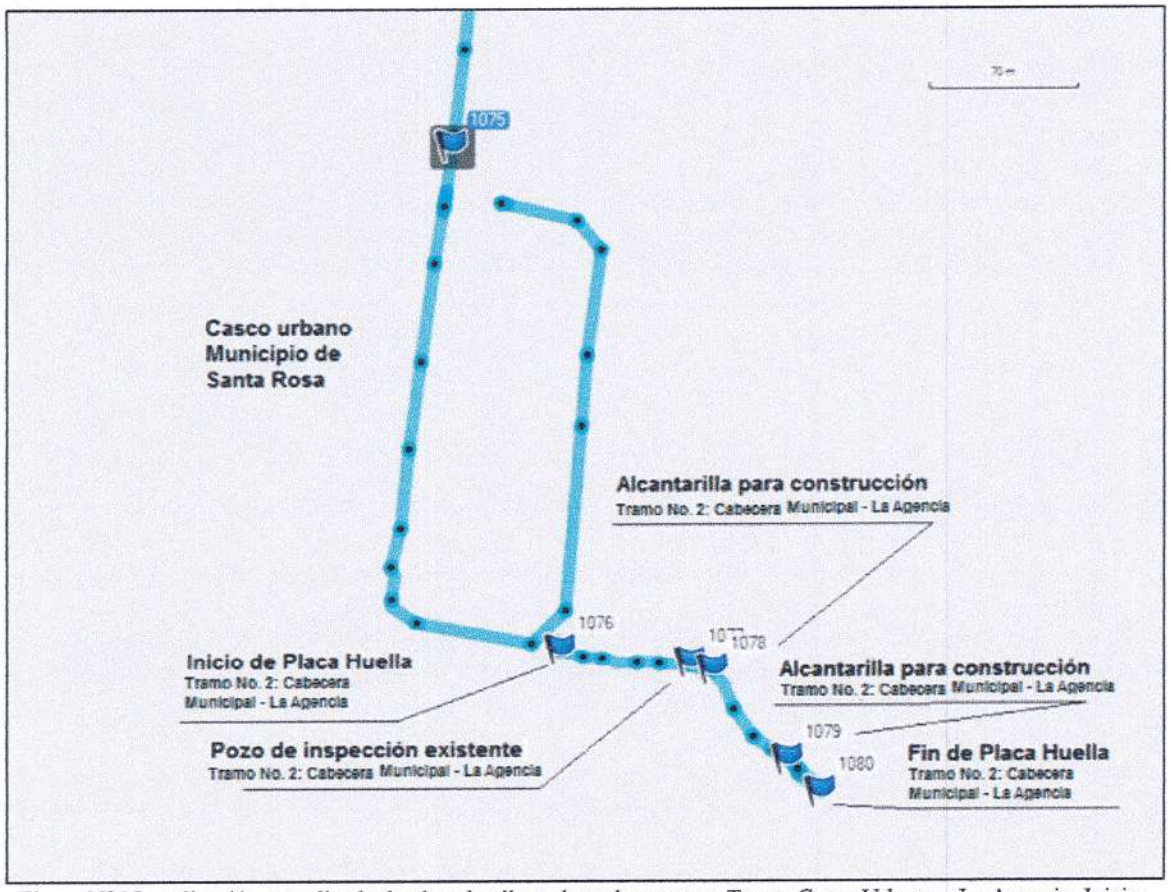



Figura N°6 Localización actualizada de placa huella y obras de arte para Tramo Casco Urbano – La Agencia; Inicio: K0+000, Fin: K0+159.3, longitud 159, 3 m.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

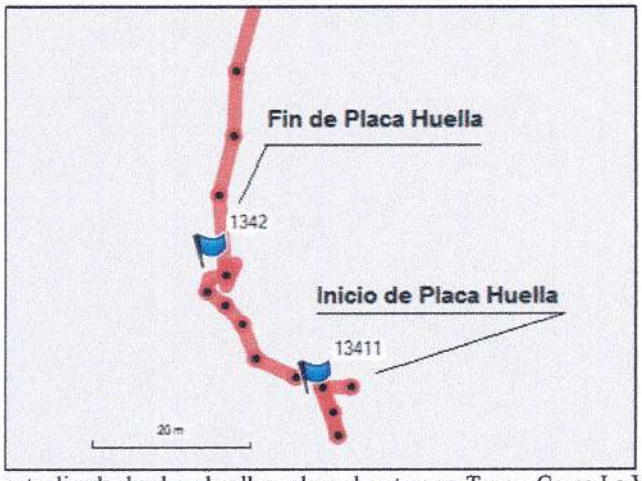



Figura N°7 Localización actualizada de placa huella y obras de arte para Tramo Cruce La Virgen – Tarabita; Inicio: K0+000, Fin: K0+090, longitud 90 m.

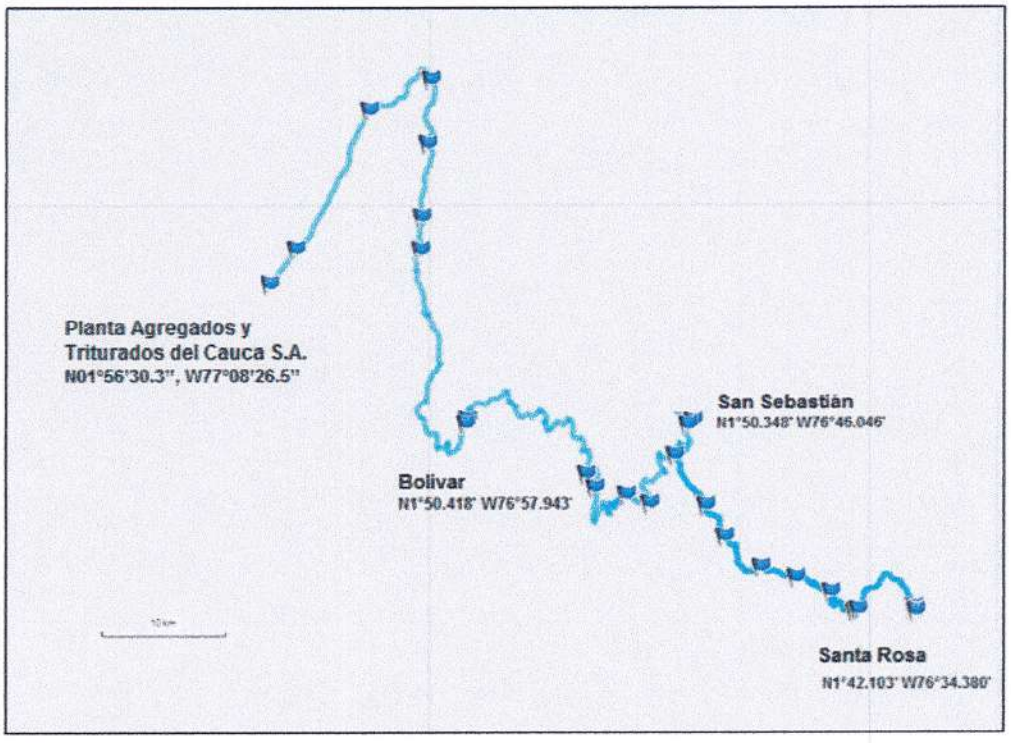



Figura N°8 Localización actualizada del recorrido desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta: Cabecera Municipal de Santa Rosa. Longitud de acarreo = 185Km.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## BALBOA

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Balboa**.

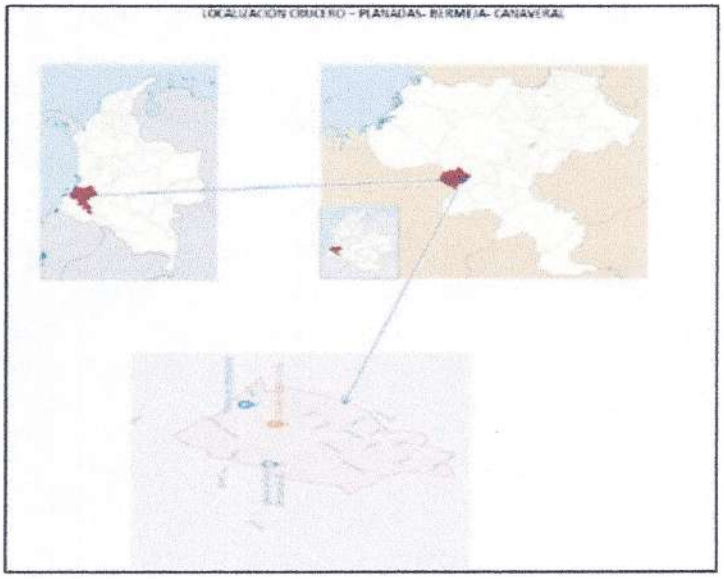


Figura N°9 Localización general del proyecto.

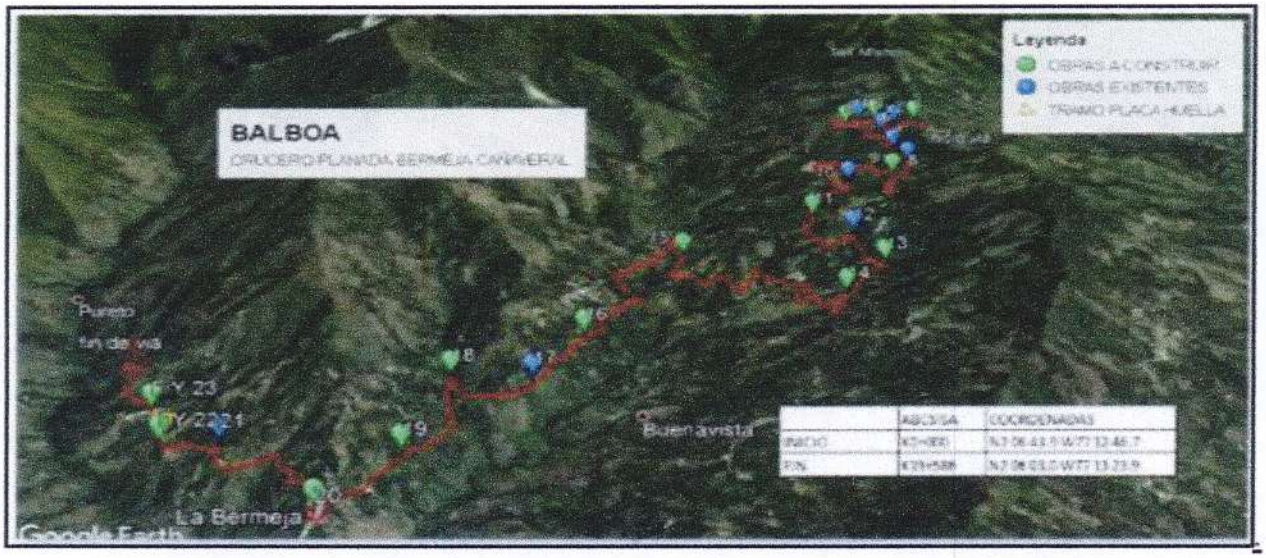



Figura N°10 Localización inicial de las obras en la red terciaria Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

A continuación presentamos los nuevos esquemas de localización actualizados de las obras en el tramo, Vía Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral:

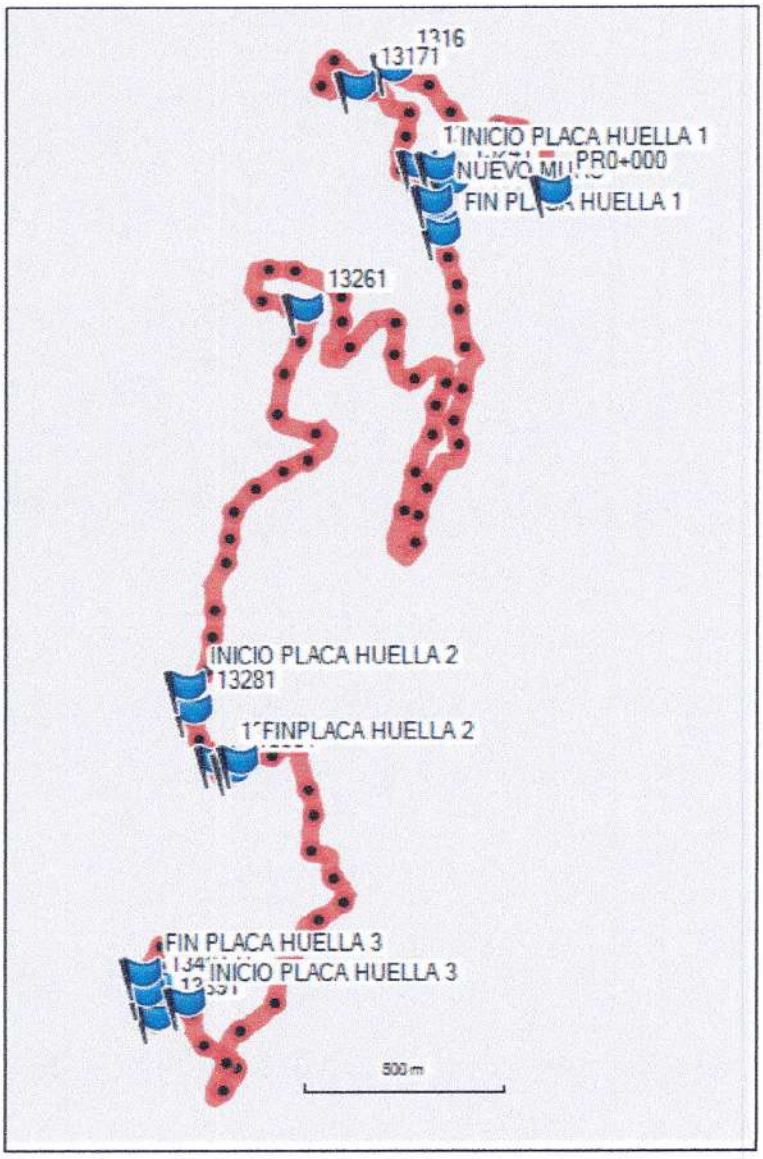



Figura N°11 Localización general actualizada de Placa Huella Tramo No. 1: Cruce La Planada-La Planada (Inicio K1+550, Fin K1+680), Tramo No. 2: La Planada- Versalles Bajo (Inicio K6+060, Fin k5+706.4), Tramo No. 3: La Cabaña-Escuela La Cabaña (Inicio K7+800, Fin K8+084)



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

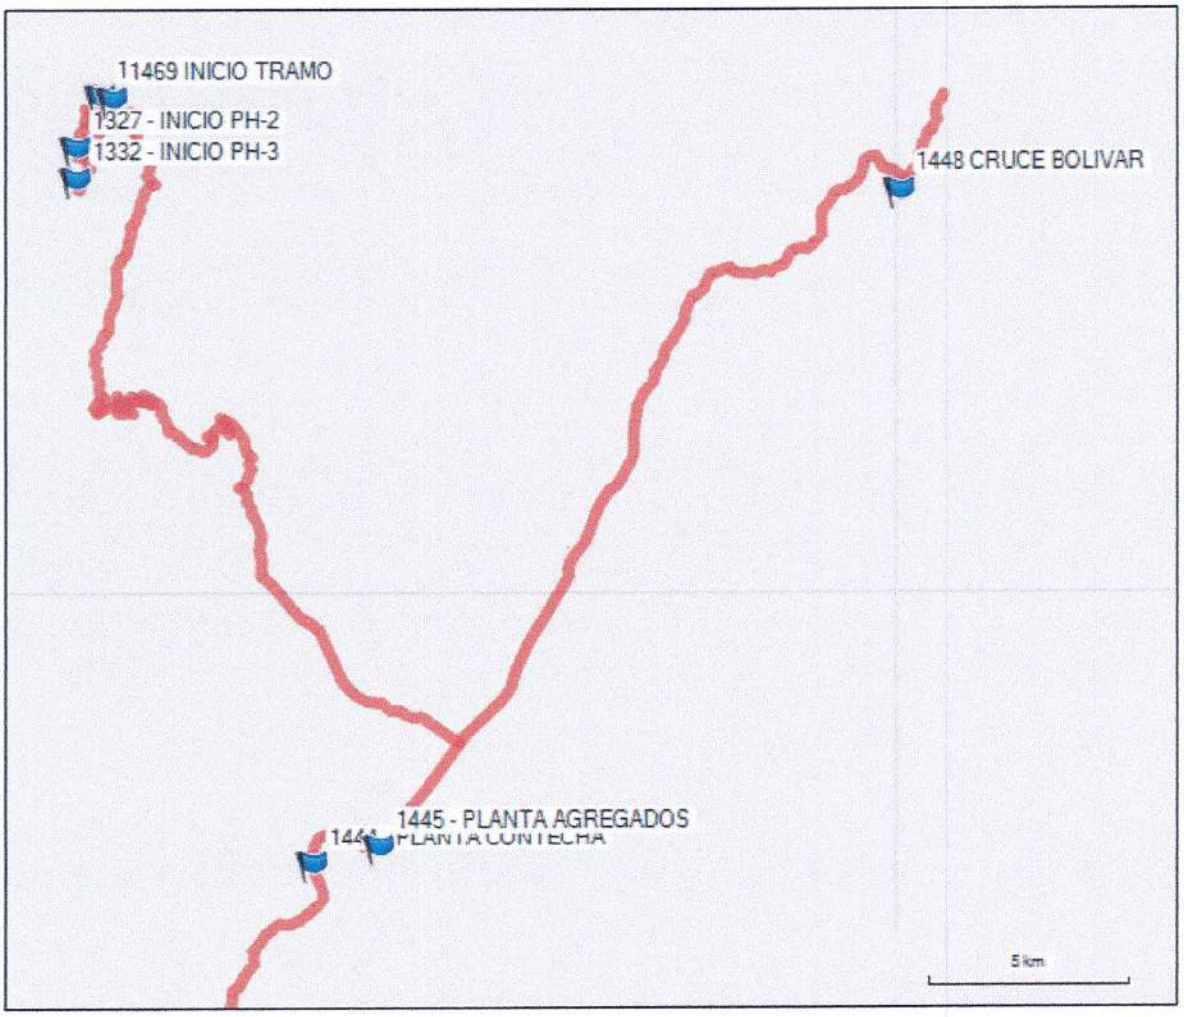



Figura N°12 Localización actualizada de recorrido desde Cantera hasta Tramo 1 Cruce La Planada-La Planada, longitud de acarreo = 40 Km; desde cantera hasta Tramo 2 La planada - Versalles Bajo, longitud de acarreo = 44Km; desde cantera hasta Tramo 3 La Cabaña-Escuela La Cabaña, longitud de acarreo = 46Km.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

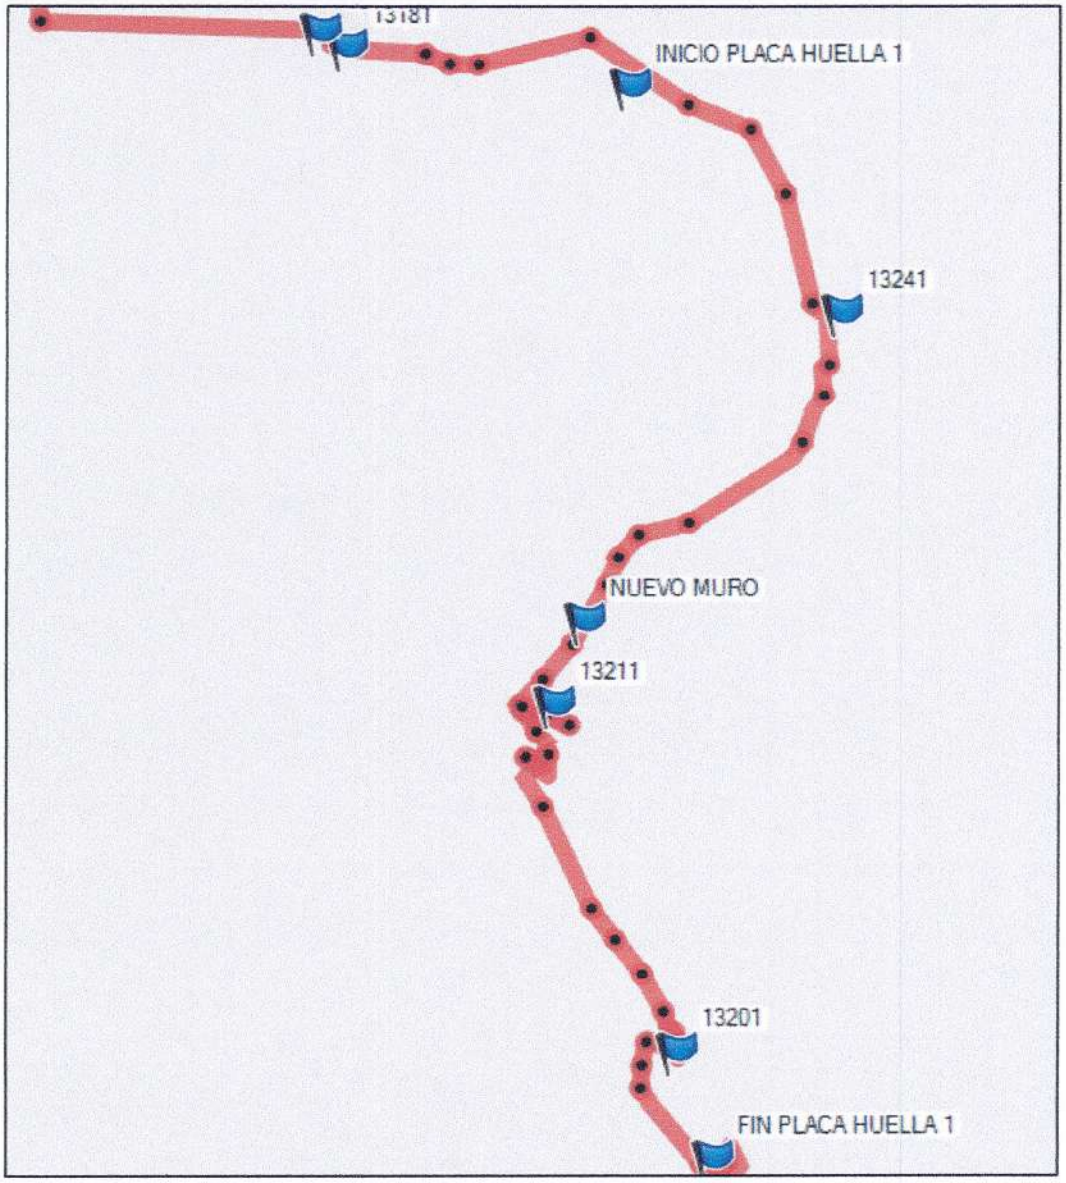



Figura N°13 Localización actualizada de Placa Huella Tramo No. 1: Cruce La Planada-La Planada, Inicio K1+550, Fin K1+680, Longitud = 130 m.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

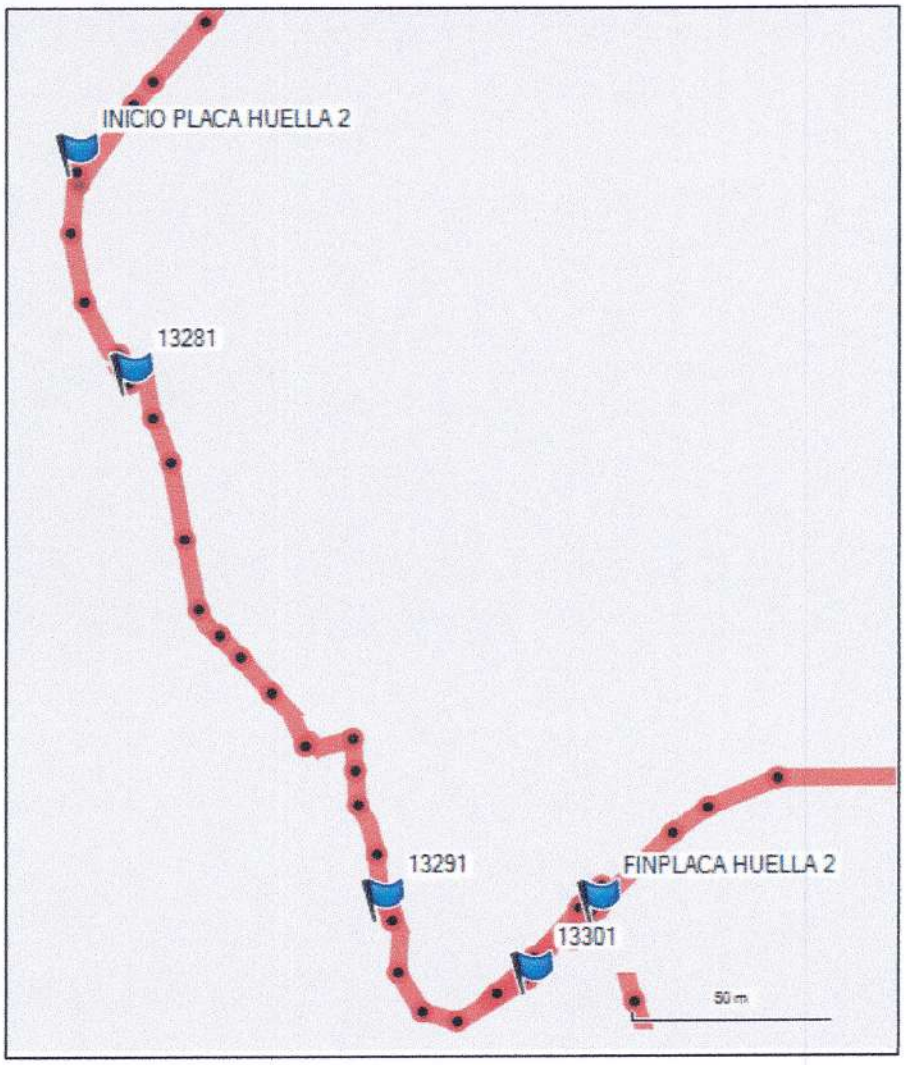



Figura N°14 Localización actualizada de Placa Huella Tramo No. 2 La planada- Versalles Bajo: Inicio K6+060, Fin K5+706.4, Longitud = 353.6 m.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

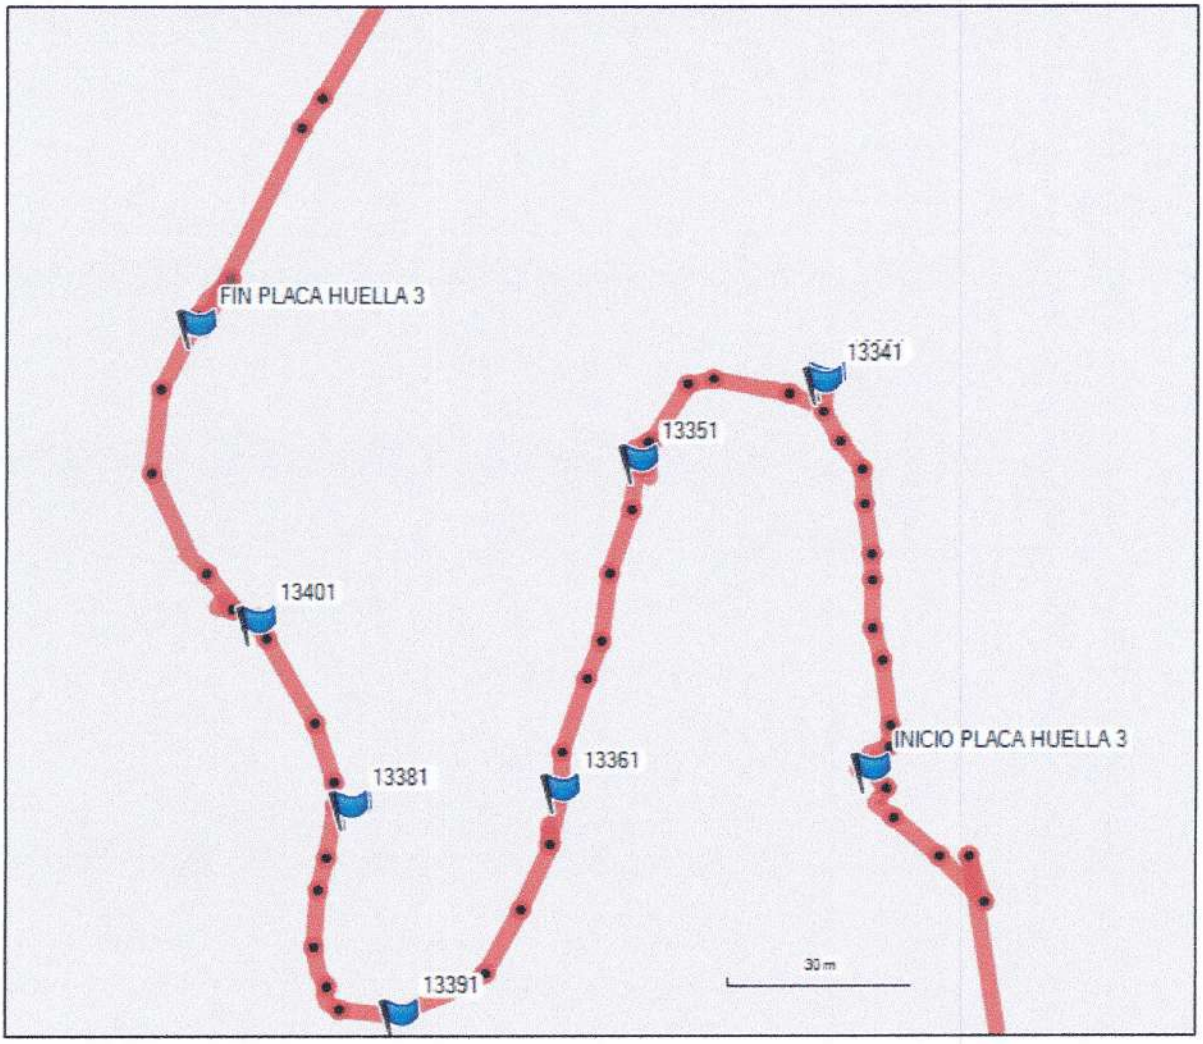



Figura N°15 Localización actualizada de Placa Huella Tramo No. 3 La Cabaña-Escuela La Cabaña: Inicio K7+800, Fin K8+084, Longitud = 284 m.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## FLORENCIA

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Florencia**.

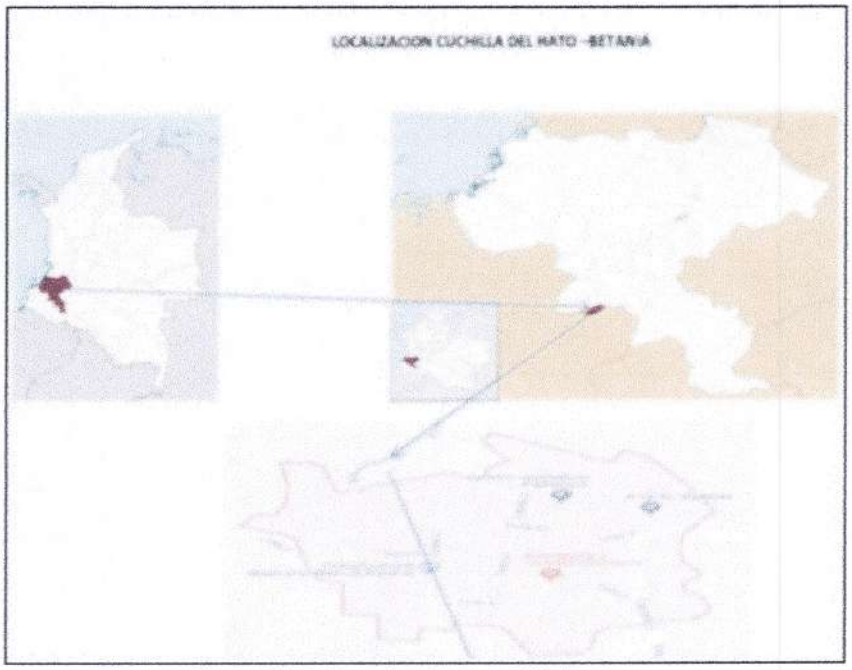



Figura N°16 Localización general del proyecto



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com




Figura N°17 Localización de la red terciaria, (Vía Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja). Alcantarilla inicial K0+820, Alcantarilla final K5+400




Figura N°18 Localización inicial de la red terciaria, (Cuchilla del Hato – Betania). Tramo a intervenir K1+300 a K1+425, longitud a intervenir 124,5 m.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

A continuación, presentamos los nuevos esquemas de localización actualizados de las obras en los tramos:

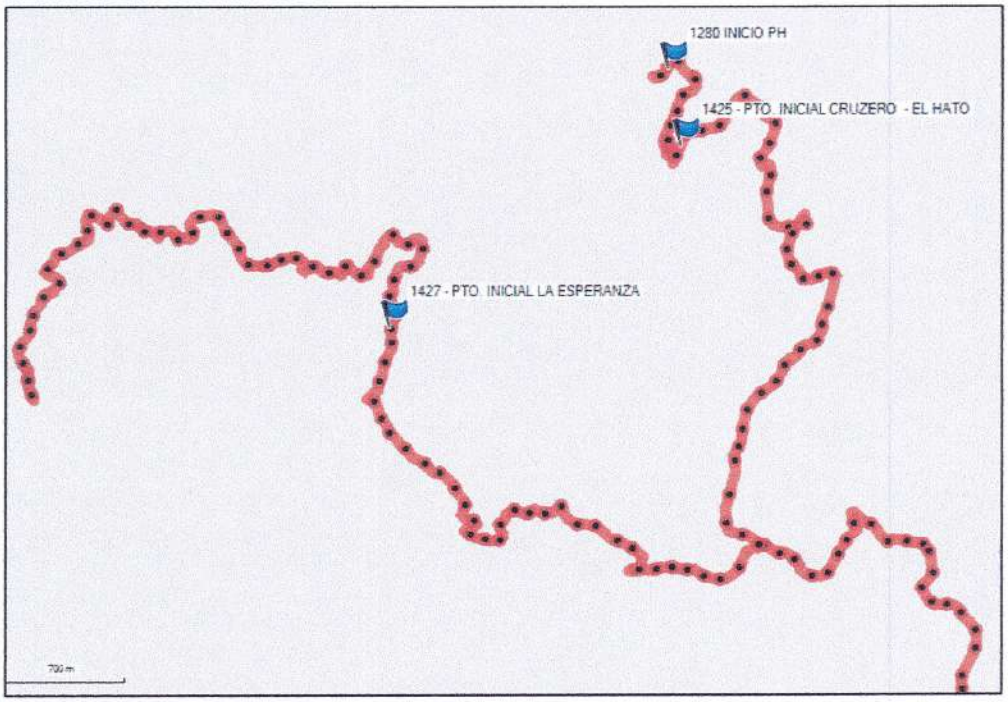



Figura N°19 Localización actualizada de tramos a intervenir, Sector 1: Alcantarilla inicial K0+830, Alcantarilla final K5+135; Sector 2 Cuchilla del Hato – Betania: Inicio K1+194,5 Fin K1+319, Longitud = 124,5.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

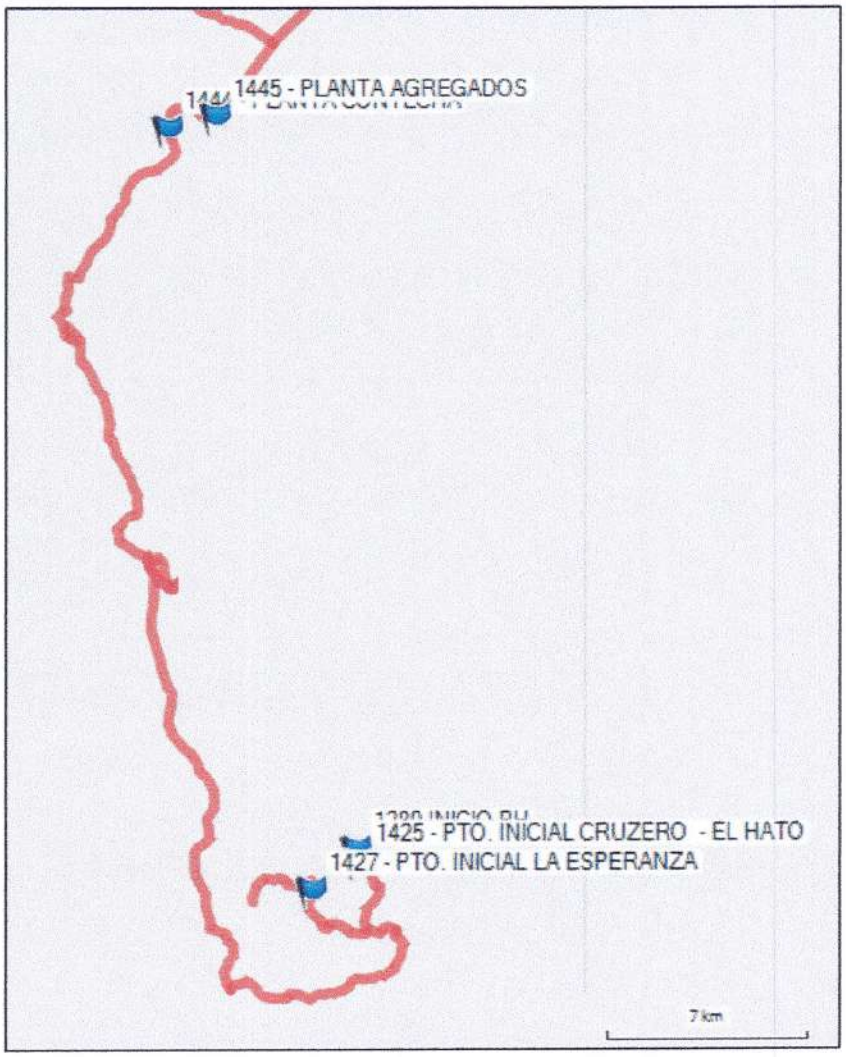



Figura N°20 Localización actualizada de distancia desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta Sector 1 Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja: 65,00 Km; desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta Sector 2 Vía Cuchilla Del Hato – Betania: 63,00 Km.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## MERCADERES

La siguiente figura detalla la ubicación de los tramos de acuerdo al anexo técnico entregado por INVIAS, correspondiente al Municipio de **Mercaderes**.


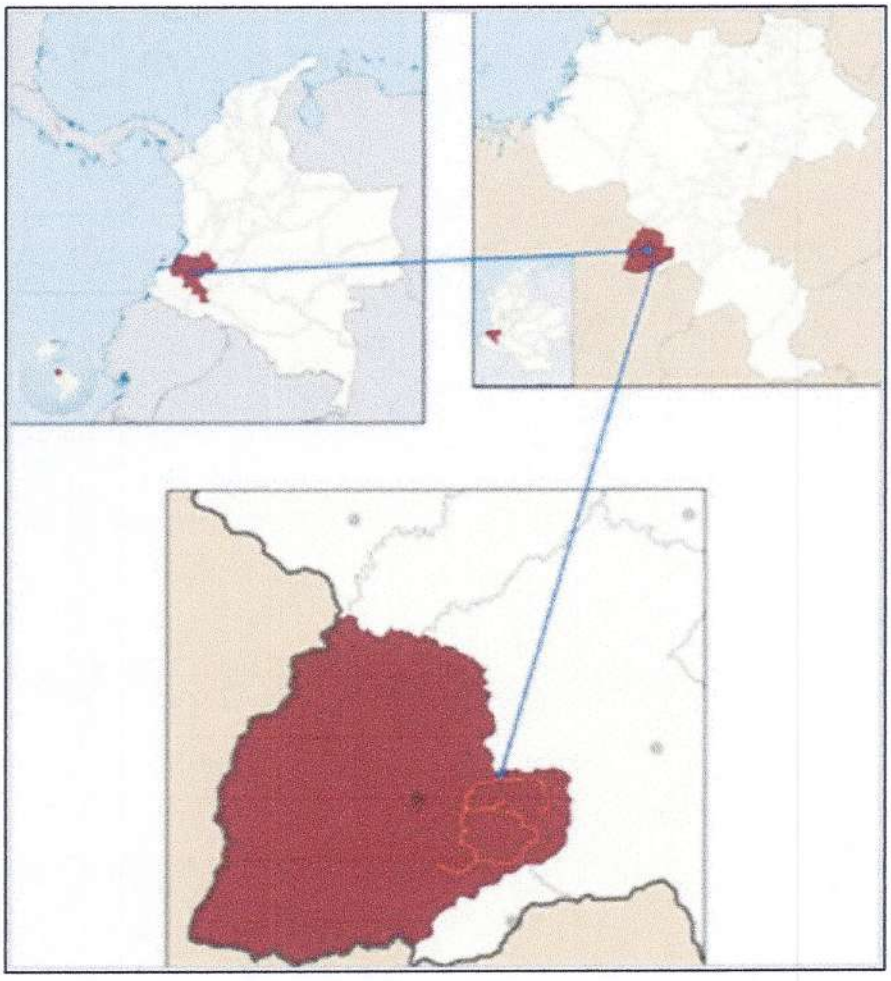


Figura N°21 Localización general del proyecto.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

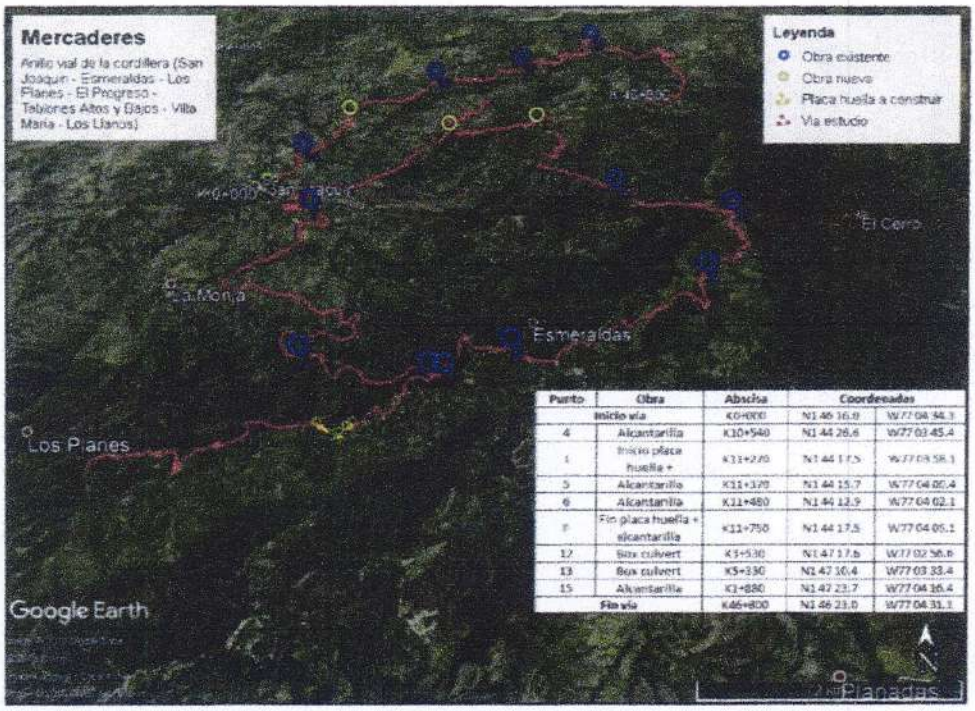


| Punto | Obra | Abscisa | Coordenadas | |
|---|---|---|---|---|
| Inicio vía | | K0+000 | N1 46 16.9 | W77 04 44.3 |
| 4 | Alcantarilla | K10+540 | N1 44 26.6 | W77 03 45.4 |
| 1 | Inicio placa huella + | K11+270 | N1 44 17.5 | W77 03 58.1 |
| 5 | Alcantarilla | K11+370 | N1 44 15.7 | W77 04 00.4 |
| 6 | Alcantarilla | K11+480 | N1 44 12.9 | W77 04 02.1 |
| 7 | Fin placa huella + alcantarilla | K11+750 | N1 44 17.5 | W77 04 05.1 |
| 12 | Box culvert | K3+530 | N1 47 17.6 | W77 02 56.6 |
| 13 | Box culvert | K3+330 | N1 47 10.4 | W77 03 33.4 |
| 15 | Alcantarilla | K3+880 | N1 47 23.7 | W77 04 16.4 |
| Fin vía | | K46+800 | N1 46 23.0 | W77 04 31.1 |

Figura N°22 Localización inicial del proyecto, anillos viales No. 1 y No. 2.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

A continuación presentamos los nuevos esquemas de localización actualizados de las obras en los tramos:

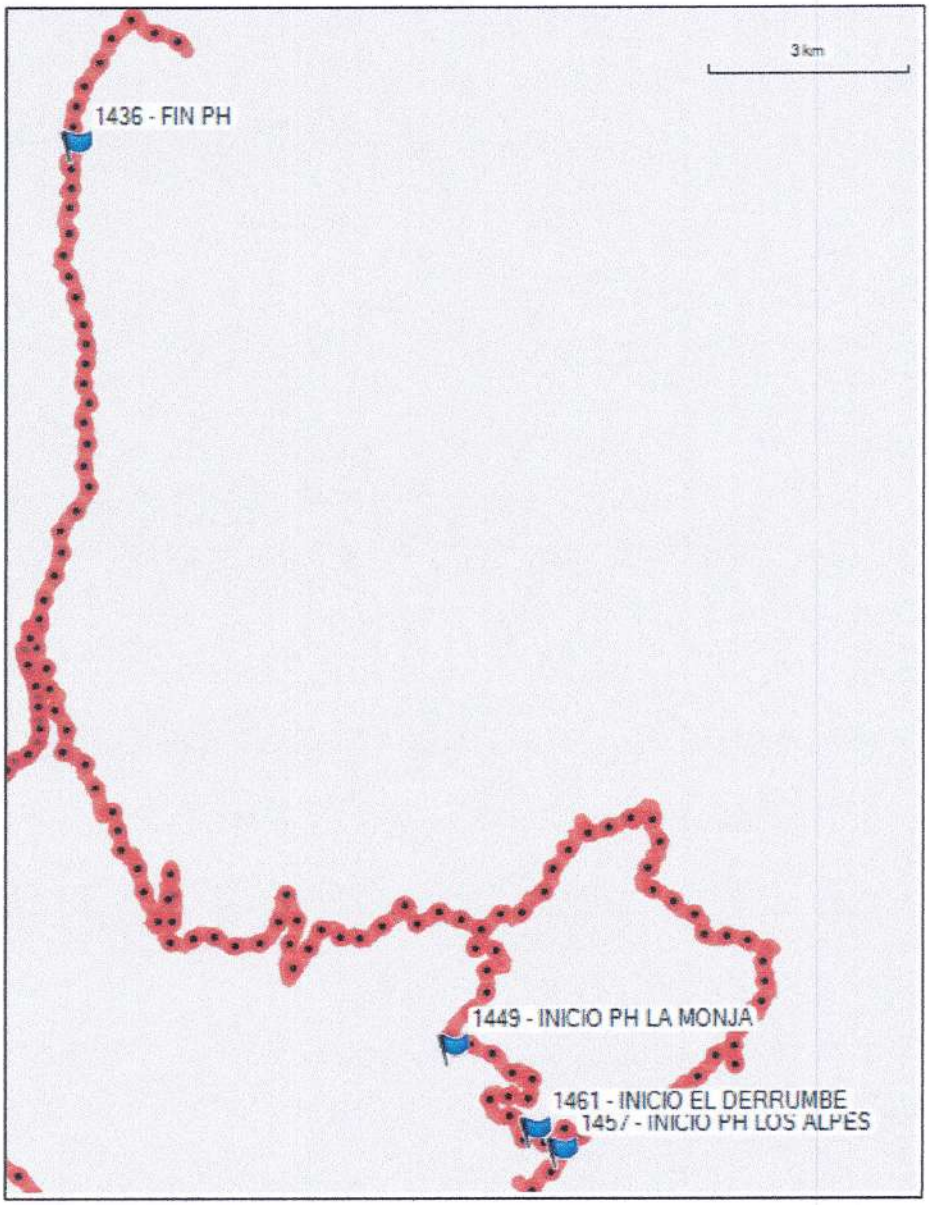



Figura N°23 Localización actualizada del proyecto. Sector 1 Anillo Vial de La Cordillera: Tramo No. 1 San Joaquín – La Monja: Inicio K3+100, Fin K3+250, longitud 150 m; Tramo No. 2 Los Alpes: Inicio K7+870, Fin K8+090, longitud 220 m; Tramo No. 3 Cruce Los Alpes: Inicio K9+630, Fin K9+690, longitud 60 m. Sector 2 Anillo Vial La Curva – El Pilón: Tramo No. 1 Los Medios: Inicio K8+585, Fin K8+735, longitud 150 m.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

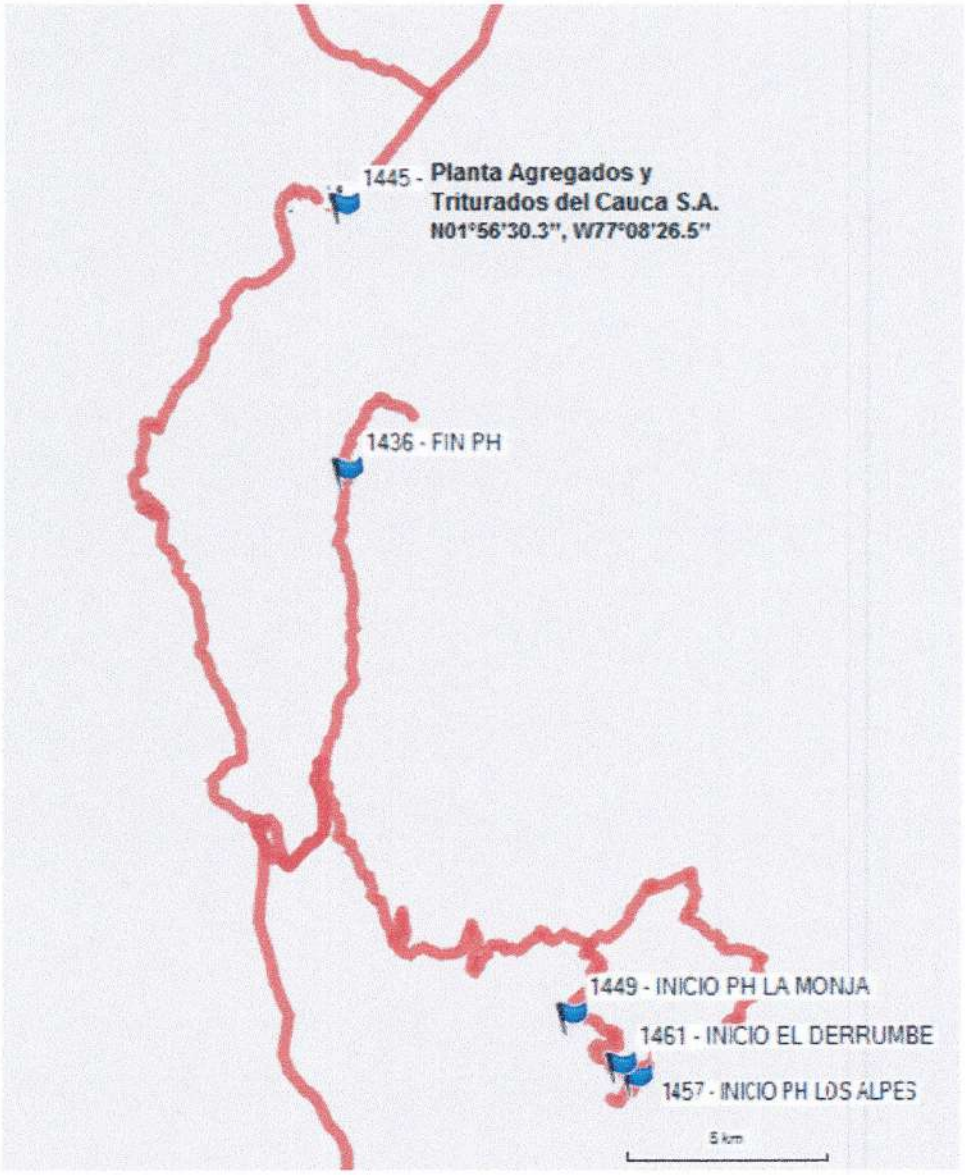



Figura N°24 Localización actualizada del recorrido desde Planta Agregados y Triturados del Cauca S.A. hasta: Sector 1 Anillo Vial de La Cordillera: Tramo No. 1 San Joaquín – La Monja: 54 Km; hasta Tramo No. 2 Los Alpes: 59 Km; hasta Tramo No. 3 Cruce Los Alpes: 61 Km. Hasta Sector 2 Anillo Vial La Curva – El Pilón: Hasta Tramo No. 1 Los Medios: 41 Km.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## 2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA

Las condiciones que presentan actualmente las vías en los sitios y tramos identificados en la evaluación de la red terciaria, realizada con criterio técnico por los profesionales enviados para el efecto por la Federación Nacional de Cafeteros y relacionados en el Anexo Técnico para su intervención, son vías con altas pendientes que generan un lavado continuo de los materiales finos por ausencia de obras de drenaje, representando en tiempos de invierno, inestabilidad en las vías de acceso y dificultad en la conectividad terrestre de las zonas rurales de cada municipio (Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes), disminuyendo la capacidad y nivel de servicio, y perjudicando la comodidad y seguridad a los usuarios de las mismas.

## 2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO.

Teniendo en cuenta lo descrito en el Anexo Técnico del Contrato No 495 de 2018, las obras proyectadas para ejecución son producto de los informes técnicos donde se determinan las necesidades de **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017".**

Igualmente, se define que estas necesidades pueden variar una vez se elaboren los estudios y diseños de los puntos a intervenir en la vía, y los correspondientes cálculos de los componentes geotécnicos, hidráulicos, estructurales y ambientales, que presentó el Contratista a la Interventoría para su aprobación.

Para esta primera etapa se contempló un plazo de un (01) mes para la elaboración, entrega, revisión, ajustes y aprobación por parte de Interventoría de los Estudios y Diseños, y que incluyen los levantamientos topográficos, diseños geométrico, geotécnico, hidráulico, y finalmente los diseños estructurales de las soluciones definidas, todos ellos con sus respectivos informes.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# 3.INFORMACION CONTRATO DE OBRA

En el plazo restante se programó la etapa de ejecución de las obras de mantenimiento y construcción definidas para los sitios críticos, que habían sido previamente considerados en los diseños y presupuestos de obra.

## 3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

### 3.1 INFORMACIÓN GENERAL (Incluye seguimiento, garantías contractuales)

| | |
|---|---|
| PROCESO DE SELECCIÓN | DIRECTA |
| N° DEL CONTRATO | 0495-2018 |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 25 DE ENERO DEL 2018 |
| OBJETO | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. |
| CONTRATISTA | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA<br>DIRECCION: CALLE 24 N $N_o$ 1542 BARRIO/ CAMPAMENTO<br>TELEFONO: 823-18-00 A.A 558 |
| NIT | 860.007.538-2 |
| DEPARTAMENTO | CAUCA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $13.026.230.310,94 Moneda Corriente para todo el Departamento del Cauca. |
| BALBOA | $ 880.158.717,25 COSTO DIRECTO |
| FLORENCIA | $ 432.186.167,24 COSTO DIRECTO |
| SANTA ROSA | $ 446.261.456,21 COSTO DIRECTO |
| MERCADERES | $810.012.503,31 COSTO DIRECTO |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. |
| ORDEN DE INICIO | 22 DE MAYO DE 2018 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

| | |
|---|---|
| PRORROGA | HASTA 28 DE FEBRERO DE 2019 |
| FECHA TERMINACIÓN | HASTA 28 DE FEBRERO DE 2019 |
| ACTAS PARCIALES | 1 y 2 |

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

Durante este periodo se realizaron trabajos en conjunto con personal designado por la Federación Nacional de Cafeteros en cada uno de los municipios, para atender la documentación necesaria y dar inicio en las obras proyectadas para cada sector durante el mes de Diciembre del 2018 con un avance de obra descrito en el siguiente cuadro:

| DESCRIPCION | SANTA ROSA | BALBOA | FLORECIA | MERCADERES |
|---|---|---|---|---|
| COSTO DIRECTO | $485.778.790,34 | $940.597.936,44 | $490.808.676,79 | $822.612.769,99 |
| % AVANCE MES OBRAS | 0,00% | 0,00% | 4,29% | 1,48% |
| % AVANCE ACUMULADO | 0,00% | 0,00% | 4,29% | 1,48% |

A continuación, se describen las actividades realizadas en cada Municipio:

### Santa Rosa

Durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre del 2018 se realizaron visitas para ubicación del Punto de Atención Ciudadana en la oficina de inspección de policía e instalación del buzón en instalaciones de la alcaldía municipal de Santa Rosa, con el acompañamiento de funcionarios de la alcaldía y de la residente social Claudia Macías en representación de la Federación Nacional de Cafeteros. Además durante la misma jornada se diligenciaron los formatos de organización comunitaria.

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de obra e interventoría el día 11 de diciembre del 2018, para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José Adrián Valencia,



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Director Territorial, Luis Eduardo Ledezma, Blas Uriel Páez, Juan Carlos Gómez, Fernando Velasco y Alonso Ortega en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra y José Fernando Montealegre por Federación Nacional de Cafeteros; y en representación de la Interventoría asistió la Ingeniera Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos por parte del contratista, tal como el inicio de obra en los sectores Cruce de La Virgen- Tarabita y Cabecera- La Agencia, implementando las acciones correctivas para dar inicio de obra el día 17 de diciembre del 2018, y presentar a esta Interventoría el plan de contingencia con el objetivo de promover la construcción de las obras contractuales y reducir el atraso que presentan las obras en este municipio.

Durante las fechas posteriores a la reunión, las actividades que se desarrollaron en el tramo Tarabita – La Agencia corresponden a:

- ✓ Transporte de materiales (cemento, acero, señalización y materiales granulares).
- ✓ Localización y replanteo de los tramos de placa huella.
- ✓ Corte de acero y construcción de flejes.
- ✓ A la fecha no se han realizado actividades de excavación en los tramos Cruce de la virgen- Tarabita y Cabecera- La Agencia, ya que la maquinaria y el equipo que ha sido contratado por la FNC no ha funcionado óptimamente.

**Balboa**

Durante las jornadas del día 30 de Noviembre y del 1° de diciembre en recorrido a los tramos de placa huella con el acompañamiento de los ingenieros Johan Cárdenas y Oscar Ojeda residentes de obra, en representación de Comité Nacional de Cafeteros con el objeto de verificar el transporte y depósito de materiales pétreos, además de ubicar los lugares de almacenamiento de materiales más cercanos a los tramos.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Continuando con las actividades de gestión social se instalaron los puntos de atención al ciudadano en la Sede del Comité de Cafeteros en la cabecera municipal de Balboa y el buzón en la vereda La Planada frente a la cancha deportiva. Las actividades contaron con la participación de la Residente social Claudia Macías y algunos representantes de la alcaldía.

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de obra e interventoría el día 11 de diciembre del 2018, para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José Adrián Valencia, Director Territorial, Luis Eduardo Ledezma, Blas Uriel Páez, Juan Carlos Gómez, Fernando Velasco y Alonso Ortega en representación de Invias, Fernando Chacón Director de Obra y José Fernando Montealegre por Federación Nacional de Cafeteros; en representación de la interventoría estuvo la ingeniera Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos por parte del contratista, tal como el inicio de obra en el tramo Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral, implementando las acciones correctivas para dar inicio de obra el día 17 de diciembre del 2018, y presentar a esta Interventoría el plan de contingencia con el objetivo de promover la construcción de las obras contractuales y reducir el atraso que presentan las obras en este municipio.

A partir de esta fecha se han realizado las actividades que se describen a continuación:

- ✓ Transporte de materiales (cemento, acero, tubería, señalización y materiales granulares).
- ✓ Localización y replanteo de los tramos de placa huella.
- ✓ Corte de acero y construcción de flejes.
- ✓ A la fecha solo se han realizado actividades de excavación en el primer tramo de placa huella para la construcción de la alcantarilla de 36" localizada en K1+660.

**Florencia**



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

El día 5 de diciembre del 2018 el contratista transporta 12 tubos de PVC de 36" hasta el casco urbano de Florencia. Sin embargo se le manifiesta que algunos de los tubos han sufrido daños en el momento de ser bajados por la maquinaria.

Durante el día 6 de diciembre del 2018 la Federación Nacional de Cafeteros convoca a una reunión con presidentes de la JAC, veeduría ciudadana, comunidad en general y funcionarios de la alcaldía municipal de Florencia con el objeto de establecer las actividades de trabajo durante la época de fin de año y los procesos de contratación de mano de obra no calificada. Finalizada la reunión la comunidad manifiesta que durante las épocas festivas el personal de mano de obra local no trabaja, y que los tramos deben estar habilitados y debidamente señalizados para el tránsito de personas y vehículos. Por lo tanto el contratista en ánimo de cumplir con sus obligaciones deberá prever la situación que se le presenta durante esas fechas.

Para la jornada anteriormente mencionada también se instaló el buzón del proyecto en las instalaciones de la casa parroquial frente a la alcaldía municipal de Florencia con el acompañamiento de la residente social Luisa Castillo en representación de la Federación Nacional de Cafeteros.

En respuesta a la solicitud de la interventoría el día 11 de diciembre del 2018 se realizaron las actas de vecindad colectiva para las placas huellas existentes localizadas en el tramo Cruce del Hato- Betania y Cruce Escuela Bella Vista-Esperanza Baja, en compañía de la residente social Luisa Castillo, ya que estas estarán expuestas al tránsito de maquinaria y/o equipo pesado y transporte de materiales.

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de obra e interventoría el día 11 de diciembre del 2018, para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José Adrián Valencia, Director Territorial, Luis Eduardo Ledezma, Blas Uriel Páez, Juan Carlos Gómez, Fernando Velasco y Alonso Ortega en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra y José Fernando Montealegre designado por Federación Nacional



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

de Cafeteros; en representación de la interventoría estuvo la Ingeniera Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos por parte del contratista, tal como el inicio de obra en los tramos Cruce Escuela Bella Vista-La Esperanza baja y Cuchilla del Hato-Betania, implementando las acciones correctivas para dar inicio de obra el día 17 de diciembre del 2018, y presentar a esta Interventoría el plan de contingencia con el objetivo de promover la construcción de las obras contractuales y reducir el atraso que presenta las obras en este municipio.

A la fecha se han desarrollado las siguientes actividades:

- ✓ Transporte de materiales (cemento, acero, tubería, señalización y materiales granulares).
- ✓ Localización y replanteo en el tramo de placa huella.
- ✓ Corte de acero y construcción de flejes.
- ✓ En el tramo Cuchilla del Hato-Betania: se realizaron las actividades de excavación, instalación de tubería de 36", relleno y compactación de las alcantarillas No.1 y No.2 localizadas en el K1+235 y K1+303 de la placa huella.
- ✓ En el tramo Cruce Escuela Bella Vista-La Esperanza Baja: se realizaron las actividades de excavación, instalación de tubería de 36", relleno y compactación de las alcantarillas No.12, No.11 y No.9 localizadas en el K5+135 y K5+090 y K3+561.

**Mercaderes**

El día 1 de diciembre de 2018, el contratista hace la localización y replanteo de las obras.

El día 4 de diciembre de 2018, se instala el buzón en el municipio de Mercaderes y en San Joaquín, se levantan dos (2) Actas de Vecindad y se instala el punto de servicio de atención ubicado en la cabecera municipal en la cooperativa del Cauca agencia de compra de café.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de obra e interventoría el día 11 de diciembre del 2018, para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José Adrián Valencia, Director Territorial, Luis Eduardo Ledezma, Blas Uriel Páez, Juan Carlos Gómez, Fernando Velasco y Alonso Ortega en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra y José Fernando Montealegre designado por Federación Nacional de Cafeteros; en representación de la interventoría estuvo la ingeniera Angélica Garzón.

Concluido el comité se determinaron algunos compromisos por parte del contratista, tal como el inicio de obra en los tramos Anillo vial de la Cordillera y Anillo vial La Curva, el día 17 de diciembre del 2018, y presentar a esta Interventoría el plan de contingencia con el objetivo de promover la construcción de las obras contractuales y reducir el atraso que presenta las obras en este municipio.

El día 13 de diciembre del 2018, el contratista transporta (8) tubos de PVC de 36" y (400) sacos de cemento, y el 19 de diciembre de 2018 lleva (1) tubo de PVC a la obra.

El día 13 de diciembre de 2018, se desarrolla reunión con la comunidad, el Alcalde de Mercaderes, contratista e interventoría, con el objetivo de informar a la comunidad el estado del proyecto y el inicio de las obras.

A la fecha se han desarrollado las siguientes actividades:

- ✓ Transporte de materiales (cemento, tubería, señalización y materiales granulares).
- ✓ Localización y replanteo en el tramo de placa huella.
- ✓ En el tramo Anillo vial de la cordillera: el contratista avanza en la intervención de las alcantarillas K8+850 y K8+890, desarrollando las siguientes actividades: excavación, instalación de tubería de 36", relleno y compactación del mismo.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

### 3.2.1 Avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato.

Tanto La Federación Nacional de Cafeteros, como la Interventoría, estamos atentos a la actualización del Gesproy para dar inicio a la ejecución física de las obras en todos los cuatro (4) Municipios.

| DESCRIPCION | SANTA ROSA | | | BALBOA | | | FLORECIA | | | MERCADERES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Básico | Al | Total | Básico | Al | Total | Básico | Al | Total | Básico | Al | Total |
| Estudios y diseños | 12.324.350,42 | 2.341.626,58 | 14.665.977,00 | 24.008.142,02 | 4.561.546,98 | 28.569.689,00 | 12.529.329,15 | 2.380.572,54 | 14.909.901,69 | 12.151.117,5 | 3.031.703,82 | 15.182.821,32 |
| Obra básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.053.704,92 | 0,00 | 21.053.704,92 | | | 0,00 |
| Obras complementarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Provisión para ajustes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gestión social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gestión predial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Gestión ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Otras actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Total** | **12.324.350,42** | **2.341.626,58** | **14.665.977,00** | **24.008.142,02** | **4.561.546,98** | **28.569.689,00** | **33.583.034,07** | **2.380.572,54** | **35.963.606,61** | **12.151.117,5** | **3.031.703,82** | **15.182.821,32** |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# 4.REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### 3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.

La Interventoría mediante Oficio CDP-146-2018 radicó los presupuestos con los respectivos APU, correspondientes a las actividades a desarrollar para la localización definitiva de las obras, por lo que no se puede advertir por el momento acerca de la eventual aparición de APUs no previstos.

### 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

La Interventoría solicita al Contratista mediante oficio No. CDO-171-2018 de fecha cinco (5) de diciembre de 2018, dar cumplimiento a la ejecución de las actividades de acuerdo a la Programación de Obra presentada con fecha de inicio de obras 20 de noviembre del 2018 para los tramos localizados en los municipios de Santa Rosa, Balboa, Florencia y Mercaderes, puesto que estas corresponden a la fase siguiente a la aprobación de estudios y diseños.

Personal de la Interventoría aprobado por INVIAS Subdirección Red Terciaria y Férrea, ha venido laborando desde el inicio de las actividades y lo continuará haciendo según lo pactado contractualmente, hasta el vencimiento de las prórrogas y recibo final de las obras.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

### 4.1 RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3. Revisar Anexos.

### 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4 Revisar Anexos.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## 4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se presenta el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6 donde se relaciona el personal en obra utilizado. Revisar Anexos.

## 4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8. Revisar Anexos

## 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10. Revisar Anexos.

## 4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11.

## 4.7 CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 con la relación de personal en obra. Revisar Anexos.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificacion NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SOLARTE LLANTEN ADRIANA ISABEL identificado con CC-25397502, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razon Social |
| NI-860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 13890343 | E | 2018-12-11 | 0,0696 |

Datos Administradores

| Tipo | NIT | Codigo | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 30 |
| EPS | 800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 30 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compenzacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 30 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 30 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado RAMOS GALINDO LINDA ESTER TABITA identificado con CC-1061749004, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | | | |
|---|---|---|---|
| **Identificación** | | **Razón Social** | |
| NI-860007538 | | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | |
| **Datos Planilla** | | | |
| **Número Planilla** | **Tipo Planilla** | **Fecha de Pago** | **Tarifa Riesgos Laborales** |
| 13890343 | E | 2018-12-11 | 0,0696 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo** | **NIT** | **Código** | **Nombre** | **Días** |
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 814000337 | ESSC18 | Asociacion Mutual Empresa Solidaria de salud de Nariño EMSSANAR E.S.S | 30 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 30 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 30 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pension: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MACIAS MACIAS CLAUDIA YOHANA identificado con CC-1010168753, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razón Social |
| NI-860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 13890343 | E | 2018-12-11 | 0,01044 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Días |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 30 |
| EPS | 901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS S.A.S. | 30 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compenzacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 30 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 30 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado QUINTERO MANRIQUE GLORIA PATRICIA identificado con CC-52837113, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificacion | Razon Social |
| NI-860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Numero Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 13890343 | E | 2018-12-11 | 0,01044 |

Datos Administradoras

| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
|---|---|---|---|---|
| AFP | 800224808 | 230301 | PORVENIR | 30 |
| EPS | 901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS S.A.S. | 30 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compenzacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 30 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 30 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado SANCHEZ GERRERO JAVIER MARTIN identificado con CC-93378931, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificación | Razon Social |
| NI-860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 13890343 | E | 2018-12-11 | 0,01044 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Codigo | Nombre | Dias |
| AFP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 30 |
| EPS | 800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 30 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compenzacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 30 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 30 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pension: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CHACON PENAGOS FERNANDO NICOLAS identificado con CC-10303468, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación | Razón Social | | |
| NI-860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | | |
| Datos Planilla | | | |
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 13850343 | E | 2018-12-11 | 0,0696 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
| AFP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 30 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 30 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compensacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 30 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 30 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pension: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificación NI 860007538 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado CARDENAS QUINTERO JHOAN identificado con CC-1061721705, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | | | |
|---|---|---|---|
| Identificación | Razon Social | | |
| NI-860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS | | |
| Datos Planilla | | | |
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 13890343 | E | 2018-12-11 | 0,0696 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Codigo | Nombre | Dias |
| AFP | 800227940 | 231001 | COLFONDOS | 30 |
| EPS | 805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 30 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 30 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compenzacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 30 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 30 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 30 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Periodo Pensión: 2018-11
Periodo Salud : 2018-12

Se certifica que en la fecha 2018-12-11 la empresa FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS con documento de identificacion NI 860007538 sucursal 0, cancelo los aportes de seguridad social correspondientes al empleado OJEDA RODRIGUEZ OSCAR FERNANDO identificado con CC-76307621, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

| Datos Aportante | |
|---|---|
| Identificacion | Razon Social |
| NI-860007538 | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS |

| Datos Planilla | | | |
|---|---|---|---|
| Número Planilla | Tipo Planilla | Fecha de Pago | Tarifa Riesgos Laborales |
| 13850343 | E | 2018-12-11 | 0,0696 |

| Datos Administradoras | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | NIT | Código | Nombre | Dias |
| AFP | 900336004 | 25-14 | Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 17 |
| EPS | 900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. | 17 |
| ARL | 800256161 | 14-28 | ARL SURA | 17 |
| CCF | 891500182 | CCF14 | Caja de Compenzacion Familiar del Cauca COMFACAUCA | 17 |
| SENA | 899999034 | PASENA | SENA | 17 |
| ICBF | 899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 17 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## 4.8 INFORME AVANCE FISICO – FINANCIERO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14. Revisar Anexos.

## 4.9 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-IN-15-FR-15. Revisar Anexos.

## 4.10 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17. Revisar Anexos.

## 4.11 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

### 1. SEGUIMIENTO A LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjuntan los Formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y MINFRA-MN-IN-2-FR-2. Revisar Anexos.

### 2. SEGUIMIENTO PROGRAMA DE OBRA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjuntan los Formatos PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES MINFRA-MN-IN-6-FR-2. Revisar Anexos.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## 3. ACTAS DEL CONTRATO

- **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.**

  Formato MINFRA-IN-14-FR-1. Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre de 2018 se realizaron los Comités de Obra semanales, que se indican en el documento adjunto. Revisar Anexos.

- **ACTA DE REUNIÓN**

En el periodo correspondiente del 1° al 31 de diciembre de 2018, se elaboraron actas de reunión y puntos de atención al usuario. Revisar anexos.

- **INFORMES SEMANALES**

Correspondientes al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjuntan los informes semanales en formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2. Revisar Anexos.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-PR-3 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 1 | | |
| PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** DICIEMBRE 2018

CONTRATO DE OBRA No.: 495 de 2018

OBJETO: "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
FECHA DE INICIACION: 22/05/2018
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 13.026.230.310,94
VALOR ACUMULADO: $ -
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 28 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 921 de 2018 INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

## ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Obras de Arte | Unidad | 39 |
| Placa Huella | Metros | 1721,1 |
| Cunetas | Metros | 1721,1 |
| Box-coulvert | Unidad | 2 |
| Muro de contención | Metros | 19,7 |

## AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA |
|---|---|---|
| Mejoramiento | Unidad | 0 |
| Construcción | Metros | 0 |
| Pavimentación | Metros | 0 |

## AVANCE FINANCIERO

| | Inversión Programada (P) | INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) | | | E/P | Costos de Intervent (I) | C/B | I/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obra (B) | Ajustes (A) | Total (C=A+B) | | | | |
| En el mes: | N/A | | | | | | | |
| Acumulado: | | | | | | | | |

| VIGENCIAS PRESUPUESTALES | |
|---|---|
| Año | Valor |
| | |
| | |
| Total | |

| | E/V | Meses Ejecutados | Plazo Ejecutado/Total | Meses Faltantes | Saldo Contrato | Plazo Adicional Estimado | Presupuesto disponible | Valor Programado para los meses faltantes del año. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | N/A | | | | | | | |
| Interventor: | | | | | | | | |

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

| *OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | Valor sin IVA |
|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| GESTIÓN PREDIAL | |
| GESTIÓN SOCIAL | |
| GESTIÓN AMBIENTAL | |
| OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN | |
| VALOR TOTAL | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

## ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

| Amparo | VIGENCIA | |
|---|---|---|
| | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | 25-ene-18 | 01/07/2019 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 25-ene-18 | 01/07/2019 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 25-ene-18 | 31/12/2021 |
| Calidad de Estudios y Diseños | 31-dic-18 | 31/12/2023 |
| Estabilidad y Calidad de Obra | 31-dic-18 | 31/12/2023 |

| Seguro | VIGENCIA | |
|---|---|---|
| | Desde | Hasta |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | 25/01/2018 | 31/12/2018 |
| Otros | | |

**Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros:** Póliza 2039848-0 SURAMERICANA, aprobada 21 Febrero 2018 por el Instituto.

**PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

N/A

**CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

N/A

**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA**

EL CONTRATISTA DIO INICIO A LAS OBRAS: FLORENCIA Y SANTA ROSA 17 DE DICIEMBRE DE 2018, MERCADERES 21 DE DICIEMBRE DE 2018 Y BALBOA 26 DE DICEMBRE DE 2018.

Firma
Luis Samuel Ordoñez Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCION TERRITRIAL** CAUCA

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**MES DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO No.** 495 DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** BALBOA: Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral.

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**SECTOR:** Placa Huella K1+550 al K1+680, K5+706 al K6+060, K7+800 al K8+084, Alcantarillas K1+665, K1+935, K2+230, K5+250, K5+309, K5+800, K5+967, K6+060, K7+700, K7+821, K7+926, K7+990, K8+074, K8+084, Muro K1+665.

(Abscisas alcance del contrato )

| MAQUINARIA Y EQUIPO | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Retrocargador de llantas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | R | R | R |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA — **CAUCA**

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**MES DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO No.** 495 DE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** FLORENCIA: TRAMO 1 CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA.

**SECTOR:** TRAMO 1: Alcantarillas K0+000, K0+828, K1+240, K1+922, K2+072, K2+872, K3+072, K3+335, K3+439, K3+561, K4+661, K5+090, K5+135, K5+440. TRAMO 2: Placa Huella K1+194 al K1+319 y Alcantarillas: K1+194 y K1+319.
(Abscisas alcance del contrato )

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | I | I | A | I | A | A | A | I | I | A |
| Compactador manual | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | I | I | A | I | A | A | A | I | I | A |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordoñez Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA — **CAUCA**

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**Y/O PROYECTO:** MERCADERES: TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

**MES DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO No.** 495 DE 2018

**SECTOR:** TRAMO 1: Placa Huella K3+530 al K3+680, K8+670 al K8+890 y K10+320 al K10+380, Alcantarillas K3+570, K8+670, K8+810, K8+850, K8+890 y K10+370, Box coulvert K10+370 y K10+380. TRAMO 2: Placa huella K8+410 al K8+560, Alcantarillas K8+470, K8+540, K8+560 y K8+890.

(Abscisas alcance del contrato )

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

| MAQUINARIA Y EQUIPO | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Retrocargador de llantas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | I | I | I | A | A | I | I | I | I |
| Compactador manual | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | I | I | I | A | A | I | I | I | I |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | FECHA | 2 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA — **CAUCA**

## CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

**MES DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO No.** 495 DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRAMO No. 1 EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA y TRAMO No. 2 LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA.

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** TRAMO No. 1 Placa Huella K0+000 al K0+157, Alcantarilla K0+018 y K0+090 y TRAMO No. 2 Placa Huella K0+000 al K0+159, Alcantarillas K0+087 y K1+200.

(Abscisas alcance del contrato )

| MAQUINARIA Y EQUIPO | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Retrocargador de llantas | | | | | | | | | | | | | | | | | A | A | A | A | I | I | I | I | A | A | A | I | I | I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No. : 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) / 1 (Mes) / 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

**MES DEL INFORME:** DICIEMBRE 2018

**CONTRATO DE OBRA No.** 495 DE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** BALBOA: Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral.

**SECTOR:** Placa Huella K1+550 al K1+680, K5+706 al K6+060, K7+800 al K8+084, Alcantarillas K1+665, K1+935, K2+230, K5+250, K5+309, K5+800, K5+967, K6+060, K7+700, K7+821, K7+926, K7+990, K8+074, K8+084, Muro K1+665.

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 de 2018

**INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

| NOMBRE | CARGO | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGO | DIRECTOR DE OBRA | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| OSCAR FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ | RESIDENTE DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| ADRIANA ISABEL SOLARTE LLANTEN | LIDER SOCIAL | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| CLAUDIA YOHANA MACIAS | RESIDENTE SOCIAL | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINDA ESTER TABITA RAMOS GALINDO | ASISTENTE DE ARCHIVOS | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la Interventoria que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordu[illegible] Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

**MES DEL INFORME:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO DE OBRA No.** 495 DE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** FLORENCIA: TRAMO 1 CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA.

**SECTOR:** TRAMO 1: Alcantarillas K0+000, K0+828, K1+240, K1+922, K2+072, K2+872, K3+072, K3+335, K3+439, K3+561, K4+661, K5+090, K5+135, K5+440. TRAMO 2: Placa Huella K1+194 al K1+319 y Alcantarillas: K1+194 y K1+319.

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 de 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

| NOMBRE | CARGO | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGO | DIRECTOR DE OBRA | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| ADRIANA ISABEL SOLARTE LLANTEN | LIDER SOCIAL | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| LINDA ESTER TABITA RAMOS GALINDO | ASISTENTE DE ARCHIVOS | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Cano Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| FECHA | 2 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA**

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** MERCADERES: TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN-ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS-VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

**MES DEL INFORME:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO DE OBRA No.** 495 DE 2018

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA **SECTOR:** TRAMO 1: Placa Huella K3+530 al K3+680, K8+670 al K8+890 y K10+320 al K10+380, Alcantarillas K3+570, K8+670, K8+810, K8+850, K8+890 y K10+370, Box coulvert K10+370 y K10+380. TRAMO 2: Placa huella K8+410 al K8+560, Alcantarillas K8+470, K8+540, K8+560 y K8+890.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 de 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

| NOMBRE | CARGO | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGO | DIRECTOR DE OBRA | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| ADRIANA ISABEL SOLARTE LLANTEN | LIDER SOCIAL | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| LINDA ESTER TABITA RAMOS GALINDO | ASISTENTE DE ARCHIVOS | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| JHOAN CARDENAS QUINTERO | RESIDENTE DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | | | X |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la interventoria que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matricula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordue Gomez
Director de Interventoria
Matricula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA**

**MES DEL INFORME:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO DE OBRA No.** 495 DE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRAMO No. 1 EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA y TRAMO No. 2 LA CABECERA MUNICIPAL- LA AGENCIA.

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**SECTOR:** TRAMO No. 1 Placa Huella K0+000 al K0+157, Alcantarilla K0+018 y K0+090 y TRAMO No. 2 Placa Huella K0+000 al K0+159, Alcantarillas K0+087 y K1+200.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 de 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

| NOMBRE | CARGO | DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGO | DIRECTOR DE OBRA | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| ADRIANA ISABEL SOLARTE LLANTEN | LIDER SOCIAL | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| LINDA ESTER TABITA RAMOS GALINDO | ASISTENTE DE ARCHIVOS | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| CLAUDIA YOHANA MACIAS | RESIDENTE SOCIAL | | | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JAVIER MARTIN SANCHEZ GUERRERO | RESIDENTE DE OBRA | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**NOTA:**
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

MUNICIPIO DE BALBOA: Tramo 1: Cruce La Planada-La Planada, Tramo 2: La planada-Versalles Bajo, Tramo 3: La Cabaña-Escuela La Cabaña. MUNICIPIO DE MERCADERES: Sector 1 Anillo Vial de La Cordillera: Tramo No. 1: San Joaquín – La Monja, Tramo No. 2: Los Alpes, Tramo No. 3: Cruce Los Alpes; Sector 2 Anillo Vial La Curva – El Pilón: Tramo No. 1: Los medios. MUNICIPIO DE SANTA ROSA: Tramo No. 1 Cabecera Municipal – La Agencia, Tramo No. 2 Cruce La Virgen – La Tarabita. MUNICIPIO DE FLORENCIA: Sector 1: Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja, Sector 2: Vía Cuchilla Del Hato – Betania

**SECTOR:**

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | |
| AJUSTES | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | |
| | | VERSIÓN | | |
| | | FECHA | | DE |

| FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** BALBOA: Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral.

Placa Huella K1+550 al K1+680, K5+706 al K6+060, K7+800 al K8+084, Alcantarillas K1+665, K1+935, K2+230, K5+250, K5+309, K5+800, K5+967, K6+060, K7+700, K7+821, K7+926, K7+990, K8+074, K8+084, Muro K1+665.

**SECTOR:**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 24 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 506 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordúz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | FECHA | | DE | |

| FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** FLORENCIA: TRAMO 1 CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA.

**SECTOR:** TRAMO 1: Alcantarillas K0+000, K0+828, K1+240, K1+922, K2+072, K2+872, K3+072, K3+335, K3+439, K3+561, K4+661, K5+090, K5+135, K5+440. TRAMO 2: Placa Huella K1+194 al K1+319 y Alcantarillas: K1+194 y K1+319.

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 24 | 24 | 18 | 24 | 23 | 23 | 505 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | |
| | VERSIÓN | | |
| | FECHA | | DE |

| FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MERCADERES: TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

**SECTOR:** TRAMO 1: Placa Huella K3+530 al K3+680, K8+670 al K8+890 y K10+320 al K10+380, Alcantarillas K3+570, K8+670, K8+810, K8+850, K8+890 y K10+370, Box coulvert K10+370 y K10+380. TRAMO 2: Placa huella K8+410 al K8+560, Alcantarillas K8+470, K8+540, K8+560 y K8+890.

**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 24 | 24 | 18 | 24 | 23 | 23 | 505 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**

**OBSERVACIONES:**

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordúz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | | |
| | | FECHA | | DE | |

| FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRAMO No. 1 EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA y TRAMO No. 2 LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA.

**SECTOR:** TRAMO No. 1 Placa Huella K0+000 al K0+157, Alcantarilla K0+018 y K0+090 y TRAMO No. 2 Placa Huella K0+000 al K0+159, Alcantarillas K0+087 y K1+200.

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 24 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | 24 | 24 | 18 | 24 | 23 | 23 | 505 |
| Lluvias moderadas | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| **Total** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | | DE | |

| FECHA | 2 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** BALBOA: Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral.

**SECTOR:** Placa Huella K1+550 al K1+680, K5+706 al K6+060, K7+800 al K8+084, Alcantarillas K1+665, K1+935, K2+230, K5+250, K5+309, K5+800, K5+967, K6+060, K7+700, K7+821, K7+926, K7+990, K8+074, K8+084, Muro K1+665.

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación /Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** En el presente periodo no se hicieron ensayos de laboratorio.

**NOTA:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** FLORENCIA: TRAMO 1 CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA.

**SECTOR:** TRAMO 1: Alcantarillas K0+000, K0+828, K1+240, K1+922, K2+072, K2+872, K3+072, K3+335, K3+439, K3+561, K4+661, K5+090, K5+135, K5+440. TRAMO 2: Placa Huella K1+194 al K1+319 y Alcantarillas: K1+194 y K1+319.

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación /Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** En el presente periodo no se hicieron ensayos de laboratorio.

**NOTA:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Fernando Nicolas Chacón Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | | DE | |

| | FECHA | 2 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: DICIEMBRE 2018** **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MERCADERES: TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON).

**SECTOR:** TRAMO 1: Placa Huella K3+530 al K3+680, K8+670 al K8+890 y K10+320 al K10+380, Alcantarillas K3+570, K8+670, K8+810, K8+850, K8+890 y K10+370, Box coulvert K10+370 y K10+380. TRAMO 2: Placa huella K8+410 al K8+560, Alcantarillas K8+470, K8+540, K8+560 y K8+890.

**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación /Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** En el presente periodo no se hicieron ensayos de laboratorio.

**NOTA:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-11 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PAGINA | | DE | |

| | FECHA | 2 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** TRAMO No. 1 EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA y TRAMO No. 2 LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA.

**SECTOR:** TRAMO No. 1 Placa Huella K0+000 al K0+157, Alcantarilla K0+018 y K0+090 y TRAMO No. 2 Placa Huella K0+000 al K0+159, Alcantarillas K0+087 y K1+200.

## RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

| No. Consecutivo del Ensayo | Fecha del Ensayo | Descripción/Ensayo | Norma | Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra) | No. De Muestras | Rango Cumplimiento del Ensayo | Resultado del Ensayo | Cumple SI o NO | Observación /Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** En el presente periodo no se hicieron ensayos de laboratorio.

**NOTA:**

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.

Firma
Fernando Nicolás Chacon Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordoz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 de 2018

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

**SECTOR:** MUNICIPIO DE BALBOA: Tramo 1: Cruce La Planada-La Planada, Tramo 2: La planada- Versalles Bajo, Tramo 3: La Cabaña-Escuela La Cabaña. MUNICIPIO DE MERCADERES: Sector 1 Anillo Vial de La Cordillera: Tramo No. 1: San Joaquín – La Monja, Tramo No. 2: Los Alpes, Tramo No. 3: Cruce Los Alpes; Sector 2 Anillo Vial La Curva – El Pilón: Tramo No. 1: Los medios. MUNICIPIO DE SANTA ROSA: Tramo No. 1 Cabecera Municipal – La Agencia, Tramo No. 2 Cruce La Virgen – La Tarabita. MUNICIPIO DE FLORENCIA: Sector 1: Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja, Sector 2: Vía Cuchilla Del Hato – Betania

## VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| Nombre | Cargo | Período laborado | No. Días mes (Base Liquidación) | C.C. | Días del Mes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | EPS | | ARL | Pensiones | | Caja de Compensación - ICBF Y SENA | | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Planilla | No. días cotizados | | Planilla | No. días cotizados | Planilla | No. días cotizados | | |
| FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGO | DIRECTOR DE OBRA | dic-18 | 30 | 10.303.488 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13890343 | 30 | X | 13890343 | 30 | 13890343 | 30 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | |
| ADRIANA ELIZABETH SOLARTE LLANTEN | LIDER SOCIAL | dic-18 | 30 | 25.397.502 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13890343 | 30 | X | 13890343 | 30 | 13890343 | 30 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | |
| LINDA ESTER TABITA RAMOS GALINDO | AUXILIAR DE ARCHIVO | dic-18 | 30 | 1.061.749.004 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13890343 | 30 | X | 13890343 | 30 | 13890343 | 30 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | |
| CLAUDIA YOHANA MACIAS | RESIDENTE SOCIAL | dic-18 | 30 | 101.068.753 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13890343 | 30 | X | 13890343 | 30 | 13890343 | 30 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | |
| JAVIER MARTIN SANCHEZ GUERRERO | RESIDENTE DE OBRA | dic-18 | 30 | 93.378.931 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13890343 | 30 | X | 13890343 | 30 | 13890343 | 30 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | |
| JHOAN CARDENAS QUINTERO | RESIDENTE DE OBRA | dic-18 | 30 | 1.061.721.705 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13890343 | 30 | X | 13890343 | 30 | 13890343 | 30 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | |
| OSCAR FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ | RESIDENTE DE OBRA | dic-18 | 17 | 76.307.621 | | | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13890343 | 17 | X | 13890343 | 17 | 13890343 | 17 | FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS | |

**NOTA:**

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

**3. Hasta la fecha, el Contratista de Obra no ha sido presentada la información referente a Pago de Seguridad Social del personal vinculado, pese a la solicitud expresa por parte de la Interventoria.**

Firma
Nombre: Fernando Nicolas Chacon Penagos
Cargo: Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Nombre: Luis Samuel Ordoz Gomez
Cargo: Director de Interventoria
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-14 | | |
|---|---|---|---|
| VERSION | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 (Día) / 1 (Mes) / 2019 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA | ACTA No: 5 | PERIODO MES: DICIEMBRE 2018 | VALOR BÁSICO ACTA: $ -

CONTRATO DE OBRA No : 495 de 2018
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"
CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
SECTOR: MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA
RUTA
MUNICIPIO DE BALBOA: Tramo 1: Cruce La Planada-La Planada, Tramo 2: La planada-Versalles Bajo, Tramo 3: La Cabaña-Escuela La Cabaña.
TRAMO:

PLAZO INICIAL: 31 DE DICIEMBRE
FECHA DE INICIACIÓN: 22/05/2018
FECHA DE REANUDACIÓN: -
VALOR INICIAL (Incluido IVA) : $ 13.026.230.310,94
VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 28 DE FEBRERO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: -
VALOR ADICIONALES: -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO: -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 921 DE 2018 | INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA | SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

## I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

**CONTRATO DE OBRA**

| Contrato No. | Plazo Acumulado | Fecha Vencimiento | Valor | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 495 DE 2018 | 31-dic | 31-dic | 13.026.230.310,94 | 13.026.230.310,94 |
| | | | | |
| | | | | |

**VIGENCIAS PRESUPUESTALES**

| Año | Valor |
|---|---|
| 2018 | 13.026.230.310,94 |
| | |
| Total | 13.026.230.310,94 |

**ANTICIPOS**

| | |
|---|---|
| Otorgado $ | - |
| Amortizado $ | - |
| Saldo $ | - |

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Contrato No. | Plazo Acumulado | Fecha Vencimiento | Valor | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 921 DE 2018 | CINCO MESES | 09/01/2019 | 464.786.915 | 464.786.915 |
| | | | | |
| | | | | |

| | Inversión Programada (P) | INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA) | | | E/P | Costos de Intervent (I) | C/B | I/C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Obra (B) | Ajustes (A) | Total (C=A+B) | | | | |
| En el mes: | N/A | | | | | | | |
| Acumulado: | | | | | | | | |

| | E/V | Meses Ejecutados | Plazo Ejecutado/Total | Meses Faltantes | Saldo Contrato | Plazo Adicional Estimado | Presupuesto disponible | Valor Programado para los meses faltantes del año. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | N/A | | | | | | | |
| Interventor: | | | | | | | | |

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

| Sección | Metros |
|---|---|
| Corona: | |
| Calzada: | |
| Bermas: | |
| Sub base: | |
| Base: | |
| Carpeta: | |

Observaciones:

| *OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | Valor sin IVA |
|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | |
| GESTIÓN PREDIAL | |
| GESTIÓN SOCIAL | |
| GESTIÓN AMBIENTAL | |
| OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN | |
| VALOR TOTAL | |

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 (Día) / 1 (Mes) / 2019 (Año)

## AVANCE FISICO ACUMULADO DE OBRA

| ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP) | PR 0 / PR / PR / PR / PR / PR / PR / PR N | Programado (Km-mes) | Ejecutado (Km-mes) | Programado Acumulado (PA) (Km) | Ejecutado Acumulado (EA) (Km) | EA / PA | INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | En el mes | | Acumulado | |
| | | | | | | | Programado | Ejecutado | Programado | Ejecutado |
| GPP1 | | | | | | | | | | |
| GPP2 | | | | | | | | | | |
| GPP3 | | | | | | | | | | |
| GPP4 | | | | | | | | | | |
| GPP5 | | | | | | | | | | |
| GPP6 | | | | | | | | | | |
| GPPn | | | | | | | | | | |

**NOTAS:**

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Fernando Nicolas Chacón Penagos
Director de Obra
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordua Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No. 25202-26306 CND

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-15 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 495 DE 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**OBJETO DEL CONTRATO:** "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017".

**FECHA DE INICIO:** 22/05/2018

**PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DICIEMBRE 2018

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 28 DE FEBRERO DE 2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 13.026.230.310,94

**VALOR ACUMULADO:** $ 13.026.230.310,94 (Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 de 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | - | $ 1.302.623.031,00 | 25 | 1 | 2018 | 1 | 7 | 2019 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | - | $ 2.605.246.062,00 | 25 | 1 | 2018 | 1 | 7 | 2019 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | - | $ 2.605.246.062,00 | 25 | 1 | 2018 | 31 | 12 | 2021 |
| Calidad de Estudios y Diseños | - | $ 233.936.383,00 | 31 | 12 | 2018 | 31 | 12 | 2023 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | - | $ 3.907.869.093,00 | 31 | 12 | 2018 | 31 | 12 | 2023 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 2038848-0

**Certificado de modificación o anexo No.:** -
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | - | $ 651.311.516,00 | 21 | 1 | 2018 | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 0533577-5 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** -
*(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)*

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-15 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | FECHA | 2 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | - | $ 1.302.623.031,00 | 25 | 1 | 2018 | 1 | 7 | 2019 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | - | $ 2.605.246.062,00 | 25 | 1 | 2018 | 1 | 7 | 2019 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | - | $ 2.605.246.062,00 | 25 | 1 | 2018 | 31 | 12 | 2021 |
| Calidad de Estudios y Diseños | - | $ 233.936.383,00 | 31 | 12 | 2018 | 31 | 12 | 2023 |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | - | $ 3.907.869.093,00 | 31 | 12 | 2018 | 31 | 12 | 2023 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 2038848-0

**Certificado de modificación o anexo No.:** -

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | - | $ 651.311.516,00 | 21 | 1 | 2018 | - | - | - |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 0533577-5** **OTRAS PÓLIZAS No.** _____

**Certificado de modificación o anexo No.** _____

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SURAMERICANA

**Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:** DC 7565 APROBACION
POLIZA CONTRATO PRINCIPAL 495 DE 2018, DEL21 DE FEBRERO DE 2018

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

Firma

Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-17 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | FECHA | 3 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |
|---|---|---|---|---|

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.** 495 DE 2018 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

**CONTRATISTA** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**FECHA DE INICIO:** 22-may-18 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2018 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28-feb-19 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 921 de 2018 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

## 1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ NO X VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 11-mar-19

**OBSERVACIONES:** Se emitió Oficio CDP-083-2019 mediante el cual se devuelve sin aprobación el Documento recibido y se presentan observaciones al Plan de Calidad presentado por la Federación Nacional de Cafeteros

## 2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI _____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: N/A FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N/A

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: N/A FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: N/A

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO X

**OBSERVACIONES:** Mediante Oficio CDP-083-2019 en su numeral 3, se solicita a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia programar Auditorias de Calidad.

## 3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI _____ NO X APROBADO: SI _____ NO X FECHA DE APROBACIÓN: N/A

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: N/A No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: N/A

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

**OBSERVACIONES:** Mediante Oficio CDP-083-2019 en su numeral 4, se solicita a la Federación Nacional de Cafeteros presentar el PLAN DE INSPECCION, MEDICION Y ENSAYO, el cual debe cumplir con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones tecnicas de construcción del Instituto Nacional de Vias.

El plan de inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vias.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

## 4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** N/A **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** N/A

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** N/A **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** N/A

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** N/A

**OBSERVACIONES:** Mediante Oficio CDP-083-2019 en su numeral 5, se solicita a la Federación Nacional de Cafeteros establecer el sistema de registro de reportes de no conformidad.

A la fecha no se ha recibido ningun reporte de no conformidad.

## 5. QUEJAS Y RECLAMOS

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** N/A **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** N/A

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** N/A **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** N/A

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** N/A **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** N/A

**OBSERVACIONES:** Mediante Oficio CDP-083-2019 en su numeral 6, se solicita a la Federación Nacional de Cafeteros establecer el sistema para la recepción de quejas y reclamos.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | N/A | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | N/A | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | N/A | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | N/A | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | N/A | |
| IGn: Índice de gestión n = | N/A | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:** Mediante Oficio CDP-083-2019 en su numeral 7, se solicita a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia presentar los INDICES DE GESTION IG para cada objetivo del Plan de calidad, se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento.

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** Mediante Oficio CDP-083-2019 en su numeral 8, se solicita a la Federación Nacional de Cafeteros presentar el cuadro de CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, NIMEDICIÓN Y ENSAYO.

**NOTAS:**

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

| Firma | Firma | Firma | Firma |
|---|---|---|---|
| Fernando Nicolás Chacon Penagos | Nombre: N/A | Luis Samuel Ordoz Gomez | Nombre: N/A |
| Director de la Obra | Especialista en Calidad de la Obra | Director de la Interventoría | Especialista en Calidad de la Interventoría |
| Matrícula No.: 19202-153851 CAU | Matrícula No.: | Matrícula No.: 25202-28306 CND | Matrícula No.: |

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS:
RADICACION 18879 13/03/2019 03:13:48 pm
REFERENCIA OFICIO
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

CODIPRO LTDA
Ingeniería & Arquitectura

Bogotá D.C. Marzo 11 de 2019.
CDP-083-2019.

Señores:
**FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**
**Comité De Cafeteros Del Cauca**
**Contratista de Obra.**
**Atn: Fernando Nicolás Chacón Penagos**
Director de Obra OCAD PAZ Cauca.
Popayán (Cauca).

SiDoc - Comité Cauca
Cons: E1900253
Radi: 13/03/2019 03:20:51 p.m.
*E1900253*

**Referencia:** CONTRATO DE OBRA No. 0495 de 2018.

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017- MUNICIPIOS DE BALBOA – MERCADERES – FLORENCIA Y SANTA ROSA

**Asunto:** **Pronunciamiento de la Interventoría frente al Plan de Calidad presentados por LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, COMITÉ DE CAFETEROS DEL CAUCA.**

Cordial Saludo:

Una vez revisado el Plan de Calidad presentado por FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, COMITÉ DE CAFETEROS DEL CAUCA, mediante oficio CDS 18C00456 numeral 8., respetuosamente nos permitimos hacer las siguientes observaciones:

1. Se debe actualizar el Plan de Calidad presentado teniendo en cuenta las necesidades reales del Proyecto.
2. Se debe presentar el organigrama del proyecto con los nombres del personal que está laborando en él.
3. Se debe presentar el Programa de Auditorías de Calidad.
4. Se debe presentar el PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE). El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
5. Se debe establecer el sistema para registrar el reporte de no conformidades.
6. Se debe establecer el sistema para la recepción de quejas y reclamos.
7. Se deben presentar los ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento).
   Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

8. Se debe representar el cuadro de CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

9. El plan de calidad debe venir debidamente suscrito por los responsables de la calidad del proyecto.

Respetuosamente les solicitamos atender las observaciones anteriores lo más pronto posible.

Atentamente,

Luis Samuel Orduz Gómez
Director de Interventoria.
CODIPRO INGENIERIA LTDA.

C.C. Ingeniero Luis Eduardo Ledezma - Supervisor del Contrato. – INVIAS Territorial Cauca.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-2-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 495 **DE** 2018 **CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**OBJETO DEL CONTRATO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 **DE** 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** -
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

**JUSTIFICACIÓN:** No se tramitó anticipo.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | 100% |

**NOTAS:**

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoria.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Contratista
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

(Firma)
Luis Samuel Cadiz Gomez
Director de Interventoria
Interventor
Matrícula No. 25202-28306 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-2-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 2 (Dia) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO No.** 5 **MES:** DICIEMBRE DE 2018 **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** ☐ (Marque X si corresponde)

**CONTRATO DE OBRA No.** 495 **DE** 2018

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** _____ **DE** _____ ENTIDAD FINANCIERA: _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** _____ **BANCO** _____ SUCURSAL _____
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 0 %

**VALOR DEL ANTICIPO:** $ - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:** "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

**CONTRATISTA:** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 **DE** 2018

**INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | *ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de obra Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

### SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ITEM

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTALES | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($)** $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS** - **FECHA** - **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-2)

**OBSERVACIONES:** No se tramitó anticipo

Firma
Fernando Nicolas Chacon Penagos
Director de Obra
Contratista
Matrícula No.: 19202-153851 CAU

Firma
Luis Samuel Ordoz Gomez
Director de Interventoria
Interventor
Matrícula No. 25202-28306 CND

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

# ACTAS DE COMITE

| ACTA DE COMITÉ DE OBRA | PÁGINA | 1 | DE | 4 |
|---|---|---|---|---|
| | FECHA | 13 (Día) | 12 (Mes) | 18 (Año) |

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Red Terciaria y Férrea DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cauca

CONTRATO DE OBRA No. 495 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL ODAD-PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1934 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 DE 2018

INTERVENTOR:

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Alex Muñoz Perdomo | Alcalde | Municipio Mercaderes |
| Diana Paz Cabrera | Representacion | Interventoria CODIPRO |
| Jhoan Cardenas Quintero | Representacion | Federacion N. Cafeteros |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Aclarar Inquietudes de la comunidad → Mercaderes

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Comunicar a la comunidad el proceso constructivo de la Placa Huella.
2. Comunicar a la comunidad el tiempo Programado para el cierre total de la via
3. Solicitud de la comunidad al alcalde de Mercaderes mejorar vias alternas.
4. Solicitud del señor Jose Victor Nuñez.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**ACTA DE COMITÉ DE OBRA**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 2 | DE | 4 |

| FECHA | 13 (Día) | 12 (Mes) | 18 (Año) |
|---|---|---|---|

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

1. La Comunidad, y ellos Son directamente beneficiarios del Proyecto, Solicita a los Ingenieros Profesionales involucrados en la ejecución del contrato, aclarar el modo constructivo de la Placa Huella, con Finalidad de conocer si se requiere el cierre Parcial o total de la Vía, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos necesitan movilizarse a las diferentes veredas, además de transportar sus alimentos y Productos generados en la zona.

El contratista conjunto a la Interventoría, manifestarán que debido al manual de Construcción de Pavimentos con Placa Huella del Instituto Nacional de Vías INVIAS, es necesario el cierre total de la vía Puesto que los Paños correspondientes a huellas en concreto, bordillo y viga-riostra deben ser fundidas monolíticamente para garantizar la calidad final y el Periodo de durabilidad de la obra.

2. La Comunidad Solicita se aclare cuál será el tiempo de cierre de la vía. Para lo anterior se comunica a dicha comunidad que los tramos correspondientes a la monja y el derrumbe serán intervenidos de forma Simultánea y Para ello el tiempo Programado Para su ejecución es de 3 meses en actividades de obra y adicionalmente 1 mes para el curado del concreto. Por tanto el periodo de cierre es de Cuatro (4) meses.

3. La Comunidad Solicita al alcalde de Mercaderes Se mejore las vías alternas, teniendo en cuenta que el cierre de la vía es de cuatro (4) meses, en especial la vía que de la vereda los Alpes comunica con el municipio de Florencia. El Alcalde manifiesta que ya en días anteriores en conjunto con la administración municipal de Florencia Se realizo mejoramiento de dicha vía, Sin Embargo, teniendo en cuenta que a fecha de hoy se Presentan Puntos críticos, se compromete a involucrar nuevamente a la administración de Florencia Para Solucionar dichos Puntos Críticos y con ello Permitir que la comunidad tenga Acceso con normalidad.

4. El Señor Jose Victor Narvaez, habitante de la vereda los Alpes, manifiesta que necesita que dén Solución al deslizamiento del talud ubicado en el lado derecho de la vía en donde se encuentra Proyectado un tramo de la Placa Huella, ya que a la fecha no se tiene una Solución Especifica y Temen que el deslizamiento Prosiga llevando con ello su vivienda ubicada muy cerca en la Parte Superior del Talud. A la Presente Solicitud,

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**ACTA DE COMITÉ DE OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 3 | DE | 4 |
| FECHA | 13 (Día) | 12 (Mes) | 18 (Año) |

**DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA**

El alcalde se compromete para la siguiente semana a partir de la suscripción de esta acta, con suministrar un maestro y los materiales necesarios para la construcción de un muro que de solución a la presente situación. Sin embargo, el alcalde solicita a la comunidad colocar la mano de obra para la construcción del muro y poder continuar con la ejecución de la Placa Huella, teniendo en cuenta que son ellos los directamente beneficiarios del proyecto. A lo, anterior, la comunidad se compromete con la mano de obra.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 4 | DE | 4 |
| FECHA | 13 (Día) | 12 (Mes) | 18 (Año) |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Compromisos Segun Presente Acta de reunión | | |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| Alex Muñoz Perdomo | |
| Franklin Hernan Pinta | |
| Didna Paz Cabrera | |
| Jhosu Cardenas Quintero | |

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

OBRA: Contrato 00495- Municipio de Piamonte Cauca

DEPARTAMENTO: CAUCA MUNICIPIO: MERCADERES

VEREDA /CORREGIMIENTO: LOS ALPES FECHA: 13-DICIEMBRE-2018

ACTIVIDAD: REUNION COMUNIDAD, ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA LUGAR: LOS ALPES.

| Ord | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN | CARGO | TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libio Alexander Castillo | 70 593 512 | Los Alpes | | 3178931609 |
| 2 | Miller Muñoz | 10594566 | los Alpes | | 3173162515 |
| 3 | Luis Carlos Martinez | 10430128 | Esmeraldas | | 3114738757 |
| 4 | Luis Hernando Pino | 4319425 | Esmeraldas | | |
| 5 | Livio Bantil Castillo Pino | 10593074 | Los Alpes | Presidente JAC. | 3508277772 |
| 6 | Luis Alfredo Diaz B | 10593906 | El Placer | | 3182282958 |
| 7 | griselda Benavides | 34 450 742 | los alpes | | |
| 8 | Huberly Benavides | 70 593 927 | los alpes | | |
| 9 | Jairo pacu | 4710467 | TB | TJRC | Jairo pacu |
| 10 | Fidensio ordoñez | 4770209 | los Alpes | | |
| 11 | Fider muñoz | 4710480 | el placer | V. J.A.C | Fabricio. J |
| 12 | Nabor Benavides | 10430063 | los alpes | | |
| 13 | Fidencio Benavides | 70,430 792 | El placer | | Fidencio Benavides |
| 14 | Abel ortiz | 10.593339 | Esmeralda | | Abel ortiz |
| 15 | segundo G- Burbano | 4710409 | losalpes | | 3100468161 |
| | Jairo Alvarado D | 1061016412 | los alpes | | |

# REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de Piamonte Cauca

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

DEPARTAMENTO: Cauca MUNICIPIO: Mercaderes FECHA: 13-Dic-2018.

VEREDA /CORREGIMIENTO: Los Alpes LUGAR: Los Alpes

ACTIVIDAD: REUNION COMUNIDAD, ADMINISTRACION MUNICIPAL, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA

| Ord | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN | CARGO | TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Situa | 10540451 | el placer comite cafet | pte comite-s | |
| 2 | Ever Bolbano | 6710121 | Los Alpes | Agricultos | |
| 3 | Favian Lasso 13 | 70594239 | Esmeraldas | Agricultor | |
| 4 | Elder iMbachi | 70430783 | Esmeraldas | presidente | 3704163677 |
| 5 | Luz Angelica Cordoba | 34526596 | Esmeraldas | Damedcasa | 3147831783 |
| 6 | Jose victor Narvaez | 10430454 | los alpes | | |
| 7 | Carmen F Dorado | 34566544 | Los Alpes | ama de casa | 3227707701 |
| 8 | Hilarión pino M. | 6572205 | Esmeraldas | | 3167088740 |
| 9 | Elcira Imbachi | 25579870 | Los Alpes | ama de casa | 3193337777 |
| 10 | Marina Ruiz Beltral | 34445759 | Los Alpes | ama de casa | |
| 11 | Hermis Narvaez | 10594624 | los Alpes | | |
| 12 | Luis Armando Muñoz | 10594439 | los Alpes | | |
| 13 | Nubia Burbano Burbano | 34445171 | Los Alpes. | | |
| 14 | Mercedes Monfilla | 1061086305 | Florencia | | |
| 15 | Miguel Bulbano | 10592967 | LOS ALPES | agricultor | 3122037047 |
| | Duber Martinez | 10.593899 | Esmeraldas | Agricultor | |

# REGISTRO DE ASISTENCIA

OBRA: Contrato 00495- Municipio de Piamonte Cauca

DEPARTAMENTO: CAUCA MUNICIPIO: MERCADERES FECHA: 13- DICIEMBRE- 2018.

VEREDA /CORREGIMIENTO: Los AIPES LUGAR: Los AIPES

ACTIVIDAD: REUNION COMUNIDAD, ADMINISTRACCIÓN MUNICIPAL, INTERVENTORÍA y CONTRATISTA

| Ord | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | VEREDA / BARRIO / INSTITUCIÓN | CARGO | TELÉFONO / CORREO ELECTRONICO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olmedo muñoz samboni | 1061020131 | Esmeraldas | Fiscal J.A.C | |
| 2 | Jorge Ceron Doco | 0710370 | Cojinl Esm | Agricultor | |
| 3 | Humberto Burbano | 70430767 | Los Alpes | | |
| 4 | AFRANIO CASTILLO | 10 230171 | Los Alpes | | 3128871426 |
| 5 | Obdulio Lasso | 0710122 | Esmeraldas | obdulio Lasso | |
| 6 | Rubito Bolaños | 4.941360 | Tablones Altos | Concejal | 320 720 25 68 |
| 7 | Nelson Daza | 83165625 | Esmeraldas | agricultor | |
| 8 | Nidia M Jansasoy Diaz | 34446795 | esmeraldas | ama de casa | |
| 9 | Vicky A. Beltrán | 98021837 | los Alpes | agricultor | 3508579375 |
| 10 | Audelo Beltrán | 5239258 | los alpes | agricultor | |
| 11 | maria Ester Bnbi | | 3 H H h-10 | maria EyB | |
| 12 | Luis Gonzalo Lopez | 10030132 | La manga | Luis Gonzalo | 3508658944 |
| 13 | Alonia Selva | 34676674 | Esmeraldas | Representante principal comité | 3122667371 34676674 |
| 14 | Edelfa Irene Burbano B. | 34569957 | Los Alpes | Representante Princi Palcomite de cafeteros | 3185747240 3502528534 |
| 15 | Pablo Julian Hoyos Rodriguez | 76'320068 | Los Alpes | Representant. comité de Cafeteros | 3228815940 317 898 1515. |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE COMITÉ DE OBRA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 05 (Día) Dic (Mes) 2018. (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: _____ DIRECCIÓN TERRITORIAL: _____

CONTRATO DE OBRA No. 495 DE 2018.

CONTRATISTA: Federación Nacional de Cafeteros.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: _____

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 DE 2018.

INTERVENTOR: Codipro Ingeniería y Arquitectura Ltda.

| PARTICIPANTES | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Angelica Maria Cortés | Residente. | Codipro. |
| Jhon Cardenas Q. | Gestor Proyectos | contratista. |
| Manuel Lopez. | | Contratista. |

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

Analizar detalles de Construcción.

**LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS**

**TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA**

1. Pendiente de tubería - Alcantarillas.
2. Espesor de relleno para alcantarillas.
3. Modulación de losas.
4. Programación de visita a Campo.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | | DE | |
| FECHA | | | |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

① Pendiente de tubería – Alcantarilla
Teniendo en cuenta los criterios de la Cartilla de obras menores de vías terciarias de INVIAS, se adopta la pendiente de tubería de 2%.

② Espesor de relleno para alcantarillas
Se define que el relleno entre la cota clave y la subrasante es. 60 centímetros (Mínimo).

③ Modulación de losas.
Las modulaciones de losas se realizarán en campo durante el proceso constructivo en compañía con Interventoría y Contratista, lo anterior puesto que constructivamente no es viable según los lineamientos de diseño de pavimento.

④ Programación de visita de campo.
Se programa visita a campo en compañía de Interventoría y contratista para el día martes 11 de diciembre de 2018.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |
| | | FECHA | | | |
| | | | (Día) | (Mes) | (Año) |

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| | | |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA** _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

**NOTAS**

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| Angélica María Garzón | |
| Juan Cardenas Quintero | |
| Manuel A. Lopez Gragales | |

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 08 (Día) 01 (Mes) 19 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 495 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco de la OCAD paz en el departamento del Cauca de conformidad con el decreto ley 1534 del 15 de septiembre de 2017.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 DE 2018

INTERVENTOR: CONIPRO

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Heiner Jesus Morino | Propietario predio | Comunidad vda la esperanza |
| Diana C. Bedoya | Residente Social | FNC. |
| Mike Delgado | Residente Tecnico | FNC. |
| Eduardo Hoyos | Inspector obra | |
| Alberto Grajo. | Maestro de obra. | |

OBJETIVOS DE LA REUNION

Solicitud de permiso instalación de punto ecológico y Botiquin de primeros auxilios proyecto OAD Tramo La Esperanza.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNION

1. Inicia la reunión con la presentación de la residente social y el propietario de la vivienda Heiner Jesus Morino.
2. Se explica el objetivo de la reunión.
3. Concertación uso de espacio para punto ecológico y botiquin.
4. Cierre de la actividad

DESARROLLO DE LA REUNION

Se solicita consentimiento por parte del proyecto ocad paz para instalacion de punto ecológico y botiquin de primeros auxilios, al señor Heiner Jesus Morino indicandole que el tiempo de instalacion corresponde al tiempo que demore la intervencion social y tecnica de la obra pues corresponde a dos (2) meses, aproximadamente con fecha tentativa de retiro del 28 de febrero de 2019.

Se le indica que esta solicitud no contempla o debe generar ningún tipo de contraprestacion economica y que este se debe asumir como un aporte solidario de parte de la comunidad para lo cual el propietario manifiesta estar de acuerdo preguntando que en el futuro que pasará con estos elementos: botiquin y punto ecologico indagando si una vez culminada la obra se pueden donar a la vereda La esperanza; a lo cual se responde que se hara la consulta al invias y a la interventoria quienes finalmente emitiran el concepto ante tal solicitud. posteriormente se cierra esta actividad con el registro fotografico de instalación.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | DE |

FECHA (Día) (Mes) (Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Permiso instalación de Botaguin y punto ecológico. | 2 meses Aproxi. | propietario |
| Retiro los elementos Botaguin y punto ecológico al final de obra. | 2 meses Aprox. | FNC. |

**OBSERVACIONES**
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** (Día) (Mes) (Año)

**NOTAS**
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoria suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] | |

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | |
|---|---|---|
| Federación Nacional de Cafeteros de Colombia | PROYECTO DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. | INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS |

## ACTA DE COMPROMISO

**Nombre del Propietario:** Geiner Jesus Moreno

**Dirección:** Vda la Esperanza **Fecha:** 08-01-2019

**Actividad Economica:** Agricultor

**Área requerida:** Espacio para instalación del ponto ecológico y Botiquin de primeros Auxilios

**Municipio:** Florencia (Cauca)

Contrato 0495 de 2018; Proyecto de "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DE LA OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017". TRAMO la Esperanza SECTOR _____ del Municipio de Florencia Cauca.

La presente acta de compromiso, tiene como objetivo solicitar el permiso para la ocupación de un área para la ejecución del contrato en mención; dicha área será utilizado de manera temporal por el contratista para desarrollar actividades constructivas, por ejemplo la instalacion de un campamento de Obra. En este caso instalación de ponto ecológico y botiquin de primeros Auxilios.
De acuerdo a lo anterior.

1. El contratista, se compromete a dejar el predio en iguales o mejores condiciones de las iniciales.
2. El contratista, ocupara el predio de manera temporal, una vez se ejecute la Obra, el mismo será retomado a su propietario.
3. Con relación al acuerdo entre las partes, el contratista deberá cancelar la suma pactada por el alquiler u ocupación del área específica del predio.
4. Los pagos por la ocupación del área serán cancelados de forma mensual.
5. La presente acta de compromiso, no implica que el propietario del predio este cediendo su propiedad de manera parcial o total a la federación Nacional de Cafeteros.
6. Observaciones adicionales del propietario o responsable del predio:

Se instala ponto ecológico y Botiquin de primeros auxilios

Se firma a los 08 días del mes de enero del año 2018.

Diana Rodriguez.
**Residente de Obra o Social**

Geiner Moreno
**Propietario del Predio y/o Vivienda**
**C.C.** 4709266.

Anexo. Cédula y acta de vecindad.

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|
| | VERSIÓN | 1 | | |
| | PÁGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA: 10 (Día) 01 (Mes) 19 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 495 DE 2018

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco de la OCAD paz en el departamento del Cauca de conformidad con el decreto ley 1534 del 15 de septiembre de 2017.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 921 DE 2018

INTERVENTOR: CODIPRO

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA O ENTIDAD |
|---|---|---|
| Maria Castillo | Propietaria | Comunidad Los Alpes |
| Antonio Muñoz | Hermano propietario | Comunidad |
| Angelica Garzon | Interventora Residente | CODIPRO |
| Jhotan Cardenas Quintero | Residente | OCAD PAZ - FNC |
| Diana Carolina Bedoya F. | Residente social | OCAD PAZ - FNC |

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Solicitud consentimiento para instalación de punto ecológico y Botiquin y camilla de primeros auxilios.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Saludo y presentacion de la actividad
2. Desarrollo de la reunion.
3. instalación de los elementos y registro fotografico.
4. Lectura y firma del acta.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se inicia la reunión en la cual participan los residentes de la vivienda la señora Maria Castillo, el señor Antonio Muñoz en representacion del propietario de la vivienda y el señor Miller muñoz.

Se les indica el objetivo que consiste en solicitar consentimiento tendiente en autorizacion para instalar el punto ecologico y el botiquin con la camilla de primeros auxilios teniendo en cuenta la cercania de la vivienda al sitio de obra.

los acuerdos no contemplan una mensualidad que el contratista debe asumir con el propietario, si no que corresponde a un acuerdo solidario entre ambas partes.

Se indica la manera de uso del punto indicando que residuos solidos van en cada una de las canecas: el azul corresponde al plastico reutilizable, la gris al papel a reciclar y la verde a los residuos ordinarios que no son reutilizables.

Se indica los elementos del botiquin y su uso haciendo enfasis en que los elementos entregados son de mucha utilidad.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-14-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 2 | DE | 2 |

FECHA: 10 (Día) 01 (Mes) 19 (Año)

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| - equipo FNC retirara el botalón, camilla y punto ecologico una vez culmine la obra | Febrero/2019 | FNC |
| - Propietario permite la instalación del botalón, camilla y punto ecologico durante el tiempo que demore la obra sin esperar costo alguno. | inicio 10/enero/19 Febrero/2019. | propietario |

**OBSERVACIONES**

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** ____/____/____ (Día) (Mes) (Año)

**NOTAS**

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | FIRMA |
|---|---|
| Maria Castillo | Maria Castillo Pino |
| Antonio Muñoz | Antonio Muñoz |
| Angelica Garzón | |
| Jhoan Cardenas Quintero | |
| Diana Carolina Bedoya. | Diana Bedoya |

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# INFORMES SEMANALES

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 6 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 17 del 29/11/2018 al 05/12/2018 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 767,6 M PLACA HUELLA Y 767,6 M DE CUNETAS 18,7 ML MURO

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.: 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

PLAZO INICIAL: 5 meses — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.026.230.311,00 | Para el Departamento del Cauca |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | |

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 115.679.457,00 Para los cuatro (4) Municipios

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: OCTUBRE


VALOR FACTURA: $ 39.849.881,00 FECHA FACTURA: 29/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| MURO | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |
| | | | |

TRAMO 1: CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

TRAMO 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACION

**PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.**

VIA MOJARRAS- EL BORDO (ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**

SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: VERSION 1 DOCUMENTO PAGA SIN CORREGIR

**OBSERVACIONES:**

**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORIA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | |

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: CEDE COMITÉ DE CAFETEROS CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES:**

* El contratista entrego actas de vecinda el dia 23 de noviembre del presente año con el radicado numero CDS18C00816
* El contratista reprogramo la visita para el dia 30 de Noviembre del 2018 , para verificar algunos puntos donde fuera necesario diligenciar nuevas actas de vecindad o permisos de intervención.
* Se instalaron el buzon en la vereda La Planada y el punto de atencion ciudadana en la cabecera municipal de Balboa en compañía de la residente social Claudia Macias representante de la Federacion Nacional de Cafeteros.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CODIGO | MINFRA-MI-IN-15-FR-3 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PAGINA | 1 DE 1 | |
| | | FECHA | 6 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año) | |


## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se realizo una visita de obra para el tramo CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL el 30 de Noviembre en compañia de los ingenieros Johan Cardenas y Oscar Ojeda residente de obra, representantes de la Federacion Nacional de Cafeteros. 2. Se instalaron el dia 3 de diciembre del 2018 los buzones y puntos de atencion ciudadana que fueron localizados en el casco urbano del Municipio de Balboa Cede Comite de Cafeteros y en la vereda La Planada en la tienda Lopez frente a la cancha deportiva.
3. Se radico el oficio CDP-171-2018 para cumplimiento de programacion de obra ya que a la fecha no se han realizado actividades de obra en el sector CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL .

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):**
1. Comite de seguimiento de contrato 0495 de obra el dia 11 de Diciembre del 2018 con participacion del director INVIAS territorial Cauca, supervisores y personal representantes de Federacion Nacional de Cafeteros.
2. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
3. Ejecución de actividades para inicio de obra, lo cual comprende, entre otros, la instalación de campamento de obra, adquisición y disposición en sitio de insumos, contratación de personal (maestro de obra y ayudantes).

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

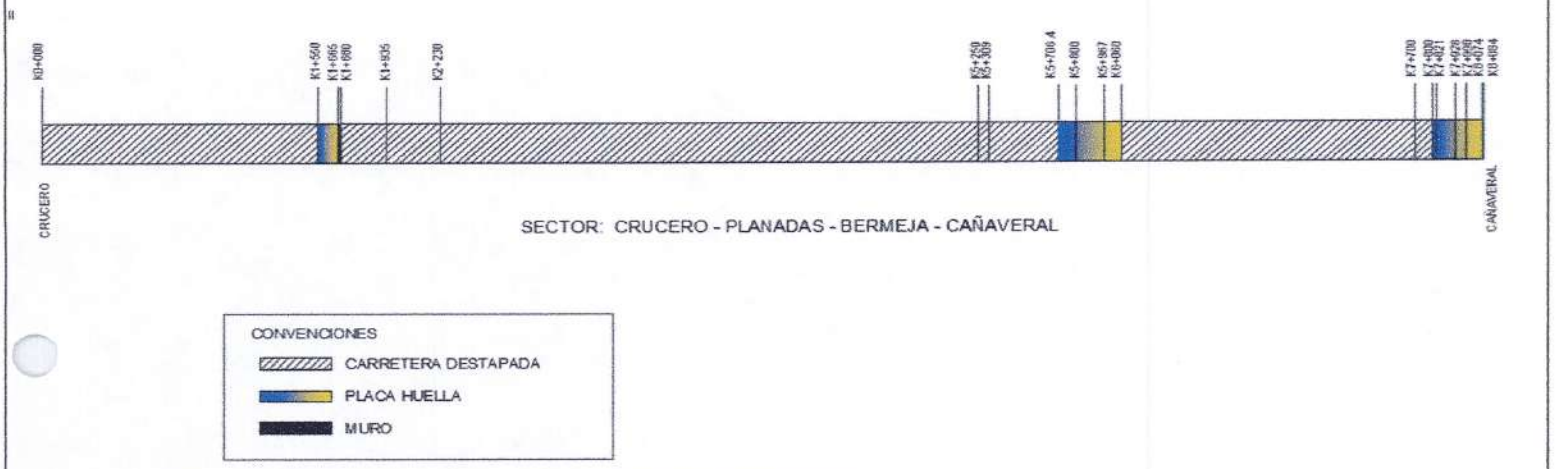


El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERA).**




Foto 1. INSTALACION DE BUZON EN LA VEREDA LA PLANADA




Foto 2. INSTALACION DE BUZON TIENDA LOPEZ VEREDA LA PLANADA




Foto 3. INSTALACION PUNTO DE ATENCION SEDE COMITÉ DE CAFETEROS BALBOA

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

| |
|---|
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS |
| IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA. |
| CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. |

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| CODIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PAGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 6 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 17 (Numeración consecutiva) del 29/11/2018 al 05/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 124,5 M PLACA HUELLA Y 124,5 M DE CUNETAS

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
INVERSIONES EJECUTADAS: — COMPLETAR
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: — COMPLETAR

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 115.679.457,00 — Para los cuatro (4) Municipios


| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.881,00 FECHA FACTURA: 28/11/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mescladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

TRAMO 1: CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA — TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION

PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A
VEREDA GUARRAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA)
UBICACION

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A | |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: EN REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
VERSION 1 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
VERSION 2 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS SEDE FLORENCIA-CAUCA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES**
* El contratista entrego actas de vecindad el dia 21 de noviembre del presente año con el radicado numero CDS18C00795
* El contratista entrego PMT el dia 23 de noviembre del presente año con el radicado numero CDS18C00808
* Pendiente gestion de la acta de vecindad del predio propiedad de la Sra. Otilia Grijalba.
* Interventoria solicito realizar actas de vecindad en las tres placas huellas existentes localizadas en el tramo Cuchilla del Hato-Betania , ya que estas estarian expuestas al transito de maquinaria pesada y transporte de materiales para la construccion de las obras.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


Se radico el oficio CDP-171-2018 para cumplimiento de programacion de obra ya que a la fecha no se han realizado actividades de obra en el sector Cruce Escuela Bella Vista- La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato- Betania.
El dia 5 de diciembre del 2018 el contratista realiza el transporte de 12 tubos de PVC de 36" hasta el casco urbano de Florencia. Sin embargo se le manifiesta que algunos de los tubos han sufrido daños en el momento de ser bajados por la maquinaria.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**ECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):**
. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.
**ECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):**
. Instalación de valla informativa en tramo inicial.
. Localización y replanteo de las obras de arte proyectadas, instalación de campamento, transporte de maquinaria y equipo pesado.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

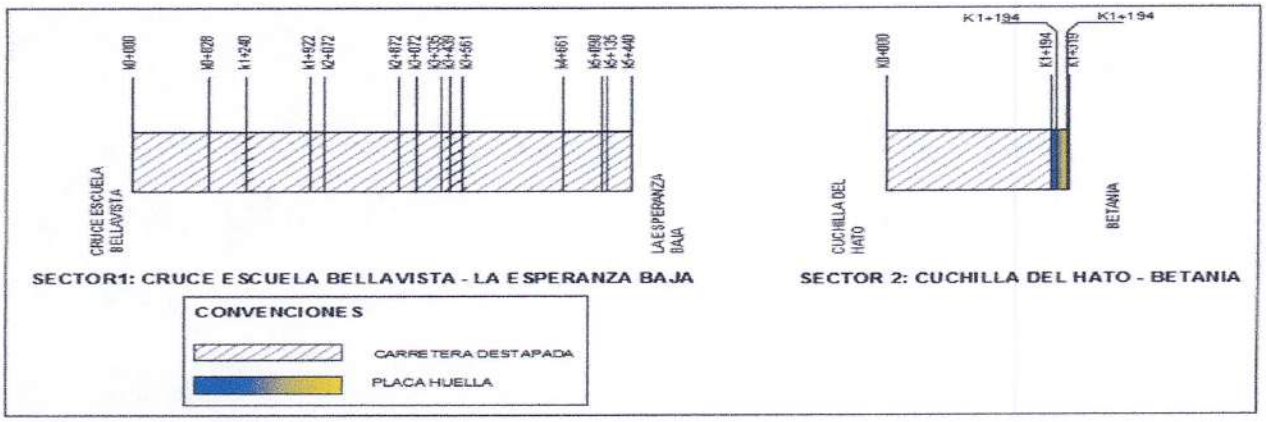


esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).



Foto 1. Fragmento de tubo PVC




Foto 2. Daño en campana de tubería de PVC

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL E CAFETEROS.

IPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL UMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

LABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN E LAS OBRAS.

FIRMA:

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | 2 |

FECHA: 5 (Día) / 12 (Mes) / 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA( SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 17 (Numeración consecutiva) del 29/11/2018 al 05/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**


EJECUTADO ACUMULADO: $ 115.679.457,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]
MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.881,00 FECHA FACTURA: 26/11/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | | ACUMULADO PROYECTO 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST | | 100% | 100% |
| TOPOGRAFIA | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLA | | | |
| SEÑALIZACIÓN | | | |
| TRANSPORTE | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TRAMO 1: ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA( SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)

TRAMO 2: ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN: PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: VIA MOJARRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA) — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

UBICACIÓN: _____ — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

ZONAS DE DEPOSITO: SI ____ NO ____ N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI ____ NO ____ N/A ____
CONCESION DE AGUAS: SI ____ NO ____ N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES: SI ____ NO ____ N/A ____
VERTIMIENTOS: SI ____ NO ____ N/A ____
EMISIONES: SI ____ NO ____ N/A ____
OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) SI ____ NO ____ N/A ____

**OBSERVACIONES:**
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: EN REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
**VERSION 2 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 |
|---|---|
| | |

TOTAL: 0

**OBSERVACIONES:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-IS-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | 2 |

| FECHA | 5 (Día) | 12 (Mes) | 2018 (Año) |
|---|---|---|---|

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Se hace la localización y replanteo de las obras.
2. Instalación del buzón en el municipio de Mercaderes y levantamiento de (2) Actas de Vecindad. Instalación del punto de servicio de atención ubicado en la cabecera municipal en la cooperativa del cauca agencia de compra de café.
3. El contratista no inicia la ejecución de obras civiles.
4. Se radicó el oficio CDP-171-2018 para solicitar el cumplimiento de la programacion de obra debido a que a la fecha el contratista no ha iniciado actividades constructivas ni en el Anillo vial de la Cordillera y ni en el Anillo vial la Curva.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


**SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería.

**SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería.


## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

II

ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA( SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)




ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)




CONVENCIONES

- CARRETERA DESTAPADA
- PLACA HUELLA
- BOX COUOLVERT

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Foto 1. INTALACION DE BUZON




Foto 2. INSTALACION DE BUZON DE SUEGERENCIAS




Foto 1. PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO




Foto 2. PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO EN LA AGENCIA DE COMPRA DE CAFÉ.

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA INICIE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2018, DEBIDO A QUE LA PRESENTE SEMANA NO HAY EJECUCIÓN Y PRESENTE LAS HOJAS DE VIDA PENDIENTES DEL PERSONAL PARA APROBACIÓN DE LA INTERVENTORIA.

| | |
|---|---|
| FIRMA | |
| NOMBRE | LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ |
| No. MAT. | 25202-28306 CND |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 6 (Día) / 12 (Mes) / 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 17 (Numeración consecutiva) del 29/11/2018 al 05/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

PLAZO INICIAL: 5 meses — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.026.230.311,00 | Para el Departamento del Cauca |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | | |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | |

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 115.679.457,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO: OCTUBRE

VALOR FACTURA: $ 39.849.891,00 FECHA FACTURA: 28/11/2018


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.




**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

TRAMO 1: EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA

TRAMO 2: LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACION

**PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.**

VIA MOJARRAS- EL BORDO

(DE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: VERSION 1 DOCUMENTO PAGA SIN CORREGIR

**OBSERVACIONES:**

*VERSION 1 DOCUMENTO PAGA* PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018

SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | |

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: OFICINA DE INSPECCION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA.

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES**:

* El contratista entrego documentos de soporte de actividades y gestion social el dia 23 de noviembre del presente año con el radicado numero CDS18C00817
* Se instala el Buzon y el punto de atencion al usuario en la Alcaldia municipal de Santa Rosa en compañia con la residente social Claudia Macias, representante de la Federacion Nacional de Cafeteros.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Instalación de Buzones y puntos de atención al usuario el dia 30 de Noviembre ademas de diligenciar los formatos de organización comunitaria.
2. Se radico el oficio CDP-171-2018 para cumplimiento de programacion de obra ya que a la fecha no se han realizado actividades de obra en los sectores:EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA y LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):**

1. Ejecución de actividades para inicio de obra, lo cual comprende, entre otros, la instalación de campamento de obra, adquisición y disposición en sitio de insumos, contratación de personal (maestro de obra y ayudantes).

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 ( EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).




Foto 1. PUNTO DE ATENCION AL CIUDADANO OFICINA DE INSPECCION DE POLICIA




Foto 2. INSTALACION DE BUZON

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | | MINFRA-MAN-IN-15-FR-7 | |
| VERSIÓN | | 1 | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 13 (Día) | 12 (Mes) | 2018 (Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 06/12/2018 al 12/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 767,6 M PLACA HUELLA Y 767,6 M DE CUNETAS 18,7 ML MURO

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 122.590.553,00 — Para los cuatro (4) Municipios


| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.861,00 FECHA FACTURA: 26/11/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| MURO | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |
| | | | |
| | | | |

TRAMO 1: CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL
TRAMO 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACIÓN
**PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.**
VIA MOJARRAS- EL BORDO
ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI X | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: CEDE COMITE DE CAFETEROS CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES:**
* El contratista reprogramó la visita del dia 30 de Noviembre del 2018 , para verificar algunos puntos donde fuera necesario diligenciar nuevas actas de vecindad o permisos de intervención.

1. el día 11 de diciembre del 2018 Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoria , para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José Adrián Valencia, director territorial, Luis Eduardo Ledezma, Uriel Páez en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoria la ingeniera Angélica Garzón, este último adquiere los siguientes compromisos: Suministrar materiales como granulares y tubería el día 14 de diciembre de 2018, inicio de obra el 17 de diciembre de 2018 y presentar hojas de vida del personal técnico el día 12 de diciembre de 2018.


## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):**
1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Transporte de tubería y materiales petreos hasta el 17 de diciembre del 2018 e inicio de las actividades de obra en el tramo Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO




SECTOR: CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el contratista de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERA).**




FOTO 1. COMITÉ TÉCNICO DESARROLLADO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018




FOTO 2.COMITÉ TÉCNICO DESARROLLADO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

FIRMA
NOMBRE: LUIS MIGUEL ORDUZ GOMEZ
No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| CÓDIGO | MINFRAMN-01-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 13 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 06/12/2018 al 12/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 124,5 M PLACA HUELLA Y 124,5 M DE CUNETAS

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | | | INTERVENTOR: | CODIPRO INGENIERIA LTDA | | |
| INTEGRANTES: | N/A | | | INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 495 de 2018 | VALOR INICIAL: | $ 13.026.230.310,94 | CONTRATO No. | 921 de 2018 | VALOR INICIAL: | $ 464.788.915,00 |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: | $ - | PLAZO INICIAL: | 5 meses | ADICIONES: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: | $ 13.026.230.310,94 | PLAZO ACUMULADO: | 5 meses | VALOR ACUMULADO: | $ 464.788.915,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.026.230.311,00 | Para el Departamento del Cauca |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | COMPLETAR |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | COMPLETAR |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 122.560.553,00 Para los cuatro (4) Municipios

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |


MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.881,00 FECHA FACTURA: 28/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mescladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarín) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACIÓN

PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A
VEREDA BARRAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA)
UBICACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PERMISO MINERO: | SI X | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI X | NO | |
| | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:**
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI X | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A | |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: EN REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
VERSION 1 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
VERSION 2 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | |

**OBSERVACIONES**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS SEDE FLORENCIA-CAUCA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 |
|---|---|
| | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES**
* Pendiente gestion de la acta de vecindad del predio propiedad de la Sra. Otilia Grijalba.
* Interventoria solicito realizar actas de vecindad en las tres placas huellas existentes localizadas en el tramo Cuchilla del Hato-Betania, ya que estas estarian expuestas al transito de maquinaria pesada y transporte de materiales para la construccion de las obras.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

. El dia 6 de diciembre del 2018 el contratista convoco a una reunion con presidentes de la junta, veeduria ciudadana, comunidad en general y funcionarios de la alcaldia municipal de Florencia con el objeto de establecer las actividades de trabajo durante la epoca de fin de año y los procesos de contratacion de ano de obra no calificada, ademas se instalo el buzon del proyecto en las instalaciones de la casa parroquial frente a la alcaldia municipal de Florencia.
. el dia 11 de diciembre del 2018 Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoria, para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José drián Valencia, director territorial, Luis Eduardo Ledezma, Uriel Páez en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoria la ingeniera Angélica Garzón, este último adquiere los siguientes compromisos:
uministrar materiales como granulares y tubería el dia 14 de diciembre de 2018, inicio de obra el 17 de diciembre de 2018 y presentar hojas de vida del personal técnico el dia 12 de diciembre de 2018
1 de Diciembre del 2018 se realizaron las actas de vecindad colectiva para las placas huellas existentes localizadas en el tramo Cruce del Hato- Betania en compañia con la residente social Luisa Castillo
.Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
3. El dia

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):**


1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Transporte de materiales petreos hasta el 17 de diciembre del 2018 e inicio de las actividades de obra en el tramo 1

**SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):**

1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Transporte de materiales petreos hasta el 17 de diciembre del 2018 e inicio de las actividades de obra en el tramo 2

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

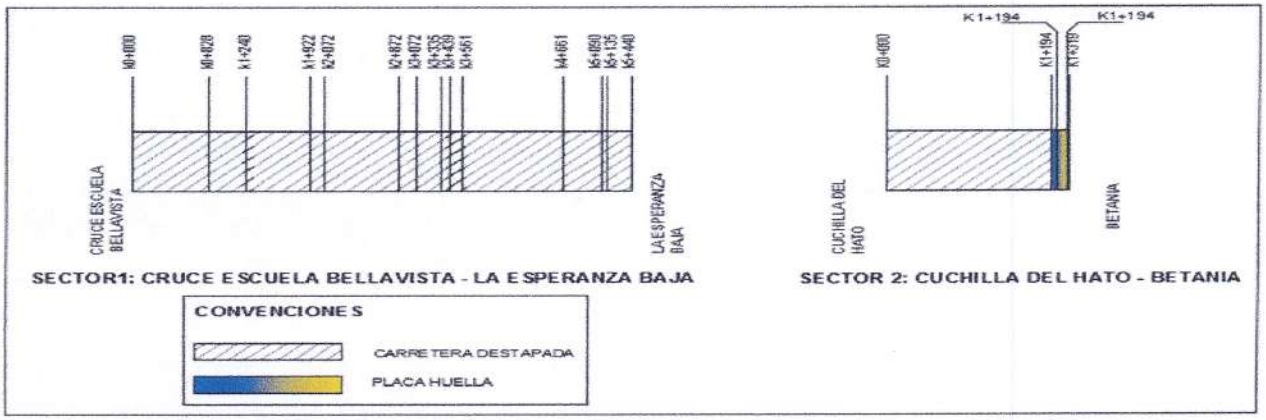


El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).**



**Foto 1. Reunion para inicio de actividades convocada por Federacion Nacional de Cafeteros**




**Foto 2. Instalacion del buzon en Casa parroquial**



**Foto 1. Reunion para inicio de actividades convocada por Federacion Nacional de Cafeteros**

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO | MINFRA-MN-PI-15-FR-2 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PAGINA | | DE | 2 |

FECHA: 13 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA( SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 06/12/2018 al 12/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | | | INTERVENTOR: | CODIPRO INGENIERIA LTDA | | |
| INTEGRANTES: | N/A | | | INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 495 de 2018 | VALOR INICIAL: | $ 13.026.230.310,94 | CONTRATO No. | 921 de 2018 | VALOR INICIAL: | $ 464.788.915,00 |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: | $ - | PLAZO INICIAL: | 5 meses | ADICIONES: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: | $ 13.026.230.310,94 | PLAZO ACUMULADO: | 5 meses | VALOR ACUMULADO: | $ 464.788.915,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.026.230.311,00 | Para el Departamento del Cauca |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | |

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 122.590.553,00 Para los cuatro (4) Municipios

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |


MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.849.981,00 FECHA FACTURA: 28/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST | 100% | 100% | 100% |
| TOPOGRAFIA | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLA | | | |
| SEÑALIZACIÓN | | | |
| TRANSPORTE | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TRAMO 1: ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)

TRAMO 2: ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION

**PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A**
VEREDA GUARRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA)
UBICACION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |
| | PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: EN REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
VERSION 1 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .
VERSION 2 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 6 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | |

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | 2 |

| FECHA | 13 (Día) | 12 (Mes) | 2018 (Año) |
|---|---|---|---|

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Gestión Social y recopilación de documentación: Certificado de sana posesión de los predios aledaños a las obras a construir, resolución de conformación del comité veedor, registro fotográfico y video de la placa huella existenen el San Joaquin, radicación del cierre de vía temporal en la Secretaria de Salud de Popayán y en el municipio de Mercaderes.

2. El contratista no inicia la ejecución de obras civiles.


El día 11 de diciembre del 2018 Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoria , para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José Adrian Valencia, director territorial, Luis Eduardo Ledezma, Uriel Páez en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoria la ingeniera Angélica Garzón, este último adquiere los siguientes compromisos: Suministrar materiales como granulares y tubería el día 14 de diciembre de 2018, inicio de obra el 17 de diciembre de 2018 y presentar hojas de vida del personal técnico el dia 12 de diciembre de 2018.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería.

**SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

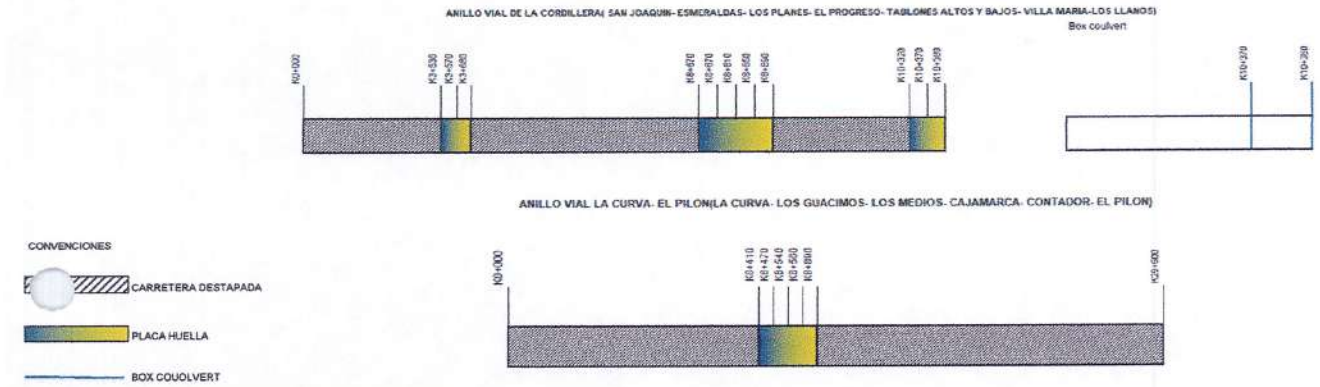


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto 1. Reunión comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoría.**




**Foto 1. Reunion comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoría.**

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

SE ESTA A LA ESPERA QUE EL CONTRATISTA INICIE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES EL 17 DE DICIEMBRE DE 2018 Y CUMPLA CON TODOS LOS DEMÁS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON LA ENTIDAD CONTRATANTE E INTERVENTORÍA EN COMITÉ TÉCNICO DESARROLLADO EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2018.

| | |
|---|---|
| FIRMA | |
| NOMBRE | LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ |
| No. MAT | 25202-28306 CND |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CODIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 |
| VERSIÓN | 1 |
| PAGINA | 1 DE 2 |

FECHA: 13 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 18 (Numeración consecutiva) del 06/12/2018 al 12/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
INVERSIÓN EJECUTADA:

Para el Departamento del Cauca

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 122.590.553,00

Para los cuatro (4) Municipios

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |


MES FACTURADO: OCTUBRE
VALOR FACTURA: $ 39.649.691,00 FECHA FACTURA: 28/11/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

TRAMO 1: EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA

TRAMO 2: LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION

**PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.**
VIA MOJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL., POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: VERSION 1 DOCUMENTO PAGA SIN CORREGIR

**OBSERVACIONES:**
**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | TOTAL: 0 |
|---|---|---|
| | | |


**OBSERVACIONES:**

1. El 10 de diciembre se hizo repcecion del acero para la obra.

2. El día 11 de diciembre del 2018 Se desarrolló el comité de seguimiento contrato 495-2018, convocando a los representantes legales y directores de contratista e interventoria , para tratar temas relacionados con la fecha de inicio de las actividades de obra, contando con la asistencia de los ingenieros José Adrián Valencia, director territorial, Luis Eduardo Ledezma, Uriel Páez en representación de Invias, Fernando Chacón director de obra designado por Federación Nacional de Cafeteros y en representación de la interventoria la ingeniera Angélica Garzón, este último adquiere los siguientes compromisos: Suministrar materiales como granulares y tubería el día 14 de diciembre de 2018, inicio de obra el 17 de diciembre de 2018 y presentar hojas de vida del personal técnico el día 12 de diciembre de 2018.

**TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):**
1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Transporte de tubería y materiales petreos hasta el 17 de diciembre del 2018 e inicio de las actividades de obra en el tramo El Cruce de la Virgen- Tarabita y La cabecera -La Agencia.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

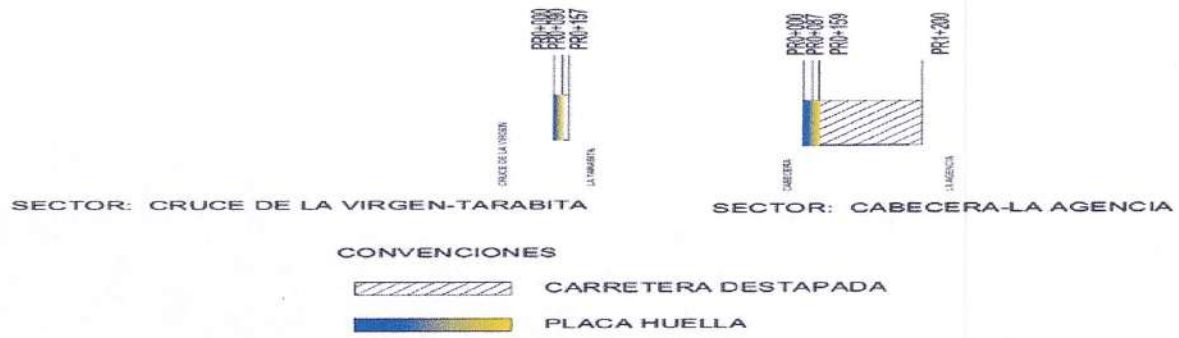


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 ( EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).




Foto 1. REPCECION DE ACERO




Foto 2.COMITÉ TECNICO DESAROLLADO EL DIA 11 DE DICIEMBRE.

| DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA |
|---|
| IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA. |
| ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS |
| CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. |
| |
| |

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MM-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA: 20 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/12/2018 al 19/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 767,6 M PLACA HUELLA Y 767,8 M DE CUNETAS 19,7 ML MURO

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 129.501.646,00 — Para los cuatro (4) Municipios


| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

MES FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 42.965.394,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| MURO | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mescladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |
| | | | |
| | | | |

TRAMO 1: CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL
TRAMO 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION
**PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.**
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
VIA MOJARRAS- EL BORDO
ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI X | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: VERSION 1 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: CEDE COMITÉ DE CAFETEROS CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | TOTAL: 0 |
|---|---|---|
| | | |

**OBSERVACIONES:**
Se solicita al contratista presentar la documentacion relacionada con la mano de obra contratada a la fecha.
Se solicita al contratista instalar la señalizacion preventiva a lo largo de los dos tramos para prevenir la accidentabilidad de la zona.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Transporte de 10 tubos de PVC de 36" al campamento localizado en la vereda La Planada en el tramo Crucero-Planadas-Bermeja-Cañaveral, el 17 de diciembre del 2018.
2. Transporte de 400 bit de cemento al campamento localizado en la vereda La Planada, el dia 17 de diciembre del 2018.
3. Transporte de señalización preventiva al campamento localizado en la vereda La Planada.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):**

1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Excavaciones varias en material comun en seco (incluye retiro) para alcantarillas.
3. Fundicion de concreto resistencia 14 mpa (f) para solados en alcantarillas.
4. Instalacion de tuberia de plastico d:900 mm.
5. Rellenos para estructuras de alcaltarilla con suelo.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO




SECTOR: CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL

CONVENCIONES
- CARRETERA DESTAPADA
- PLACA HUELLA
- MURO

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL).**



Foto 1. ALMACENAMIENTO DE CEMENTO EN LA VEREDA LA PLANADA

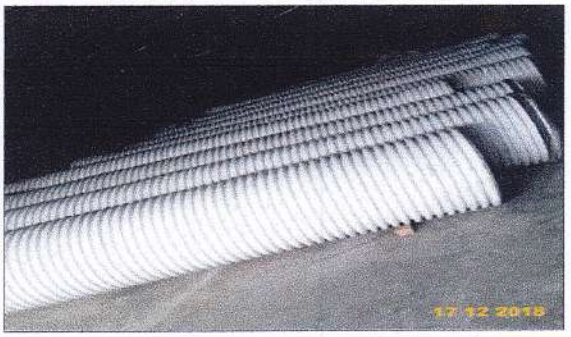



Foto 2. ALMACENAMIENTO TUBERIA PVC DIAM 900 MM




Foto 3. SEÑALIZACION PREVENTIVA PARA EL TRAMO

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

FIRMA
NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO | MINFRAMAN-15-FR-3 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 20 (Día) / 12 (Mes) / 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/12/2018 al 19/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 124,5 M PLACA HUELLA Y 124,5 M DE CUNETAS

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 495 de 2018 | PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018

VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 921 de 2018 | PLAZO INICIAL: 5 meses | PLAZO ACUMULADO: 5 meses

VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
ADICIONES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

### OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
INVERSIONES EJECUTADAS: — COMPLETAR
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: — COMPLETAR

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [ ] NO [X]

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

### INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 129.501.648,00 — Para los cuatro (4) Municipios

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI [X] NO [ ]


MES FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 42.985.394,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | 100% | 100% | 100% |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

TRAMO 1: CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA

TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mescladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 62, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACIÓN

**PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL A S.A**
JARRAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA)
CION

PERMISO MINERO: SI [X] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [X] NO [ ]

PERMISO MINERO: SI [ ] NO [ ]
LICENCIA AMBIENTAL: SI [ ] NO [ ]

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI [X] | NO [ ] | N/A [ ] |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI [ ] | NO [ ] | N/A [ ] |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI [ ] | NO [ ] | N/A [ ] |
| CONCESION DE AGUAS: | SI [ ] | NO [ ] | N/A [ ] |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI [ ] | NO [ ] | N/A [ ] |
| VERTIMIENTOS: | SI [ ] | NO [ ] | N/A [ ] |
| EMISIONES: | SI [ ] | NO [ ] | N/A [ ] |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI [ ] | NO [ ] | N/A [ ] |

**OBSERVACIONES:**
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: EN REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
VERSION 1 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .
VERSION 2 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS SEDE FLORENCIA-CAUCA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES**
**Se solicita al contratista presentar la documentacion relacionada con la mano de obra contratada a la fecha.**
**Se solicita al contratista instalar la señalizacion preventiva a lo largo de los dos tramos para prevenir la accidentabilidad de la zona.**

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

. Transporte de cemento y acero al lugar de almacenamiento.
. Se realizan actividades de corte y fijado de acero para los dos tramos de Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato-Betania.
. Localizacion y replaneo de las obras para los dos tramos.
. No se ha dado inicio a las actividades de excavacion para las alcantarillas ya que el contratista manifiesta que la maquinaria presento para la fecha daños.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):**


1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Excavaciones varias en material comun en seco (incluye retiro) para alcantarillas.
3. Fundicion de concreto resistencia 14 mpa (f) para solados en alcantarillas.
4. Instalacion de tubería de plastico d:900 mm.
5. Rellenos para estructuras de alcaltarilla con suelo.

**SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):**

1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Excavaciones varias en material comun en seco (incluye retiro) para alcantarillas.
3. Fundicion de concreto resistencia 14 mpa (f) para solados en alcantarillas.
4. Instalacion de tubería de plastico d:900 mm.
5. Rellenos para estructuras de alcaltarilla con suelo.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

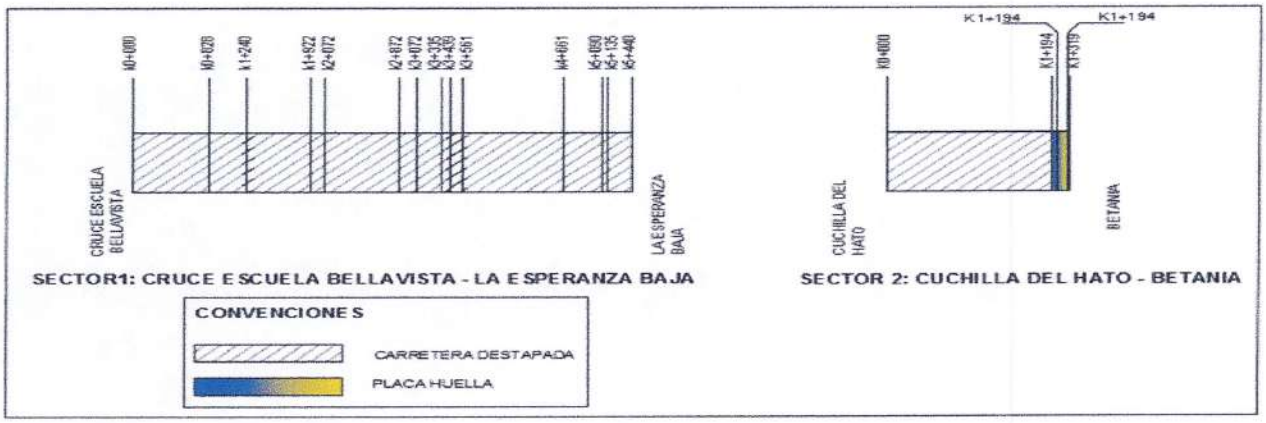


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).**



**Foto 1. ALMACENAMIENTO DE CEMENTO 50 KG**



**Foto 2. ALMACENAMIENTO ACERO**




**Foto 3. CORTE Y FLEJADO DE ACERO EN CAMPAMENTO**

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-15-FR-2 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 2 |

FECHA: 19 (Día) / 12 (Mes) / 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA( SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/12/2018 al 19/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT

| CONTRATO DE OBRA: | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | | INTERVENTOR: | CODIPRO INGENIERIA LTDA | |
| INTEGRANTES: | N/A | | INTEGRANTES: | N/A | |
| CONTRATO No. | 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94 | CONTRATO No. | 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00 |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ - | PLAZO INICIAL: | 5 meses | ADICIONES: $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94 | PLAZO ACUMULADO: | 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.026.230.311,00 | Para el Departamento del Cauca |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 129.501.646,00 Para los cuatro (4) Municipios

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | X | |


MES FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 42.986.384,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| REVIS, AJUST Y ACTLZAC ESTUD EXIST | 100% | 100% | 100% |
| TOPOGRAFIA | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLA | | | |
| SEÑALIZACIÓN | | | |
| TRANSPORTE | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TRAMO 1: ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)

TRAMO 2: ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION

**PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A**
UBICACION: VEREDA GUARRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |
| PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: EN REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

OBSERVACIONES:
VERSION 1 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .
VERSION 2 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | |

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES:**

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

. El contratista no inicia la ejecución de obras civiles, solo suministro de materiales como cemento y tubería de 900 mm.


. Reunión con la comunidad, personal de la alcaldía de Mercaderes, contratista e interventoría.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería.

**SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

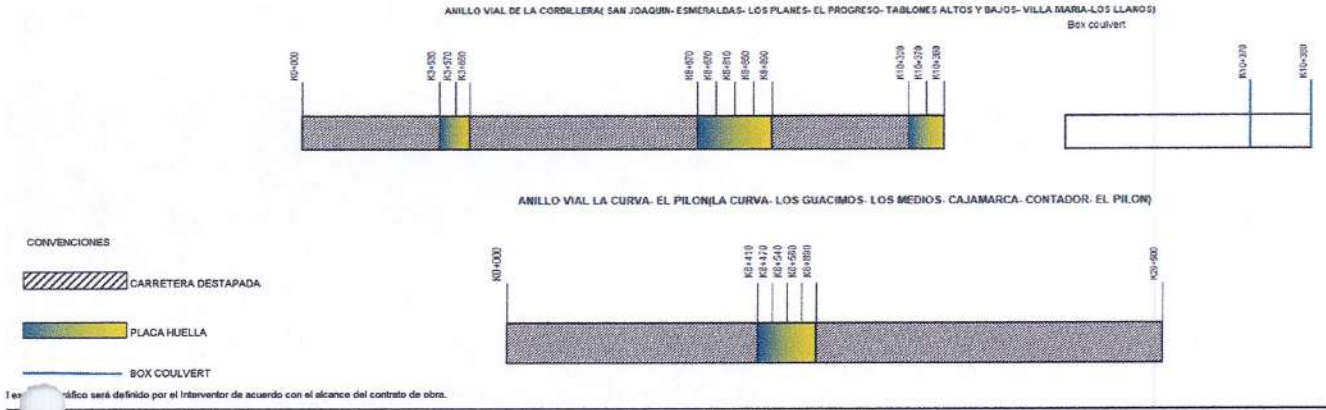


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto 1. Reunión con la comunidad el día 13 de diciembre de 2018.**




**Foto 2. Reunión con la comunidad el día 13 de diciembre de 2018.**



**Foto 3. Suministro de tubería de 900 mm.**




**Foto 4. Suministro de tubería de 900 mm.**




**Foto 5. Almacenamiento de cemento.**

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.
EL CONTRATISTA CUMPLE PARCIALMENTE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN COMITÉ TÉCNICO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2018, SE HACE NECESARIO REQUERIR AL CONTRATISTA PARA DAR INICIO A LAS OBRAS CONTRACTUALES.

FIRMA
NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 2 |
| FECHA | 20 (Día) | 12 (Mes) | 2018 (Año) |

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 19 (Numeración consecutiva) del 13/12/2018 al 19/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: 4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 495 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 — VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No. 921 de 2018 — VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses — VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BASICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

Para el Departamento del Cauca

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 129.501.646,00 — Para los cuatro (4) Municipios

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |


MES FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 42.995.394,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | | | |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

TRAMO 1: EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA — TRAMO 2: LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION

PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A
VIA MOJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATÍA - (CAUCA))

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: VERSION 1 DOCUMENTO PAGA SIN CORREGIR

**OBSERVACIONES:**
**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES:**
Se solicita al contratista presentar la documentacion relacionada con la mano de obra contratada a la fecha.
Se solicita al contratista instalar la señalizacion preventiva a lo largo de los dos tramos para prevenir la accidentabilidad de la zona.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Transporte de 800 bits de cemento de 50 kg en el deposito de almacenamiento de la obra localizado en la cabecera municipal.
2. Transporte de señalizacion y elementos basicos para la prevencion de riesgos.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):**

1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Excavaciones varias en material comun en seco (incluye retiro) para alcantarillas.
3. Fundicion de concreto resistencia 14 mpa (f) para solados en alcantarillas.
4. Instalacion de tuberia de plastico d:900 mm.
5. Rellenos para estructuras de alcaltarilla con suelo.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 ( EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).




Foto 1. ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO




Foto 2. ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO EN EL CAMPAMENTO LOCALIZADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTAROSA




Foto 3. SEÑALIZACION VERTICAL

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO | MINFRA-MN-01.15-FR-0 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE BALBOA TRAMO CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 20 (Numeración consecutiva) del 20/12/2018 al 26/12/2018

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 767,8 M PLACA HUELLA Y 767,6 M DE CUNETAS 18,7 ML MURO

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 136.414.741,00 — Para los cuatro (4) Municipios


| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

MES FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 42.985.394,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FÍSICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | 50% | | 50% |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| MURO | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | 1 | | |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarín) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |
| | | | |
| | | | |

TRAMO 1: CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL
TRAMO 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION
PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.
VIA MOJARRAS- EL BORDO
ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI X | NO | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | NO | N/A |

**OBSERVACIONES:**
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: VERSION 1 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**
**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
OTROS: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: CEDE COMITÉ DE CAFETEROS CABECERA MUNICIPAL DE BALBOA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 |
|---|---|
| | |

TOTAL: 0

**OBSERVACIONES:**
Se solicita al contratista presentar la documentación relacionada con la mano de obra contratada a la fecha.
Se solicita al contratista instalar la señalizacion preventiva a lo largo de los dos tramos para prevenir la accidentabilidad de la zona.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | 27 (Día) | 12 (Mes) | 2018 (Año) |

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Corte y fijado de hierro en el campamento de La Planada.
2. Localización y replanteo de los tramos de placa huella.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL):**
correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
Excavaciones varias en material común en seco (incluye retiro) para alcantarillas.
3. Instalación de tubería de plástico d:900 mm.
4. Rellenos para estructuras de alcaltarilla con suelo.

1. Implementar las acciones
2.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO




SECTOR: CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL

CONVENCIONES
- CARRETERA DESTAPADA
- PLACA HUELLA
- MURO

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. Se actualizará con base a los estudios y diseños definitivos, presentados por el Contratista de Obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO SECTOR 1 (CRUCERO-PLANADAS-BERMEJA-CAÑAVERAL).**



FOTO 1. ADECUACION TERRENO PARA MATERIAL DE DESALOJO



FOTO 2. TRANSPORTE TUBERIA PARA ALCANTARILLA NO.1

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

FIRMA
NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ
No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CODIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
| VERSIÓN | 1 | | |
| PAGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE FLORENCIA (VIA CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA Y VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA)

UNIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 20 del 20/12/2018 al 26/12/2018
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 14 OBRAS DE ARTE, 124,5 M PLACA HUELLA Y 124,5 M DE CUNETAS

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORÍA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA | | | INTERVENTOR: | CODIPRO INGENIERIA LTDA | | |
| INTEGRANTES: | N/A | | | INTEGRANTES: | N/A | | |
| CONTRATO No. | 495 de 2018 | VALOR INICIAL: | $ 13.026.230.310,94 | CONTRATO No. | 921 de 2018 | VALOR INICIAL: | $ 464.788.915,00 |
| PLAZO INICIAL: | HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: | $ - | PLAZO INICIAL: | 5 meses | ADICIONES: | $ - |
| PLAZO ACUMULADO: | HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: | $ 13.026.230.310,94 | PLAZO ACUMULADO: | 5 meses | VALOR ACUMULADO: | $ 464.788.915,00 |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 13.026.230.311,00 | Para el Departamento del Cauca |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ - | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ - | |
| AVANCE DE OBRA EN % (B/A): | | |
| INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | | |

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORIA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 136.414.741,00 Para los cuatro (4) Municipios

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |

MES FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 42.895.394,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | 100% | 100% | 100% |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | 3,25% | 3,24% | 6,48% |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.




**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | 1 | | 1 |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | 1 | | 1 |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 18 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

TRAMO 1: CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA

TRAMO 2: VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACION

[illegible] DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL C[illegible] S.A
VIA MOJARRAS- EL BORDO (MERCADERES-CAUCA)

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | X | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO |

UBICACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | | NO |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: EN REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

**OBSERVACIONES:**

VERSION 1 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA.
VERSION 2 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

| | |
|---|---|
| TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: | N/A |
| FICHAS PREDIALES APROBADAS: | N/A |
| ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS | N/A |
| AVALÚOS APROBADOS: | N/A |
| PREDIOS ADQUIRIDOS: | |

**OBSERVACIONES**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS SEDE FLORENCIA-CAUCA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES**

Se solicita al contratista presentar la documentacion relacionada con la mano de obra contratada a la fecha.
Se solicita al contratista instalar la señalizacion preventiva a lo largo de los dos tramos para prevenir la accidentabilidad de la zona.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Transporte de material mixto al tramo Cuchilla del Hato-Betania y Cruce Escuela de la Virgen -La Esperanza Baja.
2. Se realizan actividades de corte y fijado de acero para los dos tramos de Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato-Betania.
3. Se solicita al contratista realizar ensayos para garantizar la calidad del material de relleno y que cumpla las especificaciones de la entidad contratante.
4. En el tramo Cuchilla del Hato-Betania: excavación, instalación de tubería de 36", relleno y compactación de las alcantarillas No.1 y No.2 localizadas en el K1+235 y K1+303 de la placa huella.
5. En el tramo Cruce Escuela Bella Vista-La Esperanza Baja: excavación, instalación de tubería de 36", relleno y compactación de las alcantarillas No.12. No.11 y No.8 localizadas en el K5+135 y K5+090 y K3+439.


## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA):**
1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Excavaciones varias en material comun en seco (incluye retiro) para alcantarillas.
4. Instalacion de tuberia de plastico d:900 mm.
5. Rellenos para estructuras de alcaltarilla con suelo.

**SECTOR 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA):**
1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor atraso posible de la obra.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

Sector No.1 y No.2

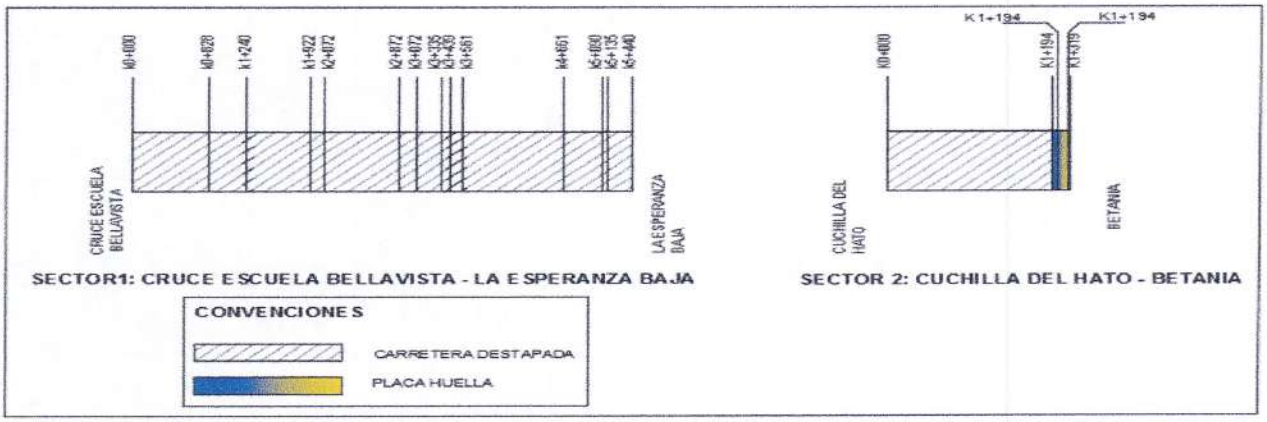


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO DEL SECTOR 1 (CRUCE ESCUELA BELLA VISTA - LA ESPERANZA BAJA) Y 2 (VIA CUCHILLA DEL HATO - BETANIA).**




**Foto 1. EXCAVACION EN ALCANTARILLA NO. 2 LOCALIZADA EN TRAMO 2 K1+303.**




**Foto 2. EXCAVACION EN ALCANTARILLA NO.1, LOCALIZADA EN TRAMO 2 K1+235.**




**Foto 3. EXCAVACION EN ALCANTARILLA NO.1, LOCALIZADA EN TRAMO 2 K1+235.**

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA SOLICITUD ANTE INVIAS DE MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

FIRMA

HOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
**INFORME SEMANAL**

| CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 3 |

FECHA: 26 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

TRAMO Y/O SECTOR(S): MUNICIPIO DE MERCADERES ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA( SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS) Y ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON(LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

NIDAD EJECUTORA: RED TERCIARIA Y FERREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 20 (Numeración consecutiva) del 20/12/2018 al 26/12/2018

UPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ

BJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"

FECHA DE INICIO: 09-ago-18

M A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: 8 OBRAS DE ARTE, 580,2 M PLACA HUELLA Y 580 M DE CUNETAS 2 BOX COULVERT

**CONTRATO DE OBRA:**

ONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NTEGRANTES: N/A
ONTRATO No.: 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94
LAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -
LAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA LTDA
INTEGRANTES: N/A
CONTRATO No.: 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00
PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**ISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
A[illegible]E DE OBRA EN % (B/A):
[illegible]NVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

MES FACTURADO: N/A
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 136.414.741,00 — Para los cuatro (4) Municipios

| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | X | |


MES FACTURADO: NOVIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 42.985.394,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | 100% | 100% | 100% |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLA | 1,48 | | |
| SEÑALIZACIÓN | | | |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN VIAL | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de llantas 120 HP | 1 | | 1 |
| Compactador manual | 1 | | 1 |

TRAMO 1: ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS)

TRAMO 2: ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON)

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**
UBICACION

**PLANTA DE AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A**
V[illegible]ARRAS- EL BORDO (MERCADERES-PATIA)
U[illegible]ON

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PERMISO MINERO: | SI | X | NO | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | X | NO | |
| PERMISO MINERO: | SI | | NO | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | |

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | X | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL DE LA FUENTE DE MATERIAL.

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: REVISION VERSION 2 DOCUMENTO PAGA

OBSERVACIONES:
VERSION 1 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE. PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .
VERSION 2 DOCUMENTO PAGA PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DIA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018 PARA REVISION.

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A
AVALÚOS APROBADOS: N/A
PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

OTAL EMPLEOS GENERADOS: 5
MPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 3
MPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2
TROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | TOTAL: 0 |
|---|---|---|
| | | |

**OBSERVACIONES:**

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA


El contratista avanza en la excavación, instalación de material para atraque, tubería de 900 mm y relleno en el anillo vial la cordillera K8+850 y K8+890.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**SECTOR 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUIN- ESMERALDAS- LOS PLANES- EL PROGRESO- TABLONES ALTOS Y BAJOS- VILLA MARIA-LOS LLANOS):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería de 900 mm.

**SECTOR 2 ANILLO VIAL LA CURVA- EL PILON (LA CURVA- LOS GUACIMOS- LOS MEDIOS- CAJAMARCA- CONTADOR- EL PILON):** 1. Instalación de valla informativa.
2. Excavaciones e instalación de tubería de 900 mm.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

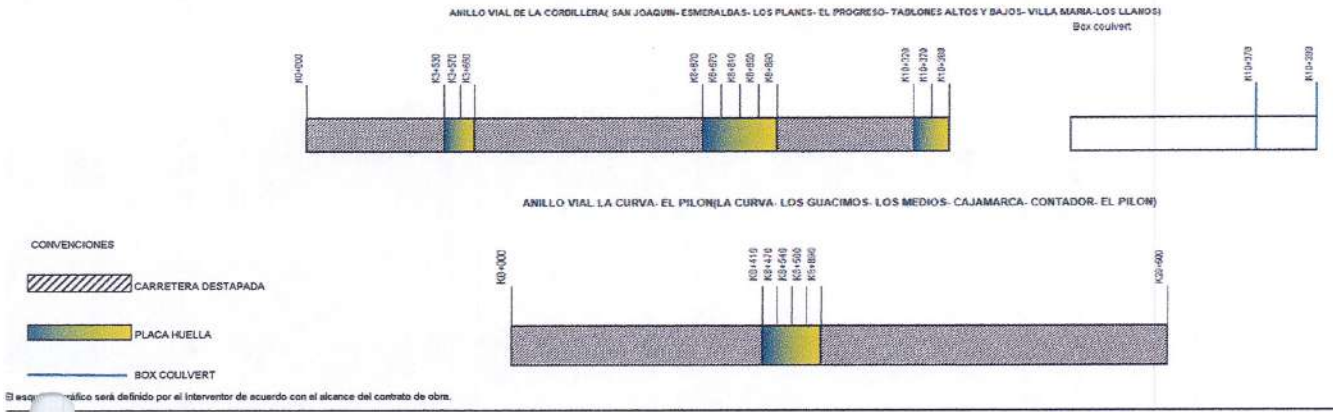


El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto 1. Recorrido con la comunidad.**




**Foto 2. Recorrido con la comunidad.**



**Foto 3. Instalación de tubería de 900 mm.**



**Foto 4. Instalación de tubería de 900 mm.**



**Foto 5. Instalación de material de atraque.**



**Foto 5. Señalización de las obras.**

## XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO A LA FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

EL CONTRATISTA DEBE IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS PARA AVANZAR EN LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME SEMANAL** | CODIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-2 | |
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | 1 DE 2 | |

FECHA: 27 (Día) 12 (Mes) 2018 (Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETER: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

TRAMO Y/O SECTOR(S): **MUNICIPIO DE SANTA ROSA (CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA, CABECERA MUNICIPAL - LA AGENCIA)**

UNIDAD EJECUTORA: **RED TERCIARIA Y FERREA**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAUCA**

SEMANA No.: **20** (Numeración consecutiva) del **29/12/2018** al **26/12/2018**

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **Ing. LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS**

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: **Ing. ISOLIER ANDRES EGUIS BENITEZ**

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017"**

FECHA DE INICIO: **09-ago-18**

KM A MEJORAR: | KM A REHABILITAR: | KM A CONSTRUIR: | No. PUENTES: | OTROS: **4 OBRAS DE ARTE, 249 M PLACA HUELLA Y 249 M DE CUNETAS**

**CONTRATO DE OBRA:**

CONTRATISTA: **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No: 495 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 13.026.230.310,94

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DIC 2018 | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31 DIC 2018 | VALOR ACUMULADO: $ 13.026.230.310,94

**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**

INTERVENTOR: **CODIPRO INGENIERIA LTDA**

INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 921 de 2018 | VALOR INICIAL: $ 464.788.915,00

PLAZO INICIAL: 5 meses | ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 5 meses | VALOR ACUMULADO: $ 464.788.915,00

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| VIGENCIA | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS POR VIGENCIA | $ - | $ 13.026.230.310 | $ - | $ - |
| EJECUTADO | $ - | $ - | $ - | $ - |

(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 13.026.230.311,00 — Para el Departamento del Cauca

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | | X |

MES FACTURADO: N/A

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA: N/A

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

**INTERVENTORÍA**

EJECUTADO ACUMULADO: $ 138.414.741,00 — Para los cuatro (4) Municipios

| | SI | NO |
|---|---|---|
| PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: | X | |

MES FACTURADO: NOVIEMBRE


VALOR FACTURA: $ 42.999.394,00 FECHA FACTURA: 14/12/2018

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIN FINACION: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

## III. AVANCE FISICO

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | ACUMULADO PROYECTO 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | 100% | 100% | 100% |
| INVENTARIO Y CARACTERIZACION | | | |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO | 100% | 100% | 100% |
| PLACA HUELLA | | | |
| CUNETAS | | | |
| ALCANTARILLAS | | | |
| GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL | | | |




Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

**MAQUINARIA Y EQUIPOS**

| TRAMO Y/O SECTOR(S): | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Retroexcavadora de 120 HP de llantas | | | |
| Mezcladoras de concreto de un saco. | | | |
| Compactador manual (saltarin) Peso de operación (Kg.) 52, Fuerza de imp por golpe (KN) 12. | | | |
| Motoniveladora potencia 215 HP, ancho de cuchilla 4,27 m, peso 16 ton. | | | |
| Vibrocompatador, potencia 153 HP, peso 10 Ton. | | | |
| Vibrador de concreto, Motor de 3 hp a 18.000 rpm | | | |

TRAMO 1: **EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA** TRAMO 2: **LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA**

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

UBICACIÓN

**PLANTA AGREGADOS Y TRITURADOS DEL CAUCA S.A.**
VIA MOJARRAS- EL BORDO
(ENTRE LOS MUNICIPIO DE MERCADERES Y PATIA - (CAUCA))

PERMISO MINERO: SI X NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

PERMISO MINERO: SI NO

LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

**OBSERVACIONES:**
SE RECIBE EL PERMISO MINERO Y LA LICENCIA AMBIENTAL, POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018.

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESION DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (LEVANTAMIENTO DE VEDA) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: VERSION 1 DOCUMENTO PAGA SIN CORREGIR

**OBSERVACIONES:**
**VERSION 1 DOCUMENTO PAGA** PRESENTADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA EL DÍA 23 DE OCTUBRE DE 2018
SE EMITEN OBSERVACIONES POR PARTE DE INTERVENTORÍA EL DÍA 26 DE OCTUBRE, PENDIENTE ENTREGA DE DOCUMENTO CORREGIDO POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA .

## V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS EN EL PROYECTO: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

ESTUDIOS JURIDICOS APROBADOS N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:

OTROS: 0

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OFICINA DE INSPECCION DE POLICIA

| CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 1 | CIERRE DE ACTAS VECINDAD SECTOR 2 | |
|---|---|---|
| | | TOTAL: 0 |

**OBSERVACIONES:**
Se solicita al contratista presentar la documentacion relacionada con la mano de obra contratada a la fecha.
Se solicita al contratista instalar la señalizacion preventiva a lo largo de los dos tramos para prevenir la accidentabilidad de la zona.

## VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

1. Corte y flejado de hierro en el campamento de la cabecera municipal.
2. Localizacion y replanteo de los tramos de placa huella localizados en el Cruce de la Virgen-Tarabita y Cabecera-La agencia.

## VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

**TRAMO No. 1 (EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) y TRAMO No. 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA):**

1. Implementar las acciones correctivas que se requieran para promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible de la obra.
2. Excavaciones varias en material comun en seco (incluye retiro) para alcantarillas.
3. Instalacion de tuberia de plastico d:900 mm.
4. Rellenos para estructuras de alcaltarilla con suelo.

## IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO




El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

## X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**SE ANEXA REGISTRO FOTOGRAFICO PARA TRAMO 1 ( EL CRUCE DE LA VIRGEN- LA TARABITA) Y TRAMO 2 (LA CABECERA MUNICIPAL-LA AGENCIA).**




FOTO 1. CORTE Y FLEJADO DE HIERRO EN CAMPAMENTO




FOTO 2. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LA PLACA HUELLA UBICADA EN EL SECTOR CABECERA-LA AGENCIA



FOTO 3. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LA PLACA HUELLA UBICADA EN EL SECTOR CRUCE DE LA VIRGEN-TARABITA




FOTO 4. SEÑALIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL




FOTO 5. SEÑALIZACION EN LA CABECERA MUNICIPAL.

**XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS QUE SE REQUIERAN PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA.

CONTINUAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO Y AL TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL EQUIPO DE FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS.

FIRMA

NOMBRE: LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ

No. MAT: 25202-28306 CND

# 5.INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| PROCESO DE SELECCIÓN | CMA-DO-SRT-057-2018 |
| N° DEL CONTRATO | 921 DEL 2018 |
| FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO | 28 JUNIO DEL 2018 |
| OBJETO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |
| CONTRATISTA | CODIPRO INGENIERIA LTDA |
| NIT | 800.172.033-2 |
| INTEGRANTES DEL CONSORCIO | N/A |
| DEPARTAMENTO | CAUCA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 464.788.915 INCLUIDO IVA |
| PLAZO DE EJECUCION | 5 MESES |
| ORDEN DE INICIO | 9 DE AGOSTO 2018 |
| DIRECCION BOGOTA | CALLE 98 N° 65 A – 46 – SEGUNDO PISO |
| DIRECCION MERCADERES | CRR 2 # 3-18 BARRIO CENTRO – MERCADERES. |
| NUMERO TELEFONICO | 6366945 |
| PRÓRROGA | En trámite |
| FECHA TERMINACION | 8 DE ENERO 2019 |
| ACTAS PARCIALES | Se tramitaron las Actas de Costos No. 1, 2, 3, 4 y 5. |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL INTERVENTOR EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° AL 31 de DICIEMBRE DE 2018.

Las actividades que se han ejecutado en el presente periodo son:

**Operativas:** Se realizó trabajo en conjunto con el personal del Contratista, con el objeto de verificar las actividades a ejecutar en el objeto contractual y detectar los posibles cambios y dificultades que puedan presentarse. Se impartieron las aclaraciones técnicas respectivas para el esclarecimiento oportuno de las actividades programadas como avance y desarrollo de las obras de intervención previstas.

**Legales:** Revisión de los aspectos legales establecidos en el Contrato y su cumplimiento durante el proceso de ejecución. La Interventoría realizó seguimiento de lo contratado, y en cuanto a los procedimientos para el logro del objeto contractual que se ajusten enteramente a la ley y a lo pactado, dando el especial trato que merece por ser un Proyecto con recursos OCAD.

**Técnicas:** En esta etapa de Consultoría se ha estado atentos en las actividades para la determinación de los puntos críticos en los tramos y los ajustes pertinentes para la presentación de los diseños en cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada ítem de obra.

Se ha interactuado con los funcionarios delegados como Supervisores y Gestores del INVIAS así como con el Contratista, para lograr un desarrollo armónico del "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA, BALBOA, FLORENCIA Y MERCADERES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

**Administrativas:** Las actividades Administrativas desarrolladas por la Interventoría han sido las siguientes:

1- Revisión del cumplimiento de todos los aspectos relativos al numeral 7.5 de los pliegos de condiciones.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

2- Ejecución de Comités de seguimiento de acuerdo al Manual de Interventoría.

3- Elaboración de los diferentes informes de acuerdo al Manual de Interventoría y a los solicitados por la Entidad.

4- Elaboración de oficios varios, dirigidos tanto al INVIAS como al Contratista, referente a diversos aspectos en este periodo del Proyecto.

5- Coordinación de Comités de seguimiento y elaboración de las respectivas actas.

### 5.2.1 INFORME EJECUTIVO DEL DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018 se anexa al presente informe mensual No. 05, el Informe ejecutivo mensual del Director de Interventoría. Revisar Anexos.

### 5.3 INFORME DE LOS ESPECIALISTAS.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018, se anexa el informe por parte de los especialista ambiental. Ver anexos.

### 5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC

**N/A.**

### 5.5 INFORME DE OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

**N/A.**



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# 6.REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

### 6.1 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5. Revisar Anexos.

### 6.2 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7. Revisar Anexos.

### 6.3 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9. Revisar Anexos.

### 6.4 CONTROL DE APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-13. Revisar Anexos.

### 6.5 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16. Revisar Anexos.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# 7.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 6.6 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO.**

Correspondiente al período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018. Se adjunta Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-2. Revisar Anexos.

## 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contratista debe implementar las acciones correctivas para promover la construcción de las obras contractuales y reducir el atraso que presenta en los municipios de Mercaderes, Florencia, Santa Rosa y Balboa. A la fecha solo ha iniciado obra en los municipios de Mercaderes, Florencia y Balboa.

- La interventoría continúa haciendo acompañamiento, control y seguimiento de todos los componentes del contrato de obra No.495 de 2018: Social, Ambiental y Técnico.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-5 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 2 (Día) / 1 (Mes) / 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**MES DE INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO No.** 921 DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

FLORENCIA: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)- BALBOA: TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL )- MERCADERES:TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) - SANTA ROSA: TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

**INTERVENTORÍA:** CODIPRO INGENIERIA LTDA **SECTOR:**

| EQUIPO | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Computador SAMSUNG | PC Oficina Core i5 | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | I | A | A | A | I | I | A |
| Telefono Celular | Movil marca NOKIA | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | I | A | A | A | I | I | A |
| Vehículo cc 2000 4x4 | Kia UUS007 | I | I | A | A | A | A | A | I | I | A | A | A | A | A | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:** N/A

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS:** N/A

**CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Luis Samuel Ordaz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Firma
Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 19202-79853

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-7 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 2 (Día) / 1 (Mes) / 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

## CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

**MES DEL INFORME:** DICIEMBRE 2018 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 DE 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** MUNICIPIOS DE FLORENCIA, BALBOA, MERCADERES Y SANTA ROSA.

FLORENCIA: TRAMOS 1 (ESCUELA BELLA VISTA-LA ESPERANZA BAJA), TRAMO 2 (CUCHILLA DEL HATO-BETANIA)- BALBOA: TRAMO 1 (CRUCERO - PLANADAS - BERMEJA - CAÑAVERAL )- MERCADERES:TRAMO 1 ANILLO VIAL DE LA CORDILLERA (SAN JOAQUÍN - ESMERALDAS - LOS PLANES - EL PROGRESO - TABLONES ALTOS Y BAJOS - VILLA MARÍA - LOS LLANOS) , TRAMO 2 ANILLO VIAL LA CURVA - EL PILÓN (LA CURVA - LOS GUÁCIMOS - LOS MEDIOS - CAJAMARCA - CONTADOR - EL PILÓN) - SANTA ROSA: TRAMO 1 (AGENCIA - TARABITA)

**INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA **SECTOR:**

| NOMBRE | CARGO | DIAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Luis Samuel Orduz Gómez (25%) | Director de Interventoría | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| Diana Paz Cabrera (100%) | Residente de Interventoría | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| Angélica María Garzón Alayón (100%) | Residente de Interventoría | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| Julieth Noguera Muñoz (100%) | Secretaria | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | X | X | X | | | X |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Luis Samuel Orduz Gomez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Firma
Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula No. : 19202-79853

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CODIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PAGINA | 1 DE 1 |
| | | FECHA | 2 de enero de 2019 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA — DIRECCION TERRITORIAL CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 921 DE 2018 — INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

**MES INFORME MENSUAL:** DICIEMBRE DE 2018

**CARRETERA Y/O PROYECTO:** Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia); Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes); Agencia - Tarabita (Santa Rosa).

**SECTOR:** N/A

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1618 | - 005-2402-0603-2018-130101-0001 | A19000 | Nación | Principal | 464.788.915,00 |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | **TOTAL** | | | 464.788.915,00 |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** 464.788.915,00

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total | Anticipo Amortizado | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 2318 De (21/06/2018) | Valor Total Ejecutado Acumulado | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | - | 464.788.915,0 | | **464.788.915,00** | | |
| 1 Parcial | ago-18 | 8.398.420,00 | 1.595.700,00 | 9.994.120,00 | - | - | 454.794.795,00 | 9.994.120,00 | 454.794.795,00 | | |
| 2 Parcial | sep-18 | 15.053.420,00 | 2.860.150,00 | 17.913.570,00 | - | - | 436.881.225,00 | 27.907.690,00 | 436.881.225,00 | | |
| 3 Parcial | oct-18 | 33.367.477,50 | 6.339.821,00 | 39.707.298,50 | - | - | 397.173.926,50 | 67.614.988,50 | 397.173.926,50 | | |
| 4 Parcial | nov-18 | 35.992.410,00 | 6.838.558,00 | 42.830.968,00 | - | - | 354.342.958,50 | 110.445.956,50 | 354.342.958,50 | | |
| 5 Parcial | dic-18 | 24.889.880,00 | 4.729.077,00 | 29.618.957,00 | - | - | 324.724.001,50 | 140.064.913,50 | 324.724.001,50 | | |
| **TOTALES** | | **$ 117.701.607,50** | **$ 22.363.306,00** | **$ 140.064.913,50** | **$ 0,00** | **$ 0,00** | **$ 324.724.001,50** | **$ 140.064.913,50** | **$ 324.724.001,50** | | |

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal o Delegado
Matrícula: 25202-33706 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula: 19202-79853 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-13 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |
| | | FECHA | 2 (Día) | ene (Mes) | 2019 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 921 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA. CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** Diciembre de 2018 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** Crucero - Planadas - Bermeja - Cañaveral (Balboa); Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Betania (Florencia); Anillo vial de la Cordillera (San Joaquín - Esmeraldas - Los Planes - El Progreso - Tablones Altos y Bajos - Villa María - Los Llanos) y Anillo vial La Curva - El Pilón (La Curva - Los Guácimos - Los Medios - Cajamarca - Contador - El Pilón) (Mercaderes); Agencia - Tarabita (Santa Rosa).

**SECTOR:** N/A

| No. | NOMBRES Y APELLIDOS | CÉDULA | CARGO | SALARIO / HONORARIOS | Indice Base Cotización (I.B.C.) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ARL | EPS | PENSION | CAJA 4% | SENA | ICBF |
| 1 | Luis Samuel Orduz Gómez | 19.092.412 | Director de Interventoria | 5.000.000,00 | 1.250.000,00 | 87.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | |
| 2 | Diana Paz Cabrera | 27.146.830 | Ingeniero Residente (Mercaderes). | 3.175.000,00 | 3.175.000,00 | 220.980,00 | 127.000,00 | 508.000,00 | 127.000,00 | | |
| 3 | Angelica Maria Garzon Alayon | 1.113.779.432 | Ingeniero Residente (Florencia). | 3.175.000,00 | 3.175.000,00 | 220.980,00 | 127.000,00 | 508.000,00 | 127.000,00 | | |
| 4 | Ricaurte Rojas Vargas | 12.102.657 | Especialista Ambiental | 4.300.000,00 | 1.032.000,00 | 71.827,20 | 41.280,00 | | 41.280,00 | | |
| 5 | Nury Julieth Noguera Muñoz | 1.061.018.950 | Secretaria | 900.000,00 | 900.000,00 | 62.640,00 | 36.000,00 | 144.000,00 | 36.000,00 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| N..VECES | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES | | | | 16.550.000,00 | **9.532.000,00** | **663.427,20** | **381.280,00** | **1.160.000,00** | **381.280,00** 4% | | |

**NOTAS:**

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Luis Samuel Orduz Gómez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

5 Parcial

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-16 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| | | FECHA | 2 (Día) | 1 (Mes) | 2019 (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 921 DE 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERÍA LTDA

**OBJETO DEL CONTRATO:** "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, FLORENCIA, MERCADERES Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

**FECHA DE INICIO:** 9-ago-2018

**PLAZO INICIAL:** 5 meses

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 9-ene-2019
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 464.788.915,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 0,00
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde (Día) | (Mes) | (Año) | Hasta (Día) | (Mes) | (Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | 46.478.891,50 | 28 | jun | 2018 | Hasta la Liquidación del contrato | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | 78.115.784,00 | 28 | jun | 2018 | Hasta la Liquidación del contrato | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | 92.957.783,00 | 28 | jun | 2018 | 18 | abr | 2021 |
| Calidad del servicio | 30% | 139.436.675,00 | 5 años a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la Interventoría | | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101275612

**Certificado de modificación o anexo No.:** 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S. A.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde (Día) | (Mes) | (Año) | Hasta (Día) | (Mes) | (Año) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | 46.478.891,50 | 28 | jun | 2018 | 9 | jul | 2019 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 100% | 78.115.784,00 | 28 | jun | 2018 | 9 | jul | 2019 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | 92.957.783,00 | 28 | jun | 2018 | 9 | ene | 2022 |
| Calidad del servicio | 30% | 139.436.675,00 | 9 | ene | 2019 | 9 | ene | 2024 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 21-44-101275612

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S. A.

**Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos:**

**OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:**

LUIS SAMUEL ARDUZ GOMEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-15-FR-18 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | |
| | | PÁGINA | | DE |

FECHA: 3 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 DE 2018 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

**INTERVENTOR** CODIPRO INGENIERIA LTDA

**FECHA DE INICIO:** 09/08/2018 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 5 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 28/02/2019 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE OBRA No:** 495 DE 2018 (Indicar número y año)

**CONTRATISTA** FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

## 1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ VERSIÓN No. 0 FECHA DE VERSIÓN: 09/08/2018

**OBSERVACIONES:**

## 2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ____ FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO ____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ____

**OBSERVACIONES:**

## 3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI ____ NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: ____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: ____ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: ____

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ____ NO ____

**OBSERVACIONES:** En el periodo del informe no se programaron ensayos

*El plan de inspección, medición y ensayo de la interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.*
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

## 4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** NINGUNA **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** NINGUNA

**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** NINGUNA **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** NINGUNA

**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** NINGUNA

**OBSERVACIONES:**

## 5. QUEJAS Y RECLAMOS

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** NINGUNA **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** NINGUNA

**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** NINGUNA **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** NINGUNA

**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** NINGUNA **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** NINGUNA

**OBSERVACIONES:**

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título Indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = Satisfaccón del cliente | >85% alto; Entre 80 y 85% medio; menor de 80% bajo. | |
| IG2: Índice de gestión 2 = Control Presupuestal | >75% alto; Entre 60 y 75% medio; menor de 75% bajo. | |
| IG3: Índice de gestión 3 =Presentación de informes | 1 = 100% | |
| IG4: Índice de gestión 4 = Efectividad de la Facturación | 1=100% | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:** En el periodo de este informe no se utilizó equipo que requiriera de calibración.

**NOTAS:**

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Luis Samuel Orduz Gomez
Director de la Interventoría
Matrícula No.: 25202-28306 CND

Firma
Nombre: N.A.
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: Luis Eduardo Ledezma Ramos
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-79853 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-3-FR-1 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

| | FECHA | 2 | 1 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 921 **DE** 2018 **INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** -
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan inicial el número 1)

**JUSTIFICACIÓN:** LA INTERVENTORIA RENUNCIO A UTILIZAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO.

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | % |
| 2 | | | | | | | % |
| 3 | | | | | | | % |
| 4 | | | | | | | % |
| 5 | | | | | | | % |
| N | | | | | | | % |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | | | | | **100%** |

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal
Interventor
Matricula No.: 2520233706 CND

(Firma)
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula No. 19202-79853

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>**INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MINFRA-MN-IN-3-FR-2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | 1 | DE | 1 |

FECHA: 2 (Día) 1 (Mes) 2019 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

## DATOS GENERALES

**INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** [x] (Marque X si corresponde) **INFORME FINAL DE INVERSION DEL ANTICIPO** [ ] (Marque X si corresponde)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 921 **DE** 2018

**CUENTA BANCARIA No.:** - **BANCO** - SUCURSAL -

**ANTICIPO OTORGADO:** 0 %

**VALOR DEL ANTICIPO:** $ - **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS

## DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

| TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | *ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | | | | | |
| | | | | | | |
| LA INTERVENTORIA RENUNCIO A UTILIZAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

* Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el plan de inversión del anticipo mensualizado del contrato de interventoría Formato MINFRA-MN-IN-3-FR-1

**SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ITEM**

| ITEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ITEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N/A | | | | | |
| | | | | | | |
| LA INTERVENTORIA RENUNCIO A UTILIZAR LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **TOTALES** | | | | | | |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRESENTE MES ($):** $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ - (Según certificación de Entidad bancaria)

**COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.** - **FECHA** - **VALOR** $ -
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MINFRA-MN-IN-3)

Firma
JESÚS MARÍA BERDUGO LEAL
Representante Legal
Interventor
Matrícula No. 2520233706 CND

Firma
LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS
Supervisor del contrato de Interventoría
Matricula No.: 19202-79853

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

# 8.ANEXOS

## 8. ANEXOS.

## 8.1 RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR.

## OFICIOS ELABORADOS POR LA INTERVENTORÍA

| FECHA | CONSECUTIVO | REFERENCIA | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 05 DE 2018 | CDP-171-2018 | CONTRATO No. 921 DE 2018 | FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS-FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. | INICIO DE OBRAS CONTRATO No. 0495 DE 2018 |
| DICIEMBRE 07 DE 2018 | CDP-172-2018 | CONTRATO No. 921 DE 2018 | FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS-FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. | EVALUACION HOJAS DE VIDA 4 RESIDENTES Y 1 RESIDENTE SOCIAL |
| DICIEMBRE 19 DE 2018 | CDP-183-2018 | CONTRATO No. 921 DE 2018 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-INVIAS | ACTA DE COSTO DE INTERVENTORIA No 5 |
| DICIEMBRE 27 DE 2018 | CDP-194-2018 | CONTRATO No. 921 DE 2018 | FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS-FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. | PRONUNCIAMIENTO DEL INGENIERO ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA RESPECTO AL PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL -PAGA V2 DE LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES Y FLORENCIA. |
| DICIEMBRE 21 DE 2018 | CDP-191-2018 | CONTRATO No. 921 DE 2018 | FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS-FEDERACION NACIONAL DE | NUEVA EVALUACION HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE OBRA JHOAN CARDENAS- |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

| FECHA | CONSECUTIVO | REFERENCIA | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | CAFETEROS. | |
| DICIEMBRE 26 DE 2018 | CDP-178-2018 | CONTRATO No. 921 DE 2018 | FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS-FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. | HOJA DE VIDA RESIDENTE SOCIAL |
| DICIEMBRE 28 DE 2018 | CDP-197-2018 | CONTRATO No. 921 DE 2018 | FERNANDO NICOLAS CHACON PENAGOS-FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS. | APROBACION DE HOJAS DE VIDA |

## OFICIOS RADICADOS POR EL CONTRATISTA

| FECHA | CONSECUTIVO | REFERENCIA | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00855 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | EQUIPO MINIMO REQUERIDO MUNICIPIO DE FLORENCIA. |
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00856 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | INSTALACIONES PROVISIONALES |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

| FECHA | CONSECUTIVO | REFERENCIA | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00857 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | LABORATORIO DE TOMA DE MUESTRAS. |
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00858 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | EQUIPO MINIMO REQUERIDO MUNICIPIO DE SANTA ROSA. |
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00859 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | INSTALACIONES PROVISIONALES SANTAROSA |
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00861 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | EQUIPO MINIMO REQUERIDO BALBOA |
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00862 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | INSTALACIONES PROVISIONALES BALBOA |
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | CDS18C00863 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | LABORATORIO DE TOMA DE MUESTRAS BALBOA. |
| DICIEMBRE 13 DE 2018 | CDS18C00888 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | ENTREGA DE MODELO DE VOLANTE INFORMATIVO PARA CIERRE DE VIAS DE LOS MUNICIPIOS DE MERCADERES, BALBOA, FLORENCIA Y SANTA ROSA. |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

| FECHA | CONSECUTIVO | REFERENCIA | DIRIGIDO A | ASUNTO |
|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 16 DE 2018 | CDS18C00897 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | SOLICITUD DE APROBACION DEL RESIDENTE SOCIAL |
| DICIEMBRE 17 DE 2018 | CDS18C00901 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | RESPUESTA SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE CTAS DE VECINDA EN FLORENCIA |
| DICIEMBRE 18 DE 2018 | CDS18C00902 | CONTRATO 0495 DE 2018 | EDWIN URBANO ALCALDE MERCADERES | NOTIFICACION DE CIERRE DE VIAS TEMPORALES . |
| DICIEMBRE 27 DE 2018 | CDS18C00928 | CONTRATO 0495 DE 2018 | CODIPRO LTDA-JESUS MARIA BERDUGO LEAL | REMISION DE DOCUMENTOS |

## OFICIOS RADICADOS POR EL INVIAS

| FECHA | CONSECUTIVO | REFERENCIA | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| DICIEMBRE 03 DE 2018 | SRT 54539 | CONTRATO DE OBRA No 495 DE 2018 | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| DICIEMBRE 06 DE 2018 | SRT 55142 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 921 DE 2018 | PRESUNTO INCUMPLIMIENTO EN RADICACIÓN DE INFORMES MENSUALES Y ACTAS DE COSTOS |
| DICIEMBRE 14 DE 2018 | SRT 56850 | CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 921 DE 2018 | DEVOLUCION ACTAS DE COSTOS 1, 2 Y 3 DEL CONTRATO 921 DE 2018 |



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

## 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS

En el período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018, se realizaron las actividades relacionadas en el documento anexo.

## 8.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES Y PREDIALES

En el período comprendido del 1° al 31 de diciembre de 2018, se realizaron las actividades relacionadas en el documento anexo.



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

# REGISTRO FOTOGRÁFICO

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente técnico en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **BALBOA-CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 1** Almacenamiento de cemento en la vereda La Planada.

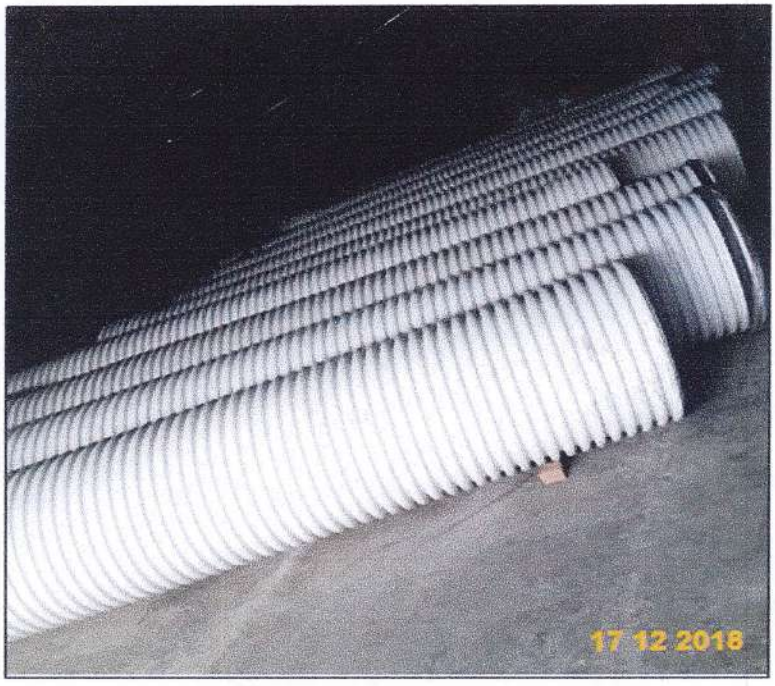



**Foto No. 2** Almacenamiento tubería PVC 900 mm.




**Foto No. 3** Señalización preventiva para el tramo.




**Foto No. 4** Adecuación terreno para instalación del material de excavación.

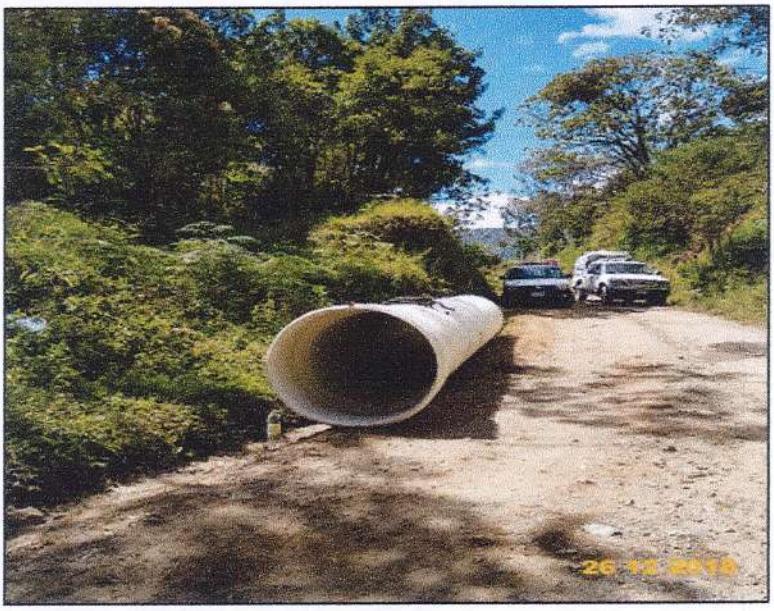


**Foto No. 5** Suministro tubería para alcantarilla No.1

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente técnico en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **SANTA ROSA - CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 6** Almacenamiento de acero de refuerzo en campamento.




**Foto No. 7** Elementos básicos para la prevención de riesgos en seguridad e higiene en el trabajo.




**Foto No. 8** Almacenamiento del cemento en el campamento localizado en la cabecera municipal de Santarosa.




**Foto No. 9** Señalización del PMT.




**Foto No. 10** Corte y flejado de acero de refuerzo en campamento.




**Foto No. 11** Localización y replanteo de la placa huella ubicada en el sector Cabecera - La Agencia.




**Foto No. 12** Localización y replanteo de la placa huella ubicada en el sector Cruce de la Virgen - Tarabita.




**Foto No. 13** Señalización en la cabecera municipal - PMT.




**Foto No. 14** Señalización en la cabecera municipal - PMT.

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente técnico en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **FLORENCIA - CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 15** Fragmento de tubo PVC.




**Foto No. 16** Daño en campana de tubería de PVC.




**Foto No. 17** Almacenamiento de cemento.




**Foto No. 18** Almacenamiento acero de refuerzo.




**Foto No. 19** Corte y flejado de acero de refuerzo en campamento.




**Foto No. 20** Instalación de tubería en alcantarilla No. 2 localizada en tramo 2 K1+303.




**Foto No. 21** Excavación en alcantarilla No.1, localizada en tramo 2 K1+235.




**Foto No. 22** Excavación en alcantarilla No.1, localizada en tramo 2 K1+235.

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente técnico en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **MERCADERES - CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 23** Almacenamiento de cemento.




**Foto No. 24** Suministro de tubería de 900 mm, tramo Los Alpes – Anillo Vial la Cordillera.



**Foto No. 25** Suministro de tubería de 900 mm. tramo La Monja – Anillo Vial la Cordillera.




**Foto No. 26** Recorrido con la comunidad – Anillo Vial la Cordillera.




**Foto No. 27** Recorrido con la comunidad – Anillo Vial la Cordillera.



**Foto No. 28** Instalación de tubería de 900 mm – Anillo Vial la Cordillera.




**Foto No. 29** Instalación de tubería de 900 mm– Anillo Vial la Cordillera.




**Foto No. 30** Instalación de material de atraque – Anillo Vial la Cordillera.



**Foto No. 31** Señalización de las obras – Anillo Vial la Cordillera.

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente social en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **BALBOA-CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 1** Instalación de buzón en la vereda La Planada.




**Foto No. 2** Instalación de buzón tienda López vereda La Planada.




**Foto No. 3** Instalacion punto de atención sede comité de cafeteros Balboa.




**Foto No. 4** Comité Técnico desarrollado el día 11 de diciembre de 2018.

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente social en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **SANTA ROSA - CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 1** Instalacion de buzón.

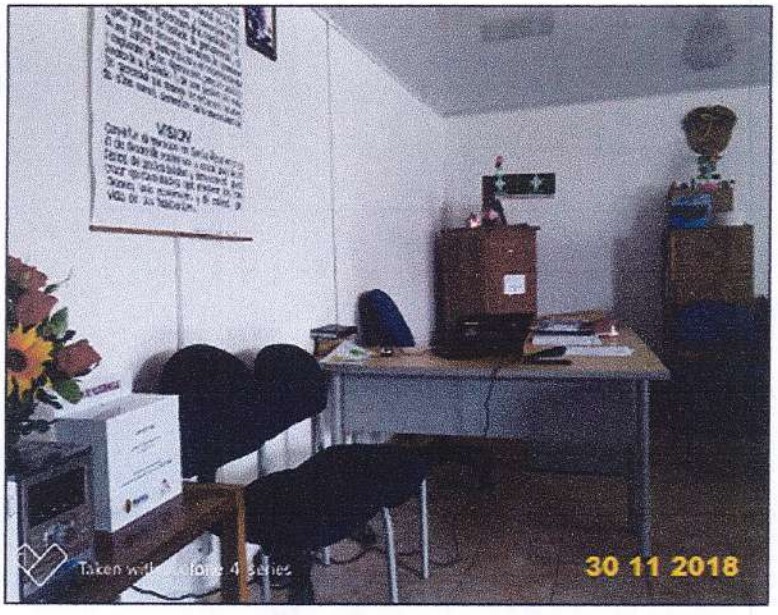



**Foto No. 2** Punto de atención al ciudadano oficina de inspección de policía.




**Foto No. 3** Comité Técnico desarrollado el día 11 de diciembre de 2018.

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente social en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **FLORENCIA - CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 1** Reunión para inicio de actividades convocada por Federación Nacional de Cafeteros.




**Foto No. 2** Instalacion del buzón en casa parroquial.




**Foto No. 3** Comité Técnico desarrollado el día 11 de diciembre de 2018.

## REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION SOCIAL

En el registro fotográfico se muestran todas las actividades desarrolladas en el componente social en el período del 1 al 31 de diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | **MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.** |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | **MERCADERES - CAUCA** |
| **CONTRATISTA:** | **FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS** |
| **CONTRATO DE OBRA No.:** | **495 de 2018** |
| **INTERVENTORÍA:** | **CODIPRO INGENIERÍA LTDA.** |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | **921 de 2018** |




**Foto No. 5** Instalación de buzón de sugerencias en tienda-internet San Joaquín.

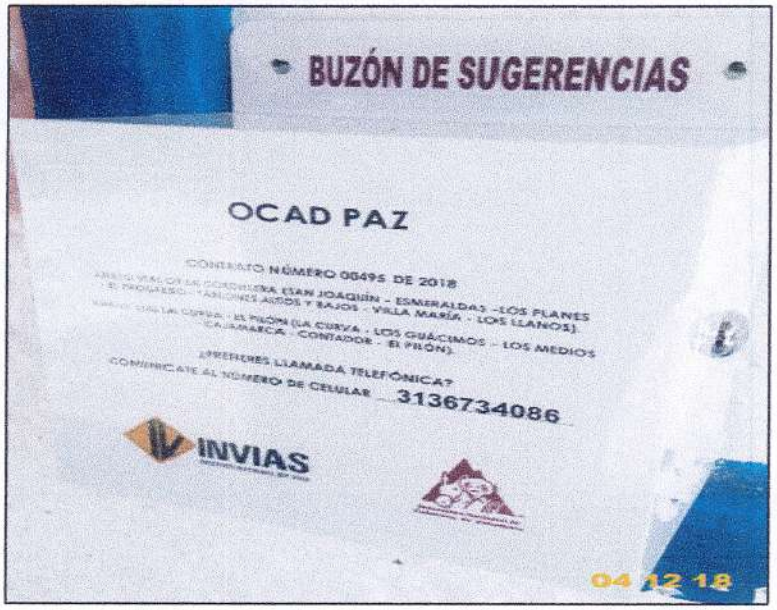



**Foto No. 6** Instalación de buzón de sugerencia en tienda-internet San Joaquín.




**Foto No. 7** Instalación del punto de servicio de atención ubicado en la cabecera municipal en la cooperativa del cauca agencia de compra de café.




**Foto No. 8** Instalación del punto de servicio de atención ubicado en la cabecera municipal en la cooperativa del cauca agencia de compra de café.




**Foto No. 9** Comité Técnico desarrollado el día 11 de diciembre de 2018.




**Foto No. 10** Comité Técnico desarrollado el día 11 de diciembre de 2018.




**Foto No. 11** Reunión con la comunidad el día 13 de diciembre de 2018.




**Foto No. 12** Reunión con la comunidad el día 13 de diciembre de 2018.

# BITACORA DE OBRA

# BALBOA



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Contrato de Obra
N. 495 de 2018

Objeto: Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en el departamento del Cauca de conformidad con el decreto ley 1534 del 15 de septiembre de 2017".

Municipio: Balboa


Personal de Obra: Fernando Nicolás Chacón
Residente de Obra: Oscar Fernado Ojeda


Personal de Interventoría:
Director: Luis Samuel Orduz
Residente: Jhon Jairo Mocondino

Supervisor: Luis Eduardo Ledezma

Bitácora de Obra

Noviembre 20 de 2018, Martes
No hay actividades en obra.

Contratista 

Interventoria 


Noviembre 21 de 2018, Miércoles
No hay actividades en obra.

Contratista 


Interventoria 


Noviembre 22 de 2018, Jueves
No hay actividades de obra

Contratista 

Interventoria 

Noviembre 23 de 2018, Viernes
No hay actividades de obra

Contratista 


Interventoria 

Noviembre 24 de 2018, sábado
No hay actividades de obra.

Contratista 


Interventoria 


Noviembre 25 de 2018, Domingo
No hay actividades de obra.

Contratista 

Interventoria 

Noviembre 26 de 2018, Lunes
No hay ejecución de obra.

Contratista 

Interventoria 

Noviembre 27 de 2018, Martes
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoría

Noviembre 28 de 2018, Miércoles
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoría

Noviembre 29 de 2018, Jueves
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoría

Noviembre 30 de 2018, Viernes
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoría

Diciembre 1 de 2018 Sábado
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoría

Diciembre 2 de 2018, Domingo
No hay ejecucion de obra

Contratista


Interventoría

Diciembre 3 de 2018, Lunes
No hay ejecucion de obra


Contratista

Interventoría


Diciembre 4 de 2018, Martes.
No hay ejecución en obra.

Contratista  Interventoría 


Diciembre 5 de 2018, Miércoles
No hay ejecución en obra, se solicita al contratista presentar un plan de contingencia.

Contratista  Interventoría 


Diciembre 6 de 2018, Jueves
No hay ejecución en obra, se solicita al contratista presentar un plan de contingencia e iniciar las obras.

Contratista  Interventoría 



Diciembre 7 de 2018, Viernes
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista presentar un plan de contingencia e iniciar las obras.

Contratista  Interventoría 

Diciembre 8 de 2018, Sábado
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista presentar un plan de contingencia e iniciar las obras.

Contratista  Interventoría 

Diciembre 9 de 2018, Domingo
No hay ejecución de obra.

Contratista  Interventoría 

Diciembre 10 de 2018, Lunes
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista presentar un plan de contingencia e iniciar las obras.

Contratista _____ Interventoría

Diciembre 11 de 2018, Martes
Se desarrolla comité técnico en las instalaciones del Invias Territorial Cauca, se cuenta con la asistencia del Ing Adrian Valencia Director Territorial, Ing Luis Eduardo Ledezma Supervisor de Contrato, Ing. Juan Carlos Gómez Ing de Apoyo a Supervision entre otros ingenieros del Invias, Ing Fernando Chacón Director de Obra, Ing Fernando Monteale-gre ingeniero de apoyo por parte de la Federación Nacional de Cafeteros y la Ing Angélica Mª Garzón de esta interventoría. El contratista se compromete a suministrar los materiales (tubería y granulares) en cada municipio (Florencia, Mercaderes, Santa Rosa y Balboa) el día 14 de diciembre de 2018, iniciar las obras 17 de diciembre de 2018, presentar a interventoría las hojas de vida faltantes.
No hay ejecución de obra.

Contratista _____ Interventoría

Diciembre 12 de 2018, Miércoles
No hay ejecución de obra

Contratista _____ Interventoría

Diciembre 13 de 2018, Jueves
No hay ejecución de obra.

Contratista _____ Interventoría

Diciembre 14 de 2018, Viernes
El contratista suministra tubería PVC 36" (7) tubos de 6,5m.
No hay ejecución de obra.
El contratista no suministra la totalidad de los materiales, por lo tanto está incumpliendo el compromiso adquirido en comité del 11 de diciembre de 2018.

Contratista Interventoría

Diciembre 15 de 2018, (Viern) Sábado.
El contratista suministra (200) sacos de cemento, no ha cumplido con el compromiso adquirido en comité del 11 de diciembre de 2018.
No hay ejecución de obra.

Contratista Interventoría



Diciembre 16 de 2018, Domingo
El contratista suministra (200) sacos de cemento, no ha cumplido con el compromiso adquirido en comité del 11 de diciembre de 2018.
No hay ejecución de obra.

Contratista Interventoría

Diciembre 17 de 2018, Lunes
El contratista no inicia obra, tampoco ha suministrado la totalidad de los tubos de PVC 36" ni granulares, incumple el compromiso adquirido en comité de 11 de diciembre de 2018.

Contratista Interventoría

Diciembre 18 de 2018, Martes
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista cumplir los compromisos adquiridos en comité del 11 de diciembre de 2018.

Contratista  Interventoría 


Diciembre 19 de 2018, Miércoles
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista cumplir los compromisos adquiridos en comité del 11 de diciembre de 2018.

Contratista  Interventoría 


Diciembre 20 de 2018, Jueves
El contratista suministra (8) tubos de PVC 36".
No hay ejecución de obra, el contratista debe presentar un plan de contingencia e iniciar las obras.

Contratista  Interventoría 



Diciembre 21 de 2018, Viernes
No hay ejecución de obra, el contratista debe presentar un plan de contingencia y ejecutar las obras.

Contratista  Interventoría 



Diciembre 22 de 2018, Sábado
Suministro de (34TN) de acero de refuerzo
No hay ejecución de obra el contratista debe implementar un plan de contingencia para ejecutar las obras y reducir el atraso.

Contratista  Interventoría 


Diciembre 23 de 2018, Domingo
No hay ejecución de obra.

Contratista  Interventoría 



Diciembre 24 de 2018, Lunes
No hay ejecución de obra, el contratista debe implementar un plan de contingencia para ejecutar las obras y reducir el atraso.

Contratista  Interventoría 


Diciembre 25 de 2018, Martes festivo
No hay ejecución de obra.

Contratista  Interventoría 

Diciembre 26 de 2018, Miércoles
Llegada personal: maestro y oficial al corregimiento de la Planada para iniciar la contratación del personal como obreros.
No hay ejecución de obra.

Contratista  Interventoría 

Diciembre 27 de 2018, Jueves
Tiempo: soleado mañana y tarde.
Demolición de la estructura de salida de la alcantarilla N.1, (K11+550) el rendimiento es bajo porque el concreto esta muy duro y el contratista no tiene compresor para avanzar con la demolición.
Personal (1) maestro, (1) oficial, (1) operador Retro (1) inspector.

Contratista  Interventoría. 



Diciembre 28 de 2018, Viernes.
Continúa con la demolición de la poceta de encole y la excavación para instalación de tubería de PVC 36", aflora roca en el talud superior en la demolición de la caja, esta se demuele toda con el cucharon de la retro. En la excavación de la tubería (aparece) se encuentra que la tubería esta apoyada sobre roca (2.0m de longitud aprox), se determina que esto impide alcanzar la profundidad necesaria para garantizar el recubrimiento a la nueva tubería (90cm) faltan 25cm de excavación.
Se solicita a la interventoria evaluar la opción: construcción de una losa reforzada sobre el tubo PVC 36", al no tener respuesta inmediata, el contratista tapa la excavación y se restituye el paso vehicular.
Tiempo: seco
Personal: Maestro (1) oficial (1) operador Retro (1)
Ayudante(1) Inspector (1).
Equipo: Retroexcavador de llantas. (Pajarita).

Contratista



Interventoria

Diciembre 29 de 2018, Sábado.
Debido a la dureza del concreto y la existencia de rocaen las excavaciones se determina llevar a obra un compresor para hacer las demoliciones.
Inicia la excavación en la alcantarilla N. 3(K1+935) (nueva), la actividad se desarrolla normalmente hasta las 11 am, la retro sufre una falla mecánica (se revienta una manguera) no se alcanza a excavar la longitud total por lo tanto, no se puede instalar el tubo pues no cuenta con personal suficiente para continuar con la actividad a mano, se procede a tapar la excavación y dar apertura a la vía.
Es necesario contar con el compresor en obra.


Tiempo: seco
Personal: Ayudante(1), Inspector (1), Maestro (1) oficial(1) Operador (1).
Equipo: Pajarita (1)
Nota: la consecución del personal no calificado no ha sido fácil porque la mano de obra en el sector dónde se desarrollan las obras es muy costosa y la gente no acepta el valor que ofrece el contratista como tarifa para obreros.

Contratista  Interventoria 

Diciembre 30 de 2018, Domingo.
No hay ejecución de obra, el equipo (pajarita) esta varada.

Contratista  Interventoria 

Diciembre 31 de 2018, Lunes.
No hay ejecución de obra, el equipo (pajarita) continúa varado.

Contratista  Interventoria 

# FLORENCIA

Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Florencia (Cauca), Noviembre 20 de 2018.


Contrato de obra 0495 de 2018

Objeto Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en el departamento de Cauca de conformidad con el decreto ley 1534 del 15 de septiembre de 2017

Fernando Chacón
Director Obra

Diana Paz
Residente de Interventoria

Miercoles 21 de Noviembre del 2018.
- No se realizan actividades de obra en los tramos



Jueves 22 de Noviembre del 2018
- No se realizan actividades en los tramos de cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Belania



Viernes 23 de Noviembre del 2018
- No se realizan actividades de obra en los tramos de cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato Belania.



Sabado 24 de Noviembre del 2018.
- No se realizan actividades de obra en los tramos



Lunes 26 de Noviembre del 2018.
- No se realizan actividades de obra en los tramos



Martes 27 de Noviembre del 2018
- No se realizan actividades de obra en los tramos Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja y Cuchilla del Hato - Belania.
- Se instala el Punto de Atencion al ciudadano en la Sede Federación Nacional de Cafeteros de la Inspección Municipal de Florencia.
- Se convoca a una reunion con los presidentes de la JAC de los dos tramos, representantes de veeduria y representantes de la Alcaldia Municipal de Florencia, para la constitucion formal de la veeduria Ciudadana encargada de vigilar el proceso y ser garante del proyecto ante la comunidad.



- Miercoles 28 de Noviembre del 2018.
- No se realizan actividades de obra en los dos tramos



- Jueves 29 de Noviembre del 2018
- No se realizan actividades de obra.
- Interventoria Solicita realizar actas de vecindad a los pasos huellas existentes para los dos tramos ya que estos se veran afectados por el tramito de carga pesada.

Viernes 30 de Noviembre del 2018

- No se realizan actividades de obra en los dos tramos
- El contratista presenta el documento PAGA version 2 para revision de interventoria.
- Esta pendiente el acta de vecindad firmada para el predio de la Sra. Otilia Grijalba en el tramo Cruce Escuela Bella Vista - La Esperanza Bajo para construcción de alcantarillo.

Sabado 01 de Diciembre del 2018.

- No se realizan actividades de obra en los tramos

Lunes 03 de Diciembre del 2018.

- No se realizan actividades de obra en los tramos

Martes 04 de Diciembre del 2018.

- Transporte de tuberia desde centro de Acopio de Hatoviejos.
- No se realizan actividades de obra en los tramos.

Miercoles 05 de Diciembre del 2018

- Descarga de tuberia Ø 36" a los alrededores de Coliseo a la salida de la Cabecera municipal del municipio de Florencia - Cauca.
- Se manifiesta al contratista el deterioro de algunos tubos que han sufrido a la hora de descargue.

Jueves 06 de Diciembre del 2018.

- Instalacion de Valla de proyecto en la casa parroquial frente a la Alcaldia Municipal de Florencia
- El contratista convoca a una reunión a los presidentes de la JAC y vecinos para programar actividades de mano temporal durante los tres (3) siguientes diciembres, tales ademas los temas de contratacion de mano de obra y programacion de las actividades hasta fin de año

Lunes 24 de diciembre del 2018
- Excavacion, instalacion de tuberia, relleno y compactacion de alcantarilla No 11 Ks+090 del tramo Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja.

Martes 26 de diciembre del 2018
- Excavacion, instalacion de tuberia, relleno y compactacion de alcantarilla No 8 No 12 Ks+439 del tramo Escuela Bella Vista - La Esperanza Baja.

Jueves 27 de diciembre del 2018
- No se realizan actividades de excavacion en los tramos 1 y 2.

Viernes 28 de diciembre del 2018
- No se realizan actividades de excavacion en los tramos 1 y 2 el contratista debera presentar certificacion del personal de la mayordomia en proceso de capacitacion de curso para trabajo en altura durante estos dias de cese de actividades
- El contratista presento oficio radicado por la alcaldia Municipal solicitando que las actividades de obra no se realicen durante la primera semana de enero

Sabado 29 de diciembre del 2018
- Se reunio el contratista instalar señalizacion preventiva en los tramos 1 y 2.
- No se realizan actividades de obra.

Domingo 30 de diciembre del 2018
- No se realizan actividades de obra.

Lunes 31 de diciembre del 2018
- No se realizan actividades de obra

Martes 02 de Enero del 2019
- No se realizan actividades de obra

- Jueves 03 de Enero del 2019
- No se realizan actividades de obra

# MERCADERES



Bogotá D.C., Carrera 48 No. 101 A - 99. Teléfono 2567258 – 6011785
Codipro2011@gmail.com

Diciembre 2 de 2018 domingo
No hay ejecución de obra.

Contratista

Interventoria

Diciembre 3 de 2018, lunes.
No hay ejecución de obra.

Contratista

Interventoria

Diciembre 4 de 2018, martes.
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoria

Diciembre 5 de 2018, miércoles
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la obra.

Contratista

Interventoria

Diciembre 6 de 2018, jueves
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la ejecución.

Contratista

Interventoria.

Diciembre 7de 2018 viérnes
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la ejecución.

Contratista

Interventoria

Noviembre 26 de 2018, lunes
No hay ejecución de Obra.

Contratista — Interventoria

Noviembre 27 de 2018, Mártes
No hay ejecución de obra.

Contratista — Interventoria

Noviembre 28 de 2018, Miércoles
No hay ejecución de obra.

Contratista — Interventoria

Noviembre 29 de 2018, Jueves.
No hay ejecución de obra.

Contratista — Interventoria

Noviembre 30 de 2018, Viérnes
No hay ejecución de obra

Contratista — Interventoria

Diciembre 1 de 2018, Sábado
No hay ejecucion de Obra

Contratista — Interventoria

Noviembre 20 de 2018, Martes.
No hay actividades en obra.

Contratista

Interventoria

Noviembre 21 de 2018, Miércoles
No hay actividades en obra.

Contratista

Interventoria

Noviembre 22 de 2018, Juéves
No hay actividades de obra

Contratista

Interventoria

Noviembre 23 de 2018, Viérnes
No hay actividades de obra

Contratista

Interventoria

Noviembre 24 de 2018, Sábado
No hay actividades en obra

Contratista

Interventoria

Noviembre 25 de 2018, Domingo
No hay actividades de obra

Contratista

Interventorra.

Contrato de Obra
N. 495 de 2018

Objeto: "Mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de vías terciarias en el marco del OCAD PAZ en el departamento de Cauca de conformidad con el decreto Ley 1534 del 15 de septiembre de 2017."

Personal de Obra:
Director de Obra: Fernando Nicolás Chacón
Residente de Obra: Jhoan Cárdenas Quintero
Auxiliar de Obra: Esteban Pasaje

Personal de Interventoría:
Director: Luis Samuel Orduz
Residente: Angélica María Garzón

Supervisor: Luis Eduardo Ladezma.

Bitácora de Obra
Municipio de Mercaderes.

Diciembre 2 de 2018 domingo
No hay ejecución de obra.

Contratista

Interventoria

Diciembre 3 de 2018, lunes.
No hay ejecución de obra.

Contratista

Interventoria

Diciembre 4 de 2018, martes.
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoria

Diciembre 5 de 2018, miércoles
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la obra.

Contratista

Interventoria

Diciembre 6 de 2018, jueves
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la ejecución.

Contratista

Interventoria.

Diciembre 7 de 2018 viérnes
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la ejecución.

Contratista

Interventoria

Scanned by CamScanner

Diciembre 8 de 2018, sábado
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la ejecución

Contratista — Interventoria

Diciembre 9 de 2018, domingo
No hay ejecución de obra.

Contratista — Interventoria

Diciembre 10 de 2018, lunes
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista implementar un plan de contingencia e iniciar la ejecución

Contratista — Interventoria

Diciembre 11 de 2018, martes
Se desarrolla comité técnico en las instalaciones del Invias Territorial Cauca, se cuenta con la asistencia del Ing. Adrián Valencia Director Territorial, Ing Luis Eduardo Ledezma Supervisor del Contrato, Ing Juan Carlos Gómez Apoyo a Supervisión entre otros ingenieros del Invias, Ing Fernando Chacón Director de obra, Ing. José Fernando Montealegre ingeniero de apoyo por parte de la Federación de Cafeteros y la Ing. Angélica Mª Garzón de esta interventoria. El contratista se compromete a suministrar los materiales (tubería, granulares) en cada municipio (Florencia, Mercaderes, Balboa y Santa Rosa) el día 14 de diciembre de 2018, iniciar las obras el 17 de diciembre de 2018, presentar a interventoria las hojas de vida faltantes.
No hay ejecución de Obra

Contratista — Interventoria

Scanned by CamScanner

Diciembre 12 de 2018, miércoles
No hay ejecución de obra.

Contratista Interventoría

Diciembre 13 de 2018, jueves
Suministro de (8) tubos de PVC 900mm y (400) sacos de cemento, descargados cada punto (localización de alcantarilla) y en la bodega respectivamente.
No hay ejecución de obra.
Se desarrolla reunión con la comunidad, Alcalde de Mercaderes, contratista e interventoría para informar el estado del proyecto e inicio de las obras.
Se solicita al contratista cumplir los compromisos de comité.

Contratista Interventoría

Diciembre 14 de 2018, viérnes
No hay ejecución de obra.
El contratista no suministra el material granular cumple parcialmente el compromiso adquirido en el comité técnico del 11 de diciembre de 2018.

Contratista Interventoría

Diciembre 15 de 2018, sábado
No hay ejecución de obra, se solicita al contratista dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en comité.

Contratista Interventoría

Scanned by CamScanner

Diciembre 16 de 2018, domingo
No hay ejecución de obra.

Contratista Interventoría

Diciembre 17 de 2018, lunes.
El contratista no inicia la ejecución de obra, incumple el compromiso adquirido en comité técnico del 11 de diciembre de 2018.

Contratista Interventoría

Diciembre 18 de 2018, martes.
No hay ejecución de obra, se incumplen los compromisos adquiridas en comité de 11 de diciembre de 2018.

Contratista Interventoría

Diciembre 19 de 2018, miércoles
Suministro de (1) tubo PVC 900m
No hay ejecución de obra, el contratista no comple los compromisos adquiridas en comite del 11 de diciembre 2018.

Contratista Interventoría.

Diciembre 20 de 2018, jueves
Recorrido con la comunidad al Tramo Anillo vial de la Cordillera, se muestra a la comunidad la localización de todas las alcantarillas y placahuellas del tramo.
Instalación de la senalización del PMT en el tramo del derrumbe.
No hay ejecución de obras, el contratista

Scanned by CamScanner

suministra el material para atraque de la tubería y programa inicio de obra para mañana 21 de diciembre de 2018.

Contratista

Interventoria

Diciembre 21 de 2018, Viernes.
Inicio de obra: excavación, instalación de material de atraque y tubo PVC 36" y material de relleno en el K8+890. Anillo Vial de la Cordillera
Maquinaria: Retro excavadora de llantas (1)
Compactador manual (1).
Herramienta menor.
Estado del Tiempo: seco.

Contratista

Interventoria

Diciembre 22 de 2018, sábado
No hay ejecución de obra, la retroexcavadora de llantas esta varada.

Contratista

Interventoria

Diciembre 23 de 2018, domingo
No hay ejecución de Obra

Contratista

Interventoria

Diciembre 24 de 2018, Lunes.
No hay ejecución de obra

Contratista

Interventoria

Scanned by CamScanner

Diciembre 25 de 2018, martes festivo
No hay ejecución de obra.

Contratista Interventoria

Diciembre 26 de 2018, miércoles
No hay ejecución de obra, la retro excavadora de llantas continúa varada, se solicita al contratista tomar las correctivas necesarios.

Contratista Interventoria

Diciembre 27 de 2018, jueves
Equipo Retrocargada de llantas
Herramienta menor
Compactador manual
Tiempo Seco.
Excavación, instalación del material de atraque tubo de 36" PVC y material de relleno en el K8+850

Contratista Interventoria

Diciembre 28 de 2018, viernes
Equipo Retrocargador de llantas, compactador manual.
Herramienta menor
Tiempo: seco.

No es posible trabajar debido a la celebración en la zona "dia de los inocentes" de los santos inocentes.

Contratista Interventoria

Scanned by CamScanner

Diciembre 29 de 2018, sábado
Equipo Retrocargador de llantas, compactador manual y herramienta menor
Tiempo: seco.

Excavación, instalación del material de atraque tubo PDC 36" y material de relleno en el K81810.
Anillo vial de la Cordillera.

Contratista — Interventoría

Diciembre 30 de 2018, (Sábado) Domingo
No hay ejecución de obra.

Contratista — Interventoría

Diciembre 31 de 2018, Lunes.
No hay ejecución de obra.

Contratista — Interventoría

Scanned by CamScanner

# SANTAROSA

OBJETO CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO OCAD PAZ EN EL DEP. DEL CAUCA. DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO Ley 1534

MUNICIPIO: SANTA ROSA - CAUCA

CORRECCR.: AGENCIA - TARABITA

CONTRATISTA: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS

INTERVENTOR: CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA

DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Martes 20 Noviembre:

Se da inicio de Obra por Parte de interventoria.

Ing. Residente O. DIR. INTERVENTORIA

Miercoles 21 Noviembre.

- No se ejecutan labores en Obra, se inicia con labores de coordinación de adquisición de materiales y suministro de obra.

Ing. Residente DIR. INTERVENTORIA

Jueves 22 Noviembre.

No se ejecutan labores, se procede a la adquisición de Bodega para los materiales, se reprograma socialización al 24 noviembre

Ing. Residente DIR. INTERVENTORIA

Viernes 23 Noviembre:

No se ejecutan labores en Obra, se adquiere bodega para alojamiento y disposición de materiales,

Ing. Residente DIR. INTERVENTORIA

Sabado 24 Noviembre

No se ejecutan labores de Obra, se efectua la Socialización del Proyecto, con las Comunidades de la Talabita y de la agencia,

Ing. Residente DIR. INTERVENTORIA

Lunes. 26 Noviembre.

No se ejecutan Labores de Obra.

Ing. Residente DIR. INTERVENTORIA

Martes 27 noviembre.

No se ejecutan Labores de obra.

Ing. Residente DIR. INTERVENTORIA

Miercoles 28 de Noviembre:
No se ejecutan labores de Obra.

Ing. Residente  DIR. INTERVENTORIA

Jueves 29 de Noviembre: DIR. INTERVENTORIA
No se ejecutan labores de Obra,

Ing. Residente  DIR. INTERVENT.

Viernes 30 de Noviembre
se hace la instalación de Punto de atención a la Comunidad en la Oficina de la inspección de Policía, y se deja buzon de sugerencias en esta oficina,

Ing. Residente  DIR. INTERVENTORIA

Sabado 1 de Diciembre.
No se ejecutan labores de obra,

Ing. Residente  DIR. INTERVENTOR

Lunes 3 de Diciembre.
No se Ejecutan labores de Obra,

Ing. Residente  DIR. INTER.

Martes 4 de Diciembre:
No se ejecutan labores de Obra,

Ing. Residente  DIR. INTERVENTORIA

Miercoles 5 de Diciembre:
No se Ejecutan labores de Obra,

Ing. Residente  DIR. INTERVENTORIA

Jueves 6 de Diciembre
No se ejecutan labores de Obra,

Ing. Residente.  DIR. INTERVENTORIA

Viernes 7 de Diciembre.

- Se definen con la alcaldía el adquirir el Vibrocompactador y Retrocargador, No se ejecutan Obras

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Sabado 8 de diciembre

- Nos ejecutan Obras

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

- Lunes 10 de Diciembre.

No se ejecutan Obras.

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Martes 11 de Diciembre,

- No se ejecutan Obras -

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Miercoles 12 de Diciembre

- Se descarga el Acero en la bodega, Para las obras -

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Jueves 13 de Diciembre.

No se Ejecutan Obras,

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Viernes 14 de Diciembre.

- Se descarga 800 sacos de 50kg de Cemento Para las Obras de Placa Huella y alcantarillado.

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Sabado 15 de Diciembre.

Nos ejecutan labores de Obra,

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Lunes 17 Diciembre.
Estado Tiempo: Seco. mañana, llovisna. Tarde.
Se inicia labores. con reconocamento. de Via, y Planificación de actividades a desarrollar,

Martes 18 de Diciembe: DIR. INTERVENTORIA

Estado Tiempo: Mañana: Seco. Tarde: llovisnas - Seco.
Se efectuan corte de acero Para flejes de Placa huella y riostras,
La retroexcavadora, que se tiene Para las labores, Presenta Problemas Mecanicos, y no se Puede laborar con ella.

Miercoles 19 de Diciembe: DIR. INTERVENTORIA

Estado Tiempo: Mañana: llovisnas (1/2 hora) Tarde: Seco -
Personal: 1. Maestro. 3: ayudantes.
Se le comunica a los Presidentes de Junta de hacer llegar hojas de vida Para Seleccion del Personal Para labores de obra.
Se continua Con el flejado del Acero,

Jueves 20 Diciembe: DIR. INTERVENTORIA

Estado Tiempo: Mañana: 1/2 hora llovisna, Tarde, 1/2 hora llovisna.
Personal. 1 Maestro 3 ayudantes.
Se Continua Con el figurado del Acero Para riostras y Placas huellas,

Viernes 21 Diciembre DIR. INTERVENTORIA

Estado Tiempo: Mañana Seco Tarde Seco
Personal. 1. Maestro, 3 Ayudantes
Se inicia replanteo del Tramo la Agencia, y se toman Niveles y Topografia. del los Ejes bordes Via.
- Se Continua Con el Flejado de Acero Para Drenes y Placas huellas.

DIR. INTERVENTORIA

Sabado 22 de Diciembre.
- Estado Tiempo. Mañana: Seco Tarde: Seco
Personal. 1 Maestro, 3 ayudantes, 1 Topografo 1 Aux. de T.O. 1 ING. Res.
Se Efectua replanteo de tramo Tajabita, use nivel y localiza ejes y bordes, la Via Puente en desplazamiento en los Primeros 20 mts, Pelo cual se debe desplazar 80cm a 1.mt hacia la izquierda, el tramo de la garita en los abscesas 100 a 130, se debe desplazar 50 cm Para no generar un muro sobre la cañada aledaña de Via.
Se Continua con Fijados de Acero

ING. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Lunes 24 Diciembre
Estado del Tiempo: Mañana: Soleado Tarde Soleado.
Personal. 1 Maestro 2. Ayudantes. 1 ING. Residente.
Se Continua con Fijado de Acero.
la retroexcavadora no se encuentra a con disponible.

ING. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Miercoles: 26 Diciembre
Estado Tiempo: Mañana y Tarde: Seco
PERSONAL: 1. Maestro, 2 ayudantes. 1. ING. Res. de obra.
Se Continua con Fijado del Acero.
Se Efectua limpieza a los costados del tramo de la Garita.

ING. Residente


DIR. INTERVENTORIA

Jueves 27 de Diciembre
Estado Tiempo: Mañana: Seco. Tarde: Seco.
PERSONAL DE OBRA: 1 Maestro, 2 Auxiliares, 1 ING. Residente
Se continua con Fijado del acero Para Placa huellas y Rostros.


ING. Residente

DIR. INTERVENTORIA


Viernes 28 Diciembre
Estado Tiempo: Seco - Tarde y Mañana
Personal: 1 maestro, 2 ayudantes, 1 ing. residente.
Se continua con flejado de acero,


Sabado 29 Diciembre
Estado Tiempo: Mañana: Nublado Hora. Tarde. Seco
Personal: 1 maestro, 2 ayudantes,
Se continua con flejado de Placa huella y contras
Se acopia material de Subbase y Triturado y se
Efectua instalación de la Señalización






Lunes 31 de Diciembre
Estado Tiempo. Mañana. Nublado, Tarde - Seco
Personal: 1. maestro. 2. ayudantes. 1. ing. Residente
Se continua con flejado y estacado de los bordes de
tramo agencia,






- Miercoles 2 de Enero
Estado Tiempo: Mañana Seco, Tarde Seco
Personal: 1 maestro, 2 ayudantes, ing. Residente
Se hacen flejes para bordillos, de conetes,


- Jueves 3 Enero
Estado Tiempo: Mañana Seco Tarde Seco
- Personal: 1 maestro 4 ayudantes, ing. residente,
Se continuan con flejados de bordillos y cunetas,
Se descargan 3 formaletas, formaleta, Salterones y Equipo menor

Viernes 4 Enero del 2019

Estado Tiempo: Mañana: Nubes Lluvia, Tarde Seco

Personal: 1. maestro, 4 ayudantes, 1 ing. Residente

Se continua con fundido de vigas riostras, y bordillos,

Se dejan 2 tubos de 36" en terraplen y 2 tubos en la agencia,

ing. residente

DIR. INTERVENTORIA

Sabado 5 Enero.

Estado Tiempo: Mañana Seco, Tarde. Seco

Personal. 1. maestro, 4. ayudantes, 1. ing. residente.

Se continuan con fundido, de cunetas,

Se Toman niveles y redireccionan, el eje en la abscisa

120 a 140, Para evitar Construccion de Muro

ing. residente

DIR. INTERVENTORIA

Lunes 7 Enero.

Estado Tiempo: Mañana Seco, Tarde. Seco

Personal: 1. maestro, 6 ayudantes, 1 ingeniero Residente

- Se Fijan. Niveles Para las alcantarillas,

Se Solicita tomar diseño Para Pocetas de descole, a 90°

Para alcantarilla Km 0+0.87 de la agencia, Pero se mas

adecuada Para el Terreno, la cual manifesto que

si se asumiera este diseño.

Se, hacen fundidos Para cunetas,

ing. residente

DIR. INTERVENTORIA

Martes. 8 Enero.

Estado Tiempo: Mañana. Nubes Lluvia, Tarde. Seco

Personal. 1 Maestro 6. ayudantes, ing. Residente

Se continuan con armado fijacion de hierro Para Pocetas

Se hace conformacion de Subrasante con Pajarilla,

- Se descarga 16 m3 de Subbase y 14 m3 de arena,

DIR. INTERVENTORIA

Miercoles 9 Enero:
Estado Tiempo: Mañana Seco. Tarde seco
Personal. 1. maestro, 2 oficiales, 4 ayudantes
Maquinaria. 1. retroexcavadora, 1. Vibrocompactador, 3. tromos, 2 saltarines,
Se inicia excavaciones, del alcantarilla 40+160. de la 4
agencia, Se excava encoles y descabe, se nivela PSO y se
instala tubería de 36', compactado y alineando,
con Saltarin, Se. Continua con filtrado de alcanta-
rillos, y Placa Huella,

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Jueves 10 Enero
Estado Tiempo: Mañana: Seco Tarde: Seco
Personal: 1. maestro, 2. oficiales, 4 ayudantes.
Maquinaria: 1. retroexcavadora, 1. Vibrocompactador, 3. tiempos, 2. saltarines.
Se extiende material de sobbase desde 40+00 al 40+080
Se inicia nivelacion y tomo de altura, de la misma,
Se Excava los encoles, del 40+160,
Se explana la via desde 40+90 al 40+140, y se
amplia la via, se Excava encoles y tubería del 40+87
de la agencia, Se continua con filtrado de viga riostras
y encoles, de tubería, se atiaca y compacta, Paso de tubería,

Ing. residente

DIR INTERVENTORIA

Viernes 11 Enero,
Estado Tiempo: Mañana: Seco Tarde Seco
Personal: 1 maestro, 2. oficiales, 4 ayudantes,
Maquinaria: 1. retroexcavadora, 1. Vibrocompactador, 4 saltarines, 3. Tromeos.
Se compacta sobbase desde 40+00 al 40+60, - se Continua con
Manejo Tubería de 40+87, y se excavan Encoles, del 40+160,
Se continua con filtrado viga riostra y encoles, Se recibe
Viga de Sobbase,

Ing. Residente

DIR. INTERVENTORIA

Sabado 12 De Enero.
Estado Tiempo: mañana. Seco. Tarde. Seco
Equipo 1. retroexcavadora, 1. Vibrocompactador. 2 Saltarines. 3 Tiombas.
Personal: 1. Maestro 2 oficiales. 5 ayudantes.
Se inicia labores de nivelacion y ampliacion de via del Tarabita, Se excava tuberia de 40+18 , 4 x instala tuberia, se llena y Compacta.
Se pixnta roca en la cajade cneole del 40+90, la cual x requiere hacer Excavacion en roca.
Se continua con compactacion de Solbase en la agnaa. Se instala Solado de los encajes descals de 40+160 de la agnaa,

Ing. residente

DIR. INTERVENTORIA

Domingo 13 de Enero
Estado tiempo: Mañana, soleado, Tarde lloviznas,
Personal: 1 Maestro. 2 oficiales. 5 ayudantes,
Equipo: 1. retroexcavadora, 1. vibroapisonador -
Se continua con excavacion de la tuberia del 40+90 de la Tarabita, se deja Parte de la excavacion,
Se requiere taladrar la caja de encole.

DIR. INTERVENTORIA

# INFORME DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**INFORME EJECUTIVO DE INTERVENTORIA**

Señores:
**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS**
SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FERREA

**PROYECTO**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| | |
|---|---|
| **INTERVENTOR:** | CODIPRO INGENIERIA LTDA. |
| **ÁREA DEL INFORME:** | Dirección de Interventoría. |
| **PERIODO DEL INFORME:** | Diciembre de 2018. |

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

- Constantemente se viene revisando la información contractual, legislativa, normativa, acuerdos OCAD, financiero, Anexos Técnicos y demás información básica del Proyecto.

- Con el Personal de la Federación Nacional de Cafeteros se ha coordinado el Inicio de las Obras en los cuatro (4) Municipios incluidos en este Proyecto.


- Se han venido revisando los Informes Semanales correspondientes al mes de diciembre, elaborados por el personal de campo de Interventoría, con el fin de enviarlos al Ingeniero Supervisor en Territorial Cauca, así como a la Subdirección Red Terciaria y Férrea, con la aprobación de esta Dirección.

- Se revisó el Informe Mensual No. 5 de Interventoría correspondiente al mes de diciembre de 2018 y se da aval para edición definitiva, con el propósito de enviarlo al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS para conocimiento y archivo en la Dirección Territorial Cauca, así como en la Planta Central.

- Se ha dado instrucción al personal de campo de la interventoría, para que se hagan cumplir las funciones expuestas en nuestro contrato y en el manual de Interventoría del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS.

- Se ha atendido lo solicitado por parte de INVIAS Planta Central referente a los trámites de Renuncia al Anticipo, Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra e Interventoría, etc.

Cordialmente,



**LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ**
Director de interventoría
Codipro Ingeniería Ltda.
M.P. 25202-28306 CND

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL DIRECTOR DE INTERVENTORIA DURANTE DICIEMBRE DE 2018.**

**PROYECTO**: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN LOS MUNICIPIOS DE BALBOA, MERCADERES, FLORENCIA Y SANTA ROSA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2017

**INTERVENTOR:** CODIPRO INGENIERIA LTDA.
**PROFESIONAL:** Luis Samuel Orduz Gómez.
**PERIODO DEL INFORME:** Diciembre de 2018.

| | |
|---|---|
| 3/12/2018 | Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer procedimientos a seguir. |
| 4/12/2018 | Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer procedimientos a seguir. Elaboración de Oficio CDP-171-2018 respecto al Inicio de Obras Contrato No. 0495 de 2018. |
| 5/12/2018 | Revisión informe semanal No 17 para Municipios de Balboa y Mercaderes. |
| 6/12/2018 | Revisión informe semanal No 17 para Municipios de Santa Rosa y Florencia. |
| 7/12/2018 | Revisión de Hojas de Vida propuestas por la Federación Nacional de Cafeteros, emitiendo concepto mediante Oficio CDP-172-2018. |
| 10/12/2018 | Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer la directriz a seguir. |
| 11/12/2018 | Coordinación y continua comunicación con Ingenieros Residentes, atendiendo desde Bogotá la Reunión en INVIAS Territorial Popayán. |
| 12/12/2018 | Revisión informe semanal No 18 para cada uno de los cuatro (4) Municipios. |
| 13/12/2018 | Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer procedimientos a seguir. |
| 14/12/2018 | Revisión y aprobación Acta de Costos de Interventoría No. 5 |
| 17/12/2018 | Revisión informe semanal No 19 para los Municipios de Florencia y Santa Rosa. Corrección Formato Renuncia del Anticipo. |
| 18/12/2018 | Revisión informe semanal No 19 para los Municipios de Balboa y Mercaderes. |
| 19/12/2018 | Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer procedimientos a seguir. |
| 20/12/2018 | Finalización informe semanal No 19 para cada Municipio. |
| 21/12/2018 | Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer procedimientos a seguir. |
| 24/12/2018 | Establecer Contacto con Ingeniero Residente para postular su Hoja de Vida. |
| 26/12/2018 | Comunicación telefónica con Ingenieros Residentes, para saber al detalle el desarrollo del Proyecto y establecer procedimientos a seguir. |
| 27/12/2018 | Finalización informe semanal No 20 para los Municipios de Florencia y Santa Rosa. |
| 28/12/2018 | Finalización informe semanal No 20 para los Municipios de Balboa y Mercaderes. |
| 31/12/2018 | Revisión y aprobación Informe Mensual No. 5 |

**LUIS SAMUEL ORDUZ GOMEZ**
Director de interventoría
Codipro Ingeniería Ltda.
M.P. 25202-28306 CND

# INFORMES ESPECIALISTA AMBIENTAL

| INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | |
|---|---|
| CODIPRO LTDA – CONTRATO INTERVENTORIA 921 DE 2018 | |
| **INFORME AMBIENTAL MENSUAL N°03** | |
| **Periodo: 01 Diciembre - 31 Diciembre 2018** | |
| Localización proyecto: Departamento del Cauca. | Fecha elaboración: Diciembre 2018. |

## PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

**OBJETIVOS**

- Realizar recorrido de obra en el área de influencia directa para la ejecución del contrato 495 de 2018 **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y/O REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS EN EL MARCO DEL OCAD PAZ EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO LEY 1534 OEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.**
- Revisar en campo las áreas sensibles y las más vulnerables desde el punto de vista ambiental.
- Verificar in situ manejo y disposición de escombros, estado de drenajes y fuentes de agua, estado de campamentos y fuentes de materiales para la ejecución de la obra.
- Hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para el desarrollo del presente contrato en materia ambiental.
- Verificar en campo las necesidades mínimas que debe cumplir el PAGA para su implementación durante la ejecución del presente contrato.

**Principales Actividades realizadas por el Contratista e Interventoría:**

- La interventoría realiza observaciones al PAGA Versión 1 presentado por el contratista para ser atendidas por La Federación de Cafeteros en la brevedad posible con miras a dar aprobación al documento que va servir como lineamiento al seguimiento al desempeño ambiental del contrato.

- El contratista presenta mediante correo electrónico la versión 02 del PAGA para los municipios de Mercaderes y Florencia el 12 de diciembre de 2018.

- La interventoría presenta observaciones a los ´PAGA de los municipios de Mercaderes y Florencia el día 14 de diciembre de 2018 para que sean atendidas por el contratista en la brevedad posible, con el objeto de aprobar la Guía ambiental que va a servir para el seguimiento ambiental del contrato.

- En revisión realizada por la interventoría encuentra observaciones para ajustar dentro de los formatos que hacen parte del documento PAGA, incluyendo falta de firmas en

original para proceder a su aprobación y posterior radicación ante la Subdirección de medio ambiental del INVIAS.

**Descripción de actividades del periodo:**

Para este periodo se trataron básicamente tres temas los cuales se describen a continuación:

**Permisos ambientales:** La interventoría solicitó al contratista gestionar visita técnica por parte de la Corporación para informales sobre las obras a ejecutar dentro del presente contrato y así determinar la necesidad de abrir expedientes para el otorgamiento de permisos ambientales.

**Aprobación PAGA:** Se enviaron observaciones por parte de la interventoría, el contratista radica los PAGAS para revisión de los municipios de Florencia y Mercaderes. La interventoría envía observaciones el día 14 de diciembre de 2018.

**Seguimiento ambiental:** La interventoría a través del residente ambiental está presente en los distintos comités verificando temas ambientales los cuales son consultados con el especialista ambiental para su concepto y aprobación.

CONCLUSIONES

- ***PAGA***. El PAGA para este periodo se encuentra en su segunda revisión por parte de la interventoría, para los municipios de Mercaderes y Florencia, para los municipios de Balboa y Santa Rosa no se ha vuelto a presentar documento por parte del contratista.

- **Permisos ambientales.** Se hace visita de campo por parte de la corporación, indicando que las obras a ejecutar no requieren de permisos ambientales a solicitar ante la Autoridad Ambiental.

- ***Transporte de Material.*** El contratista cuenta con fuentes de materiales que cumplen con la legislación ambiental para su operación.

- ***ZODMES***. Se presenta un ZODME el cual se encuentra en evaluación por parte de la interventoría para que cumpla de acuerdo a los requisitos legales que solicita la legislación colombiana en materia ambiental.

RECOMENDACIONES

- *PAGA*. Se solicita al contratista en la brevedad posible realizar las correcciones informadas por la interventoría; de tal forma, que el documento se ajuste a las necesidades ambientales que requiere la ejecución del presente contrato.

  Por otro lado, diligenciar los formatos que hacen parte del PAGA y recoger las firmas en original para proceder a sus correspondiente aprobación y posterior radicación ante la Subdirección de medio ambiente del INVIAS.

- **Permisos ambientales.** A la fecha, no se ha identificado la necesidad de permisos ambientales; sin embargo, hay que estar atentos a no generar pasivos ambientales dentro de la ejecución del presente contrato.

- **Transporte de Material.** La interventoría recomienda identificar los puntos críticos donde se van a realizar las obras de la vía, con el objeto de analizar la necesidad de establecer puntos de acopio temporal de materiales de construcción, teniendo en cuenta las distancias que conforman el presente contrato.

- **ZODMES**. Solo se presenta un ZODME, la interventoría recomienda gestionar varios puntos que cuenten con los permisos para disposición de material de derrumbes y/o excavación, verificando la documentación que aplica en materia ambiental para su legalización.

**Ing. RICAURTE ROJAS VARGAS.**
**Especialista Ambiental**
**Codipro ltda.**
