Villavicencio, 15 de agosto de 2024

Señores:
UT INTERVENTORÍA CCTV
ciudad

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES **JULIO** DE 2024

Respetados señores,

Conforme al contrato No. 775 de 2023, que tiene por objeto "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", a continuación, se presenta informe técnico de avance de las actividades.

Atentamente,

FABIAN GUZMAN SOTO
R.P Data Link Smart Solutions

Proyectó: Julián Lozano /
Project Manager

MEGAPROYECTOS

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACION DEL CONTRATO 3
2. OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO 3
2.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 3
2.2. ENTREGABLES DEL CONTRATO 4
3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 8
3.1. ALCANCE DEL INFORME 9
3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIVIDADES 9
3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES 12
3.4. REPORTE DE AVANCE Y CURVA S 40
4. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO 42
4.1. FINANCIERO 42
4.2. ADMINISTRATIVO 46
4.3. JURIDICO 48
5. ANEXOS 48

MEGAPROYECTOS

1. INFORMACION DEL CONTRATO

TABLA RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO	
NÚMERO DE PROCESO	LP-37-2023
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA
NÚMERO DE CONTRATO	775 DE 2023
OBJETO	CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD SIES CCTV 123 DEL MUNICIPIO DE LETICIA DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE LETICIA
NIT	899.999.302-9
CONTRATISTA	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
NIT	900.714.956-5
REPRESENTANTE LEGAL	FABIAN GUZMAN SOTO
CEDULA DE CIUDADANIA	86.079.311
VALOR DEL CONTRATO	$6.890.763.427,00
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	11 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE ACTA DE INICIO	19 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	18 DE OCTUBRE DE 2024
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	OTROSI DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2023 “FORMA DE PAGO”

2. OBLIGACIONES Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

En este ítem se relacionan las obligaciones a cargo del DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, frente al contrato y su forma de cumplimiento. Se aclara que la FASE 1 de estudios y diseños fue culminada a satisfacción, y actualmente nos encontramos en FASE II de implementación.

2.1. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
1) Entrega de los trabajos de CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS, conforme se estipula en la Cláusula Primera de este Contrato, en concordancia con la oferta presentada	Se finalizaron los entregables definidos en el “ANEXO 24 D “ENTREGABLES MÍNIMOS ESTUDIOS Y DISEÑOS – CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)” del ministerio del interior, teniendo en cuenta las especificaciones mínimas requeridas en el contrato 775 de 2024, pliego de condiciones y demás documentos anexos del proceso, cumpliendo así con los entregables de la fase I de estudios y diseños. Para la fase de implementación se ha adelantado el proceso de adquisición y transporte de las cantidades del proyecto, y se han adelantado preparativos para la operación en campo(Ver numeral 3.3).
2) Atender las recomendaciones del supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	Esta obligación se cumple de manera continua.

OBLIGACION	ESTADO DE CUMPLIMIENTO
3) Las demás contenidas en el pliego de condiciones y la propuesta presentada por el CONTRATISTA, y las que resulten de la normal ejecución del contrato.	Para la fase I de estudios y diseños se tuvo en cuenta lo definido en los pliegos de condiciones, estudios previos y anexos técnicos del proceso. De igual forma en la fase II de Implementación se ejecutan las actividades conforme a los entregables de los estudios y diseños, el presupuesto de cantidades definitivo y los requerimientos del proyecto en los pliegos de condiciones y documentos anexos.

2.2. ENTREGABLES DEL CONTRATO

En el marco del contrato 775 de 2023, el presupuesto se cantidades definitivo, conforme a los resultados de la fase I de estudios y diseños, se muestra en la siguiente tabla, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1	Elaboración de estudios y diseños	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00
SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS - 123					
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	9	$ 5.806.390,00	$ 52.257.510,00
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
EQUIPOS CCTV					
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00
2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (Puestos de trabajo, sillas, gaveta, porta cpu)	UND	3	$ 5.806.390,00	$ 17.419.170,00
3	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
4	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
5	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
6	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS	UND	0	$ 25.746.830,00	$ -
7	EQUIPO DE TRANSMISION Y RECEPCIÓN DE MICROONDAS (CIDEO Y CONTROL) DE BACKBONE ONDAS MILIMETRICAS	UND	0	$ 67.587.450,00	$ -
8	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
9	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
10	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
11	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
12	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
13	UPS DE 1.5KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
14	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
15	PLANTA ELECTRICA DE 20KVA Y TRANSFERENCIA	UND	0	$ 81.845.866,00	$ -
16	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
17	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
18	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
19	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
20	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
21	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
1	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	0	$ 5.120.616,00	$ -
2	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
3	ACOMETIDAS Y DISTRIBUCION ELECTRICA PUNTOS DE CAMARA Y NODOS	UND	0	$ 2.365.470,00	$ -
4	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
5	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
6	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
7	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
8	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
9	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
10	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
11	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
12	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
13	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
14	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
OBRAS CIVILES / ELECTRICAS / OTROS					
1	**ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS**	**GL**	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
2	**ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL**	**GL**	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00
ITEMS NUEVOS					
1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.982.465.908,00

Nota: En la tabla anterior, se muestran en relleno color amarillo, los ítems afectados, al final de la tabla se agregan los ítems nuevos que no estaban contemplados inicialmente.

En referencia a los entregables de la FASE I - ESTUDIOS Y DISEÑOS, entregados en físico y digital, y aprobados conforme al Anexo 24D del Ministerio del Interior, especificaciones mínimas requeridas, pliegos y demás documentos anexos al proceso, los cuales están disponibles para todas las partes interesadas en la carpeta de Google drive "**ENTREGABLES ESTUDIOS Y DISEÑOS - LETICIA**", con el siguiente link de acceso: https://drive.google.com/open?id=1DmP29qFAxMhcFxZtsm1Ty25LOuylpi-M&usp=drive_fs. De igual forma, hacen parte del expediente del proyecto entregado al ministerio del interior.

Para la FASE II - IMPLEMENTACIÓN, el ministerio del interior tiene definido el "FORMATO ENTREGABLES MÍNIMOS IMPLEMENTACIÓN - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) ANEXO 24 E", para la cual se crea la carpeta compartida "**ENTREGABLES FASE II IMPLEMENTACIÓN - SIES LETICIA"**, con el link de acceso: https://drive.google.com/drive/folders/1fMJxD2oUV7k5BxdC6rbn6KUxZl23GVMl?usp=sharing

A continuación, se presenta una tabla de seguimiento a los entregables, con su estado y/o aplicación, y un link de acceso a la carpeta contenedora del entregable:

ITEM	ENTREGABLE	CONTENIDO REQUERIDO	CHECK	LINK
1.1	**Actas generadas en la implementación**	Bitácora de implementación	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1YApguf2xjPLMivUWdfNASqymfOy_AfQe&usp=drive_fs
1.2	**Actas generadas en la implementación**	Acta de recibo final del Municipio	SIN INICIAR	
1.3	**Actas generadas en la implementación**	Actas comité técnico y de coordinación	EN CURSO	
1.4	**Actas generadas en la implementación**	Actas de recibo final del Ministerio	SIN INICIAR	
1.5	**Actas generadas en la implementación**	Pólizas todo Riesgo	SIN INICIAR	
1.6	**Actas generadas en la implementación**	Informe final	SIN INICIAR	
1.7	**Actas generadas en la implementación**	Consolidado actas por municipio y a nivel central	EN CURSO	
1.8	**Actas generadas en la implementación**	Actas Mininterior	SIN INICIAR	
1.9	**Actas generadas en la implementación**	Registro fotográfico por proyecto	EN CURSO	
2.1	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Alcances y descripción de la adecuación física ejecutada en el CCM, cuarto de equipos, Nodos, CAI´s y punto de visualización	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1p_MLarZz_arnGufbbtin66heaAE_corg&usp=drive_fs
2.2	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Fichas técnicas de materiales civiles (nuevos utilizados)	EN CURSO	
2.3	**Adecuación física civiles en calle, CAI´s, nodos, puntos de visualización de incluir memorias de cálculo**	Certificados de la obra civil	EN CURSO	
3.1	**Sistema térmico**	Cálculo de carga térmica de los equipos instalados en cada sitio	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1Chqau1kxwPRamX3B2ze-uPeuT_4iVoDy&usp=drive_fs
3.2	**Sistema térmico**	Plano de ubicación de equipos instalados y existentes (incluye ductería).	FINALIZADA	
3.3	**Sistema térmico**	Plano eléctrico de conexión de los equipos de aire acondicionado instalados y existentes	FINALIZADA	
3.4	**Sistema térmico**	Plano de ubicación de desagües instalada	FINALIZADA	
4.1	**Sistema eléctrico final**	Planos de la ubicación de la subestación instalada o modificada o tableros impactados, donde se muestre los detalles de rutas de canalizaciones especificando conductor, ductos o tuberías, registros	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1rsd5CvQnmRByI8H-1RDo-8-nWj4ryDN-&usp=drive_fs
4.2	**Sistema eléctrico final**	Cuadro de cargas instalado	SIN INICIAR	
4.3	**Sistema eléctrico final**	Diagrama unifilar instalado	SIN INICIAR	
4.4	**Sistema eléctrico final**	Distribución de redes eléctricas en el CCTV	SIN INICIAR	
4.5	**Sistema eléctrico final**	Registro fotográfico de componentes eléctricos	SIN INICIAR	
4.6	**Sistema eléctrico final**	Diseño eléctrico con las modificaciones realizadas	SIN INICIAR	
4.7	**Sistema eléctrico final**	Sistema de Puesta a tierra definitivo (planos record, informe de medidas de SPT en puntos de cámara, nodos, punto de visualización y CCM)	SIN INICIAR	
4.8	**Sistema eléctrico final**	Plan Cuadro de marquillado donde se especifique nombre o número tablero, circuito, y consecutivo de la salida eléctrica. (registro fotográfico)	SIN INICIAR	
4.9	**Sistema eléctrico final**	Formato de control de cableado	SIN INICIAR	
4.10	**Sistema eléctrico final**	Fichas técnicas materiales eléctricos instalados	SIN INICIAR	
4.11	**Sistema eléctrico final**	Certificación de elementos eléctricos instalados	SIN INICIAR	
4.12	**Sistema eléctrico final**	Certificación de cableado estructurado	SIN INICIAR	
4.13	**Sistema eléctrico final**	Autodeclaración o Certificación RETIE para instalaciones donde aplique y autocertificaciones	SIN INICIAR	
5.1	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 2D de cada NODO, punto de visualización y CAI (detalle de entrada de fibra y cortes que muestran los equipos instalados)	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=1cIKKTsu0Q_mGl4S3hfGkkzHVvlpoGn06&usp=drive_fs
5.2	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 2D hidráulicos y arquitectónicos con detalles de puertas, aires acondicionados, piso, techo y todas las áreas intervenidas en CCM y cuarto de equipos con cortes que muestran los equipos instalados)	SIN INICIAR	

MEGAPROYECTOS

5.3	**Diseños en 2D y 3D**	Planos 3D definitivo CCM, cuarto de equipos, punto de visualización, nodos y CAI´s intervenidos	SIN INICIAR	
5.4	**Diseños en 2D y 3D**	Render en 3D CCM, cuarto de equipos y punto de visualización definitivo. (recorrido virtual)	FINALIZADA	
6.1	**Detalle del tendido de Fibra óptica**	Planos de la topología de red definitiva: detalle del tendido de FO (en formato KMZ y AutoCAD) y topología de red por puntos de concentración	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=18FaO7QAXcbg_K_GiarNEpA33NcXdNO7m&usp=drive_fs
6.2	**Detalle del tendido de Fibra óptica**	Cartera de postes definitiva	SIN INICIAR	
7.1	**Site Survey**	Site survey de puntos de cámaras definitivo	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=185HoB70-_58Mx04qM6fe-jIIM1ctsRiV&usp=drive_fs
7.2	**Site Survey**	Formato de canalizaciones definitivo para puntos de cámara Según lo instalado. Indicar cantidades de canalización de acuerdo al medio (Zona blanda, dura, asfalto, adoquín, etc.) y de cajas de inspección con su respectiva medida	SIN INICIAR	
7.3	**Site Survey**	Inventario de los equipos instalados con sitio de ubicación e IP	SIN INICIAR	
8.1	**Permisos adquiridos**	Todos los permisos contemplados	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1UYZLJF8GV0IR-KkaGnYWah_KctBl4ukG&usp=drive_fs
8.2	**Permisos adquiridos**	Recibo a satisfacción de cada una de obras realizadas en la fase de implementación certificada por el responsable del área que emitió el permiso	SIN INICIAR	
8.3	**Permisos adquiridos**	Paz y salvo de escombrera	N/A	
8.4	**Permisos adquiridos**	Paz y salvo de recepción de desechos sólidos y tóxicos	N/A	
9.1	**Presupuesto detallado del proyecto**	Presupuesto definitivo firmado	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=142szFsDz7NoRJqbsce5Tt42VqcsutLMd&usp=drive_fs
9.2	**Presupuesto detallado del proyecto**	Cuadro de cantidades finales	EN CURSO	
9.3	**Presupuesto detallado del proyecto**	APU Finales firmados de todos los ítems.	EN CURSO	
10.1	**Estudios de interferencia para los enlaces inalámbricos**	Informe enlaces inalámbricos instalados. (carta de responsabilidad).	N/A	https://drive.google.com/open?id=1CTlhuCmNWxE_d0e0VXiMkE3DSnbXql_b&usp=drive_fs
11.1	**Topología de red**	Pruebas de OTDR carretes - Prueba de fibra	EN CURSO	https://drive.google.com/open?id=1h2yKt9NMCYcWhF7ppNsMzjxlNJ6WYpKR&usp=drive_fs
11.2	**Topología de red**	Planos de topología de red definitiva	EN CURSO	
11.3	**Topología de red**	Carta de empalmes	SIN INICIAR	
11.4	**Topología de red**	Pruebas de OTDR de anillos y ramales	SIN INICIAR	
12.1	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de toda la solución CCTV (mínimo debe contener sistema de grabación, estaciones de trabajo, impresora, visualización, integración, punto de cámara, detección de incendios, control de acceso, aire acondicionado, planta, UPS, radio enlaces y nodos)	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=13QUPxlJfyiZmh1iJoj1kAG6jbdlu8qjR&usp=drive_fs
12.2	**Especificaciones técnicas de la solución**	Plano de control de acceso	FINALIZADA	
12.3	**Especificaciones técnicas de la solución**	Nodos (detalle conexión eléctrica y rack de comunicación)	N/A	
12.4	**Especificaciones técnicas de la solución**	Punto de visualización (detalle conexión eléctrica y rack de comunicación)	N/A	
12.5	**Especificaciones técnicas de la solución**	Integración, visualización y grabación. Seguridad CAIs (detalle conexión eléctrica y rack de comunicaciones)	SIN INICIAR	
12.6	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de bloques del sistema (CCTV, CCTV-LAN+WAN, CCTV CENTRO DE CONTROL)	SIN INICIAR	
12.7	**Especificaciones técnicas de la solución**	Detección de incendio que incluya la ubicación de todos los elementos	SIN INICIAR	
12.8	**Especificaciones técnicas de la solución**	Mobiliario	SIN INICIAR	
12.9	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama del videowall	SIN INICIAR	
12.10	**Especificaciones técnicas de la solución**	Diagrama de iluminación	SIN INICIAR	
12.11	**Especificaciones técnicas de la solución**	Típicos de instalación (ingreso del cableado al rack, ingreso cableado videowall) y otros según las particularidades de cada proyecto	SIN INICIAR	
12.12	**Especificaciones técnicas de la solución**	Punto de cámara con dimensiones (poste, acometida, cámaras instaladas, gabinete, cajas de inspección, corona antiescalatoria, gabinete de equipos y radio enlace)	SIN INICIAR	

12.13	**Especificaciones técnicas de la solución**	Sistema de puesta a tierra en punto de cámara, axonometría, diseños de registros y otros complementarios	SIN INICIAR	
12.14	**Especificaciones técnicas de la solución**	Plano de distribución de equipos en RACK	FINALIZADA	
12.15	**Especificaciones técnicas de la solución**	Matriz de evacuación	SIN INICIAR	
12.16	**Especificaciones técnicas de la solución**	Fichas técnicas de equipos y componentes instalados	SIN INICIAR	
13.1	**Protocolo de pruebas y Demos**	Resultado de protocolos de prueba CCTV ejecutados (se debe realizar como mínimo las pruebas de: sistema de grabación, sistema de visualización, sistema contra incendio, sistema de iluminación, sistema de refrigeración	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1Un_6XQoubLMXw3opwiDj_Nmzg1MXqD15&usp=drive_fs
13.2	**Protocolo de pruebas y Demos**	Resultado protocolos de prueba al sistema LPR y/o analítica instalada	N/A	
13.3	**Protocolo de pruebas y Demos**	Resultado protocolos verificación de SPT ejecutado	SIN INICIAR	
13.4	**Protocolo de pruebas y Demos**	Resultado protocolos verificación de obras en calle ejecutado.	SIN INICIAR	
13.5	**Protocolo de pruebas y Demos**	Demos y laboratorios realizados (incluye registro fotográfico)	SIN INICIAR	
13.6	**Protocolo de pruebas y Demos**	Prueba de autonomía de las UPS (instaladas o intervenidas)	SIN INICIAR	
13.7	**Protocolo de pruebas y Demos**	Prueba de autonomía de planta eléctrica (instalada o intervenida)	SIN INICIAR	
14.1	**Capacitación.**	Plan y documentación capacitación a nivel administrativo	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=15-8mEuUjAKQG2q1qEpGN_nBJ96-p20kd&usp=drive_fs
14.2	**Capacitación.**	Plan y documentación capacitación a nivel de operadores	SIN INICIAR	
14.3	**Capacitación.**	Plan y documentación capacitación internacional	SIN INICIAR	
14.4	**Capacitación.**	Certificados de los ítems 14.1, 14.2 y 14.3	SIN INICIAR	
15.1	**Gerencia de proyectos.**	Acta de constitución del proyecto	FINALIZADA	https://drive.google.com/open?id=14L-xEPgK3oMpzzNS2nk4WLJcOUd1gMQ7&usp=drive_fs
15.2	**Gerencia de proyectos.**	Plan de gestión del proyecto	EN CURSO	
15.3	**Gerencia de proyectos.**	Plan de gestión del alcance, Tiempo, calidad, recurso humano, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados	EN CURSO	
15.4	**Gerencia de proyectos.**	Lecciones aprendidas (recopilación final)	EN CURSO	
15.5	**Gerencia de proyectos.**	Cronograma de verificación y entrega por municipio	EN CURSO	
15.6	**Gerencia de proyectos.**	Planes de acción implementados con asignación de recursos	EN CURSO	
15.7	**Gerencia de proyectos.**	Gerente de proyecto - gerentes locales e ingenieros residentes	EN CURSO	
15.8	**Gerencia de proyectos.**	Matriz de concentración	EN CURSO	
15.9	**Gerencia de proyectos.**	Formato certificado altura y CONTE por actividad (mensual)	EN CURSO	
15.10	**Gerencia de proyectos.**	Plan de manejo ambiental	EN CURSO	
15.11	**Gerencia de proyectos.**	Consolidado de aportes a seguridad social y parafiscales	EN CURSO	
15.12	**Gerencia de proyectos.**	Control de personal	EN CURSO	
16.1	**Certificados y manuales.**	Certificado de suministro de partes y repuestos	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1ndjpH_NrDE7FS1ppddfKB08RxqOK-9ke&usp=drive_fs
16.2	**Certificados y manuales.**	Certificado de licenciamiento de software	SIN INICIAR	
16.3	**Certificados y manuales.**	Certificado de todos los equipos de medida utilizados	SIN INICIAR	
16.4	**Certificados y manuales.**	Manual de operación de equipos	SIN INICIAR	
16.5	**Certificados y manuales.**	Manual aplicativo WEB (link, lista de usuarios y contraseñas)	SIN INICIAR	
17.1	**Mantenimiento**	Protocolo de intervención de terceros del sistema (equipos y fibra óptica, para futuras ampliaciones)	SIN INICIAR	https://drive.google.com/open?id=1gm4xh92QKv03EYEee0oExkvm1Zz3EHIb&usp=drive_fs
17.2	**Mantenimiento**	Protocolo de mantenimiento	SIN INICIAR	
17.3	**Mantenimiento**	Cronograma de mantenimiento	SIN INICIAR	
17.4	**Mantenimiento**	Formato de mantenimiento preventivo	SIN INICIAR	
17.5	**Mantenimiento**	Formato de mantenimiento correctivo	SIN INICIAR	

3. INFORME DE ACTIVIDADES DEL PERIODO

El objetivo del presente informe es dar cumplimiento al objeto del contrato No. N°775 de 2023 suscrito con el municipio de Leticia y Datalink Smart Solutions SAS (Megaproyectos de tecnología) como ejecutor del proyecto

para los estudios y diseños, e implementación sistema unificado CCTV y NUSE-123 para la ciudad de Leticia (Amazonas), solución tecnológica enfocada a la seguridad y convivencia ciudadana que impactará de manera positiva los indicadores de la ciudad.


3.1. ALCANCE DEL INFORME


El presente informe, está dirigido al supervisor y a la interventoría del Contrato de Suministro N°775 de 2023 y a los funcionarios del grupo de Infraestructura SIES del Ministerio del Interior, quienes, de una u otra manera, participan en el desarrollo y/o prestan asesoría a los servicios comprometidos en desarrollo del contrato. Abarca las actividades realizadas entre el 01 DE JULIO DE 2024 y el 31 DE JULIO DE 2024.


3.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La última versión del cronograma de actividades fue presentado al cierre de la fase I de los estudios y diseños, surtido el trámite de aprobación de sus entregables, por las partes interesadas, y tras la firma del acta de autorización de inicio de actividades de operación en campo, ajustado al nuevo presupuesto de cantidades, los diseños e ingeniería de detalle final aprobada, así como a los plazos contractuales y las condiciones del lugar de ejecución, en el marco del convenio marco 1340 de 2023 y el contrato derivado 775 de 2023, para la implementación del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 en Leticia-Amazonas.

A continuación, se presentan pantallazos del cronograma actualizado elaborado en la herramienta Microsoft Project, así:

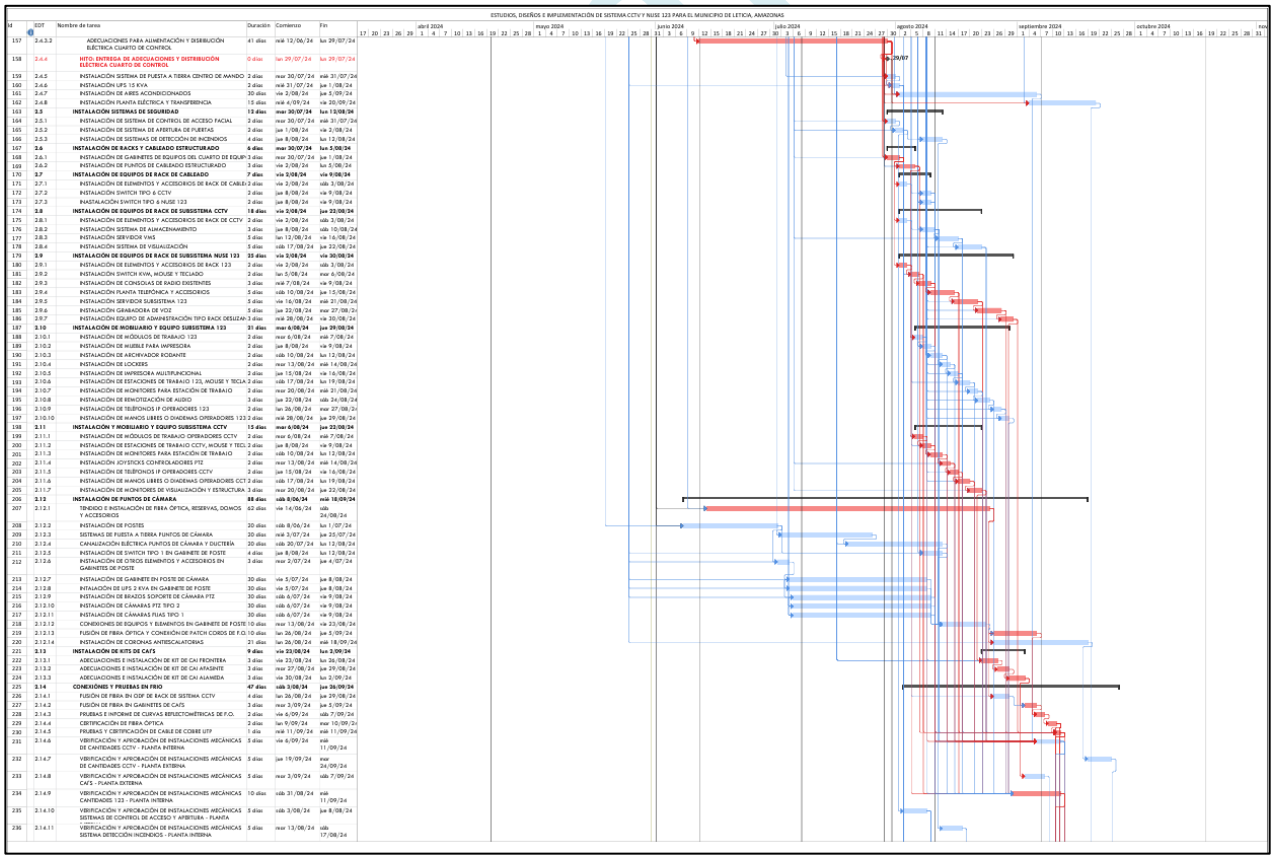

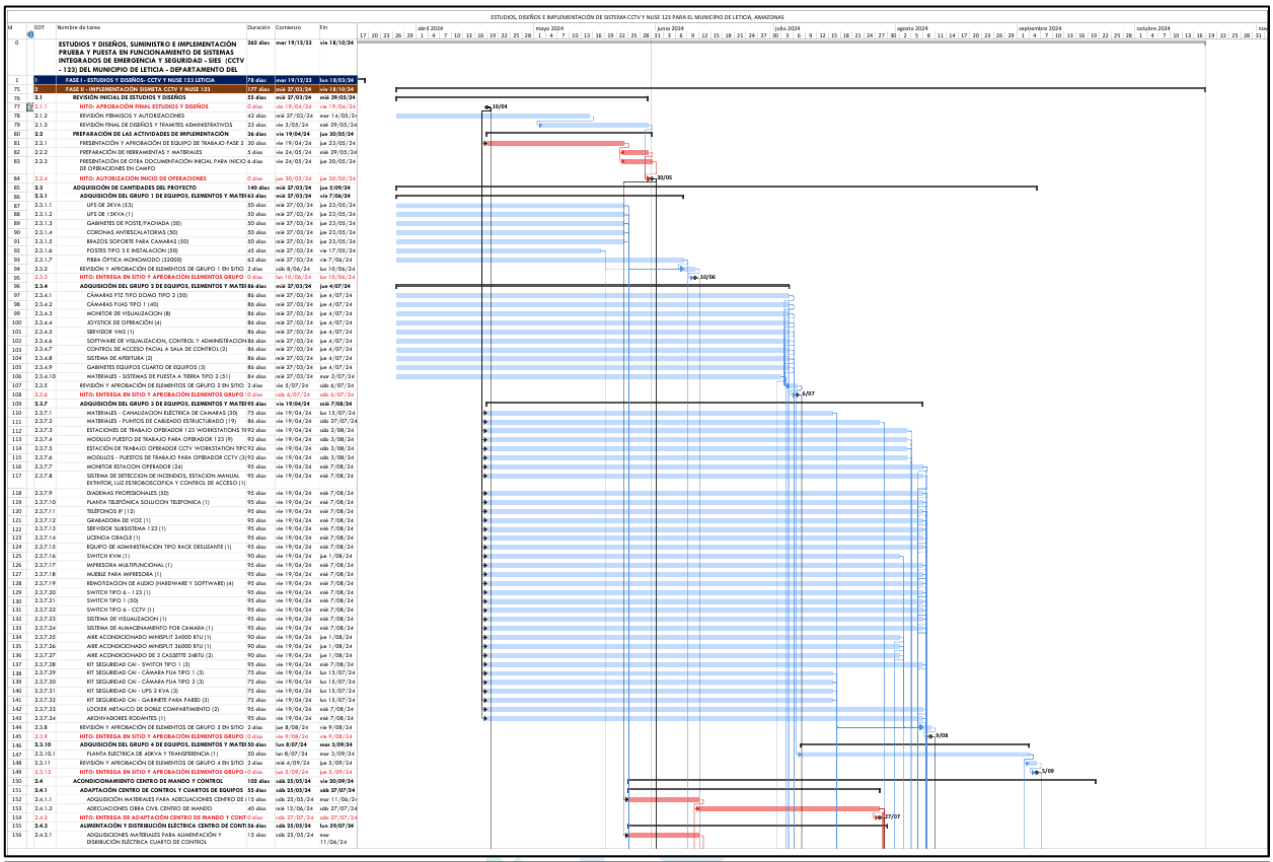

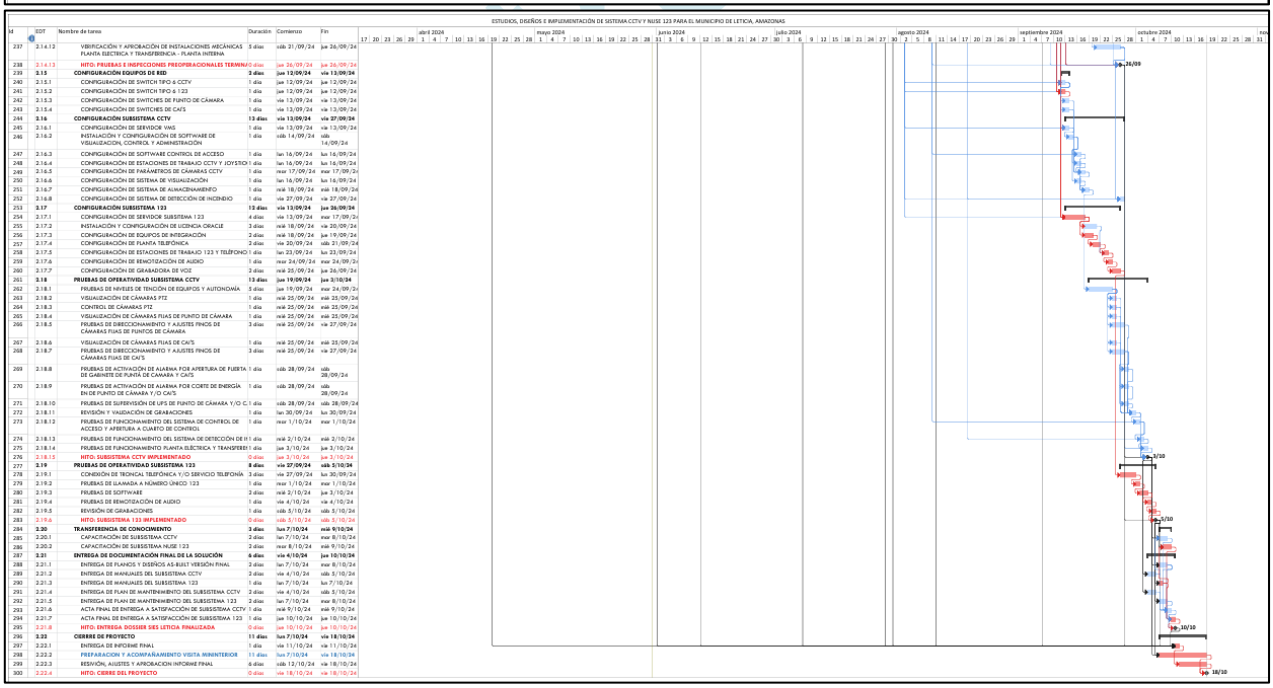


Para ver el detalle del cronograma actualizado al plan de choque ver el ***ANEXO N°1 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***.

De igual forma se estable el plan de choque mensualizado alineado al cronograma propuesto, con cortes mensuales de avance, para su seguimiento y control, aprobado por interventoría, municipio de Leticia y Ministerio del Interior. A continuación, se presenta un pantallazo de la tabla para el valor planeado de las metas mensuales, conforme a las cantidades del proyecto, así como la curva S de planeación:

PLAN DE CHOQUE CON PLANIFICACIÓN DE AVANCE X VALOR GANADO

PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN	VR/UNIT	VR/TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT
PROYECTO SIES CCTV-NUSE 123 LETICIA-AMAZONAS					$ 6.982.465.908,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	10,92%	25,57%	53,89%	89,25%	92,81%	100,00%
1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	0,00%	0,00%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%	2,98%
1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	$ 31.214.590,00	$ 280.931.310,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	3,62%	4,02%
2	MÓDULOS- PUESTOS DE TRABAJO 123	UND	9	$ 3.806.390,00	$ 32.257.510,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,75%	0,75%
3	Planta telefónica SOLUCION TELEFONICA + TEL IP	UND	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,74%	0,74%	0,82%
4	Grabadora de voz	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,43%
5	Servidor Subsistema 123	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,29%	1,29%	1,43%
6	LICENCIA ORACLE	UND	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,47%	0,52%
7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UND	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,28%
8	SWITCH KVM	UND	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	0,10%
9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UND	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,14%	0,14%	0,15%
10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UND	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	0,02%
11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UND	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	0,06%
12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UND	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%	1,40%
13	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,51%
14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	$ 31.214.590,00	$ 93.643.770,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,21%	1,21%	1,34%
15	MÓDULOS- PUESTOS DE TRABAJO CCTV	UND	3	$ 3.806.390,00	$ 17.419.170,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,25%	0,25%	0,25%
16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,24%	10,97%	10,97%	12,19%
17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,82%	3,04%	3,04%	3,38%
18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11,54%	12,89%	13,93%	14,57%	16,19%
19	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.300,00	$ 240.510.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,10%	3,10%	3,44%
20	SWITCH TIPO 6	UND	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,46%	0,51%
21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,10%	1,10%	1,22%
22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,99%	2,85%	2,85%	2,85%
23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,31%	0,31%	0,35%
24	UPS DE 2KVA	UND	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,24%	2,61%	3,13%	3,36%	3,73%
25	UPS DE 15KVA	UND	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,51%	0,59%	0,59%	0,76%	0,76%	0,85%
26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	12,00%	13,33%
27	SERVIDOR VMS	UND	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,00%	1,29%	1,29%	1,43%
28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	0,63%	0,69%
29	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UND	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%
30	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UND	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,24%	0,26%
31	KIT SEGURIDAD CAFs Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,97%	1,44%	1,55%	1,72%
32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,58%	1,84%	2,39%	2,63%	2,63%	2,63%
33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%	0,21%	0,21%	0,21%	0,30%	0,30%
34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,28%	0,36%	0,40%	0,40%	0,40%
35	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UND	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,67%	2,67%	2,67%
36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,07%	2,62%	2,62%
37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,17%	0,17%
38	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UND	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	0,35%
39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,52%	0,52%
40	SISTEMA DE APERTURA	UND	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,17%	0,19%
41	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UND	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%
42	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UND	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%
43	ARCHIVADORES RODANTES	UND	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,13%	0,13%
44	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%	1,15%	1,15%	1,15%
45	AUMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	1,40%	0,98%	1,40%	1,40%
46	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UND	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,37%	1,52%
47	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UND	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,27%	0,76%	0,76%
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,20%	3,73%	5,33%	5,33%	5,33%	5,33%
49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	$ 2.860.397,00	$ 68.647.128,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,98%	0,98%	0,98%
						$ -	$ -	$ 208.226.891,00	$ 208.226.891,00	$ 762.667.254,20	$ 1.785.483.514,60	$ 3.763.140.416,16	$ 6.231.852.737,40	$ 6.480.678.677,80	$ 6.982.465.908,00

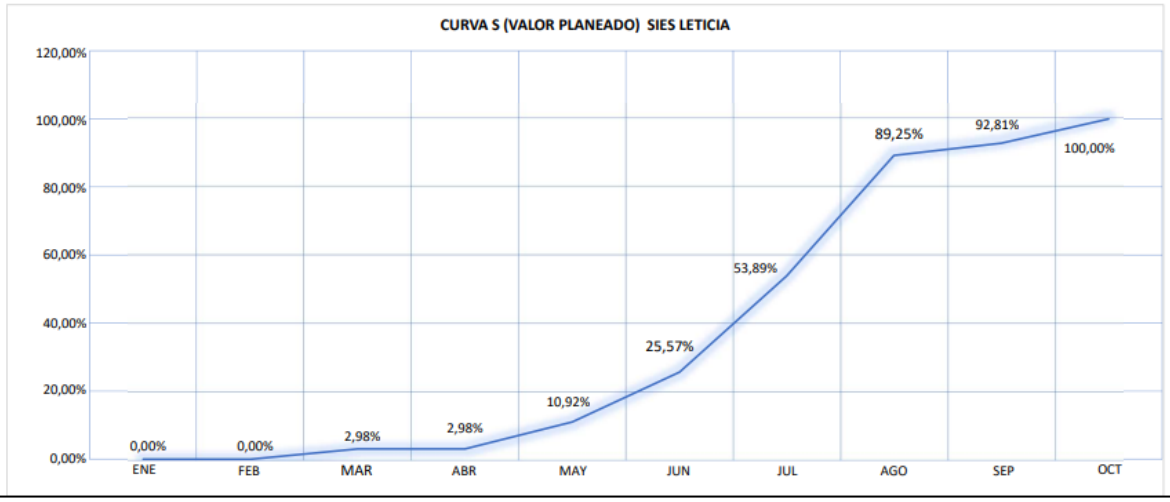

Como se puede observar en las imágenes anteriores, se estable el avance planeado para cada mes fijando el porcentaje de avance acumulado, el cual se muestra ilustrativamente mediante la gráfica de la curva S del valor planeado, con cierre al 18 de octubre de 2024, fecha de finalización del contrato 775 de 2023 y el convenio marco 1340 de 2023 (ver ***ANEXO N°2 - PLAN CHOQUE Y CURVA S PLANEACION SIES LETICIA.pdf***).

3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES

Durante el mes de JULIO de 2024, se continua con la ejecución del plan de choque para la fase II de implementación, se realizan nuevas adquisiciones y transporte a sitio de los elementos del proyecto, se cierra el trámite del otrosi modificatorio al convenio marco 1340 de 2023, celebrado entre la nación- Ministerio del interior - fondo nacional de seguridad y convivencia ciudadana, FONSECON - con el municipio de leticia amazonas, conforme a los resultados obtenidos en la fase I de estudios y diseños, y se cierra satisfactoriamente el trámite de permisos de intervención sobre la vía nacional Leticia-Tarapacá, con la autorización para realizar las actividades planificadas en dicho tramo, conforme a los diseños del proyecto . Así mismo, se inician operaciones, en cuanto al alistamiento de postes con la instalación de ductería interna, embonado, excavaciones, transporte a sitio e hincado de postes, las canalizaciones con la instalación de cajas de inspección, la preparación de las demás actividades. Se destacan las siguientes actividades y acciones desarrolladas en el presente periodo:

ADQUISICIONES:

- El día 30 de julio de 2024, se realiza validación por parte de la interventoría de los materiales adquiridos para el ítem de las canalizaciones eléctricas de puntos de cámara, los cuales se relacionan a continuación:


ACTIVIDAD	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	MARCA	REFERENCIA
CANALIZACIÓN ELÉCTRICA DE CÁMARAS Y NODOS	1	Cable concentrico 1x8+8 AWG	Metros	1500	PROCABLES	Cu 1x8+8 AWG, 600 V, PE/PVC 75°
	2	Capacete de 1"	Unidad	50	MAXWEL	IMC 1"
	3	Tuberia IMC de 1" x 3 mts	Unidad	100	MAXWEL	IMC 1"
	4	Cinta bandit 5/8	Rollo	5	MAXWEL	5/8
	5	Tuberia conduit PVC de 1" x 3 mts	Unidad	150	PLEXIN	Conduit PVC de 1"
	6	Formaleta para cajas de inspeccion de 60x60	Unidad	1	N.A	60X60
	7	Formaleta para cajas de inspeccion de 40x40	Unidad	1	N.A	40X40

La interventoría realiza validación de las cantidades, características y especificaciones de los elementos relacionados en la tabla anterior, aprobando el cumplimiento con las especificaciones mínimas requeridas y los diseños del proyecto.







GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218832°
Long -69.94216°
30/07/24 04:24 p. m. GMT -05:00
Google

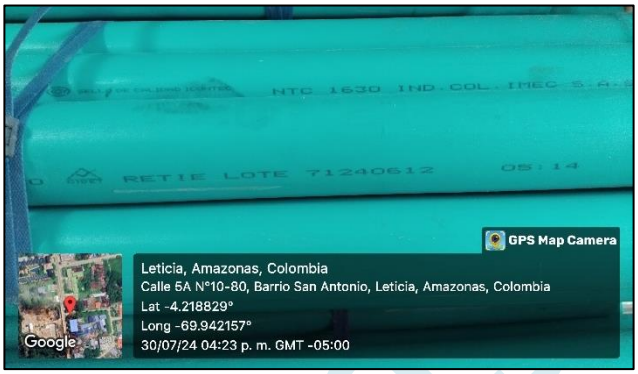
GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218829°
Long -69.942157°
30/07/24 04:23 p. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218832°
Long -69.942159°
30/07/24 04:23 p. m. GMT -05:00
Google


Stainless Steel Banding Strap
Width: 5/8"
Thickness: 0.5 mm
Length: 30 Meters/Roll
Material: Stainless steel
GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218813°
Long -69.942153°
30/07/24 04:22 p. m. GMT -05:00
Google

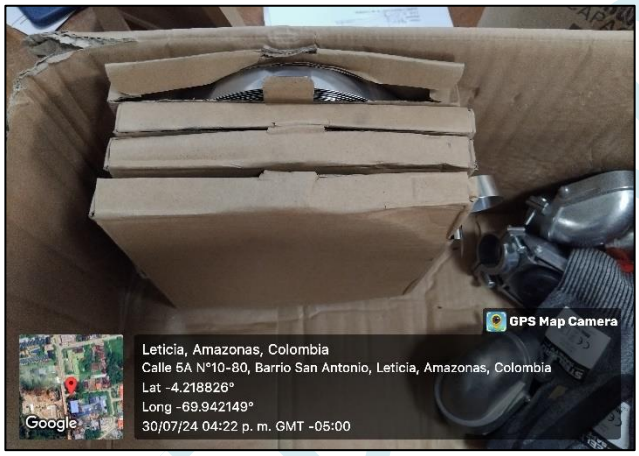
GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218826°
Long -69.942149°
30/07/24 04:22 p. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218845°
Long -69.942148°
30/07/24 04:21 p. m. GMT -05:00
Google



GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218851°
Long -69.942148°
30/07/24 04:20 p. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
Calle 5A N°10-80, Barrio San Antonio, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.218851°
Long -69.942147°
30/07/24 04:20 p. m. GMT -05:00
Google







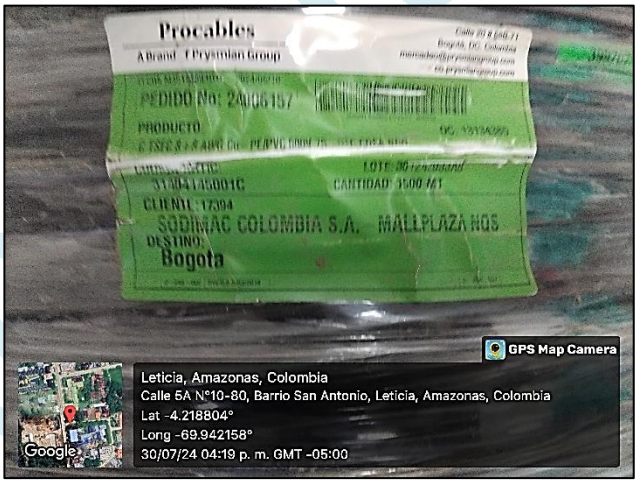

En el ***ANEXO N°3 - OC-93 MATERIALES CANALIZACIONES P-CAM.pdf*** y en el ***ANEXO N°10 - ORDEN DE DESEMBOLSO 008.pdf*** se puede validar las cantidades adquiridas.

- **Resumen consolidado de adquisiciones:**

A continuación, se presenta tabla con la trazabilidad de las adquisiciones de las cantidades aprobadas, por desembolsos del anticipo a través de la fiduciaria de occidente, así:

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021 WORD-EXCEL -POWER POINT	MICROSOFT	T5D03487	12	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.1. CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	50	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.2. CÁMARAS FIJAS TIPO 1	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	40	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.3. FIBRA ÓPTICA MONOMODO	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	CABLES SUPERIORES	CSFO24H200NR	32.000	CABLES SUPERIIORES COLOMBIA SAS	MP-LET-0032024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	CONTROLADORA DE VIDEO WALL	HIKVISION	DS-C30S-S11(V2)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO SALIDA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HO(V2)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	MODULO ENTRADA HDMI PARA CONTROLADORA	HIKVISION	DS-C30S-04HI(V2)	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.8. SISTEMA DE VISUALIZACIÓN	DECODIFICADOR 4K	HIKVISION	DS-6916UDI(B)	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.9. MONITOR DE VISUALIZACIÓN	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	8	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.10. JOYSTICK DE OPERACIÓN	JOYSTICK DE OPERACIÓN	HIKVISION	DS-1600KI(B)	4	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.11. UPS 1.5KVA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	50	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.12. UPS 15 KVA	UPS 15 KVA	POWEST	POWEST 15KVA	1	SENSAR INGENERIA SA	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	ALMACENAMIENTO EN CLUSTER 24 RANURAS	HIKVISION	DS-A82024D(B)	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.14. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	DISCO DURO	SEAGATE	EXOS 7E10 ST10000NM018B	34	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.15. SERVIDOR	SERVIDOR	HIKVISION	DS-VD22D-B/HW2	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	BODEGA	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-Base/64Ch	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-VSS-1Ch	61	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-ACS-Base/2Door	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-SmartWall-Module	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	3.16. SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN	HIKVISION	HikCentral-P-Service	5	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.1. POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	INGAL	14M X 750KGF	50	INGAL DE OCCIDENTE SAS	MP-LET-0022024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	GABINETES DE POSTE/FACHADA	QUEST	CE-2719	50	DAGA S.A.	MP-LET-0042024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.2. GABINETES DE POSTE/FACHADA	PLACA CON PROTECCIONES Y ELEMENTOS PARA GABINETE	N/A	N/A	50	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0762024	BODEGA	O.D.002	20/02/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.5. CORONAS ANTIESCALATORIAS	CORONAS ANTIESCALATORIAS	METALCO	MC-CA-18V-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	MP-LET-0052024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6. BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	METALCO	MC-BMCD-1.5-m	50	METALCO COMUNICACIONES SAS	MP-LET-0052024	BODEGA	O.D.003	04/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.9. GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	POWEST	NGBP-10044	3	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.11. CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	HIKVISION	DS-K1T673TDWX	2	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.12. SISTEMA DE APERTURA	ENROLADOR DE TARJETAS	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	1	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	MARCA	REFERENCIA	CANT.	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	ORDEN DESEMB N°	FECHA GIRO
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	CÁMARAS FIJAS TIPO 2	HIKVISION	DS-2CD2646G2-IZS	3	USA VIRTUAL MARKET SAS	MP-LET-0012024	PEDIDO	O.D.005	03/04/2024
EQUIPOS CCTV	6.1. KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UPS 1.5KVA	POWEST	POWEST 2KVA	3	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	BODEGA	O.D.004	12/03/2024
ITEMS NUEVOS	2.1. MONITOR ESTACION OPERADOR	MONITOR ESTACION OPERADOR	HP	1C4A7AA	24	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0072024	PEDIDO	O.D.004	12/03/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6 CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	CABLE ELÉCTRICO PARA CANALIZACIONES DE PUNTOS DE CÁMARA	PROCABLES	Cu 1x8+8 AWG, 600 V, PE/PVC 75°	1240	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	OC-80	BODEGA	O.D.008	15/07/2024

De igual forma, se presenta tabla con las demás órdenes de compra realizadas hasta la fecha, así:

TÍTULO	GRUPO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA	ESTADO	FECHA O.C.
EQUIPOS CCTV	3.3. FIBRA ÓPTICA MONOMODO	HERRAJES, DOMOS Y ACCESORIOS FIBRA ÓPTICA	WIMCO INTERNET COLOMBIA SAS	OC-32	BODEGA	8/05/2024
SISTEMA DE RECEPCION DE LLAMDAS	2.1. ESTACION DE TRABAJO OPERADOR	WORK STATION PARA OPERADOR	SENSAR INGENERIA SAS	MP-LET-0562024	PEDIDO	12/06/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.1. POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN	TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA POSTES	I E INTER ELECTRICAS SAS	OC-74	BODEGA	24/06/2024
ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA	4.6 CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	MATERIALES PARA CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PUNTOS DE CÁMARA	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION	OC-93	BODEGA	17/07/2024

En el ***ANEXO N°4 - CONSOLIDADO ORDENES DE COMPRA.rar***, se presenta el consolidado de las órdenes de compra relacionadas en las tablas anteriores.

MATRIZ DE ADQUISICIONES

- De conformidad con las adquisiciones hasta la fecha, se presenta la matriz de adquisiciones con los elementos principales, relacionando marcas, referencias o modelos, cantidades, seriales cuando aplique, una etiqueta de identificación, así como un campo para registrar su destino final de instalación, conforme a los puntos de intervención definidos en el proyecto, de igual forma, se registra el estado en el que se encuentra y la fecha de llegada a la bodega central y/o revisión por el cliente, finalmente la matriz cuenta con una celda de observaciones para registrar datos importantes a tener en cuenta para cada ítem de la matriz. La numeración asignada a cada ítem guardará trazabilidad con las cantidades del contrato 775 de 2024. A continuación, se muestra un pantallazo de la matriz.

MATRIZ DE CONTROL DE ADQUISICIONES — CÓDIGO: MT-OP-01 | VERSIÓN: 01 | FECHA: 9/07/2012

PROYECTO: PROYECTO SIES CCTV 123 LETICIA
OBJETO: ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
ALCANCE: CONTROL DE ADQUISICIONES E INVENTARIO DE BIENES Y ELEMENTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	DESTINO (Ver plano)	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE	FECHA DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES (Indique datos importante a tener en cuenta)
CCTV													
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	UND	50	50	CAM-P-0001	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055641		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0002	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055646		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0003	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055648		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0004	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055649		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0005	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055650		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0006	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055657		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0007	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055659		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0008	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055660		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0009	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055661		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		
					CAM-P-0010	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055662		BODEGA CENTRAL	28/06/2024		

De la matriz de control de adquisiciones se extraen los datos de los elementos principales adquiridos,

trazables a las cantidades definitivas del proyecto, así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO. TIPO 2.	UND	50	50	CAM-P-0001	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055641	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0002	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055646	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0003	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055648	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0004	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055649	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0005	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055650	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0006	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055657	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0007	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055659	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0008	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055660	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0009	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055661	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0010	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH2055662	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0011	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037406	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0012	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037436	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0013	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037450	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0014	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037452	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0015	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037459	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0016	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AH3037463	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0017	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW5145491	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0018	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW5145498	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0019	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704639	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0020	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704643	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0021	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704644	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0022	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704647	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0023	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704648	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0024	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704651	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0025	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704662	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0026	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704663	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0027	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704664	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0028	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704665	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0029	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704666	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0030	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704669	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0031	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704697	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0032	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704705	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0033	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704712	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0034	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704713	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0035	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704718	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0036	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704721	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0037	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704723	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0038	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704725	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0039	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	, AW6704726	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0040	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704727	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0041	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704728	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0042	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW6704729	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0043	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639741	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0044	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639755	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0045	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639805	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0046	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639808	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0047	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639809	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0048	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639810	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0049	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639814	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-P-0050	HIKVISION	DS-2DF8A442IXS-AEL	AW8639818	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	40	CAM-F-0001	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800498	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0002	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800499	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0003	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800500	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0004	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800501	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0005	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800502	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0006	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800503	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0007	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800504	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0008	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800505	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0009	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800506	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0010	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800507	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0011	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800508	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0012	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800509	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0013	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800510	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0014	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800511	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0015	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800512	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0016	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800513	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0017	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800514	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0018	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800515	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0019	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800516	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0020	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800517	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0021	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800518	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0022	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800519	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0023	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800520	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0024	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800521	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0025	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800522	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0026	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800523	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0027	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800524	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0028	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800525	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0029	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800526	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0030	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800527	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0031	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800528	BODEGA CENTRAL	28/06/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE
					CAM-F-0032	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800529	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0033	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800530	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0034	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800531	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0035	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800532	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0036	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800533	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0037	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800534	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0038	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800535	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0039	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800536	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0040	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800537	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO Y ACCESORIOS	UND	31200	31200	FOM	CABLES SUPERIORES	CSFO24H200NR v2	N/A	BODEGA CENTRAL	17/06/2024
3.7	MONITOR DE VISUALIZACIÓN	UND	8	8	MON-0001	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230357	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					MON-0002	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230358	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					MON-0003	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230364	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					MON-0004	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230365	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					MON-0005	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230404	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					MON-0006	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230405	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					MON-0007	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230406	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					MON-0008	HIKVISION	DS-D2055LU-Y	AZ2230415	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	4	JOY-0001	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529643	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					JOY-0002	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529644	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					JOY-0003	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529647	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					JOY-0004	HIKVISION	DS-1600KIB	AX6529649	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
3.9	UPS 1.5KVA	UND	50	50	UPS-0001	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950116	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0002	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950120	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0003	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950121	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0004	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950125	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0005	POWEST	NUOLT - 7306	231023-97950126	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0006	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870019	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0007	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870033	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0008	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870035	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0009	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870049	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0010	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870050	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0011	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870052	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0012	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870053	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0013	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870054	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0014	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870058	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0015	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870060	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0016	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870066	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0017	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870125	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0018	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870131	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0019	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870142	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0020	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870144	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0021	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870145	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0022	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870065	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0023	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870056	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0024	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870051	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0025	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870055	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0026	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870042	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0027	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870043	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0028	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870038	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0029	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870041	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0030	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870047	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0031	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870040	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0032	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870045	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0033	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870062	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0034	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870063	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0035	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870064	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0036	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870044	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0037	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870048	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0038	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870039	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0039	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870036	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0040	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870046	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0041	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870037	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0042	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870057	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0043	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870138	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0044	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870137	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0045	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870136	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0046	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870060	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0047	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870132	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0048	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870133	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0049	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870140	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0050	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870135	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870141	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0052	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870139	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0053	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870134	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
3.10	UPS 15 KVA	UND	1	1	UPS-0001	POWEST EA 9915	NUOLT -7572	310027859dc9902 100001	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
3.12	SERVIDOR	UND	1	1	SER-0001	HIKVISION	DS-VD22D-B/HW2	30086983798	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
4.1	POSTES TIPO 1 E INSTALACIÓN	UND	50	50	POST-0001	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0002	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0003	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0004	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE
					POST-0005	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0006	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0007	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0008	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0009	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0010	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0011	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0012	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0013	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0014	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0015	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0016	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0017	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0018	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0019	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0020	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0021	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0022	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0023	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0024	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0025	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0026	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0027	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0028	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0029	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0030	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0031	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0032	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0033	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0034	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0035	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0036	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0037	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0038	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0039	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0040	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0041	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0042	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0043	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0044	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0045	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0046	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0047	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0048	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0049	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
					POST-0050	INGAL	14m x 750kgf	N/A	BODEGA CENTRAL	16/05/2024
4.7	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	50	GAB-0001	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0002	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0003	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0004	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0005	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0006	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0007	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0008	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0009	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0010	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0011	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0012	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0013	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0014	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0015	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0016	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0017	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0018	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0019	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0020	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0021	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0022	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0023	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0024	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0025	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0026	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0027	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0028	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0029	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0030	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0031	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0032	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0033	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0034	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0035	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0036	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0037	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024

MEGAPROYECTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE
					GAB-0038	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0039	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0040	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0041	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0042	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0043	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0044	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0045	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0046	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0047	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0048	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0049	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					GAB-0050	QUEST	CE-2719	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	50	COR-0001	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0002	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0003	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0004	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0005	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0006	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0007	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0008	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0009	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0010	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0011	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0012	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0013	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0014	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0015	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0016	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0017	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0018	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0019	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0020	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0021	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0022	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0023	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0024	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0025	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0026	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0027	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0028	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0029	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0030	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0031	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0032	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0033	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0034	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0035	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0036	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024

MEGAPROYECTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE
					COR-0037	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0038	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0039	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0040	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0041	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0042	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0043	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0044	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0045	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0046	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0047	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0048	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0049	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					COR-0050	METALCO	CORONA ANTIESCALTORIA-18V	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
4.4	BRAZOS DE SOPORTE PARA CÁMARAS	UND	50	50	BRA-0001	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0002	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0003	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0004	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0005	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0006	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0007	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0008	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0009	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0010	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0011	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0012	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0013	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0014	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0015	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0016	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0017	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0018	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0019	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0020	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0021	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0022	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0023	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0024	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0025	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0026	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0027	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0028	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0029	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024

MEGAPROYECTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD FINAL	ETIQUETA	MARCA	REFERENCIA/MODELO	SERIAL	ESTADO	FECHA BODEGA Y/O REVISIÓN CLIENTE
					BRA-0030	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0031	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0032	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0033	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0034	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0035	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0036	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0037	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0038	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0039	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0040	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0041	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0042	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0043	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0044	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0045	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0046	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0047	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0048	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0049	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					BRA-0050	METALCO	BRAZO-SOPORTE-CAMARA-PTZ-1.50m	N/A	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	3	RACK-0001	POWSET	NGBP 10044	N/A	BODEGA CENTRAL	27/06/2024
					RACK-0002	POWEST	NGBP 10044	N/A	BODEGA CENTRAL	27/06/2024
					RACK-0003	POWEST	NGBP 10044	N/A	BODEGA CENTRAL	27/06/2024
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL	UND	2	2	CAF-0001	HIKVISION	K1T673TDWX	AD6880438	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAF-0002	HIKVISION	K1T673TDWX	AD6880440	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UND	1	1	SA-0001	HIKVISION	DS-K1F100-D8E	G35827555	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
6,1	KIT SEGURIDAD-CAMARA FIJA TIPO 1	UND	3	3	CAM-F-0041	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800538	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0042	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800539	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
					CAM-F-0043	HIKVISION	DS-2CD2646G2- IZS	FD7800540	BODEGA CENTRAL	28/06/2024
6,1	KIT SEGURIDAD-UPS 1,5 KVA	UND	3	3	UPS-0051	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870141	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0052	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870139	BODEGA CENTRAL	25/05/2024
					UPS-0053	POWEST	NUOLT - 7306	231206-21870134	BODEGA CENTRAL	25/05/2024

La matriz de adquisiciones se presenta en el ***ANEXO N°5 - MATRIZ DE ADQUISICIONES SIES LETICIA.xlsx***.

Cabe resaltar que, la matriz de adquisiciones fue compartida a la secretaría de gobierno y al almacén municipal del municipio de Leticia, con el objetivo de que se ingresen los elementos a su inventario, conforme a sus procedimientos internos institucionales, y para que se registre y retorne el documento con el código de identificación de cada elemento, registrándolo en el campo "**RÓTULO (ID) ALCALDÍA**" de la matriz (ver ***ANEXO N°5***).

La matriz anterior se encuentra trazable al presupuesto de cantidades definitivo, organizado en su modificación para el contrato 775 de 2024, conforme a las indicaciones del área jurídica de la alcaldía de Leticia, así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	**$ 208.226.891,00**	**$ 208.226.891,00**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	$ 31.214.590,00	$ 374.575.080,00
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	$ 5.806.390,00	$ 69.976.680,00
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	$ 57.170.316,00	$ 57.170.316,00
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	$ 36.211.924,00	$ 36.211.924,00
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO RACK DESLIZANTE	UN	1	$ 19.330.807,00	$ 19.330.807,00
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00

MEGAPROYECTOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
	nodo) TIPO 2				
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.982.465.908,00

TRÁMITE MODIFICACIONES CONTRACTUALES

- El otrosi modificatorio N°2 del contrato 775 de 2023, fue aprobado por la secretaría jurídica de la alcaldía de Leticia, y se encuentra en trámite de publicación en el SECOP II (ver ***ANEXO N°6 - OTROSI No. 2 CONTRATO 775-2023.pdf***), a continuación, se presenta un resumen de la modificación planteada, así:

SOPORTE TECNICO DE LA MODIFICACÍON
Que, el día 11 de diciembre de 2023 se suscribe el contrato de Obra N°775 de 2023, entre el Municipio de Leticia y DATA LINK SMART SOLUTIONS S.A.S.– NIT. 900.714.956-5. Que el plazo de ejecución del contrato se estableció por diez (10) meses. Que el valor inicial del contrato se estableció en SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($6.890.763.427,00). Que el día 19 de diciembre de 2023 se suscribió acta de inicio del contrato 775 de 2023.

Que el día 27 de diciembre se suscribió OTROSI DEL CONTRATO No. 775 DE 2023, donde se modificó la CLÁUSULA TERCERA – FORMA DE PAGO, para corregir el valor en números y letras del anticipo el cual presentaba un error involuntario al momento de elaborar la minuta del contrato.

Que mediante memorando fechado del día 29 de mayo de 2024 con referencia: "JUSTIFICACIÓN ADICIÓN DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES EN CONTRATO", presentado por parte de la INTERVENTORIA y radicado en la secretaria de Gobierno y Convivencia Ciudadana, se solicita realizar el trámite respectivo para la suscripción de OTROSI MODIFICATORIO al contrato 775 de 2023, teniendo en cuenta las justificaciones presentadas en lo referente al cambio de las cantidades del proyecto y valor total del proyecto.

Que el secretario de Gobierno, como supervisor delegado, requiere mediante la presente el visto bueno a la oficina jurídica para adelantar trámites correspondientes al OTROSI MODIFICATORIO N°2 de las cláusulas primera, segunda y tercera del Contrato N°775 de 2023.

Que para el Contrato de Obra No 775/2023 cuyo objeto es "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E I MPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.", se requiere hacer la respectiva MODIFICACION en la CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO, en lo referente al cuadro de cantidades, la CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO-, y la CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO del Contrato, quedando las demás estipulaciones sin modificación alguna.

Dando cumplimiento como lo regula la ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes de contratación estatal, como lo regula en la ley 1437 de 2011, así:

> ***LEY 1437 DE 2011 "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" en su artículo 45, dice:***
>
> *En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda.*

En consecuencia, se hace necesario **OTRO SI N°2 MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA No. 775 DE 2023,** el cual se regirá por las siguientes Clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar las siguientes cláusulas de. Contrato 775 de 2023, quedando así:

…*"**CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.- CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.** Para lo cual el CONTRATISTA realizara los trabajos conforme a las condiciones contenidas en los pliegos de condiciones definitivos, estudio de conveniencia y justificación de la necesidad, propuesta presentada por el CONTRATISTA y cuadro que a continuación se detalla:*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS					
1.1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLOBAL	1	**$ 208.226.891,00**	**$ 208.226.891,00**
2. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS					
2.1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UN	12	**$ 31.214.590,00**	**$ 374.575.080,00**
2.2	MODULOS- PUESTOS DE TRABAJO (PUESTOS DE TRABAJO, SILLAS)	UN	12	**$ 5.806.390,00**	**$ 69.976.680,00**
2.3	PLANTA TELEFÓNICA SOLUCION TELEFONICA	UN	1	**$ 57.170.316,00**	**$ 57.170.316,00**
2.4	GRABADORA DE VOZ	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**
2.5	SERVIDOR SUBSISTEMA 123	UN	1	**$ 99.803.929,00**	**$ 99.803.929,00**
2.6	LICENCIA ORACLE	UN	1	**$ 36.211.924,00**	**$ 36.211.924,00**
2.7	EQUIPO DE ADMINISTRACION TIPO	UN	1	**$ 19.330.807,00**	**$ 19.330.807,00**

	RACK DESLIZANTE				
2.8	SWITCH KVM	UN	1	$ 7.182.300,00	$ 7.182.300,00
2.9	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	UN	1	$ 10.639.880,00	$ 10.639.880,00
2.10	MUEBLE PARA IMPRESORA	UN	1	$ 1.094.519,00	$ 1.094.519,00
2.11	REMOTIZACION DE AUDIO (HARDWARE Y SOFTWARE)	UN	4	$ 1.062.200,00	$ 4.248.800,00
2.12	MANOS LIBRES Y/O DIADEMAS PROFESIONALES	UN	50	$ 1.956.450,00	$ 97.822.500,00
2.13	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3. EQUIPOS CCTV					
3.1	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UN	50	$ 17.023.500,00	$ 851.175.000,00
3.2	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UN	40	$ 5.900.120,00	$ 236.004.800,00
3.3	FIBRA ÓPTICA MONOMODO	ML	31200	$ 36.232,00	$ 1.130.438.400,00
3.4	SWITCH TIPO 1	UN	50	$ 4.810.200,00	$ 240.510.000,00
3.5	SWITCH TIPO 6	UN	1	$ 35.743.200,00	$ 35.743.200,00
3.6	SISTEMA DE VISUALIZACION	UN	1	$ 85.223.788,00	$ 85.223.788,00
3.7	MONITOR DE VISUALIZACION	UN	8	$ 24.834.359,00	$ 198.674.872,00
3.8	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UN	4	$ 6.092.565,00	$ 24.370.260,00
3.9	UPS DE 1.5KVA	UN	50	$ 5.211.492,00	$ 260.574.600,00
3.10	UPS DE 15KVA	UN	1	$ 59.021.172,00	$ 59.021.172,00
3.11	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UN	90	$ 10.341.887,00	$ 930.769.830,00
3.12	SERVIDOR VMS	UN	1	$ 99.803.929,00	$ 99.803.929,00
3.13	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UN	1	$ 48.516.369,00	$ 48.516.369,00
3.14	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 24000 BTU	UN	1	$ 13.178.300,00	$ 13.178.300,00
3.15	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 36000 BTU	UN	1	$ 18.366.395,00	$ 18.366.395,00
4. ELEMENTOS PASIVOS DEL SISTEMA					
4.1	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UN	50	$ 3.672.337,00	$ 183.616.850,00
4.2	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UN	50	$ 413.346,00	$ 20.667.300,00
4.3	ALIMENTACION Y DISTRIBUCION ELECTRICA CENTRO DE CONTROL	GL	1	$ 97.642.992,00	$ 97.642.992,00
4.4	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UN	50	$ 557.288,00	$ 27.864.400,00
4.5	SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control y nodo) TIPO 2	UN	51	$ 3.651.535,00	$ 186.228.285,00
4.6	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UN	50	$ 3.655.292,00	$ 182.764.600,00
4.7	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UN	3	$ 3.966.492,00	$ 11.899.476,00
4.8	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO	UN	19	$ 1.278.587,00	$ 24.293.153,00
4.9	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UN	2	$ 18.300.500,00	$ 36.601.000,00
4.10	SISTEMA DE APERTURA	UN	2	$ 6.537.886,00	$ 13.075.772,00
4.11	SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO	UN	1	$ 31.160.358,00	$ 31.160.358,00
4.12	LOCKER METALICO DE DOBLE COMPARTIMIENTO	UN	2	$ 1.633.269,00	$ 3.266.538,00
4.13	ARCHIVADORES RODANTES	UN	1	$ 8.785.000,00	$ 8.785.000,00
5. OBRAS CIVILES					
5.1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	GLOBAL	1	$ 80.371.084,00	$ 80.371.084,00
6. OTROS					
6.1	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	UN	3	$ 40.126.892,00	$ 120.380.676,00
7. ITEMS NUEVOS					
7.1	PLANTA ELECTRICA DE 40KVA Y TRANSFERENCIA	UN	1	$ 106.009.646,00	$ 106.009.646,00
7.2	AIRE ACONDICIONADO DE 2 CASSETTE 24BTU	UN	2	$ 26.483.515,00	$ 52.967.030,00
7.3	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UN	50	$ 7.446.459,00	$ 372.322.950,00
7.4	MONITOR ESTACION OPERADOR	UN	24	$ 2.860.297,00	$ 68.647.128,00
TOTAL					$ 6.982.465.908,00

EN APROBACIÓN

…*"**CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO.-** Para todos los efectos legales, administrativos y fiscales el valor del presente contrato es SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($ 6.982.465.908,00)."*…

…*"**CLÁUSULA TERCERA.- FORMA DE PAGO.-** El pago del presente contrato se realizará de la siguiente forma: un anticipo, correspondiente a la suma de MIL TRESCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($1.309.245.051.00), previo perfeccionamiento del contrato y presentación de acta de inicio. El saldo restante, será pagado mediante pagos parciales hasta completar el 90% del valor total del contrato, incluidas modificaciones, de conformidad con los avances en la ejecución de las actividades previstas previa presentación de actas parciales y con la presentación de la cuenta de cobro y/o factura, acompañado del informe de actividades y ejecución, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. El restante 10% del recurso, será pagado junto con el acta de liquidación del contrato, adjuntando la documentación requerida incluyendo informe, constancia de cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, los cuales deben contar con la certificación de recibo a satisfacción por parte del interventor del contrato. Los pagos se realizarán por medio de la Tesorería Municipal de Leticia, a través de transferencia en línea a la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos, previos los descuentos municipales y de ley aplicables. En caso de terminación anticipada sólo habrá lugar al pago de los bienes y servicios efectivamente adquiridos y/o prestados/implementados, liquidados de acuerdo a los valores establecidos en el contrato. El MUNICIPIO no pagará ninguna suma de dinero al contratista mientras este no haya cumplido previamente con los requisitos de ejecución del contrato que se celebra. Buen manejo y correcta inversión del anticipo. (CONSTITUCION DE FIDUCIA O PATRIMONIO AUTONOMO PARA MANEJO DE ANTICIPO) Con base a lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) en los contratos de obra, concesión, salud, o los que se realicen por licitación pública, el contratista deberá constituir UNA FIDUCIA o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del contrato correspondiente. El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista. Rendimientos del Anticipo: Los rendimientos que se generen patrimonio autónomo serán entregados al contratista como abono de los pagos pendientes. **NOTA.** Según lo señalado en la Guía para el manejo de anticipos mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable G-MACFMI-01, en los pliegos de condiciones, la Entidad Estatal debe establecer los términos y condiciones de la administración del anticipo a través del patrimonio autónomo. La constitución del patrimonio autónomo para el manejo del anticipo no exime a la Entidad Estatal de exigir la garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo. El Municipio podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes a favor del Contratista, hasta donde sea necesario, para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no corregidos, a garantías no cumplidas, al pago de multas, pleitos, acciones legales o perjuicios imputables al Contratista. Cuando el motivo que originó la retención sea subsanado por el contratista, el Municipio hará la devolución de los pagos retenidos."*…

…*"**CLÁUSULA CUARTA.- CARGO PRESUPUESTAL.-** El valor del presente contrato se encuentra respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No:*

N° de certificado de disponibilidad presupuestal de vigencia futura	Fecha de Expedición	Rubro	VALOR
391	09/02/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.47214.09.01.1.3.3.4.01	$794.478.925
1813	21/09/2023	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.3.1.1.07	$1.938.297.772
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.01.1.3.1.1.07	$43.279.742
844	11/04/2024	2.3.2.01.01.003.05.03.4501028.09.02.1.2.4.3.04	$ 5.172.997

"…

CLAUSULA SEGUNDA.-Las demás clausulas no modificadas con el presente otrosí permanecerán vigentes.

En consecuencia, de acuerdo con lo esbozado se da cumplimiento con los trámites administrativos para continuar con el proceso en la oficina asesora jurídica para darle celeridad con la revisión y elaboración del OTRO SI N°2, para que se pueda surtir y reflejar en el aplicativo SECOP II.

- Por otro lado, el 4 de julio de 2024 se perfeccionó la primera adición y prorroga al convenio 1340 de 2023, realizando las respectivas modificaciones, conforme a los resultados de los estudios y diseños y el plan de choque presentado y aprobado por las partes (ver ***ANEXO N°7 - PRIMERA ADICION Y PRORROGA CONVENIO 1340.pdf***).


  A continuación, se presenta un cuadro resumen con las modificaciones realizadas, así:

CONVENIO 1340 DE 2023	ANTES	DESPUES
FECHA DE FINALIZACIÓN	5 DE JULIO DE 2024	18 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 7.322.954.554,00**	**$ 7.371.407.293,00**

CONTRATO 775 DE 2023	ANTES	DESPUES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 6.890.763.427,00**	**$ 6.982.465.908,00**

COMITÉS DE SEGUIMIENTO

- Durante el mes de JULIO de 2024, se realizaron los comités de seguimiento con la participación de las partes interesadas del proyecto, Alcaldía de Leticia, Ministerio del Interior, Interventoría e implementador, los cuales se llevaron a cabo: el día 22 de julio de 2024.

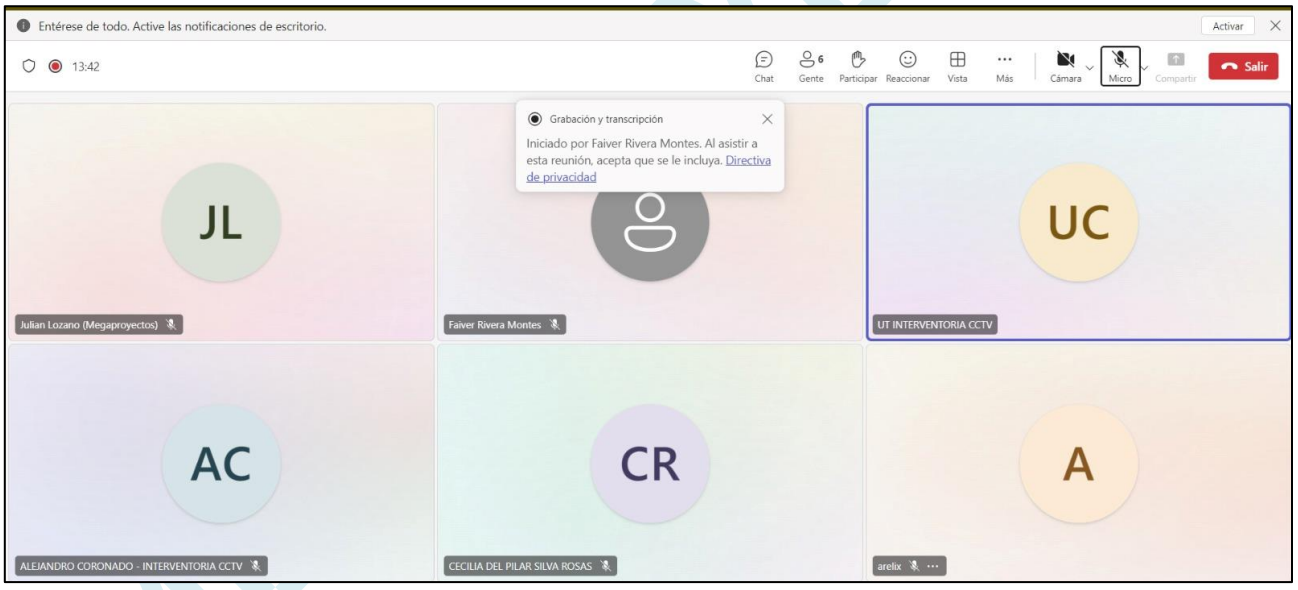

- De igual forma, se mantuvo permanente articulación con la interventoría al contrato, llevando a cabo reuniones y dialogo permanente, para la revisión de los avances del proyecto.

  Nota: Las actas de los comités y reuniones son llevadas por la interventoría.

AVANCES EN LA OPERACIÓN

- En cuanto a la operación en sitio, en el mes de JULIO, se avanzó con las actividades relacionadas con el alistamiento de la tubería interna de los postes de fibra, conforma a los diseños, tanto en la sección superior

como la sección inferior, conforme a los diseños del proyecto, así como con su embonado, la excavación de los puntos de cámara, el traslado de los postes a cada sitio y su hincado, tal como se resume en la siguiente tabla, así:

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTADO	HINCADO DE POSTE	CIMENTACIÓN	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVANDAL
1	BARRIO SAN ANTONIO - COLEGIO RAFAEL POMBO	CARRERA 11 CALLE 5		jul 05																						
2	CANCHA BARRIO EL ÁGUILA	CARRERA 12 CALLE 4		jul 05																						
3	MUELLE FLUVIAL VICTORIA REGIA	CARRERA 12 CALLE 3		jul 05																						
4	BARRIO PORVENIR - CUADRA CALIENTE	CALLE 3 CON CARRERA 10		jul 05																						
5	BARRIO PORVENIR - CENTAUROS	CALLE 3 CON CARERA 8		jul 05	jul 31																					
6	BARRIO PORVENIR - COLEGIO SAGRADO CORAZÓN	CARRERA 8 CON CALLE 5		jul 05																						
7	BARRIO COLOMBIA - HITO CEMENTERIO DE BRASIL	CARRERA 1 CALLE 1		jul 05																						
8	BARRIO LA FLORIDA - COOTRASUR	CARRERA 9 CON CALLE 6		jul 05	jul 31																					
9	PUERTO DE MIKE	CARRERA 12 CALLE 7		jul 08																						
10	BARRIO LA FLORIDA BBVA	CARRERA 10 CALLE 7		jul 08																						
11	BARRIO CENTRO - EL OPITA	CARRERA 11 CON CALLE 8		jul 08																						
12	BARRIO CENTRO - CALIPOLLO	CARRERA 9 CALLE 8		jul 08																						
13	BARRIO VICTORIA REGIA - INPEC	CARRERA 11 CON CALLE 13		jul 08																						
14	PUERTO CIVIL - CAI ALAMEDA	CARRERA 12 CALLE 8		jul 08	jul 30	jul 30																				
15	BARRIO CENTRO - GOBERNACIÓN	CARRERA 11 CALLE 10		jul 08	jul 31																					
16	BARRIO CENTRO - PONAL	CARRERA 10 CALLE 12		jul 08																						
17	BARRIO CENTRO - PUNTO DE LA AREPA	CARRERA 8 CON CALLE 9		jul 08																						
18	BARRIO JARDIN - PROCURADURIA	CARRERA 8 CALLE 12		jul 08																						

MEGAPROYECTO

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTADO	HIINCADO DE POSTE	CIMENTACIÓN	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVANDAL
19	BARRIO CENTRO - COLEGIO NORMAL	CALLE 10 CARRERA 9		jul 08					c																	
20	BARRIO VICTORIA REGIA - HIPER	CARRERA 10 CALLE 14	jul 18	jul 08	jul 25	jul 25																				
21	ENTRADA ANTIGUO ZOOLOGICO	CARRERA 10 AV. VASQUEZ COBO	jul 17	jul 09	jul 24	jul 25																				
22	BARRIO URIBE URIBE	CALLE 17 CON CARRERA 7	jul 16	jul 09	jul 24	jul 25																				
23	AEROPUERTO VASQUEZ COBO	AEROPUERTO INT. ALFREDO VASQUEZ COBO		jul 09	jul 24	jul 26																				
24	CANCHA LA ESPERANZA	CARRERA 5 CON CALLE 15		jul 09	jul 26	jul 26																				
25	BARRIO LA SARITA	CARRERA 3 TRANSVERSAL 14	jul 16	jul 09	jul 25	jul 25																				
26	BARRIO SIMÓN BOLIVAR - CARABINEROS	CARRERA 5 CALLE 14	jul 12	jul 09	jul 10	jul 11	jul 12	jul 12		jul 23	jul 23	jul 24	jul 24	jul 24												
27	TRANSVERSAL 14 BARRIO NUEVO II - ENTRADA A XINGU	TRANSVERSAL 14	jul 16	jul 09	jul 25	jul 27																				
28	TRANSVERSAL 15 BARRIO NUEVO II - ENTRADA AFASINTE	TRANSVERSAL 15	jul 17	jul 09	jul 25	jul 25																				
29	BARRIO NUEVO	BARRIO NUEVO	jul 17	jul 09	jul 25	jul 27																				
30	MANGUARE	MANGUARE	jul 17	jul 09	jul 25	jul 26																				
31	BARRIO IANE - HITO FRONTERA	CARRERA 1 CALLE 11	jul 18	jul 09	jul 26	jul 27																				
32	BARRIO11 DE NOVIEMBRE - HOTEL SIAMY	CARRERA 4 CON CALLE 9		jul 09																						
33	BARRIO SAN MARTIN - MI NEGRITA	CARRERA 3 CALLE 13	jul 17	jul 09	jul 24	jul 26																				
34	BARRIO PUNTA BRAVA - CREDIBAMBU	CARRERA 7 CON CALLE 7		jul 09																						
35	BARRIO DETRÁS DE CEMENTERIO	CARRERA 8 CON CALLE 15	jul 16	jul 09	jul 26	jul 27																				
36	AV INTERNACIONAL - CLEMENTE	CARRERA 6 CALLE 11		jul 09	jul 31																					
37	BARRIO LA ESPERANZA - ASENTAMIENTO VILLA OLÍMPICA	CARRERA 2 C CALLE 20		jul 09																						

MEGAPROYECTOS

SEGUIMIENTO ACT. x PUNT. CÁMARA			POSTE CAM							CANALIZACIÓN CAM						TIERRA			GAB		S	U	B	P	F	C
PUNTO	DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	EXCAVACIÓN POSTE	ALISTAMIENTO POSTE SUP	ALISTAMIENTO POSTE INF.	EMBONADO	TRANSPORTADO	HIINCADO DE POSTE	CIMENTACIÓN	CAJA INSP. 60X60	CAJA INSP. 40X40	CANALIZACIÓN CAJAS	TUBERÍA CAJAS	INST.N TUBERÍA IMC	CABLEADO ELÉCTRICO	INST. ELECTRODO 5/8	ANILLO COBRE 2/0	CABLE DE TIERRA	ARMADO GABINETE	GABINETE EN POSTE	INST. SWITCH	INST. UPS	INST. BRAZO PTZ	CÁMARA PTZ	CÁMARA FIJA	CORONA ANTIVANDAL
38	BARRIO CENTRO - VIDRIOS DEL AMAZONAS	CARRERA 6 CALLE 8		jul 09																						
39	BARRIO PORVENIR - LA POLA	CARRERA 6 CALLE 5		jul 09																						
40	BARRIO COLOMBIA	CARRERA 3 CALLE 4		jul 09																						
41	BARRIO GAITAN - FRONTERA 1	CARRERA 1 CALLE 6		jul 15																						
42	BARRIO GAITAN	CARRERA 4 CALLE 7		jul 15																						
43	BARRIO COLOMBIA - FRONTERA	CARRERA 1 CON CALLE 4		jul 15																						
44	BARRIO COLOMBIA - FRONTERA	CARRERA 6 CALLE 3		jul 15																						
45	KILOMETRO 8 - BALNEARIO	KILOMETRO 8	jul 31	jul 15	jul 30	jul 30																				
46	KILOMETRO 3 - COLEGIO SAN JUAN BOSCO	KILOMETRO 3	jul 31	jul 15	jul 26	jul 26																				
47	BARRIO SAN SEBASTIAN LA Y	KILOMETRO 3	jul 31	jul 15	jul 26	jul 26																				
48	BARRIO NIA NEMECHI	KILOMETRO 3.5	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29																				
49	KILOMETRO 7 - ENTRADA MUNDO AMAZONICO	KILOMETRO 7	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29																				
50	KILOMETRO 6 - SAN JOSÉ	KILOMETRO 6	jul 31	jul 15	jul 29	jul 29																				
SUMATORIA AVANCE X PUNTO DE CÁMARA			18	50	21	21	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Como se puede observar en la tabla anterior, durante el mes de JULIO, se avanzó con la excavación para 18 puntos de poste, el alistamiento con tubería y accesorios internos de la sección superior de 50 postes, el alistamiento de tubería y accesorios internos de la sección inferior de 21 postes, el embonado de 21 postes, y el transporte e hincado de 1 poste (Punto 26 en el Barrio Simón Bolívar - Carabineros).

Por otro lado, en este mismo punto se adelantó la instalación de la canalización eléctrica, en cuanto a la instalación de la caja de inspección de 60x60, caja de inspección de 40x40, la canalización entre cajas, la instalación de la tubería entre las cajas.

Para las actividades de operación en campo, relacionadas en la tabla anterior, el HSE veló permanentemente por la seguridad del personal en general por el cumplimiento de los requisitos en seguridad y salud en el trabajo, llevando organizadamente y reportando a la interventoría, la documentación diaria en cuanto a

charlas, ATS, permisos de trabajo e inspecciones preoperacionales, cuando así se requería. En el ***ANEXO N°16 - DOCUMENTACION SST DE OPERACION JULIO-24.pdf*** se entrega copia de toda la documentación SST de operación en campo para el mes de JULIO de 2024. De igual forma, se presenta en DVD la carpeta con el registro fotográfico del componente SST diario para el mes de JULIO de 2024, coincidente con los formatos registrados en la documentación anexa y con lo relacionado en la tabla anterior (VER ***ANEXO N°17 - REGISTRO FOTOGRAFICO SST OPERACIÓN JULIO-24.rar***).















GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
a 12-417, Carrera 5 #12-55, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.206771°
Long -69.938004°
12/07/24 12:14 p. m. GMT -05:00
Google


GPS Map Camera
Leticia, Amazonas, Colombia
a 12-417, Carrera 5 #12-55, Leticia, Amazonas, Colombia
Lat -4.206765°
Long -69.938018°
12/07/24 12:14 p. m. GMT -05:00
Google



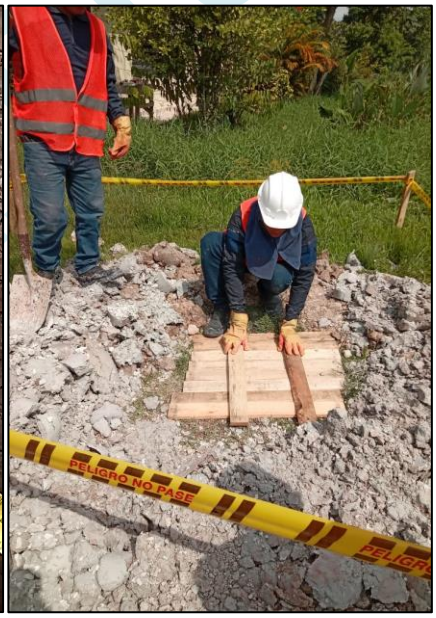


PELIGRO NO PASE














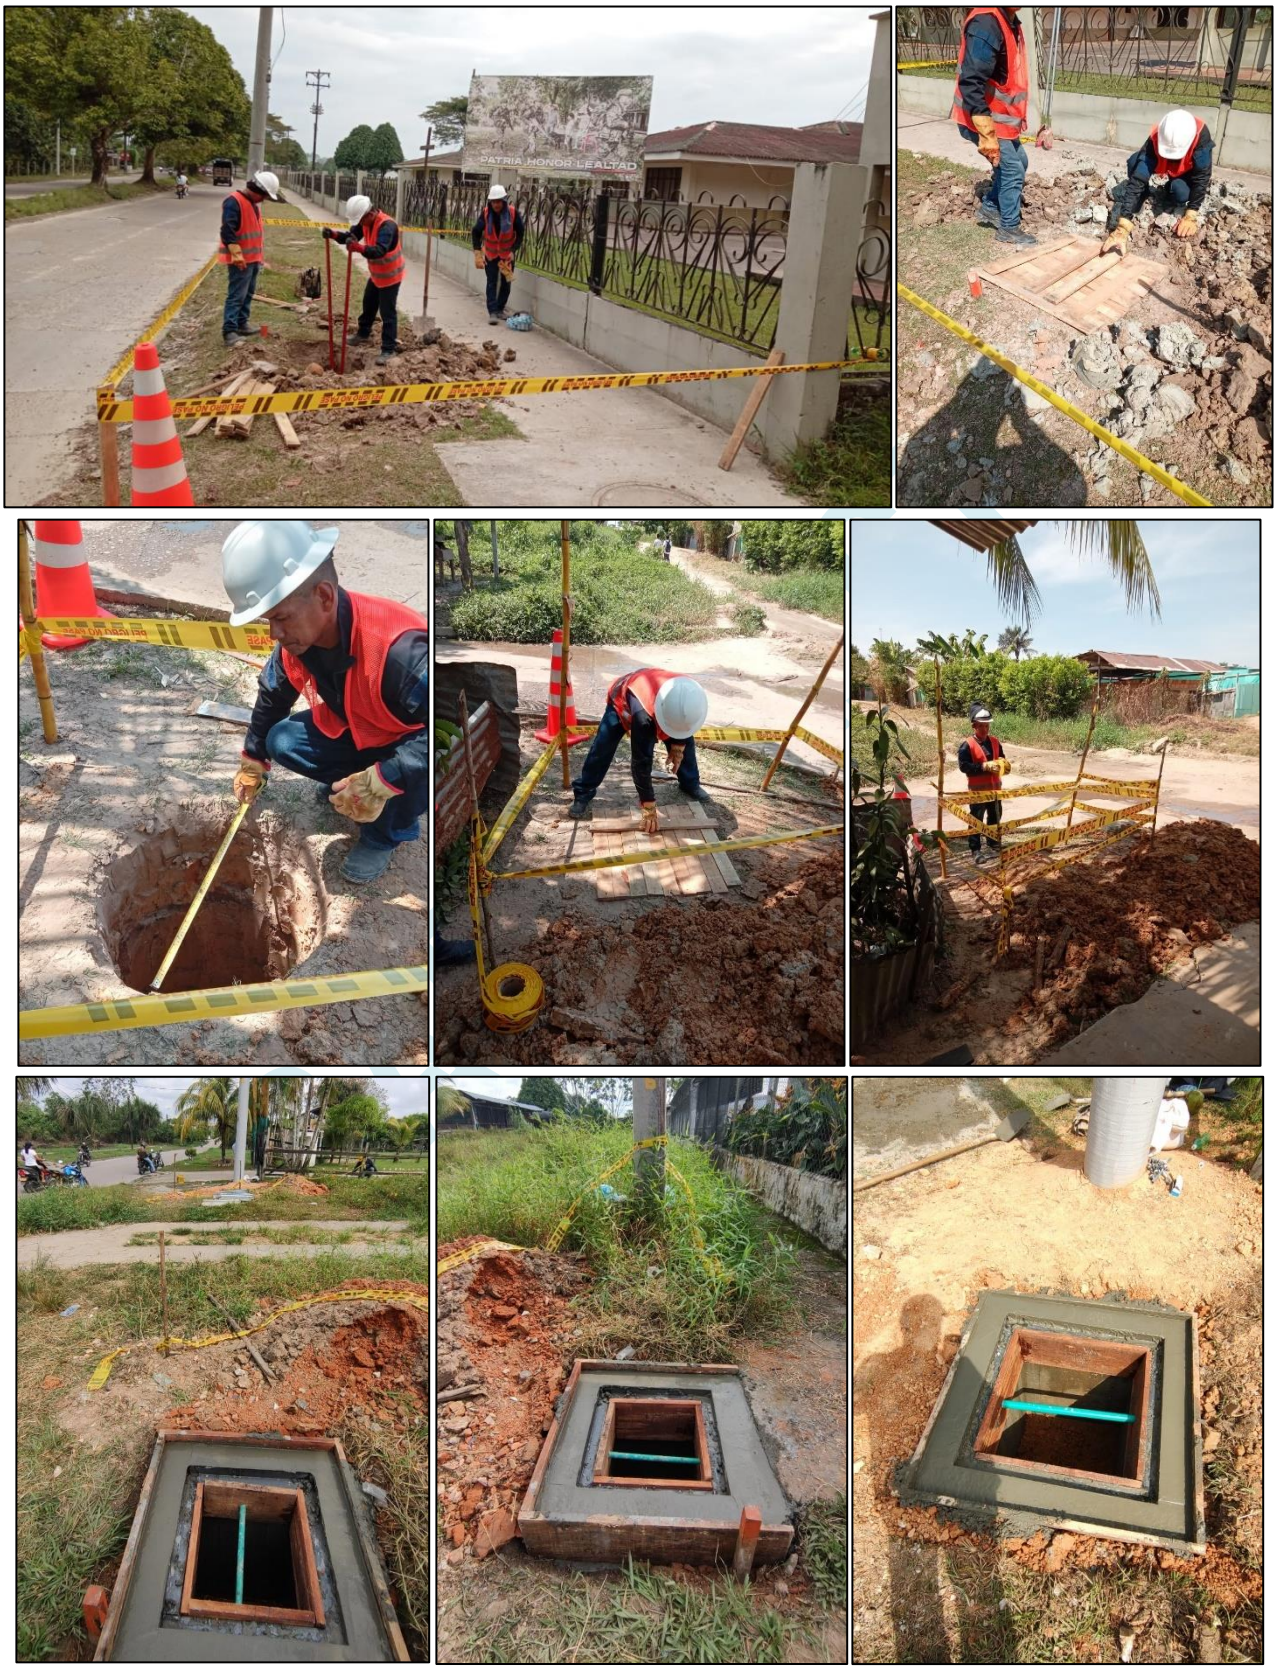

PATRIA HONOR LEALTAD



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, Y AMBIENTAL (SSTA)

Para el control del cumplimiento de la seguridad y salud en el trabajo en el desarrollo del proyecto SIES CCTV-NUSE 123 Leticia-Amazonas, se acordó con la interventoría crear una capeta de almacenamiento en la nube

donde se registre la documentación requerida en materia de seguridad y salud en el trabajo, y ambiental, carpeta creada y disponible en la plataforma Google Drive, así:

NOMBRE CARPETA	LINK
01.INTERVENTORIA SSTA	https://drive.google.com/drive/folders/1YeUr2HPvXvBFHO4i0XX8FRK1IMeZh1na?usp=drive_link

A continuación, se presenta tabla con la información requerida por la interventoría en materia de SSTA, a corte del 31 de JULIO, su chequeo, observaciones en lo referente a su aplicabilidad o no aplicabilidad y su ubicación dentro de la carpeta definida, así:

ITEM	REQUERIMIENTO	CHECK	OBSERVACIONES
1	Registro fotográfico de todas las actividades realizadas (Operativas/SSTA/Reuniones/Etc) como anexo en DVD o Memoria USB para entrega a la supervisión.	SI	Se entrega DVD con los registros solicitados (ver ***ANEXO N°18 - CARPETA CUMPLIMIENTO SSTA.rar***).
2	Ausentismo por Accidente de Trabajo	NA	No se registraron accidentes de tabajo
3	Ausentismo por Accidente de Tránsito (Trabajadores y Días)	NA	No se registraron accidentes de transito
4	Ausentismo por Enfermedad General (Trabajadores y Días)	NA	No se registro enfermedad laboral
5	Incapacidades por Enfermedad General (Registro de Trabajadores)	NA	No se registraron incapacidad por enfermedad laboral
6	Charlas de SSTA, describiendo la fecha, temática y cantidad de trabajadores	SI	Todos los días se realizaron las respectias charlas SSTA con el personal de obra. Los registros de asistencia, y formatos de las charlas se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
7	Plan de Manejo de Tránsito (PMT), registro fotográfico capacitaciones y de implementación	SI	El Plan de Manejo de Transito se implementa de acuerdo a las actividades desarrolladas de excavacion y de hincado de postes. Esta carpeta se encuentra almacenada en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO"
8	Señalización de las áreas de trabajo, capacitación y Registro fotográfico	SI	La señalización de las áreas de trabajo se realizó en los diferentes puntos de intervención, conforme al avance obra, durante las charlas diarias preoperativas se capacita al personal de obra en la forma correcta de instalar la señalización. Los registros de asistencia, formatos de las charlas y registro fotográfico, se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
9	Charla de seguridad, capacitación y registro fotográfico	SI	Todos los días se realizaron las respectias charlas de seguridad con el personal de obra. Los registros de asistencia, y formatos de las charlas se encuentran almacenadas en la carpeta "02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO", en cada semana y día específico.
10	Entrega de EPP y Dotación	SI	En el momento del ingreso de un colaborador, se realiza la respectiva entrega de los elementos de protección personal (EPP) y dotación, de acuerdo a sus funciones específicas. Los formatos de entrega de EPP y dotación se encuentran almacenados en la carpeta "01.BASE DE DATOS DEL PERSONAL", donde para cada colaborador se registra la información especifica de ingreso, incluida lo referente a entrega de EPP y dotación.
11	Evidencias SSTA	SI	Todas las evidencias del cumplimiento del SSTA se encuentran registradas en la carpeta definida por la interventoría "01.INTERVENTORIA SSTA"
12	Caracterización de AT	SI	Disponible en carpeta "01.INTERVENTORIA SSTA"
13	Capacitaciones	SI	En el momento del ingreso de personal nuevo se realiza las inducciones, se encuentran en "01. BASE DE DATOS DEL PERSONAL" > "01. CUADRILLA DE HINCADO POSTES" > Documento PDF "28 Asistencia a Capacitación de responsabilidades y obligaciones Decreto 1072"
14	Listado y planillas de la seguridad social (Cuadrillas de Operación)	SI	Las planillas de pago de la seguridad social de las cuadrillas de operación y demás colaboradores del proyecto se presentan anexos a los informes mensuales de ejecución. (ver ***ANEXO N°15 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JULIO 2024.pdf***).
15	Accidentes laborales	NA	No se registraron accidentes laborales
16	Ausentismo	NA	No se registraron ausentismos

ITEM	REQUERIMIENTO	CHECK	OBSERVACIONES
17	Inspecciones	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "DOCUMENTOS REQUERIDOS"
18	Permisos de trabajo	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "DOCUMENTOS REQUERIDOS"
19	Registro fotográfico (Actividades, Charlas, etc)	SI	Los formatos de inspección pueden variar según las actividades a realizar y otras se realizar diariamente. Esta carpeta se encuentra definida en "02. DOCUMENTOS DE CAMPO" > "REGISTRO FOTOGRAFICO"
20	Registro de inducción	SI	En el momento del ingreso de personal nuevo se realiza las inducciones, se encuentran en "01. BASE DE DATOS DEL PERSONAL" > "01. CUADRILLA DE HINCADO POSTES" > Documento PDF "20. CERTIFICADO DE INDUCCIÓN DEL CARGO"
21	Reporte de actos y condiciones inseguras	NA	No se registraron actos o condiciones inseguras
22	Listado de personal	SI	Las Listas de asistencia del personal se encuentran adjuntados en la carpeta DOCUMENTOS REQUERIDOS los cuales lo pueden encontrar de la siguiente manera 01. INTERVENTORIA SSTA > 02. CUMPLIMIENTO EN CAMPO > 01. JULIO > SEMANA 1 al 4 > 2 al 31 07 2024 > DOCUMENTOS REQUERIDOS > (DOC PDF) LISTA ASISTENCIA Charla SST
23	Certificado de accidentalidad	SI	El certificado de accidentalidad se encuentra en la carpeta "16. CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD"
24	Ambiental	SI	Ambiental se encuentran en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "18. AMBIENTAL"
25	Matriz de Riesgo	SI	La matriz de riesgo se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "09. MATRIZ DE RIESGOS"
26	Plan de Manejo de Emergencia	SI	El plan de emergencia se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "11. PLAN DE EMERGENCIA"
27	Plan de seguridad Industrial	SI	Se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "20. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL"
28	Plan de Manejo Ambiental	SI	Se encuentra en el DRIVE "01.INTERVENTORIA SSTA" carpeta "19. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"
29	Sistema de Gestión de Cambios	SI	Los cambios realizados a los formatos, de conformidad con las observaciones de la interventoría en cuanto a forma y detalles específicos del proyecto SIES Leticia, se registran en una tabla que permite ver la trazabilidad de documentos SSTA del proyecto.

Para ver el detalle de toda la información relacionada en la tabla anterior en materia de SSTA (ver el ***ANEXO N°18 - CARPETA CUMPLIMIENTO SSTA.rar***).



















3.4. REPORTE DE AVANCE Y CURVA S

Conforme a la matriz de seguimiento con el plan de choque aprobada por las partes, se presenta el avance acumulado a corte 31 de JULIO de 2024, donde se registra el avance referente a las adquisiciones de los elementos adquiridos, relacionados en la siguiente tabla:

						ASIGNACION PORCENTUAL DE ACUERDO CON SU PESO DE UNIDAD QUE REPRESENTA SU VALORACIÓN DEL AVANCE POR CADA ITEM					AVANCE ACUMULADO PARCIAL JULIO - SEM 4					
												AVANCE (%)		52,17%	PERIODO:	31-jul	
	ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CAN	Peso porcentual Financiero del componente	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	TOTAL	ADQUISICIONES NACIONALES E INTERNACIONALES CON OC	IMPORTACION Y/O MOVILIZACIÓN A SITIO PUESTO EN BODEGA	IMPLEMENTACION Y ADECUACIONES (CIVILES / ELECTRICAS)	PRECONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA / DOCUMENTACION, VERIFICACION Y ENTREGA	ACUMULADO PORCENTUAL EJECUCIÓN	ACUMULADO POR PESO PORCENTUAL
Total Estudios y Diseños	1	ESTUDIOS Y DISEÑOS	GLB	1	2,98%	100%					100%				100,00%	2,98%	
Fase II: fase Implementación	1	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR 123 WORKSTATION TIPO 1	UND	9	4,02%	60%	10%	20%	10%	100%	9				60,00%	2,41%	
	14	ESTACION DE TRABAJO OPERADOR CCTV WORKSTATION TIPO 1	UND	3	1,34%	60%	10%	20%	10%	100%	3				60,00%	0,80%	
	16	CÁMARAS PTZ TIPO DOMO (TIPO 2)	UND	50	12,19%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	8,53%	
	17	CÁMARAS FIJAS TIPO 1	UND	40	3,38%	60%	10%	20%	10%	100%	40	40			70,00%	2,37%	
	18	FIBRA ÓPTICA MONOMODO + FUSION	ML	31200	16,19%	60%	10%	20%	10%	100%	31.200	31.200			70,00%	11,33%	
	21	SISTEMA DE VISUALIZACION	UND	1	1,22%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,73%	
	22	MONITOR DE VISUALIZACION	UND	8	2,85%	60%	10%	30%	0%	100%	8	8			70,00%	1,99%	
	23	JOYSTICK DE OPERACIÓN	UND	4	0,35%	60%	10%	20%	10%	100%	4	4			70,00%	0,24%	
	24	UPS DE 2KVA	UND	50	3,73%	60%	10%	20%	10%	100%	50	50			70,00%	2,61%	
	25	UPS DE 15KVA	UND	1	0,85%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	0,59%	
	26	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO POR CAMARA	UND	90	13,33%	60%	10%	20%	10%	100%	90				60,00%	8,00%	
	27	SERVIDOR VMS	UND	1	1,43%	60%	10%	20%	10%	100%	1	1			70,00%	1,00%	
	28	SOFTWARE DE VISUALIZACION, CONTOL Y ADMINISTRACION	UND	1	0,69%	60%	10%	20%	10%	100%	1				60,00%	0,42%	
	31	KIT SEGURIDAD CAI's Y/O ESTACIONES DE POLICÍA	KIT	3	1,72%	60%	10%	20%	10%	100%	1,20	1,20			28,00%	0,48%	
	32	GABINETES DE POSTE/FACHADA	UND	50	2,63%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	1,84%	
	33	CORONAS ANTIESCALATORIAS	UND	50	0,30%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,21%	
	34	BRAZOS SOPORTE PARA CAMARAS	UND	50	0,40%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50			70,00%	0,28%	
	36	CANALIZACION ELECTRICA DE CAMARAS Y NODOS	UND	50	2,62%	60%	10%	30%	0%	100%	1	1	1		2,00%	0,05%	
	37	GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS	UND	3	0,17%	60%	10%	30%	0%	100%	3	3			70,00%	0,12%	
	39	CONTROL DE ACCESO FACIAL A SALA DE CONTROL	UND	2	0,52%	60%	10%	20%	10%	100%	2	2			70,00%	0,37%	
	48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	UND	50	5,33%	60%	10%	30%	0%	100%	50	50	14,85		78,91%	4,21%	
	49	MONITOR ESTACION OPERADOR	UND	24	0,98%	60%	10%	30%	0%	100%	24				60,00%	0,59%	

Las cantidades relacionadas en los avances tanto para las adquisiciones, como para la entrega en sitio en bodega, y los avances en la implementación, fueron validadas por la interventoría, conforme al plan de choque

avalado por las partes (ver ***ANEXO N°2***). Cada elemento se registra en la matriz de seguimiento al plan de acción, con los respectivos pesos porcentuales financieros y pesos porcentuales de avance en las etapas de la implementación de cada una de las cantidades del proyecto

Para el avance en las actividades de IMPLEMENTACIÓN de los postes (ítem 48 "POSTES TIPO 3 E INSTALACIÓN" de la tabla anterior), se acordó con la interventoría computar avances parciales, de acuerdo a pesos porcentuales distribuidos así:


ÍTEM	ACTIVIDAD	AVANCE PARCIAL	PESO %
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	EXCAVACIÓN POSTE	10%
		ALISTAMIENTO POSTE SUP	15%
		ALISTAMIENTO POSTE INF.	15%
		EMBONADO	10%
		TRANSPORTE E HINCADO	30%
		CIMENTACIÓN	20%


Por lo que el avance registrado de **14,85** se computa de la siguiente forma:


ÍTEM	ACTIVIDAD	AVANCE PARCIAL	PESO %	CANTIDAD	CÁLCULO	AVANCE
48	POSTES TIPO 3 E INSTALACION	EXCAVACIÓN POSTE	10%	18	1,8	14,85
		ALISTAMIENTO POSTE SUP	15%	50	7,5	
		ALISTAMIENTO POSTE INF.	15%	21	3,15	
		EMBONADO	10%	21	2,1	
		TRANSPORTE E HINCADO	30%	1	0,3	
		CIMENTACIÓN	20%	0	0	

Tal como se expuso anteriormente en la tabla de avance de actividades en campo (ver página 29), a corte del 31 de JULIO de 2024, en cuanto a la implementación de los postes para los puntos de cámara, se avanzó con la excavación para 18 puntos de poste, el alistamiento con tubería y accesorios internos de la sección superior de 50 postes, el alistamiento de tubería y accesorios internos de la sección inferior de 21 postes, el embonado de 21 postes, y el transporte e hincado de 1 poste (Punto 26 en el Barrio Simón Bolívar - Carabineros).

De igual forma, se presenta gráficamente el comparativo entre el valor planeado y el valor ejecutado, mediante la curva S de seguimiento, así:

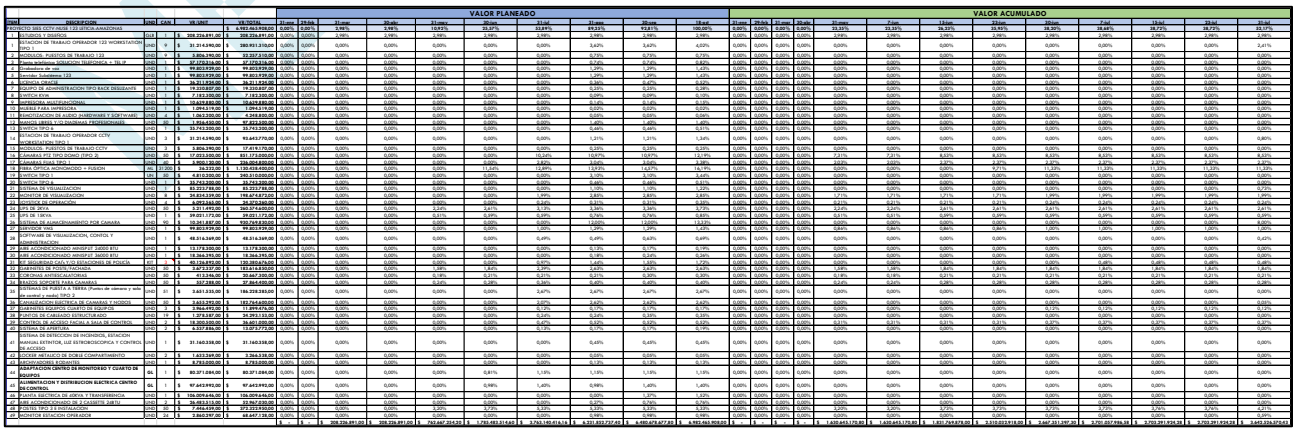

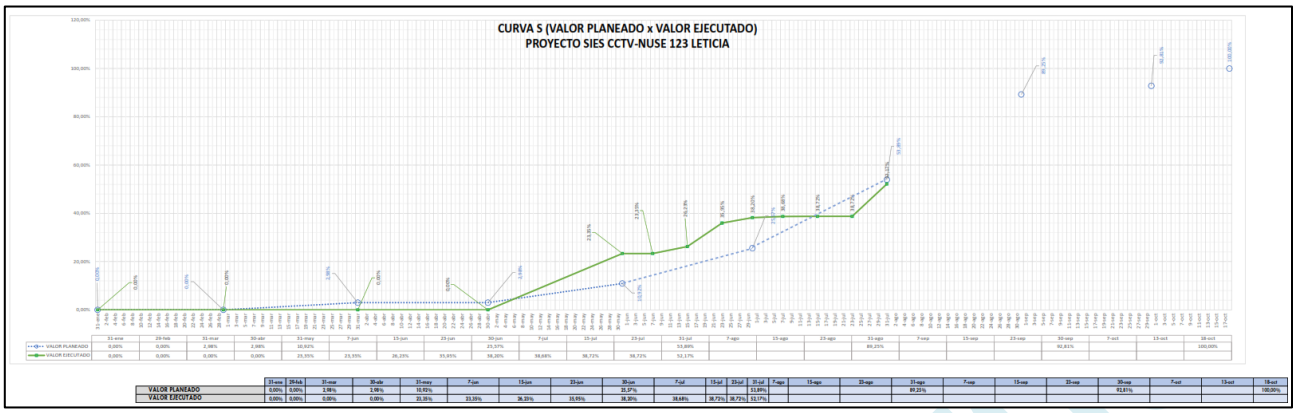

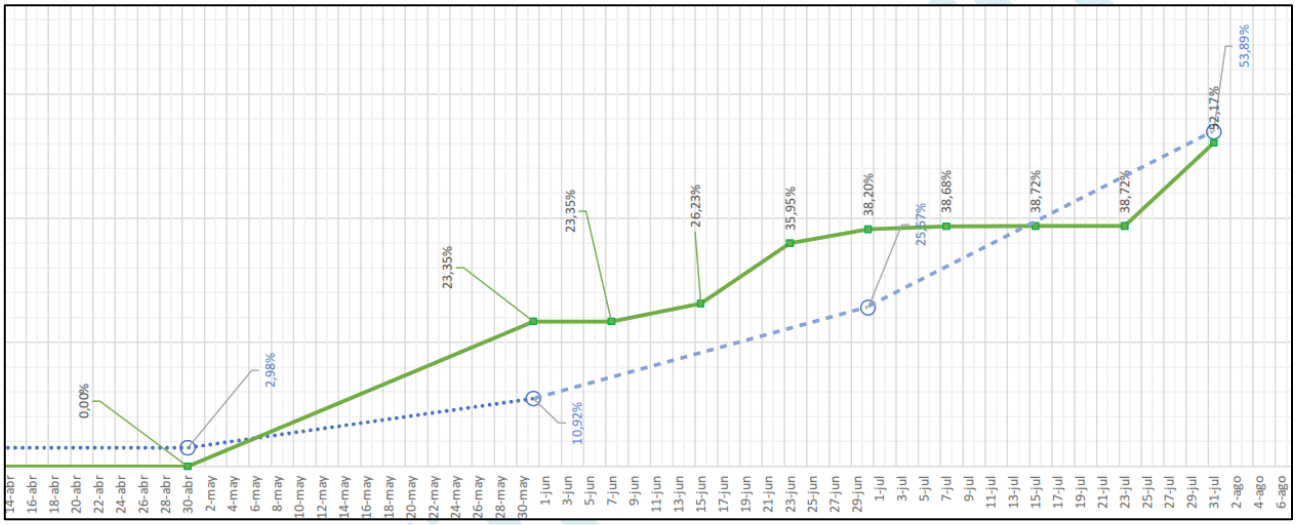

Como se observa, a corte 31 de JULIO de 2024 se registra un avance del **52,17%** frente al 53,89% esperado, teniendo en cuenta los avances relacionados en el presente informe. Para ver la Matriz de seguimiento diligenciada ver el ***ANEXO N°8 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE Y CURVA S JUL 31xlsx***. De igual forma se anexa el reporte general de avance y curva S de seguimiento (Ver ***ANEXO N°9 - SMTO PLAN DE CHOQUE Y CURVA S CORTE JUL 31.pdf***).

4. ESTADO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y JURIDICO DEL CONTRATO

4.1. FINANCIERO

- Se presenta en la siguiente tabla, el balance financiero del contrato 775 de 2023 a la fecha, así:

RESUMEN FINANCIERO			
DESCRIPCIÓN	**VALOR**	**%**	**PERIODO**
Valor FASE I de Estudios y Diseños	$ 208.226.891	2,98%	19/12/2023 – 18/03/2024
Valor FASE II de Implementación,	**$ 6.774.239.017**	97,02%	19/04/2024 – 18/10/2024
TOTAL CONTRATO 775 DE 2023	**$ 6.982.465.908**	**100%**	**19/12/2023 – 18/10/2023**
ANTICIPO (FIDUCIA)	$ 1.309.245.051	18,75%	**GIRADO (2/01/2024)**
SALDO	**$ 5.673.220.857**	81,25%	

Nota: Se tabla anterior se ajusta al presupuesto definitivo (ver numeral 3.3).

- El día 12 de julio de 2023 se realizó la solicitud de desembolso No. 008, afectando el rubro de estudios y diseños del plan de inversión, por un valor de $9.155.462, a favor de DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, correspondientes al reembolso por la ejecución de los estudios y diseños aprobados por las partes, y por otra parte, se afecta el rubro de Adquisición de equipos, elementos y accesorios de los ítems del proyecto del plan de inversión del anticipo, por un valor de $24.491.000, a favor de SION servicios integrales de ingeniería, como parte de pago para el suministro del cableado eléctrico necesario para el proyecto, específicamente el ítem de canalizaciones eléctricas para punto de cámara del presupuesto de cantidades del proyecto. La solicitud se presenta inicialmente a la interventoría para su validación y posteriormente a la fiduciaria FIDUOCCIDENTE para el giro desde el fideicomiso FID 3-18854 (ver ***ANEXO N°10 - ORDEN DE DESEMBOLSO 008.pdf***). El giro de los recursos fue realizado el día 15 de julio de 2023 (ver ***ANEXO N°11 - COMPROBANTE PAGOS DESEMBOLSO 008.pdf***).

  Luego se presenta el consolidado de los desembolsos realizados a la fecha con el detalle del rubro del plan de inversión del anticipo afectado, el numero de la orden de desembolso, proveedor al que se le realizó el desembolso y su respectivo número de NIT, cuenta de cobro o factura, valor desembolsado.

RUBRO	VALOR	ORDEN DE DESEMBOLSO	NIT No.	NOMBRE DE PROVEEDOR	No. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	FECHA DE GENERACION	VALOR EN PESOS	ANEXOS
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$208.226.891	O.D. N°001	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$42.500.000	VER INFORME DE ENERO
		O.D. N°001	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	CUENTA DE COBRO 001	19/01/2024	$98.000.000	VER INFORME DE ENERO
		O.D. N°006	900971683-0	JANAGER TECNOLOGIA SAS	FACTURA JT-40	14/06/2024	$38.571.429	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°007	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	20/06/2024	$20.000.000	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°008	900714956-5	DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	N/A	15/07/2024	$9.155.462	***ANEXO N°10 - ORDEN DE DESEMBOLSO 008.pdf***
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTO	$1.101.018.160	O.D. N°002	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA 001	20/02/2024	$87.375.000	VER INFORME DE FEBRERO
		O.D. N°003	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	$150.168.500	VER INFORME DE MARZO
		REINTEGRO	901020151-8	INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	FACTURA PROFORMA 053	06/03/2024	-$24.491.000	VER INFORME DE JUNIO
		O.D. N°003	8605163143	DAGA SA EN REORGANIZACION	FACTURA ELECTRONICA DCE8857	06/03/2024	$58.803.850	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°003	9010878846	METALCO COMUNICACIONES SAS	FACTURA PROFORMA MC-010	06/03/2024	$34.093.500	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°004	901622242-3	SENSAR INGENIERIA SAS	FACTURA PROFORMA FP003	12/03/2024	$269.047.100	VER INFORME DE MARZO
		O.D. N°005	900284221-4	USA VIRTUAL MARKET SAS	FACTURA PROFORMA	03/04/2024	$436.464.170	VER INFORME DE ABRIL
		O.D. N°005	805022762-9	CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	PROFORMA 001	03/04/2024	$65.066.040	VER INFORME DE ABRIL
		O.D. N°008	901020489-1	SION SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	FACTURA PROFORMA 2024-01	15/07/2024	$24.491.000	***ANEXO N°10 - ORDEN DE DESEMBOLSO 008.pdf***
VALOR GIRADO-PAGO PROVEEDORES							**$ 1.309.245.051**	
VALOR ANTICIPO							**$ 1.309.245.051**	
SALDO ANTICIPO							**$ 0**	

Como se puede observar en la tabla anterior, el saldo final es cero, esto quiere decir que con el giro realizado el día 15 de julio se agotó el recurso disponible en los dos rubros definidos en el plan de inversión del anticipo para el contrato 775 de 2023.

- Dado que se agota el recurso del anticipo disponible en el fideicomiso FID 3-18854, el día 15 de julio de 2024, se recibe un correo electrónico de parte de FIDUOCCIDENTE solicitando enviar desde correo electrónico autorizado la instrucción del pago de gastos bancarios y de GMF con los recursos del Fondo para el pago de comisión Fiduciaria, teniendo en cuenta que DATA LINK SMART SOLUTIONS constituyó un fondo de comisión fiduciaria por valor de $5.460.000, del cual se descontarán los siguientes conceptos:

CONCEPTO	VALOR
Saldo Factura comisión mes de junio iva incluido	$2.407.160,00
Factura comisión mes de julio (a prorrata 15 días del mes iva incluido)	$1.237.600,00
Comisión por liquidación iva incluido	$1.547.000,00
GMF orden de desembolso No. 008 (Aproximado)	$134.585,85
Comisión más IVA orden de desembolso No. 008 (Aproximado)	$80.000,00
TOTAL	**$5.406.345,85**

Nota: Es importante anotar que, estos costos son asumidos por DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, y que el depósito disponible en el fondo de comisión fiduciaria fue depositado por DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS, con recursos propios, en el momento de la constitución de la fiducia, a la cuenta corriente No. 256058975 del Banco de occidente, luego los saldos de este fondo que resulten del balance de liquidación serán retornados a nuestra compañía sin afectar en ningún momento los recursos del anticipo que están depositados en la cuenta de ahorros No. 710- 86080-0 del Banco de Occidente

Como se observa en la tabla anterior, los recursos disponibles en el fondo de reserva para comisión fiduciaria son suficientes para cubrir los costos asociados a los conceptos pendientes de pago, y de esta forma continuar con el trámite de liquidación del encargo fiduciario FID 3-18854.

El día 16 de julio de 2024, se procede al envío del correo solicitado junto con la solicitud de Liquidación y Traslado de Recursos del Fondo de Comisión Fiduciaria y del Fondo de Reserva, junto con las instrucciones para el deposito de los excedentes existentes.

Para más información ver el ***ANEXO N°12 - TRAMITE LIQUIDACION FID 3-18854.pdf*** con el comunicado de FIDUOCCIDENTE y el oficio de respuesta.

Dado que la fiduciaria envía la información reporte del mes vencido entre la segunda y tercera semana del mes siguiente, se reporta la información disponible a la fecha, así:

- Se reportan rendimientos del fideicomiso FID 3-18854 por valor de $ 1.995,49 para el mes de JULIO (última información reportada), los cuales fueron girados a la cuenta indicada por municipio de Leticia, cuenta de ahorros N°407300680 del Banco de Bogotá. (Ver ***ANEXO N°13 - PAGO RENDIMIENTOS JULIO FID 3-18854.pdf***). A corte del 31 de JULIO de 2024, se han reportado un acumulado de rendimientos del fideicomiso por valor de **$1.325.431,17**, tal como se observa en la siguiente tabla:

MES	VALOR RENDIMIENTOS	SOPORTE
ENERO	$ 521.263,35	Ver Informe del mes de enero
FEBRERO	$ 453.347,67	Ver informe del mes de febrero
MARZO	$ 311.398,01	Ver informe del mes de marzo
ABRIL	$ 18.177,87	Ver informe del mes de mayo
MAYO	$ 11.475,07	Ver informe del mes de mayo
JUNIO	$ 7.773,71	Ver informe del mes de junio
JULIO	$ 1.995,49	***ANEXO N°13 - PAGO RENDIMIENTOS JULIO FID 3-18854.pdf***
TOTAL	**$ 1.325.431,17**	

- La Fiduciaria de Occidente S.A. envía informe mensual con corte al 31 DE JULIO DE 2024 (información disponible a la fecha, ver ***ANEXO N°14 - INFORME MENSUAL FIDUOCCIDENTE CON SOPORTES JUL 2024.pdf***), en el cual se presenta la siguiente información:
  - Informe Mensual
  - Estados Financieros
  - Extracto(s) Cuenta (s) Bancaria (s) y/o FIC´s
  - Relación de Recaudos y/o Pagos (si aplica)
  - Plan de inversión del anticipo

A continuación, se presenta tabla resumen resultado con corte al mes de JULIO, con los desembolsos y rendimientos, reportada por FIDUOCCIDENTE:

FIDEICOMISO 3-18854 DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

CONTROL DE PAGOS Y RECURSOS DISPONIBLES

RUBRO	CONCEPTO DE LA INVERSION	VALOR TOTAL	NOMBRE PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHAS	O.P.	VALOR PAGADO	SALDO CONTRATO
RUBRO 1 -	ESTUDIOS Y DISEÑOS	208,226,891.00	JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	42,500,000.00	-
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	19-ene-24	2024-001	98,000,000.00	
			JANAGER TECNOLOGÍA SAS	DESEMBOLSO	14-jun-24	2024-006	38,571,429.00	
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	20-jun-24	2024-007	20,000,000.00	
			DATA LINK SMART SOLUTIONS SAS	REEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	9,155,462.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		208,226,891.00	
RUBRO 2 -	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE LOS ITEMS PROYECTOS	1,101,018,160.00	SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	20-feb-24	2024-002	87,375,000.00	-
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	150,168,500.00	
			DAGA S.A EN REORGANIZACION	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	58,803,850.00	
			METALCO COMUNICACIONES SAS	DESEMBOLSO	6-mar-24	2024-003	34,093,500.00	
			SENSAR INGENIERÍA SAS	DESEMBOLSO	12-mar-24	2024-004	269,047,100.00	
			USA VIRTUAL MARKET SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	436,464,170.00	
			CABLES SUPERIORES COLOMBIA SAS	DESEMBOLSO	1-abr-24	2024-005	65,066,040.00	
			INGENIERIA EN GALVANIZADOS DE OCCIDENTE SAS	REINTEGRO	24-jun-24	2024-003	(24,491,000.00)	
			SION SERVICIOS INTREGARLES DE TECNOLOGIA	DESEMBOLSO	12-jul-24	2024-008	24,491,000.00	
					TOTAL RUBRO PAGADO		1,101,018,160.00	
GMF	-		Banco de Occidente		24-ene-24	GMF	562,052.59	106,081.53
			Banco de Occidente		22-feb-24	GMF	351,619.79	
			Banco de Occidente		8-mar-24	GMF	2,050,384.65	
			Data Link		26-mar-24	Reintegro	(2,030,000.00)	
			Data Link		1-abr-24	Reintegro	(3,021,900.00)	
			Banco de Occidente		5-abr-24	GMF	2,007,454.24	
			Banco de Occidente		8-may-24	GMF	90.08	
			Data Link		13-jun-24	Reintegro	(254,286.00)	
			Data Link		20-jun-24	Reintegro	(120,000.00)	
			Data Link		20-jun-24	Reintegro	(60,000.00)	
			Banco de Occidente		21-jun-24	GMF	244,327.13	
			Banco de Occidente		31-jul-24	GMF	164,175.99	
					TOTAL		(106,081.53)	
GASTOS BANCARIOS	-		Banco de Occidente		24-ene-24	IVA	2,099.50	146,429.50
			Banco de Occidente		24-ene-24	Comisión	11,050.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	IVA	1,387.00	
			Banco de Occidente		22-feb-24	Comisión	7,300.00	
			Banco de Occidente		8-mar-24	IVA	4,769.00	
			Banco de Occidente		8-mar-24	Comisión	25,100.00	
			Banco de Occidente		5-abr-24	IVA	3,505.50	
			Banco de Occidente		5-abr-24	Comisión	18,450.00	-
			Banco de Occidente		8-may-24	IVA	693.50	
			Banco de Occidente		8-may-24	Comisión	3,650.00	
			Banco de Occidente		21-jun-24	IVA	3,781.00	
			Banco de Occidente		21-jun-24	Comisión	19,900.00	
			Banco de Occidente		31-jul-24	IVA	7,144.00	
			Banco de Occidente		31-jul-24	Comisión	37,600.00	
					TOTAL		146,429.50	
VALOR DE ANTICIPO		1,309,245,051.00			SALDOS TOTALES		1,309,285,398.97	-40,347.97

GIRO SALDOS	
Rendimientos generados con recursos del Anticipo	1,325,427.15
Rendimientos Fondo de Reserva	87,741.90
Rendimientos Fondo de Comision Fiduciaria y Gtos.	224,991.12
Retención en la fuente sobre utilidades (informativo)	(21,979.00)
Saldo pendiente de reintegro para gastos bancarios	(40,347.97)
Mayor valor girado a Entidad Estatal por rendimientos financieros	4.02
Total Rendimientos Trasladados a Entidad Estatal con corte a julio 2024	1,325,431.17
Saldos Rubros Plan de Inversión.	(40,347.97)
Disponible Fiduciario	312,733.02
Los rendimientos mostrados generados con recursos del anticipo, corresponden a los rendimientos en la cuenta de ahorros y son para trasladar de forma mensual a la Entidad Estatal.	

OBSERVACIONES:

El contrato No. 775 DE 2023 tiene un valor inicial de $ 6.890.763.427,00 con el objetivo de "CONTRATAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD — SIES (CCTV – 123) DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS", y se administrará el 19% en modalidad de anticipo en el Patrimonio Autonomo, por valor de $ 1.309.245.051 los cuales ingresaron a la cuenta del Fideicomiso el día 02 de enero de 2024.

Nota: En el mes de julio se agotaron los recursos del anticipo - Total ejecutado $1.309.245.051 (según ordenes de pago enviadas por el Fideicomitente) Los saldos totales incluyen el saldo del aporte realizado por el fideicomitente para gastos bancarios, para corte del mes de julio quedaron pendientes de reintegro $40.347,97.

Nota: La imagen anterior corresponde a un pantallazo del reporte generado por la fiduciaria FIDUOCCIDENTE, referido como "Plan de Inversión del Anticipo", el cual hace parte integral del informe reportado a la fecha.

4.2. ADMINISTRATIVO

El área administrativa se encarga de garantizar el pago de seguridad social del personal de la fase II, de conformidad con los porcentajes de dedicación respectivos, en el mes de JULIO, así:

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	Gerente del Proyecto	100	JULIAN ANDRES LOZANO FLOREZ	9471350532	$786.900	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
2	Consultor tecnológico	100	JHON ALEXANDER SILVARA GUERRERO	7938769227	$405.000	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
3	Ingeniero civil o arquitecto	50	ROBINSON DIAZ LOPEZ	79559456	$381.700	EPS SURA	COLFONDOS	ARL SURA	N.A
4	Ingeniero Eléctrico o electricista	40	CRISTIAN GUTIERREZ LANDINEZ	7938711067	$178.300	SANITAS	COLPENSIONES	POSITIVA	N.A
5	Ingeniero de sistema de aire acondicionado	20	DARIO ARLEY RODRIGUEZ LOPEZ	9471350532	$208.000	FAMISANAR	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
6	Ingeniero residente	100	CHIRISTIAN HELI ALVAREZ	C	$512.000	SANITAS	PROTECCION	POSITIVA SEGUROS	ICBF SENA CAFAMAZ
7	Técnico de apoyo eléctrico	40	JUAN HARVIN SANTOS HERNANDEZ	9471350532	$208.000	NUEVA EPS	PORVENIR	AXA	ICBF SENA CAFAMAZ
8	Técnico De Apoyo De F.O o Radioenlace	50	BREZNEVH LEONARDO CHIA	9471350532	$384.700	SANITAS	PORVENIR	AXA COLPATRIA	COFREM
9	Profesional de Seguridad Industrial y Medio Ambiental	10	ELIANE LETICIA GONZALEZ P	9471350532	$181.400	SANITAS	COLPENSIONES	AXA COLPATRIA	ICBF SENA CAFAMAZ
10	Consultor de seguridad	NA	FABIAN GUZMAN SOTO	9471350532	$874.300	SANITAS	COLFONDOS	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
11	Financiero y/o contable	10	ERIKA LILIANA ACOSTA OLAYA	9471350532	$437.200	SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA COFREM
12	Administrativo	10	ALBEIRO MENDEZ BURITCA	7938712489	$64-000	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS DE VIDA COLPARIA SA	N.A
13	Jurídico	10	FABIAN LIBARDO MARTINEZ CUBIDES	9471516115	$380.600	SALUD TOTAL	PORVENIR	ARL SURA	N.A.

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
14	Coordinador Operativo	N.A	RAFAEL ENRIQUE MONTOYA ALVAREZ	9471350532	$208.000	FOSYGA	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A
15	Ingeniera civil de apoyo	N.A	SOFIA MARGARITA VILLAMIZAR	79367869	$522.400	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA	N.A

De igual forma se presenta la información de los aportes a seguridad social de los colaboradores que hacen parte de las cuadrillas de operación en el mes de julio de 2024, así:

IT	DESCRIPCIÓN	% DEDICA	NOMBRE	PLANILLA N°	VALOR PAGADO	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES
1	AYUDANTE DE OBRA	NA	ADOLFO SOUZA DOBALES	7938775286	$241.400	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	NA
				9471350532	$100.600	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
2	AYUDANTE DE OBRA	NA	HECTOR FLOREZ BELLNCA	7938718304	$244.900	EPS SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A
				9471350532	$100.600	EPS SANITAS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
3	AYUDANTE DE OBRA	N.A	LEIDER PINTO PINTO	7938718231	$241.400	EPS MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	N.A
				9471350532	$100.600	EPS MALLAMAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
4	AYUDANTE DE OBRA	N.A	JHON ALEJANDRO BARRAGAN TIJARO	7938718355	$241.400	EPS MALLAMAS	PROTECCION	COLPATRIA ARP	N.A
				9471350532	$100.600	EPS MALLAMAS	PROTECCION	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
5	AYUDANTE DE OBRA	N.A	MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	7938777629	$243.200	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A
				9471350532	$100.600	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	ICBF SENA CAFAMAZ
6	AYUDANTE DE OBRA	N.A	FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUEZ GUZMAN	7938784579	$81.700	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A
7	TECNICO ELECTRICISTA	N.A	SAMMI LEONARDO DE AVILA	7938847430	$27.600	SANITAS	COLPENSIONES	COLPATRIA ARP	N.A
8	AUXILIAR ELECTRICO	N.A	PEDRO PABLO DEL CASTILLO	7938846094	$27.500	NUEVA EPS	PORVENIR	COLPATRIA ARP	N.A

Nota: Durante el período del 1 al 18 de julio, el personal fue contratado bajo la modalidad de prestación de servicios, para la ejecución de unos entregables específicos., referente al alistamiento, excavaciones e hincado de postes, a partir del 19 de julio, y con el ánimo de garantizar mayor estabilidad laboral de los colaboradores, se acordó con ellos el cambio a un contrato de obra o labor. Otros colaboradores fueron contratados bajo la modalidad de prestación de servicios para la ejecución de actividades específicas de instalación de canalizaciones por dos días, entre los días 19 y 20 de julio. A continuación, se presenta una tabla resumen, así:

NOMBRE Y APELLIDO	FECHA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA DE INICIO CONTRATO OBRA O LABOR
ADOLFO SOUZA DOBALES	1 JULIO HASTA 18 JULIO 2024	19 DE JULIO 2024
HECTOR FLOREZ BELLNCA	1 JULIO HASTA 18 JULIO 2024	19 DE JULIO 2024

LEIDER PINTO PINTO	1 JULIO HASTA 18 JULIO 2024	19 DE JULIO 2024
JHON ALEJANDRO BARRAGAN TIJARO	1 JULIO HASTA 18 JULIO 2024	19 DE JULIO 2024
MARCOS FORNEY VILLAR CAHUACHE	1 JULIO HASTA 18 JULIO 2024	19 DE JULIO 2024
FRANCISCO AUGUSTO RODRIGUEZ GUZMAN	12 DE JULIO 2024 HASTA 17 JULIO 2024	NO CONTINUA
SAMMI LEONARDO DE AVILA	19 DE JULIO 2024 HASTA 20 JULIO 2024	N.A
PEDRO PABLO DEL CASTILLO	19 DE JULIO 2024 HASTA 20 JULIO 2024	N.A

Para más información, ver ***ANEXO N°15 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JULIO 2024.pdf***).

Nota: El personal relacionado en la tabla anterior, corresponde al personal ya aprobado por la interventoría.

4.3. JURIDICO

En cuanto a la gestión jurídica, durante el mes de JULIO se realizaron las gestiones tendientes a la revisión de los informes de la fiducia, así como la revisión de los contratos con el personal mínimo requerido y, los contratos, acuerdos u ordenes de servicio suscritos con proveedores en el marco de la ejecución de las actividades del proyecto.

5. ANEXOS

Se presentan los siguientes anexos al presente informe:

- ***ANEXO N°1 - CRONOGRAMA PLAN CHOQUE IMPLEMENTACION SIES LETICIA VF.pdf***
- ***ANEXO N°2 - PLAN CHOQUE Y CURVA S PLANEACION SIES LETICIA.pdf***
- ***ANEXO N°3 - OC-93 MATERIALES CANALIZACIONES P-CAM.pdf***
- ***ANEXO N°4 - CONSOLIDADO ORDENES DE COMPRA.rar***
- ***ANEXO N°5 - MATRIZ DE ADQUISICIONES SIES LETICIA.xlsx***
- ***ANEXO N°6 - OTROSI No. 2 CONTRATO 775-2023.pdf***
- ***ANEXO N°7 - PRIMERA ADICION Y PRORROGA CONVENIO 1340-2023.pdf***
- ***ANEXO N°8 - MATRIZ SMTO PLAN CHOQUE Y CURVA S JUL 31.xlsx***
- ***ANEXO N°9 - SMTO PLAN DE CHOQUE Y CURVA S CORTE JUL 31.pdf***
- ***ANEXO N°10 - ORDEN DE DESEMBOLSO 008.pdf***
- ***ANEXO N°11 - COMPROBANTE PAGOS DESEMBOLSO 008.pdf***
- ***ANEXO N°12 - TRAMITE LIQUIDACION FID 3-18854.pdf***
- ***ANEXO N°13 - PAGO RENDIMIENTOS JUNIO FID 3-18854.pdf***
- ***ANEXO N°14 - INFORME MENSUAL FIDUOCCIDENTE CON SOPORTES JUN 2024.pdf***
- ***ANEXO N°15 - CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL JUNIO 2024.pdf***
- ***ANEXO N°16 - DOCUMENTACION SST DE OPERACION JULIO-24.pdf***
- ***ANEXO N°17 - REGISTRO FOTOGRAFICO SST OPERACIÓN JULIO-24.rar***
- ***ANEXO N°18 - CARPETA CUMPLIMIENTO SSTA.rar***

Nota: *El archivo digital* ***ANEXO N°18*** *se entregará únicamente en físico en el DVD anexo a este informe. Debido a su gran peso en bytes (más de 600MB), no permite su carga en el SECOP II (ver DVD anexo).*
