CONTRATO 4804 DEL 2023

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 1

DICIEMBRE DEL 2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

INFORME MENSUAL NO. _____ **MES O PERIODO:** _____

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización				
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto				
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato				
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3			
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4			
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6			
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8			
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10			
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11			
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12			
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14			
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15			
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17			
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1 MINFRA-MN-IN-2-FR-2			
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1 MINFRA-MN-IN-6-FR-2			
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1			
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2			
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2			
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5			
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7			
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9			
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13			
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16			
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18			
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1 MINFRA-MN-IN-3-FR-2			
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTROL DE APROBACION

Nombre del documento:		Informe Mensual de interventoría No 1
Código del documento:		
Versión:	**1**	

ELABORACIÓN, REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN			
Actividad	**Fecha**	**Nombre del ejecutor**	**Firma**
Elaboración	31/12/2024	Gabriel Vesga	
Revisión	1/01/2024	Jesús Orlando Vivas	
Verificación			
Aprobación			

DISTRIBUCIÓN		
Persona a quien se envía	**Cargo**	**Organización**
Mauricio Hoyos	Supervisor	INVIAS

CONTROL DE VERSIONES		
Versión	**Fecha**	**Naturaleza del cambio realizado con respecto a la versión anterior**
1	31/12/2024	Revisión de correcciones por parte del supervisor de INVIAS
2		

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. INTRODUCCION 7
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 8
2.1 LOCALIZACION 8
2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA 8
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 9
3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA 10
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 10
3.1.1 Información contractual 10
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 11
3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA 11
3.3.1 Modificaciones y adiciones al contrato 11
3.3.2 Estado de pólizas 11
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 12
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 12
4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 19
4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA 19
4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA 19
4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 19
4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO 19
4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 20
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA 22
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 22
5.1.1 Aspectos legales del contrato 22
5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR 25
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25
6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 26

6.3 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA..... 26

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26

8. ANEXOS 27

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato 10
Tabla 2. Póliza de cumplimiento 12
Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual 13
Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría 31
Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría 32
Tabla 6. Personal Activo de la Interventoría. 34
Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida 37
Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada 44

LISTA DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización del proyecto 8

LISTA DE ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 37
Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 58

1. INTRODUCCION

El presente informe describe las actividades realizadas durante el período comprendido entre el 14-31 de diciembre de 2023, para el proyecto **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"**

Las actividades corresponden principalmente a labores de seguimiento, control y verificación a los trabajos correspondientes al convenio No. 3317 de 2023 en proceso de revisión y aprobación de documentos, cuyo objeto es: "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."(código BPIN No. 202300000000001)"** El seguimiento a la ejecución del proyecto se ha realizado periódicamente a través de reuniones y recorridos en conjunto con la JAC de las veredas de Puerto Perales, Director territorial y supervisor de INVIAS, a diario con Ingenieros Directores, Residentes e Interventoría para dar cumplimiento a lo estipulado en el pliego de condiciones y anexo técnico del Contrato 4804 de 2023 y en las Especificaciones Técnicas de INVIAS.

El presente informe se remite a INVÍAS, a la Dirección Territorial de Medellín, al despacho del Supervisor del Contrato de interventoría N° 4804-2023, Ingeniero Mauricio Hoyos.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 LOCALIZACION



Ilustración 4. Localización de vía a intervenir en Corregimiento Puerto Perales.


Imagen 1. Localización del proyecto

El área del proyecto se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, municipio de Puerto Triunfo, en la vereda de Puerto Perales. Con este proyecto se pretende cumplir las especificaciones de vía secundaria; es decir, realizar el mejoramiento de suelo, aumentar el ancho de la vía y disminuir la presencia de curvas sucesivas.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

Las vías de Puerto perales, se encuentra en mal estado debido a la falta de intervención y debido al tráfico constante de vehículos de carga pesada hacia los sectores de producción agrícola y minera que se encuentran en la zona, además de extender los tiempos de viaje y aumentar los costos de carga.



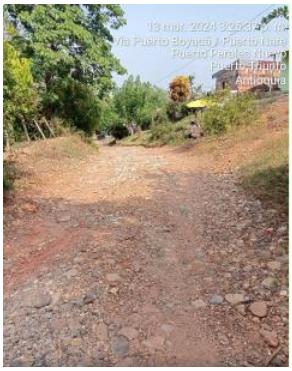

2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El Alcance del proyecto será el mejoramiento con la pavimentación de111 metros en Puerto perales en el tramo comprendido entre el K0+000 al K0+111 respectivamente. Estas vías internas se encuentran en muy mal estado debido a la poca intervención por parte de los entes territoriales, las precipitaciones que a su vez dificultan el tráfico y aumentan los costos de operación y aumento en el recorrido de las mismas.

El departamento Antioquia realiza inversiones en la construcción, mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pero en muchos de los casos se terminan atendiendo situaciones de emergencia por lo limitado de los recursos.

De acuerdo con lo indicado en los pliegos de condiciones, el objeto de esta intervención es efectuar obras de mejoramiento de vía terciaria en la vereda de Puerto perales y las obras complementarias que garanticen la estabilidad de la vía, según los estudios y diseños aprobados por el INVIAS y de acuerdo con la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales de INVIAS.

De igual manera se contempla la ejecución de actividades ambientales del programa de adaptación de la guía de manejo ambiental (PAGA), orientados a evitar, prevenir, corregir y mitigar o compensar los impactos generados en desarrollo del proceso de mejoramiento de la vía mencionada en el objeto del contrato 4804 de 2023.

3. INFORMACION CONTRATO DE OBRA

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

3.1.1 Información contractual

Tabla 1. Información general del contrato

CONVENIO No. - FECHA	3317 del 13 de septiembre de 2023
TIPO DE CONVENIO	Obra
DEPENDENCIA CONTRATANTE	Dirección territorial INVIAS
CONTRATISTA	JAC PUERTO PERALES, MPIO PTO TRIUNFO
C.C. o N.I.T.	811017456-1
REPRESENTANTE LEGAL	Edgar Álvaro Macias Quintana
C.C. o N.I.T	7.252.077
OBJETO DEL CONVENIO	"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL."(código BPIN No. 202300000000001)"
VALOR DEL CONVENIO	$201.333.957.00
PLAZO O DURACIÓN	Tres (3) meses.
PLAZO ADICIONAL DE DURACIÓN	De acuerdo con el Adicional No. 01: "Modificar el plazo de ejecución tres (03) meses más".
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO TRIUNFO – PUERTO PERALES
SUPERVISOR (Acto administrativo y fecha de designación)	MAURICIO HOYOS. Director territorial INVIAS Antioquia.
INTERVENTOR (Externo)	Interventor Externo Jesús Orlando Vivas Noguera del INVIAS, Contrato de Interventoría No. 4804 de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE SUSCRIPCION	13/09/2023
FECHA DE INICIO	12/12/2023
FECHA DE TERMINACION	31/12/2023

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

En este periodo correspondiente del 14-31 de diciembre de 2023 en ejecución del contrato 4804 de 2023. El Contratista JAC Puerto perales, realizó las siguientes actividades.

- Se realiza socialización con el director territorial de INVIAS
- Se realiza las solicitudes de prórroga de los convenios y de la interventoría.

Se adelantan las siguientes actividades técnicas:

✓ Hasta el momento no se han adelantado actividades en obra.

3.3 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

3.3.1 Modificaciones y adiciones al contrato

A la fecha se no han presentado modificaciones de cantidades.

3.3.2 Estado de pólizas

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la póliza de cumplimiento No 100284287, con respecto a la fecha de inicio, expedida por la aseguradora MUNDIAL DE SEGUROS S.A. A continuación, se relacionan los amparos actualizados de esta póliza.

Tabla 2. Póliza de cumplimiento

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.400.187,10	31/12/2023	31/12/2028

Página 1

De igual manera y de acuerdo con lo estipulado en el contrato de obra, el contratista de obra presento la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No.100069231, expedida por la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A, y aprobada por la gobernación de norte de Santander. A continuación, se relaciona el amparo inicial de esta póliza.

Tabla 3. Póliza de responsabilidad civil extracontractual

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA	
			Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			13/09/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

A continuación, se describe el estado general del proyecto durante el transcurso del periodo comprendido entre el 14-31 de diciembre de 2023, la información se relaciona en el Anexo 1. MEPI-MN1-IN-15-FR-2.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSION: 01**
	INFORME MENSUAL No. 1	**FECHA: Del 14-31 de diciembre de 2023**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **PERIODO MES:** dic-23

CONVENIO No.: 3317 - 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/03/2024
PLAZO ACUMULADO: 14/03/2024

VALOR INICIAL : $ 201.333.957,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ 200.333.957,00
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORI 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	111
Estructuras	Alcantarillas	GBL	2
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML	0	0
Estructuras	Alcantarillas	GBL	0	0
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$ 151.512.376,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ 4.545.371,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 44.276.210,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 200.333.957,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ -	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ -	0,00
VALOR EJECUTADO		0,00

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): #¡DIV/0!

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto 1





Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.


Foto 3

Foto 4

Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.





Indicar la localización y actividad.

Indicar la localización y actividad.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre JESUS ORLANDO VIVAS
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

4.1 INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA

El desarrollo semanal del contrato de obra se encuentra relacionado en el formato denominado MEPI-MN1-IN-15-FR-3. Los Informes Semanales están suscritos por el director de Interventoría y contienen la información relacionada con: I. Información general, II. Información presupuestal y avance financiero, III. Avance físico, IV. Gestión ambiental, V. gestión predial, VI. Gestión social, VII. Actividades realizadas en la semana, VIII. Actividades que realizar en la siguiente semana, IX. Esquema gráfico alcance del contrato, X. registro fotográfico y XI. Describir las acciones a seguir por parte de la interventoría que contribuyan al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del Contratista de obra.

Se presenta el registro digital de la totalidad de informes semanales, correspondientes al desarrollo del proyecto.

Informe N°1. (14 -21 dic)

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSION: 01**
	INFORME MENSUAL No. 1	**FECHA: Del 14-31 de diciembre de 2023**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	23/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 1 (Numeración consecutiva) del 14/12/2023 al 21/12/2024 — Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de placa huella y la elaboracion de 2 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de placa huella en la vereda Puerto Perales y la contruccion de dos alcantarilla, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES

CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14/03/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Estudios y diseños	GL	1
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A	____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A	____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A	____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A	____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A	____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A	____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A	____

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Comunicación de interventoria con el presidente de la junta de accion comunal de puerto perales para socializacion del convenio y brindar la asesoria en todos los aspectos tecnicos y administrativos para el buen desarrollo del convenio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se programa socializacion del proyecto con la interventoria, junta de accion comunal y ente territorial para validacion del convenio.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTMDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSION: 01**
	INFORME MENSUAL No. 1	**FECHA: Del 14-31 de diciembre de 2023**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°2. (22 -28 dic)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CODIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 2 del 22/12/2023 al 28/12/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal No

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de placa huella y la elaboracion de 2 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CABACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de placa huella en la vereda Puerto Perales y la contruccion de dos alcantarilla, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES

CONVENIO No.	3317-2023	VALOR INICIAL:	$ 201.333.957,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 201.333.957,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No.	4804 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 57.596.402,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	14/03/2024	VALOR ACUMULADO:	$ 57.596.402,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	14/03/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % — Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
1	Estudios y diseños	GL	1
2			
3			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Física	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades segun el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)
ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza acompañamiento de parte de la interventoria a la JAC de puerto perales en la gestion documental y socializacion de temas administrativos para inicio de actividades en acompañamiento del director territorial Mauricio Hoyos.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera de entrega de documentacion solicitada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOTA Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-39679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Consultoría, Interventor y Dirección Territorial.

Informe mensual 01 – enero de 2024

	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	**VERSION: 01**
	INFORME MENSUAL No. 1	**FECHA: Del 14-31 de diciembre de 2023**
	CONTRATO No. 4804 DEL 2023	

Informe N°3. (29 dic – 4 ene)

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
INFORME SEMANAL

CÓDIGO | VERSIÓN | PÁGINA | FECHA: 5/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA | SEMANA No.: 3 del 29/12/2024 al 4/01/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: N/A

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Se realizaran 111 mts de placa huella y la elaboracion de 2 alcantarillas

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

construccion de 111 m de placa huella en la vereda Puerto Perales y la construccion de dos alcantarilla, municipio de Puerto Triunfo

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES

CONVENIO No. 3317-2023 | FECHA DE INICIO: 12/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

VALOR INICIAL: $ 201.333.957,00 | VALOR ADICIONES: $ - | VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA | INTEGRANTES: N/A

CONTRATO No. 4804 de 2023 | FECHA DE INICIO: 14/12/2023 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 14/03/2024 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 14/03/2024

VALOR INICIAL: $ 57.596.402,00 | VALOR ADICIONES: | VALOR ACUMULADO: $ 57.596.402,00 | VALOR ANTICIPO: $ - | VALOR AMORTIZADO: $ - | SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.333.957	$ 200.333.957		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 57.596.402	$ 57.596.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.333.957,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: En la medida del inicio de actividades se solicitara la programacion, ya que se proyecta fase de estudios y diseños.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-23
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
Estudios y diseños	GL	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la emisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Pendiente recibir, documentacion sobre la fuente de los materiales

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESION DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES: se requerira en la medida de ser necesario

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		0

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Se realiza acompañamiento de parte de la interventoria a la JAC de puerto perales en la gestion documental y socializacion de temas administrativos para inicio de actividades.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se espera la entrega de informacion solicitada.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

0

Ajustes a Estudios y diseños	0	Programado
	0	Ejecutado
Placa huella	0	Programado
	0	Ejecutado
alcantarillas	0	Programado
	0	Ejecutado

El esquema gráfico será deﬁnido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

REALIZAR EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A CADA ACTIVIDAD DE LA EJECUCION DEL CONVENIO DESDE LO ADMINISTRATIVO, SOCIAL, AMBIENTAL Y TECNICO

CORROBORAR LA INFORMACION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL CONVENIO.

CONTROLAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y AMBIENTALES EVITANDO SOBRECOSTOS O GASTOS NO DESEADOS.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: JESUS ORLADO VIVAS NOGUERA
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Gerencial, Interventor y Dirección Territorial

Informe mensual 01 – enero de 2024

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Hasta el momento no se han ejecutado actividades con maquinaria o equipos.

4.3 PERSONAL CONTRATO DE OBRA

En el presente período no se ha contratado personal de obra debido a que el proyecto está en la etapa de revisión de diseños.



4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

No aplica.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Devido a que no se ha ejecutado actividades no se lleva aun el seguimiento del tiempo para este periodo.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante este periodo aún no se han tomado muestras debido a la inactividad de obra.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se diligencia el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, correspondiente al SEGUIMIENTO A LAS GARANTIAS del contrato de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CODIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-12
		VERSION	1
		PAGINA	
		FECHA	(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3317-2023 **CONTRATISTA:** JAC PUERTO PERALES, CORREGIMIENTO DE PTO PERALES

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE PUERTO PERALES DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 13/12/2023
PLAZO INICIAL: 1 MES
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (incluye prorrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 201.333.957,00
VALOR ACUMULADO: $ 201.333.957,00 (incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	31/10/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	31/12/2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.400.197,10	31/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100384287
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garanda en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGUN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			13/09/2023	31/12/2023
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	31/12/2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE 1000668331 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	20%	$ 40.266.791,40	13/09/2023	1/03/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		-	-	-
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.066.697,85	13/09/2023	30/04/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	$ 40.400.197,10	30/04/2024	30/04/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100384287
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación de la garanda en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			13/09/2023	30/04/2024
Predio, labores y operaciones.	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Patronal	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Vehiculos propios y no propios	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024
Contratistas y subcontratistas	10%	$ 232.000.000,00	13/09/2023	30/04/2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE 1000668331 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el interventor.
2. El interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (incluir las casillas que se requieran).

Firma
Nombre Jesus Orlando Vivas Noguera
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-32879 NTS

Original informe mensual de interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor y Dirección Territorial

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Seguimiento al plan de calidad contrato de obra FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-14

Nota: A la fecha no se han entregado los documentos del plan de calidad por parte del contratista de obra a la interventoría.

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

5.1.1 Aspectos legales del contrato

Tabla 4. Aspectos legales del contrato de interventoría

CONTRATO:	4804-2023
CONTRATISTA:	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"
N° PROCESO DE SELECCION	IP-DT-ANT-029-2023
N° ID DEL SECOP	CO1.PCCNTR.5620712
NIT CONTRATISTA	13.451.988-3
DIRECCION	Calle 51 No. 79-51 Medellín Antioquia COLOMBIA
FECHA DE SUSCRIPCION	1/12/2023
PLAZO INICIAL:	14/03/2024
FECHA INICIO:	14/12/2023

FECHA TERMINACIÓN ACTUAL:	14/03/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 57.596.402

5.1.2 Pólizas y seguros

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías, gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

La aprobación de la póliza única de cumplimiento No 100007003 de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A fue indicada mediante en la plataforma SECOP II.

Tabla 5. Póliza de cumplimiento del contrato de interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4804 - 2023 **INTERVENTOR:** JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA

OBJETO DEL CONTRATO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 14/03/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 57.596.402,00
VALOR ACUMULADO: $ 57.596.402,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 7.200.000,00	1/12/2023	30/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.400.000,00	1/12/2023	31/12/2026
Calidad del servicio	30%	$ 21.600.000,00	1/12/2023	31/12/2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100007003
Certificado de modificación o anexo No.: 0
último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/03/2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento	10%	$ 7.200.000,00	18/12/2023	15/09/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 14.400.000,00	18/12/2023	15/03/2027
Calidad del servicio	30%	$ 21.600.000,00	15/03/2024	15/03/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100007003
Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 4/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679 NTS

Firma
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-096961 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

Durante el transcurso del periodo comprendido entre el 14-31 de diciembre de 2023, la Interventoría desarrolló las siguientes actividades como seguimiento y control a la ejecución del contrato de interventoría N° 4804 de 2023

Dentro de las actividades administrativas se encuentran:

- ✓ Elaboración de Informes Semanales y Mensuales de interventoría.
- ✓ Comités de socialización con la territorial INVIAS Antioquia y la JAC.
- ✓ Seguimiento, control y aprobación de cuentas.

Dentro de las actividades técnicas se realizaron:

- ✓ Se realizo reconocimiento vial del tramo de carretera a intervenir por parte del ingeniero residente de interventoría.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En el cuadro “Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría”, presentado en el anexo denominado “Formatos de seguimiento mensual” y logrado con el desarrollo de la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se presenta parcialmente, con detalle a nivel diario, la participación o utilización de los profesionales en desarrollo de las actividades objeto de la Interventoría, en el periodo objeto del informe.

En este periodo ha intervenido el personal que está desarrollando las actividades de seguimiento y control a la ejecución de obras, de acuerdo a los estudios y diseños y a los documentos técnicos entregados por la entidad contratante, que hacen parte del proyecto.

6.2 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Hasta el momento no se ha realizado ningún movimiento financiero.

6.3 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

En el cuadro denominado “Seguimiento a las garantías contractuales interventoría” desarrollado en la forma MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se detalla el estado que presentan las pólizas o garantías del INTERVENOR (Garantía única), gestionadas en atención a los requerimientos contractuales; el cuadro se presenta en el anexo denominado Formatos de seguimiento mensual.

6.4 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se elevará consulta ante el INVIAS para establecer las condiciones y la forma de presentación del plan de calidad para su aprobación.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se requiere por parte del contratista, acatar todas las recomendaciones dadas por la interventoría, así mismo la entrega oportuna de la documentación solicitada, con el fin de avanzar lo más pronto con el inicio de actividades en el sitio.

8. ANEXOS

Anexo 8.1. Relación de la correspondencia generada entre INVIAS, contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

Tabla 7. Relación de la correspondencia recibida

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"					
RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE El 1 al 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
FECHA	**CORREO**	**REMITENTE**	**ENTIDAD**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
6 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora contrato	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Documentos plan de gestión social
16 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora contrato	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Solicitud e firma MEPI
18 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora contrato	JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA	Solicitud firma formato de prorroga

Gmail **jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>**

DOCUMENTOS PLAN DE GESTION SOCIAL

Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co> 6 de diciembre de 2023, 9:55

Buenos días,

Envío documentos del Plan de Gestión Social para los fines pertinentes.

Quedo atenta,

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co

PLAN DE GESTION SOCIAL.zip
7429K

21/2/24, 18:15 Gmail - Fwd: SOLICITUD DE FIRMA MIPI

Gmail jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

Fwd: SOLICITUD DE FIRMA MIPI

Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co> 16 de diciembre de 2023, 10:11
Para: "licitaciones.jevitarsas@gmail.com" <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

Obtener Outlook para iOS

De: Yalile Isaac Toscano <yisaac@invias.gov.co>
Enviado: Saturday, December 16, 2023 10:04:28 AM
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>
Asunto: SOLICITUD DE FIRMA MIPI

Cordial saludo.

Paul, por favor solicitar firma del documento adjunto al interventor para le día

Atentamente,

Yalile Isaac Toscano

Abogada - Contratista

Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

Dirección Territorial Antioquia

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

yisaac@invias.gov.co

Cel 3049695714

Calle 51 No. 79-51 B/ Los Colores, Medellín (Ant)

www.invias.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA INVIAS

de hoy

Atentamente,


https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e2653764d8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1784507750804284... 1/2

21/2/24, 18:15 Gmail - Fwd: SOLICITUD DE FIRMA MIPI

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario y puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de ser presentare alguna anomalía de carácter informático. atencionciudadano@invias.gov.co

MEPI CON 4398 DE 2023 (1).pdf
184K

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e2653764d8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1784507750804284... 2/2

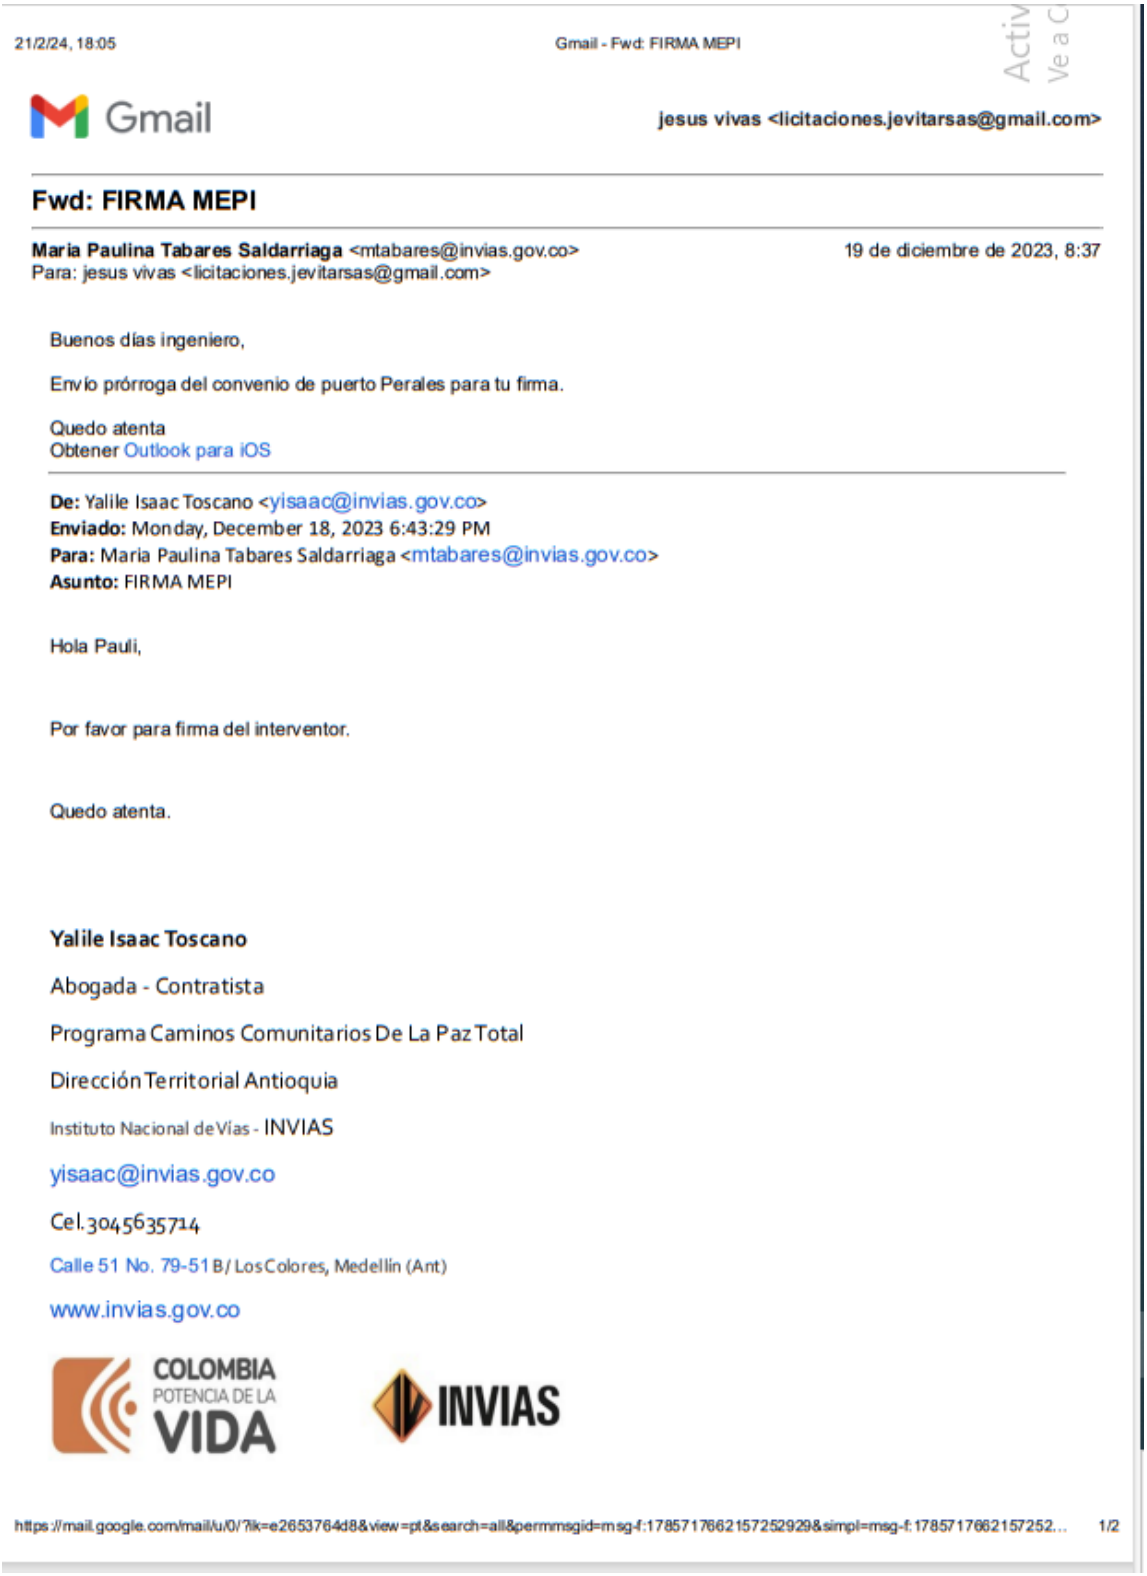

21/2/24, 18:05 Gmail - Fwd: FIRMA MEPI

Gmail jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

Fwd: FIRMA MEPI

Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co> 19 de diciembre de 2023, 8:37
Para: jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

Buenos días ingeniero,

Envio prórroga del convenio de puerto Perales para tu firma.

Quedo atenta
Obtener Outlook para iOS

De: Yalile Isaac Toscano <yisaac@invias.gov.co>
Enviado: Monday, December 18, 2023 6:43:29 PM
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>
Asunto: FIRMA MEPI

Hola Pauli,

Por favor para firma del interventor.

Quedo atenta.

Yalile Isaac Toscano

Abogada - Contratista

Programa Caminos Comunitarios De La Paz Total

Dirección Territorial Antioquia

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

yisaac@invias.gov.co

Cel. 3045635714

Calle 51 No. 79-51 B/ Los Colores, Medellín (Ant)

www.invias.gov.co

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA INVIAS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e2653764d8&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f:1785717662157252929&simpl=msg-f:1785717662157252... 1/2

Tabla 8. Relación de la correspondencia enviada

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"				
RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DESDE EL 1-31 DE DICIEMBRE DE 2023				
FECHA	**No DE OFICIO**	**DESTINATARIO**	**ENTIDAD/EMPRESA**	**ASUNTO**
4 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Entrega de póliza de cumplimiento INVIAS IP-DT-ANT-029-2023
6 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Hojas de vida profesionales interventoría IP-DT-ANT-029-2023
6 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Hojas de vida del inspector sst interventoría IP-DT-ANT-029-2023
14 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Hojas de vida profesionales interventoría IP-DT-ANT-029-2023
18 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Solicitud firma formatos de prórroga del cto 4804-2023
19 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Firma MEPI
19 de diciembre de 2023		María Paulina Tabares	Supervisora de contrato INVIAS	Redam ACTUALIZADO Jesús Vivas

21/2/24, 18:21 Gmail - Entregan de póliza de cumplimiento INVIAS IP-DT-ANT-029-2023

Gmail **jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>**

Entregan de póliza de cumplimiento INVIAS IP-DT-ANT-029-2023

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 4 de diciembre de 2023, 15:58
Para: mtabares@invias.gov.co

Cordial saludo
Ingeniera María Paulina Tabares
mtabares@invias.gov.co

Entrego póliza de cumplimiento

Quedo atento de instrucciones

--

Gracias.
Atentamente,

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

POLIZA-JESUS O V_signed.pdf
1316K

Gmail

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

HOJAS DE VIDA PROFESIONALES INTERVENTORIA IP-DT-ANT-029-2023

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 6 de diciembre de 2023, 19:12
Para: mtabares@invias.gov.co

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Calle 51 No. 79-51 Medellín
Antioquia COLOMBIA
Atención: Ingeniera María Paulina Tabares
mtabares@invias.gov.co

REFERENCIA 1: Proceso de Contratación **IP-DT-ANT-029-2023.**

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Asunto: Entrega de Hojas de vida del personal profesional

Cordial saludo.

Ver anexo

Atentamente,

JESUS ORLANDO VIVAS

HOJAS DE VIDA PROFESIONALES IP-DT-ANT-029-2023.zip

OFICIO ENTREGA HOJAS DE VIDA PROFESIONALES IP-DT-ANT-029-2023.pdf
40K

Gmail

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

Hoja de vida del Inspector SST INTERVENTORIA IP-DT-ANT-029-2023

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 7 de diciembre de 2023, 16:47
Para: mtabares@invias.gov.co

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
Calle 51 No. 79-51 Medellín
Antioquia COLOMBIA
Atención: Ingeniera María Paulina Tabares
mtabares@invias.gov.co

Cordial saludo

Entrego Hoja de vida del Inspector SST

--

Gracias.
Atentamente,

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

INSPECTOR SST.zip
6902K

Gmail

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

HOJAS DE VIDA PROFESIONALES INTERVENTORIA IP-DT-ANT-029-2023

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 14 de diciembre de 2023, 15:44
Para: mtabares@invias.gov.co

Cordial saludo
Atención: Ingeniera María Paulina Tabares
mtabares@invias.gov.co

Anexo Hojas de vida completas para estudio de aprobación
para el inicio de la ejecución del Contrato de Interventoría INVIAS 4804-2023

Para la socialización con la comunidad, con posibilidad de realizarse el próximo 19 de diciembre,

Le pido el favor si es posible, hacer reunión virtual previa con

personal de interventoría para aclarar dudas del personal

HVCompletas-INTERVENTORIA-4804de2023-PtoTriunfo...

[El texto citado está oculto]
–

Gracias.
Atentamente,

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

Gmail jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

SOLICITUD FIRMA FORMATOS DE PRORROGA DEL CTO 4804-2023

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 18 de diciembre de 2023, 21:43
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>
Cc: Yalile Isaac Toscano <yisaac@invias.gov.co>

Cordial saludo

Atención: Ingeniera María Paulina Tabares
mtabares@invias.gov.co

Cordial saludo

Entrego
- SOLICITUD PRORROGA - PUERTO TRIUNFO_firmado
- SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1
- Certificado REDAM JESUS VIVAS
- CÉDULA JESUS VIVAS

Después de aprobación de prórroga, estaré atento para solicitar a la aseguradora la ampliación de póliza de cumplimiento del
contrato 4804-2023 para la interventoría de los proyectos en las veredas de Puerto Triunfo,
la cual se hará llegar tan pronto la expidan.

Estaré atento a ampliar cualquier información
--

Gracias.
Atentamente,

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

[El texto citado está oculto]
--

4 adjuntos

Certificado_REDAM JESUS VIVAS.pdf
37K

SOLICITUD PRORROGA - PUERTO TRIUNFO_signed.pdf
239K

MEPI PTO TRIUNFO_firmado.pdf
178K

CEDULA JESUS VIVAS.pdf
276K

21/2/24, 18:06 Gmail - Fwd: FIRMA MEPI

Gmail **jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>**

Fwd: FIRMA MEPI

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 19 de diciembre de 2023, 9:58
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>

Cordial saludo
Ingeniera María Paulina Tabares

mtabares@invias.gov.co

Entrego prórroga del convenio de puerto Perales: MEPI CON 3317 DE 2023 firmado

Quedo atento de instrucciones

--

Gracias.
Atentamente,

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

[El texto citado está oculto]

MEPI CON 3317 DE 2023_firmado.pdf
218K

21/2/24, 18:04 Gmail - REDAM Jesus Vivas actualizado

Gmail

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com>

REDAM Jesus Vivas actualizado

jesus vivas <licitaciones.jevitarsas@gmail.com> 19 de diciembre de 2023, 15:56
Para: Maria Paulina Tabares Saldarriaga <mtabares@invias.gov.co>

Cordial saludo
Ingeniera María Paulina Tabares

mtabares@invias.gov.co

Entrego documentos actualizados

Quedo atento de instrucciones

--

Gracias.
Atentamente,

JESÚS ORLANDO VIVAS NOGUERA

09 CERTIFICADOS ACTUALIZADOS-dic23.zip
478K

Anexo 8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

Hasta el momento no se han ejecutado actividades de obra.

Firma

Nombre: **JESUS ORLANDO VIVAS NOGUERA**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-35679NTS
