

MANTENIMIENTO
Rocería y Limpieza
Alcantarillas



MEJORAMIENTO
Construcción
de alcantarillas



MEJORAMIENTO
Construcción Placa
Huella o pavimento

Construcción – Consultoría - Interventoría

INFORME DE INTERVENTORÍA NO. 4
CONTRATO 4597 – 2023
CONVENIOS GARZÓN, HUILA

PERIODO: 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATISTA:
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GARZÓN, HUILA

INTERVENTOR:
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

SUPERVISOR:
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

ABRIL DE 2024

Contenido

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – LA CABAÑA 5

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – SAN LUIS 7

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – POTRERILLOS 8

RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROY – EL MESÓN 10

INTRODUCCIÓN 11

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3802 DE 2023, JAC VEREDA LA CABAÑA 11

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 11

1.1.1 Localización 11

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 12

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 12

1.1.4 Características técnicas del proyecto 13

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 13

1.2.1 Información general del contrato 13

1.2.2 Descripción de las actividades 14

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 15

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 15

1.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 16

1.3.1 Informe semanal 16

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 16

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 17

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 17

1.3.5 Estado general del tiempo 18

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 18

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 18

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 19

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 20

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4176 DE 2023, JAC VEREDA SAN LUIS 21

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 21

2.1.1 Localización 21

2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 22
2.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 22
2.1.4 Características técnicas del proyecto 23
2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 23
2.2.1 Información general del contrato 23
2.2.2 Descripción de las actividades 24
2.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 24
2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 24
2.3 REPORTE a EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 25
2.3.1 Informe semanal 25
2.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 25
2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 25
2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 25
2.3.5 Estado general del tiempo 26
2.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 26
2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 26
2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 27
2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 27
3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA POTRERILLOS 28
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 28
3.1.1 Localización 28
3.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 29
3.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 29
3.1.4 Características técnicas del proyecto 30
3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 30
3.2.1 Información general del contrato 30
3.2.2 Descripción de las actividades 31
3.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 32
3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 32
3.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 33

3.3.1 Informe semanal 33
3.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 33
3.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 33
3.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 34
3.3.5 Estado general del tiempo 35
3.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 35
3.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 35
3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 36
3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 36
4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA EL MESÓN 38
4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 38
4.1.1 Localización 38
4.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 38
4.1.3 Inventario y estado inicial de la vía 39
4.1.4 Características técnicas del proyecto 39
4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 39
4.2.1 Información general del contrato 39
4.2.2 Descripción de las actividades 40
4.2.3 Seguimiento Ítems no previstos 41
4.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 41
4.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA 41
4.3.1 Informe semanal 41
4.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra 41
4.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra 41
4.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra 42
4.3.5 Estado general del tiempo 42
4.3.6 Resumen ensayos de laboratorio 42
4.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra 42
4.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra 43
4.3.9 Otros documentos seguimiento mensual 43
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 44

5.1 Información general del contrato 44

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor 45

5.3 Informes especialistas y profesionales 46

5.4 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría 48

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 48

6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría 48

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría 48

6.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría 49

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría 49

6.5 Otros documentos seguimiento mensual 50

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 50

8. ANEXOS 51

8.1 Relación de la correspondencia 51

8.2 Registro fotográfico 51

8.3 Bitácora 54

8.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios 54

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 3802 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 28/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1: 17/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 17/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.105.183,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.105.183,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	60,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,36
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,08
	Subbase Granular Clase C	M3	106,03
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in	M3	73,27
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	32,23
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3407,21
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in s	M3	0,80
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in s	M3	9,60
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	M3	23,00
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	5,00
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	1,2
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	97,5	97,5
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	7,56	7,56
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	500	500
Excavaciones varias sin Clasificar	33,58	33,58
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	2,7	2,7
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	4,83	4,83
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	305,08	305,08
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	9,16	9,16
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior	6	6
Suministro e instalación de saco suelo	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.026.250,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.260.788,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.818.145,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.105.183,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	36.034.809,67	36.247.219,27
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	7.407.800,00	16.962.998,21
VALOR TOTAL EJECUTADO	43.442.609,67	53.210.217,48

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 134.924.937,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 36.247.219,27
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 26,86%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Instalación de formaleta y fundición de concreto ciclópeo	**Fundición y terminación de la superficie del concreto ciclópeo**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

PERIODO MES: ENERO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4176 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 30/12/2023
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1: 19/01/2024
FECHA DE PRÓRROGA No. 1: 19/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 188.483.432,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 188.483.432,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	42,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,80
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,69
	Subbase Granular Clase C	M3	122,02
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	84,49
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	37,19
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3923,81

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	140.457.826,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.213.735,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.811.871,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	187.483.432,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 187.483.432,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar la localización y actividad.	**Indicar la localización y actividad.**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA
PERIODO MES: MARZO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4126 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 1/12/2023
FECHA DE PRÓRROGA: 7/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2024

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.252.458,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.252.458,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023
INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	36,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	2,00
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	3,95
	Subbase Granular Clase C	M3	102,51
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	77,71
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	25,06
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	3566,30
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	43,40
	Excavaciones en roca en seco	M3	7,70
	Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in s	M3	0,80
	Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in s	M3	9,60
	Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	578,90
	Relleno para estructuras con suelo	M3	23,00
	Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de	M	5,00
	Suministro e instalación de saco suelo	M2	45,00

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0,97
Excavaciones varias sin Clasificar	8,25	8,25
Subbase Granular Clase C	101,25	101,25
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	68,98	68,98
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	2987,8	2987,8
Excavaciones varias sin Clasificar	0	11,7
Excavaciones en roca en seco	0	0
Concreto reforzado resistencia 14 Mpa (F) - mezcla in situ	0,44	1,49
Concreto reforzado resistencia 21 MPa (D) - mezcla in situ	3,9	3,9
Acero de Refuerzo Fy 4200 Mpa	76,62	76,62
Relleno para estructuras con suelo	117,14	121,15
Tubería de Concreto Reforzado 21 Mpa de 900 mm de diámetro interior		5
Suministro e instalación de saco suelo		2,45

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	142.168.683,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.265.060,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	41.818.715,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.252.458,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	104.629.809,87	109.461.698,85
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	10.004.620,00	25.568.925,34
VALOR TOTAL EJECUTADO	114.634.429,87	135.030.624,19

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 188.252.458,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 135.030.624,19
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 71,73%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 3
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **8**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	
		VERSION	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Compactación de la subbase granular / Construcción de alcantarilla de 36"





Construcción de alcantarilla de 36" / Construcción de placa huella en concreto reforzado

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA **PERIODO MES:** MARZO DE 2024

CONVENIO SOLIDARIO No.: 4777 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL MESÓN DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 189.724.356,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 189.724.356,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** WILDER ORLEY SALAZAR

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	ml	42,00
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	0,60
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	Excavaciones varias sin Clasificar	M3	4,79
	Subbase Granular Clase C	M3	124,54
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in s	M3	86,34
	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	M3	38,01
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	KG	4007,88

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Limpieza a mano de alcantarillas de 600mm a 900mm	0	0
Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	0	0
Excavaciones varias sin Clasificar	0	0
Subbase Granular Clase C	0	0
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	0	0
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	0	0
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	0	0

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO
BÁSICO DE OBRA	141.657.946,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	4.249.738,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	42.816.672,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	188.724.356,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	ACUMULADO
BÁSICO DE OBRA	0,00	0,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA DEL CONVENIO

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 188.724.356,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto 1

Tramo postulado por JAC El Mesón - Visita de verificación técnica por parte del INVIAS

Foto 2

Tramo postulado por JAC El Mesón - Visita de verificación técnica por parte del INVIAS

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica en el periodo reportado.

Firma
Nombre SILVIA LORENA ORDOÑEZ
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INTRODUCCIÓN

El INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS suscribió convenios solidarios con Juntas de Acción Comunal del departamento, bajo el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Para lo cual, en el municipio de Garzón las JAC La Cabaña, San Luis, Potrerillos y El Mesón, suscribieron los convenios solidarios No. 3802, 4176, 4126 y 4777 de 2023, respectivamente.

Dado lo anterior, el INVIAS mediante proceso IP-DT-HUI-010-2023 efectuó el contrato No. 4597 de 2023 con orden de inicio 2023S-VHUI-029107 para realizar la interventoría a los convenios solidarios anteriormente mencionados, con el objeto "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo anterior, el INVIAS designó como Supervisor del contrato de interventoría al ing. Wilder Orley Salazar Cuellar.

El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados.

El presente informe parcial contempla las actividades realizadas en cada uno de los convenios en el periodo entre el 01 de marzo de 2024 hasta el 31 de marzo de 2024.

1. CONVENIO SOLIDARIO NO. 3802 DE 2023, JAC VEREDA LA CABAÑA

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda la Cabaña, teniendo como punto de referencia inicial la vía denominada la Parabólica en la coordenada NORTE 2.193402 OESTE 75.593027 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.191511 OESTE

75.592453, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.

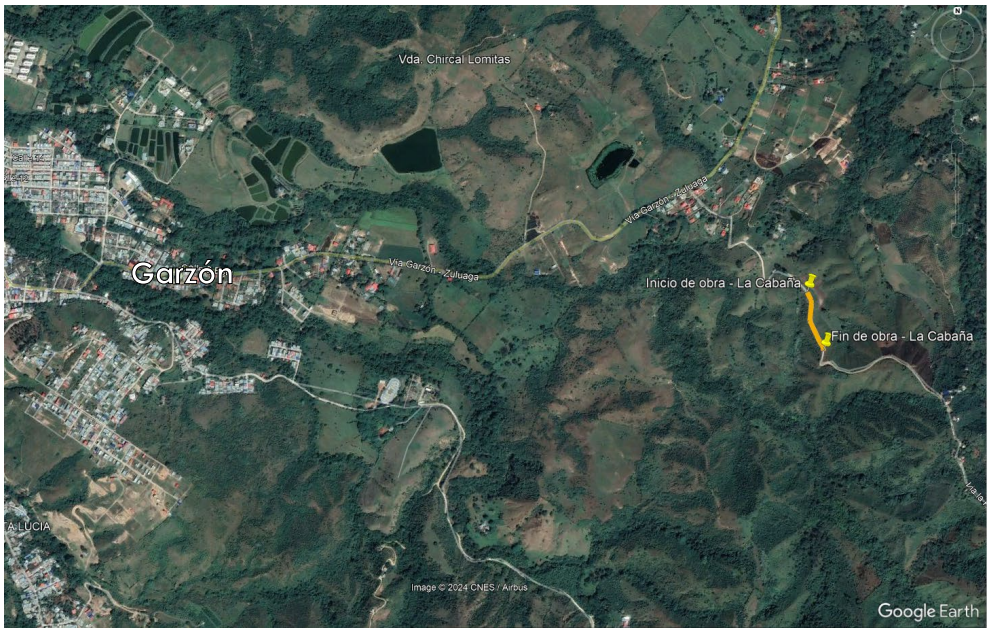


Ilustración 1. Localización de la obra del convenio 3802 de 2023 - JAC La Cabaña

1.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Con la ejecución del proyecto, la población de las veredas ubicadas sobre la vía la Parabólica, la cual corresponde a una variante generada sobre la vía que comunica a Garzón – Zuluaga; allí se encuentran principalmente las poblaciones de La Cabaña y Mesón, que son veredas productoras y comercializadores de café, lo cual permite mejorar las condiciones de conectividad en materia de transporte, principalmente al municipio de Garzón.

Por otra parte, a 2.2 km del cruce de la vía que comunica a Zuluaga, sobre la vía la Parabólica se encuentra el sitio turístico denominado Mirador La Torre Garzón el cual genera un volumen considerable de tránsito atraído.

1.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 126 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

1.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
10,00	1,36	126,00	1

1.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

1.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	3802 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	9/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal de La Cabaña del municipio de Garzón – Huila
RUT	891.101.472-1
VALOR INICIAL	$ 189.105.183,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.105.183,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-028489 de fecha 14/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023

SUSPENSIÓN No. 1	28/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

1.2.2 Descripción de las actividades

El miércoles 06/03/2024 se realizó el comité operativo No. 10, donde se realizaron ajustes en cuanto proveedor de Vibro Compactador ya que el anterior aprobado presentó daños en el equipo y no podía prestar el servicio, se aprobó a NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ; se socializó y aprobó la contratación de un proveedor para el flejado del acero: FLEJES DEL HUILA; así como la hoja de vida de un ayudante de obra, teniendo en cuenta que una de las personas aprobadas anteriormente desertó del cargo. Se autorizó la transferencia de recursos No. 5.

Durante la semana se efectuaron actividades de mejoramiento como la conformación de la subrasante, la cual estuvo acompañado por la topografía para garantizar el cumplimiento del diseño; en cuanto a la reposición de la alcantarilla, se realizó la excavación mecánica e instalación de la tubería de concreto reforzado, con su respectivo solado y relleno.

Durante la semana se efectuaron actividades de reposición de la alcantarilla de 36" tales como la excavación, figurado e instalación de acero, fundida de concreto y relleno con material seleccionado, de la poceta y el descole. También, se realizó la toma de muestras de cilindro del concreto mezclado en obra para efectuar el respectivo control de laboratorio. Por otra parte, se realizó el acopio de material como subbase y arena en el punto de obra.

El viernes 15/03/2024 se realizó el comité operativo No. 11, donde se aprobó la transferencia de recursos No. 6 que comprendía la nómina del personal operativo. En cuanto a la ejecución de obra, durante la semana se realizó la instalación y compactación de la subbase granular. Además, se transportó el material pétreo de arena y triturado, y materiales de obra como cemento y acero, lo cual permitió efectuar el corte y figurado del acero de vigas riostras. Sin embargo, cabe resaltar que parte del atraso en la programación semanal fue debido al trámite del desembolso de los recursos en la cuenta de los proveedores.

Durante la semana se realizó el encofrado y fundición de la placa en concreto ciclópeo de acuerdo con el diseño en una longitud aproximada de 60 m. También, se realizó el corte y armado del acero de refuerzo de las vigas riostras según el diseño. Cabe resaltar que la semana corresponde a la conmemoración de la semana santa, por lo cual, la cantidad de días laborados fue menor.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de marzo de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 142.026.250,00	N/A	$ 36.034.809,67	$ 36.247.219,27	$ 105.779.030,73
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.260.788,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.260.788,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.818.145,00	N/A	$ 7.407.800,00	$ 16.962.998,21	$ 24.855.146,79
TOTAL	**$ 188.105.183,00**	**N/A**	**$ 43.442.609,67**	**$ 53.210.217,48**	**$ 134.894.965,52**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 28,29%. Esta información se encuentra reportada en los informes semanales.

1.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

1.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio.

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación de la Junta de Acción Comunal, presidente y tesorero, así como de los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron comparativos acompañados de cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

Al inicio de las obras se hace necesario la realización de topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante, para lo cual se

solicitan los certificados de calibración de equipos. Lo anterior, nos sirve como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

- Revisión y/o ajuste de estudios y diseños

La interventoría realiza la revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños de presentados por la JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

Se anexan los formatos "ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS".

1.3 RTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

1.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 12: Desde el 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024.
- Semana 13: Desde el 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024.
- Semana 14: Desde el 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024.
- Semana 15: Desde el 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

1.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

El 05 de marzo de 2024 se realizaron trabajos de excavación mecánica para la instalación de la tubería de la alcantarilla y adecuación de los descoles naturales a lo largo de la localización de la placa huella. Luego, el 11 de marzo se efectúa la extensión de la subbase granular para su posterior compactación. Por lo cual, se relaciona la maquinaria empleada durante el periodo.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

1.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el periodo de marzo de 2024 se mantuvo el personal calificado y se realizó se realizó la vinculación e inicio del personal relacionado a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO	Contadora	23/01/2024	Prestación de servicios
2	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA	Residente	23/01/2024	Prestación de servicios
3	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA	Maestro	04/03/2024	Obra labor
4	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	Ayudante	04/03/2024	Obra labor
5	YESID ROJAS	Ayudante	04/03/2024	Obra labor
6	PASTOR OLAYA LOPEZ LOPEZ	Ayudante	04/03/2024	Obra labor
7	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	Ayudante	04/03/2024	Obra labor

Se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

1.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 3802 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1179823 de fecha 2023-10-20 por valor $ 188.105.183,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 184.075.692,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 4.029.491,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS", ya que no se modifica.

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

1.3.5 Estado general del tiempo

El clima registrado en obra fue tomado desde el 04 de marzo que iniciaron las labores en campo, registrando periodos de lluvia intensa que impedían el normal desarrollo de las actividades, sin embargo, trabajo que fue compensado los días soleados como se registró en la bitácora de obra.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

1.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, la empresa SEND SUELOS Y CONCRETOS realizó la toma de densidades en el terreno de acuerdo con el ensayo INV-E-161 "DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA" el 16 de marzo de 2024 mediante dos (2) muestras en las abscisas de la placa huella PR 00+030 y PR 00+070; luego, el 18 de marzo de 2024 mediante tres (3) muestras en los PR 00+090, PR 00+100 y PR 00+120; presentando un informe el 19 de marzo con resultados promedio de 95,32% de compactación para todos los ensayos, lo cual cumple con la norma técnica.

Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

1.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial y la suspensión No. 1:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 1 de fecha 1/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 0 de fecha 18/10/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	09/10/2023	31/10/2024

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	31/12/2023	31/12/2028
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	09/10/2023	31/12/2026
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	18/10/2023	31/12/2023

- Suspensión No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 2 de fecha 29/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 1 de fecha 29/01/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	31/10/2023	20/11/2024
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	20/01/2024	20/01/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	31/12/2026	20/01/2027
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**20/01/2024**	**20/01/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/12/2023	20/01/2024

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002981 certificado No. 3 de fecha 30/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007865 certificado No. 2 de fecha 30/01/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 37.821.037,00	20/11/2024	02/03/2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.731.555,00	30/04/2024	30/04/2029
PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5%	$ 9.455.260,00	20/01/2027	02/05/2027
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**27/01/2024**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	20/01/2024	30/04/2024

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no se modifica.

1.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

1.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 1 presentada por el ingeniero residente de obra, a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 28,29% con respecto a un porcentaje programado del 93% del proyecto.

  Lo anterior, se debe a que las actividades realizadas en marzo fueron afectadas por la dificultad de conseguir proveedores de maquinaria amarilla en la región para las actividades cajeo, extensión de material y compactación; sin embargo, el avance se vio representado en la construcción la alcantarilla.

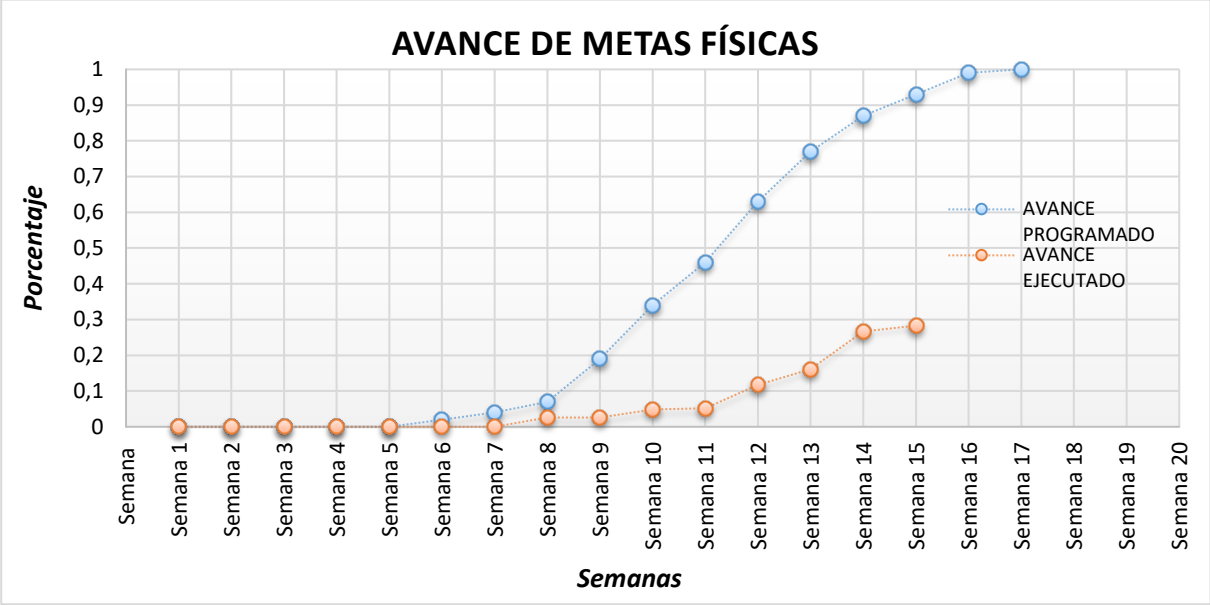

De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizará la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-actas y acta de recibo parcial de

obra para convenios. Para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
06/03/2024	Comité operativo No. 10	Se presentó nuevamente cotización de proveedor de vibro compactador, así como propuesta de flejado del acero y oficial de obra.
15/03/2024	Comité operativo No. 11	Se presentó nuevamente cotización de proveedor de vibro compactador, dados los incumplimientos por parte de los proveedores anteriores; también, se presentó trasferencia de recursos correspondiente a la nómina del personal operativo.
20/03/2024	Comité operativo No. 12	Se solicitó una autorización de transferencia para la compra de materiales pétreos que se requerían para culminar el alcance de placa huella del convenio, así como los pagos de nómina y honorarios correspondientes, y cuentas pendientes por pagar por servicios de topografía.

  Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

2. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4176 DE 2023, JAC VEREDA SAN LUIS

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda San Luis, teniendo como punto de referencia inicial el portón donde Alberto en la vereda San Luis con la coordenada NORTE 2.065109 OESTE 75.64341 y punto de referencia final la coordenada NORTE

2.064123 OESTE 75.642938, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 2. Localización de la obra del convenio 4176 de 2023 - JAC San Luis

2.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

En el tramo postulado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Luis, en el municipio de Garzón, transitan diariamente más de 50 vehículos al día, transportando los productos agrícolas como café, yuca, maíz, arracacha, así como también se desarrolla la actividad ganadera de doble propósito, porcícola y avícola. Es de destacar que se cuenta con actividad turística alrededor de fincas de la zona.

2.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 145 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor.





Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

2.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
7,00	0,80	145,00	0

2.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4176 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	2/12/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda San Luis del municipio de Garzón – Huila
RUT	900.016.133-6
VALOR INICIAL	$ 188.483.432,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 188.483.432,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-033843 de fecha 30/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	30/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	19/01/2024
PRÓRROGA No. 1	19/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

2.2.2 Descripción de las actividades

El 03 de marzo de 2024 se expidieron las pólizas de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 1 y responsabilidad civil extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 1, que amparan la suspensión No. 1 y la prórroga No. 1 con nueva fecha de terminación el 30 de abril de 2024.

Por otra parte, el 26 de marzo de 2024 se realizó el desembolso de los recursos en la cuenta de manejo conjunto del convenio solidario, por lo cual se programará la socialización de inicio con la comunidad de la vereda por parte del INVIAS e interventoría, para el siguiente periodo.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de marzo de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 140.457.826,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.457.826,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.213.735,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.213.735,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.811.871,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.811.871,00
TOTAL	**$ 187.483.432,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 187.483.432,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%.

2.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

Teniendo en cuenta que el contratista no cuenta con el desembolso de los recursos no se ha evaluado el presupuesto y, por ende, no se ha requerido la legalización de ítems no previstos al presupuesto.

2.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el periodo reportado la interventoría realizó seguimiento al estado del convenio, dado el desembolso del recurso el 26 de marzo de 2024; para lo cual, se programó la socialización de inicio para inicios del siguiente periodo.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la OAC con el fin de socializar el convenio solidario y presupuesto oficial, así mismo para adelantar temas de

contratación del personal calificado, tramitar los permisos y/o autorización de captación de agua y espacio para el almacenamiento de los materiales.

2.3 REPORTE a EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

2.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 12: Desde el 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024.
- Semana 13: Desde el 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024.
- Semana 14: Desde el 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024.
- Semana 15: Desde el 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

2.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el mes de marzo de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, debido a que el contratista no cuenta con los recursos desembolsados para iniciar con la ejecución.

No se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

2.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el periodo reportado no se realizaron contrataciones de personal.

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

2.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4176 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1450023 de fecha 2023-12-30 por valor $ 187.483.432,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA

PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 184.689.694,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 2.793.738,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

2.3.5 Estado general del tiempo

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

2.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, no se han ejecutado ensayos de laboratorio. Por lo anterior, no se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

2.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 0 de fecha 14/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	02/12/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	02/12/2023	31/12/2026

ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	31/12/2023

- Suspensión No. 1 y Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. NB-100299715 anexo No. 1 de fecha 01/03/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100074298 anexo No. 0 de fecha 01/03/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.696.687,00	31/12/2023	01/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.424.172,00	31/12/2023	30/04/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.545.030,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 104.007.852,00**	**30/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	02/12/2023	30/04/2024

Se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS".

2.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

2.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta que el desembolso de recursos fue realizado el 26 de marzo de 2024, se tiene pendiente aprobar al personal calificado, el cual realizará la programación de obra con el fin de efectuar el respectivo seguimiento.

  De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

  Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades

de obra ejecutadas soportadas mediante pre-actas y acta de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se ejecutaron actividades, por lo cual, no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado no se han realizado reuniones ni comités de obra, dado que el convenio no cuenta con el desembolso de recursos correspondiente.

3. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA POTRERILLOS

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda Potrerillos, teniendo como punto de referencia inicial la vía hacia la vereda Potrerillos desde la vereda Paraíso, en la curva del portón blanco con coordenadas NORTE 2.146264 OESTE 75.604431 y punto de referencia final la coordenada NORTE 2.147764 OESTE 75.603286, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 3. Localización de la obra del convenio 4126 de 2023 - JAC Potrerillos

3.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

En el tramo postulado por la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos, en el municipio de Garzón, transitan diariamente entre 30 y 50 vehículos al día, transportando los productos agrícolas como café, plátano cacao y frutales como mandarina y guanábana, así como también se desarrolla la actividad ganadera para producción de leche, la actividad piscícola de tilapia de Nilo y roja. Por la vía postulada se estima un tránsito menor a 20 vehículos al día, lo cual indica una actividad tranquila y un ambiente rural en la vereda, donde los desplazamientos son principalmente para actividades locales y de proximidad.

3.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 134 m de material afirmado en estado regular puesto que no tiene una adecuada conformación de cunetas y la falta de material que permita tener una superficie homogénea, ya que se encuentran baches a lo largo del corredor; además, se presenta una erosión del afirmado.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

3.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
6,00	2,00	134,00	1

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4126 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	26/10/2023
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda Potrerillos del municipio de Garzón – Huila
RUT	813.005.618-3
VALOR INICIAL	$ 189.252.458,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.252.458,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VBOG-025348 de fecha 01/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023

PRÓRROGA No. 1	07/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

3.2.2 Descripción de las actividades

Durante la primera semana, se realizaron actividades de mejoramiento como la compactación de la subbase granular instalada. En cuanto a la alcantarilla, se realizó el figurado y armado del acero de la poceta y descole para su posterior fundición y relleno lateral.

Luego, se realizaron actividades de figurado y armado del acero de la placa huella de acuerdo con el diseño. Así mismo, se efectuaron labores de excavación manual de las vigas riostras, cunetas y colocación del acero de las mismas. Se realizan ensayos de densidades por parte del contratista.

El viernes 15/03/2024 se realizó el comité operativo No. 12, donde se aprobó la transferencia de recursos No. 7 que comprendía la nómina del personal operativo, retenciones, transporte de agregados, anti sol, abono al maestro por la alcantarilla construida y maquinaria vibro compactador. En cuanto a la ejecución de obra, durante la semana se realizó la fundición de los primeros 39 m de placa huella en concreto reforzado de acuerdo con el diseño, además, de aplicar el anti sol sobre la superficie de la estructura para evitar la evaporación del agua del concreto; también, se realizó el figurado e instalación de acero para poder fundir la siguiente semana. Sin embargo, cabe resaltar que parte del atraso en la programación semanal fue debido al trámite del desembolso de los recursos en la cuenta de los proveedores, y el incumplimiento por parte del proveedor de la maquinaria vibro compactador, por lo que fue necesario conseguir otro equipo.

Durante la última semana se realizó la fundición de aproximadamente 57 m de placa huella en concreto reforzado de acuerdo con el diseño, además, de aplicar el anti sol sobre la superficie de la estructura para evitar la evaporación del agua del concreto; también, se realizó el figurado e instalación de acero para poder fundir la siguiente semana. Adicionalmente, se terminaron las fundiciones de guarda ruedas del encole y descole de la alcantarilla teniendo en cuenta que se aproximaba la fundida de placa huella sobre la misma. Cabe resaltar que la semana corresponde a la conmemoración de la semana santa, por lo cual, la cantidad de días laborados fue menor.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de marzo de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO

BÁSICO DE OBRA	$ 142.168.683,00	N/A	$ 104.629.809,87	$ 109.461.698,85	$ 32.706.984,15
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.265.060,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.265.060,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 41.818.715,00	N/A	$ 10.004.620,00	$ 25.506.925,34	$ 16.311.789,66
TOTAL	**$ 188.252.458,00**	**N/A**	**$ 114.634.429,87**	**$ 134.968.624,19**	**$ 53.283.833,81**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 71,70%. Esta información se encuentra reportada en los informes semanales.

3.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

A la fecha no se ha requerido la creación de ítems no previstos al presupuesto.

3.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

Se efectuaron los comités dirigidos por la interventoría, con la participación del presidente y tesorero de la Junta de Acción Comunal, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados; allí, se presentaron cotizaciones y se realizó la evaluación correspondiente costo/beneficio para la aprobación y trámite de transferencia de recursos que permitiese la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría garantiza que la Junta realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en garantizar la participación de la comunidad mediante una contratación directa con la Junta y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

Al inicio de las obras se hace necesario la realización de topografía y estudios de suelos para determinar las características físicas y mecánicas de la subrasante, para lo cual se solicitan los certificados de calibración de equipos. Lo anterior, nos sirve como suministro para realizar la revisión y/o ajustes de estudios y diseños.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Igualmente, es necesario que la obra cuente con los elementos que permitan la señalización preventiva y realizar controles ambientales.

- Revisión y/o ajuste de estudios y diseños

La interventoría realiza la revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños de entregados por JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

Se anexan los formatos "ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS".

3.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

3.3.1 Informe semanal

Con el fin de realizar un seguimiento a las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, se efectúa el diligenciamiento del informe semanal:

- Semana 12: Desde el 01 de marzo de 2024 al 07 de marzo de 2024.
- Semana 13: Desde el 08 de marzo de 2024 al 14 de marzo de 2024.
- Semana 14: Desde el 15 de marzo de 2024 al 21 de marzo de 2024.
- Semana 15: Desde el 22 de marzo de 2024 al 28 de marzo de 2024.

Se anexan los formatos "INFORMES SEMANALES".

3.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el mes de marzo de 2024 se realizó el proceso de cotización y aprobación del equipo de compactación, encontrando grandes dificultades para realizar el alquiler por cuestión de incumplimiento por parte de los proveedores y los altos costos que requerían algunos para realizar los trabajos en la junta. Sin embargo, se alquiló un vibro compactador mono cilíndrico en obra desde el 21 al 23 de marzo.

Se anexa el formato "MAQUINARIA Y EQUIPO".

3.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

En el periodo de marzo de 2024 se mantuvo el personal calificado y operativo:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO	VINCULACIÓN

1	YURI ANDREA PARRA SERRANO	Contadora	02/01/2024	Prestación de servicios
2	LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ	Residente	02/01/2024	Prestación de servicios
3	CELESTINO CARVAJAL GARCÍA	Maestro	15/02/2024	Obra labor
4	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA	Oficial	15/02/2024	Obra labor
5	JEFFERON GONZALEZ NIETO	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
6	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
7	MARCOS EDUARDO LOPEZ LÓPEZ	Ayudante	15/02/2024	Obra labor
8	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	Ayudante	15/02/2024	Obra labor

No se anexa el formato "PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL".

3.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4126 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1274323 de fecha 2023-11-20 por valor $ 188.252.458,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 185.625.186,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 2.627.272,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS", ya que no se modifica.

Se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

Se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

3.3.5 Estado general del tiempo

El clima en obra corresponde mayormente a unas condiciones nubladas con leves lloviznas en la madrugada que no tuvieron un registro por parte del residente de obra, sin embargo, el clima registrado en bitácora refleja las condiciones secas y nubladas en las jornadas laborales.

Se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

3.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, la empresa SEND SUELOS Y CONCRETOS realizó la toma de densidades en el terreno de acuerdo con el ensayo INV-E-161 "DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA" el 14 de marzo de 2024 mediante cuatro (4) muestras en las abscisas de la placa huella K 00+040, K 00+080, K 00+107 y K 00+160, donde se tuvo resultados que no alcanzaron la densidad optima, por lo cual se realizaron las acciones de mejora correspondiente; luego, el 26 de marzo de 2024 se toman nuevamente densidades dentro de las abscisas de estudio, dando como resultado una compactación promedio de 95,65%, lo cual cumple con la norma técnica.

Se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

3.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. 137105283 certificado No. 0 de fecha 08/11/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007889 certificado No. 0 de fecha 14/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.850.492,00	26/10/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.462.623,00	26/10/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.775.738,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.088.853,00**	**26/10/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	26/10/2023	31/12/2023

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. 3002994 certificado No. 1 de fecha 19/01/2024 y de responsabilidad civil y extracontractual No. 1007889 certificado No. 1 de fecha 19/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.850.492,00	31/10/2024	01/03/2025
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.462.623,00	31/12/2026	01/05/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.775.738,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 104.088.853,00**	**17/01/2024**	**30/04/2029**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	31/12/2023	30/04/2024

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no se modifica.

3.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra


Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

3.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta la programación No. 1 presentada por el ingeniero residente de obra, a la fecha de corte se tiene un porcentaje de ejecución del 71,70% con respecto a un porcentaje programado del 84% del proyecto.

  Debido a que las actividades correspondientes al inicio de la construcción de placa huella se vieron afectadas por la contratación de la contratación de maquinaria amarilla, en especial el vibro compactador; lo anterior, desprogramando las actividades del personal operativo; sin embargo, el avance presentado corresponde a la terminación de la alcantarilla e inicio en la construcción de placa huella.

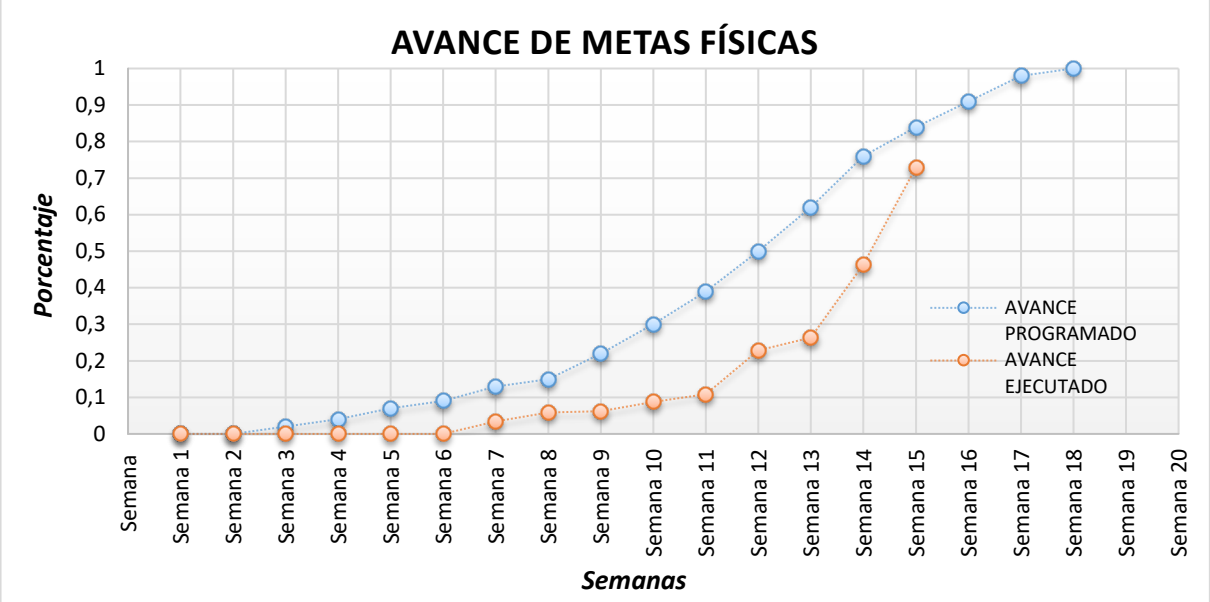

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-actas y acta de recibo parcial de obra para convenios. Para el periodo reportado no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes reuniones y comités de obra:

FECHA	REUNIÓN / COMITÉ	DESCRIPCIÓN
08/03/2024	Comité operativo No. 11	Se revisaron y aprobaron los proveedores de ensayos de laboratorio para el control de calidad, así como una nueva propuesta de vibro compactador debido al incumplimiento del proveedor anterior. Se autorizó la transferencia No. 6.
15/03/2024	Comité operativo No. 12	Nuevamente se presenta un proveedor de vibro compactador, el cual incluye transporte de la máquina. Se autorizó la transferencia de recursos No. 7.
20/03/2024	Comité operativo No. 13	Se presenta la cotización y aprueba al proveedor de vibro compactador mono cilíndrico.

Se anexan las actas de reunión y comités de obra.

4. CONVENIO SOLIDARIO NO. 4126 DE 2023, JAC VEREDA EL MESÓN

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4.1.1 Localización

El frente de obra corresponde a un tramo propuesto por la JAC y definido por el INVIAS en la suscripción de los convenios, de la siguiente manera:

El proyecto por desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del municipio de Garzón departamento del Huila, en la vereda el Mesón, teniendo como punto de referencia inicial el acceso hacía el centro poblado el Mesón por la vía hacia la Cabaña con coordenada NORTE 2.172169 OESTE 75.567981 y punto de referencia final NORTE 2.17171 OESTE 75.567981, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Huila del INVIAS.



Ilustración 4. Localización de la obra del convenio 4777 de 2023 - JAC El Mesón

4.1.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto beneficia la población de las veredas ubicadas sobre la vía la Parabólica como el Mesón, La Perdiz y Santa Rosa, que son veredas dedicadas al comercio de productos agrícolas como café y plátano, así como también se desarrolla la actividad turística alrededor de lugares como el Páramo Miraflores y el Mirador. Estos productos y servicios son destinados al comercio o para el sustento diario, por lo que el

mejoramiento de esta vía permitirá reducir los tiempos de acceso a servicios de salud y educativos ofrecidos en el centro poblado o área rural cercana y facilitará la conectividad de los habitantes de la vereda con los municipios cercanos para acceder a insumos destinados a la actividad agrícola, fortalecer las redes de comercialización de los productos de la zona y mejorar las condiciones para la garantía de la seguridad alimentaria de la población.

4.1.3 Inventario y estado inicial de la vía

El tramo por intervenir corresponde a 148 m de material afirmado en buen estado puesto a pesar de que se evidencia la falta de cunetas que permitan el correcto drenaje de la vía.

	
Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)	Foto inicial (Visita técnica inicial INVIAS el 28/06/2023)

4.1.4 Características técnicas del proyecto

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas. También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella, discriminado de la siguiente manera:

MANTENIMIENTO RUTINARIO		**MEJORAMIENTO**	
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (UND)	ROCERÍA (HA)	PLACA HUELLA (ml)	ALCANTARILLAS (UND)
7,00	0,60	148,00	0

4.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

4.2.1 Información general del contrato

CONVENIO SOLIDARIO	4777 DE 2023
SUSCRIPCIÓN CONVENIO	01/12/2023

OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA El MESON DEL MUNICIPIO DE GARZON HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda El Mesón del municipio de Garzón – Huila
RUT	891.101.337-3
VALOR INICIAL	$ 189.724.356,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 189.724.356,00
ORDEN DE INICIO	N/A
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

4.2.2 Descripción de las actividades

A la fecha no se ha realizado trámite administrativo de suspensión y/o prórroga del convenio en referencia.

Por lo anterior, aún se tiene pendiente la socialización de inicio con la comunidad de la vereda por parte del INVIAS e interventoría, debido a que no se ha realizado el desembolso de los recursos por parte de la Entidad. Así mismo, se está atento y a la disposición de las indicaciones de la Entidad.

Por otra parte, se presenta la relación del presupuesto y valores ejecutados del mismo para el mes reportado con corte a 31 de marzo de 2024.

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR ACUMULADO	SALDO
BÁSICO DE OBRA	$ 141.657.946,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 141.657.946,00
GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.249.738,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.249.738,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 42.816.672,00	N/A	$ 0,00	$ 0,00	$ 42.816.672,00
TOTAL	**$ 188.724.356,00**	**N/A**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 188.724.356,00**

Por lo cual, el porcentaje de avance ejecutado del proyecto en el periodo reportado corresponde a 0%. Las memorias de los gastos se encuentran consolidados en las actas de recibo parcial de obra de convenio.

4.2.3 Seguimiento Ítems no previstos

Teniendo en cuenta que el contratista no cuenta con el desembolso de los recursos no se ha evaluado el presupuesto y, por ende, no se ha requerido la legalización de ítems no previstos al presupuesto.

4.2.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

En el periodo reportado la interventoría ha solicitado a la Entidad las indicaciones para dar seguimiento al estado legal del convenio teniendo en cuenta que a la fecha no se ha cuenta con orden inicio.

Finalmente, se tendrá comunicación continua con el presidente de la OAC con el fin de realizar seguimiento a las pólizas que amparan el convenio, el desembolso de recursos y con ello, programar la socialización de inicio.

4.3 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.3.1 Informe semanal

Dado el estado en el que se encuentra el convenio, no se efectúa el diligenciamiento del informe semanal, puesto que, no se tiene avance ni modificación con relación a los entregados en el periodo anterior.

No se anexan los formatos “INFORMES SEMANALES”.

4.3.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el mes de marzo de 2024 no se realizó proceso de cotización de maquinaria y equipo de obra, debido a que el contratista no cuenta con los recursos desembolsados para iniciar con la ejecución.

No se anexa el formato “MAQUINARIA Y EQUIPO”.

4.3.3 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

Para el periodo reportado no se realizaron contrataciones de personal.

No se anexa el formato “PERSONAL, CONTROL DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL”.

4.3.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

De acuerdo con el convenio solidario No. 4777 de 2023, CLAÚSULA SÉPTIMA: "EL INSTITUTO girará al OAC el valor a su cargo en un único desembolso equivalente al cien por ciento (100%) del valor de los recursos correspondientes a la vigencia fiscal 2023", por lo cual, el contratista no recibe anticipo ni se realiza seguimiento de este.

Con base en el CDP No. 138023 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal No. 1450923 de fecha 2024-01-22 por valor $ 188.724.356,00 para el contrato principal; discriminado en C-2402-0600-12-0-2402041-02 "VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 185.966.019,00 y C-2402-0600-14-0-2402112-02 "VÍA TERCIARIA CON MANTENIMIENTO PERIÓDICO O RUTINARIO - MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. NACIONAL" por valor $ 2.758.337,00.

Con el fin de realizar un control sobre el único desembolso realizado por parte de la Entidad, se efectúa el diligenciamiento de los formatos:

No se anexa el formato "PLAN DE INVERSIÓN DEMBOLSO CONVENIOS".

No se anexa el formato "INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE DESEMBOLSO DE CONVENIOS".

No se anexa el formato "ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS".

4.3.5 Estado general del tiempo

Dado que no hubo personal de obra contratado, no hay registro del reporte del tiempo durante el periodo en mención.

No se anexa el formato "ESTADO GENERAL DEL TIEMPO".

4.3.6 Resumen ensayos de laboratorio

De acuerdo con las actividades realizadas en el periodo, no se han ejecutado ensayos de laboratorio. Por lo anterior, no se anexa el formato "RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO".

4.3.7 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Convenio inicial: Póliza de cumplimiento No. NB-100298065 anexo No. 0 de fecha 05/12/2023 y de responsabilidad civil y extracontractual No. NB-100073701 anexo No. 0 de fecha 05/12/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	20%	$ 37.944.872,00	01/12/2023	31/10/2024
PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 9.486.218,00	01/12/2023	31/12/2026
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30%	$ 56.917.307,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 104.348.397,00**	**01/12/2023**	**31/12/2028**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	01/12/2023	31/12/2023

No se tiene aprobación de la póliza en la plataforma SECOP, teniendo en cuenta que fue excedido el plazo de aprobación por parte de la Entidad.

No se anexa el formato "SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS", ya que no se modifica.

4.3.8 Seguimiento al plan de calidad del contrato de obra

Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 2022, o la normatividad que se encuentre vigente.

4.3.9 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento a programación y ejecución de obra:

  Teniendo en cuenta que el convenio aún no tiene orden de inicio a la fecha de corte del presente informe, se atrasan las actividades administrativas que dependen del desembolso y permiten realizar la contratación del personal, tal como el ingeniero residente de obra; por lo cual, cuando se halle resuelto dicho trámite de recursos y demás administrativos, se presentará la programación de obra permita realizar el respectivo seguimiento.

  De acuerdo con la CLAÚSULA NOVENA – PARÁGRAFO SEGUNDO: "El interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades y/o bienes que sean comprobables y efectivamente soportadas, verificadas y avaladas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el OAC".

Con el fin de realizar un control de las actividades ejecutadas con relación al presupuesto asignado al convenio, se realizarán la medición de las cantidades de obra ejecutadas soportadas mediante pre-actas y acta de recibo parcial de obra para convenios. Sin embargo, para el periodo reportado no se ejecutaron actividades, por lo cual, no se anexa el formato "ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA DE CONVENIO SOLIDARIO".

- Actas de reunión y comités de obra:

  Durante el periodo reportado no se han realizado reuniones ni comités de obra, dado que el convenio no cuenta con orden de inicio.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

PROCESO DE SELECCIÓN	IP-DT-HUI-010-2023
FECHA DE PUBLICACIÓN	9/11/2023 10:09 AM
ID DEL CONTRATO EN SECOP II	CO1.PCCNTR.5580987
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4597 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22/11/2023
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
CC	55.181.920
VALOR INICIAL	$ 82.643.855,00
VALOR ADICIONAL	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 82.643.855,00
ORDEN DE INICIO	2023S-VHUI-029107 de fecha 18/12/2023
PLAZO INICIAL	Hasta el 31/12/2023
SUSPENSIÓN No. 1	29/12/2023
REANUDACIÓN No. 1	17/01/2024
PRÓRROGA No. 1	17/01/2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	Hasta el 30/04/2024
DIRECCIÓN	Calle 18 # 42-72, Neiva – Huila
NÚMERO DE TELÉFONO	3235785141
SUPERVISOR	WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el interventor

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en campo, como en oficina, por el personal profesional y técnico de la Interventoría, en cumplimiento de sus obligaciones contractuales:

- Recorrido en los frentes de obra, para identificar los sitios críticos que serán intervenidos mediante el contrato y demarcación de los puntos de intervención.
- Verificación del cumplimiento de las obligaciones del Contratista.
- Control de permanencia del personal calificado y no calificado.
- Revisión de los diferentes documentos presentados por el contratista.
- Control del pago de parafiscales del personal que labora para el contrato.
- Archivo actualizado de la Interventoría.
- Comunicados dirigidos al contratista.
- Comunicados dirigidos al INVIAS.
- Reuniones con el contratista.
- Asistir a las reuniones citadas por el INVIAS.
- Seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades desarrolladas por el Contratista en los sectores donde se desarrollan las obras.
- Elaboración de informes semanales.
- Elaboración de informe mensual.
- Medición y cuantificación de cantidades de obra.
- Supervisión de ejecución de obras.
- Revisión de pre-actas y actas de obra.

Lo anterior, mediante la realización de comités operativos de seguimiento con la participación invias, de la Junta de Acción Comunal mediante el presidente y tesorero, así como los profesionales de contaduría e ingeniería civil contratados, con el fin de evaluar y tomar decisiones técnicas y administrativas, correspondientes principalmente a la vinculación de mano de obra, presentación de cotizaciones para una evaluación costo/beneficio y trámite de transferencia de recursos que permite la compra y adquisición de los bienes y servicios requeridos por los proyectos.

La interventoría busca garantizar que la JAC realice la verificación de los antecedentes del personal y su proceso de vinculación, el cual debe estar encaminada en la participación de la comunidad mediante una contratación directa con gente de la zona y que la ejecución de las actividades dé cumplimiento a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Con relación al personal calificado, residente y contador, se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos y de experiencia.

En cuanto al suministro de materiales se solicitan los certificados de calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas. Para la maquinaria y equipo se requieren los documentos del vehículo tales como SOAT y tarjeta de propiedad, y que el operario esté debidamente afiliado a seguridad social.

Por otra parte, se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnica y diseños de las obras ejecutadas en los convenios solidarios en ejecución.

5.3 Informes especialistas y profesionales

Durante el mes de marzo de 2024, las labores del director y residente de interventoría consistieron en requerir al residente del proyecto, atender los requerimientos técnicos contemplados en la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales.


Así mismo, se requiere al residente y al contador el diligenciamiento de los formatos entregados por el INVIAS adoptados a los convenios solidarios, los cuales permiten llevar un seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, jurídico del convenio.

Igualmente se acompañaron las labores administrativas que permitieron vincular al personal de obra en el proyecto, así como la revisión y aprobación de proveedores de suministros y servicios requeridos tales como topografía y ensayos de suelos, entre otros.

- Componente ambiental:

Dado el inicio de actividades en la junta de acción La Cabaña, se compraron e instalaron los elementos correspondientes al punto ecológico para el manejo de residuos de obra, por lo cual, la interventoría realiza el seguimiento de la instalación y correcta utilización de este; así como el respectivo cerramiento del sitio de obra.

	
Cerramiento – JAC La Cabaña	Cerramiento – JAC La Cabaña

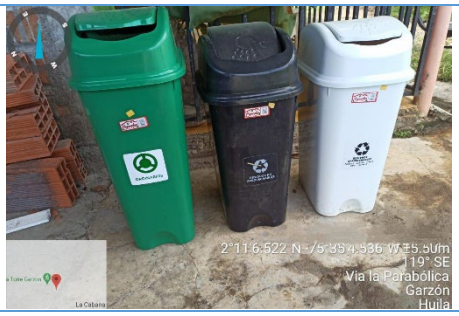	
Cerramiento – JAC La Cabaña	Punto ecológico – JAC La Cabaña

De acuerdo con el oficio recibido por el INVIAS el periodo anterior, en cuanto al Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), estamos a la espera de las indicaciones de los formatos que aplican para su diligenciamiento y radicación.

- Componente social:

Tal como se mencionó en el periodo anterior, el acompañamiento de la interventoría se realiza desde la socialización de inicio, por lo que se programará para inicio del mes de abril efectuar dicha reunión en con la comunidad de la junta de acción San Luis dado el desembolso de los recursos.

Así mismo, la interventoría realiza seguimiento de la instalación de la valla informativa de cada uno de los proyectos, para el caso de La Cabaña que dio inicio a las actividades en el mes de marzo. Además, el trámite de radicación de las actas de veeduría ante la personería no ha sido posible durante el presente mes tampoco, teniendo en cuenta que existe un trámite administrativo de nombramiento en curso.

	
Valla informativa – JAC La Cabaña	Valla informativa – JAC La Cabaña



Valla informativa – JAC La Cabaña



Aviso informativo – JAC La Cabaña

5.4 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

La interventoría realiza la revisión para la aprobación definitiva de estudios y diseños entregados por JAC de acuerdo con la instrucción del INVIAS, teniendo en cuenta los parámetros técnicos de topografía y estudios de laboratorio e in situ; así como los diseños geométrico y estructural para la construcción de las estructuras de placa huella y alcantarilla.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6.1 Equipo y vehículos contrato de interventoría

Durante el periodo reportado se contó con dos (2) motos para el residente e inspector de obra, permitiendo realizar las visitas de obra; también, con equipos de cómputo y dotación de oficina, que son requeridos para la efectuar las actividades de interventoría.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

6.2 Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de interventoría

Durante el mes de marzo de 2024 se generó pago de aportes de seguridad social del personal que se relaciona a continuación:

No.	NOMBRE	CARGO	INICIO
1	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	Directora	18/12/2023

2	EDGAR MAURICIO ARGÜELLO MALDONADO	Residente	1/01/2024
3	MARTHA BARRAGAN	Inspector	1/01/2024

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

6.3 Información financiero y presupuestal contrato de interventoría

Con base en el CDP No. 183223 de fecha 2023-11-01. Se hizo el registro presupuestal No. 1294023 de fecha 2023-11-24 por valor 82.643.855,00 para el contrato principal. Lo anterior, sin adiciones a la fecha.

Se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

6.4 Seguimiento garantías contrato de interventoría

A continuación, se presenta una relación de las pólizas y los amparos correspondientes para el convenio inicial:

- Contrato inicial: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 0 de fecha 23/11/2023.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	22/11/2023	30/06/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	22/11/2023	31/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	31/12/2023	31/12/2028
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**22/11/2023**	**31/12/2028**

- Suspensión No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 3 de fecha 22/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	17/01/2024	14/08/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	17/01/2024	14/02/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	14/02/2024	14/02/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**14/02/2029**

- Prórroga No. 1: Póliza de cumplimiento No. CHU-100011070 anexo No. 4 de fecha 22/01/2024.

AMPARO	% AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	10%	$ 8.264.390,00	17/01/2024	20/11/2024
PRESTACIONES SOCIALES	20%	$ 16.528.780,00	17/01/2024	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	30%	$ 24.793.170,00	30/04/2024	30/04/2029
TOTAL		**$ 49.586.340,00**	**18/12/2023**	**30/04/2029**

No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13, ya que no se modifica.

6.5 Otros documentos seguimiento mensual

- Seguimiento al Plan de cargas o Reprogramación al plan de cargas aprobado:

  De acuerdo con las indicaciones dadas por el supervisor, se mantiene el plan de cargas con fecha de terminación el 31 de mayo de 2024 presentado al supervisor en el periodo anterior, el cual considera un valor de ajuste corresponde al ítem de provisión para ajustes teniendo en cuenta el plazo real de ejecución.

  No se anexa el formato MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el mes de marzo iniciaron las actividades de obra del convenio 3802 de 2023 de la JAC La Cabaña, mediante la reconstrucción de alcantarilla de 36" de diámetro, así como la instalación y compactación de subbase granular, y posterior instalación de formaleta para fundición de concreto ciclópeo de la placa huella en una longitud de 60 m.

En el convenio 4126 de 2023 de la JAC Potrerillos, se culminaron las actividades correspondientes a la reconstrucción de la alcantarilla de 36" de diámetro que iniciaron a finales del periodo pasado, con la construcción de la poceta y descole en concreto reforzado. Con relación a la placa huella, cabe resaltar la dificultad de conseguir vibro compactador para el proyecto, lo cual dificultó la compactación oportuna de la subbase granular, razón por la cual se atrasó la ejecución con relación a la programación; sin embargo, se realizó dicha labor para dar cumplimiento a la especificación técnica. Luego, se fundieron las huellas y berma-cunetas en concreto reforzado de acuerdo con el diseño.

En cuanto al control de calidad, se tomaron los cilindros de concreto de las fundiciones de poceta y descole de las alcantarillas, así como del ciclópeo, huellas y berma-cunetas de las placas huella.

Se trabaja en conjunto con los representantes de las OAC para la toma de decisiones con respecto al desarrollo del convenio mediante comités operativo y reuniones en los sitios de las obras, con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de revisión y aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipo requerido en el proyecto.

Igualmente, esta interventoría está atenta a los trámites administrativos de los dos convenios que no cuentan con recursos con el fin de para lograr una total ejecución en los cuatro (4) convenios en el plazo y recurso asignado.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia

Durante el mes de marzo de 2024 se tuvo la siguiente trazabilidad de correspondencia de las Juntas de Acción Comunal, Interventoría y Supervisión:

- Interventoría

FECHA	COMUNICADO	DESCRIPCIÓN
13/03/2024	INVIAS 4597-2023/05	Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras. JAC La Cabaña.
13/03/2024	INVIAS 4597-2023/06	Requerimientos técnicos para control y seguimiento de las obras. JAC Potrerillos.

Se anexan los comunicados, oficios y cartas relacionadas.

8.2 Registro fotográfico

JAC La Cabaña	
	

	CONTRATISTA OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS LA CABAÑA, SAN LUIS, POTRERILLOS Y EL MESÓN	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	INFORME No. 4 Parcial
	Convenios Solidarios No. 3802, 4176, 4126 y 4777 de 2023.	Contrato No. 4597 de 2023	
Wilder Orley Salazar Cuellar - Supervisor	**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		

Instalación de tubería de 36"	Construcción de solado de tubería
	
Extensión de subbase granular	Extensión de subbase granular
	
Compactación de la subbase	Compactación de la subbase
	
Fundición del dentellón de descole	Fundición del dentellón de descole
	
Corte y flejado del acero de refuerzo	Corte y flejado del acero de refuerzo
	

	CONTRATISTA OBRA	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	
INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL VEREDAS LA CABAÑA, SAN LUIS, POTRERILLOS Y EL MESÓN	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	INFORME No. 4 Parcial
	Convenios Solidarios No. 3802, 4176, 4126 y 4777 de 2023.	Contrato No. 4597 de 2023	
Wilder Orley Salazar Cuellar - Supervisor	**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA		

Corte y flejado del acero de refuerzo	Acero de vigas riostras
JAC Potrerillos	
	
Toma de densidades	Replanteo y excavación de vigas riostras
	
Flejado de acero de vigas	Instalación de vigas riostras
	
Instalación de acero longitudinal	Acero de refuerzo placa huella
	
Fundición de concreto de placa huella	Fundición de concreto de placa huella

	
Toma de cilindros de concreto	Toma de cilindros de concreto
	
Instalación de formaleta para fundición	Construcción de alcantarilla
	
Construcción placa huella con apoyo de la comunidad	Construcción placa huella con apoyo de la presidenta

8.3 Bitácora

Teniendo en cuenta que la interventoría se ejecuta en simultaneo para los proyectos activos, presentan los siguientes documentos: Informes semanales, maquinaria y equipo, personal control aportes legales y seguridad social, informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios acta parcial de pagos de convenios, estado general del tiempo, resumen ensayos de laboratorio, bitácora, comités operativos.

8.4 Formatos Interventorías Convenios Solidarios

Equipo y vehículos, personal control aportes legales y seguridad social, información financiera y presupuestal.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
LA CABAÑA

- Acta de aprobación definitiva de estudios y diseños
- Informes semanales
- Maquinaria y equipo
- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Acta parcial de pagos del convenio
- Estado general del tiempo
- Resumen ensayos de laboratorio
- Comités operativos
- Bitácora de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 11/03/2024
(Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Mediante la suscripción de la presente acta de aprobación de estudios y diseños, se aprueba por el Contratista y el Interventor los estudios y diseños contratados para la ejecución del Convenio 3802 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potrerillos del municipio de Garzón.

CONVENIO No: 3802 DE 2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.105.183,00
(Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 14 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2023 (Año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA CABAÑA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4597 DE 2023
(Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
4126 DE 2023	26/10/2023	HASTA 31/12/2023	$ 189.105.183	$ 189.105.183
PRÓRROGA UNO (1)	17/01/2024	HASTA 30/04/2024	$ 189.105.183	$ 189.105.183

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		28/12/2023	28/12/2023	16/01/2024	17/01/2024

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA "VÍA PARABÓLICA" A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 126 M DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 11/03/2024
(Día / Mes / Año)

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	**Condiciones locales**	**1**	**13**	**N/A**	**Nombre:** "INFORME DE CONDICIONES LOCALES" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA
	Diseño geométrico	**1**	**15**	**1**	**Nombre:** "INFORME DE DISEÑO GEOMÉTRICO" **Elaborado por:** Wilson Fernando Mendez Borja. **M.P:** 01-10803 CPNT **Plano No. 1:** "Diseño geométrico - Placa huella"
	Condiciones climáticas e hidrológicas	**1**	**41**	**N/A**	**Nombre:** "ESTUDIO HIDROLÓGICO" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA
	Caracterización de materiales	**1**	**4**	**N/A**	**Nombre:** "Proctor modificado" **Elaborado por:** Juan Carlos Caballero. **Revisado por:** Diana Lorena Murcia.
	Concepto del tránsito	**1**	**26**	**N/A**	**Nombre:** "Estudio de tránsito" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA **Anexo No. 1:** "Aforos vehiculares"
	Concepto estructural	**1**	**23**	**3**	**Nombre:** "Informe diseño Estructural de Placa Huella" **Elaborado por:** Carlos Eliecer Matoma Cruz. **M.P:** 25202-150536 CND **Plano No. 1:** "Diseño estructural en planta y detalle - Placa huella" **Plano No. 2:** "Diseño estructural 1 - Alcantarilla" **Plano No. 3:** "Diseño estructural 2 - Alcantarilla"
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	**1**	**53**	**N/A**	**Nombre:** "ESTUDIO DE SUELOS" **Elaborado por:** Diana Lorena Murcia. **M.P:** 25202-097944 CND
ANEXO 2	Diseño de mezclas	**1**	**11**	**N/A**	**Nombre:** "Diseño de mezcla concreto hidráulico 3000 PSI" **Elaborado por:** Diana Lorena Murcia. **M.P:** 25202-097944 CND
ANEXO 3	Levantamiento topográfico	**1**	**18**	**2**	**Nombre:** "INFORME DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO" **Elaborado por:** Wilson Fernando Mendez Borja. **M.P:** 01-10803 CPNT **Plano No. 1:** "Planta y perfil longitudinal" **Plano No. 2:** "Secciones transversales"
ANEXO 4	Memorias de cálculo	**1**	**N/A**	**N/A**	**Nombre:** "Memorias de cálculo" **Elaborado por:** Norman Nicolas Velasquez Mancera. **M.P:** 101037-0556449 GJA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

	FECHA	11/03/2024
		(Día / Mes / Año)

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma: Arturo Bustos

ARTURO BUSTOS ROJAS
Representante legal de la Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón
Contratista

Firma:

NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Unidad Ejecutora
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 12 del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023	hasta 16/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	75,50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 96.577.850,00	68,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 5.839.793,12	4,11%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (90.738.056,88)	-63,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 26.984.987,50	19,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.627.383,52	3,96%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (21.357.603,98)	-15,04%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 596.510,32	14,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.599.975,70	66,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 15.750.195,33	37,66%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.660.739,24	54,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.660.739,24	54,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: [ ] [X]

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$**	**188.105.183,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	124.774.336,02	66,33%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$	21.589.988,45	11,48%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$**	**188.105.183,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$	6.612.800,00	3,52%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$	69.696.145,00	37,05%

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 68,00%
Meta Física Ejecutada % 4,11%
Avance o Atraso Físico % -63,89%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	10				100,0%
Ejec					
Prog	1,36				100,0%
Ejec	1,2				88,2%
Prog	73,08				58,0%
Ejec					
Prog	0,93				93,0%
Ejec	0,28				28,1%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	KM 2 Vía Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de comité operativo.
Comité operativo No. 10 - 06 de marzo de 2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El miércoles 06/03/2024 se realizó el comité operativo No. 10, donde se realizaron ajustes en cuanto proveedor de Vibro Compactador ya que el anterior aprobado presentó daños en el equipo y no podía prestar el servicio, se aprobó a NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ; se socializó y aprobó la contratación de un proveedor para el flejado del acero: FLEJES DEL HUILA; así como la hoja de vida de un ayudante de obra, teniendo en cuenta que una de las personas aprobadas anteriormente desertó del cargo. Se autorizaró la transferencia de recursos No. 5.


Durante la semana se efectuaron actividades de mejoramiento como la conformación de la subrasante, la cual estuvo acompañado por la topografía para garantizar el cumplimiento del diseño; en cuanto a la reposición de la alcantarilla, se realizó la excavación mecánica e instalación de la tubería de concreto reforzado, con su respectivo solado y relleno.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El lunes 11 de marzo de 2024 se tiene programado instalar la subbase granular y su compactación, para la posterior toma de densidades por parte del laboratorio. También, se tiene programado iniciar con el flejado del acero y la instalación de la formaleta de la placa huella.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

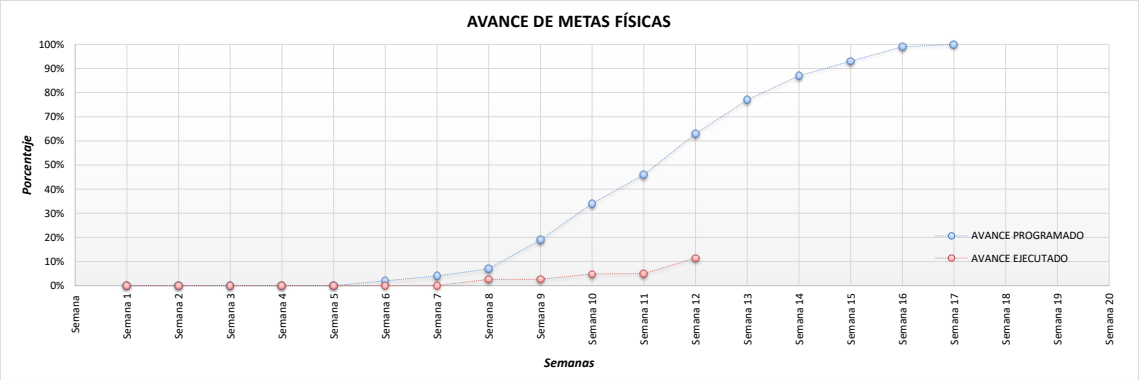

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Cierre de vía



Excavación e instalación de tubería de alcantarilla



Mezcla de concreto in situ para solado y atraques de tubería

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, dando cumplimiento a la programación y especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 13 del 8/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	75,50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.461.525,00	82,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 13.367.908,05	9,41%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (103.093.616,95)	-72,59%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.883.675,00	14,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 7.528.114,92	5,30%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (12.355.560,08)	-8,70%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 1.661.707,32	39,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.781.790,20	76,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 16.520.195,33	39,50%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 1.311,75	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.032.589,82	60,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.032.589,82	60,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 149.905.022,52	79,69%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 29.888.103,38	15,89%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 44.654.200,00	23,74%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 114.350.345,00	60,79%

Observaciones: Los rendimientos financieros tramitados en el periodo correspoden a Febrero 2024.
Se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra pero se presenta atraso en la programación a causas de falta de disponibilidad de Maquinaria y equipo en la region.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82,00%
Meta Física Ejecutada % 9,41%
Avance o Atraso Físico % -72,59%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	10				100,0%
Ejec					
Prog	1,36				100,0%
Ejec	1,2				88,2%
Prog	126				100,0%
Ejec					
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	KM 2 Vía Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de seguimiento en obra.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se efectuaron actividades de reposición de la alcantarilla de 36" tales como la excavación, figurado e instalación de acero, fundida de concreto y relleno con material seleccionado, de la poceta y el descole. También, se realizó la toma de muestras de cilindro del concreto mezclado en obra para efectuar el respectivo control de laboratorio.


Por otra parte, se realizó el acopio de material como subbase y arena en el punto de obra.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El viernes 15 de marzo se tiene programado realizar la compactación de la subbase granular y toma de densidades por parte del laboratorio. el resto de semana se tiene programado iniciar con el flejado del acero y la instalación de la formaleta de la placa huella.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

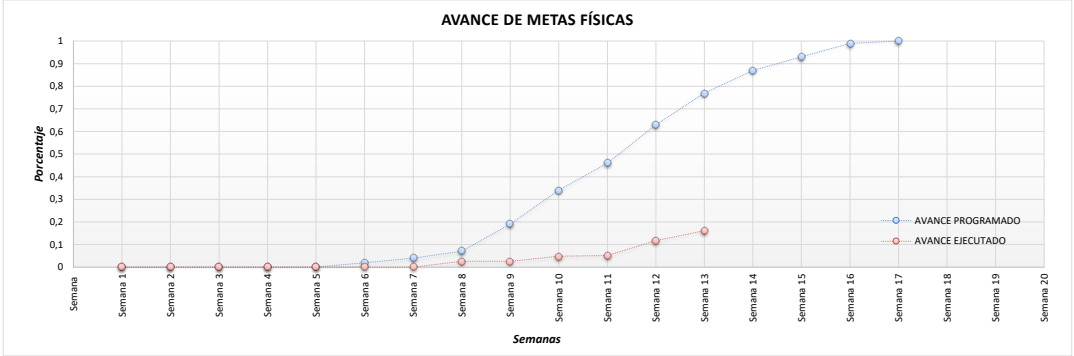

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figurado e instalación de acero de descole



Poceta de alcantarilla fundida



Transporte de subbase granular

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, dando cumplimiento a la programación y especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 14 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	75,50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 129.243.887,50	91,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 33.267.165,55	23,42%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (95.976.721,95)	-67,58%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 12.782.362,50	9,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.899.257,50	14,01%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 7.116.895,00	5,01%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 2.726.904,32	64,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 35.963.604,70	86,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 16.520.195,33	39,50%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55.404.440,39	67,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.404.440,39	67,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 167.934.396,52	89,28%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 49.787.360,88	26,47%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 3.469.800,00	1,84%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 117.820.145,00	62,64%

Observaciones: Se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra pero se presenta atraso en la programación a causas de falta de disponibilidad de maquinaria y equipo en la región.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 91,00%
Meta Física Ejecutada % 23,42%
Avance o Atraso Físico % -67,58%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	10				100,0%
Ejec					
Prog	1,36				100,0%
Ejec	1,2				88,2%
Prog	126				100,0%
Ejec	21,26				16,9%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibro compactador	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	KM 2 Vía Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron comités operativos:
-Comité operativo No. 11 de fecha 15/03/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El viernes 15/03/2024 se realizó el comité operativo No. 11, donde se aprobó la transferencia de recursos No. 6 que comprendía la nómina del personal operativo.


En cuanto a la ejecución de obra, durante la semana se realizó la instalación y compactación de la subbase granular. Además, se transportó el materiales pétreo de arena y triturado, y materiales de obra como cemento y acero, lo cual permitió efectuar el corte y figurado del acero de vigas riostras. Sin embargo, cabe resaltar que parte del atraso en la programación semanal fue debido al trámito del desembolso de los recursos en la cuenta de los proveedores.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la semana se tiene programado realizar el figurado del acero faltante para iniciar fundición de una longitud aproximada de 30 m.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

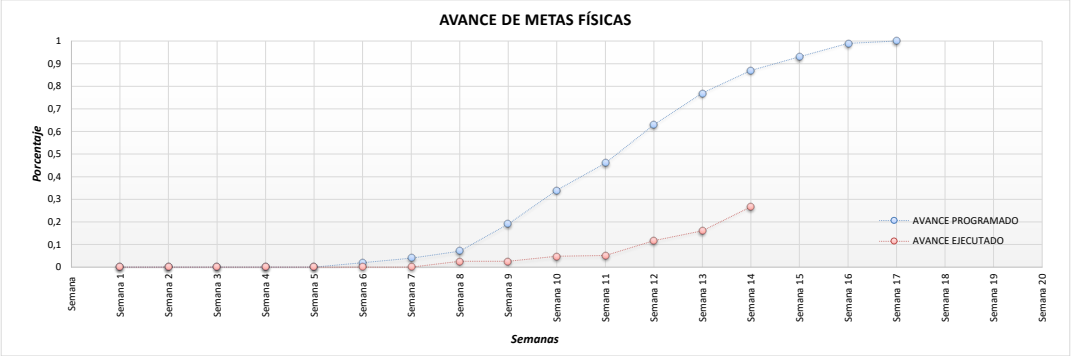

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de subbase granular



Compactación de subbase granular



Figurado de acero de refuerzo de placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, dando cumplimiento a la programación y especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 15 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 10 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 1,36 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 126 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	ARTURO BUSTOS ROJAS				
CONVENIO No.	3802 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	189.105.183,00	
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	189.105.183,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	28/12/2023 hasta 16/01/2024		$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023	VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00	
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00	
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023 hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-	
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024	VALOR AMORTIZADO:	$	-	
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024	SALDO POR AMORTIZAR:	$	-	
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.105.183			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.105.183			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.026.250,00**	75,50%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 134.924.937,50	95,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 36.247.219,27	25,52%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (98.677.718,23)	-69,48%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.681.050,00	4,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.980.053,72	2,10%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (2.700.996,28)	-1,90%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.260.788,00**	2,27%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 3.408.630,40	80,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.145,00**	**22,23%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 38.472.693,40	92,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 16.520.195,33	39,50%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.776.290,97	73,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 60.776.290,97	73,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 176.806.261,30	93,99%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 52.767.414,60	28,05%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.105.183,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 117.820.145,00	62,64%

Observaciones: Se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra pero se presenta atraso en la programación a causas de falta de disponibilidad de maquinaria y equipo en la región.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 95,00%
Meta Física Ejecutada % 25,52%

Avance o Atraso Físico % -69,48%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	10
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	1,36
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	126
*	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	10				100,0%
Ejec					
Prog	1,36				100,0%
Ejec	1,2				88,2%
Prog	126				100,0%
Ejec	24,44				19,4%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda La Cabaña

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibro compactador	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S.	PERMISO MINERO:	SI X	NO
	KM 2 Vía Garzón - San Antonio del Pescado	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda La Cabaña - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Durante la semana se realizó el encofrado y fundicón de la placa en concreto ciclópeo de acuerdo con el diseño en una longitud aproximada de 60 m. También, se realizó el corte y armado del acero de refuerzo de las vigas riostras según el diseño. Cabe resaltar que la semana corresponde a la conmemoración de la semana santa, por lo cual, la cantidad de días laborados fue menor.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

En la semana se tiene programado realizar el figurado del acero faltante para iniciar fundición de una longitud aproximada de 30 m.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

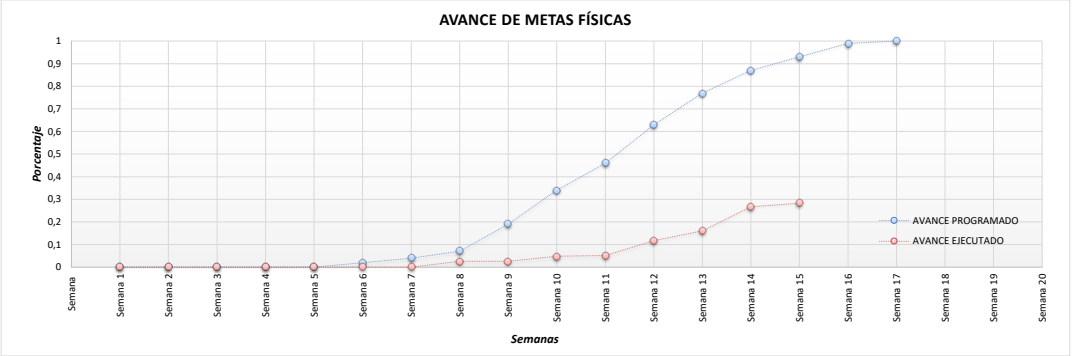

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación de formaleta para concreto ciclópeo



Fundición de concreto ciclópeo



Figurado de acero de refuerzo de placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, dando cumplimiento a la programación y especificaciones técnicas.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO SOLIDARIO No. 3802 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023

INTERVENTORÍA: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Motoniveladora	CATERPILLAR	120G	La Cabaña											A	A	A	A	A	A															
Retro cargadora	CATERPILLAR 420D	3 Ton	La Cabaña					A	A	A																								
Vibro compactador	CATERPILLAR CS433B	10 Ton	La Cabaña															A	A	I	A													
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO								1	1	1				1	1	1	1	2	2	1	1													
TOTAL ACTIVO				0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	36,67%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	33,33%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	3,33%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): El día 17 de marzo corresponde a un domingo, día no laboral en el proyecto.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma

Nombre: Edgar Mauricio Argüello Maldonado
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0582894 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 3802 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: mar-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: POSITIVA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO *	1.077.868.669	CONTADORA	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.300.000	$ 6.800	I	Nueva EPS	9464562981	$ 162.500	Positiva	9464562981	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
2	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA *	1.091.674.759	RESIDENTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.300.000	$ 97.500	V	Sanitas	8629786591	$ 162.500	Porvenir	8629786591	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
3	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA *	12.203.488	MAESTRO	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.170.000	$ 125.300	V	Nueva EPS	29587892	$ 147.000	Porvenir	29587892	$ 188.000	$ -	$ -	$ -	
4	PASTOR OLAYA LOPEZ	1.077.857.087	AYUDANTE	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.170.000	$ 81.500	V	Nueva EPS	9465395425	$ 146.300	Porvenir	9465395425	$ 187.200	$ 46.800	$ 58.500		
5	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	1.077.723.924	AYUDANTE	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.170.000	$ 81.500	V	Sanitas	9465395425	$ 146.300	Porvenir	9465395425	$ 187.200	$ 46.800	$ 58.500		
6	JOSE OLIVER PICHICA CUAJI	1.004.302.932	AYUDANTE	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.170.000	$ 81.500	V	Sanitas	9465395425	$ 146.300	Colpensiones	9465395425	$ 187.200	$ 46.800	$ 58.500		
7	YESID ROJAS	83.182.706	AYUDANTE	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 1.170.000	$ 81.500	V	Nueva EPS	9465395425	$ 146.300	Porvenir	9465395425	$ 187.200	$ 46.800	$ 58.500		
8	JOSE DARIO VASQUEZ MEDINA	1.193.141.708	OFICIAL	$ 1.600.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			$ 693.334	$ 48.300	V	Nueva EPS	9465395425	$ 86.700	Porvenir	9465395425	$ 111.000	$ 27.800	$ 34.800		
9																																																	
10																																																	
N																																																	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El rango de la ARL reportada para el Residente se debe a que no se efectuaron labores de obra en el mes reportado, por lo cual, se hará el respectivo aporte a riesgo V en el siguiente período.

El contratista adjunta la certificación de fecha _____, a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	556560162	9464562981	I	2024/04/15	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1077868669	PARRA YURI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	556560162	9464562981	I	2024/04/15	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JOSE LIZARDO ESCOBAR LOSADA
IDENTIFICACIÓN:	CC-12203488
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-24
FECHA DE PAGO:	2024-04-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	29587892
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	29587892
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.170.000	$ 0	$ 0	$ 700	$ 146.300	$ 147.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.170.000	$ 0	$ 0	$ 800	$ 187.200	$ 188.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 333.500	$ 335.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/05/2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891101472	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	VEREDA LA CABAÑA	GARZON-HUILA	3212706557	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	556512173	9465395425	E	2024/04/16	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$2,413,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	12191318	GONZALEZ BARRAGAN CARLOS JULIO	X	X																230301	1	$53,334	$8,600	EPS037	1	$53,334	$6,700	CCF32	1	$53,334	$2,200	14-11	1	$53,334	$3,800	1	$53,334	$2,800	No	$24,100
2	CC	1077857087	OLAYA LOPEZ PASTOR	X																	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS041	27	$1,170,000	$146,300	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$1,170,000	$58,500	No	$520,300
3	CC	1077723924	PERDOMO PERDOMO OSCAR ANDRES	X																	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$146,300	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$1,170,000	$58,500	No	$520,300
4	CC	1004302932	PICHICA CUAJI JOSE OLIVER	X																	25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$146,300	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$1,170,000	$58,500	No	$520,300
5	CC	83182706	ROJAS YESID	X																	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$146,300	CCF32	27	$1,170,000	$46,800	14-11	27	$1,170,000	$81,500	27	$1,170,000	$58,500	No	$520,300
6	CC	1193141708	VASQUEZ MEDINA JOSE DARIO	X																	230301	13	$693,334	$111,000	EPS037	13	$693,334	$86,700	CCF32	13	$693,334	$27,800	14-11	13	$693,334	$48,300	13	$693,334	$34,800	No	$308,600
Total	**Afiliados(6)**																						$5,426,668	$868,400			$5,426,668	$678,600			$5,426,668	$217,200			$5,426,668	$378,100		$5,426,668	$271,600		$2,413,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891101472	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	VEREDA LA CABAÑA	GARZON-HUILA	3212706557	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	556512173	9465395425	E	2024/04/16	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$2,413,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$868,400	$0	$0	$868,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$187,200	$0	$0	$187,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$681,200	$0	$0	$681,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$378,100	$0	$0	$378,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$378,100	$0	$0	$378,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$217,200	$0	$0	$217,200
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	6	$217,200	$0	$0	$217,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$678,600	$0	$0	$678,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$239,700	$0	$0	$239,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$146,300	$0	$0	$146,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$292,600	$0	$0	$292,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$163,000	$0	$0	$163,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	6	$163,000	$0	$0	$163,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$108,600	$0	$0	$108,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	6	$108,600	$0	$0	$108,600
TOTAL				**6**	**$2,413,900**	**$0**	**$0**	**$2,413,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891101472	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	VEREDA LA CABAÑA	GARZON-HUILA	3212706557	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03		9464699559	Y	2024/04/16			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	12203488	ESCOBAR LOSADA JOSE LIZARDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	27	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0	No	$125,300
2	CC	1091674759	VELASQUEZ MANCERA NORMAN NICOLAS	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,400,000	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
Total	**Afiliados(2)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,200,000	$222,800		$0	$0		$222,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891101472	1	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA CABAÑA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOS	VEREDA LA CABAÑA	GARZON-HUILA	3212706557	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03		9464699559	Y	2024/04/16			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$222,800	$0	$0	$222,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$222,800	$0	$0	$222,800
TOTAL				2	$222,800	$0	$0	$222,800

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	NORMAN NICOLAS VELASQUEZ MANCERA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1091674759
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-04-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-04-12
FECHA DE PAGO:	2024-04-12
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-03
PERÍODO SALUD:	2024-03
NÚMERO PLANILLA:	8629786591
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8629334274
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 370.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/05/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 **MES:** MARZO 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 3802 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 188.105.183,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Cuenta de cobro	01	28-feb-24	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	$ 1.000.000,00	6	TOPOGRAFIA DISEÑOS
Factura electrónica	FE-56	28-feb-24	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS	$ 712.800,00	6	DISEÑO MEZCLA Y PROCTOR
Cuenta de cobro	01	28-feb-24	YURI ANDREA PARRA SERRANO	$ 1.400.000,00	6	HONORARIOS CONTADORA
Cuenta de cobro	01	28-feb-24	NORMAN NICOLÁS VELASQUEZ MANCERA	$ 3.500.000,00	6	HONORARIOS RENSIDENTE
Cuenta de cobro	02	28-feb-24	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA	$ 264.000,00	6	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Factura electrónica	JAF-87	28-feb-04	JESÚS MARÍA FERNANDEZ FIERRO	$ 3.168.000,00	1	MOTONIVELADORA
Cuenta de cobro	01	28-feb-04	WILLIAM FERNANDO CANO SILVA	$ 792.000,00	3	TRANSPORTE MATERIALES
Factura electrónica	T40482	1-abr-24	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECHAR SAS	$ 504.000,00	2	ANTISOL
Cuenta de cobro	01	6-mar-24	CAMILO ANDRES BELTRAN LOSADA	$ 1.955.000,00	1	RETRO EXCAVADORA
Cuenta de cobro	02	8-mar-24	LUCILA ARDILA RAMIREZ	$ 400.000,00	6	GASTOS REPRESENTACIÓN
Factura electrónica	FEV 379	13-feb-24	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS	$ 22.887.800,00	2	MATERIALES PÉTREOS
Factura electrónica	F3FJ-6503	13-mar-24	COOCENTRAL	$ 9.843.800,00	2	MATERIALES CONSTRUCCIÓN
Factura electrónica	FEVC-21	8-mar-24	CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ	$ 3.960.000,00	1	VIBRO COMPACTADOR
Factura electrónica	AB-4269	11-mar-24	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ	$ 70.000,00	6	EXÁMENES DE INGRESO
Cuenta de cobro	01	21-mar-24	JUDITH CÓRDOBA PIAMBA	$ 809.600,00	2	FLEJES
	01	14-mar-24	YESID ROJAS	$ 543.200,00	4	PRIMERA QUINCENA
	01	14-mar-24	PASTOR OLAYA LÓPEZ LÓPEZ	$ 543.200,00	4	PRIMERA QUINCENA
	01	14-mar-24	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO	$ 543.200,00	4	PRIMERA QUINCENA
Cuenta de cobro	01	18-mar-24	JOSÉ LIZARDO ESCOBAR LOSADA	$ 1.000.000,00	6	HONORARIOS MAESTRO
Cuenta de cobro		15-mar-24	LUCILA ARDILA RAMIREZ	$ 24.000,00	6	RETENCIÓN ICA ENE-FEB
Cuenta de cobro		15-mar-24	LUCILA ARDILA RAMIREZ	$ 273.000,00	6	RETENCIÓN RENTA FEB
Extracto bancario		31-mar-24		$ 520.335,18	6	GASTOS BANCARIOS MARZO

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 17.396.033,00	$ -	$ 9.083.000,00	$ 9.083.000,00	$ 8.313.033,00
2	MATERIALES	$ 83.228.833,00	$ 54.138.200,00	$ 34.045.200,00	$ 88.183.400,00	$ (4.954.567,00)
3	TRANSPORTE	$ 22.703.189,00	$ -	$ 792.000,00	$ 792.000,00	$ 21.911.189,00
4	MANO DE OBRA	$ 18.698.195,00	$ -	$ 1.629.600,00	$ 1.629.600,00	$ 17.068.595,00
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.260.788,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.260.788,00
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 41.818.145,00	$ 9.390.038,21	$ 9.164.135,18	$ 18.554.173,39	$ 23.263.971,61
	TOTALES	$ 188.105.183,00	$ 63.528.238,21	$ 54.713.935,18	$ 118.242.173,39	$ 69.863.009,61

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (ENERO) : $ 1.593,24
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 2.675,09
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
REP 204 08/02/2024	$ 1.082		DICIEMBRE 2023	8/02/2024	$ 1.082
REP 204 08/02/2024	$ 1.593		ENERO 2024	8/02/2024	$ 2.675
					2 de 2

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Se tiene pendiente la entrega por parte de la entidad financiera del comprobante de consignación de rendimientos financieros del mes de marzo de 2024, de acuerdo con la solicitud de realizar la transferencia VIA SEBRA al Tesorio Nacional.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Arturo Bustos

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Presidente
Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón

Firma:

Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma:

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 3802 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VIA INTERVENIDA: Vía Parabólica

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4597 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 14 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.105.183,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: 28 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE PRÓRROGA: 17 (Día) DE 1 (Mes) DE 2024 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.105.183,00

PLAZO (MESES): 4,5

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA		CTA COBRO	28/02/2024	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
2	SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS		FE-56	28/02/2024	$ 620.000,00	$ 117.800,00	$ 737.800,00
3	YURI ANDREA PARRA SERRANO		CTA COBRO	28/02/2024	$ 1.400.000,00		$ 1.400.000,00
4	NORMAN NICOLÁS VELASQUEZ MANCERA		CTA COBRO	28/02/2024	$ 3.500.000,00		$ 3.500.000,00
5	WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA		CTA COBRO	28/02/2024	$ 300.000,00		$ 300.000,00
6	JESÚS MARÍA FERNANDEZ FIERRO		JAF-87	28/02/2004	$ 3.200.000,00		$ 3.200.000,00
7	WILLIAM FERNANDO CANO SILVA		CTA COBRO	28/02/2004	$ 800.000,00		$ 800.000,00
8	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TECH		T40482	1/04/2024	$ 504.000,00		$ 504.000,00
9	CAMILO ANDRES BELTRAN LOSADA		CTA COBRO	6/03/2024	$ 2.080.000,00		$ 2.080.000,00
10	LUCILA ARDILA RAMIREZ		CTA COBRO	8/03/2024	$ 400.000,00		$ 400.000,00
11	DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SAS		FEV 379	13/02/2024			$ -
12	COOCENTRAL		F3FJ-6503	13/03/2024	$ 8.291.597,00	$ 1.575.403,00	$ 9.867.000,00
13	CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ		FEVC-21	8/03/2024	$ 4.000.000,00		$ 4.000.000,00
14	ALFONSO BENAVIDES SUAREZ		AB-4269	11/03/2024	$ 70.000,00		$ 70.000,00
15	JUDITH CÓRDOBA PIAMBA		CTA COBRO	21/03/2024	$ 809.600,00		$ 809.600,00
16	YESID ROJAS			14/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
17	PASTOR OLAYA LÓPEZ LÓPEZ			14/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
18	OSCAR ANDRES PERDOMO PERDOMO			14/03/2024	$ 543.200,00		$ 543.200,00
19	JOSÉ LIZARDO ESCOBAR LOSADA		CTA COBRO	18/03/2024	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
20	LUCILA ARDILA RAMIREZ		CTA COBRO	15/03/2024	$ 24.000,00		$ 24.000,00
21	LUCILA ARDILA RAMIREZ		CTA COBRO	15/03/2024	$ 273.000,00		$ 273.000,00

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 29.901.797	**PAGOS ACUMULADOS**	$ 109.900.632
VALOR IVA	$ 1.693.203	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ 8.271.673
TOTAL PAGOS	$ 31.595.000	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ 118.172.305

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

Acta ☐ **No.** 2

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma:
Nombre: Arturo Bustos Rojas
Presidente
Junta de Acción Comunal La Cabaña - Garzón

Firma:
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 3802 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco				21	24	24	19	21			21	24	24	17	24	24		24	24	24	22	24			19	24	24					428
Lluvias moderadas				1	0	0	0	3			3	0	0	7	0	0		0	0	0	0	0			0	0	0					14
Lluvias intensas				2	0	0	5	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	2	0			5	0	0					14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma
Nombre: Edgar Mauricio Argüello Maldonado
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0582894 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No.: 3802 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	12/02/2024	Determinación de CBR	INV E-148	La Cabaña	6	< = 3%	10,02	SÍ	
2	16/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	PR 00+030 PR 00+070	2	95%	95,48	SÍ	
3	18/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	PR 00+090 PR 00+100 PR 00+120	3	95%	95,22	SÍ	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	18/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	La Cabaña	2	95%	96,00	SÍ	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Norman Nicolas Velasquez Mancera
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 101037-0556449 GJA

Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

SEND Servicio de Ensayos No Destructivos
SUELOS Y

Suelos y Concretos S.A.S

COMUNICACION DE ENTREGA DE INFORME DE ENSAYOS

VEL-000
V.01

Informe No 202403-45

Garzon, 19 de marzo de 2024

Señor (a)

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA

Proyecto: ESTUDIO DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA LA CABAÑA MUNICIPIO DE GARZON

ENTREGA DEL INFORME DE LABORATORIO No202403-45

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA CABAÑA

Informe No202403-45 contiene 3 paginas

Nombre del Ensayo	Cant.
ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO Y ARENA)	5
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------

Esta información no intenta suplir los conocimientos, técnicas y criterios profesionales responsables de la construcción de las obras.

Los resultados emitidos en este informe no deben ser utilizados en ningún tipo de campaña de información técnica o comercial.

SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. no se responsabiliza por el muestreo transporte y/o daños que se presenten en el transcurso del mismo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro laboratorio y estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de inquietud.

Cordial saludo,

Ing. DIANA LORENA MURCIA G.
Representante Legal

(a) El presente informe no puede reproducirse sin la aprobación por parte del laboratorio.

(b) Los resultados de los ensayos emitidos en este informe solo son aplicables a las muestras ensayadas.

(c) El Informe No202403-45 contiene 3 páginas incluida la carta de entrega de informes de ensayos.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS No 202403-45

Suelos y Concretos S.A.S	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO Y ARENA)	EL-004 V.01 Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE GARZON
SOLICITADO POR:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS
LOCALIZACIÒN:	Paicol - Huila
DESCRIPCIÒN DEL MATERIAL:	Sub_Base / Garzon - Huila
NORMA ASOCIADA:	INV E- 161 Y 143-2022
FECHA:	2024-03-16
EQUIPO UTILIZADO:	BALANZA DE 20 Kg, TAMICES Nº 16,Nº 30, PLACA BASE CONO Y ARENA,PORRA,CINCEL,BROCHA,PLATONES,PROBADOR DE CARBURO.

No. Ensayo	D-0001	D-0002
Abscisa/Eje	PlacaHuella La Cabaña	PlacaHuella La Cabaña
Profundidad/Altura - Del Ensayo en Cm.	12,00	12,00
Material	Sub-Base	Sub-Base
Peso frasco y arena Inicial, $W_{s\,(g)}$	6920	6893
Peso frasco y arena restante, $W_{b\,(g)}$	2831	2353
Peso arena total usado, $W_1 = W_s - W_{b\,(g)}$	***4089***	***4540***
Constante del cono, $W_{7\,(g)}$	1877,6	1877,6
Peso arena en el hueco, $W_s = W_1 - W_{7\,(g)}$	***2211***	***2662***
Peso unitario aparente arena, $g_{1\,(g/cm3)}$	1,394	1,394
Volumen del hueco, V (cm3)	***1586,1***	***1909,6***
Peso material extraído húmedo,total$_{(g)}$	3531	4215
Humedad particulas finas,MC_f (%)	***7,8%***	***7,6%***
Peso material extraído humedo> 3/4" , (g)	***258***	***362***
Peso material extraído humedo <3/4" , (g)	3273	3853
Humedad particulas gruesas, (%)	***2,2%***	***2,2%***
Peso seco particulas Gruesas(g)	252	354
Peso seco de particulas Finas (g)	3036	3581
Porcentaje particulas gruesas %	***7,68***	***9,00***
Porcentaje particulas finas %	***92,32***	***91,00***
Peso unitario seco del material en campo, (g/cm3)	2,073	2,061
Peso unitario Seco Corregido del material, fino (g/cm3)	2,040	2,020
Peso unitario seco óptimo material, $g_{d\ óptimo\ (g/cm3)}$	2,126	2,126
Contenido humedad optima %	***7,60***	***7,60***
Gravedad Especifica Bulk Particulas Gruesas , K (g/cm3)	2,59	2,59
Porcentaje Compactación (%)	***95,94***	***95,01***

OBSERVACIONES: **PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.** **Elaboracion del proctor:** 11/03/2024

Este Informe Del Ensayo De Densidad En El Terreno (Cono Y Arena) Corresponde Al Estado Del Terreno En El Dia Y En La Cota Señalada, Húmedad Tomada Con Humedometro Speedy. Las Modificaciones Posteriores Sufridas Por El Terreno En La Cota Señalada, No Estan Dentro Del Alcance De Este Informe. Y de Existir Modificaciones Voluntarias o Involuntarias, Se Debera Realizar Nuevamente El Ensayo.

Valor Promedio del Lote: 0,95
Desviacion Estandar 0,007

Promedio Estimado del Lote Con Grado de Confiabilidad 90%
Factor K, con n= 3,00 **Y Probalidad 90%**

ELABORADO POR
Ing. JUAN CARLOS CABALLERO

REVISO
Ing DIANA L. MURCIA G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS No 20240316-45

Calle 8 Sur N° 15 - 42 Barrio Los Samanes . e-mail sendsuelosyconcretos@gmail.com
Tel: 311 444 86 54 - 310 297 84 24 / Garzón – Huila

SEND Servicio de Ensayos No Destructivos
SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
901.680.866-6

Suelos y Concretos S.A.S	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO Y ARENA)	EL-004 V.01 Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE GARZON
SOLICITADO POR:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS
LOCALIZACIÒN:	Paicol - Huila
DESCRIPCIÒN DEL MATERIAL:	Sub_Base / Garzon - Huila
NORMA ASOCIADA:	INV E 161 Y 143-2022 — FECHA: 2024-03-18
EQUIPO UTILIZADO:	BALANZA DE 20 Kg, TAMICES Nº 16,Nº 30, PLACA BASE CONO Y ARENA,PORRA,CINCEL,BROCHA,PLATONES,PROBADOR DE CARBURO.

No. Ensayo	D-0003	D-0004	D-0005
Abscisa/Eje	PlacaHuella La Cabaña	PlacaHuella La Cabaña	PlacaHuella La Cabaña
Profundidad/Altura - Del Ensayo en Cm.	12,00	12,00	12,00
Material	Sub-Base	Sub-Base	Sub-Base
Peso frasco y arena Inicial, $W_{s\,(g)}$	6864	6860	6860
Peso frasco y arena restante, $W_{b\,(g)}$	2331	2464	2930
Peso arena total usado, $W_1 = W_s - W_{b\,(g)}$	***4533***	***4396***	***3930***
Constante del cono, $W_{7\,(g)}$	1877,6	1877,6	1877,6
Peso arena en el hueco, $W_s = W_1 - W_{7\,(g)}$	***2655***	***2518***	***2052***
Peso unitario aparente arena, $g_{1\,(g/cm3)}$	1,394	1,394	1,394
Volumen del hueco, V (cm3)	***1904,6***	***1806,3***	***1472,1***
Peso material extraído húmedo,total$_{(g)}$	4136	3890	3189
Humedad particulas finas,MC_f (%)	***5,6%***	***5,4%***	***5,6%***
Peso material extraído humedo> 3/4" , (g)	***317***	***225***	***201***
Peso material extraído humedo <3/4" , $_{(g)}$	3819	3665	2988
Humedad particulas gruesas, (%)	***2,2%***	***2,2%***	***2,2%***
Peso seco particulas Gruesas(g)	310	220	197
Peso seco de particulas Finas (g)	3616	3477	2830
Porcentaje particulas gruesas %	***7,90***	***5,95***	***6,50***
Porcentaje particulas finas %	***92,10***	***94,05***	***93,50***
Peso unitario seco del material en campo, $_{(g/cm3)}$	2,062	2,047	2,056
Peso unitario Seco Corregido del material, fino $_{(g/cm3)}$	2,026	2,020	2,027
Peso unitario seco óptimo material, $g_{d\ óptimo\ (g/cm3)}$	2,126	2,126	2,126
Contenido humedad optima %	***7,60***	***7,60***	***7,60***
Gravedad Especifica Bulk Particulas Gruesas , K (g/cm3)	2,59	2,59	2,59
Porcentaje Compactación (%)	***95,31***	***95,02***	***95,33***

OBSERVACIONES: **PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.** **Elaboracion del proctor:** 11/03/2024

Este Informe Del Ensayo De Densidad En El Terreno (Cono Y Arena) Corresponde Al Estado Del Terreno En El Dia Y En La Cota Señalada, Húmedad Tomada Con Humedometro Speedy. Las Modificaciones Posteriores Sufridas Por El Terreno En La Cota Señalada, No Estan Dentro Del Alcance De Este Informe. Y de Existir Modificaciones Voluntarias o Involuntarias, Se Debera Realizar Nuevamente El Ensayo.

Valor Promedio del Lote: **0,95** — **Promedio Estimado del Lote Con Grado de Confiabilidad 90%**

Desviacion Estandar **0,002** — **Factor K, con n= 3,00** **Y Probalidad 90%**

ELABORADO POR
Ing. JUAN CARLOS CABALLERO

REVISO
Ing DIANA L. MURCIA G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS No 20240318-45

Calle 8 Sur N° 15 - 42 Barrio Los Samanes . e-mail sendsuelosyconcretos@gmail.com
Tel: 311 444 86 54 - 310 297 84 24 / Garzón – Huila

SEND Servicio de Ensayos No Destructivos
SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
901.680.866-6

RECEBO - DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO DE ARENA

NORMA INV E-161 - 143 /2013

PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".						
LABORATORIO:	**LABORATORIO DE SUELOS A.S**						
TIPO DE MATERIAL:	**SUBBASE**	**CAPA Nº.**	**UNA**		**ESPESOR:**		**12 cm.**
FECHA:	**18-mar-24**	**ABSCISA:**	**VEREDA LA CABAÑA**	**CANTERA MASSEQ**	**CANTIDAD:**		
CONTRATO:	**INTERVENTORIA**						

ITEM	**ENSAYO Nº**	1	2	3	4	5	6	7	8
	ABSCISA	**Placa Huella**	**Placa Huella**						
	COSTADO	**e**	**e**						
	PROFUNDIDAD (cm)	**12**	**12**						
1	**PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)**	6945	6890						
2	**PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)**	2824	2996						
3	**PESO ARENA TOTAL USADA (g) (1-2)**	4121	3894						
4	**CONSTANTE DEL CONO**	1597	1597						
5	**PESO ARENA EN EL HUECO (g) (3-4)**	2524	2297						
6	**DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)**	1,39	1,39						
7	**VOLUMEN DEL HUECO (cm3) (5/6)**	1816	1653						
8	**PESO SOBRETAMAÑOS EXTRAIDO SECO (g)**	208	277						
9	**PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (g)**	3431	3074						
10	**HUMEDAD (%)**	5,5	5,6						
11	**PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (g)**	3252,1	2911,0						
12	**PESO TOTAL MATERIAL EXTRAIDO SECO (g)**	3460,1	3188,0						
13	**% DE MATERIAL GRUESO**	6,0	8,7						
14	**% DE MATERIAL FINO**	94,0	91,3						
15	**DENSIDAD DEL MATERIAL (g/cm3) (10/7)**	1,906	1,929						
16	**DENSIDAD MAXIMA LAB. (g/cm3)**	1,961	1,961						
17	**HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO (%)**	7,2	7,2						
18	**DENSIDAD SOBRETAMAÑOS (Gm)**	2,6	2,6						
19	**DENSIDAD CORREGIDA (g/cm3)** (100*16*18)/(16*13+18*14)	1,990	2,004						
20	**COMPACTACION EN EL TERRENO (%) (15/19)**	95,7	96,3						
21	**COMPACTACION ESPECIFICADA DI (%)**	95	95						

Observaciones:	Material cumple por compactación.	**Elaboró** **AMILCAR SANCHEZ PEÑA** Cargo: Laboratorista

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 10	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 06/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resumen de avance de obra y administración.
3- Cotizaciones.
4- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Resumen de avance de obra y administración:** Se presentaron los avances del residente de obra y la contadora a la fecha: • Residente de obra: Se realizó el avance en obra de la excavación e instalación de la tubería en concreto reforzado, para hoy realizar el relleno y compactación de este, con el fin de poder efectuar la instalación y compactación de la subbase granular en el tramo a intervenir. Se está realizando el acopio de material pétreo en el punto de obra. • Contadora: Se revisaron las cuentas con el fin de soportar los gastos de representación y caja menor. También, se solicitó al banco el extracto bancario correspondiente al mes de febrero 2024 para realizar la conciliación bancaria y así poder determinar impuestos para presentar en este periodo. Además, se realizó transferencia de recursos No. 4, la cual fue radicada el sábado 02 de marzo de 2024. Saldo a la fecha 29/02/2024: $ 124.578.256,54.
3.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. • **Maquinaria**: Vibro compactador. NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ. Alquiler de 3 días de un benitin mono cilindro moto Diesel. Por valor de $ 500.000,00 /día. Transporte por valor de $ 100.000,00 /trayecto. Se presenta la cotización del alquiler del benitin, teniendo en cuenta que las máquinas aprobadas anteriormente no dieron cumplimiento con el servicio pactado. Aunado con la dificultad de conseguir la maquinaria en la zona. • **Flejado acero:** FLEJES DEL HUILA. Por valor de $ 809.600,00. Se socializa la necesidad de realizar el flejado del acero por el rendimiento programado y el plazo actual. • **Personal de obra:** Se socializa que el oficial de obra que se había aprobado anteriormente desertó de la oferta laboral, por lo cual, se presenta un trabajador que suplirá la carga laboral requerida. OFICIAL: José Darío Vasquez Medina.
4.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realizan las autorizaciones de transferencia de los proveedores aprobados en este comité y el anterior:

	• Motoniveladora: JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. Tiempo de 16h por valor de $ 3.200.000,00. La cual no fue tramitada en la transferencia No. 4 por falta de asociación de cuentas. • Transporte de materiales: WILLIAM FERNANDO CANO SILVA. Anticipo de 4 viajes por valor de $ 800.000,00. La cual no fue tramitada en la transferencia No. 4 por falta de asociación de cuentas. • Vibro compactador: NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ. Por valor de $ 1.700.000,00. • Topografía levantamiento: WILSON FERNANDO MENDEZ BORJA. Saldo 50% por valor de $ 300.000,00. • Antisol: TECHAR. Para 63 kg por valor de $ 504.000,00. Aprobado en el comité No. 8. • Retrocargador: JONATHAN ESCOBAR LAMILLA. Tiempo de 16h por valor de $ 2.080.000,00. Aprobado en el comité No. 8. • Agregados: DF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.S. Saldo por valor de $ 23.220.000,00. Aprobado en el comité No. 5. • Materiales de construcción: COOCENTRAL – CONSTRURAMA. Saldo del 20% por valor de $ 9.843.800,00. Aprobado en el comité No. 5. • Examen de ingreso: ALFONSO BENAVIDES SUAREZ. Para un (1) examen por valor de $ 70.000,00. Flejado del acero: FLEJES DEL HUILA. Por valor de $ 809.600,00. • Gastos de representación: LUCILA ARDILA RAMÍREZ. Por valor de $ 400.000,00. Así mismo, el traslado de los rendimientos financieros del mes de febrero de 2024: • Febrero de 2024. Por valor de $ 1.311,75

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	Aprobación: • Vibro compactador: NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ.
4.	Aprobación: Transferencias de recursos No. 5. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 42.927.400,00 y traslado de rendimiento financiero del mes de febrero por valor de $ 1.311,75.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

2.	Informe Ejecución Financiera:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales:	SI ____	NO _X_	No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Toma de densidades de la subbase granular.	Residente	11/03/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos

Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 11	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 08/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Cotizaciones.
3- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. • **Maquinaria**: Vibro compactador. CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ. Alquiler de 20 horas de un vibro compactador por valor de $ 150.000,00 /hora. Transporte por valor de $ 1.000.000,00. Se presenta la cotización del alquiler del vibro compactador, teniendo en cuenta que las máquinas aprobadas anteriormente no dieron cumplimiento con el servicio pactado. Aunado con la dificultad de conseguir la maquinaria en la zona.
3.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realizan las autorizaciones de transferencia de los proveedores aprobados en este comité y el anterior: • Vibro compactador: CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ. Por valor de $ 4.000.000,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	**Aprobación:** Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio: • Vibro compactador: CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ.
3.	**Aprobación:** Transferencias de recursos No. 5 ajustada: • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 45.227.400,00.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:




Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor



Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos




Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos



Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 12	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 20/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: La Cabaña – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 3802 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Cabaña

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Arturo Bustos Rojas	Junta de Acción Comunal	Presidente
Lucila Ardila Ramírez	Junta de Acción Comunal	Tesorera
Norman Nicolas Velásquez Mancera	Junta de Acción Comunal	Residente
Yuri Andrea Parra Serrano	Junta de Acción Comunal	Contadora
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y avance del convenio

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resumen de avance de obra y administración.
3- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorera, así como el secretario, la contadora y el residente. por parte de la interventoría, la directora y el residente
2.	**Resumen de avance de obra y administración:** Se presentaron los avances a la fecha: • **Residente de obra:** La semana anterior se culminaron las actividades de construcción de alcantarilla, lo cual permitió iniciar con la extensión de la subbase granular para su posterior compactación. El ingeniero indica que se requiere material pétreo para culminar la longitud del proyecto, teniendo en cuenta que la factura inicial correspondía al primer ejercicio de cálculo de cantidades que fueron proyectadas sin el diseño correspondiente. Por lo anterior, en el presente comité se solicita la compra de 16m^3 de arena, 20m^3 de triturado y 30m^3 de subbase para culminar la longitud del convenio y proyectar unos metros más, puesto que con la cantidad solicitada se pretende realizar la extensión del material y permitir una adecuación del terreno para la continuación de la estructura de placa huella por parte de la junta de acción comunal. • **Contadora:** Se indica que la transferencia de recursos No. 6 fue aprobada y tramitada, teniendo en cuenta que correspondía al pago de nómina del personal operativo de la primera quincena, pago al maestro de obra por la ejecución de la alcantarilla y el pago de las retenciones ICA bimestre enero-febrero y retención en la fuente.
3.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realizan las autorizaciones de transferencia de los proveedores aprobados en este comité y anteriores: • Nómina del 16 al 30 de marzo. Por valor de $ 3.424.067,00. • Maestro de obra: JOSÉ LIZARDO ESCOBAR. Por valor de $ 1.350.000,00. • Topografía: WILSON FERNANDO MENDEZ. Por valor de $ 1.000.000,00. • Material pétreo: DF CONSTRUCCIONES. Arena y triturado por valor de $ 5.300.000,00. • Material pétreo: DF CONSTRUCCIONES. Subbase por valor de $ 3.900.000,00. • Honorarios contadora: YURI ANDREA PARRA. Por valor de $ 1.400.000,00. • Honorarios residente: NORMAN NICOLÁS VELASQUEZ. Por valor de $ 3.500.000,00. • Seguridad social: LUCILA ARDILA RAMIREZ. Por valor de $ 2.636.700,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	**Aprobación:** Transferencias de recursos No. 7: • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 22.510.767,00.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar transferencia de recursos No. 7	Contadora	26/03/2024
Iniciar con el armado y fundición del concreto ciclópeo de la placa huella.	Residente	26/03/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Arturo Bustos Rojas
Cargo: Presidente OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Lucila Ardila Ramírez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Norman Nicolas Velasquez
Cargo: Residente Convenio Potrerillos

Nombre: Yuri Andrea Parra Serrano
Cargo: Contador Convenio Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

con el proceso de contratación se adelanta modalidad de contratación para el maestro de obra es por obra labor y el grupo de ayudantes de obra por contrato laboral, se contrata al siguente personal:
Maestro de Obra - Jose Lizardo Escobar Losada CC 12'203.488
Ayudante - Yesid Rojas C.C. 83'182.706.
Ayudante - Pastor Olaya Lopez C.C 1.077'857.087.
Ayudante - Oscar Andres Perdomo Perdomo C.C 1.077.723.924
Ayudante - Jose Oliver Pichica Cuaji C.C. 1.004'302.932.
Los contratos empiezan a regir del 4 de marzo de 2024

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente de Obra.

- Lunes 4 de marzo de 2024.
Tiempo: Lluvias fuertes de 12:30 p.m. a 02:00 p.m.
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta, 1 Volqueta.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra.
Trasporte de formaleta a bodega de obra, llegada de 60 tablas (15 cm x 3 m), 57 tablas (30cm x 3m), 200 estacas de 60 cm y 10 cercos (5:10 x 3m).
Trasporte y descargue de 190 bultos de cemento Cemex x 50 kg uso general.
Cerramiento en sitio de obra, inicio y fin de proyecto cerramiento en el cruce de la escuela de la vereda La Cabaña.

Ing. Norman Velasquez Mancera
Residente de Obra.

- Martes 5 de Marzo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta, 1 retrocargador, 2 furgones, 1 mezcladora de concreta

Powered by CamScanner

Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra 2 conductores, 1 operador, 1 comisión topografica.
Replanteo topografico de rasante, se traza eje de via.
Transporte y descargue de 6 tubos de concreto de 36" tipo INVIAS.
Transporte y descargue de 200 bultos de cemento en bodega y 40 varillas de 1/2"
Conformación de via alterna de obra.
Excavación para alcantarilla PR0+050.
Fundido de solado de alcantarilla PR0+050.
Instalación de 6 tubos de concreto de 36"

Ing. Norman Velasquez Mancera.
Residente de obra

- Miercoles 6 de Marzo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria Utilizada: 1 Camioneta, 1 retrocargador, 1 mezcladora de concreto,
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra, 1 operador, 1 Comisión topografica.
Replanteo y estacado topografico para subbase
Continua conformación de via alterna de obra.
Fundido de atraques de alcantarilla PR0+050
Relleno con material seleccionado alcantarilla PR0+050

Ing. Norman Velasquez Mancera.
Residente de Obra.

- Jueves 7 de marzo de 2024
Tiempo: Lluvias fuertes de 04:00 a.m a 09:00a.m
Maquinaria Utilizada: 1 Camioneta, 1 retrocargador, 1 mezcladora de concreto, 1 volqueta.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 4 ayudantes de obra, 2 operadores.

Powered by CamScanner

Fundido de solado de encole alcantarilla PRO+050.
Armado de doble emparrillado de acero de encole alcantarilla PRO+050.
Trasporte y descargue de triturado
Trasporte y descargue de Arena.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

- Viernes 8 de marzo de 2024.
Tiempo: Lluvias desde 11:00 a.m. hasta 01:30 p.m.
Maquinaria utilizada: 1 camioneta, 1 mezcladora de concreto,
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro 4 ayudantes Obra
Continua armado de doble emparrillado de acero de encole de alcantarilla PRO+050.
Fundido de Encole Alcantarilla PRO+050.
Encofrado de Encole de alcantarilla PRO+050.

Ing. Norman Velasquez Mancera.
Residente de obra.

- Lunes 11 de marzo de 2024
Tiempo: Lluvias entre las 06:00 a.m. y las 09:00 a.m.
Maquinaria utilizada: 1 camioneta, 1 mezcladora de concreto, 1 motoniveladora, 4 volquetas.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra, 5 operadores.
Trasporte y descargue de subbase a sitio de obra.
Extensión de subbase entre los PRO+080 al PRO+130.
Desencofrado de alcantarilla encole PRO+050.
Perfilado de excavación de descole de alcantarilla PRO+050.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

-Martes 12 de Marzo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 1 camioneta, 1 mezcladora de concreto, 1 motoniveladora, 4 volquetas.
Personal en obra: 1 ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra, 5 operadores.
Trasporte y descargue de subbase a sitio de obra.
Extension de subbase entre los PR 0+020 a PR 0+080.
Fundido de solado de alcantarilla PR 0+050
Armado de doble emparrillado de acero de descole de alcantarilla PR 0+050.
Encofrado de descole de alcantarilla PR 0+050.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

-Miercoles 13 de Marzo de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 1 camioneta, 1 mezcladora de concreto,
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudanteode obra.
Continua armado de doble emparillado de acero de descole alcantarilla PR 0+050.
Continua encofrado de descole de alcantarilla PR 0+050.
Fundido de descole de alcantarilla PR 0+050.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

-Jueves 14 de Marzo de 2024.
Tiempo: Llovizna desde las 05:00 a.m. hasta las 11:30 a.m.
Maquinaria utilizada: 1 camioneta, 1 motonivelador,
Personal en obra: 1 ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra, 1 operador.

Powered by CamScanner

Desencofrado de alcantarilla descole PR 0+050.
Excavación de dentellón de descole de alcantarilla PR 0+050.
Fundido de dentellón de alcantarilla PR 0+050.
Relleno de encole de alcantarilla PR 0+050 con material seleccionado.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

-Viernes 15 de marzo de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 1 camioneta, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador.
Personal en Obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra, 2 operadores, 1 comisión topográfica.
Continua desencofrado alcantarilla PR 0+050.
Extensión de subbase entre los PR 0+000 al PR 0+130.
Replanteo topográfico de subbase entre los PR 0+000 al PR 0+100.
Cereo de subbase entre los PR 0+000 al PR 0+100.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

-Sabado 16 de marzo de 2024.
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 1 camioneta, 1 motoniveladora, 1 vibrocompactador.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 4 ayudantes de obra, 2 operadores.
Cereo de subbase entre los PR 0+060 al PR 0+130
Compactación de subbase entre los PR 0+000 al PR 0+130.
Toma de ensayos de laboratorio a subbase, densidades en los PR 0+030, PR 0+070, PR 0+090.

Powered by CamScanner

PR0+100 y PR 0+120, en conjunto con la interventoria del proyecto.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

-Lunes 18 de Marzo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria Utilizada: 1 Camioneta.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes de obra.
Trasporte y descargue de 1026 varillas N° 3 a sitio de obra
Toma densidades por parte de interventoria del proyecto a subbase instalada.
Figurado gancho de cuneta.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

-Martes 19 de Marzo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria Utilizada: 1 Camioneta.
Personal de obra: 1 Ingeniero 1 maestro 1 oficial 4 Ayudantes de obra.
Figurado de flejes ganchos de cunetas.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.

-Miercoles 20 de Marzo de 2024
Tiempo: Soleado
Maquinaria Utilizada: 1 Camioneta.
Personal en obra: 1 Ingeniero 1 Maestro 1 oficial 4 ayudantes de obra, 1 Comision topografica
Figurado de gancho de cuneta.
Figurado y armado de vigas Riostras

Replanteo de eje de via
Transporte y descargue de materiales petreos e
sitio de obra.
Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.
-Jueves 21 de Marzo de 2024
Tiempo: Lluvias fuertes entre las 11:00 a.m. a
01:00 p.m.
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 Maestro, 1 Oficial,
4 ayudantes de obra.
Figurado de gancho de cuneta.
Figurado y armado de vigas Riostras.
Transporte y descargue de materiales petreos en
sitio de obra.
Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.
-Viernes 22 de Marzo de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta.
Personal de obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 Oficial,
4 ayudantes de obra.
Figurado de gancho de cuneta.
Figurado y armado de vigas Riostras.
Ing. Norman Velasquez M.
Residente de Obra.
-Lunes 25 de Marzo de 2024.
Tiempo: Lluvias fuertes entre las 05:00 a.m. a
10:00 a.m.
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial

Powered by CamScanner

4 ayudantes de obra.
Encofrado y nivelación de centro de placa huella depde el PR 0+000 al PR 0+060.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

- Martes 26 de Marzo de 2024.
Tiempo: Soleado
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta, 1 mezcladora.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes de obra, 4 ayudantes JAC.
Fundido de concreto ciclopéo de placa huella entre los PR 0+000 al PR 0+030.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

- Miercoles 27 de marzo de 2024.
Tiempo: Soleado.
Maquinaria utilizada: 1 Camioneta, 1 mezcladora.
Personal en obra: 1 Ingeniero, 1 maestro, 1 oficial, 4 ayudantes de obra, 4 ayudantes JAC.
Fundido de concreto ciclopeo de placa huella. entre los PR 0+000 al PR 0+060.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra.

- Jueves 28 y Viernes 29 de marzo de 2024.
Dias festivos por motivo de semana santa no se realizarón actividades en sitio de obra.

Ing. Norman Velasquez M.
Residente de obra

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL
SAN LUIS

- Informes semanales
- Seguimiento garantías y seguros

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 12 del 1/03/2024 al 7/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023	hasta 18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.660.739,24	54,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.660.739,24	54,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana no se realizó el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, por lo cual, no fue posible realizar la socialización de inicio y efectuar comités operativos; sin embargo, se tuvo contacto director con el Presidente de la Junta de Acción Comunal para el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene pendiente el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.


VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada se acaba de realizar la aprobación de la hoja de vida del ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Estar prestos al desembolso de los recursos y poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.	FIRMA:  NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 13 del 8/03/2024 al 14/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023	hasta 18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55.404.440,39	67,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.404.440,39	67,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana no se realizó el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, por lo cual, no fue posible realizar la socialización de inicio y efectuar comités operativos; sin embargo, se tuvo contacto director con el Presidente de la Junta de Acción Comunal para el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene pendiente el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada se acaba de realizar la aprobación de la hoja de vida del ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Estar prestos al desembolso de los recursos y poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 14 del 15/03/2024 al 21/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023	hasta 18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55.404.440,39	67,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.404.440,39	67,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO:	SI ___	NO ___		
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ___	NO ___		

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	____	NO	____	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	____	NO	____	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	____	NO	____	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	____	NO	____	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	____	NO	____	N/A	X
EMISIONES:	SI	____	NO	____	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	____	NO	____	N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana no se realizó el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, por lo cual, no fue posible realizar la socialización de inicio y efectuar comités operativos; sin embargo, se tuvo contacto director con el Presidente de la Junta de Acción Comunal para el seguimiento y acompañamiento correspondiente.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene pendiente el desembolso de los recursos por parte de la Entidad, con el fin de iniciar con las actividades de socialización y comités operativos.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada se acaba de realizar la aprobación de la hoja de vida del ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
Estar prestos al desembolso de los recursos y poder dar inicio a las actividades inherentes al proyecto, tales como la realización de comités operativos con el fin de planificar las actividades a realizar por medio de aprobación de proveedores de suministros, alquiler de maquinaria y equipos, y todo lo necesario para contratación de personal de servicio y nomina requeridos en el proyecto para su inicio.	FIRMA: NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 3802 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 15 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 7 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 0,80 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 145 ml

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN - HUILA				
R. LEGAL:	EDWIN JOVAN GARZON CARVAJAL				
CONVENIO No.	4176 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	188.483.432,00
FECHA DE INICIO:	30/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	188.483.432,00
SUSPENSIÓN No. 1:	30/12/2023	hasta 18/01/2024		$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	19/01/2024			$	-
PRÓRROGA No. 1:	19/01/2024				
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023		VALOR INICIAL:	$	82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023		VALOR ADICIONES:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	$	82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta 16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$	-
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024		VALOR AMORTIZADO:	$	-
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024		SALDO POR AMORTIZAR:	$	-
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 187.483.432			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 187.483.432			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 140.457.826,00**	**74,92%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	-	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ -	
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.213.735,00**	**2,25%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 42.811.871,00**	**22,84%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.801.084,12	73,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 60.801.084,12	73,57%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.105.183,00**	**100,33%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 187.483.432,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ -	

Observaciones: No se tienen valores valores ejecutados debido a no se han realizado actividades por el trámite administrativo en el que se encuentra el convenio.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % _____ Avance o Atraso Físico % _____

Meta Física Ejecutada % _____

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	7
*	DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	0,8
*	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	145

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda San Luis

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A		X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A		X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A		X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A		X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A		X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A		X
EMISIONES:	SI		NO		N/A		X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A		X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 4

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda San Luis - Garzón

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

El 26/03/2024 se realizó el desembolso de los recursos a la cuenta de manejo conjunto del convenio solidario, por lo que se tuvo contacto directo con los dignatarios de la Junta de Acción Comunal para programar la socialización de inicio.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar la socialización de inicio con la comunidad de la junta de acción comunal en compañía del INVIAS, así como realizar el primer comité operativo con el fin de revisar y aprobar las hojas de vida de los profesionales de contaduría y residencia de obra.

Por otra parte, se tiene programado efectuar el cambio de firmas de la cuenta bancaria, para que se puedan dar las autorizaciones y transferencias de los recursos por parte de la interventoría.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Teniendo en cuenta que a la fecha reportada se acaba de realizar la aprobación de la hoja de vida del ingeniero residente de obra, el cual entregará la programación de obra, no se presenta un esquema gráfico de avance.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comités operativos para aprobación de proveedores y desembolsos que halla lugar, con el fin de dar inicio a las obras, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas. Así mismo, realizar seguimiento al trámite administrativo de prórroga correspondiente.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	3	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4176 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN LUIS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS MUNICIPIO DE GARZON DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL, EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 30/12/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 188.483.432,00

VALOR ACUMULADO: $ 188.483.432,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.696.687,00	2	12	2023	31/10/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.424.172,00	2	12	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.545.030,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299715

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	2	12	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100074298 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 19/12/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 37.696.687,00	31	12	2023	1/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 9.424.172,00	31	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	$ 56.545.030,00	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100299715

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 14/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 260.000.000,00	2	12	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB-100074298 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 14/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL POTRERILLOS

- Acta de aprobación definitiva de estudios y diseños
- Informes semanales
- Maquinaria y equipo
- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Informe de inversión y buen manejo del desembolso
- Acta parcial de pagos del convenio
- Estado general del tiempo
- Resumen ensayos de laboratorio
- Comités operativos
- Bitácora de obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 01/03/2024 (Día / Mes / Año)

INDICAR LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

ELABORACIÓN ☑ **ACTUALIZACIÓN** ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **COMPLEMENTACIÓN** ☐ **AJUSTE** ☐ **REVISIÓN** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS:

Mediante la suscripción de la presente acta de aprobación de estudios y diseños, se aprueba por el Contratista y el Interventor los estudios y diseños contratados para la ejecución del Convenio 4126 de 2023 suscrito entre el Invias y la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potrerillos del municipio de Garzón.

CONVENIO No: 4126 DE 2023 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO $ 189.252.458,00 (Indique en este espacio el valor total incluidos adicionales en números)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 1 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONVENIO 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2023 (Año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4597 DE 2023 (Indicar número y año)

CONVENIO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRÓRROGAS:

CONVENIO No. Y ADICIONAL No.	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO	VALOR CONVENIO	VALOR ACUMULADO
4126 DE 2023	26/10/2023	HASTA 31/12/2023	$ 189.252.458	$ 189.252.458
PRÓRROGA UNO (1)	26/12/2023	HASTA 30/04/2024	$ 189.252.458	$ 189.252.458

SUSPENSIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

CONTENIDO DEL INFORME FINAL DEL AJUSTE Y REVISIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A EJECUTAR:

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA DENOMINADA "RAMAL - CRUCE GARZÓN - PARAISO - ALTO SAN RAFAEL - LA VEGA - VEREDA POTRERILLOS" A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 134 M DE PLACA HUELLA Y 1 ALCANTARILLA.

RESUMEN DEL CONTENIDO DEL INFORME FINAL

* VOLUMEN	* DESCRIPCIÓN	TOMOS	FOLIOS	No. PLANOS	OBSERVACIONES
VOL I	**Condiciones locales**	1	10	N/A	**Nombre:** "INFORME DE CONDICIONES LOCALES" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM
	Diseño geométrico	1	17	1	**Nombre:** "INFORME DE DISEÑO GEOMÉTRICO" **Elaborado por:** Wilson Fernando Mendez Borja. **M.P:** 01-10803 CPNT **Plano No. 1:** "Diseño geométrico - Placa huella"
	Condiciones climáticas e hidrológicas	1	30	N/A	**Nombre:** "Informe de condiciones climáticas e hidrológicas" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM
	Caracterización de materiales	1	1	N/A	**Nombre:** "Proctor modificado" **Elaborado por:** Victor Armando Perdomo. **Revisado por:** Carlos Andrés Cuscue.
	Concepto del tránsito	1	21	N/A	**Nombre:** "Estudio de tránsito" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM **Anexo No. 1:** "Estudio de clasificación vehicular"
		1	21	N/A	**Nombre:** "Plan de manejo de tránsito" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM
	Concepto estructural	1	30	4	**Nombre:** "Diseño Estructural de Placa Huella" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM **Plano No. 1:** "Diseño estructural en planta - Placa huella" **Plano No. 2:** "Diseño estructural en detalle - Placa huella" **Plano No. 3:** "Diseño estructural 1 - Alcantarilla" **Plano No. 4:** "Diseño estructural 2 - Alcantarilla"
ANEXO 1	Pruebas de laboratorio	1	72	N/A	**Nombre:** "ESTUDIO DE SUELOS" **Elaborado por:** Andrés Ome Cano. **M.P:** 70202-139526 TLM **Anexo No. 1:** "Apique No. 1" **Anexo No. 2:** "Apique No. 2"
ANEXO 2	Diseño de mezclas	2	2 2	N/A	**Nombre:** "Diseño de concreto hidráulico 2000 PSI" y "Diseño de concreto hidráulico 3000 PSI" **Elaborado por:** Carlos Andrés Cuscue
ANEXO 3	Levantamiento topográfico	1	21	1	**Nombre:** "INFORME DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO" **Elaborado por:** Wilson Fernando Mendez Borja. **M.P:** 01-10803 CPNT **Plano No. 1:** "Levantamiento en planta y perfil longitudinal"
ANEXO 4	Memorias de cálculo	1	N/A	1	**Nombre:** "Memorias de cálculo" **Elaborado por:** Luis Fernando Calderón Gómez. **M.P:** 161032-0521136 TLM

*** Estos conceptos deben corresponder a los exigidos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES, la cual hace parte de los documentos del convenio solidario.**

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La Interventoría deja constancia que recibió, revisó y aprobó los volúmenes, tablas, anexos, planos y demás documentos correspondientes a los estudios y diseños entregados por el contratista, los cuales, cumplen con lo contemplado en las normas, especificaciones y demás condiciones contractuales.

Mediante la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de los Estudios y Diseños, el contratista y el Interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y no exonera al contratista de las obligaciones ni de las responsabilidades estipuladas en el convenio solidario.

Con la suscripción de la presente acta la Interventoría certifica que recibió del contratista los documentos requeridos que conforman los estudios y diseños aprobados conforme a los lineamiento descritos en la especificación particular del Proyecto REQUERIMIENTO DE REVISIÓN DE LAS GUÍAS DE OBRAS MENORES.

QUIEN ENTREGA

Firma: Mariana Angarita Gonzalez

MARIANA ANGARITA GONZALEZ
Representante legal de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Potrerillos - Garzón
Contratista

Firma:

LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

QUIEN RECIBE, VERIFICA Y APRUEBA

Firma:

SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante legal
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Unidad Ejecutora
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección competente de la Dirección Técnica y de Estructuración y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 7/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA — SEMANA No.: 12 del 1/03/2024 al 7/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69.662.654,67	49,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 26.049.193,72	18,32%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (43.613.460,95)	-30,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.746.989,28	16,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 21.217.304,74	14,92%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (1.529.684,54)	-1,08%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ -	
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.600.351,90	66,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 16.353.096,64	39,10%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 44.660.739,24	54,04%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 44.660.739,24	54,04%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: ☐ X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 97.263.006,57	51,67%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 42.402.290,36	22,52%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ -	
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 104.487.816,56	55,50%

Observaciones: No se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra.
Con relación a los valores programados, se efectúa seguimiento a la programación No. 1.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 49,00%
Meta Física Ejecutada % 18,32%
Avance o Atraso Físico % -30,68%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo 1**				**%**
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	0,97				48,5%
Prog	53,6				40,0%
Ejec	19,095				14,3%
Prog	1				100,0%
Ejec	0,44				44,2%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI		NO
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guarani	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Se entregó al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES: No se realizaron reuniones de comité operativo.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron actividades de mejoramiento como la compactación de la subbase granular instalada. En cuanto a la alcantarilla, se realizó el figurado y armado del acero de la poceta y descole para su posterior fundición y relleno lateral.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El lunes 11 de marzo de 2024 se tiene programado la toma de densidades de la subbase granular por parte del laboratorio. También, se tiene programado iniciar con el flejado del acero y la instalación de la formaleta de la placa huella.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

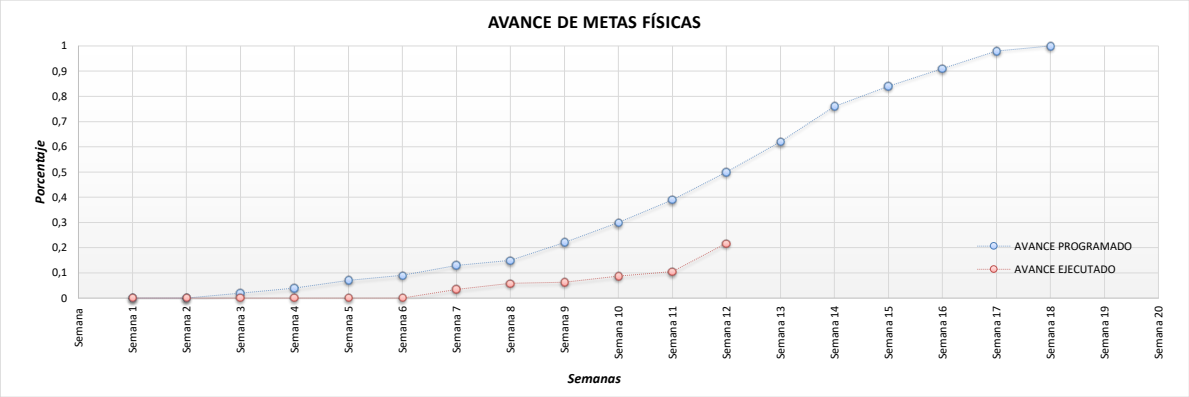

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación de la subbase granular



Replanteo de la placa huella



Excavación manual del descole de alcantarilla

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, dando cumplimiento a la programación y especificaciones técnicas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 14/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

SEMANA No.: 13 del 8/03/2024 al 14/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 92.409.643,95	65,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 26.127.677,97	18,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (66.281.965,98)	-46,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 22.746.989,28	16,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 78.484,25	0,06%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ (22.668.505,03)	-15,94%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 85.301,20	2,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 30.527.661,95	73,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 23.570.586,59	56,36%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO	$ 988,44	

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.032.589,82	60,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.032.589,82	60,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 123.022.607,10	65,35%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 49.698.264,56	26,40%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 19.303.318,32	10,25%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 134.833.418,88	71,62%

Observaciones: Los rendimientos financieros tramitados en el periodo correspoden a Febrero 2024.
Se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra pero se presenta atraso en la programación a causas de falta de disponibilidad de Maquinaria y equipo en la región.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65,00%
Meta Física Ejecutada % 18,38%
Avance o Atraso Físico % -46,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	0,97				48,5%
Prog	134				100,0%
Ejec	19,18				14,3%
Prog	1				100,0%
Ejec	0,44				44,2%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI		NO
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guarani	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Se entregó al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron reuniones de seguimiento en obra.


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana, se realizaron actividades de figurado e instalación del acero de refuerzo de la poceta. Por otra parte, se trabajó en el armado del acero de la placa huella de acuerdo con el diseño. Así mismo, se efectuaron labores de excavación manual de las vigas riostras, cunetas y colocación del acero de las mismas. Se realizan ensayos de densidades por parte del contratista.


VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

El viernes 15 de marzo de 2024 se tiene programado continuar con el flejado del acero y la instalación de la formaleta de la placa huella, para su posterior fundición.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

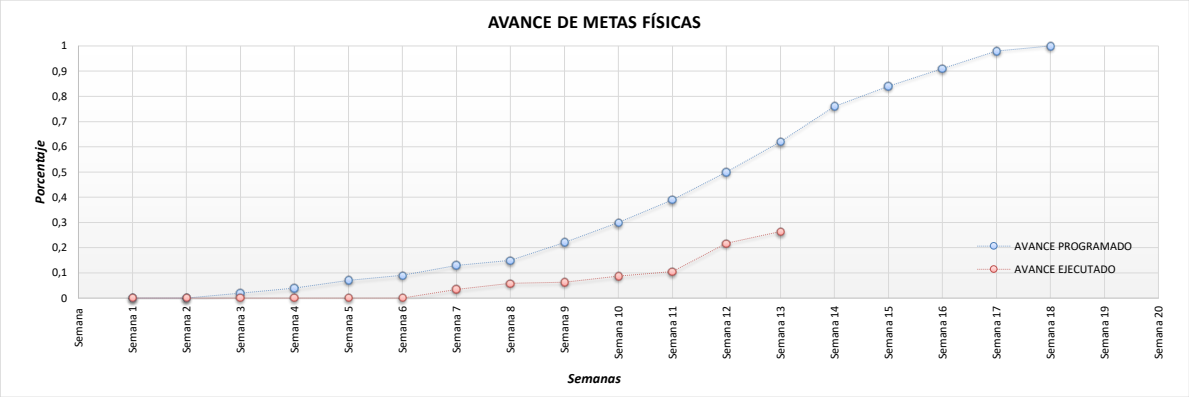

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Toma de densidades a la SBG



Replanteo de la placa huella



Excavación manual de las vigas riostras y acero de la placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, con el fin de dar cumplimiento a la programación, diseño y especificaciones técnicas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

SEMANA No.: 14 del 15/03/2024 al 21/03/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 116.578.320,06	82,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 59.466.654,56	41,83%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (57.111.665,50)	-40,17%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.168.676,11	17,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.338.976,59	23,45%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 9.170.300,48	6,45%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 1.151.566,20	27,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 33.454.972,00	80,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 27.794.586,59	66,46%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 50.032.589,82	60,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 50.032.589,82	60,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 151.184.858,26	80,31%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 87.261.241,15	46,35%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL	$ 15.795.800,00	8,39%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 150.629.218,88	80,01%

Observaciones: Se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra pero se presenta atraso en la programación a causas de falta de disponibilidad de Maquinaria y equipo en la región.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 82,00%
Meta Física Ejecutada % 41,83%
Avance o Atraso Físico % -40,17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	0,97				48,5%
Prog	134				100,0%
Ejec	56,56				42,2%
Prog	1				100,0%
Ejec	0,70				70,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guarani	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se entregó al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2
ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES: Se realizaron comités operativos:
-Comité operativo No. 12 de fecha 15/03/2024.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


El viernes 15/03/2024 se realizó el comité operativo No. 12, donde se aprobó la transferencia de recursos No. 7 que comprendía la nómina del personal operativo, retenciones, transporte de agregados, antisol, abono al maestro por la alcantarilla construida y maquinaria vibro compactador.

En cuanto a la ejecución de obra, durante la semana se realizó la fundición de los primeros 39 m de placa huella en concreto reforzado de acuerdo con el diseño, además, de aplicar el antisol sobre la superficie de la estructura para evitar la evaporación del agua del concreto; también, se realizó el figurado e instalación de acero para poder fundir la siguiente semana. Sin embargo, cabe resaltar que parte del atraso en la programación semanal fue debido al trámite del desembolso de los recursos en la cuenta de los proveedores, y el incumplimiento por parte del proveedor de la maquinaria vibro compactador, por lo que fue necesario conseguir otro equipo.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con el flejado y figurado del acero y la instalación de la formaleta de la placa huella, para su posterior fundición.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

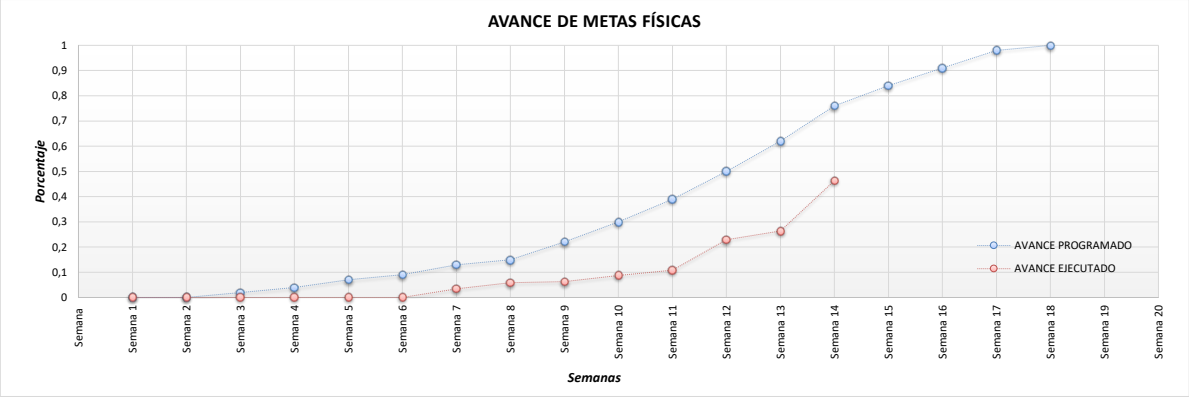

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figurado e instalación del acero de refuerzo



Fundida de concreto de 3000 PSI y toma de cilindros



Fundida de concreto y cepillado de la superficie

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, con el fin de dar cumplimiento a la programación, diseño y especificaciones técnicas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 28/03/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONVENIO SOLIDARIO: 4126 DE 2023

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA SEMANA No.: 15 del 22/03/2024 al 28/03/2024 Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: WILDER ORLEY SALAZAR GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABÓN CARRILLO

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE: 6 und
DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS: 2,00 Ha
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA: 134 ml
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS: 1 und

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizarán actividades de mantenimiento, las cuales consisten en limpieza de obras menores de drenaje y, desmonte y limpieza de zonas no boscosas.
También se realizarán actividades de mejoramiento que contemplan la construcción de placa huella y construcción de alcantarilla Tipo I.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN		
R. LEGAL:	MARIANA ANGARITA GONZALEZ		
CONVENIO No.	4126 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 189.252.458,00
FECHA DE INICIO:	1/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 189.252.458,00
PRÓRROGA No. 1:	7/12/2023		$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024		$ -
			$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO				
INTEGRANTES:	DIRECTOR: SILVIA ORDOÑEZ - RESIDENTE: MAURICIO ARGÜELLO				
CONTRATO No.	4597 DE 2023			VALOR INICIAL:	$ 82.643.855,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023			VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023			VALOR ACUMULADO:	$ 82.643.855,00
SUSPENSIÓN No. 1:	29/12/2023	hasta	16/01/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN No. 1:	17/01/2024			VALOR AMORTIZADO:	$ -
PRÓRROGA No. 1:	17/01/2024			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/04/2024				

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 188.252.458			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 188.252.458			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 82.643.855			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 82.643.855			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	**$ 142.168.683,00**	**75,52%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 126.530.127,87	89,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 109.461.698,85	76,99%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (17.068.429,02)	-12,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.951.807,81	7,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 49.995.044,30	35,17%
AVANCE O ATRASO SEMANAL DE OBRA:	$ 40.043.236,49	28,17%
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL) (B):	**$ 4.265.060,00**	**2,27%**
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL PROG. ACUMULADA:	$ 1.833.975,80	43,00%
GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL EJEC. ACUMULADA:	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C):	**$ 41.818.715,00**	**22,21%**
ADMINISTRACIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 35.545.907,75	85,00%
ADMINISTRACIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	$ 27.794.586,59	66,46%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PERIODO		

INTERVENTORÍA		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.776.290,97	73,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 60.776.290,97	73,54%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.371.850,58	6,50%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: ENERO
VALOR FACTURA: $ 16.880.000,00

VALOR PRESUPUESTO (A+B+C):	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 163.910.011,42	87,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA:	$ 137.256.285,44	72,91%
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO	**$ 188.252.458,00**	**100,00%**
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO SEMANAL		
SEGUIMIENTO DESEMBOLSO ACUMULADO	$ 150.629.488,88	80,01%

Observaciones: Se tienen valores ejecutados en cuanto al avance de obra pero se presenta atraso en la programación a causas de falta de disponibilidad de Maquinaria y equipo en la región.

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se realiza seguimiento al plan de cargas de acuerdo con la prórroga tramitada hasta el 30/04/2024.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89,00% Avance o Atraso Físico % -12,01%

Meta Física Ejecutada % 76,99%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
* LIMPIEZA OBRAS MENORES DE DRENAJE	UND	6
* DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS	HA	2
* CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA	ML	134
* CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS	UND	1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo 1				%
Prog	6				100,0%
Ejec					
Prog	2				100,0%
Ejec	0,97				48,5%
Prog	134				100,0%
Ejec	109,77				81,9%
Prog	1				100,0%
Ejec	1				100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Vereda Potrerillos

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	MASSEQ S.A.S	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	KM0+300 Vía Agrado - Muelle Guarani	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Se entregó al profesional ambiental de la interventoría para su revisión.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

ACTAS DE VECINDAD REALIDAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vereda Potrerillos - Garzón

OBSERVACIONES:


VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana se realizó la fundición de aproximadamente 57 m de placa huella en concreto reforzado de acuerdo con el diseño, además, de aplicar el antisol sobre la superficie de la estructura para evitar la evaporación del agua del concreto; también, se realizó el figurado e instalación de acero para poder fundir la siguiente semana. Adicionalmente, se terminaron las fundiciones de guardaruedas del encole y descole de la alcantarilla teniendo en cuenta que se aproximaba la fundida de placa huella sobre la misma. Cabe resaltar que la semana corresponde a la conmemoración de la semana santa, por lo cual, la cantidad de días laborados fue menor.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se tiene programado continuar con el flejado y figurado del acero y la instalación de la formaleta de la placa huella, para su posterior fundición.

Se realizará comité operativo de seguimiento a la ejecucion de obra.

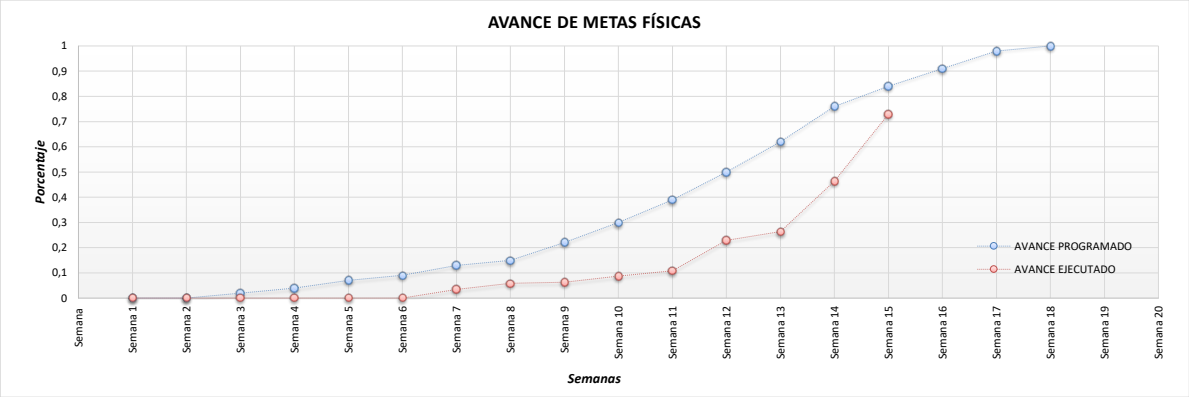

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Figurado e instalación del acero de refuerzo



Toma de densidades a la SBG



Fundida de concreto de 3000 PSI

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Realizar comité operativo para aprobación de desembolsos que halla lugar, al igual que el seguimiento de la actividades desarrolladas en obra, con el fin de dar cumplimiento a la programación, diseño y especificaciones técnicas.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: MARZO 2024

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO SOLIDARIO No. 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Vibro compactador Monocilíndrico	ECOROAD	13.5 – 28 KN	Potrerillos																					A	A	A								
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																								1	1	1								
TOTAL ACTIVO																								1	1	1								
TOTAL EN REPARACIÓN																								0	0	0								
TOTAL INACTIVO																								0	0	0								

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	10,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	10,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0,00%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,00%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se presentaron diferentes proveedores dada la dificultad de conseguir maquinaria amarilla vibro compactador en la región para prestar los servicios en la junta, por la distancia y las ofertas económicas que no eran viables para ellos por la baja complejidad del proyecto. Además, al inicio de mes se tuvo presencia de un vibro compactador benitin que no cumplió con las especificaciones técnicas y tuvo que ser devuelto el mismo día.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31/03/2024
	(Día / Mes / Año)

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma

Nombre: Edgar Mauricio Argüello Maldonado
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0582894 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON – HUILA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	YURI ANDREA PARRA SERRANO *		CONTADORA	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 6.800	I	Nueva EPS	9464562981	$ 162.500	Positiva	9464562981	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
2	LUIS FERNANDO CALDERÓN GÓMEZ *		RESIDENTE	$ 1.728.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.728.000	$ 97.500	V	Nueva EPS	8630071640	$ 216.000	Colpensiones	8630071640	$ 276.500	$ -	$ -	$ -	
3	CELESTINO CARVAJAL GARCIA *		MAESTRO	$ 1.640.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.640.000	$ 114.200	V	Sanitas	9464060575	$ 205.000	Porvenir	9464060575	$ 262.400	$ -	$ -	$ -	
4	EDWIN DUIRAN GRUALBA SANCHEZ		AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	9465376340	$ 162.500	Porvenir	9465376340	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
5	JEFFERSON GONZALEZ NIETO		AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	9465376340	$ 162.500	Porvenir	9465376340	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
6	JUAN PABLO ESCARPETA MEDINA		OFICIAL	$ 1.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.600.000	$ 111.400	V	Nueva EPS	9465376340	$ 200.000	Protección	9465376340	$ 256.000	$ 64.000	$ 80.000		
7	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ		AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	9465376340	$ 162.500	Porvenir	9465376340	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
8	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO		AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$ 1.300.000	$ 90.500	V	Nueva EPS	9465376340	$ 162.500	Porvenir	9465376340	$ 208.000	$ 52.000	$ 65.000		
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	556560162	9464562981	I	2024/04/15	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: GARZON Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC 1077868669	PARRA YURI	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077868669		PARRA SERRANO YURI ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12a # 3 - 21 BR floresta	GARZON-HUILA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	556560162	9464562981	I	2024/04/15	2024/04/05	BANCOLOMBIA	0	$377,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,800	$0	$0	$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$377,300	$0	$0	$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	555274731	9465376340	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$3,023,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077845426	ESCARPETA MEDINA JUAN PABLO																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000	CCF32	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$1,600,000	$80,000	No	$711,400
2	CC	1083900561	GONZALEZ NIETO JEFFERSON		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
3	CC	1077864215	GRIJALBA SANCHEZ EDWIN DUIRAN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
4	CC	1077861398	LOPEZ LOPEZ MARCOS EDUARDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
5	CC	1077840731	SAENZ CARRILLO MILTON DANIEL		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$1,300,000	$65,000	No	$578,000
Total	**Afiliados(5)**																						$6,800,000	$1,088,000			$6,800,000	$850,000			$6,800,000	$272,000			$6,800,000	$473,400		$6,800,000	$340,000		$3,023,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	555274731	9465376340	E	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$3,023,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,088,000	$0	$0	$1,088,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$832,000	$0	$0	$832,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$473,400	$0	$0	$473,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$473,400	$0	$0	$473,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$272,000	$0	$0	$272,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	5	$272,000	$0	$0	$272,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$850,000	$0	$0	$850,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$850,000	$0	$0	$850,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$204,000	$0	$0	$204,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$204,000	$0	$0	$204,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$136,000	$0	$0	$136,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$136,000	$0	$0	$136,000
TOTAL				**5**	**$3,023,400**	**$0**	**$0**	**$3,023,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	555196396	9464635822	Y	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$211,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1077868984	CALDERON GOMEZ LUIS FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,400,000	$97,500	0	$0	$0	No	$97,500
2	CC	83252421	CARVAJAL GARCIA CELESTINO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-11	30	$1,640,000	$114,200	0	$0	$0	No	$114,200
Total	**Afiliados(2)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$3,040,000	$211,700		$0	$0		$211,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 813005618	3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PLANTA	VEREDA POTRERILLOS	GARZON-HUILA	3142374713	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	555196396	9464635822	Y	2024/04/04	2024/04/04	BANCOLOMBIA	0	$211,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$211,700	$0	$0	$211,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$211,700	$0	$0	$211,700
TOTAL				**2**	**$211,700**	**$0**	**$0**	**$211,700**

CERTIFICADO DE APORTES

PAGADA

Se certifica que LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ CC 1077868984 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social del empleado LUIS FERNANDO CALDERON GOMEZ, identificado con CC 1077868984 en la planilla número 8630071640 Sucursal No. 0

Período pensión	2024-03	Número planilla	8630071640	Entidad bancaria	BANCO DE BOGOTA
Período Salud	2024-03	Referencia de pago	8617436741		
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2024-04-19		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig cot pensión	Actividad Económica	Departamento	Municipio	Administradora			Días	IBC	Tarifa	Cotización
							Tipo	Código	Nombre				
59	0			3711001	HUILA	GARZON	AFP	25-14	COLPENSIONES	30	$ 1.728.000	0,1600000	$ 276.500
							FSP	FSP001	Fondo Solidaridad Pensional	30	$ 1.728.000	0,000	$ 0
							FSS	FSP001	Fondo Subsistencia	30	$ 1.728.000	0,000	$ 0
							EPS	EPS037	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$ 1.728.000	0,1250000	$ 216.000
							ARL	14-23	POSITIVA	30	$ 1.728.000	0,0243600	$ 42.100
							CCF	SINCCF	SIN CCF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							SENA	SENA	SENA	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ICBF	ICBF	ICBF	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							ESAP	ESAP	ESAP	0	$ 0	0,0000000	$ 0
							Ministerio	Ministerio	Ministerio	0	$ 0	0,0000000	$ 0

Novedades

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Inicio Sln	Fecha Fin Sln	IGE	Fecha Inicio Ige	Fecha Fin Ige	LMA	Fecha Inicio Lma	Fecha Fin Lma	VAC	Fecha Inicio Vac	Fecha Fin Vac	AVP	VCT	Fecha Inicio Vct	Fecha Fin Vct	IRP	Fecha Inicio Irp	Fecha Fin Irp
																												0		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 3 **MES:** MARZO 2024 **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO** ☐

CONVENIO No. 4126 DE 2023
(Indicar número y año)

DESEMBOLSO OTORGADO: 100 %

VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: $ 188.252.458,00 **(M/CTE)**

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4597 DE 2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Cuenta de cobro		1-mar-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 1.322.283,00	6	SEGURIDAD SOCIAL FEB
Cuenta de cobro	2	28-feb-24	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	$ 7.400.000,00	3	TRANSPORTE AGREGADOS
Cuenta de cobro	1	7-feb-24	YURI ANDREA PARRA SERRANO	$ 1.400.000,00	6	HONORARIOS CONTADORA
	1	29-feb-24	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	$ 724.267,00	4	PRIMERA QUINCENA
	1	29-feb-24	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	$ 724.267,00	4	PRIMERA QUINCENA
	1	29-feb-24	JUAN PABLO ESCARPETA	$ 871.467,00	4	PRIMERA QUINCENA
Cuenta de cobro	2	8-mar-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 300.000,00	6	CAJA MENOR
Cuenta de cobro	2	8-mar-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 400.000,00	6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN
	1	29-feb-24	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	$ 724.300,00	4	PRIMERA QUINCENA
Factura electrónica	JAF-89	7-mar-24	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	$ 3.366.000,00	1	MOTONIVELADORA
Cuenta de cobro	1	4-mar-24	NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRIGUEZ	$ 1.278.400,00	1	MINI BENITIN
Factura electrónica	PROFORMA 018	10-feb-24	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	$ 2.398.761,00	2	AGREGADOS
Cuenta de cobro		4-mar-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 290.150,00	4	SEGURIDAD SOCIAL MAR
Cuenta de cobro		4-mar-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 212.000,00	6	ARL FEB
Cuenta de cobro	2	4-mar-24	LUIS FERNANDO CALDERON	$ 3.500.000,00	6	HONORARIOS RESIDENTE
Cuenta de cobro	2	8-mar-24	YURI ANDREA PARRA SERRANO	$ 1.400.000,00	6	HONORARIOS CONTADORA
Factura electrónica	FE-61	9-mar-24	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	$ 764.700,00	6	ESTUDIO DE SUELOS
Cuenta de cobro		4-mar-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 27.000,00	6	RETENCIONES BIMESTRE
Cuenta de cobro		4-mar-24	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	$ 2.197.000,00	6	RETENCIONES FEBRERO
	1	29-feb-24	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	$ 724.300,00	4	PRIMERA QUINCENA
	2	14-mar-24	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	$ 679.000,00	4	SEGUNDA QUINCENA
	2	14-mar-24	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	$ 679.000,00	4	SEGUNDA QUINCENA
	2	14-mar-24	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	$ 679.000,00	4	SEGUNDA QUINCENA
	2	14-mar-24	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	$ 679.000,00	4	SEGUNDA QUINCENA
	2	14-mar-24	JUAN PABLO ESCARPETA	$ 817.000,00	4	SEGUNDA QUINCENA
Cuenta de cobro	3	18-mar-24	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	$ 5.252.000,00	3	TRANSPORTE AGREGADOS
Cuenta de cobro	2	11-mar-24	CELESTINO CARVAJAL GARCIA	$ 2.000.000,00	6	HONORARIOS MAESTRO
Factura electrónica	FEVC-22	16-mar-24	CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ	$ 1.237.500,00	1	VIBRO COMPACTADOR
Cotización	3198	21-feb-24	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	$ 825.000,00	2	ANTISOL
Extracto bancario		31-mar-24		$ 616.887,29	6	GASTOS BANCARIOS MAR.

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso,

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ 18.143.214,00	$ 3.340.134,41	$ 5.881.900,00	$ 9.222.034,41	$ 8.921.179,59
2	MATERIALES	$ 84.652.267,00	$ 83.063.670,15	$ 3.223.761,00	$ 86.287.431,15	$ (1.635.164,15)
3	TRANSPORTE	$ 22.031.585,00	$ 2.000.000,00	$ 12.652.000,00	$ 14.652.000,00	$ 7.379.585,00
4	MANO DE OBRA	$ 17.341.617,00	$ -	$ 7.591.751,00	$ 7.591.751,00	$ 9.749.866,00
5	GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL	$ 4.265.060,00	$ -		$ -	$ 4.265.060,00
6	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	$ 41.818.715,00	$ 15.480.368,34	$ 14.139.870,29	$ 29.620.238,63	$ 12.198.476,37
	TOTALES	$ 188.252.458,00	$ 103.884.172,90	$ 43.489.282,29	$ 147.373.455,19	$ 40.879.002,81

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (FEBRERO) : $ 988,44
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: $ 4.282,62
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
REP_204_31/01/2024	$ 1.598,25		DICIEMBRE 2023	31/01/2024	$ 1.598,25
REP_204_21/02/2024	$ 103,16		NOVIEMBRE 2023	21/02/2024	$ 1.701,41
REP_204_21/02/2024	$ 1.592,77		ENERO 2024	21/02/2024	$ 3.294,18
REP_204_12/03/2024	$ 988,44		FEBRERO 2024	12/03/2024	$ 4.282,62

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:

Se tienen los comprobantes de consignación de rendimientos financieros al día de acuerdo con la solicitud de realizar la transferencia VIA SEBRA al Tesorio Nacional.

NOTA:

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)**

Firma: Mariana Angarita Gonzalez
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos - Garzón

Firma:
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No. 4126 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VIA INTERVENIDA: Ramal - Cruce Garzón - Paraiso - Alto San Rafael - La Vega - Vereda Potrerillos.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON - HUILA

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO **CONTRATO No.** 4597 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR INICIAL:** $ 189.252.458,00

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) DE (Mes) DE (Año) **VALOR ADICIONES:** $ -

FECHA DE PRÓRROGA: 7 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 189.252.458,00

PLAZO (MESES): 5

FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO: 31 (Día) DE 12 (Mes) DE 2023 (Año)

FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO: 30 (Día) DE 4 (Mes) DE 2024 (Año)

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162		1/03/2024	$ 1.322.283,00	$ -	$ 1.322.283,00
2	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	1.079.390.086	CTA COBRO 2	28/02/2024	$ 7.400.000,00	$ -	$ 7.400.000,00
3	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1.077.868.669	CTA COBRO 1	7/02/2024	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00
4	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	1.077.864.215	NÓMINA 1	29/02/2024	$ 724.267,00	$ -	$ 724.267,00
5	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	1.077.861.398	NÓMINA 1	29/02/2024	$ 724.267,00	$ -	$ 724.267,00
6	JUAN PABLO ESCARPETA	1.077.845.426	NÓMINA 1	29/02/2024	$ 871.467,00	$ -	$ 871.467,00
7	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162	CTA COBRO 2	8/03/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
8	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162	CTA COBRO 2	8/03/2024	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00
9	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	1.083.900.561	NÓMINA 1	29/02/2024	$ 724.300,00	$ -	$ 724.300,00
10	JESUS MARIA FERNANDEZ FIERRO	12.190.662	JAF-89	7/03/2024	$ 3.400.000,00	$ -	$ 3.400.000,00
11	NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRIGUEZ	1.003.807.649	CTA COBRO 1	4/03/2024	$ 1.360.000,00	$ -	$ 1.360.000,00
12	MASSEQ PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S	900.341.710-9	PROFORMA 018	10/02/2024			
13	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162		4/03/2024	$ 290.150,00	$ -	$ 290.150,00
14	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162		4/03/2024	$ 212.000,00	$ -	$ 212.000,00
15	LUIS FERNANDO CALDERÓN	1.077.868.984	CTA COBRO 2	4/03/2024	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
16	YURI ANDREA PARRA SERRANO	1.077.868.669	CTA COBRO 2	8/03/2024	$ 1.400.000,00	$ -	$ 1.400.000,00
17	SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	901.680.866-6	FE-61	9/03/2024	$ 698.000,00	$ 94.620,00	$ 792.620,00
18	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162		4/03/2024	$ 27.000,00	$ -	$ 27.000,00
19	MARIANA ANGARITA GONZALEZ	55.070.162		4/03/2024	$ 2.197.000,00	$ -	$ 2.197.000,00
20	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1.077.840.731	NÓMINA 1	29/02/2024	$ 724.300,00	$ -	$ 724.300,00
21	EDWIN DUIRAN GRIJALBA SANCHEZ	1.077.864.215	NÓMINA 2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
22	MARCOS EDUARDO LOPEZ LOPEZ	1.077.861.398	NÓMINA 2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
23	JEFFERSON GONZALEZ NIETO	1.083.900.561	NÓMINA 2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
24	MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO	1.077.840.731	NÓMINA 2	14/03/2024	$ 679.000,00	$ -	$ 679.000,00
25	JUAN PABLO ESCARPETA	1.077.845.426	NÓMINA 2	14/03/2024	$ 817.000,00	$ -	$ 817.000,00
26	MAURICIO JAIR ROJAS ORDOÑEZ	1.079.390.086	CTA COBRO 3	18/03/2024	$ 5.400.000,00	$ -	$ 5.400.000,00
27	CELESTINO CARVAJAL GARCIA	83.252.421	CTA COBRO 2	11/03/2024	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
28	CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ	12.241.630	FEVC-22	16/03/2024	$ 1.250.000,00	$ -	$ 1.250.000,00
29	COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S	901.100.054-5	3198	21/02/2024	$ 693.277,00	$ 131.723,00	$ 825.000,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

Acta ☑ **No.** 3

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$	40.551.311	**PAGOS ACUMULADOS**	$	138.067.662
VALOR IVA	$	226.343	**VALOR IVA ACUMULADO**	$	15.047.731
TOTAL PAGOS	$	40.777.654	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$	153.115.393

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Mariana Angarita Gonzalez
Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Presidente
Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos - Garzón

Firma:
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma:
Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No: 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: MARZO 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24		24	22	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		20	24	24	24	18	24		612
Lluvias moderadas	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	2	0		2
Lluvias intensas	0	0		0	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		4	0	0	0	4	0		10
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM

Firma
Nombre: Edgar Mauricio Argüello Maldonado
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 161037-0582894 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** HUILA

CONVENIO No.: 4126 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE POTRERILLOS DEL MUNICIPIO DE GARZON EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023 **INTERVENTOR:** SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES


No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	5/02/2024	Determinación de CBR	INV E-148	Potrerillos	2	< = 3%	7,85	SÍ	
2	14/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	K0+160	1	95%	81,49	NO	
2	14/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	K0+107	1	95%	89,45	NO	
2	14/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	K0+080	1	95%	88,54	NO	
2	14/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	K0+040	1	95%	95,49	SÍ	
3	26/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	K0+110	1	95%	95,64	SÍ	Corresponde al periodo después de la acción de mejora
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	26/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	K0+160	1	95%	95,30	SÍ	Corresponde al periodo después de la acción de mejora
	26/03/2024	Densidad (cono y arena)	INV E-161	K0+110	1	95%	95,70	SÍ	

OBSERVACIONES:

Dadas las dificultades de maquinaria amarilla en la región, se vieron afectadas las condiciones de compactación requeridas en el primer ensayo y se obtuvieron porcentajes por debajo de la norma; sin embargo, se realizó la acción de mejora al conseguir la maquinaria correspondiente para la compactación de la subbase granular y dar cumplimiento a la especificación técnica. Lo anterior, tomando nuevamente densidades dentro de las abscisas K0+080 al K0+160 por parte del contratista y la interventoría.


NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: Luis Fernando Calderón Gómez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 161037-0521136 TLM



Firma

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez Obando
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-093187 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Informe No 202403-37

Garzon, 14 de marzo de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS

Proyecto:

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE GARZON

ENTREGA DEL INFORME DE LABORATORIO No202403-37

Apreciado JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS

Anexo el presente se entrega el Informe No202403-37 con los resultados de los siguientes ensayos,

Nombre del Ensayo	Cant.
Densidades Metodo Cono de Arena	4
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------

Esta información no intenta suplir los conocimientos, técnicas y criterios profesionales responsables de la construcción de las obras.

Los resultados emitidos en este informe no deben ser utilizados en ningún tipo de campaña de información técnica o comercial.

SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. no se responsabiliza por el muestreo transporte y/o daños que se presenten en el transcurso del mismo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro laboratorio y estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de inquietud.

Cordial saludo,

Ing. DIANA LORENA MURCIA G.
Representante Legal

(a) El presente informe no puede reproducirse sin la aprobación por parte del laboratorio.

(b) Los resultados de los ensayos emitidos en este informe solo son aplicables a las muestras ensayadas.

(c) El Informe No202403-37 contiene 2 páginas incluida la carta de entrega de informes de ensayos.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS NO 202403-37

SELLO SECO
Valido Únicamente Con sello

Suelos y Concretos S.A.S	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO Y ARENA)	EL-004 V.01 Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE GARZON
SOLICITADO POR:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS
LOCALIZACIÒN:	Paicol - Huila
DESCRIPCIÒN DEL MATERIAL:	Sub-Base Masseq Acopio V. Rosario
NORMA ASOCIADA:	INVE 161 Y 143-2022
FECHA:	2024-03-14
EQUIPO UTILIZADO:	BALANZA DE 20 Kg, TAMICES Nº 16,Nº 30, PLACA BASE CONO Y ARENA,PORRA,CINCEL,BROCHA,PLATONES,PROBADOR DE CARBURO.

No. Ensayo	D-0001	D-0002	D-0003	D-0004						
Abscisa/Eje	PlacaHuella K0+160	PlacaHuella K0+107	PlacaHuella K0+080	PlacaHuella K0+040						
Profundidad/Altura - Del Ensayo en Cm.	12,00	12,00	12,00	12,00						
Material	Sub-Base	Sub-Base	Sub-Base	Sub-Base						
Peso frasco y arena Inicial, $W_{s\,(g)}$	6195	6073	6011	5938						
Peso frasco y arena restante, $W_{b\,(g)}$	2179	1830	1844	1868						
Peso arena total usado, $W_1 = W_s - W_{b\,(g)}$	***4016***	***4243***	***4167***	***4070***						
Constante del cono, $W_{7\,(g)}$	1884,4	1884,4	1884,4	1884,4						
Peso arena en el hueco, $W_s = W_1 - W_{7\,(g)}$	***2132***	***2359***	***2283***	***2186***						
Peso unitario aparente arena, $g_{1\,(g/cm3)}$	1,395	1,395	1,395	1,395						
Volumen del hueco, V (cm3)	***1527,6***	***1690,3***	***1635,8***	***1566,3***						
Peso material extraído húmedo,total$_{(g)}$	3071	3661	3512	3599						
Humedad particulas finas,MC_f (%)	***9,4%***	***7,6%***	***7,0%***	***7,2%***						
Peso material extraído humedo> 3/4" , (g)	***188***	***264***	***374***	***306***						
Peso material extraído humedo <3/4" $_{,\,(g)}$	2883	3397	3138	3293						
Humedad particulas gruesas, (%)	***2,2%***	***2,2%***	***2,2%***	***2,2%***						
Peso seco particulas Gruesas(g)	184	258	366	299						
Peso seco de particulas Finas (g)	2635	3157	2933	3072						
Porcentaje particulas gruesas %	***6,52***	***7,56***	***11,09***	***8,88***						
Porcentaje particulas finas %	***93,48***	***92,44***	***88,91***	***91,12***						
Peso unitario seco del material en campo, $_{(g/cm3)}$	1,846	2,021	2,017	2,152						
Peso unitario Seco Corregido del material, fino $_{(g/cm3)}$	1,812	1,989	1,969	2,124						
Peso unitario seco óptimo material, $g_{d\ óptimo\ (g/cm3)}$	2,224	2,224	2,224	2,224						
Contenido humedad optima %	***6,10***	***6,10***	***6,10***	***6,10***						
Gravedad Especifica Bulk Particulas Gruesas , K (g/cm3)	2,50	2,50	2,50	2,50						
Porcentaje Compactación (%)	***81,49***	***89,45***	***88,54***	***95,49***						

OBSERVACIONES: **PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.** **Elaboracion del proctor:** 15/02/2024

Este Informe Del Ensayo De Densidad En El Terreno (Cono Y Arena) Corresponde Al Estado Del Terreno En El Dia Y En La Cota Señalada, Húmedad Tomada Con Humedometro Speedy. Las Modificaciones Posteriores Sufridas Por El Terreno En La Cota Señalada, No Estan Dentro Del Alcance De Este Informe. Y de Existir Modificaciones Voluntarias o Involuntarias, Se Debera Realizar Nuevamente El Ensayo.

Valor Promedio del Lote: **0,89**
Desviacion Estandar **0,057**

Promedio Estimado del Lote Con Grado de Confiabilidad 90%
Factor K, con n= 3,00 **Probalidad 90%**

ELABORADO POR
Ing. JUAN CARLOS CABALLERO

REVISO
Ing DIANA L. MURCIA G.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS No 20240214

Calle 8 Sur N° 15 - 42 Barrio Los Samanes . e-mail sendsuelosyconcretos@gmail.com
Tel: 311 444 86 54 - 310 297 84 24 / Garzón – Huila

SEND Servicio de Ensayos No Destructivos
SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
901.680.866-6

SEND Suelos y Concretos S.A.S	**COMUNICACION DE ENTREGA DE INFORME DE ENSAYOS**	**VEL-000** **V.01**

Informe No 202403-50

Garzon, 26 de marzo de 2024

Señores

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS

Proyecto:

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE GARZON

ENTREGA DEL INFORME DE LABORATORIO No202403-50

Apreciado JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS

Anexo el presente se entrega el Informe No202403-50 con los resultados de los siguientes ensayos.

Nombre del Ensayo	Cant.
Densidades Metodo Cono de Arena	1
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------
----------	-------

Esta información no intenta suplir los conocimientos, técnicas y criterios profesionales responsables de la construcción de las obras.

Los resultados emitidos en este informe no deben ser utilizados en ningún tipo de campaña de información técnica o comercial.

SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. no se responsabiliza por el muestreo transporte y/o daños que se presenten en el transcurso del mismo.

Agradecemos la confianza depositada en nuestro laboratorio y estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de inquietud.

Cordial saludo,

Ing. DIANA LORENA MURCIA G.
Representante Legal

(a) El presente informe no puede reproducirse sin la aprobación por parte del laboratorio.

(b) Los resultados de los ensayos emitidos en este informe solo son aplicables a las muestras ensayadas.

(c) El Informe No202403-50 contiene 2 páginas incluida la carta de entrega de informes de ensayos.

Informe SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS NO 202403-50

SELLO SECO

Valido Únicamente Con sello

Suelos y Concretos S.A.S	ENSAYO DE DENSIDAD EN EL TERRENO (CONO Y ARENA)	EL-004 V.01 Pag. 1 de 1

PROYECTO:	CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA DE POTRERILLOS MUNICIPIO DE GARZON				
SOLICITADO POR:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE POTRERILLOS				
LOCALIZACIÒN:	Paicol - Huila				
DESCRIPCIÒN DEL MATERIAL:	Sub-Base Masseq Acopio V. Rosario				
NORMA ASOCIADA:	INV E- 161 Y 143-2022		FECHA:	2024-03-26	
EQUIPO UTILIZADO:	BALANZA DE 20 Kg, TAMICES Nº 16,Nº 30, PLACA BASE CONO Y ARENA,PORRA,CINCEL,BROCHA,PLATONES,PROBADOR DE CARBURO.				

No. Ensayo	D-0005
Abscisa/Eje	PlacaHuella K 0+110
Profundidad/Altura - Del Ensayo en Cm:	12,00
Material	Sub-Base
Peso frasco y arena Inicial, $W_{s\,(g)}$	6697
Peso frasco y arena restante, $W_{b\,(g)}$	2444
Peso arena total usado, $W_1 = W_s - W_{b\,(g)}$	***4253***
Constante del cono, $W_{7\,(g)}$	1877,6
Peso arena en el hueco, $W_s = W_1 - W_{7\,(g)}$	***2375***
Peso unitario aparente arena, $g_{1\,(g/cm3)}$	1,394
Volumen del hueco, V (cm3)	***1703,8***
Peso material extraído húmedo,total$_{(g)}$	3888
Humedad particulas finas,MC_f (%)	***6,8%***
Peso material extraído humedo> 3/4" , (g)	***159***
Peso material extraído humedo <3/4" , (g)	3729
Humedad particulas gruesas, (%)	***2,2%***
Peso seco particulas Gruesas(g)	156
Peso seco de particulas Finas (g)	3492
Porcentaje particulas gruesas %	***4,27***
Porcentaje particulas finas %	***95,73***
Peso unitario seco del material en campo, (g/cm3)	2,141
Peso unitario Seco Corregido del material, fino (g/cm3)	2,127
Peso unitario seco óptimo material, $g_{d\ óptimo\ (g/cm3)}$	2,224
Contenido humedad optima %	***6,10***
Gravedad Especifica Bulk Particulas Gruesas , K (g/cm3)	2,50
Porcentaje Compactación (%)	***95,64***

OBSERVACIONES: **PROCTOR SUMINISTRADO POR EL CLIENTE.** **Elaboracion del proctor:** 15/02/2024

Este Informe Del Ensayo De Densidad En El Terreno (Cono Y Arena) Corresponde Al Estado Del Terreno En El Dia Y En La Cota Señalada. Húmedad Tomada Con Humedometro Speedy. Las Modificaciones Posteriores Sufridas Por El Terreno En La Cota Señalada, No Estan Dentro Del Alcance De Este Informe. Y de Existir Modificaciones Voluntarias o Involuntarias, Se Debera Realizar Nuevamente El Ensayo.

Valor Promedio del Lote: 0,96
Desviacion Estandar #iDIV/0!

Promedio Estimado del Lote Con Grado de Confiabilidad 90%
Factor K, con n= 3,00 y Probalidad 90%

ELABORADO POR
Ing. JUAN CARLOS CABALLERO

REVISO
Ing DIANA L. MURCIA G.

INFORME SEND SUELOS Y CONCRETOS SAS NO 20240313-50

Calle 8 Sur Nº 15 - 42 Barrio Los Samanes . e-mail sendsuelosyconcretos@gmail.com
Tel: 311 444 86 54 - 310 297 84 24 / Garzón – Huila

SEND Servicio de Ensayos No Destructivos
SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
901.680.866-6

SUB -BASE - DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO DE ARENA

NORMA INV E-161 - 143 /2013

PROYECTO:	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".						
LABORATORIO:	LABORATORIO DE SUELOS A.S						
TIPO DE MATERIAL:	**SUB-BASE**	**CAPA Nº.**	**UNA**		**ESPESOR:**		**12 cm.**
FECHA:	**26-mar-24**	**ABSCISA:**	**VEREDA POTRERILLOS**	**CANTERA: MASSEQ. Acopio V. Rosario**	**CANTIDAD:**		
CONTRATO:	**INTERVENTORIA**						

ITEM	**ENSAYO Nº**	1	2	3	4	5	6	7	8
	ABSCISA	**K 0+110**	**Placa Huella**						
	COSTADO	**EJE**	**EJE**						
	PROFUNDIDAD (cm)	**12**	**12**						
1	**PESO FRASCO Y ARENA INICIAL (g)**	7020	6990						
2	**PESO FRASCO Y ARENA RESTANTE (g)**	2917	3072						
3	**PESO ARENA TOTAL USADA (g) (1-2)**	4103	3918						
4	**CONSTANTE DEL CONO**	1597	1597						
5	**PESO ARENA EN EL HUECO (g) (3-4)**	2506	2321						
6	**DENSIDAD DE LA ARENA (g/cm3)**	1,39	1,39						
7	**VOLUMEN DEL HUECO (cm3) (5/6)**	1803	1670						
8	**PESO SOBRETAMAÑOS EXTRAIDO SECO (g)**	253	311						
9	**PESO MATERIAL EXTRAIDO HUMEDO (g)**	3842	3498						
10	**HUMEDAD (%)**	6,6	6,4						
11	**PESO MATERIAL EXTRAIDO SECO (g)**	3604,1	3287,6						
12	**PESO TOTAL MATERIAL EXTRAIDO SECO (g)**	3857,1	3598,6						
13	**% DE MATERIAL GRUESO**	6,6	8,6						
14	**% DE MATERIAL FINO**	93,4	91,4						
15	**DENSIDAD DEL MATERIAL (g/cm3) (10/7)**	2,139	2,155						
16	**DENSIDAD MAXIMA LAB. (g/cm3)**	2,224	2,224						
17	**HUMEDAD OPTIMA LABORATORIO (%)**	7,2	7,2						
18	**DENSIDAD SOBRETAMAÑOS (Gm)**	2,6	2,6						
19	**DENSIDAD CORREGIDA (g/cm3)** (100*16*18)/(16*13+18*14)	2,245	2,252						
20	**COMPACTACION EN EL TERRENO (%) (15/19)**	95,3	95,7						
21	**COMPACTACION ESPECIFICADA DI (%)**	95	95						

Observaciones:	Material en buen estado de compactación.	**Elaboró** **AMILCAR SANCHEZ PEÑA** Cargo: Laboratorista

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 11	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 08/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resumen de avance de obra y administración.
3- Cotizaciones.
4- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorero, también, la contadora y el residente.
2.	**Resumen de avance de obra y administración:** Se presentaron los avances del residente de obra y la contadora a la fecha: • Residente de obra: Se realizó el avance en obra en la compactación de la subbase granular instalada, excavación de las secciones de viga riostras y el armado del acero de estas. En cuanto a la alcantarilla, se perfiló la excavación de la poceta y descole, así como el figurado y armado del acero. • Contadora: Se revisaron las cuentas con el fin de soportar los gastos de representación y caja menor. También, se solicitó al banco el extracto bancario correspondiente al mes de febrero 2024 para realizar la conciliación bancaria y así poder determinar impuestos para presentar en este periodo. Por otra parte, se realizó la liquidación y pago de la seguridad social de febrero. Además, se realizó transferencia de recursos No. 5, la cual fue radicada el sábado 01 de marzo de 2024. Saldo a la fecha 29/02/2024: $ 84.449.584,54.
3.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. • **Maquinaria**: Vibro compactador. NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ. Alquiler de 2 días de un benitin mono cilindro moto Diesel. Por valor de $ 480.000,00 /día. Combustible por valor de $ 200.000,00. Transporte por valor de $ 100.000,00 /trayecto. Se presenta la cotización del alquiler del benitin, teniendo en cuenta que las máquinas aprobadas anteriormente no dieron cumplimiento con el servicio pactado. Aunado con la dificultad de conseguir la maquinaria en la zona. • **Laboratorio:** Ensayos de control de calidad: cilindros a compresión, densidad SBG y transporte para toma de densidades. SEND. Por valor unitario de $ 264.855,00. MASSEQ. Por valor unitario de $ 1.092.800.
4.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realiza en el comité la autorización de las transferencias de recursos: • Vibro compactador: NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ. Por valor de $ 1.360.000,00. • Laboratorio: SEND. Para 3 muestras total 12 cilindros, 4 densidades y transporte por valor de $ 578.420,00.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

Motoniveladora: JESUS MARIA FERNANDEZ SIERRO. Tiempo de 17h por valor de $ 3.400.000,00.
Materiales de construcción: COMERCIALIZADORA SURANDINA SAS. Saldo 10% por valor de $ 5.916.107,32.
Agregados: MASSEQ. Saldo 10% por valor de $ 3.036.761,00.
Mano de obra: Ayudantes dos (2) por 16 días correspondientes a la segunda quincena del mes de febrero por valor de $ 1.448.600,00. La cual no fue tramitada en la transferencia No. 4 por invalidez de cuenta.
Deducción seguridad social: MARIANA ANGARITA GONZALEZ. Oficial uno (1) y Ayudantes cuatro (4) por la planilla correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero por valor $ 290.150,00.
ARL Riesgo V – Residente y Maestro: MARIANA ANGARITA GONZALEZ. Por valor de $ 212.000,00.
Cuenta de cobro No. 2 – Residente: Por valor de $ 3.500.000,00.
Cuenta de cobro No. 2 – Contadora: Por valor de $ 1.400.000,00.
Gastos de representación: MARIANA ANGARITA GONZALEZ. Por valor de $ 400.000,00.
Caja menor: MARIANA ANGARITA GONZALEZ. Por valor de $ 300.000,00.

<table>
<tr><td>Vibro compactador</td><td>$</td><td>1.360.000,00</td></tr>
<tr><td>Laboratorio</td><td>$</td><td>578.420,00</td></tr>
<tr><td>Motoniveladora</td><td>$</td><td>3.400.000,00</td></tr>
<tr><td>Materiales de construcción</td><td>$</td><td>5.916.107,32</td></tr>
<tr><td>Agregados</td><td>$</td><td>3.036.761,00</td></tr>
<tr><td>Mano de obra</td><td>$</td><td>1.448.600,00</td></tr>
<tr><td>Deducción seguridad social</td><td>$</td><td>290.150,00</td></tr>
<tr><td>ARL Riesgo V – Residente y Maestro</td><td>$</td><td>212.000,00</td></tr>
<tr><td>Cuenta de cobro No. 2 – Residente</td><td>$</td><td>3.500.000,00</td></tr>
<tr><td>Cuenta de cobro No. 2 – Contadora</td><td>$</td><td>1.400.000,00</td></tr>
<tr><td>Gastos de representación</td><td>$</td><td>400.000,00</td></tr>
<tr><td>Caja menor</td><td>$</td><td>300.000,00</td></tr>
<tr><td></td><td>$</td><td>21.842.038,32</td></tr>
</table>
Así mismo, el traslado de los rendimientos financieros del mes de febrero de 2024:

Febrero de 2024. Por valor de $ 988,44.

</td>
</tr>
</table>

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.

3.	**Aprobación:** Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio: • Vibro compactador: NINI ALEJANDRA FAJARDO RODRÍGUEZ. • Laboratorio de suelos: SEND.
4.	**Aprobación:** Transferencias de recursos. • Se aprueba la transferencia de recursos No. 6 por un valor total de $ 21.842.038,32.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Toma de densidades de la subbase granular.	Residente	11/03/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra

Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 12	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 15/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Resumen de avance de obra y administración.
3- Cotizaciones.
4- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorero, también, la contadora y el residente.
2.	**Resumen de avance de obra y administración:** Se presentaron los avances del residente de obra y la contadora a la fecha: • Residente de obra: Se presenta el avance en la fundición de la alcantarilla y el armado del acero de refuerzo de las huellas de la estructura, así como la instalación de formaleta para fundición de huellas y bermas, de acuerdo con el diseño de placa huella. Así mismo, se requiere subir el material faltante comprado en MASSEQ para lo cual se debe pagar el saldo del transporte. También, debido a que se iniciarán a fundir las primeras placas de concreto se debe comprar el antisol para realizar el curado en la superficie del mismo. • Contadora: Se realizó seguimiento a las cuentas pendientes por pagar y los soportes de los gastos de representación y caja menor a la fecha. También, se realizó la transferencia de recursos No. 6, la cual fue radicada el sábado 12 de marzo de 2024.
3.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. • **Maquinaria**: Vibro compactador. CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ. Alquiler de 6 horas de un vibro compactador por valor de $ 150.000,00 /hora. Transporte por valor de $ 350.000,00. Se presenta la cotización del alquiler del vibro compactador, teniendo en cuenta que las máquinas aprobadas anteriormente no dieron cumplimiento con el servicio pactado. Aunado con la dificultad de conseguir la maquinaria en la zona.
4.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realizan las autorizaciones de transferencia de los proveedores aprobados en este comité y el anterior: • Retención ICA: MARIANA ANGARITA GONZALEZ. Por valor de $ 27.000,00. • Retención en la fuente febrero: MARIANA ANGARITA GONZALEZ. Por valor de $ 2.197.000,00. • Vibro compactador: CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ. Por valor de $ 1.250.000,00. • Nómina No. 1 pendiente: MILTON DANIEL SAENZ CARRILLO. Devuelva en las transferencias No 5 y No. 6. Por valor de $ 724.300,00. • Nómina No. 2 de personal operativo correspondiente al periodo 01 al 15 de marzo de 2024. Por valor de $ 3.533.000,00. • Transporte de agregados: MAURICIO JAIR ROJAS ORDIÑEZ. Por el saldo de los 40 viajes de agregados pactados inicialmente. Por valor de $ 5.400.000,00.

	• Maestro de obra: CELESTINO CARVAJAL GARCÍA. Por valor de $ 2.000.000,00. • Antisol: COMERCIALIZADORA SURANDINA S.A.S. Por 3 unidades de 20 kg. Por valor de $ 825.000,00.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	**Aprobación:** Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio: • Vibro compactador: CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ.
4.	**Aprobación:** Transferencias de recursos No. 7. • Se aprueba la transferencia de recursos por un valor total de $ 15.956.300,00.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
Realizar compactación de la subbase granular.	Residente	18/03/2024

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación

FIRMAS DE ASISTENTES:

Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor

Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos

Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor

Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos

Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra

Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 13	Dirección Territorial INVIAS: Huila	Fecha: 21/03/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Potrerillos – Garzón – Huila
No. Convenio(s) Solidario(s): 4126 de 2023
Ejecutor(es): Junta de Acción Comunal de la Vereda de Potrerillos

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
Mariana Angarita González	Junta de Acción Comunal	Presidente
Libardo Álvarez	Junta de Acción Comunal	Tesorero
Yuri Andrea Parra	Junta de Acción Comunal	Contadora
Luis Fernando Calderón	Junta de Acción Comunal	Residente
Silvia Lorena Ordoñez	Interventoría	Director
Mauricio Argüello	Interventoría	Residente
Wilder Orley Salazar	INVIAS	Supervisor

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

Seguimiento y control al avance del convenio.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Presentación de los integrantes del Comité Operativo.
2- Cotizaciones.
3- Autorización de transferencia de recursos.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	**Presentación de los integrantes:** En este comité operativo asistieron por parte de la interventoría, la directora y el residente, el supervisor del convenio por parte del INVIAS, los dos (2) miembros principales de la JAC, presidente y tesorero, también, la contadora y el residente.
2.	**Cotizaciones:** Se presentan las siguientes cotizaciones. • **Maquinaria**: Vibro compactador. HERNÁN JARAMILLO. Alquiler de 2 días de un vibro compactador mono cilíndrico por valor de $ 130.000,00 /día. Transporte por valor de $ 70.000,00/trayecto. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proveedor CARLOS EDUARDO RIVERA VITOVIZ no prestó el servicio de alquiler de vibro compactador que le fue transferido en la transferencia No. 7 con fecha de radicación el 18/03/2024 por un valor de $ 1.237.500,00; el señor Carlos Rivera realizó la respectiva devolución del recurso en efectivo a la junta de acción comunal de Potrerillos. Por lo anterior y dados los antecedentes de dificultad para conseguir la maquinaria/equipo en la región, se autoriza el alquiler del vibro compactador mono cilíndrico presentado.
3.	**Autorización de transferencia de recursos:** Se realiza en el comité la autorización del pago con cuenta de cobro del alquiler del vibro compactador por valor de $ 400.000,00 a HERNÁN JARAMILLO, por dos días incluido el transporte; además, se autoriza la compra de gasolina para operación del vibro compactador por un valor de $ 16.000,00; los anteriores valores se pagan por parte de la junta a los proveedores y se soporta mediante recibos. **Nota:** Del recurso de $ 1.237.500,00 manejados por la junta de la devolución del alquiler del vibro, se autoriza invertir $ 416.000,00 y queda un saldo de $ 821.500,00 el cual será manejado de manera coordinada y autorizada para su inversión mediante comités operativos.

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	**Aprobación:** Se realizó la aprobación de los proveedores y prestadores de servicio: • Vibro compactador: HERNÁN JARAMILLO.
4.	**Aprobación:** Se autoriza el pago de dicha maquinaria y compra de gasolina, con el recurso administrado por la junta, por valor de $ 416.000,00.

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI ___ NO _X_ No. Folios: _____
2.	Informe Ejecución Financiera: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO _X_ No. Folios: _____


COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución


PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: Wilder Orley Salazar
Cargo: Supervisor




Nombre: Mariana Angarita Gonzalez
Cargo: Presidenta OAC Potrerillos




Nombre: Silvia Lorena Ordoñez
Cargo: Interventor



Nombre: Libardo Alvarez
Cargo: Tesorero OAC Potrerillos



Nombre: Luis Fernando Calderón
Cargo: Residente de obra



Nombre: Yuri Andrea Parra
Cargo: Contadora - Potrerillos

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>

Miercoles 28 de febrero

Inicia el dia con una fuerte lluvia el cual imposibilito la regada de subbase, por lo cual al llegar las volquetas estas descargaron en la parte inferior, para en la tarde ser regado por la motoniveladora.

Clima: mañana lluvia, tarde, soleado.

odometro inicio: stand by 4 horas
odometro final: stand by 45 minutos,

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Jueves 29 de febrero

Se riega la subbase en toda la via faltando 3 viajes de subbase para continuar con el proceso de compactac

odometro inicial: 37 13.8
odometro final: 37 21.31

Clima: Soleado

Ing. Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Viernes 01 de febrero

Se riegan los 3 viajes faltantes de subbase y se procede a regar el mismo con la motoniveladora, con

Powered by CamScanner

ayuda de los trabajadores se recoge el material sobrante para regarlo en la vía.

Odometro inicial: 37121.81
Odometro final: 37281.23

Clima: soleado




Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

Sabado 02 de marzo

-llega el benitin y se inician labores de compactacion hasta las 12:00 P.m. no se continuo debido a que presento fallas.

Clima: Nublado.




Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

Lunes 04 de marzo

- se inicia con la adecuacion de la alcantarilla de salida para la armada de acero y posterior fundida.

Acero 1/2" longitudinal cada 0.20mts
Acero 3/8" transversal cada 0.20 mts

Clima: Soleado.



Ing. Luis fernando calderon G.

martes 05 de marzo

se funden los lizos de las alcantarillas y se arman las casetones para la fundida de los m.smos, en la tarde llovio imposibilitando el trabajo.

clima mañana: nublado
clima tarde: lluvia.

ing. luis fernando calderon G.
Residente de obra

miercoles 06 de marzo

se funden los muros de las alcantarillas en toda la mañana y se continua con la compactacion, mientras se recibe visita de la inspectoria en la tarde la cual dio indicaciones y puntos de vista de la obra, igual, se inicia replanteo de la obra para la excavacion y postura de las riostras cada 3 metros.

clima: nublado

ing. luis fernando calderon G.
Residente de obra

jueves 07 de marzo

se realiza excavacion cada 3 metros para las riostras y excavacion en los bordillos para el acero del m.smo. confome a los diseños entregadas al maestro.
clima: nublado.

Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

Viernes 08 de marzo

se realiza excavacion para puesta de acero de bordillos para posteriormente iniciar con el emparillado de acero se instalaron 6 Riostras y 18 metros de bordillo.

Clima: nublado

Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

Sabado 09 de marzo

se inicia el armado de las parrillas de la alcantarilla de entrada para su posterior fundida de igual manera se adelanta emparillado en dos cuadros de la placa huella.

clima: Parcialmente nublado

Ing. Luis fernando calderon G.
Residente de obra

lunes 11 de marzo

se continua con labores de armado de acero para 11 cuadros de la placa huella. Por otro lado se hacen labores de excavacion para bordillos.

Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Martes 12 de marzo

Se inicia con el vaciado de la alcantari.
Posteriormente llega material a la obra
la cual se descarga en la bodega
de la obra, se completa el vaciado
del cabezote de entrada de la alcant
villa, para iniciar con el vaciado de
la placa huella.

Clima: Parcialmente nublado

Luis Fernando Calderon G.
Residente de obra

Miercoles 13 de marzo

Se termina de realizar empañetado de
varilla de 3/8" a un 11 cuadros de placa
huella. Para iniciar con el vaciado de
las mismas.

Clima: Soleado

Luis. Fernando Calderon G.
Residente de obra

Jueves 14 de marzo

Se tomaron densidades sobre la via con el
fin de obtener resultados para la compactacion

del mismo, se inician preparativos para iniciar con la fundición de las placas de la placa huella.

Clima: nublado

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra

Viernes 15 de marzo

Se inicia el vaciado de las placas de aproximadamente 83 metros lineales y se toman cilindros para las muestras de la mezcla que se realizo para la fundida de seis placas.

Clima: Parcialmente nublado

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra

Sabado 16 de marzo

Se continua con el vaciado de la placa en donde se vacean las 5 placas restantes de las 11 iniciales para finalizar la primera seccion de vaciada dejando pendiente bordillos y ciclopeo.

-Clima parcialmente nublado

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Lunes 18 de marzo.

Se inicia con el figurado de acero de la segunda fase de vaciado y se da inicio al replanteo y excavación para las nuevas.
- Clima soleado.

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Martes 19 de marzo.

Se inicia con el armado del emparrillado y se realiza vaciado de la poceta de la alcantarilla.
- Clima: Soleado

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Miercoles 20 de marzo

Se reciben dos volquetes de arena y veinte tablas más, posteriormente se realiza el encofrado de las placas para iniciar con el vaciado de concreto.
Clima: Soleado

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Jueves 21 de marzo

Se recibe una volqueteada de piedra y se inicia con labores de vaciado de cunetas y placas de tres placas. - Clima: Soleado.

Luis Fernando Calderon G
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Viernes 22 de marzo.

Se inician labores de compactación con bentín para cumplir con las densidades.
Clima: Soleado

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Sábado 23 de marzo

Se inician con labores de armado y figurado de acero de siete planos más.
Clima: parcialmente nublado

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Lunes 25 de marzo

No se adelantaron obras en la mañana debido a que se presentaron fuertes lluvias, en la tarde se realizaron labores de encofrado para el posterior vaciado del cuneta
Clima: lluvioso - nublado.

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Martes 26 de marzo

Se inician labores de vaciado en los tres primeros cuadros junto a cunetas como en planos.
Clima: nublado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra

Miercoles 27 de marzo.

Se inicia con labores de vaciado de concreto y se realiza toma de muestras de cilindros para muestreo de fallo, en la tarde se recibe material de arena y triturado.
Clima: nublado

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Jueves 28 de marzo

No se realizaron labores por ser jueves santo.
Clima: nublado.
Luis Fernando Calderón G.
Residente de Obra.

Viernes 29 de marzo.

No de realizaron labores por ser viernes santo.
- Clima: lluvioso.

Luis fernando Calderón G.
Residente de obra.

Sábado 30 de marzo

Se inicia con labores de vaciado de seis placas
Clima: nublado.

Luis fernando Calderon
Residente de obra.

Lunes 1 de abril.

Se realiza vaciado de tres plumas. y se inicia configurado de acero de las placas restantes.
Clima: soleado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Martes 2 de abril.

Se inicia con excavaciones y replanteo de riostras y posteriormente figurado de acero y las parrillas de las mismas.
Clima: Nublado

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Miercoles 3 de abril.

Se termina con el replanteo de todas las riostras y se inicia con el encofrado para posteriormente empezar a vaciarlas.
Clima: Soleado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra

Jueves 4 de abril.

Se inicia con el vaciado de cinco plumas- Clima: nublado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Viernes 5 de abril.

Se realiza armado y figurado de acero de tres bloques más.
Clima: nublado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra

Sábado 6 de abril.

Se realiza el vaciado de ocho placas con cunetas y pluma.
Clima: nublado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Lunes 8 de abril.

Se realiza el vaciado de la cuneta faltante.
Clima: nublado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Martes 9 de abril.

Se continúa con el vaciado de las cunetas faltantes.
Clima: Soleado.

Luis Fernando Calderón G.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

Miercoles 10 de abril.

Se realiza acarreo de las piedras del concreto ciclopeo para los cajones y se formaletean los bordillos.
Clima: parcialmente nublado.

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Jueves 11 de abril.

Se inicia con el vaciado del concreto ciclopeo y los bordillos en 40 metros.
Clima: parcialmente nublado.

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Viernes 12 de abril.

Se continúa con el vaciado de los bordillos y el vaciado del concreto ciclopeo.
Clima: nublado

Luis Fernando Calderón G
Residente de obra.

Sábado 13 de abril.

Se finaliza con la construcción de la placa huella con 43 placas fundidas y aproximadamente 140 mts lineales de placa huella.
Clima = parcialmente nublado.

Luis Fernando Calderón Gomez.
Residente de obra.

Powered by CamScanner

INTERVENTORÍA

- Equipo y vehículos
- Personal, control de aportes legales y seguridad social
- Informe financiero y presupuestal

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/03/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023

INTERVENTORÍA: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

CONTRATO DE OBRA No.: 3802 DE 2023; 4176 DE 2023; 4126 DE 2023; 4777 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - LA CABAÑA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - SAN LUIS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - POTRERILLOS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - EL MESON

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PC PORTATIL	ACER NITRO 5	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC PORTATIL	HP	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PC DE ESCRITORIO	LENOVO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
IMPRESORA	EPSON L3250	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
DOTACION DE OFICINA	ESCRITORIOS 4 SILLAS 5 BIBLIOTECA 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	HONDA CB 160F DLX	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTO	SUZUKI GIXXER FI ABS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matricula Profesional No: Matrícula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 31 3 2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO DE OBRA No.: 3802 DE 2023; 4176 DE 2023; 4126 DE 2023; 4777 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - LA CABAÑA; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - SAN LUIS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - POTRERILLOS; JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GARZON - EL MESON

NOMBRE ARL: ARL POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR HUILA

VERIFICACION PERSONAL, DOCUMENTACION APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	55.181.920	Directora de interventoria	$ 2.900.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%	SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO	$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	7922055674	$ 162.500	COLPENSIONES	7922055674	$ 208.000	$ -	$ -	$ -	
2	EDGAR MAURICIO ARGUELLO MALDONADO	1.075.297.121	Ingeniero Residente	$ 2.600.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 2.600.000	$ 181.000	V	NUEVA EPS	7924368696	$ 104.000	COLFONDOS	7920418958	$ 416.000	$ 104.000	$ -	$ -	
3	MARTHA BARRAGAN	36.089.057	Inspector	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100%		$ 1.300.000	$ 6.800	I	SANITAS	7924368696	$ 52.000	COLPENSIONES	7920418958	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 6.800.000																																												

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No: Matrícula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 3 2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: HUILA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4597 DE 2023

INTERVENTOR: SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO

MES INFORME MENSUAL: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO 2024

PROYECTO: "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE GARZÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CONTRATO DE OBRA No:	CONTRATISTA:
3802 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - LA CABAÑA
4176 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - SAN LUIS
4126 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - POTRERILLOS
4777 DE 2023	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA - EL MESON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1294023	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	82.643.855,00	$ 82.643.855,00
					TOTAL	$ 82.643.855,00	$ 82.643.855,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 82.643.855,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	DICIEMBRE	0,00		0,00					0,00	0,00		
2	ENERO	$ 16.880.000,00		$ 16.880.000,00				1294023 DEL 2023	$ 65.763.855,00	$ 65.763.855,00		
3	FEBRERO	$ 18.406.000,00		$ 18.406.000,00				1294023 DEL 2023	$ 47.357.855,00	$ 47.357.855,00		
4	MARZO	$ 15.943.000,00		$ 15.943.000,00				1294023 DEL 2023	$ 31.414.855,00	$ 31.414.855,00		
TOTALES		**$ 51.229.000,00**	**$ 0,00**	**$ 51.229.000,00**					**$ 31.414.855,00**	**$ 31.414.855,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*Ejecutado Año 2024	$ 51.229.000	$ -	$ 51.229.000,00
VALOR TOTAL	**$ 51.229.000,00**	**$ 0,00**	**$ 51.229.000,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
SILVIA LORENA ORDOÑEZ OBANDO
Representante Legal
NIT. 55.181.920

Firma
WILDER ORLEY SALAZAR CUELLAR
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No. Matrícula profesional No.: 25202-087784 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.
