INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º **1617-2023** MINISTERIO – MUNICIPIO DE **VILLA RICA - CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **JULIO 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 2ª, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	CALLE 18 – CARRERA 4A – ESQUINA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$2.909.216.663
	APORTES MIN – FONSECON		$2.909.216.663
	APORTES MUNICIPIO		$70.811.762
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.980.028.425
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	ÓSCAR ALBERTO BELALCÁZAR COLONIA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	DIEGO LUIS CHARÁ NORIEGA	27/06/2023	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.660-47-994000024641	28 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	29 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN: El Municipio aporta recursos por un valor de $ 70.811.762 M/L. • El valor total del Convenio $2.980.028.425 M/L		FECHA: 28/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**PÓLIZA INICIAL**: (No. No. 660-47- 994000024641)	FECHA: 28/06/2025
	VIGENCIA DEL AMPARO: 29/05/2025	
	PÓLIZA 1RA PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2024
	VIGENCIA DEL AMPARO: 28/08/2025	
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$2.537.549.163	
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$290.922.000	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 70.811.762	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Suscripción del acta de inicio 2. Aprobación de póliza	NO APLICA	18/07/2023	$1.309.147.498
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor	30%		$533.356.388
TERCER DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Evidencia de del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	70%		$533.356.388
ULTIMO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance	100%		$533.356.289

	3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Entrega de la certificación RETIE y7o RETILAP 5. Entrega al ministerio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON (anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.309.147.498
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	581.843.333	28/06/2023	29/05/2025

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ANEXO: 1

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	596.005.685,00	28/06/2023	28/08/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
N° 486-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA	$2.537.549.163,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	5/07/2024	$ 70.811.762,06
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE	
Fecha de Acta de inicio del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

Prorroga, suspensión y reinicio	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	14/02/2024	CAMBIO DE RERPRESENTANTE LEGAL
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2	5/03/2024	ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	UN (01) MES
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	04/06/2024	UN (01) MES
	ACTA DE REINICIO No 1	4/07/2024	N/A
	CONTRATO MODIFICATORIO No 3	5/07/2024	ADICION EN RECURSO ($ 70.811.762,06)
Fecha de terminación del Contrato	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.608.360.925,06
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A

CONTRATO DERIVADO	MODIFICACIONES	FECHA FIRMA	No POLIZA	FECHA EXP.	POLIZAS
CO-486 DE 2023 - ESTUDIO, DISEÑO Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**			
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	11-44-101212980	30/11/2023	CUMPLIMIENTO - ANEXO 0
			11-40-101057648	30/11/2023	RESPONSABILIDAD - ANEXO 0
			11-44-101212980	26/02/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 2
			11-40-101057648	26/02/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 2
	CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (CAMBIO RL)	14/02/2024			SIN POLIZA
					SIN POLIZA
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2 (OBJETO)	5/03/2024	11-44-101212980	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
			11-40-101057648	7/03/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 3
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	11-40-101057648	10/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 4
			11-44-101212980	14/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5
			11-40-101057648	15/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 5
			11-44-101212980	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	4/06/2024	11-40-101057648	12/06/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 6
			11-44-101212980	13/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 8
	ACTA DE REINICIO No 1	4/07/2024	11-40-101057648	4/07/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 7
			11-44-101212980	4/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 9

	CONTRATO MODIFICATORIO No 3 (ADICION)	5/07/2024	11-44-101212980	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 10

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° 485-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		$290.922.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	03/05/2024	ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
	SUSPENSION	03/05/2024	UN (01) MES
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	04/06/2024	UN (01) MES
	REINICIO No 1	04/07/2024	N/A
Fecha de terminación del Contrato	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$290.922.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		

CO-485 DE 2023 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**			
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	430-47-994000063904	28/11/2023	CUMPLIMIENTO - ANEXO 0
			430-47-994000063904	8/02/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 1
	CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (OBJETO)	6/03/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 2
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
			430-47-994000063904	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 4

	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	4/06/2024	430-47-994000063904	12/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5
	REINICIO No 1	4/07/2024	430-47-994000063904	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: **SI** **NO**

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**JUNIO**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		**X**
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**X**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (11.04 %)**
INFORME	**13**
ESTADO	**EN EJECUCION**
RECURSOS GIRADOS	**$1.309.147.498**
PENDIENTE POR GIRAR	**$2.909.216.663**
AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑO	**10 %**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**20.43 %**
% EJECUTADO DE OBRA	**1.04 %**

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0,89%	12,15%	-11,26%
Durante el periodo	0,16%	8,28%	-8,12%
Acumulado Actual	1,04%	20,43%	-19,39%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,28%	20,43%
Valor de la Obra Programada	$ 199.441.970,05	$ 492.101.382,63

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,156%	1,04%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 3.760.356,89	$ 25.157.537,52

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS CONVENIO 1617-2023

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la secretaria de hacienda	**JULIO/2024**
TOTAL, DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 1.309.147.498,00**
TOTAL, PAGOS REALIZADOS	**$ 169.696.525,94**
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$ 6.338.484,65**
TOTAL, DE DEVOLUCIONES RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 6.338.484,65**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO	**1.145.789.456,71**

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actuaciones:

La secretaria de infraestructura se permite dar respuestas a las siguientes solicitudes realizadas por la supervisión del convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023 de acuerdo con lo consagrado en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

- De acuerdo con la solicitud del supervisor del convenio interadministrativo 1617 de 2023 se envía el día 2 de julio de 2024, vía correo electrónico certificado de d9isponibilidad de servicios Acueducto, alcantarillado y energía del proyecto.

- El día 04 de julio de 2024 la secretaria de infraestructura se permite dar respuesta al correo enviado por el MINISTARIO DEL INTERIOR el día 03 de julio 2024 en el cual solicitan ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA DEL CONVENIO No. 1617 de 2023.

- El día 04 de julio de 2024 la secretaria de infraestructura se permite dar respuesta al correo enviado por el MINISTARIO DEL INTERIOR el día 27 de junio 2024 en el cual solicitan INFORMACION SOBRE LOS MODIFICATORIOS Y/O ACTUACIONES DE LOS CONTRATOS DERIVASOS DEL CONVENIO No. 1617 de 2023.

- Se lleva a cabo el día 04 de julio 2024 comité técnico de seguimiento y control de ejecución de las actividades contractuales en coordinación con el MINISTERIO DEL INTERIOR, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO, en aras de informar el avance de las actividades obrade acuerdo al cronograma en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

- La secretaria de infraestructura envía el día 8 de julio 2024 por vía correo electrónico, notificación de presunto incumplimiento de los contratos derivados del convenio 1617 de 2023.

- Se lleva a cabo el día 08 de julio 2024 comité técnico de seguimiento y control de ejecución de las actividades contractuales en coordinación con el MINISTERIO DEL INTERIOR, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO de acuerdo al no cumplimiento al cronograma aprobado por la interventoría y la supervisión del municipio.

- Se lleva a cabo el día 09 de julio 2024 comité técnico de seguimiento y control de ejecución de las actividades contractuales en coordinación con el MINISTERIO DEL INTERIOR, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO con el fin de realizar la REVISIÓN INFORME SEMANAL No 1 obligación del contratista de interventoría del - CONVENIO 1617 DE 2023

- El día 11 de julio de 2024 la secretaria de infraestructura se permite dar respuesta al corro enviado por el MINISTARIO DEL INTERIOR el día 10 de julio 2024 en el cual solicitan SUBSANACIONES A LAS OBSERVACIONES DADAS EN EL COMITÉ VIRTUAL NO.9 QUE SE ADELANTÓ EL 9 DE JULIO DE 2024.

- El día 11 de julio de 2024 la secretaria de infraestructura se permite dar respuesta al corro enviado por el MINISTARIO DEL INTERIOR el día 11 de julio 2024 en el cual solicitan SOLICITUD DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO A CORTE DEL INICIO DE OBRA - CONVENIO 1617 DE 2023

- Se lleva a cabo el día 15 y 16 de julio 2024 comité técnico de seguimiento y control de ejecución de las actividades contractuales en coordinación con el MINISTERIO DEL INTERIOR, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO con el fin de revisar los compromisos asumidos en el anterior comité de fecha 09 de julio 2024.

- El día 19 de julio de 2024 la secretaria de infraestructura se permite dar respuesta al corro enviado por el MINISTARIO DEL INTERIOR el día 15 de julio 2024 en el cual solicitan SUBSANACIONES A LAS OBSERVACIONES DADAS EN EL COMITÉ VIRTUAL NO.9 QUE SE ADELANTÓ EL 9 DE JULIO DE 2024.

- Se lleva a cabo el día 22 de julio 2024 comité técnico de seguimiento y control de ejecución de las actividades contractuales y se envía informe semanal No 3 del proyecto en coordinación con el MINISTERIO DEL INTERIOR, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION DEL MUNICIPIO con el fin de revisar los compromisos asumidos en el anterior comité de fecha 09 de julio 2024.

- La secretaria de infraestructura envía el día 24 de julio 2024 por vía correo electrónico un segundo aviso de presunto incumplimiento del contrato de interventoría 485 de 2023.

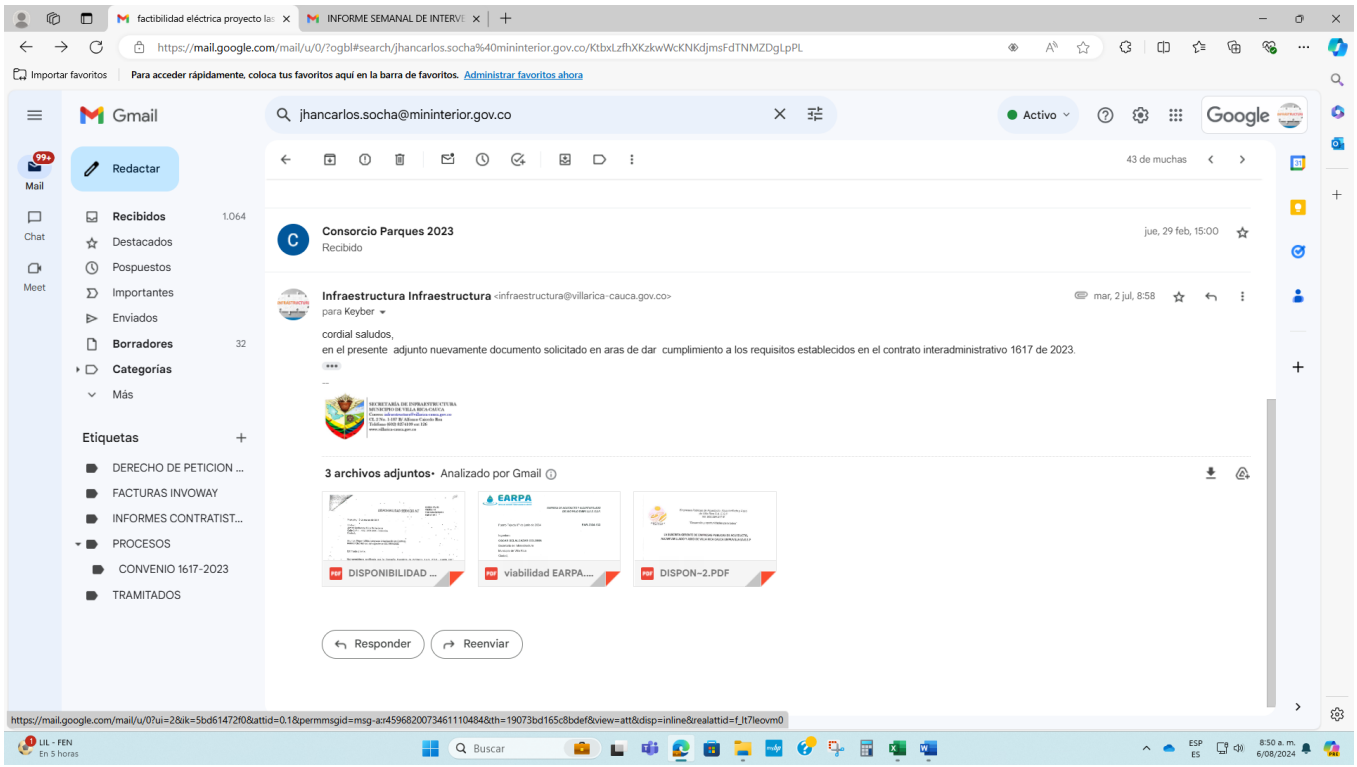
- La secretaria de infraestructura envía el día 26 y 31 de julio 2024 por vía correo electrónico un tercer aviso de presunto incumplimiento de los contratos derivados del convenio interadministrativo 1617-2023 con copia a la seguradora.

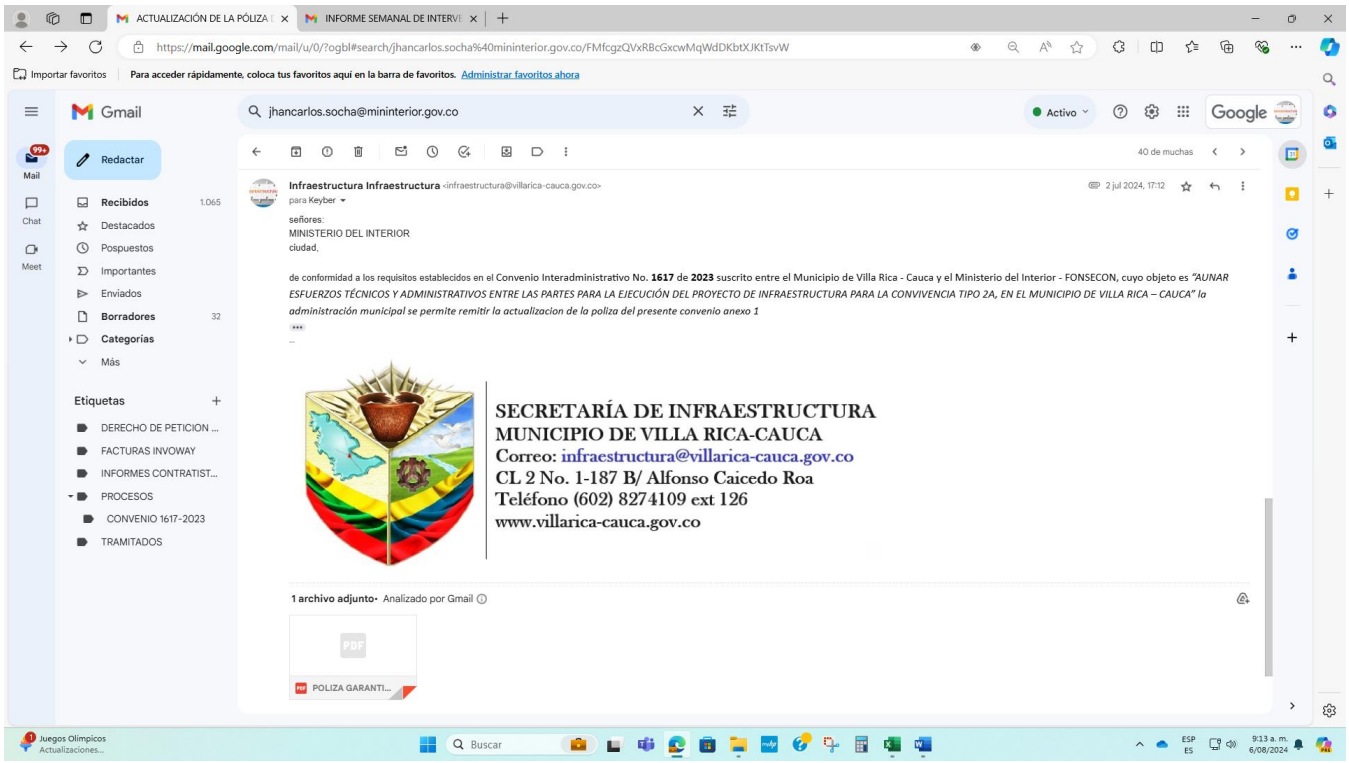
- De acuerdo a los compromisos el día 29 la secretaria de infraestructura se permite enviar el informe No 4 y las respectivas subsanación de los informe número 1,2,3. Del mismo modo se realiza reunión virtual en condonación de la supervisión del ministerio del interior y la profesional de apoyo de la secretaria de infraestructura del municipio de Villa Rica, en aras de revisar las actuaciones realizadas en los contratos derivados, se envía póliza del reinicio No 1 del contrato de obra "póliza responsabilidad anexo 07, póliza de cumplimiento anexo 9, póliza del contrato modificatorio No 3 anexo 10 y de interventoría póliza de cumplimiento anexo 10

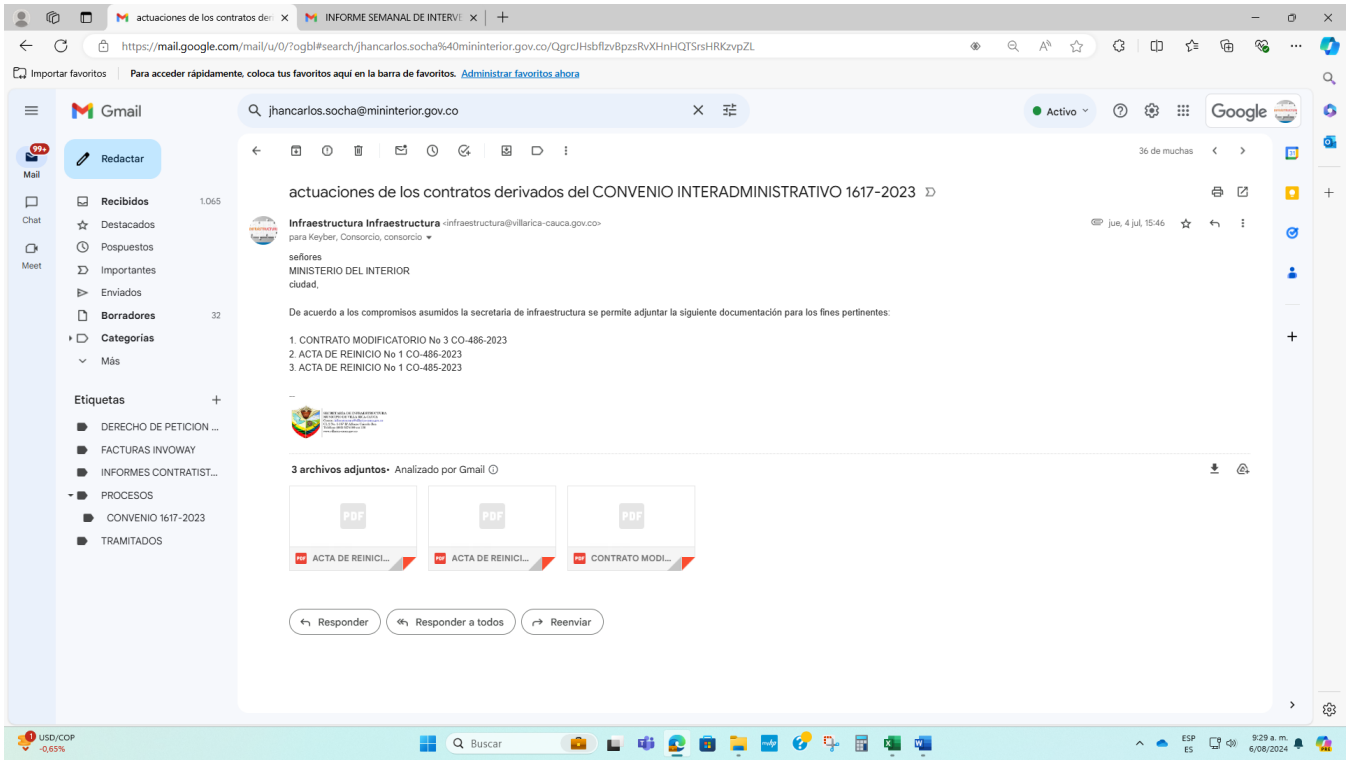
7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

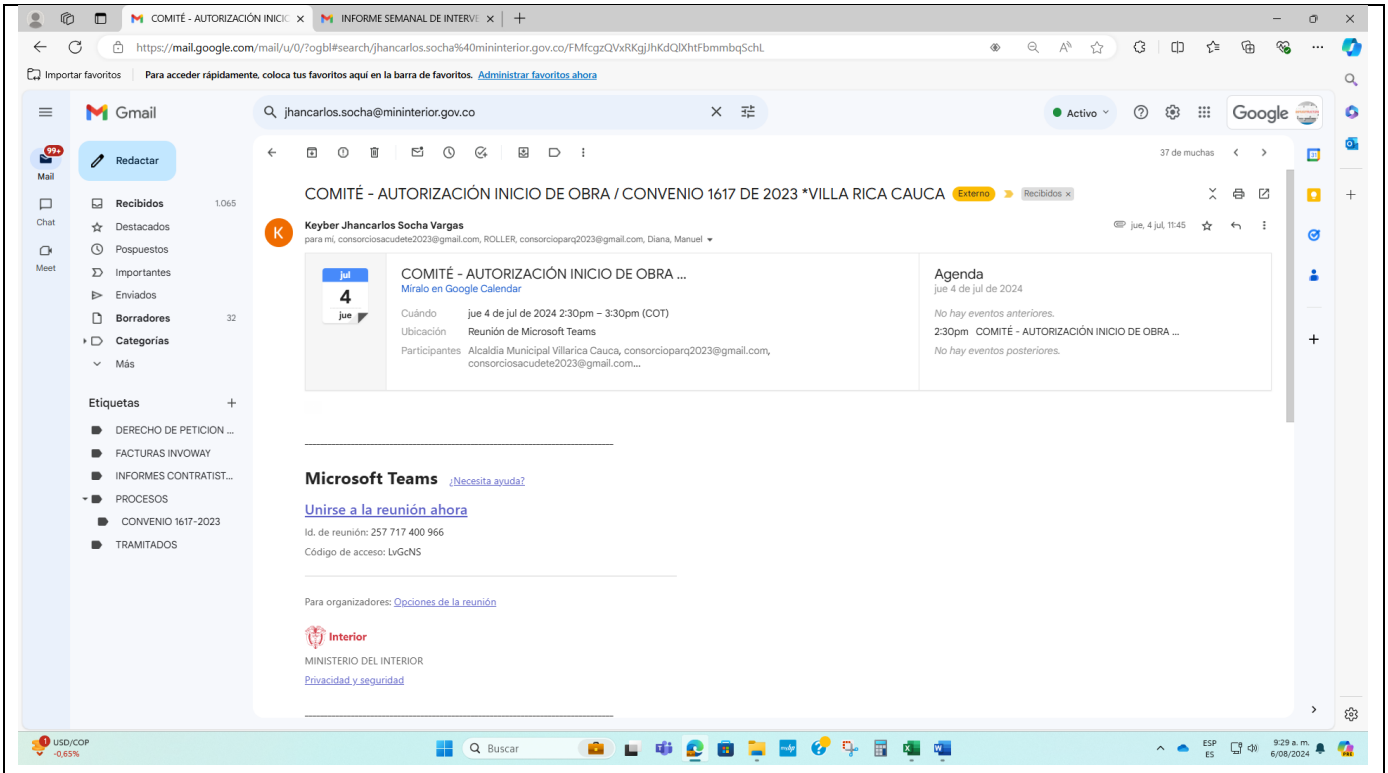
15/02/02024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

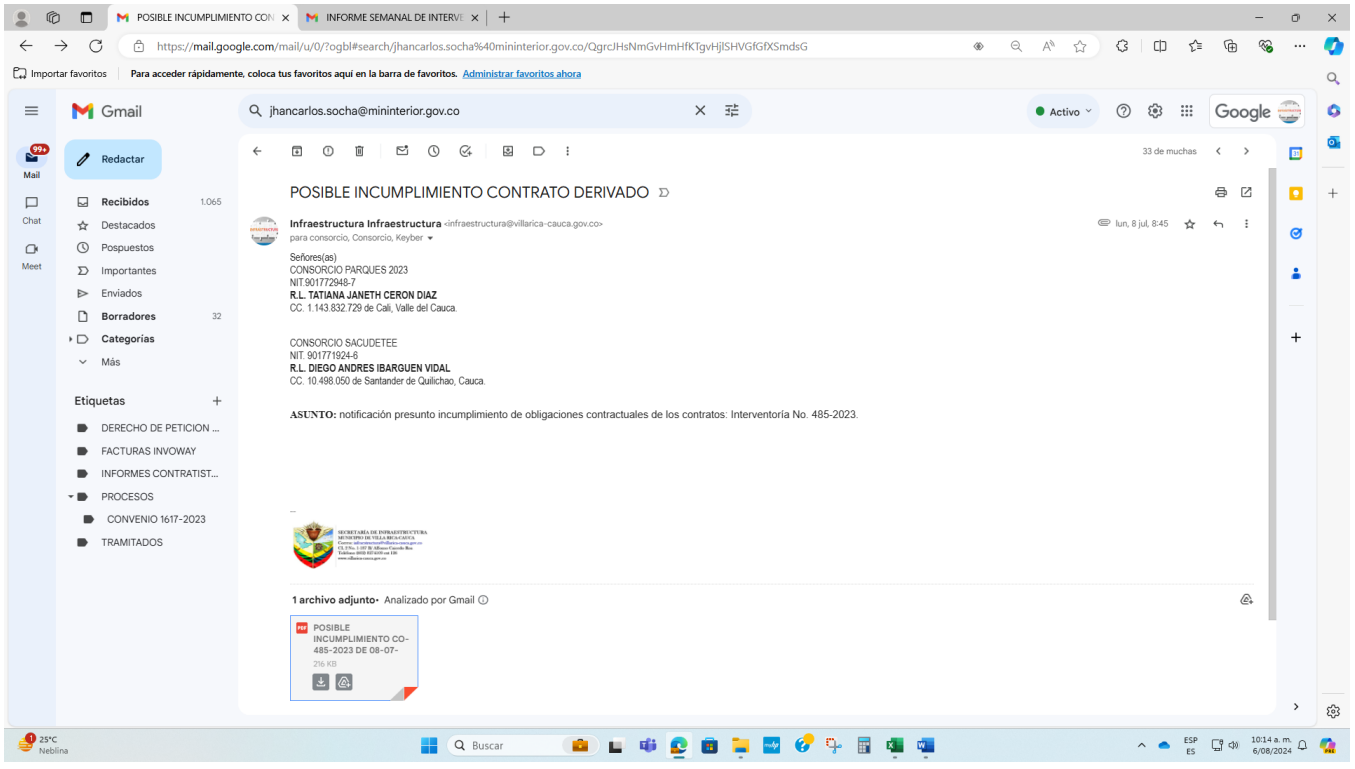
8. REGISTRO FOTOGRAFICO

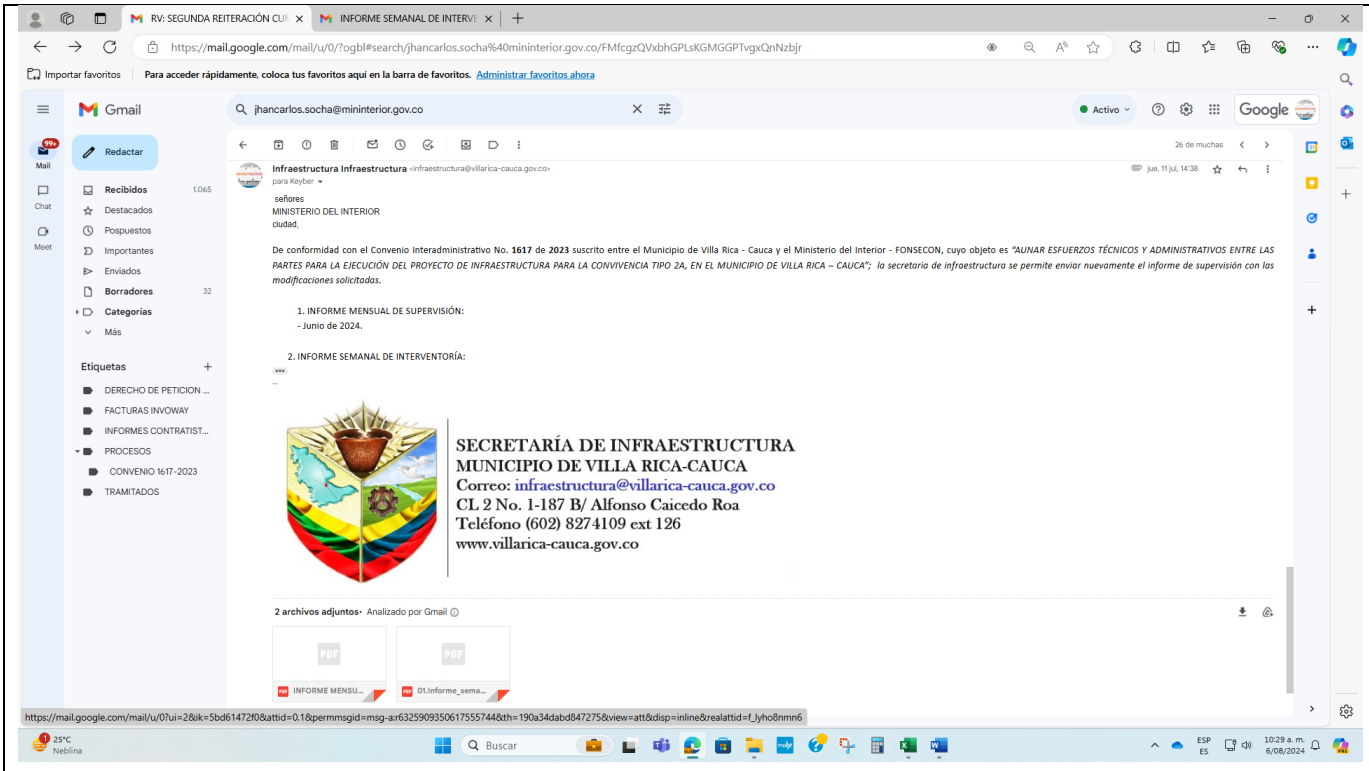



ACTUALIZACIÓN DE LA PÓLIZA
INFORME SEMANAL DE INTERVE
https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#search/jhancarlos.socha%40mininterior.gov.co/FMfcgzQVxRBcGxcwMqWdDKbtXJKtTsvW
Importar favoritos
Para acceder rápidamente, coloca tus favoritos aquí en la barra de favoritos. Administrar favoritos ahora
Gmail
jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Activo
Google
Redactar
Recibidos 1.065
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 32
Categorías
Más
Etiquetas
DERECHO DE PETICION ...
FACTURAS INVOWAY
INFORMES CONTRATIST...
PROCESOS
CONVENIO 1617-2023
TRAMITADOS
40 de muchas
Infraestructura Infraestructura <infraestructura@villarica-cauca.gov.co>
para Keyber
2 jul 2024, 17:12
señores:
MINISTERIO DEL INTERIOR
ciudad,
de conformidad a los requisitos establecidos en el Convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023 suscrito entre el Municipio de Villa Rica - Cauca y el Ministerio del Interior - FONSECON, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA" la administración municipal se permite remitir la actualizacion de la poliza del presente convenio anexo 1
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE VILLA RICA-CAUCA
Correo: infraestructura@villarica-cauca.gov.co
CL 2 No. 1-187 B/ Alfonso Caicedo Roa
Teléfono (602) 8274109 ext 126
www.villarica-cauca.gov.co
1 archivo adjunto• Analizado por Gmail
POLIZA GARANTI...
Buscar
9:13 a. m.
6/08/2024


actuaciones de los contratos der
INFORME SEMANAL DE INTERVE
https://mail.google.com/mail/u/0/?ogbl#search/jhancarlos.socha%40mininterior.gov.co/QgrcJHsbflzvBpzsRvXHnHQTSrsHRKzvpZL
Importar favoritos
Para acceder rápidamente, coloca tus favoritos aquí en la barra de favoritos. Administrar favoritos ahora
Gmail
jhancarlos.socha@mininterior.gov.co
Activo
Google
Redactar
Recibidos 1.065
Destacados
Pospuestos
Importantes
Enviados
Borradores 32
Categorías
Más
Etiquetas
DERECHO DE PETICION ...
FACTURAS INVOWAY
INFORMES CONTRATIST...
PROCESOS
CONVENIO 1617-2023
TRAMITADOS
36 de muchas
actuaciones de los contratos derivados del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1617-2023
Infraestructura Infraestructura <infraestructura@villarica-cauca.gov.co>
para Keyber, Consorcio, consorcio
jue, 4 jul, 15:46
señores
MINISTERIO DEL INTERIOR
ciudad,
De acuerdo a los compromisos asumidos la secretaria de infraestructura se permite adjuntar la siguiente documentación para los fines pertinentes:
1. CONTRATO MODIFICATORIO No 3 CO-486-2023
2. ACTA DE REINICIO No 1 CO-486-2023
3. ACTA DE REINICIO No 1 CO-485-2023
3 archivos adjuntos• Analizado por Gmail
ACTA DE REINICI...
ACTA DE REINICI...
CONTRATO MODI...
Responder
Responder a todos
Reenviar
USD/COP
-0,65%
Buscar
9:29 a. m.
6/08/2024


COMITÉ - AUTORIZACIÓN INICIO DE OBRA / CONVENIO 1617 DE 2023 *VILLA RICA CAUCA
Keyber Jhancarlos Socha Vargas
COMITÉ - AUTORIZACIÓN INICIO DE OBRA ...
Agenda
Microsoft Teams
Unirse a la reunión ahora
Id. de reunión: 257 717 400 966
Código de acceso: LvGcNS


POSIBLE INCUMPLIMIENTO CONTRATO DERIVADO
Infraestructura Infraestructura
Señores(as)
CONSORCIO PARQUES 2023
NIT.901772948-7
R.L. TATIANA JANETH CERON DIAZ
CC. 1.143.832.729 de Cali, Valle del Cauca.
CONSORCIO SACUDETEE
NIT. 901771924-6
R.L. DIEGO ANDRES IBARGUEN VIDAL
CC. 10.498.050 de Santander de Quilichao, Cauca.
ASUNTO: notificación presunto incumplimiento de obligaciones contractuales de los contratos: Interventoría No. 485-2023.
1 archivo adjunto
POSIBLE INCUMPLIMIENTO CO-485-2023 DE 08-07-



Licencia de construcción

Solicitud certificada de disponibilidad servicios públicos

9. SUPERVISOR MUNICIPIO

