INFORME MENSUAL TECNICO N°05

PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 05 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
BOGOTÁ D.C.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA NO C01.PCCNTR 876470 DE 2019

OBJETO: EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES

CONTRATO DE OBRA NO C01.PCCNTR 876470 DE 2019

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. INFORMACION BASICA 6
   2.1 GENERAL 6
   2.2 VERIFICACIÓN ESTADO PÓLIZAS 7
3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 11
   3.1 LOCALIZACIÓN 11
   3.2 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA 12
4. AVANCE DE OBRA 15
   4.1 AVANCE GENERAL DE CONTRATO 15
   4.2 AVANCE DETALLADO POR FRENTE DE TRABAJO 17
   4.2.1 FRENTES TERMINADOS 17
5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 56
   5.1 FLUJO DEL CONTRATO 56
   5.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. 57
   5.3 INVERSION POR FRENTES. 57
6. EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA 59
   PROGRAMACION INFORME Nª1 59
   PROGRAMACION INFORME Nª2 60
   PROGRAMACION INFORME Nª3 61
   PROGRAMACION INFORME Nª4 61
   PROGRAMACION INFORME Nª5 62
7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO 63
   7.1 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE OBRA 63
   7.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE REUNION ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y/O ENTIDAD 64
8. GESTION SST 67
   8.1 INTRODUCCION 67
   8.2 OBJETIVOS 67
      8.2.1 OBJETIVO GENERAL 67
      8.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO 67

8.3 UBICACIÓN 67
8.4 PERSONAL DE OBRA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCUION 68
8.4.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 68
8.4.2 RELACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OPERATIVO DE LA OBRA 69
8.5 LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS DURENTE EL PERIODO 70
8.6 REPORTE DE ACTIVIDADES Y ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD 70
18.7 ACTIVIDADES Y CAPACITACIONERS DESARROLLADAS DEL SST 70
8.8 REGISTRO FOTOGRAFICO 72
8.9 ANEXOS 73
9.COMPONENTE AMBIENTAL 75
9.1 INTRODUCCIÓN 75
9.2 OBJETIVOS 75
9.2.1 OBJETIVO GENERAL 75
9.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 75
9.3 LOCALIZACIÓN 76
9.4 PROGRAMA DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 76
9.5 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 78
9.6 PERSONAL 79
9.7 PROGRAMA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 80
9.8 PROGRAMA MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 80
9.8.1 MANEJO DE CAMPAMENTOS Y CENTROS DE ACOPIO 80
9.9 PROGRAMA GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 85
9.10 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN USO DURANTE EL PERIODO 86
9.11 PODAS, CORTE Y DESYERBE 90
9.12 ANEXOS 92
ANEXOS 94
CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES 94
BITÁCORAS 100
CONCLUSIONES 110

1. INTRODUCCIÓN

En este informe se describe la realización de actividades de obra CO1. PCCNTR 876470 DE 2019 por parte del contratista de obra EVER JOSE SALGADO SALGADO con la supervisión en interventoría del R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

Para este informe se empezará describiendo la información básica, luego el avance del contrato, aspectos financieros, informe fotográfico, actas de obra y varios anexos. Hasta la fecha de corte de este informe se han realizado diferentes actividades en varios frentes de trabajo tendientes a mitigar los riesgos principales de los reportes de emergencias presentados por la Entidad Contratante (secretaría de Educación distrital) y que han sido valoradas por la Interventoría responsable del seguimiento del proyecto, en los componentes técnicos, administrativos, ambientales, jurídicos y financieros.

A la fecha de corte del presente documento técnico han sido reportados para la atención de emergencias 155 frentes de trabajo en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá, donde se han reportado actividades como ambiental, áreas exteriores, aulas provisionales, baños portátiles, baterías sanitarias, cerramiento y talud, cocina, contingencias, cubiertas, eléctrico, equipos hidráulicos, estructura, hidráulico, inundación, limpieza y silvicultura.

El informe que se desarrollara a continuación comprende los periodos del 05 de agosto al 05 de septiembre de 2019.

La Secretaria de Educación Distrital SED, tiene como uno de sus objetivos primordiales promover una educación de calidad garantizando un buen estado de la infraestructura a través de colegios distritales modernos donde permanecen niños, Jóvenes y adolescentes con el fin de mejorar su calidad de vida a sus estudiantes y su permanencia escolar.
Destina unos recursos importantes para recuperar y mejorar las condiciones del espacio en las instituciones educativas a nivel Bogotá que se han reportado en algún tipo de riesgo en su infraestructura física, lo cual no permite en forma temporal la prestación del servicio educativo, por lo cual por medio del contrato de obra N° CO1. PCCNTR 876470 DE 2019


adjudicado a la empresa EVER JOSE SALGADO cuyo objeto es "EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES." Se efectúan las actividades técnicas que permiten solventar estas emergencias y poder dar en funcionamiento las infraestructuras educativas. De igual Forma para el seguimiento y control del este proyecto se realizó el contrato N° INTERVENTORÍA N° CO1. PCCNTR 864705 DE 2019 celebrado entre La Secretaria de Educación del Distrito y la firma INTERVENTORIA R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS, cuya finalidad es la interventoría externa para garantizar la calidad de las obras a ejecutar.

2. INFORMACION BASICA

2.1 GENERAL

ELEMENTOS	CONDICIONES INICIALES
CONTRATO DE OBRA No.	CO1.PCCNTR 876470
CONTRATISTA:	EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
NIT.CONTRATISTA:	7917558-1
VALOR DEL CONTRATO:	$ 2.578.680.000
CONTRATANTE:	Secretaria de Educación
NIT.CONTRATANTE :	899.999.061-9
OBJETO:	"EJECUCION DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES"
PLAZO INICIAL:	Hasta 15 de diciembre o terminarlo recursos
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	19 marzo del 2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	Abril 05 del 2019
FECHA PLAZO CONTRACTUAL PARA TERMINACIÓN DE OBRA:	15 de diciembre del 2019

2.2 VERIFICACIÓN ESTADO PÓLIZAS

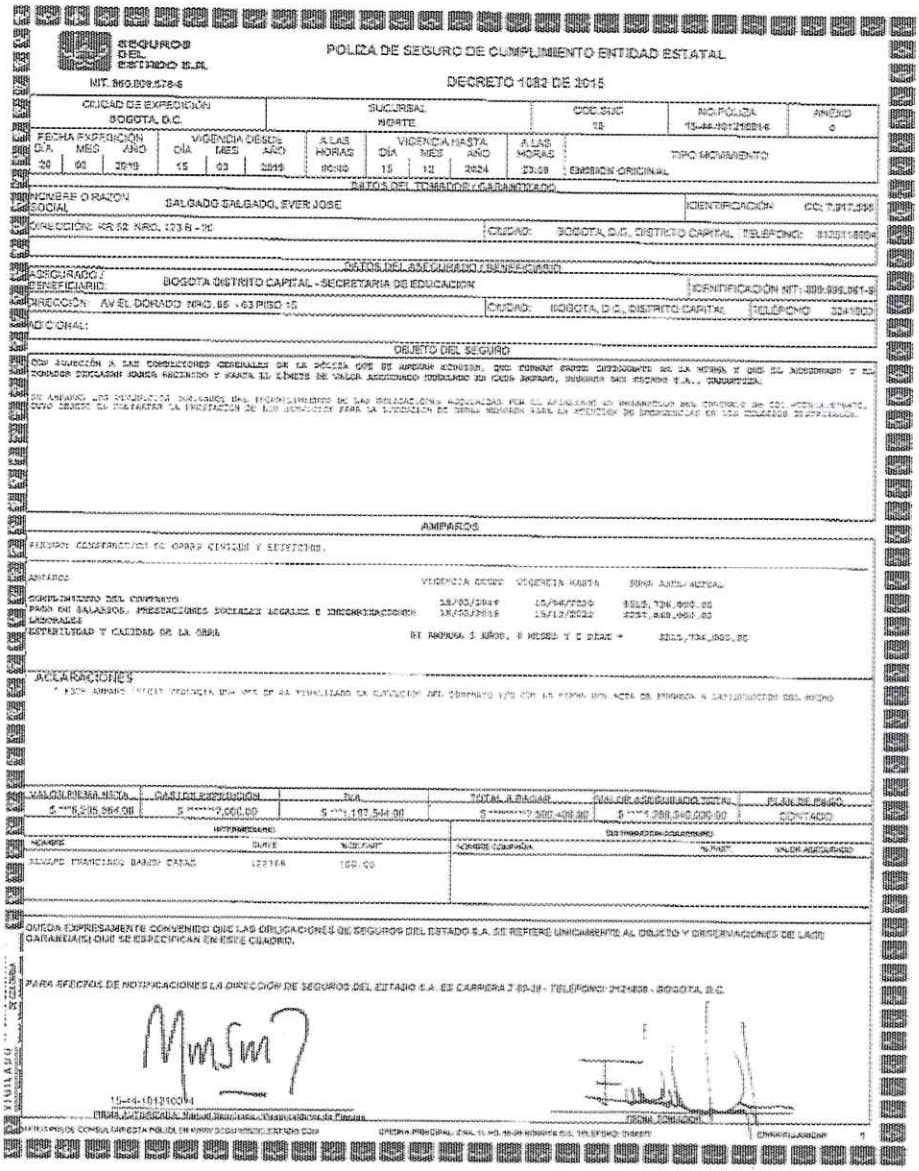

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	18	15-44-101210084	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	09	2019	15	03	2019	00:00	15	11	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	
SALGADO SALGADO, EVER JOSE	CC	7.917.356

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELEFONO
KR 52 NRO. 123 B - 70	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	91301 18004

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN NIT	
BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION	899.999.061-9	

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3241000

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE APRUEBA MEDIANTE, QUE CONSTA EXPRESAMENTE EN LA HORA Y QUE SE ENCUENTRAN Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y PARTE DE VALOR ASEGURADO TODOLAMO EN TODOS SENTIDO, UNIENDO SUS FIRMAS S.A., CONJUNTAMENTE.

EN AMPARO LOS PERJUICIOS DIRECTOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASEGURADAS POR EL AFIANZADO EN DESARROLLO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ESTATAL, CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES.

AMPAROS

RIESGOS: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS MENORES Y REPETICIONES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	15/03/2019	15/11/2024	$515,736,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	15/03/2019	15/12/2022	$257,868,000.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	DE DOCE (12) AÑOS, 8 MESES Y 0 DIAS		$515,736,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA DE PAGO
$ [illegible]6,295,964.00	$ [illegible]0,000.00	$ [illegible]07,544.00	$ [illegible]302,408.00	$ [illegible]288,340,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COASEGURADORA	% PART.	VALOR ASEGURADO
RECAUDO FINANCIERO BANDY CASAS	123166	100.00			

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 69-38 - TELEFONO: 2124888 - BOGOTA, D.C.

15-44-101210084

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

CONTRATO DE OBRA NO C01.PCCNTR 876470 DE 2019

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nº5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta ALCALDÍA MAYOR SANTAFÉ DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	SUBRAMO	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-03-101057233	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
26	03	2019	15	05	2019	00:00	15	12	2019	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SALGADO SALGADO, EVER JOSE — IDENTIFICACION: CC 7.557.338

DIRECCION: KR 92 NRO. 129 B - 20 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 3139116004

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION — IDENTIFICACION NIT: 899.999.061-9

DIRECCION: AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 15 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 2241900

BENEFICIARIO: 899999061 - BOGOTA DISTRITO CAPITAL — ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-6004 BOGTA 04-09 / E-RCE-6003-A, QUE TOMAN PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO ESTIPULADO EN CADA AMPARO, AMPARAN DEL SEGURO E.E., GARANTIZA:

EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, PARA EFECTOS DE CONTRATAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA EL EJERCICIO DE LABOR MINERA PARA LA REALIZACION DE ENCUESTAS EN LOS COLEGIOS DISTRITALES.

SERVICIOS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGOS CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y ANEXOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PERJUICIOS LABORES Y EXCAVACIONES	10,00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA + MINIMO: 3,00 SMMLV	15/03/2019	15/12/2019	$180,621,200.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ 204,819.00	$ 0.00	$ 43,012.00	$ 247,831.00	$ 180,621,200.00	CONTADO

ASEGURADO			INTERMEDIARIO		
NOMBRE	CLASE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	CLASE
RICARDO FRANCISCO MANRIQUE CASAS	TOMADOR	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y CONDICIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 33-26 - TELEFONO: 2121699 - BOGOTA, D.C.

15-03-101057233

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

ESTE DOCUMENTO PUEDE CONSULTARSE EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2180307 — 1 ASEGURADO

CONTRATO DE OBRA NO C01.PCCNTR 876470 DE 2019

8

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101196756	4

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	05	2019	04	06	2019	00:00	26	06	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: P Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS | IDENTIFICACION NIT: 830.020.129-0

DIRECCION: CR 36 A NRO. 20 - 58 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELEFONO: 2697527

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION | IDENTIFICACION NIT: 899.999.061-9

DIRECCION: AV EL DORADO NRO. 66 - 63 PISO 10 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELEFONO: 3241000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXA ADJUNTA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, OTORGA DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTAS DEL SERVICIO SEGÚN CONTRATO No. C01.PCCNTR.864703, RELACIONADO A LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS INTERVENTORIA.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/RIESGO	SUMA ASEG/SINIESTRO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	04/06/2019	29/03/2020	$83,502,248.00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	04/06/2019	26/01/2023	$30,979,382.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	04/06/2019	03/06/2024	$83,502,248.00	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE CERTIFICAMOS QUE NUESTRA ACTA DE INICIO DE FECHA MARZO 14 DE 2019 AL CONTRATO No. C01.PCCNTR.864703, SE CORRIGE LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS

LAS DEMAS CONDICIONES Y/O CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ********328,284.00	$ ********1,000.00	$ ********191,705.00	$ ********837,000.00	$ ********87,580,065.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART	DISTRIBUCION COASEGURO NUMERO CONSTANCIA	% PART	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AGUDA Y. & CIA. LTDA.	143537	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LA(S) OBLIGACIONE(S) DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONE(S) DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.


PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 97 -57 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101100756

Firma Autorizada / Nombre Representante / Vicepresidente de Cesión

Firma Tomador

VISITE NUESTRA PAGINA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM | CASA MATRIZ PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186400 | DUPLICADO

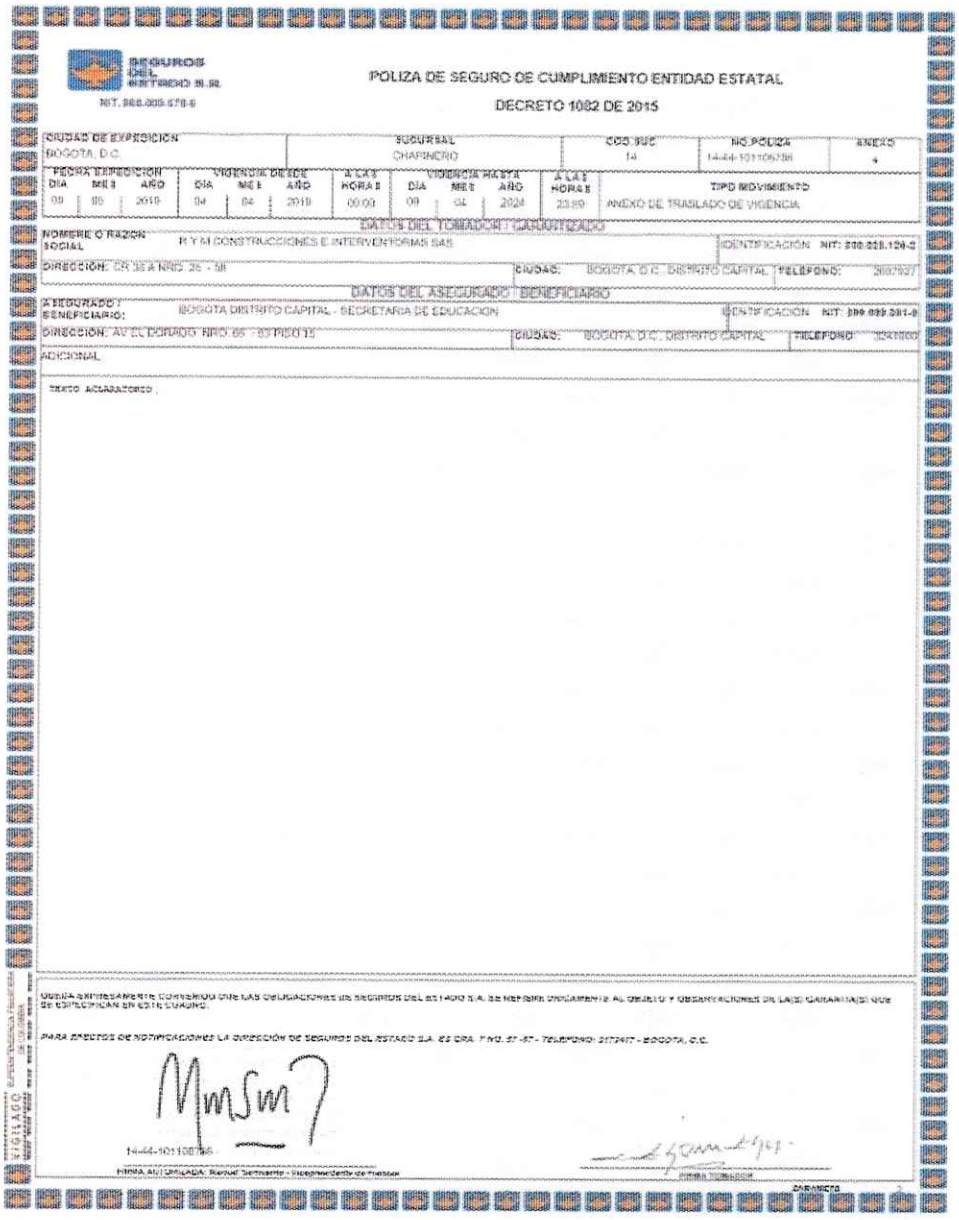

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101150788	4

FECHA EXPEDICION DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	10	2019	04	04	2019	00:00	09	04	2024	23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS — IDENTIFICACION: NIT: 900.018.126-3

DIRECCION: CR 35 # NRO 25 - 58 — CIUDAD: BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 2887937

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION — IDENTIFICACION: NIT: 899.999.061-9

DIRECCION: AV EL DORADO NRO 66 - 63 PISO 13 — CIUDAD: BOGOTA D.C. DISTRITO CAPITAL — TELEFONO: 3240000

ADICIONAL

TEXTO ACLARATORIO

OBRA EXTENSIVA PARA CONTRATO DE OBRA NO C01.PCCNTR 876470 DE 2019


3. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO

3.1 LOCALIZACIÓN

Para el presente periodo las obras de atención de emergencias que fueron identificadas por la Secretaria de Educación se encontraron distribuidas en diferentes colegios y diferentes localidades de la ciudad, como lo evidencia la siguiente tabla.

Nº	COLEGIO	SEDE	TIPO	LOCALIDAD
1	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BRISAS	A	CERRAMIENTO	CIUDAD BOLIVAR
2	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VERJON	A	BAÑOS PORTATILES	SANTA FE
3	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAUREANO GOMEZ	A	BAÑOS PORTATILES	ENGATIVA
4	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL CEPEDA - CONTINGENCIA	A	AULAS PROVISIONALES	KENNEDY
5	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JERONIMO DEL YUSTE	A	BAÑOS PORTATILES	SAN CRISTOBAL
6	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAS MARGARITAS	A	HIDRAULICO	KENNEDY
7	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR	C	BAÑOS PORTATILES	SUBA
8	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GERARDO PAREDES	A	ELECTRICO	SUBA
9	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARIA CANO	UNICA	SANITARIO	SAN CRISTOBAL
10	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	UNICA	CUBIERTA	RAFAEL URIBE
11	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO GONZALEZ OCHOA	A	COCINA	USME
12	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA VICTORIA	A	HIDRAULICO	SAN CRISTOBAL
13	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ	B	HIDRAULICO	SAN CRISTOBAL
14	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALMIRANTE PADILLA	B	HIDRAULICO	SAN CRISTOBAL
15	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ	A	HIDRAULICO	SAN CRISTOBAL
16	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MERCEDES NARIÑO	A	PISOS	RAFAEL URIBE
17	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RUFINO JOSE CUERVO	A	CERRAMIENTO	TUNJUELITO
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALFONSO REYES ECHANDIA	A	SANITARIO	BOSA
19	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL O.E.A	A	HIDRAULICO	KENNEDY
20	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ESPAÑA	A	CUBIERTA	PUENTE ARANDA
21	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS	A	CUBIERTA	RAFAEL URIBE
22	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUANA ESCOBAR	A	IMPERMEABILIZACION	SAN CRISTOBAL
23	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO	A	ELECTRICO	SUBA
24	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA AMISTAD	A	CONTINGENCIA	KENNEDY
25	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOTE SAN DIEGO	A	BAÑOS PORTATILES	KENNEDY
26	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA	B	CERRAMIENTO	ENGATIVA
27	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA	UNICA	ESTRUCTURA	KENNEDY
28	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GABRIEL BETANCOURTH MEJIA	A	INUNDACION	KENNEDY
29	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ELPORVENIR	A	EQUIPOS NEUMATICOS	KENNEDY
30	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CHUNIZA	A	GAS	USME
31	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CALASANZ BUENA VISTA	A	ELECTRICO	SAN CRISTOBAL
32	INSTITUCION EDUCATIVA HELADIA MEJIA	A	ELECTRICO	BARRIOS UNIDOS
33	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO MAZUERA	A	TALA	BOSA
34	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTADER	A	SHUT DE BASURA	ANTONIO NARIÑO
35	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANGEL ARANGO LA CASONA	B	EQUIPOS NEUMATICOS	FONTIBON
36	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO GARAVITO ARMERO	A	ELECTRICO	PUENTE ARANDA
37	INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY HEROES COCINA	A	ELECTRICO	KENNEDY
38	INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ CONTINGENCIA	C	ELECTRICO	ENGATIVA
39	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA	A	INUNDACION	SUBA
40	INSTITUCION EDUCATIVA USAQUEN ACCESO	A	CERRAMIENTO	USAQUEN
41	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DEL PROGRESO	A	AULAS PROVISIONALES	BOSA
42	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA	A	EQUIPOS NEUMATICOS	SUBA
43	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO LA CAPILLA	A	CERRAMIENTO	SAN CRISTOBAL
44	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NARANJOS TALA	A	TALA	SAN CRISTOBAL
45	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTI	A	CERRAMIENTO	RAFAEL URIBE
46	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	TALA	SAN CRISTOBAL
47	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO	B	HIDRAULICO	SUBA
48	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DOMINICANA	A	ESTRUCTURAL	SUBA
49	INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO DURAN DUSAN	A	HIDRAULICO	KENNEDY
50	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTOBAL COLON	A	BAÑOS PORTATILES	USAQUEN
51	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE JOAQUIN CASAS	A	BAÑOS PORTATILES	PUENTE ARANDA

LOCALIDAD	CANTIDAD
RAFAEL URIBE	4
ENGATIVA	3
SAN CRISTOBAL	11
TUNJUELITO	1
BOSA	3
KENNEDY	10
SUBA	7
SANTA FE	1
USME	2
CIUDAD BOLIVAR	1
PUENTE ARANDA	3
BARRIOS UNIDOS	1
ANTONIO NARIÑO	1
FONTIBON	1
USAQUEN	2
TOTAL	51

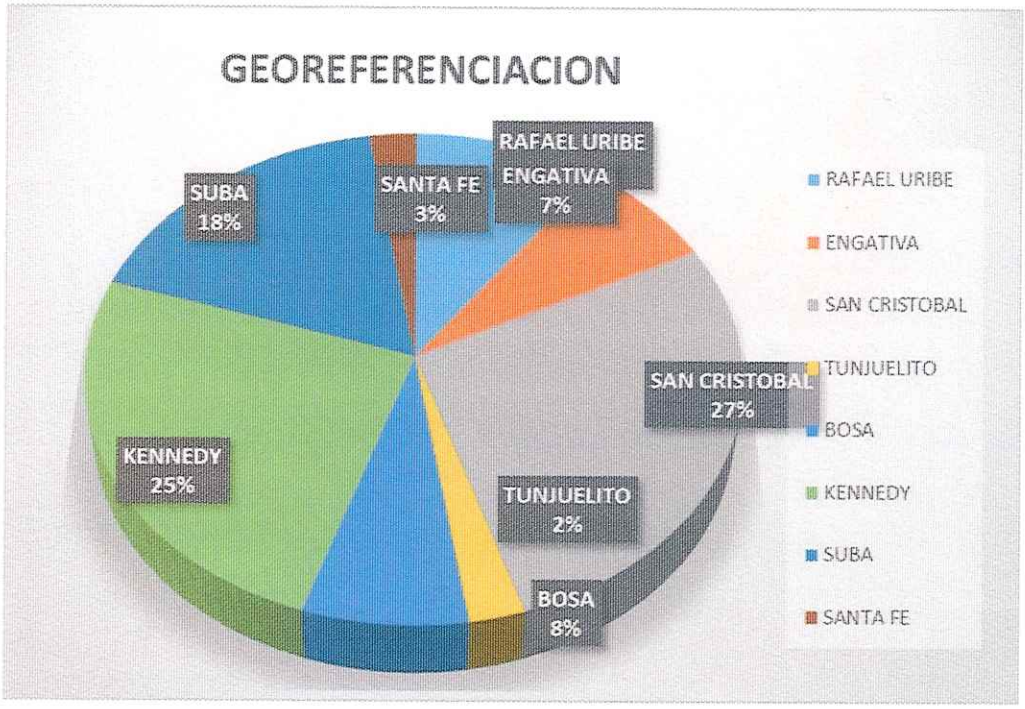


3.2 IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA

Se identifica acorde a las solicitudes de la Entidad, que existen diferentes tipos de atención de emergencias según la necesidad de cada una de las plantas físicas reportadas, acorde lo que se observa en el cuadro resumen del presente capitulo.

N°	COLEGIO	SEDE	TIPO
1	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BRISAS	A	CERRAMIENTO
2	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VERJON	A	BAÑOS PORTATILES
3	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAUREANO GOMEZ	A	BAÑOS PORTATILES
4	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL CEPEDA - CONTINGENCIA	A	AULAS PROVISIONALES
5	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JERONIMO DEL YUSTE	A	BAÑOS PORTATILES
6	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAS MARGARITAS	A	HIDRAULICO
7	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR	C	BAÑOS PORTATILES
8	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GERARDO PAREDES	A	ELECTRICO
9	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARIA CANO	UNICA	SANITARIO
10	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	UNICA	CUBIERTA
11	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO GONZALEZ OCHOA	A	COCINA
12	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA VICTORIA	A	HIDRAULICO
13	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ	B	HIDRAULICO
14	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALMIRANTE PADILLA	B	HIDRAULICO
15	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ	A	HIDRAULICO
16	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MERCEDES NARIÑO	A	PISOS
17	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RUFINO JOSE CUERVO	A	CERRAMIENTO
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALFONSO REYES ECHANDIA	A	SANITARIO
19	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL O.E.A	A	HIDRAULICO
20	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ESPAÑA	A	CUBIERTA
21	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS	A	CUBIERTA
22	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUANA ESCOBAR	A	IMPERMEABILIZACION
23	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO	A	ELECTRICO
24	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA AMISTAD	A	CONTINGENCIA
25	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOTE SAN DIEGO	A	BAÑOS PORTATILES
26	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA	B	CERRAMIENTO
27	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA	UNICA	ESTRUCTURA
28	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GABRIEL BETANCOURTH MEJIA	A	INUNDACION
29	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ELPORVENIR	A	EQUIPOS NEUMATICOS
30	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CHUNIZA	A	GAS
31	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CALASANZ BUENA VISTA	A	ELECTRICO
32	INSTITUCION EDUCATIVA HELADIA MEJIA	A	ELECTRICO
33	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO MAZUERA	A	TALA
34	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTADER	A	SHUT DE BASURA
35	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANGEL ARANGO LA CASONA	B	EQUIPOS NEUMATICOS
36	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO GARAVITO ARMERO	A	ELECTRICO
37	INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY HEROES COCINA	A	ELECTRICO
38	INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ CONTINGENCIA	C	ELECTRICO
39	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA	A	INUNDACION
40	INSTITUCION EDUCATIVA USAQUEN ACCESO	A	CERRAMIENTO
41	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DEL PROGRESO	A	AULAS PROVISIONALES
42	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA	A	EQUIPOS NEUMATICOS
43	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO LA CAPILLA	A	CERRAMIENTO
44	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NARANJOS TALA	A	TALA
45	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTI	A	CERRAMIENTO
46	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	TALA
47	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO	B	HIDRAULICO
48	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DOMINICANA	A	ESTRUCTURAL
49	INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO DURAN DUSAN	A	HIDRAULICO
50	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTOBAL COLON	A	BAÑOS PORTATILES
51	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE JOAQUIN CASAS	A	BAÑOS PORTATILES

TIPO	CANTIDAD
CERRAMIENTO	6
BAÑOS PORTATILES	7
AULAS PROVISIONALES	2
HIDRAULICO	8
ELECTRICO	7
SANITARIO	2
CUBIERTA	3
COCINA	1
PISOS	1
IMPERMEABILIZACION	1
CONTINGENCIA	1
ESTRUCTURA	2
INUNDACION	2
EQUIPOS NEUMATICOS	3
GAS	1
TALA	3
SHUT DE BASURA	1
TOTAL	51

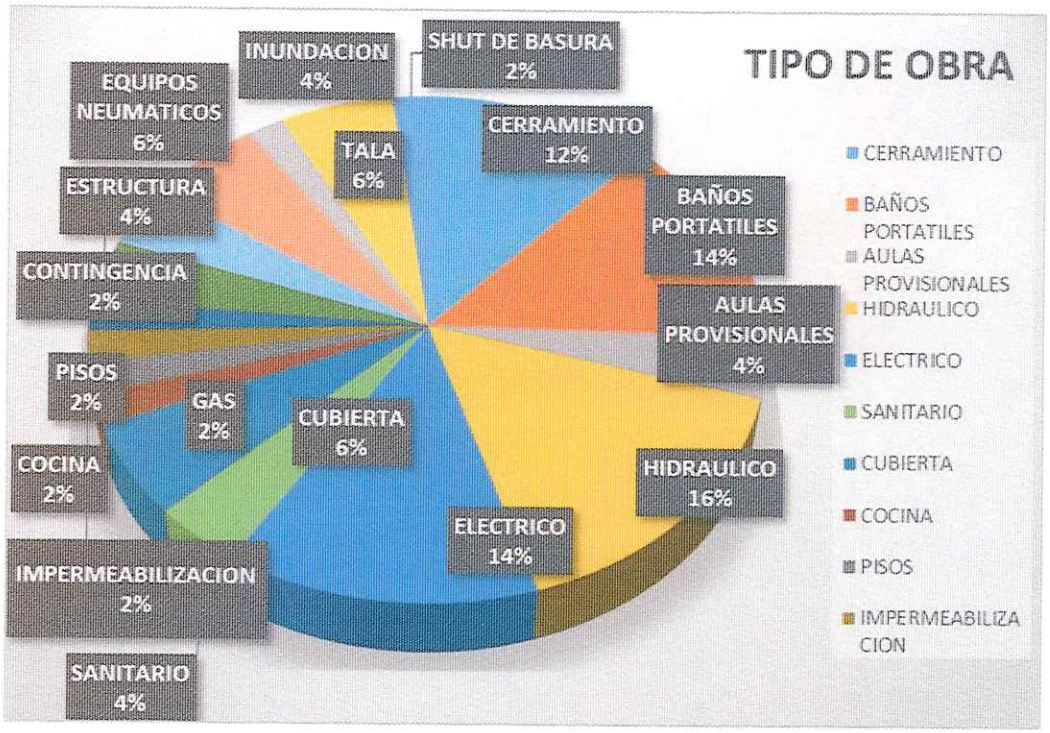


4. AVANCE DE OBRA

4.1 AVANCE GENERAL DE CONTRATO

Según las indicaciones dadas por la Interventoría y las prioridades de ejecución contractual y los reportes de emergencias ejecutadas en el presente periodo se enuncia el avance consolidado de ejecución en el presente cuadro.

Nº	COLEGIO	SEDE	TIPO	% EJECUTADO
1	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL BRISAS	A	CERRAMIENTO	100
2	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VERJON	A	BAÑOS PORTATILES	100
3	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAUREANO GOMEZ	A	BAÑOS PORTATILES	100
4	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL CEPEDA - CONTINGENCIA	A	AULAS PROVISIONALES	100
5	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JERONIMO DEL YUSTE	A	BAÑOS PORTATILES	100
6	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAS MARGARITAS	A	HIDRAULICO	100
7	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR	C	BAÑOS PORTATILES	100
8	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GERARDO PAREDES	A	ELECTRICO	100
9	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARIA CANO	UNICA	SANITARIO	100
10	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	UNICA	CUBIERTA	100
11	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO GONZALEZ OCHOA	A	COCINA	100
12	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA VICTORIA	A	HIDRAULICO	100
13	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ	B	HIDRAULICO	100
14	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALMIRANTE PADILLA	B	HIDRAULICO	100
15	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ	A	HIDRAULICO	100
16	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MERCEDES NARIÑO	A	PISOS	100
17	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RUFINO JOSE CUERVO	A	CERRAMIENTO	100
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALFONSO REYES ECHANDIA	A	SANITARIO	100
19	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL O.E.A	A	HIDRAULICO	100
20	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ESPAÑA	A	CUBIERTA	100
21	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS	A	CUBIERTA	100
22	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUANA ESCOBAR	A	IMPERMEABILIZACION	100
23	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO	A	ELECTRICO	100
24	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA AMISTAD	A	CONTINGENCIA	100
25	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOTE SAN DIEGO	A	BAÑOS PORTATILES	100
26	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA	B	CERRAMIENTO	100
27	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA	UNICA	ESTRUCTURA	90
28	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GABRIEL BETANCOURTH MEJIA	A	INUNDACION	100
29	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ELPORVENIR	A	EQUIPOS NEUMATICOS	90
30	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CHUNIZA	A	GAS	90
31	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CALASANZ BUENA VISTA	A	ELECTRICO	90
32	INSTITUCION EDUCATIVA HELADIA MEJIA	A	ELECTRICO	100
33	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO MAZUERA	A	TALA	100
34	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTADER	A	SHUT DE BASURA	100
35	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANGEL ARANGO LA CASONA	B	EQUIPOS NEUMATICOS	100
36	INSTITUCION EDUCATIVA JULIO GARAVITO ARMERO	A	ELECTRICO	100
37	INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY HEROES COCINA	A	ELECTRICO	100
38	INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ CONTINGENCIA	C	ELECTRICO	100
39	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA	A	INUNDACION	100
40	INSTITUCION EDUCATIVA USAQUEN ACCESO	A	CERRAMIENTO	100
41	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DEL PROGRESO	A	AULAS PROVISIONALES	100
42	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA	A	EQUIPOS NEUMATICOS	100
43	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO LA CAPILLA	A	CERRAMIENTO	100
44	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NARANJOS TALA	A	TALA	100
45	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTI	A	CERRAMIENTO	100
46	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	TALA	100
47	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO	B	HIDRAULICO	100
48	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DOMINICANA	A	ESTRUCTURAL	100
49	INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO DURAN DUSAN	A	HIDRAULICO	100
50	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTOBAL COLON	A	BAÑOS PORTATILES	100
51	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE JOAQUIN CASAS	A	BAÑOS PORTATILES	100

TIPO	CANTIDAD
90	4
100	47
TOTAL	51

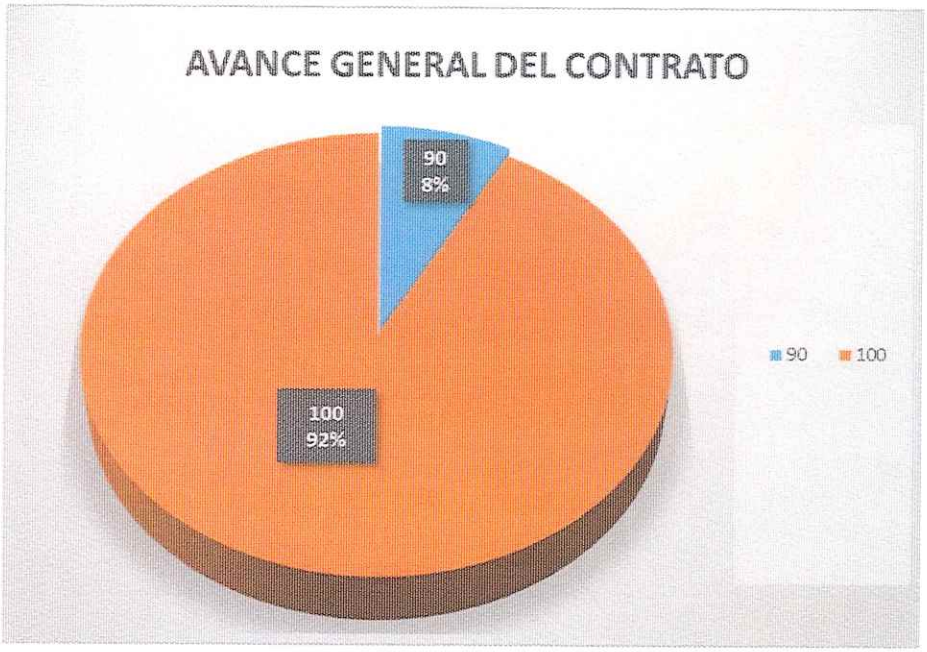

4.2 AVANCE DETALLADO POR FRENTE DE TRABAJO

A continuación, se presenta un informe detallado del avance por cada uno de los frentes de trabajo determinado los frentes de trabajo terminados y los frentes de trabajo que la fina del periodo continúan en ejecución.

4.2.1 FRENTES TERMINADOS

COLEGIO DISTRITAL	LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Por las altas precipitaciones e incorrectos procesos de mantenimiento se produjo el desprendimiento de teja de barro y obstrucción de canales y bajantes	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Aseo, limpieza, sondeos y cambio de elementos afectados.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Aseo, limpieza, sondeos y cambio de elementos afectados.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	Desmonte canales y bajantes Desmonte Reubicación de teja de barro	
REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN		
RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad	

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Colegio	DISTRITAL VERJON	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia sanitaria debido a que la institución no permite la disposición de vertimientos	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se presenta la emergencia de ausencia de baños para estudiantes	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Suministro de baterías sanitarias portátiles, con el objeto de permitir que el colegio continúe con su normal funcionamiento, adicionalmente el continuo aseo de las áreas aferentes una vez se realice la limpieza	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Prestación del servicio integral baños de unidades portátiles • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN





BATERIAS DE BAÑOS PROTATILES






RESULTADOS OBTENIDOS	Se encuentra la comunidad educativa sin servicio de baño se mitiga la emergencia con baterías baños portátiles beneficiando a la comunidad estudiantil permitiendo un funcionamiento normal en la institución

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

COLEGIO DISTRITAL	SAN ISIDRO LA CAPILLA-EL PARAMO	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia Silvicultural	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Tala de arboles	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Tala de arboles	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Tala de 8 arboles	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



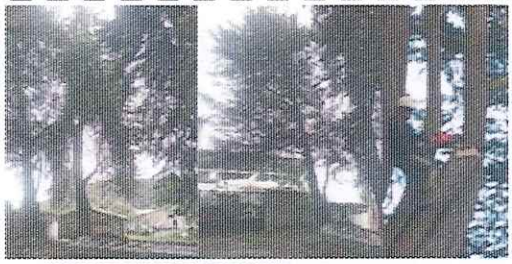



Tala de 8 arboles

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

COLEGIO DISTRITAL	KENNEDY HÉROES	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Presencia de fugas de gas en las válvulas de la cocina hacer las exploraciones pertinentes y corregir las fugas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se deben hacer las exploraciones pertinentes y corregir las fugas	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Exploraciones	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Instalación hidráulica sanitaria • Red de gas • Registros	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN





RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

Colegio	DISTRITAL LAS MARGARITAS	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por colapso en red pluvial y sanitaria	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se debe hacer reparación de red pluvial y sanitaria por colapso de la misma	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Reparación de red pluvial y sanitaria	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Instalación tubería novafort • Demolición de asfalto y base asfalto • Excavación manual	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN





Instalación tubería novafort



Demolición de asfalto y base asfalto



Excavación manual

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad


COLEGIO DISTRITAL	CHUNIZA	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Contingencia en la acometida de gas principal del colegio	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Hacer los arreglos pertinentes para mitigar el riesgo y poner en marcha el suministro de gas	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Hacer los arreglos pertinentes para mitigar el riesgo y poner en marcha el suministro de gas	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Instalación hidráulica sanitaria • Red de gas • Excavación	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN






RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

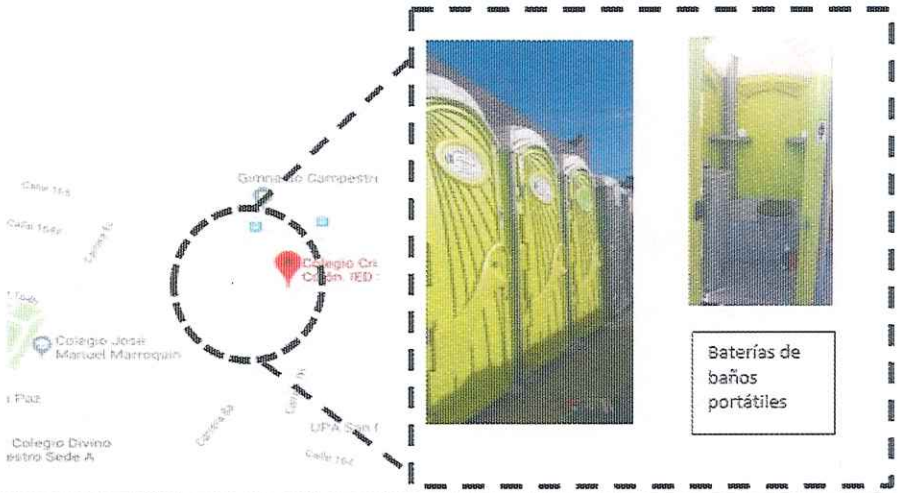
COLEGIO DISTRITAL	CRISTOBAL COLON	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia sanitaria por ausencia de baños	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Baños portátiles	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Baños portátiles	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Baños portátiles • Aseo y limpieza	
REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN		
RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad	

COLEGIO DISTRITAL	HERNANDO DURAN DUSAN	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por filtración al tanque de almacenamiento de agua	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Cambio de tubería	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Cambio de tubería y vaciado te tanque.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Excavación • Cambio de tubería • Caja de paso	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

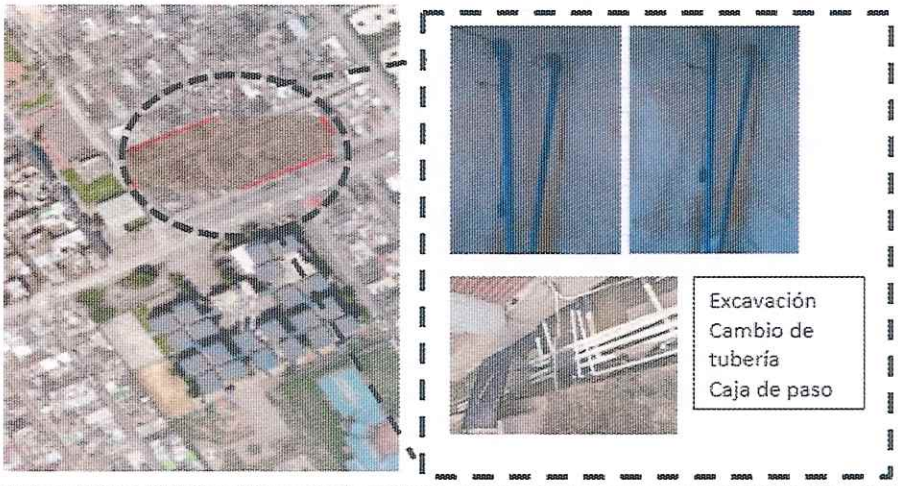


RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

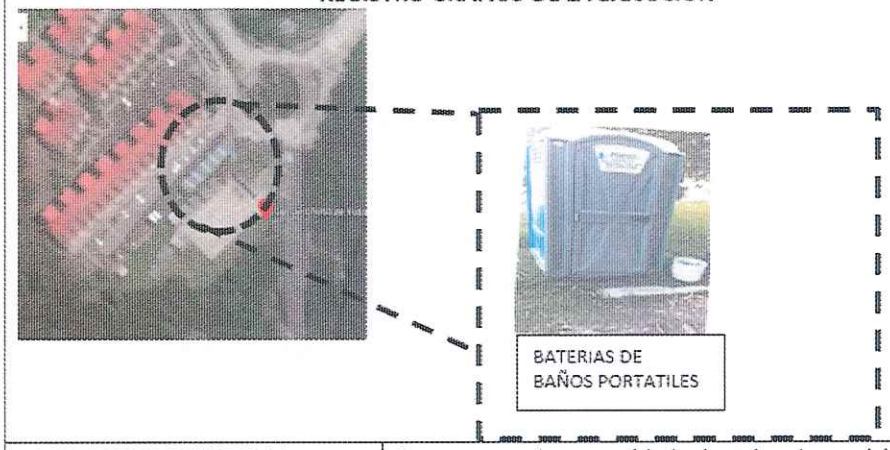Colegio	DISTRITAL SAN JERONIMO DE JUSTE	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia sanitaria debido a que la institución no permite la disposición de vertimientos	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se presenta la emergencia de ausencia de baños para estudiantes	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Suministro de baterías sanitarias portátiles, con el objeto de permitir que el colegio continúe con su normal funcionamiento, adicionalmente el continuo aseo de las áreas aferentes una vez se realice la limpieza	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Prestación del servicio integral baños de unidades portátiles • Aseo y limpieza	
REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN		
RESULTADOS OBTENIDOS	Se encuentra la comunidad educativa sin servicio de baño se mitiga la emergencia con baterías baños portátiles beneficiando a la comunidad estudiantil permitiendo un funcionamiento normal en la institución	

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nº5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

COLEGIO DISTRITAL		REPUBLICA DOMINICANA	
Estado actual		Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia hidrosanitaria por taponamiento de red pluvial		
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Revisión de sondeo y limpieza de cajas		
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Sondeo y revisión de desagües y limpieza de cajas		
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Sondeo y revisión de desagües • limpieza de cajas		

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

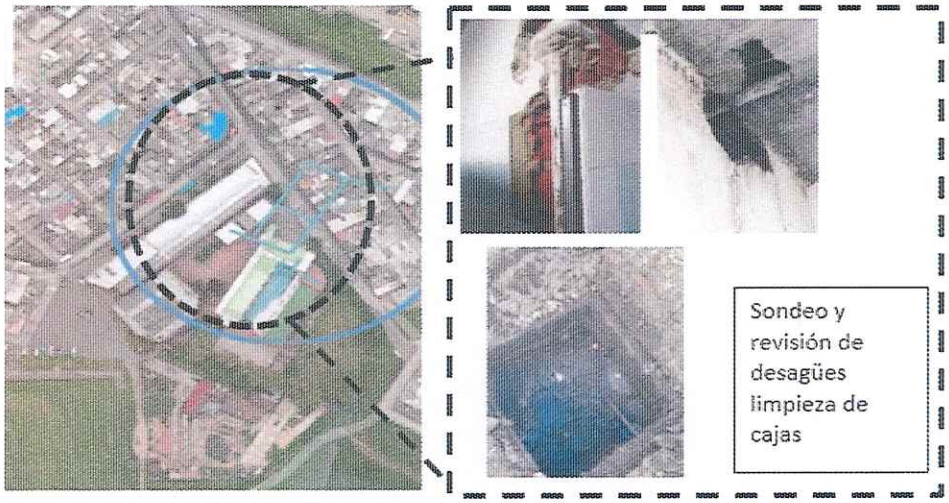

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

COLEGIO DISTRITAL	JOSE MARTI	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta por muro en riesgo de colapso	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Realizar desmonte de elementos estructurales y no estructurales	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar cerramiento	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Desmonte de elementos • Cerramiento	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

COLEGIO DISTRITAL	SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por inundación en el baño piso 3 de mujeres	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se debe realizar exploración para verificar daños	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar verificación de daños y cambio de tuberías	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cambio de tuberías	


REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

Colegio	DISTRITAL FERNANDO MAZUERA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentan falla hidráulica	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentran falla hidráulica y por falta de equipos hidroneumáticos	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Lavado y desinfección de tanque subterráneo, suministro e instalación de bomba.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Impermeabilizante bronco elastic • Desagüe e instalaciones subterráneas • Lavado y desinfección de tanque subterráneo	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

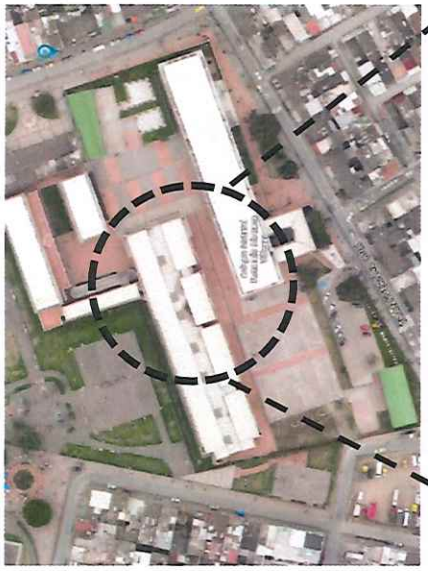





Lavado y desinfección de tanque




Impermeabilizante bronco elastic

Desagüe e instalaciones

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL CASTILLA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentan emergencia por posible colapso de estructura en mampostería	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentran grietas y fisuras en muro de fachada	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Demolición de estructura y construcción de muro en ladrillo. Instalación de ventaneria y carpintería	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Muro en ladrillo tolete • Desmonte de construcciones existentes • Limpieza e impermeabilización de fachadas	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

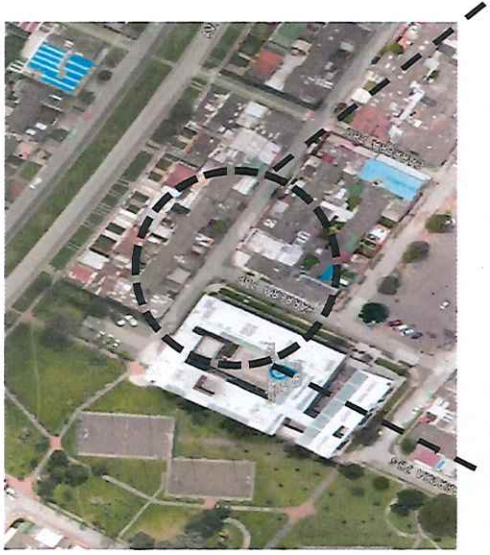





Desmonte de construcciones existentes



Muro en ladrillo tolete

Limpieza e impermeabilización

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR · BOGOTÁ D.C 2016-2019 — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Colegio	DISTRITAL JOSE ASUNCION SILVA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por muros en riesgo de colapso	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Desmonte de elementos estructurales, realizando nuevamente muro en mampostería estructural con refuerzos	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Desmonte de los muros, reinstalación de los mismos	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Desmonte de los muros • Instalación de ventanas • Retiro de escombros	


REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Desmonte de los muros



Instalación de ventanas

Retiro de escombros

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

COLEGIO DISTRITAL	LOS NARANJOS	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Características morfo tópicas representan un riesgo inminente para la comunidad	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Tala de un árbol de la especie acacia japonesa	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Tala de un árbol	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	Tala de un árbol de la especie acacia japonesa	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nª5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

COLEGIO DISTRITAL	LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Existe riesgo de daño en el acabado de piso y entramado de madera, que puede ocasionar accidentes a la comunidad educativa.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Cambio de piso madera sapan, verificación de entramado de madera y cambio de guarda escoba.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Cambio de piso madera sapan	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	Desmonte de piso Resanes generales Aseo general Instalación piso madera	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

COLEGIO DISTRITAL	PRADO VERANIEGO ELECTRICO	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentan emergencia por falta de iluminación	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentran ausencia de iluminación	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Acometidas y conductores para salida de lámparas incandescentes	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Salida de lámparas incandescentes • Vinilo bajo placa • Cuadrilla	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

COLEGIO DISTRITAL	PRADO VERANIEGO BAÑOS	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentan emergencia sanitaria	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentran deterioro en aparatos sanitarios	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Demolición de aparatos sanitarios, placa maciza y enchapes cerámicos	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Desmonte aparatos sanitarios • Desagüe para aguas negras • Suministro de sanitarios	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Desmonte aparatos sanitarios



Desagüe para aguas negras

Suministro de sanitarios

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nº5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Colegio	DISTRITAL JUANA ESCOBAR SEDE A	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	La paca del segundo piso en losas de concreto, presenta deterioro, humedades en primer piso y colapso, generando riesgo para la comunidad educativa.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se presenta la emergencia de piso en losa de concreto en mal estado con grietas en estado vetustez	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Desmonte y reposición del área afectada.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cerramiento provisional • Desmonte de piso • Sondeo de canales y bajantes • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN





Desmonte de piso



Cerramiento provisional



Aseo y limpieza

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

Colegio	DISTRITAL LA AMISTAD	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por elementos estructurales del aula de música en riesgo de colapso.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Desmonte de elementos estructurales del aula de música en riesgo de colapso	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Cómo compensación con insonorización del aula 220 y traslado los equipos para puesta en marcha de las actividades musicales	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Desmonte de elementos estructurales • Insonorización del aula • Aseo	


REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Desmonte de elementos estructurales



Insonorización del aula

Aseo

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nª5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

COLEGIO DISTRITAL	ALFONSO REYES ECHANDIA	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Aulas afectadas por explosión.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Sondeo y destaponamiento de cajas de inspección	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Sondeo Destaponamiento de cajas de inspección	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	Sondeo y verificación de desagües Limpieza de cajas de inspección	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Colegio	DISTRITAL OEA		
Estado actual	EN EJECUCCION		100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Inundación cuarto de bombas proveniente de tanque de almacenamiento subterráneo.		
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Tanque subterráneo en estado de colapso		
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	construir un tanque de recolección de aguas lluvias y todas las obras civiles pertinentes para la ejecución de la propuesta		
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• demolición de placa contra piso • excavación de tierra común • cerramiento provisional • aseo y limpieza		

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN





RESULTADOS OBTENIDOS	Eliminación de humedades e inundaciones evitando posible riesgo en la comunidad estudiantil ponemos en periodo de prueba el sistema constructivo estas actividades serán terminadas en el siguiente periodo

042

COLEGIO DISTRITAL	USAQUEN	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia de cerramiento y limpieza.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentran construcciones existentes en colapso, residuos de escombros y basuras.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Demolición de construcciones existentes, excavación manual y relleno súbase granular.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Desmonte, traslado y reubicación de casetas prefabricadas • Demolición de construcciones existentes • Limpieza, descapote y retiro de sobrantes	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Desmonte, traslado y reubicación de casetas prefabricadas



Demolición de construcciones

Limpieza, descapote y retiro de sobrantes

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

COLEGIO DISTRITAL	RUFINO JOSE CUERVO	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	El colegio se encuentra sin suministro de agua debido a acciones vandálicas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Suministro e instalación de contador de 1,5 con protección adicional para evitar posibles robos.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Suministro e instalación de contador de 1,5	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	Cerramiento Demolición de estructura en concreto Grafil Acero de refuerzo	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nº5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

COLEGIO DISTRITAL		REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Las características morfo tópicas representan un riesgo inminente para la comunidad académica	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Tala de tres árboles, dos de la especie acacia baracatinga un hayuelo relacionado paraserianthes	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Tala de dos árboles de la especie acacia baracatinga Tala de un hayuelo relacionado paraserianthes	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	Desmonte de cubierta Caballete Instalación de cubierta	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN




RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nª5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

COLEGIO DISTRITAL	SIMON BOLIVAR SUBA SEDE C	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta daño de sistema hidroneumático por falla del mismo generando desabastecimiento de agua potable.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	se presenta falla en equipo hidroneumático, como bombas e hidro acumulador	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Verificar el sistema hidroneumática y proceder a la reparación inicial y cambio de elementos necesarios.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cambio de accesorios • Mantenimiento quipos hidroneumáticos • Calibración de voltajes y presión.	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

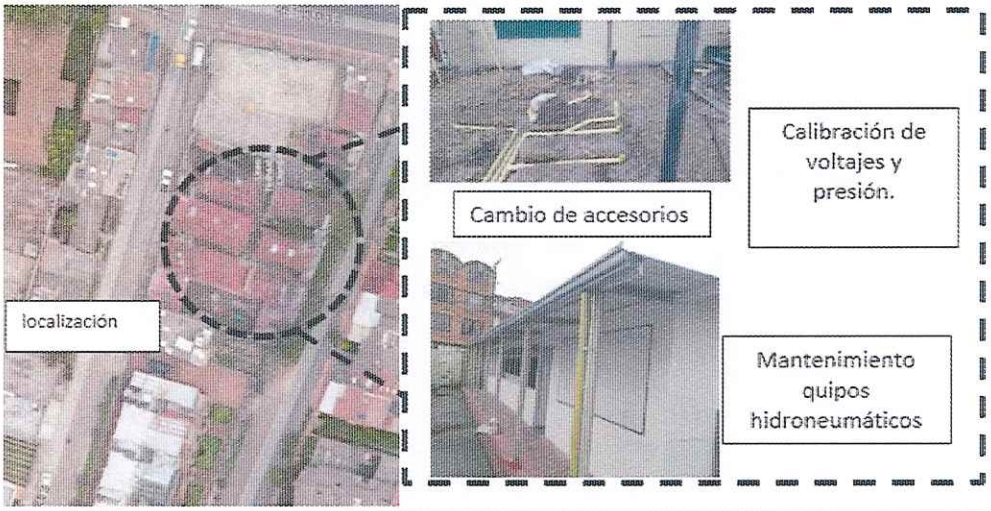

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nº5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

COLEGIO DISTRITAL	ESPAÑA SEDE B	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Persiste el colapso del cielo raso por la vetustez del elemento.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Desmonte de cielo raso existente, instalación de cielo raso liviano.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Desmonte de cielo raso existente, instalación de cielo raso liviano.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	Desmonte de cielo raso existente Cerramiento Instalación de cielo raso	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

INTERVENCIÓN	NO 9	
Colegio	DISTRITAL FERNANDO GONZALES OCHOA	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta afloración de agua permanente en equipos hidroneumáticos de la cocina de compensar generando problemas de salubridad e inconvenientes a la institución educativa.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se presenta la emergencia daños en equipos hidroneumáticos y accesorios	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Verificación de la problemática y exploración de tubería empotrada revisión de equipos hidroneumáticos para realizar la respectiva reparación y/o cambio tanto de la tubería, accesorios, como equipos hidroneumáticos de ser necesario.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Tubería pvc de ½ " • Registro paso directo de 1 ½ " • Accesorios de tuberías • Reparación de puntos eléctricos	
REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN		
RESULTADOS OBTENIDOS	Se realizaron las exploraciones existentes se encontraron rupturas en tuberías de las conexiones de los equipos hidroneumáticos	






COLEGIO DISTRITAL	GABRIEL BETANCOURT MEJIA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por aulas prefabricas y presencia de escombros.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentran residuos de escombros y basuras.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Retiro de sobrantes, cargue transporte y disposición final de escombros, trasiego de material, instalación casetas prefabricadas.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cerramiento provisional • Cargue y retiro de escombros • Trasiego	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Cerramiento provisional



Cargue y retiro de escombros

Trasiego

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nª5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INTERVENCIÓN	NO 22	
Colegio	DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ SEDE A	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	inundación por fuertes precipitaciones - riesgo de energización de aulas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Por el fuerte periodo de lluvia se presenta inundaciones y goteras en los salones de la institución	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Sondeo y limpieza de canales, bajantes y cajas – eléctrico cambio de cableado	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• limpieza de canales • sonde cajas • cambio de cableado eléctrico • sonde de bajantes	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN




RESULTADOS OBTENIDOS	Eliminación de humedades y goteras puesta en marcha las clases se mitiga la emergencia de forma eficiente

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


INTERVENCIÓN	NO 23	
Colegio	DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ SEDE B	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	inundación por fuertes precipitaciones - riesgo de energización de aulas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Por el fuerte periodo de lluvia se presenta inundaciones y goteras en los salones de la institución	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Sondeo y limpieza de canales, bajantes y cajas – eléctrico cambio de cableado	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• limpieza de canales • sonde cajas • cambio de cableado eléctrico • sonde de bajantes	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

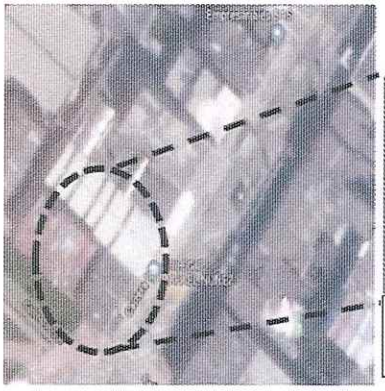



Aseo y limpieza



Limpiezas de canales



sondeos de bajantes

RESULTADOS OBTENIDOS	Eliminación de humedades y goteras puesta en marcha las clases se mitiga la emergencia de forma eficiente

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nº5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Colegio	DISTRITAL LA VICTORIA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	inundación por fuertes precipitaciones - riesgo de energización de aulas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Por el fuerte periodo de lluvia se presenta inundaciones y goteras en los salones de la institución	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Sondeo y limpieza de canales, bajantes y cajas – eléctrico cambio de cableado	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• limpieza de canales • sonde cajas • cambio de cableado eléctrico • sonde de bajantes	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	Eliminación de humedades y goteras puesta en marcha las clases se mitiga la emergencia de forma eficiente


Colegio	DISTRITAL GERARDO PAREDES	
Estado actual	En ejecución	90%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por no prestación de servicio de los equipos en la cocina.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Falla en equipos y re calentamiento de rede.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Verificación del estado de los equipos y redes.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cambio de acometidas • Cambio de breiker • Balance de cargas	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

Colegio	DISTRITAL ALMIRANTE PADILLA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	inundación por fuertes precipitaciones - riesgo de energización de aulas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Por el fuerte periodo de lluvia se presenta inundaciones y goteras en los salones de la institución	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Sondeo y limpieza de canales, bajantes y cajas -- eléctrico cambio de cableado	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• limpieza de canales • sondeo cajas • cambio de cableado eléctrico • sonde de bajantes	
REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓ		
RESULTADOS OBTENIDOS	Eliminación de humedades y goteras puesta en marcha las clases se mitiga la emergencia de forma eficiente	

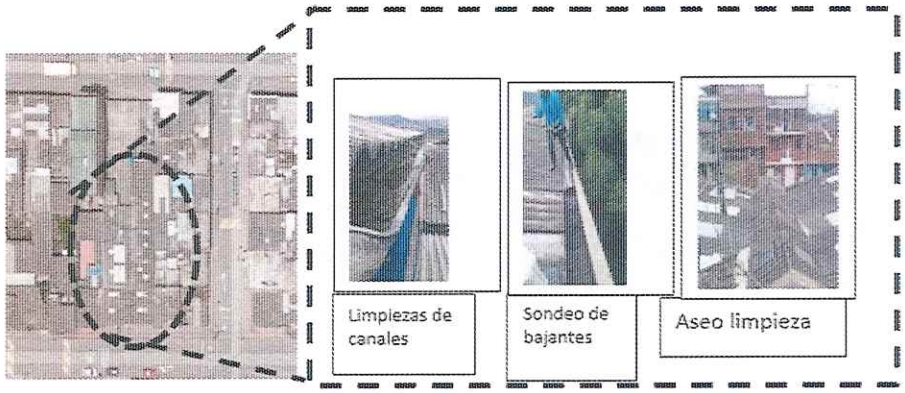

Colegio	DISTRITAL MARIA CANO	
Estado actual	EN EJECUCCION	80%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentó anegación total del área adyacente posterior a la cocina, generando emergencia sanitaria.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Exploración de redes sanitarias y pluviales, reparación, cambio y/o re direccionamiento de redes.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Reparación, cambio y/o re direccionamiento de redes y exploración.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Excavación • Relleno • Demolición muro	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN





Excavación



Relleno




Demolición muro

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

COLEGIO	DISTRITAL BRISAS	
ESTADO ACTUAL	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentó un deslizamiento afectando el normal tránsito tanto de peatones como de vehículos	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	se presenta la emergencia de muro colapsado desplomado	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Desmonte del muro en riesgo y retiro de escombro, limpieza de talud y adecuación del mismo retirando en forma permanente el riesgo.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cerramiento provisional • Descapote • Demolición de muro • Excavación manual • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

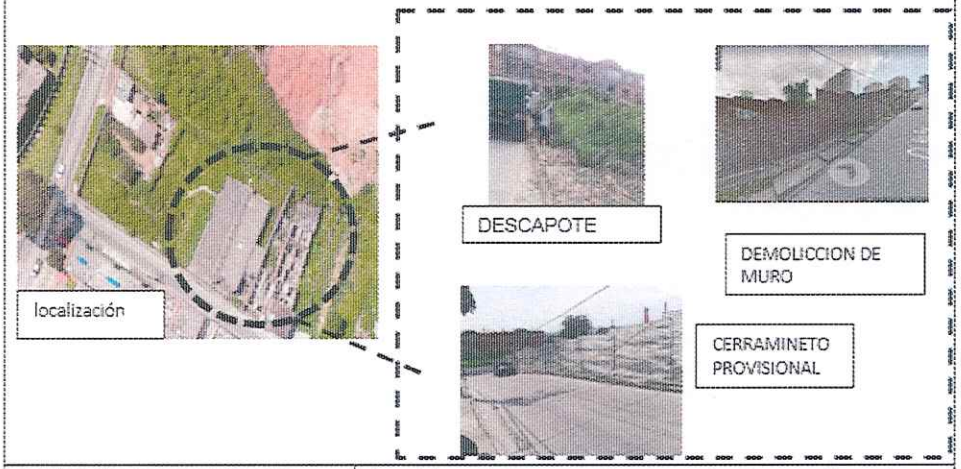

RESULTADOS OBTENIDOS	Se mitigo el riesgo se dio en uso la vía y se efectuó descargue del peso del talud como se efectuó cerramiento provisional

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Colegio	DISTRITAL MENUEL CEPEDA VARGAS	
Estado actual	Terminado	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se requiere el desmonte de los elementos provisionales del Costado Norte de la institución educativa por el alto riesgo que estos generan de una posible invasión, así como el posible colapso por el cumplimiento de su vida útil.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se presenta la emergencia de aulas provisionales en peligro de desplome	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Desmonte de los elementos estructurales y no estructurales y disposición de los mismos en sitios autorizados teniendo en cuenta que no se puede realizar ningún tipo de aprovechamiento debido al alto grado de deterioro y oxido que estos presentan.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cerramiento provisional • Demoliciones de contriciones existentes	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	Se mitiga la emergencia de aulas y se recupera el espacio beneficiando a la institución

Colegio	DISTRITAL NUEVA CONSTITUCION	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia riesgo eléctricos en el área de cocina.	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentra conexiones flotantes en tableros eléctricos carga de voltaje alta y falta de acometidas eléctricas	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Ejecutar todas las actividades eléctricas pertinentes pa .	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Instalación de tubería emt de 2 pulgadas • Cableado eléctrico • Breker industrial • Cofres eléctricos de 60 x60	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Tubería emt 2



Cableado electrico

Breker industrial

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

Colegio	DISTRITAL LOTE SAN DIEGO	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por colapso de cerramiento	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentra colapsado el cerramiento de malla eslabonada , tramos sin cerramiento	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Se encuentra cerramiento colapsada, se procede a realizar reparación de malla eslabonada, desmonte de muro en mal estado conservando su integridad y selección de material.	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Retiro de escombros • Reparación de malla eslabonada • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Retiro de escombros




Reparación de cerramiento

Aseo

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

Colegio	DISTRITAL PORVENIR	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia colegio sin suministro de agua	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Equipos en hidroneumáticos en estado de vetustez accesorios y registros hidráulicos averiados fallas en voltaje	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Ejecutar los arreglos necesarios para garantizar el suministro de agua en el colegio	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cambio de accesorios registro chequers • Suministro e instalación de moto bombas • Cambio de flotadores	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

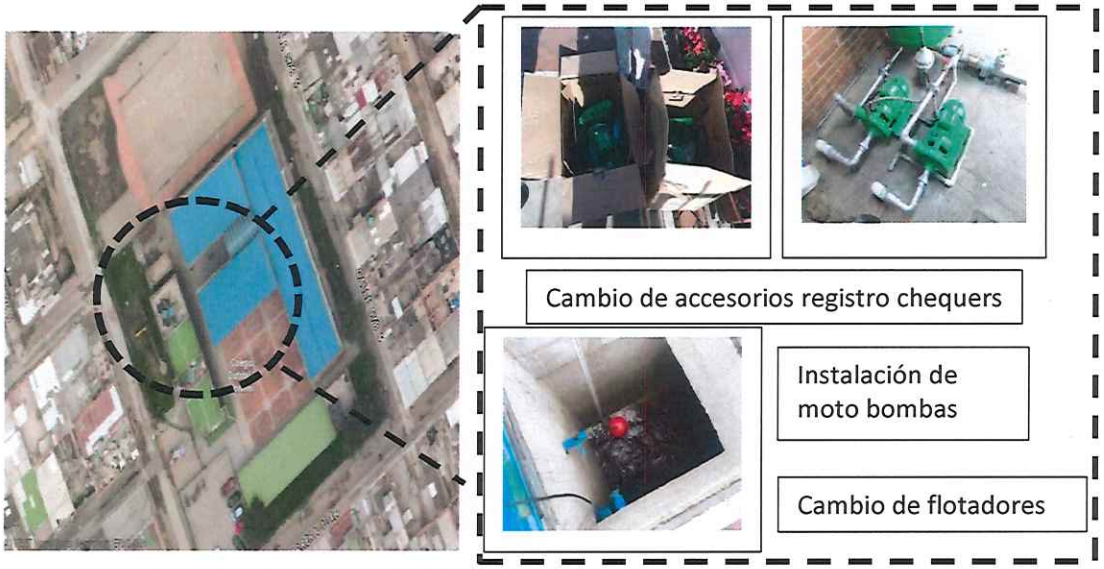

RESULTADOS OBTENIDOS	Puesta en marcha el suministro de agua en la institución

Colegio	DISTRITAL HELADIO MEJIA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentan averías en equipos hidroneumáticos institución sin agua	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Equipos hidroneumáticos en estado de vetustez sin funcionamiento accesorios y registro hidráulicos dañados tableros eléctricos sin funcionamiento	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Ejecutar todas las actividades necesarias para funcionamiento de equipos hidroneumáticos y tableros eléctricos	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Instalación de moto bombas • Tableros eléctricos y elementos eléctricos • Accesorios registro y chequers hidráulicos	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Tableros eléctricos



Accesorios registro hidraulicos

Suministro de moto bombas

RESULTADOS OBTENIDOS	Puesta en marcha el suministro de agua en la institución

Colegio	DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia shut de basuras	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentra estructura del shut de basuras en condiciones por secretaria de salud desfavorables.	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Adecuar todo el espacio con las normativas para un normal funcionamiento del shut	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Pintura epoxica • Media caña en cemento • ´punto hidráulico	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Pintura epoxica



Media caña en cemento

Punto hidráulico

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad

Colegio	DISTRITAL LAUREANO GOMEZ MURO	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia por colapso en muros de las aulas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentra estructura de pared de las aulas afectadas por vandalismo	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos pertinentes para mitigar el riesgo de cualquier accidente	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Suministro instalación de muros en eternil • Pintura vinilo en muros • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Instalación de laminas en eternil



Pintura vinilo en muros

Aseo y limpieza

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL CHUNIZA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia escape de gas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Emisiones de gas altas en cocina y patio de la cocina	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos pertinentes en la acometida de gas principal	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Suministro instalación de muros en eternil • Pintura vinilo en muros • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Limpieza y descapote



Excavación manual en tierra

Instalación interna de gas

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL LUIS ANGEL ARANGO LA CABAÑA	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Colegio sin suministro de agua	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Equipos hidroneumáticos y elementos eléctricos presentan fallas por estado de abondo	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos pertinentes para poner en marcha los equipos hidroneumáticos existentes	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cuadrilla de 1 oficial especializado • Aseo limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







aseo y limpieza



Cuadrilla 1 oficial especializado

Aseo y limpieza

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL JULIO GARABITO	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Fallas ausencia de electricidad en pasillos y puntos fijos	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Falta de energía en tablero principal	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Instalar una acometida desde el tga principal de condensa hacia el cuarto de circuito existente	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Cableado eléctrico} • Tubería emt • Gabinete eléctrico 30x30x60	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN







Cableado eléctrico




Tubería emt

Gabinete eléctrico 30x30x60

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL KENNEDY HEROES	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia escape de gas en cocina de compensar	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	emisiones de gas altas en toda la cocina cierre de cocina	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos pertinentes en la cocina y mitigar las fugas y emisiones de gas	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Demolición de enchape • Registro de 1 “ • Accesorios en cobre	


REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

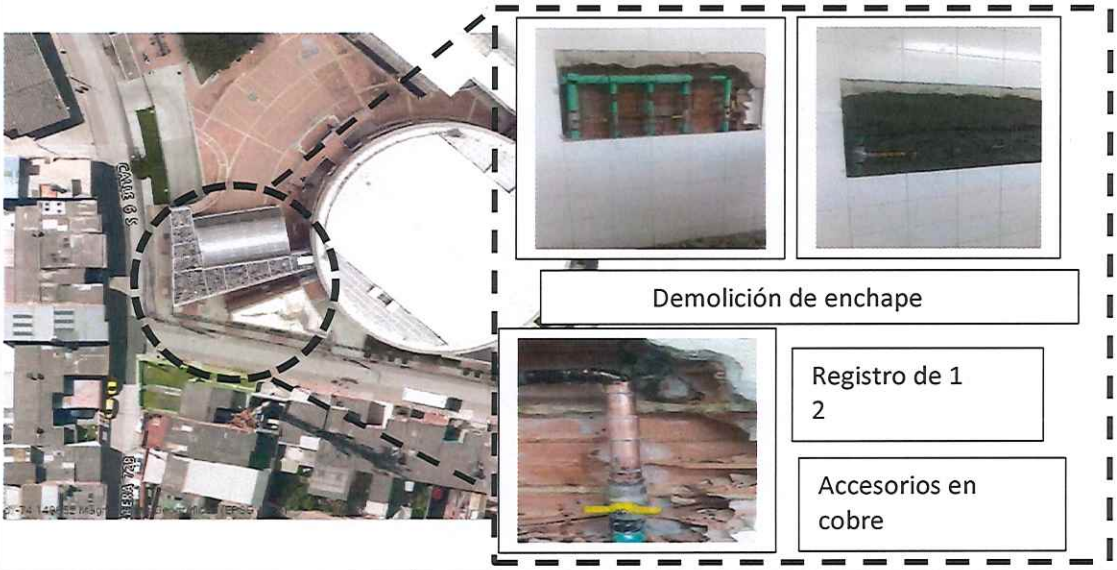

RESULTADOS OBTENIDOS	Puesta en marcha la funcionabilidad de la cocina

Colegio	DISTRITAL VILLA DEL PROGRESO AULAS	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia colapso de aula	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentra estructura de pared de las aulas afectadas con riesgo de desplome	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos pertinentes para mitigar el riesgo de cualquier accidente	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Traslado y reubicación de aulas • Instalación de losetas prefabricadas • Cielo raso pvc	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

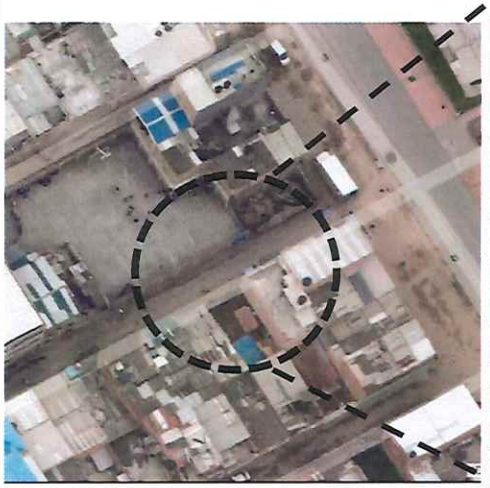





Traslado y reubicación de aulas




Instalación de losetas prefabricadas

Cielo raso pvc

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL SUBA SIMÓN BOLÍVAR MOTO BOMBAS	
Estado actual	**EN EJECUCCION**	**100%**
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Colegio sin suministro de agua	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Equipos hidroneumáticos y elementos eléctricos presentan fallas por estado de abondo	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos pertinentes para poner en marcha los equipos hidroneumáticos existentes	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Accesorios hg 2 " • Cableado eléctrico • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

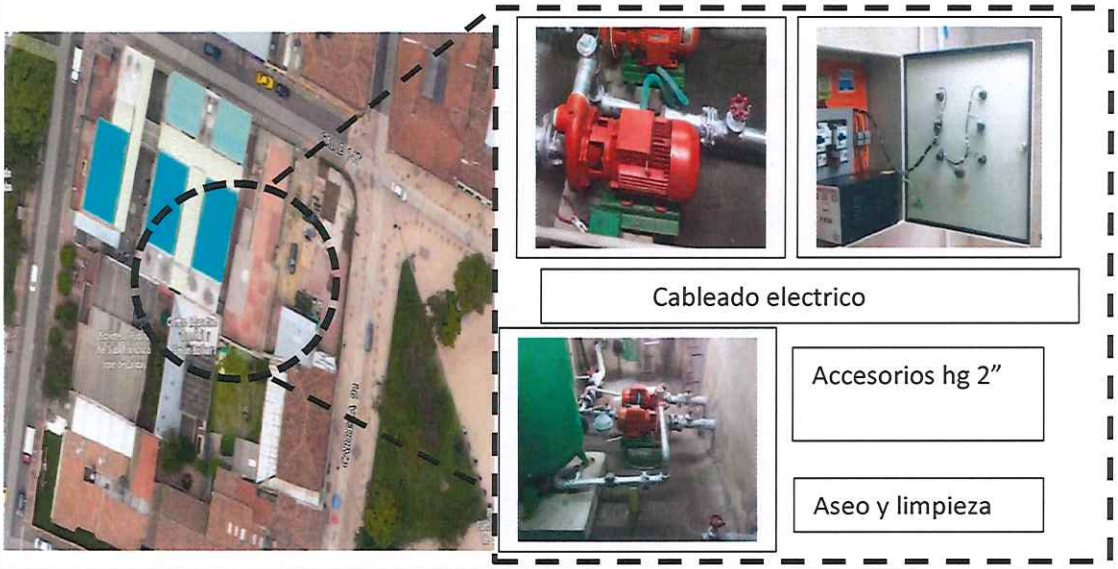

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL SUBA SIMON BOLIVAR HUMEDADES	
Estado actual	**EN EJECUCCION**	**100%**
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentan emergencias humedades en muros y placa de oficinas administrativas	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se evidencia goteras y humedades en muros placa contra piso en oficinas administrativas provenientes de los baños	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos y exploraciones pertinentes para corregir las humedades	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Demolición de muro tolete • Desmonte aparatos sanitarios • Accesorios pvc	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN



RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL JOSE JOAQUIN CASAS	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presenta emergencia sanitaria	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentra la institucion sin vertimientos de aguas sanitarias	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Mitigar la emergencia con baños portátiles	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Batería de baños portátiles • Aseo y limpieza	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN





BATERIAS DE BAÑOS PORTATILES




Aseo y limpieza

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

Colegio	DISTRITAL CALASANZ	
Estado actual	EN EJECUCCION	100%
DESCRIPCION DE LA SOLICITUD ESTABLECIDA POR LA ENTIDAD	Se presentan fallas eléctricas en la institución	
VERIFICACION EN SITIO POR PARTE DEL CONSTRUCTOR E INTERVENTOR	Se encuentran conexiones eléctricas flotantes y tableros eléctricos en estado de abandono	
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR LA ENTIDAD	Realizar los arreglos pertinentes eléctrico cambio de tableros reparaciones eléctricas en la conexiones	
PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO	• Reparación de puntos eléctricos • Instalación de tablero eléctrico para moto bombas • Cableado eléctrico	

REGISTRO GRAFICO DE LA EJECUCIÓN

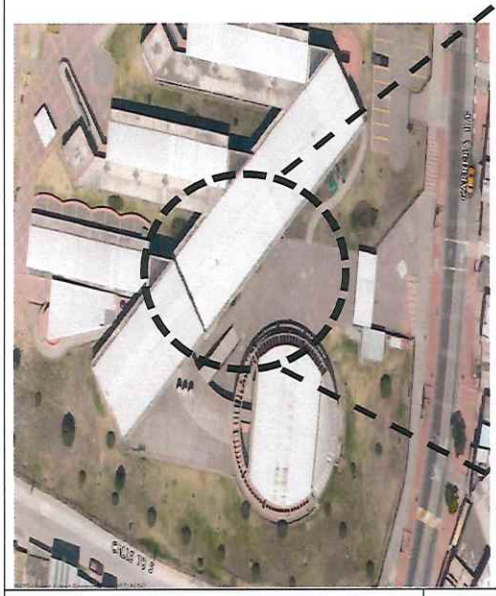





Tablero para moto bombas



Reparación de puntos eléctricos

Cableado electrico

RESULTADOS OBTENIDOS	El contratista ejecuto las actividades informada por la entidad mitigando el riesgo en su totalidad en las aulas

5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

El proyecto es financiado por la Secretaria de Educación Distrital – Alcaldía Mayor – Secretaria de Hacienda Distrital está dado por un valor de Dos mil quinientos setenta y ocho millones seiscientos ochenta mil pesos MDA/CTE ($2.578.680.000).

El proyecto de obra está programado para realizarse en 8 meses y 10 días acorde al acta de inicio del contrato, con una totalidad de 39 semanas, hasta el corte de este informe es decir 05 de julio del 2019, nos encontramos finalizando la semana número 20.

Con respecto a la ejecución de obras durante estas semanas se han ejecutado diferentes obras de características contractuales incluidas en el anexo técnico del contrato.
Si bien es cierto el contrato es por demanda, y no se efectuó una posible programación asociada a cantidades de obra al que se pudiera efectuar un seguimiento, teniendo en cuenta la naturaleza del contrato, si se desarrolló el seguimiento por parte del contratista a la inversión desarrollada y acumulada en el trascurso del periodo, así como se pudo cruzar con la expectativa programada.

5.1 FLUJO DEL CONTRATO

A continuación, se presenta tabla de avance de obra semanal:

SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO	% AVANCE / RETRASO
Semana 1	2,56%	3,45%	$ 66.120.000,00	$ 89.090.291,15	0,89%
Semana 2	5,13%	10,36%	$ 132.240.000,00	$ 267.270.873,45	5,24%
Semana 3	7,69%	15,10%	$ 198.360.000,00	$ 389.451.844,17	7,41%
Semana 4	10,26%	19,74%	$ 264.480.000,00	$ 509.087.378,00	9,49%
Semana 5	12,82%	24,68%	$ 330.600.000,00	$ 636.359.222,50	11,86%
Semana 6	15,38%	32,18%	$ 396.720.000,00	$ 829.812.426,14	16,80%
Semana 7	17,95%	36,52%	$ 462.840.000,00	$ 941.811.649,30	18,57%
Semana 8	20,51%	42,05%	$ 528.960.000,00	$ 1.084.356.115,14	21,54%
Semana 9	23,08%	47,97%	$ 595.080.000,00	$ 1.237.082.328,54	24,90%
Semana 10	25,64%	54,88%	$ 661.200.000,00	$ 1.415.262.910,84	29,24%
Semana 11	28,21%	62,78%	$ 727.320.000,00	$ 1.618.897.862,04	34,57%
Semana 12	30,77%	67,32%	$ 793.440.000,00	$ 1.735.987.958,98	36,55%
Semana 13	33,33%	71,47%	$ 859.560.000,00	$ 1.842.896.308,36	38,13%
Semana 14	35,90%	77,39%	$ 925.680.000,00	$ 1.995.622.521,76	41,49%
Semana 15	38,46%	82,92%	$ 991.800.000,00	$ 2.138.166.987,60	44,46%
Semana 16	41,03%	89,23%	$ 1.057.920.000,00	$ 2.301.074.948,56	48,21%
Semana 17	43,59%	93,18%	$ 1.124.040.000,00	$ 2.402.892.424,16	49,59%
Semana 18	46,15%	97,33%	$ 1.190.160.000,00	$ 2.509.800.773,54	51,18%
Semana 19	48,72%	103,25%	$ 1.256.280.000,00	$ 2.662.526.986,94	54,53%
Semana 20	51,28%	111,35%	$ 1.322.400.000,00	$ 2.871.252.811,92	60,06%

5.2 ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO.

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO				
	VLR INICIAL	VLR EJECUTADO	VLR POR EJECUTAR	% EJECUTADO	% POR EJECUTAR
VLR CONTRATO INICIAL	$ 2.578.680.000	-	$ 2.578.680.000	-	100.00%
VLR CONTRATO ADICIONAL	$ -	-	$-	-	100.00%
VLR CONTRATO TOTAL	$ 2.568.000.000	-	$ 2.568.000.000	-	100,00%
ANTICIPO	No aplica	-	-	-	-
ACTA RECIBO PARCIAL No. 1		$ 509.087.378,00	$ 2.058.912.622	19,82%	80,18%
ACTA RECIBO PARCIAL No. 2	-	$ 437.991.182,00	$ 1.620.921.440	21,27%	58,90%
ACTA RECIBO PARCIAL No. 3	-	$ 457.860.306,00	$ 1.163.061.134	28,25%	30,66%
ACTA RECIBO PARCIAL No. 4	-	$ 413.287.970,00	$ 749.773.164	35,53%	23,37%
ACTA RECIBO PARCIAL No. 5	-	$ 463.076.684,70	$ 699.984.449	39,82%	
ACTA RECIBO PARCIAL No. 6	-				

5.3 INVERSION POR FRENTES.

Nº	COLEGIO	VALOR
1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL BRISAS	$ 368.752,00
2	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL VERJON	$ 3.718.356,48
3	INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL CEPEDA - CONTINGENCIA	$ 27.186.845,40
4	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN JERONIMO DEL YUSTE	$ 621.863,04
5	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LAS MARGARITAS	$ 14.150.804,40
6	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SIMON BOLIVAR SEDE C	$ 4.518.924,17
7	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GERARDO PAREDES	$ 1.808.656,00
8	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MARIACANO	$ 14.307.075,64
9	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO - CUBIERTA	$ 1.842.301,12
10	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO GONZALEZ OCHOA	$ 550.280,00
11	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA VICTORIA INVERNAL	$ 49.180,80
12	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ SEDE B INVERNAL	$ 150.665,60
13	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALMIRANTE PADILLA INVERNAL	$ 310.383,16
14	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RAFAEL NUÑEZ SEDE A INVERNAL	$ 121.889,00
15	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MERCEDES NARIÑO PISO BLOQUE CONSERVACION	$ 9.178.826,69
16	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL RUFINO JOSE CUERVO	$ 10.436.163,18
17	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ALFONSO REYES ECHANDIA	$ 368.706,44
18	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL O.E.A	$ 3.983.366,15
19	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ESPAÑA	$ 1.264.025,04
20	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS	$ 431.821,08


21	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JUANA ESCOBAR	$ 13.364.400,82
22	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO - ELECTRICO	$ 2.091.982,04
23	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LA AMISTAD	$ 12.010.670,27
24	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LOTE SAN DIEGO	$ 10.048.531,65
25	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA	$ 6.565.967,45
26	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CASTILLA BLOQUE ESTRUCTURAL	$ 22.680.878,05
27	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL GABRIEL BETANCOURTH MEJIA INUNDACION	$ 22.020.554,32
28	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ELPORVENIR EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	$ 26.110.476,00
29	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CHUNIZA	$ 1.041.947,00
30	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CALASANZ BUENA VISTA EQUIPOS ELECTRICOS	$ 10.403.714,00
31	INSTITUCION EDUCATIVA HELADIA MEJIA EQUIPOS HIDRONEUMATICOS	$ 17.773.065,20
32	INSTITUCION EDUCATIVA FERNANDO MAZUERA	$ 33.870.583,60
33	INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTADER BASURAS	$ 2.266.394,94
34	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANGEL ARANGO LA CASONA EQUIPOS	$ 491.940,00
35	INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY HEROES COCINA	$ 621.491,20
36	INSTITUCION EDUCATIVA LAUREANO GOMEZ CONTINGENCIA AULAS	$ 1.473.020,00
37	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA HIDRUALICO	$ 312.519,36
38	INSTITUCION EDUCATIVA USAQUEN ACCESO	$ 16.240.084,73
39	INSTITUCION EDUCATIVA VILLAS DEL PROGRESO CONTINGENCIA AULAS	$ 19.104.164,35
40	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SUBA EQUIPOS	$ 933.578,00
41	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO LA CAPILLA VIA LA CALERA	$ 20.099.047,40
42	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NARANJOS TALA	$ 1.905.650,00
43	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE MARTI	$ 573.713,84
44	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	$ 586.578,91
45	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PRADO VERANIEGO HIDRAULICO	$ 687.966,06
46	INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DOMINICANA	$ 3.606.419,87
47	INSTITUCION EDUCATIVA HERNANDO DURAN DUSAN	$ 3.582.084,74
48	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL CRISTOBAL COLON	$ 2.284.865,28
49	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JOSE JOAQUIN CASAS	$ 1.370.663,04

6. EVOLUCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA.


La programación de obra avanzo acorde a las exigencias de cada uno de los frentes de trabajo asignados, para los cuales el contratista según el sistema constructivo y según necesidades previas al inicio de las obras efectuó un programación inicial acorde al diagnóstico desarrollado posterior a la visita inicial, en algunos casos puntuales los tiempos finales de ejecución correspondieron a la ampliación de plazo con base al incremento de obra a construir, los tiempos programados específicos para actividad que no se cumplieron a cabalidad, se debió a la presencia de fuertes lluvias, obstaculización de espacios por parte de la comunidad y otros aspectos externos a la construcción. En el transcurso de la obra se nivelaron dichos tiempos cumpliendo a cabalidad con las necesidades de los colegios

Se realizan entregas parciales al interventor y/o la Secretaria de Educación (colegios) según los requerimientos de las emergencias.

PROGRAMACION INFORME Nª1

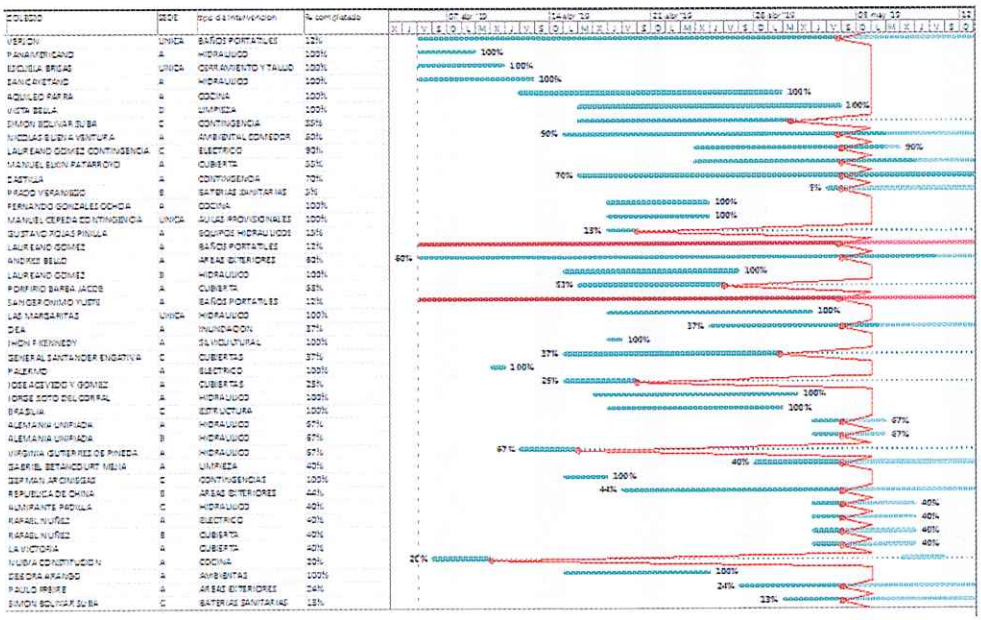

PROGRAMACION INFORME Nº2

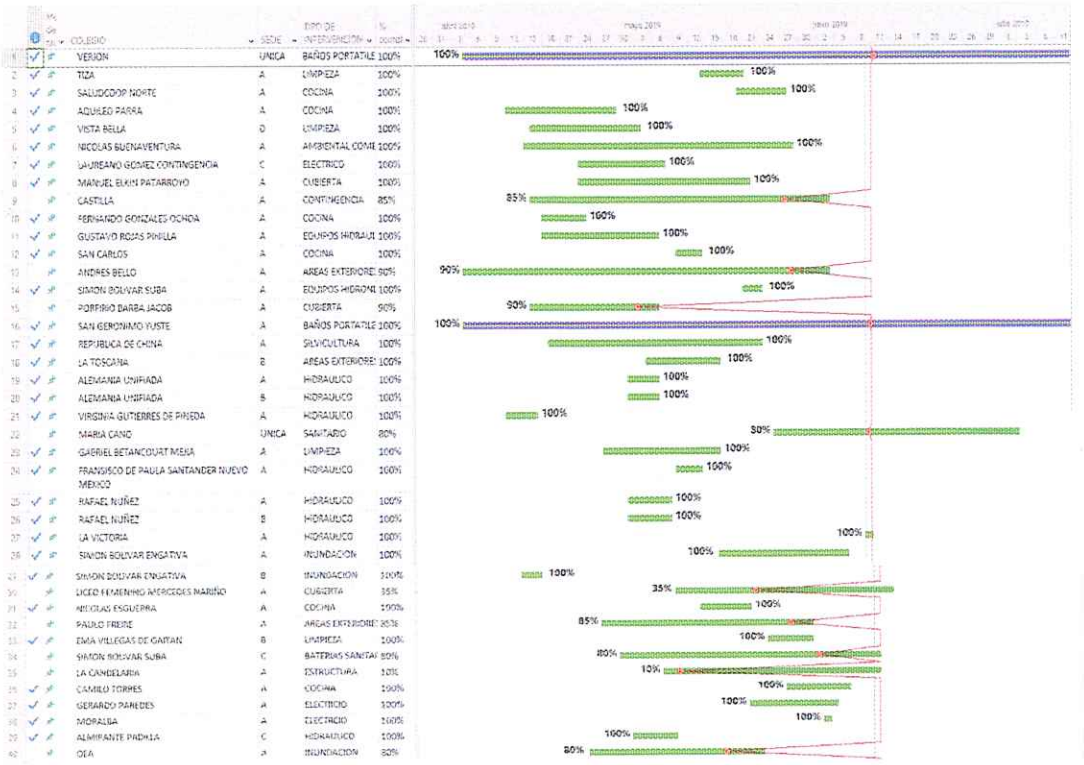


	COLEGIO	SEDE	TIPO DE INTERVENCION	% COMPLETADO
1	VERJON	UNICA	BAÑOS PORTATILE	100%
2	TIZA	A	LIMPIEZA	100%
3	SALUDCOOP NORTE	A	COCINA	100%
4	AQUILEO PARRA	A	COCINA	100%
5	VISTA BELLA	D	LIMPIEZA	100%
6	NICOLAS BUENAVENTURA	A	AMBIENTAL COME	100%
7	LAUREANO GOMEZ CONTINGENCIA	C	ELECTRICO	100%
8	MANUEL ELKIN PATARROYO	A	CUBIERTA	100%
9	CASTILLA	A	CONTINGENCIA	85%
10	FERNANDO GONZALES OCHOA	A	COCINA	100%
11	GUSTAVO ROJAS PINILLA	A	EQUIPOS HIDRAUL	100%
12	SAN CARLOS	A	COCINA	100%
13	ANDRES BELLO	A	AREAS EXTERIORE	90%
14	SIMON BOLIVAR SUBA	A	EQUIPOS HIDRAUL	100%
15	PORFIRIO BARBA JACOB	A	CUBIERTA	90%
16	SAN GERONIMO YUSTE	A	BAÑOS PORTATILE	100%
17	REPUBLICA DE CHINA	A	SILVICULTURA	100%
18	LA TOSCANA	B	AREAS EXTERIORE	100%
19	ALEMANIA UNIFIADA	A	HIDRAULICO	100%
20	ALEMANIA UNIFIADA	B	HIDRAULICO	100%
21	VIRGINIA GUTIERRES DE PINEDA	A	HIDRAULICO	100%
22	MARIA CANO	UNICA	SANITARIO	80%
23	GABRIEL BETANCOURT MEJIA	A	LIMPIEZA	100%
24	FRANSISCO DE PAULA SANTANDER NUEVO MEXICO	A	HIDRAULICO	100%
25	RAFAEL NUÑEZ	A	HIDRAULICO	100%
26	RAFAEL NUÑEZ	B	HIDRAULICO	100%
27	LA VICTORIA	A	HIDRAULICO	100%
28	SIMON BOLIVAR ENGATIVA	A	INUNDACION	100%
29	SIMON BOLIVAR ENGATIVA	B	INUNDACION	100%
30	LICEO FEMENINO MERCEDES MARIÑO	A	CUBIERTA	35%
31	NICOLAS ESGUERRA	A	COCINA	100%
32	PAULO FREIRE	A	AREAS EXTERIORE	85%
33	EMA VILLEGAS DE GAITAN	B	LIMPIEZA	100%
34	SIMON BOLIVAR SUBA	C	BATERIAS SANITAI	80%
35	LA CANDELARIA	A	ESTRUCTURA	10%
36	CAMILO TORRES	A	COCINA	100%
37	GERARDO PAREDES	A	ELECTRICO	100%
38	MORALBA	A	ELECTRICO	100%
39	ALMIRANTE PADILLA	C	HIDRAULICO	100%
40	OEA	A	INUNDACION	80%

ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL Nº5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Plantas ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

PROGRAMACION INFORME Nº3


	Modo de	COLEGIO	SEDE	TIPO DE INTERVENCION	% completad	Durac
1	✓	VERJON	UNICA	BAÑOS PORTATILES	100%	182 días
2	✓	AQUILEO PARRA	A	COCINA	100%	15 días
3		FILARMONICO SIMON BOLIVAR S	C	CONTINGENCIA	90%	30 días
4	✓	NICOLAS BUENAVENTURA	A	AMBIENTAL COMED	100%	15 días
5	✓	MANUEL ELKIN PATARROYO	A	CUBIERTA	100%	40 días
6	✓	CASTILLA	A	CONTINGENCIA	100%	60 días
7		LICEO FEMENINO MERCEDES NA	A	PISO	60%	65 días
8	✓	LUIS VARGAS TEJADA	B	EQUIPOS HIDRAULIC	100%	20 días
9	✓	LAUREANO GOMEZ BACHUE	B	HIDRAULICO	100%	35 días
10	✓	PORFIRIO BARBA JACOB	A	CUBIERTA	100%	18 días
11	✓	SAN GERONIMO YUSTE	A	BAÑOS PORTATILES	100%	185 días
12		LAS MARGARITAS	UNICA	HIDRAULICO	90%	54 días
13	✓	OEA	A	INUNDACION	100%	42 días
14	✓	LOS NARANJOS	A	SILVICULTURA	100%	3 días
15	✓	REPUBLICA DE CHINA	A	SILVICULTURA	100%	2 días
16	✓	ALEMANIA UNIFICADA	A	SILVICULTURA	100%	2 días
17	✓	SORRENTO	B	SILVICULTURA	100%	3 días
18	✓	CLEMENCIA HOLGUIN DE URDAI	B	SILVICULTURA	100%	3 días
19	✓	INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL FRANCISCO JOSE	A	SILVICULTURA	100%	6 días
20	✓	RODOLFO LLINAZ	A	COCINA	100%	15 días
21		GENERAL SANTANDER ENGATIVA	C	CUBIERTA	85%	54 días
22	✓	LA TOSCANA	B	AREAS EXTERIORES	100%	20 días
23	✓	JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	A	ELECTRICO	100%	54 días
24	✓	JORGE SOTO DEL CORRAL	A	HIDRAULICO	100%	17 días
25	✓	USAQUEN	A	CERRAMIENTO	100%	20 días
26	✓	FILARMONICO SIMON BOLIVAR	C	SILVICULTURA	100%	30 días
27	✓	MANUELITA SAENZ	A	SILVICULTURA	100%	12 días
28	✓	NUEVA CONSTITUCION	A	COCINA	100%	35 días
29		SIMON BOLIVAR ENGATIVA	B	INUNDACION	40%	14 días
30	✓	LICEO FEMENINO MERCEDES NA	A	CUBIERTA	100%	90 días
31	✓	ALFONSO REYES ECHANDIA	A	SANITARIO	100%	23 días
32	✓	NESTOR FORERO ALCALA	A	CARPINTERIA	100%	25 días
33		PAULO FREIRE	A	AREAS EXTERIORES	90%	23 días
34	✓	RUFINO JOSE CUERVO	B	CERRAMIENTO	100%	30 días
35	✓	RAFAEL DELGADO SALGUERO	A	CERRAMIENTO	100%	25 días
36		ESPAÑA	B	CUBIERTA	95%	28 días
37	✓	REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	A	CUBIERTA	100%	20 días
38	✓	ESCUELA HOGAR BERTHA HERNA	A	HIDRAULICO	100%	21 días
39		LA ESTANCIA	A	CUBIERTA	70%	18 días
40		JOSE ASUNCION SILVA	B	CERRAMIENTO	70%	12 días
41		MANUELA BELTRAN	A	CERRAMIENTO	70%	20 días

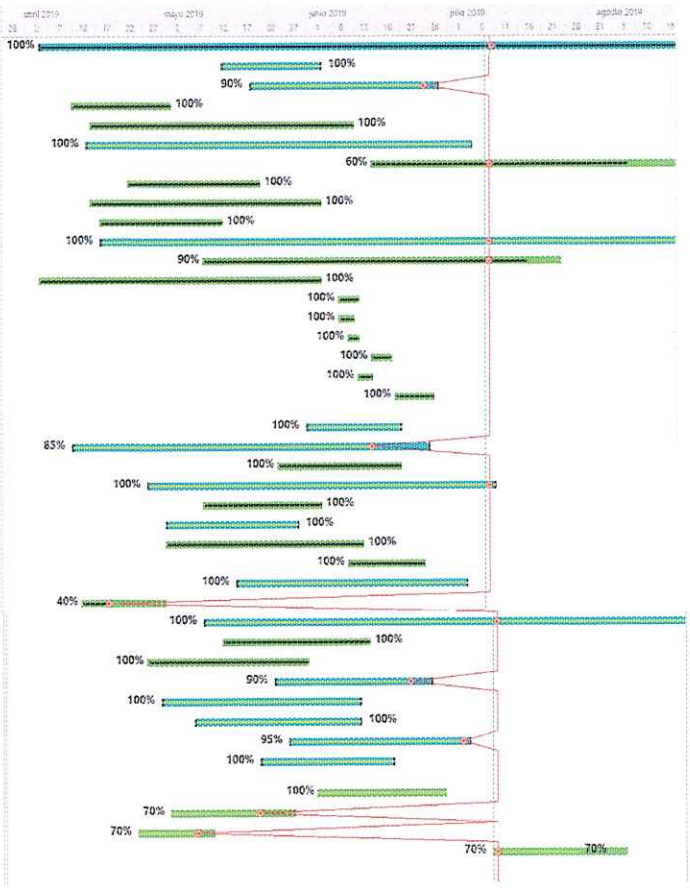

PROGRAMACION INFORME Nº4


ARQ. EVER JOSE SALGADO SALGADO	INFORME MENSUAL N°5	Secretaría de Educación D.C Sub Dirección de Planta ALCALDÍA MAYOR SANTA FE DE BOGOTÁ — BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS


	Modo de	COLEGIO	SEDE	TIPO DE INTERVENCION	%	Duracion
0		INFORME N°4				180 dia
1		LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	A	PISO	42 días	85%
2		GENERAL SANTANDER	C	CUBIERTA	63 días	100%
3		JUANA ESCOBAR	A	CUBIERTA	30 días	40%
4		LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	A	CUBIERTA	72 días	100%
5		MANUELA BELTRAN	A	CERRAMIENTO	15 días	70%
6		CASTILLA	A	CONTINGENCIA	50 días	100%
7		REPUBLICA DE CHILE	A	AREAS EXTERIORES	51 días	100%
8		FERNANDO MAZUER	A	HIDRAULICO	8 días	100%
9		MANUEL ZAPATA OLIVELLA	UNICA	CUBIERTA	54 días	100%
10		JOSE ACEVEDO Y GOMEZ	A	ELECTRICO	8 días	100%
11		RODOLFO LLINAS	A	COCINA	15 días	100%
12		LA AMISTAD	UNICA	ESTRUCTURA	10 días	50%
13		LOS LIBERTADORES	A	SHUT DE BASURA	10 días	100%
14		LOMBARDIA	A	LIMPIEZA	6 días	100%
15		JOSE ASUNCION SILVA	B	CERRAMIENTO	29 días	70%
16		PRADO VERANIEGO	B	BAÑOS	45 días	100%
17		LOS NARANJOS	UNICA	SILVICULTURAL	3 días	100%
18		PAULO FREIRE	UNICA	INUNDACION	5 días	100%
19		LA CANDELARIA	B	ESTRUCTURAL	62 días	90%
20		VERJON	UNICA	BAÑOS PORTATILES	180 días	100%
21		LAUREANO GOMEZ	A	BAÑOS PORTATILES	120 días	100%
22		SAN GERONIMO YUSTE	A	BAÑOS PORTATILES	120 días	100%
23		BOSA PORVENIR	A	BAÑOS PORTATILES	20 días	100%

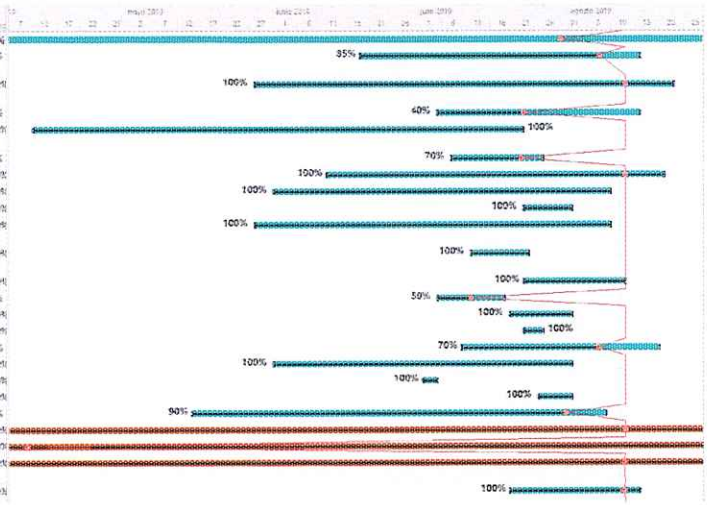

PROGRAMACION INFORME N°5

	Modo de	COLEGIO	SEDE	TIPO DE INTERVENCION	% cumplimiento	DURACION
1		BRISAS	A	CERRAMIENTO	100%	25 días
2		VERJON	A	BAÑOS PORTATILES	100%	180 días
3		LAUREANO GOMEZ	A	BAÑOS PORTATILES	100%	180 días
4		MANUEL CEPEDA - CONTINGENCIA	A	AULAS PROVISIONALES	100%	30 días
5		SAN JERONIMO DEL YUSTE	A	BAÑOS PORTATILES	100%	180 días
6		LAS MARGARITAS	A	HIDRAULICO	100%	20 días
7		SIMON BOLIVAR	C	BAÑOS PORTATILES	100%	80 días
8		GERARDO PAREDES	A	ELECTRICO	100%	8 días
9		MARIA CANO	UNICA	SANITARIO	100%	42 días
10		LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO	UNICA	CUBIERTA	100%	63 días
11		FERNANDO GONZALEZ OCHOA	A	COCINA	100%	12 días
12		LA VICTORIA	A	HIDRAULICO	100%	4 días
13		RAFAEL NUÑEZ	B	HIDRAULICO	100%	4 días
14		ALMIRANTE PADILLA	B	HIDRAULICO	100%	4 días
15		RAFAEL NUÑEZ	A	HIDRAULICO	100%	4 días
16		MERCEDES NARIÑO	A	PISOS	100%	60 días
17		RUFINO JOSE CUERVO	A	CERRAMIENTO	100%	19 días
18		ALFONSO REYES ECHANDIA	A	SANITARIO	100%	12 días
19		O.E.A	A	HIDRAULICO	100%	21 días
20		ESPAÑA	A	CUBIERTA	100%	32 días
21		REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS	A	CUBIERTA	100%	15 días
22		JUANA ESCOBAR	A	IMPERMEABILIZACIC	100%	24 días
23		PRADO VERANIEGO	A	ELECTRICO	100%	38 días

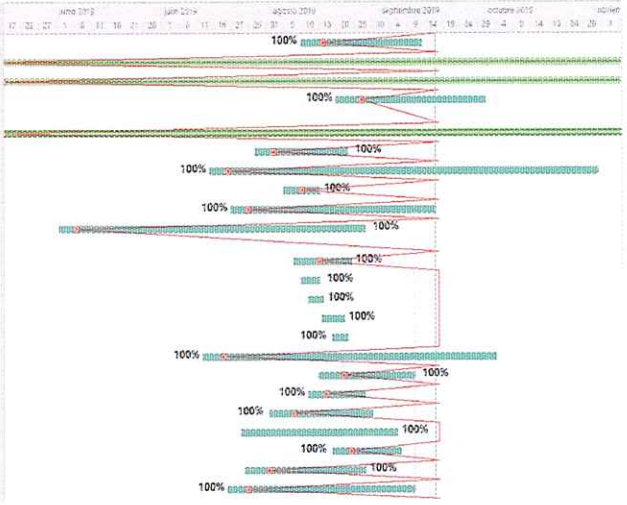

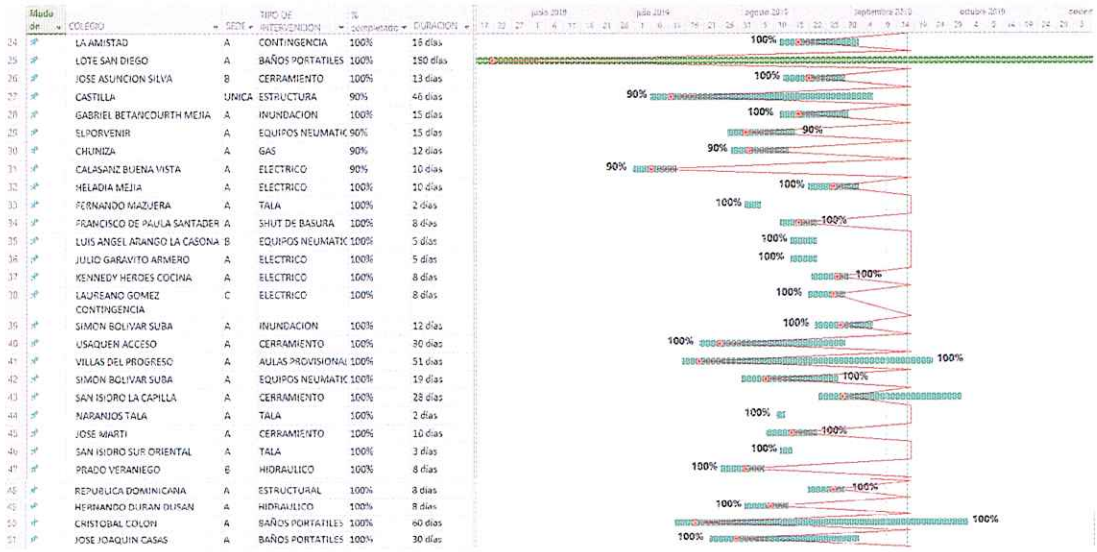

	Modo de	COLEGIO	SEDE	TIPO DE INTERVENCION	% completado	DURACION
24		LA AMISTAD	A	CONTINGENCIA	100%	18 días
25		LOTE SAN DIEGO	A	BAÑOS PORTATILES	100%	150 días
26		JOSE ASUNCION SILVA	B	CERRAMIENTO	100%	13 días
27		CASTILLA	UNICA	ESTRUCTURA	90%	46 días
28		GABRIEL BETANCOURTH MEJIA	A	INUNDACION	100%	15 días
29		ELPORVENIR	A	EQUIPOS NEUMATIC	90%	15 días
30		CHUNIZA	A	GAS	90%	12 días
31		CALASANZ BUENA VISTA	A	ELECTRICO	90%	10 días
32		HELADIA MEJIA	A	ELECTRICO	100%	10 días
33		FERNANDO MAZUERA	A	TALA	100%	2 días
34		FRANCISCO DE PAULA SANTADER	A	SHUT DE BASURA	100%	8 días
35		LUIS ANGEL ARANGO LA CASONA	B	EQUIPOS NEUMATIC	100%	5 días
36		JULIO GARAVITO ARMERO	A	ELECTRICO	100%	5 días
37		KENNEDY HEROES COCINA	A	ELECTRICO	100%	8 días
38		LAUREANO GOMEZ CONTINGENCIA	C	ELECTRICO	100%	8 días
39		SIMON BOLIVAR SUBA	A	INUNDACION	100%	12 días
40		USAQUEN ACCESO	A	CERRAMIENTO	100%	30 días
41		VILLAS DEL PROGRESO	A	AULAS PROVISIONAL	100%	51 días
42		SIMON BOLIVAR SUBA	A	EQUIPOS NEUMATIC	100%	19 días
43		SAN ISIDRO LA CAPILLA	A	CERRAMIENTO	100%	28 días
44		NARANJOS TALA	A	TALA	100%	2 días
45		JOSE MARTI	A	CERRAMIENTO	100%	10 días
46		SAN ISIDRO SUR ORIENTAL	A	TALA	100%	3 días
47		PRADO VERANIEGO	B	HIDRAULICO	100%	8 días
48		REPUBLICA DOMINICANA	A	ESTRUCTURAL	100%	8 días
49		HERNANDO DURAN DUSAN	A	HIDRAULICO	100%	8 días
50		CRISTOBAL COLON	A	BAÑOS PORTATILES	100%	60 días
51		JOSE JOAQUIN CASAS	A	BAÑOS PORTATILES	100%	30 días

De la anterior imagen se concluye que el contrato se ha desarrollado superando los porcentajes programados, se espera que para los períodos posteriores continúen con esta tendencia.

7. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

7.1 RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA NO C01.PCCNTR 876470 DE 2019

Desde la celebración del contrato se han suscrito algunos documentos de actas jurídicas que se relacionan a continuación:

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO
MINUTA DEL CONTRATO	18/04/2019	SUSCRIBIR CONTRATO DE OBRA
ACTA DE INICIO	04/04/2019	CELEBRAR EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO.
ACTA PARCIAL NO 5	06/08/2019	APROBAR POR PARTE DEL INTERVENTOR EL ACTA DE CORTE PARCIAL

7.2 RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE REUNION ENTRE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y/O ENTIDAD

Como parte integral de la ejecución del contrato de obra se han efectuado varias actividades de reunión entre las partes en el periodo No 1 las cuales se relaciona a continuación:

FECHA	15-AGOSTO-19
TIPO DE EVENTO	COMITÉ
LUGAR	OFICINA R&M CONSTRUCIONES E INTERVENTORIA SAS
OBJETO	SE CONVOCA COMITÉ SECRETARIA DE EDUCACIÓN INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA TEMAS DE ASUNTO DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA DE LOS PASOS A SEGUIR PARA LA INTERVENCIÓN DE LOS FRENTES DE TRABAJOS YA ENTREGADOS A INTERVENIR EN LOS TEMAS HABLADOS SE EXIGE LAS SIGUIENTES DOCUMENTACIONES
TEMAS TRATADOS	1 ACTA DE VISITA Y AUTORIZACIÓN DE INGRESOS 2 DIAGNÓSTICO DEL FRENTE A INTERVENIR CON REGISTRO FOTOGRÁFICO 3 PROGRAMACIÓN DEL FRENTE DE TRABAJO 4 PRESUPUESTO INICIAL
ASISTENTES	ARQUITECTO EDWIN SANTANA INGENIERA CATALIA FUENTES INGENIERO JESUS RAMIREZ ARQUITECTA SILVIA PEREZ ARQUITECTA JULIETH BERNAL INGENIERA LEIDY VALERO

FECHA	16-JULIO-19
TIPO DE EVENTO	RECORRIDO
LUGAR	COLEGIO LICEO FEMENINO MERCEDES NARIÑO COLEGIO JUANA ESCOBAR COLEGIO GENERAL SANTANDER COLEGIO CASTILLA
OBJETO	RECORRIDO EN FRENTES DE TRABAJO SECRETARIA DE EDUCACIÓN INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA CONTROL DE CALIDAD Y ACABADOS EN LA OBRA VISITA DE FRENTES NUEVOS A INTERVENIR
TEMAS TRATDOS	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE EJECUCIÓN DE OBRA
ASISTENTES	
