

CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES CALENTURAS
GEOCAL SAS.
NIT:900.815.557 – 3

INFORME DE EJECUCION DE OBRAS

CONTRATO DE MINIMA CUANTIA
N° MC- 015 - DE 2024
“CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS VÍAS ALEDAÑAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRES PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR”

AGOSTO DE 2024



CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES CALENTURAS
GEOCAL SAS.
NIT:900.815.557 – 3

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

En este capítulo se entrega la información general del contrato a la cual se le hace la Supervisión:

1.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO DE OBRA N°:	CMC - 015 - DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR
CONTRATISTA:	**CONSTRUAMBIENTALES CALENTURAS GEOCAL SAS**
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS VÍAS ALEDAÑAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRES PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR"
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIESICEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS M/C ($36.116.616,00)
AVANCE FISICO:	100 %
PLAZO:	TREINTA (30) DIAS
FECHA DE INICIO:	06 DE JUNIO DE 2.024
FECHA DE TERMINACION:	06 DE JULIO DE 2.024
ACTA DE RECIBO FINAL:	05 DE JULIO DE 2.024

1.2. GARANTIAS DEL CONTRATO

SEGUROS DEL ESTADO	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No**	**47-44-101027841**	
AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	$ 3.611.661.60	05/06/2024	06/07/2024
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 14.446.646.40	05/06/2024	06/07/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 3.611.661.60	05/06/202	06/07/2024



CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES CALENTURAS
GEOCAL SAS.
NIT:900.815.557 – 3

2. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA OBRA

2.1. ACTAS CELEBRADAS

No.	DESCRIPCION	FECHA	% DEL ACTA	% ACUMULADO	VALOR
1	DE INICIO	06/06/2024	00.00%	NO ANTICIPO	NO ANTICIPO
2	ACTA DE RECIBO FINAL	05/07/2024	100.00%	100.00%	$36.116.616,00

Hasta la fecha y en base a las condiciones pactadas mediante comunicación de aceptación de oferta emitida por el municipio de El Paso Cesar a favor de: la empresa **CONSTRUAMBIENTALES CALENTURAS GEOCAL SAS**, con Nit.: 900.815.557 - 3 se plantea la ejecución de las actividades relacionadas en el presupuesto de la propuesta a favor de la empresa **CONSTRUAMBIENTALES CALENTURAS GEOCAL SAS**; las obras se adelantaron sin anticipo, y que las mismas sean cuantificadas mediante **un solo pago final**, luego de la verificación del cumplimiento total del contrato por parte del Supervisor delegado para la misma.

2.2. AVANCE DEL CONTRATO

Las Actividades del Contrato de Mínima Cuantía N° CMC-015-2024, se desarrollaron bajo las condiciones normales, lo que permitió que cada actividad contratada se desarrollara dentro de los tiempos programados, lo que tuvo como resultado una terminación final de las obras en las fechas pactadas en acta de inicio, arrojando un avance del 100%.

3. ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

3.1. Actividades Realizadas por el Contratista.

Durante el período de ejecución del contrato, la empresa contratista llevó a cabo las actividades contractuales utilizando personal suficiente para terminar en la fecha programada inicialmente.

Se desarrollaron las actividades contratadas, desarrolladas bajo el siguiente concepto:

- Construcción en taller, y transporte de señales verticales Reglamentarias, Preventivas y/o Informativas de 0,6 m, reflectivas, de alta intensidad, en lámina galvanizada C16, con pedestal en ángulo.



- Construcción en taller y transporte de señales verticales dobles Reglamentarias, Preventivas y/o Informativas mixtas de 0,6 m, reflectivas, de alta intensidad, en lámina galvanizada C16, con pedestal en ángulo.
- Remoción de señal en mal estado, transporte al taller para su reconstrucción, transporte del taller al sitio de instalación de la señal refaccionada.
- Suministro, transporte, instalación de estoperoles metálicos de 0.1m de diámetro, altura máxima de 2" con un espigo de 5 cm mínimo, incluye colocación.
- Construcción de resaltos o reductores de velocidad en material plástico de 0.3 m de ancho, altura mínima de 5 cm, transporte e instalación de estos; incluye fijación con pernos y epóxido.

3.2. Actividades o Compromisos Cumplidos a la Fecha por el Contratista.

En base al cronograma de actividades inicial todas las actividades fueron realizadas por contratista hasta esta fecha no presentaron ningún tipo de retraso.

4. ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

4.1. ESTADO GENERAL DEL EJECUCION DEL CONTRATO

En la ejecución del contrato de obra no se realizaron adiciones en tiempo ni dinero.

5. ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO.

5.1. MANEJO DE ANTICIPOS

Se entregó al contratista un anticipo pro valor del 40% del contrato ($14.446.646,00) de acuerdo al plan de inversión aprobado, el mismo se presenta a continuación:

PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO CONTRATO No. 015-2024					
"CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS VÍAS ALEDAÑAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRES PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR."					
N°	**CONCEPTO**	**UND.**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO ($)**	**VALOR PARCIAL**
1	CONSTRUCCIÓN EN TALLER Y TRANSPORTE DE SEÑALES VERTICALES REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS Y/O INFORMATIVAS DE 0,6 REFLECTIVAS, DE ALTA INTENSIDAD, EN LÁMINAS GALVANIZADAS C16 CON PEDESTAL EN ANGULO.	U	7	$490.000,00	$3.430.000



2	CONSTRUCCIÓN EN TALLER Y TRANSPORTE DE SEÑALES VERTICALES DOBLES REGLAMENTARIAS, PREVENTIVAS Y/O INFORMATIVAS MIXTAS DE 0,6 REFLECTIVAS, DE ALTA INTENSIDAD, EN LÁMINAS GALVANIZADAS C16 CON PEDESTAL EN ANGULO.	U	3	$490.000	$1.470.000
3	REMOCIÓN DE SEÑAL EN MAL ESTADO, TRANSPORTE AL TALLER PARA SU RECONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE DEL TALLER AL SITIO DE INSTALACIÓN DE LA SEÑAL REFACCIONADA.	U	7	$66.293,58	$464.055
4	SUMINISTRO, TRANSPORTE INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES METÁLICOS DE 0,1 M DE DIÁMETRO, ALTURA MÁXIMA	U	50	$16.559,00	$827.950
5	CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS O REDUCTORES DE VELOCIDAD EN MATERIAL PLÁSTICO DE 0,3 M DE ANCHO, ALTURA MÍNIMA 5 CM; TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ÉSTOS; INCLUYE FIJACIÓN CON PERNOS Y EPÓXICO.	ML	40	$200.152	$$8.006.080
	IMPREVISTOS				$248.561
TOTAL					**$14.446.646**

5.2. PROBLEMAS Y SOLUCIONES PRESENTADOS

En el transcurso de la ejecución del contrato el contratista vio como oportunidad la generación de empleo utilizando personal de la comunidad en número suficiente para terminar las obras de: **“CONSTRUCCIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS E INFORMATIVAS PARA LAS VÍAS ALEDAÑAS A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENITO RAMOS TRES PALACIOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR”**, en base a la fecha inicialmente pactada, lo cual arrojo un balance positivo la administración, la empresa contratista y la comunidad.


ING. GEOBERTO RUIZ MARTINEZ
RL GEOCAL SAS
NIT.: 900.815.557-3



CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES CALENTURAS
GEOCAL SAS.
NIT:900.815.557 – 3

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



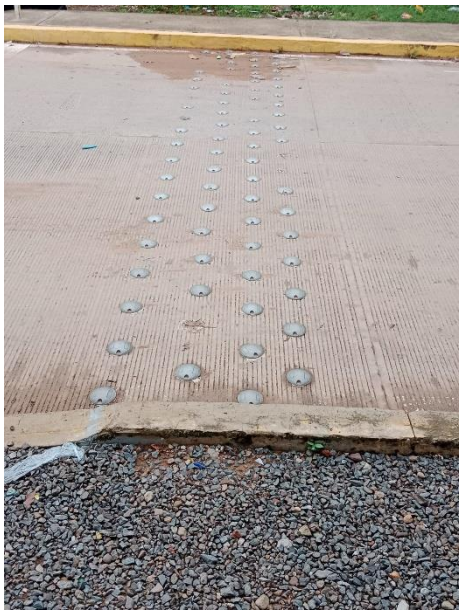







CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES CALENTURAS
GEOCAL SAS.
NIT:900.815.557 – 3











CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES CALENTURAS
GEOCAL SAS.
NIT:900.815.557 – 3











CONSTRUCCIONES Y AMBIENTALES CALENTURAS
GEOCAL SAS.
NIT:900.815.557 – 3







