SGC-CP-16337-24
Neiva, julio 17 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No.437 de 2023
Asunto: Informe de interventoría No.8

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 30 de junio de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.8
2. Informes semanales del periodo
3. Acta de comité técnico
4. Correspondencia
5. Seguridad social

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

8

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	8	Periodo comprendido entre el :	1 de junio de 2024	y el:	30 de junio de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	**Objeto:**	"ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
Contrato Nº:	437 DE 2023	**Contrato N.º:**	423 DE 2023
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	**Contratista:**	SOFOR INGENIERIA SAS
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	**Plazo Inicial:**	DIEZ (10) MESES
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	**Fecha de Inicio:**	NOVIEMBRE 8 DE 2023
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	**Fecha de Terminación:**	SEPTIEMBRE 7 DE 2024
Valor Inicial:	$ 152.573.345,00	**Valor Inicial:**	$ 1.505.964.466,00
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	
Valor total:	$ 152.573.345,00	**Valor total:**	$ 1.505.964.466,00
Valor pagado:	$ 54.397.509,04	**Valor pagado:**	$ 536.874.274,00
Valor por pagar:	$ 98.175.835,96	**Valor por pagar:**	$ 969.090.192,00
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOZO GUTIERREZ	**Nombre interventor:**	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/10/2023	22/03/2025	$ 45.772.020,00
Prestaciones sociales	30/10/2023	9/09/2027	$ 15.257.340,00
Calidad del servicio	30/10/2023	12/03/2025	$ 15.257.340,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	8/09/2027	$ 150.596.446,60
Calidad y correcto func. bienes y equipos	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Estabilidad y calidad de la obra	8/11/2023	8/09/2029	$ 301.192.893,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	8/09/2024	$ 348.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	29/12/2023	$ 19.229.353,00
Acta parcial 2	30/04/2024	$ 22.733.428,42
Acta parcial 3	En proceso	$ 12.434.727,62
TOTAL		**$ 54.397.509,04**

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	5/04/2024	$ 206.778.825,00
Acta parcial 2	25/04/2024	$ 207.328.798,00
Acta parcial 3	24/05/2024	$ 122.766.651,00
TOTAL		**$ 536.874.274,00**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

8

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	41,94%	1,96%	43,90%
% Ejecutado	41,94%	12,57%	54,51%
Diferencia	0,00%	10,61%	10,61%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 631.527,04	$ 29.532,47	$ 661.059,51	43,90%
% Ejecutado	$ 631.527,04	$ 189.362,95	$ 820.889,99	54,51%
Diferencia	$ -	$ 159.830,48	$ 159.830,48	10,61%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este periodo se ejecutaron actividades de obra en los siguientes predios del municipio de **Neiva**:

Terminación de aislamientos en: el predio Mirador de la vereda San Miguel 907m de 907m, el predio Veraguas de la vereda Santa Lucia 1.770m de 1.770m; en la vereda La Plata los predios: Himalaya 1.280m de 1.280m y La Colonia 400m de 400m; y en la vereda Pueblo Nuevo el predio Barcelona 422m de 422m. ***Ejecución de aislamientos en***: el predio La Carolina 449m de 6.450m de la vereda La Plata, el predio El Cedral 582m de 834m de la vereda Pueblo Nuevo y en el predio Armenia 1.130m de 2.350m de la vereda San Bartolo. ***Ejecución de restauración activa en***: el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo 3 ha de 10 ha.

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	4		80,00%	0,00%	4
TÉCNICO	1		20,00%	0,00%	1
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	5	0	100,00%	0,00%	5
TOTALES	**5**		**100,00%**		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		4	0,00%	26,67%	4
TÉCNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
M.O.N.C.	9		60,00%	0,00%	9
TOTAL	10	5	66,67%	33,33%	15
TOTALES	**15**		**100,00%**		


TIPO DE EMPLEO

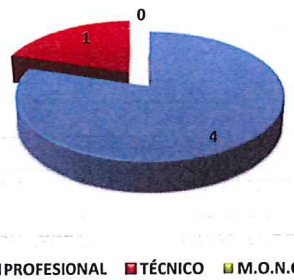


GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO



cam ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**8**	CQ Ingenieria & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

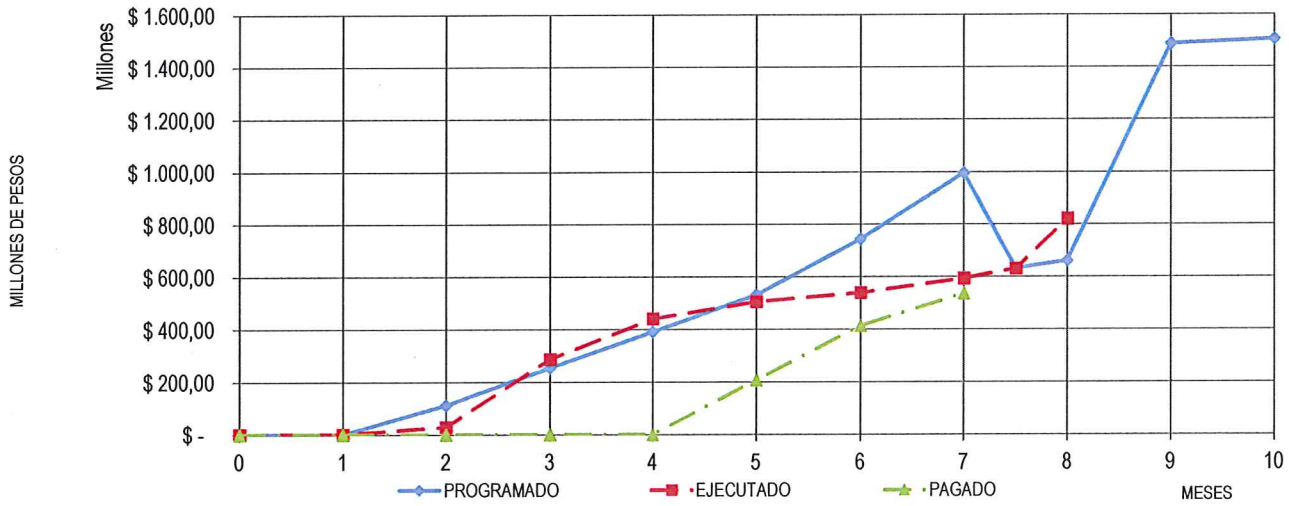

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo el contratista entregó la reprogramacion en el cual detalla la forma en que se van ejecutar las actividades en el plazo contractual. También se suscribió la suspensión del convenio con la Gobernación debido a que aún no se ha definido el tema predial con el municipio de Santa María.
Se continúa en proceso de verificación de los aislamientos terminados y parciales en los diferentes predios.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Federico Pérez Charry **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia Zambrano Serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

8

Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato N°:	423 DE 2023	**Contratista:**	SOFOR INGENIERIA SAS
Periodo:	1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024	**Interventor:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador contratista de obra	ANDRES FELIPE SAAVEDRA	**Coordinador de Interventoria:**	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
	ÍTEMS				**$ 1.197.967.119,00**				**$ 443.459.316,00**	**$ 209.543.617,00**	**$ 653.002.933,00**		**$ 544.964.186,00**
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrigrafica del rio Las Ceibas	ML	35.467,00	$ 23.408	$ 830.215.310,00	17.711,00	6.706,00	24.417,00	$ 414.580.973,00	$ 156.974.761,00	$ 571.555.734,00	11.050,00	$ 258.659.576,00
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predioos adquiridos y otros) en la cuenca hodrografica del rio Las Ceibas	HA	10,00	$ 7.896.838	$ 78.968.375,00	0,00	3,00	3,00		$ 23.690.512,00	$ 23.690.512,00	7,00	$ 55.277.863,00
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30,00	$ 9.626.114	$ 288.783.434,00	3,00	3,00	6,00	$ 28.878.343,00	$ 28.878.344,00	$ 57.756.687,00	24,00	$ 231.026.747,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				**$ 1.197.967.119,00**				**$ 443.459.316,00**	**$ 209.543.617,00**	**$ 653.002.933,00**		**$ 544.964.186**
	ADMINISTRACION		**10,00%**		$ 119.796.712,00				$ 44.345.932,00	$ 20.954.361,00	$ 65.300.293,00		$ 54.496.419,00
	IMPREVISTOS		**5,00%**		$ 59.898.356,00				$ 22.172.966,00	$ 10.477.181,00	$ 32.650.147,00		$ 27.248.209,00
	UTILIDAD		**9,00%**		$ 107.817.041,00				$ 39.911.338,00	$ 18.858.926,00	$ 58.770.264,00		$ 49.046.777,00
	IVA		**19,00%**		$ 20.485.238,00				$ 7.583.154,00	$ 3.583.196,00	$ 11.166.350,00		$ 9.318.888,00
	COSTO AIU (24.00%)				**$ 307.997.347,00**				**$ 114.013.390,00**	**$ 53.873.664,00**	**$ 167.887.054,00**		**$ 140.110.293,00**
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 1.505.964.466,00**				**$ 557.472.706,00**	**$ 263.417.281,00**	**$ 820.889.987,00**		**$ 685.074.479,00**
											54,51%		

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.505.964.466,00	**V/R ANTICIPO:**	N/A
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	0,00%
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 1.505.964.466,00**	**% RETEGARANTIA:**	0,00%

N°	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N°	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No. 1	FE-96	5/04/2024	$ 206.778.825,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 206.778.825,00	$ 1.299.185.641,00	13,73%
2	Acta parcial No. 2	FE-98 y 99	25/04/2024	$ 207.328.798,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 207.328.798,00	$ 1.091.856.843,00	13,77%
3	Acta parcial No. 3	FE-100 y 101	24/05/2024	$ 122.766.651,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 122.766.651,00	$ 969.090.192,00	8,15%
	TOTAL			**$ 536.874.274,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 536.874.274,00**	**$ 969.090.192,00**	**35,65%**

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 152.573.345,00	**V/R ANTICIPO:**	**NA**
V/R ADICIONES:	$ 0,00	**% ANTICIPO:**	**NA**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**$ 152.573.345,00**	**% RETEGARANTIA:**	**10,00%**

N°	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA N°	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FVE 59	29/12/2023	$ 19.229.353,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 19.229.353,00	$ 133.343.992,00	12,60%
2	Acta parcial No.2	FVE 60 y 61	30/04/2024	$ 22.733.428,42	$ 0,00	N/A	N/A	$ 22.733.428,42	$ 110.610.563,58	14,90%
3	Acta parcial No.3	FVE 62 y 64	En proceso	$ 12.434.727,62	$ 0,00	N/A	N/A	$ 12.434.727,62	$ 98.175.835,96	8,15%
	TOTAL			**$ 54.397.509,04**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 54.397.509,04**	**$ 98.175.835,96**	**35,65%**

cam	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** **ANEXO 2**	8	CQ Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS	Coordinador de obra:	ANDRES FELIPE SAAVEDRA
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de junio de 2024	al	30 de junio de 2024

FOTOGRAFÍA No.1




PREDIO HIMALAYA - VDA LA PLATA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.2



PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.3

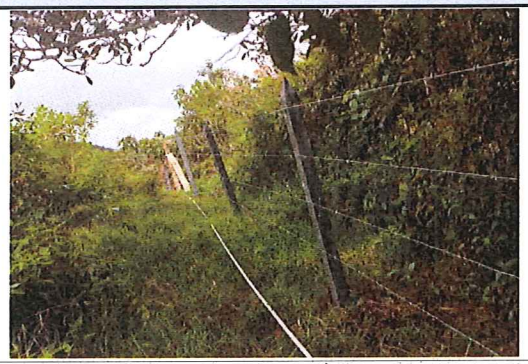

PREDIO LA COLONIA - VDA LA PLATA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.4



RNSC VERAGUAS - SANTA LUCIA - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.5



RESTAURACION ACTIVA - BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA

FOTOGRAFÍA No.6



PREDIO ARMENIA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	11-jun-24	PERIODO No.	30	DEL	3/06/2024	AL	9/06/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	90			DÍAS POR EJECUTAR	90		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	214	EQUIVALE AL	70,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	214	EQUIVALE AL	70,4%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	1/04/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35
				-56,00

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.041.582.807,21	69,16%	-27,23%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 631.441.374,61	41,93%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en el municipio de Neiva: el hincado de postes para el aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía; en el predio El Mirador vereda San Miguel no hubo avance; se terminó el aislamiento de los 1.280m en el predio de Himalaya, también se continuó con limpia y ahoyado en el aislamiento del predio La Carolina vereda La Plata; además, se inició limpia y ahoyado en los predios de El Cedral de Pueblo Nuevo y en San Andres - La Rosa vereda San Bartolo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se insiste al contratista en mejorar rendimientos en la ejecución de las actividades, teniendo en cuenta que el atraso se ha presentado debido a la poca mano de obra, las constantes lluvias y temporada de café en la zona, afectando el rendimiento en las actividades contractuales. Igualmente, ha influido la no definición por parte de la Gobernación con respecto a los predios de Santa María.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



HINCADO DE POSTES - RNSC VERAGUAS - NEIVA



AISLAMIENTO HIMALAYA - VDA LA PLATA - NEIVA



CEDRAL - PUEBLO NUEVO - NEIVA



HINCADO DE POSTES - LA CAROLINA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	17-jun-24	PERIODO No.	31	DEL	10/06/2024	AL	16/06/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DIAS POR EJECUTAR	83			DIAS POR EJECUTAR	83		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	221	EQUIVALE AL	72,7%	PLAZO TRANSCURRIDO:	221	EQUIVALE AL	72,7%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	24/06/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 631.527.037,17	41,94%	3,36%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 682.113.515,85	45,29%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en el municipio de **Neiva**: Se ejecutaron 1.400m de 1.770m de aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía; en el predio El Mirador vereda San Miguel no hubo avance; se ejecutaron 200m de 2.350m de aislamiento en el predio Armenia vereda San Bartolo; se hincaron 670 postes para el aislamiento del predio La Carolina vereda La Plata; además, se continuó limpia y ahoyado en los predios El Cedral vereda Pueblo Nuevo y en San Andrés - La Rosa vereda San Bartolo. Se terminó el aislamiento del predio Barcelona vereda Pueblo Nuevo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. En comité técnico el contratista se comprometió a mejorar rendimientos en la ejecución de las actividades; sin embargo, reiteró que en la zona aún continúan las lluvias y la temporada cafetera, situación que puede interferir en el avance de las actividades programadas; así mismo, fue solicitado al contratista la reprogramación de actividades en atención a los diferentes factores que están generando atraso. A la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la Gobernación con respecto a los predios de Santa María.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



HINCADO DE POSTES - PREDIO LA COLONIA - NEIVA



AISLAMIENTO ARMENIA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA



PREDIO BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA



HINCADO DE POSTES - PREDIO LA CAROLINA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	24-jun-24	PERIODO No.	32	DEL	17/06/2024	AL	23/06/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	76			DÍAS POR EJECUTAR	76		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	228	EQUIVALE AL	75,0%	PLAZO TRANSCURRIDO:	228	EQUIVALE AL	75,0%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	24/06/2024		no iniciado
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 642.300.311,01	42,65%	5,95%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 731.961.720,10	48,60%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en el municipio de **Neiva**: Se ejecutaron 1.770m de 1.770m de aislamiento en el predio Veraguas vereda Santa Lucía; en el predio El Mirador vereda San Miguel no ha tenido avance solo postes hincados; en el predio Armenia se han ejecutado 400m de 2.350m de aislamiento de la vereda San Bartolo; en el predio La Carolina se han ejecutado 449m de 6.450m e hincado 600 postes para el aislamiento y se terminaron los 400m del aislamiento de La Colonia en la vereda La Plata; además, se han ejecutado 575m de 836m en el predio El Cedral vereda Pueblo Nuevo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. El contratista entregó la reprogramación en la cual detalla la forma en que se van a ejecutar las actividades faltantes en los tiempos establecidos en el contrato; sin embargo, se reitera que en la zona aún continúan las lluvias y la temporada de recolección de café, situación que puede interferir en el avance de las actividades programadas. A la fecha no se ha tenido respuesta por parte de la Gobernación con respecto a los predios de Santa María, posiblemente se genere una suspensión del Convenio, mientras se resuelve la situación predial.


8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA COLONIA - VDA LA PLATA - NEIVA



AISLAMIENTO ARMENIA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA

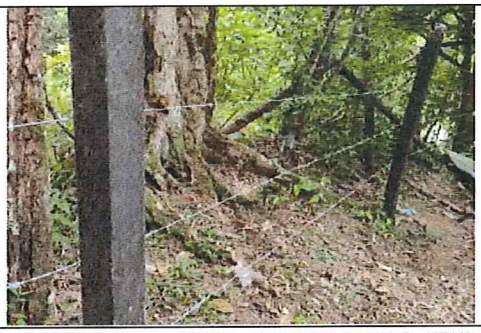

AVANCE PREDIO EL CEDRAL - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA



AVANCE PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR ENCARGADO**
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA
AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

Ingeniería & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	2-jul-24	PERIODO No.	33	DEL	24/06/2024	AL	30/06/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	437 DE 2023	CONTRATO No.:	423 DE 2023
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304	PLAZO INICIAL (5 MESES):	304
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023	FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		FECHA DE REINICIACIÓN:	
DIAS POR EJECUTAR	69	DIAS POR EJECUTAR	69
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024
PLAZO ACTUALIZADO:	304	PLAZO ACTUALIZADO:	304
PLAZO TRANSCURRIDO:	235 EQUIVALE AL 77,3%	PLAZO TRANSCURRIDO:	235 EQUIVALE AL 77,3%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00	VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00
VALOR ADICION(ES):	$ -	VALOR ADICION(ES):	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00	VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	24/06/2024	24/06/2024	0
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 661.059.509,33	43,90%	10,61%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 820.889.988,48	54,51%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en el municipio de **Neiva**: Se ejecutaron los 907m en el predio El Mirador vereda San Miguel; en el predio Armenia se han ejecutado 1.130m de 2.350m de aislamiento y se terminó en el predio La Esperanza los 366m de la vereda San Bartolo; en el predio La Carolina se han ejecutado 449m de 6.450m y se continúa hincado de postes; se inició limpia en el Lote No.4 La Corporación en la vereda La Plata; además, se han ejecutado 582m de 836m en el predio El Cedral vereda Pueblo Nuevo.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. El contratista entregó la reprogramación en la cual detalla la forma en que se van a ejecutar las actividades faltantes en los tiempos establecidos en el contrato; sin embargo, se reitera que en la zona aún continúan las lluvias y la temporada de recolección de café, situación que puede interferir en el avance de las actividades programadas. En este periodo se generó la suspensión del Convenio con la Gobernación, mientras se resuelve la situación predial en el municipio de Santa María.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



AISLAMIENTO MIRADOR - VDA SAN MIGUEL - NEIVA



AVANCE AISLAMIENTO ARMENIA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA



AISLAMIENTO LA ESPERANZA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA



HINCADO DE POSTES - PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

*** VoBo SUPERVISOR ENCARGADO**
NOMBRE SUPERVISOR ENCARGADO: FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE

CQ Ingenieria & Construcción	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/2

ACTA No.13	CONTRATO DE OBRA No.423 DE 2023

PROYECTO: ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACIÓN ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS ÁREAS DE RECARGA HÍDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RÍO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
JAVIER CARDOSO GUTIERREZ (JC) - Supervisor CAM	Firma listado de asistencia adjunto
LESLYE MUÑOZ (LM) - Profesional SGA CAM	Firma listado de asistencia adjunto
CARLOS A. QUIZA CAMACHO (CQ) - Contratista de Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
LINDSAY DAZA SALGADO (LD) - Profesional apoyo Interventoría	Firma listado de asistencia adjunto
ISABEL CHAVES (IC) - Profesional apoyo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
NICOLÁS CARDOZO BARRETO (NC) - Ingeniero campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto
ARIEL ALBEIRO ARIAS (AA) - Técnico campo Contratista de Obra	Firma listado de asistencia adjunto

II. OBJETO

Aspectos administrativos, técnicos y recomendaciones generales.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se realiza lectura al acta anterior y no se presenta observación alguna.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No se generaron compromisos en el comité anterior.

V. TEMAS TRATADOS

JC solicita información sobre el seguimiento y verificación en la ejecución de los aislamientos y reforestación que se han realizado hasta la fecha; además, sobre las dificultades y/o inconvenientes en la ejecución.

CQ informa que respecto a la definición de los predios de Santa María para la ejecución de la reforestación activa, es importante que la respuesta a la situación con las propiedades, sea emitida por la Gobernación de manera escrita; por lo tanto, invita a LM dar parte del avance y/o trámites que han surtido, de la gestión adelantada por la Corporación.

LM manifiesta que a la fecha la Gobernación no ha dado respuesta por escrito a las solicitudes que le ha realizado la Corporación; de igual manera, se solicitó a la Gobernación ampliar el plazo del convenio, en atención a que por la definición de la propiedad de los sitios donde se realizará la restauración activa, el contratista no ha podido iniciar la actividad y el plazo del convenio se vence el 30 de junio de 2024. La Corporación continúa realizando la gestión para obtener respuesta y solución por parte de la Gobernación.

CQ informa que actualmente se presenta un atraso del 14% en las actividades que se están ejecutando en los predios del municipio de Neiva; por lo cual insiste al contratista de obra en presentar la reprogramación de las actividades en dicha zona, mejorando los rendimientos en mano de obra para garantizar la culminación de dichas actividades y que en dado caso pueda facilitar la toma de decisiones con respecto al tema de Santa María, sin generar afectaciones técnicas ni económicas al contrato.

NC informa que se atenderá la solicitud de la Interventoría de reprogramar actividades; así mismo, manifiesta que actualmente ya se encuentran todos los materiales en los sitios de ejecución; sin embargo, reitera que en la zona aún continúan las lluvias e inicia la temporada de recolección de café, situación que puede interferir en el avance de las actividades.

De acuerdo a la verificación realizada a las 3 Ha faltantes de restauración activa en el Resguardo indígena de Iquira, LD solicita al contratista mejorar el plateo en algunos árboles conforme a las especificaciones contractuales; de igual manera, presentar la programación para realizar el conteo de mortalidad de especies en las 3 Ha sembradas en el mes de frebrero, teniendo en cuenta que ya han transcurrido los 4 meses para calcular el porcentaje de mortalidad.

AA manifiesta que se mejorarán las especificaciones del plateo de los árboles y se presentará la programación para realizar la actividad solicitada por la Interventoría, con el fin de atender al mantenimiento de especies que se requiera; recalca que dicha programación está sujeta también a los permisos y a la disponibiidad que se estableca con el Gobernador del Resguardo, por lo cual una vez se tenga la información se les informará.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DIA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Neiva, a los once (11) días del mes de junio de 2024.

LISTADO DE ASISTENTES	Código:	T-CAM-097
	Versión:	4
	Fecha:	____de ____de 2022

TEMA: Seguimiento y Avance Contrato Obra 423-2023 | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: CAM - Interventoría

SITIO DEL EVENTO: CAM | MUNICIPIO: Neiva | FECHA: 11-Junio-2024 | HORA: 10:15 am

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO M	SEXO F	No. IDENTIFICACIÓN	ENTIDAD	CARGO	MUNICIPIO	TELÉFONO FIJO O MÓVIL	CORREO ELECTRÓNICO	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	FIRMA
1	Lindsay Daza S.		X	49.609.707	Interv.	Profes. Apoyo	Neiva	3183826935	cquizac@gmail.com	Si	Lindsay Daza S.
2	Leslye Moreno		X	38212743	CAM	Prof. Univ.	Neiva	3118337313	Lymoreno@cam.gov.co	Si	
3	Daniel Albero Dios	X		93382899	Soforing	Tecnico	Ibagué	315 8319774	soforing@gmail.com	Si	
4	Nicolás Cardozo Barrero	X		1.110.592.681	Soforing	tecnico Ing	Ibagué	3163703894	soforing@gmail.com	Si	Nicolás C.
5	Isabel Chaves Saavedra		X	1.032.363.145	Soforing	coordinadora	Ibagué	3167419037	ichsa@gmail.com	Si	
6	Jaime Cardozo Gutierrez	X		7691887	CAM	PUSGA	Neiva	3107537090	pmcabanlr@cam.gov.co	Si	
7.	CARLOS A. QUIZA C	X		73.142300	Interv.	Interv.	Neiva	310.3214229	cquizac@gmail.com	si	

TOTAL ASISTENTES: HOMBRES: _____ MUJERES: _____

SGC-CP-16333-24
Neiva, junio 04 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Atraso ejecución de actividades.

Cordial saludo.

De acuerdo al reporte de avance de actividades ejecutadas hasta la fecha, se evidencia que se encuentran en un atraso del 12,95%, sin incluir las actividades de restauración activa en el municipio de Santa María, por lo cual se requiere que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a la programación presentada, en cuanto a las actividades que corresponden a los predios del municipio de Neiva.

Dado lo anterior y conforme a la situación actual sobre los predios en el municipio de Santa María, se solicita presentar una reprogramación con los rendimientos de mano de obra requeridos, para la culminación de las actividades en los predios del municipio de Neiva; debido a que la información suministrada por la Entidad, para los trámites de la propiedad de los predios de Santa María por parte de Gobernación tendrían solución aproximadamente finalizando el mes de junio.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16334-24
Neiva, junio 07 de 2024


Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Citación comité técnico

Cordial saludo.

Se convoca a comité técnico para el día martes 11 de junio de 2024 a las 10:00 am, en las instalaciones de la CAM de la ciudad de Neiva, con el fin de tratar aspectos técnicos y avance del contrato de la referencia, fundamental la asistencia del representante legal.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

SGC-CP-16336-24
Neiva, junio 14 de 2024

Señores
SOFOR INGENIERÍA S.A.S
R.L GEMBER CARDOZO CRUZ
Contratista de Obra

Ref.: Contrato de obra No.423 de 2023
Asunto: Respuesta solicitud aprobación especies forestales.

Cordial saludo.

En atención a la solicitud realizada mediante oficio enviado al correo electrónico el día 12 de junio de 2024, con el fin de adelantar la actividad de restauración activa de las 10ha en el predio Barcelona vereda Pueblo Nuevo del municipio de Neiva, se procedió a solicitar el concepto técnico del profesional forestal de la Corporación, el cual aprobó dos especies de las seis propuestas por ustedes: Guamo machete (*Inga densiflora Benth.*) y Guamo Santafereño (*Inga ornata Kunth*).

De igual manera, en el informe técnico anexo a la presente (4 folios), el profesional sugiere para el mismo proceso de restauración cuatro especies forestales de fácil adaptación.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

INFORME TÉCNICO

ANTECEDENTES

Oficio SOFOR Ingenieros S.A.S: Solicitud aceptación de especies forestales para que sean implementadas en el proceso de restauración activa de 10 has, predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva.

INFORME DOCUMENTAL.

Participantes en la elaboración del concepto técnico:

NOMBRE	CARGO
SANTIAGO SALAS CRUZ	Ingeniero Forestal – Profesional Universitario

Se desarrollo lo siguiente:

- Se obtuvo el mapa en el que se efectuara la reforestación el proceso de restauración activa de 10 has, predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva. Ver Anexo *1*

Se efectuó el análisis sobre la distribución de las especies propuestas por **SOFOR INGENIEROS S.A.S.** Ver

- Anexo *2*

SE CONCEPTUA.

Las especies de Guamo machete (*Inga densiflora Benth.)* y Guamo Santafereño (*Inga ornata Kunth*) son las especies que se pueden utilizar para el proceso de restauración activa de 10 has, predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva, dentro de las propuestas por parte de **SOFOR INGENIEROS S.A.S,** ya que la especie de Nogal Cafetero es llamativo para el aprovechamiento forestal, El Guayacán de Manizales (*Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC*.) no se presenta en la región, y las especies de Ocobo (*Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC*.) y Arrayan (*Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh*) no se adaptan a esta zona.


Se sugiere que para el proceso de restauración activa de 10 has, predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva las especies forestales de fácil adaptación en la región como el Chachafruto (*Erythrina edulis Triana ex Micheli*), Copé (*Clusia multiflora Kunth*), Guacharaco (*Cupania cinerea Poepp*.) y Caucho (*Ficus sp*.).

Es el informe,

Santiago Salas

SANTIAGO SALAS CRUZ
Ingeniero Forestal
Profesional Universitario

Anexo 1. Mapa Restauración Activa De 10 Has, Predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio De Neiva.

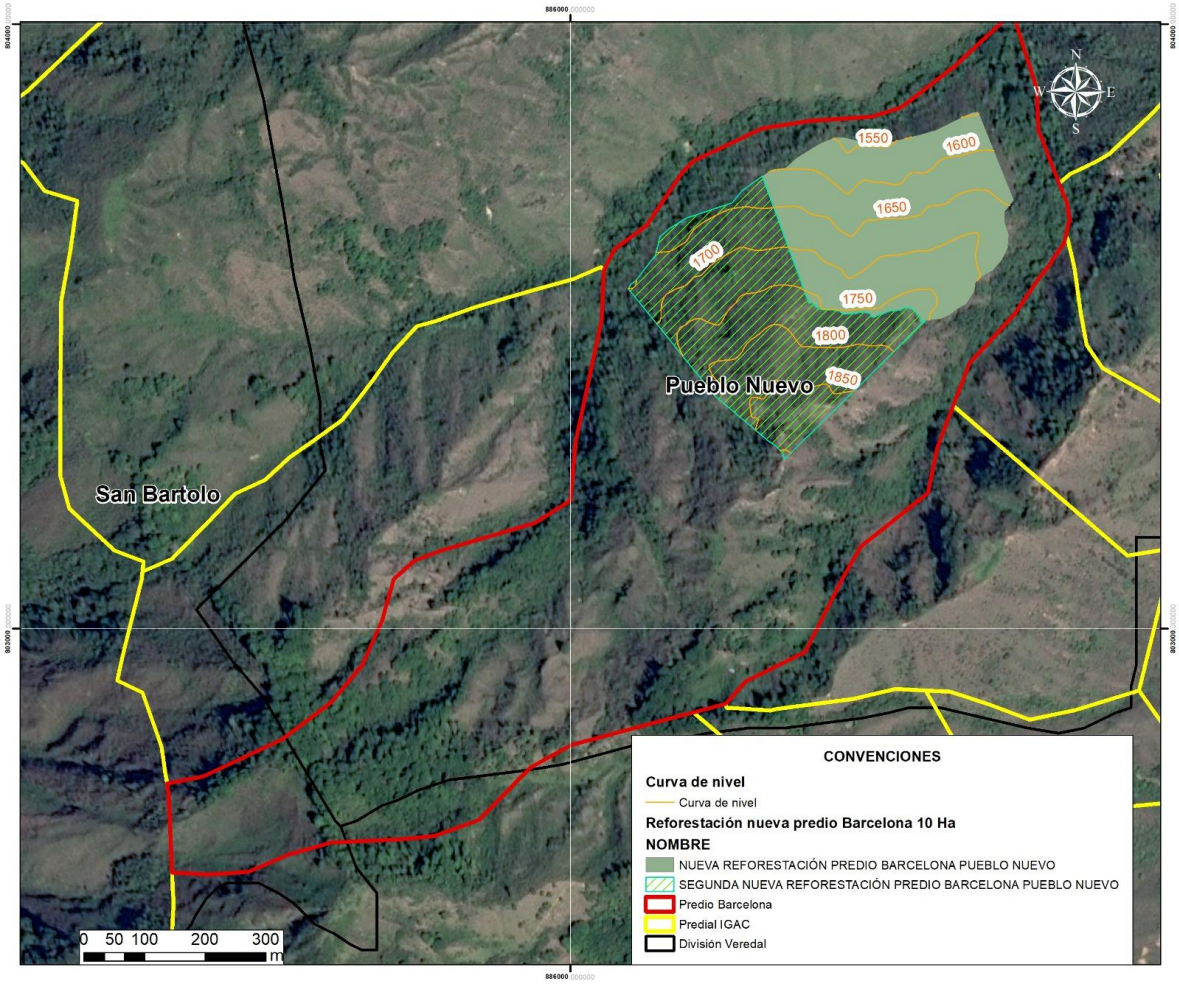

Anexo 2 Tabla De especies forestales de aceptación para siembra de las 10 Has

Nombre Comun	Nombre Cientifico	Familia	Altura Minima (msnm)	Altura Maxima (msnm)
Nogal	*Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken*	Boraginaceae	0	2000
Arrayan	*Myrcianthes leucoxyla (Ortega) McVaugh*	Myrtaceae	2650	3200
Guamo Machete	*Inga densiflora Benth.*	Mimosaceae	20	2000
Guamo Santafereño	*Inga ornata Kunth*	Mimosaceae	800	2200
Ocobo	*Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC.*	Bignoniaceae	0	1200
Guayacan de Manizales	Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC.	Lythraceae	1000	2000

Ibagué, junio 06 de 2024

Señor
CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de Interventoría

REFRENCIA: Contrato No. 0423 de 2023
ASUNTO: Solicitud aceptación de especies predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva

Cordial saludo,

En el desarrollo del contrato de la referencia suscrito entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA Y SOFOR INGENIEROS S.A.S, solicitamos comedidamente que sean tenidas en cuenta las siguientes especies para que sean implementadas en el proceso de restauración activa de 10 has en el predio Barcelona Vereda Pueblo Nuevo Municipio de Neiva para la conectividad de la zona de reserva forestal, debido a la difícil consecución de la totalidad de plántulas requeridas conforme a las especies descritas en el contrato, además de que previa verificación del predio se logró determinar que las especies solicitas en la presente; algunas se presentan en la zona y otras presentan buena adaptabilidad a la altura y a la zona de ejecución, por lo cual dichas especies se desarrollarían adecuadamente.

Nombre Común	**Nombre Científico**
Nogal	*Cordia alliodora*
Arrayán	*Myrcianthes leucoxyla*
Guamo machete	*Inga desinflora*
Guamo santafereño	*Inga ornata*
Ocobo	*Tabebuia rosea*
Guayacan de manizales	*Lafoensia acuminata*

Atentamente,



SOFOR INGENIEROS S.A.S
R.L: GEMBER CARDOZO CRUZ
C. C. No. 93.374.732 de Ibagué
Matrícula profesional No. 15.046 de Min. Agricultura.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30094328	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30094328	2024-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30094328	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30094328	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	2.400	0	226.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	2.400	0	226.400
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	1.900	0	176.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	1.900	0	176.900
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	4.400	0	410.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276718	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.334.700	35.000	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	30276718	2024-07-17	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
2	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
3	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
6	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.000	640.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	4.000.000	160.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	4.000.000	160.000	4.000.000	278.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.400	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276718	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.334.700	35.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30276718	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.648.000	0	17.400	0	1.665.400
PROTECCION	230201	800229739	0	2	520.000	0	5.500	0	525.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.128.000	0	11.900	0	1.139.900
EPS(Administradoras: 3)				6	464.000	0	5.000	0	469.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	160.000	0	1.700	0	161.700
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	174.000	0	1.900	0	175.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	130.000	0	1.400	0	131.400
ARP(Administradoras: 1)				6	723.700	0	7.700	0	731.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	723.700	0	7.700	0	731.400
CCF(Administradoras: 1)				6	464.000	0	4.900	0	468.900
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	464.000	0	4.900	0	468.900
Gran Total					3.299.700	0	35.000	0	3.334.700

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276788	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.800	16.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30276788	2024-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-07	30276788	E	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.800	16.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30276788	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	8.600	0	824.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	6.400	0	614.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	2.200	0	210.200
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	600	0	52.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	1.600	0	153.600
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	3.800	0	358.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	3.800	0	358.800
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	2.200	0	206.200
Gran Total					1.579.000	0	16.800	0	1.595.800

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
