SGC-CP-16340-24
Neiva, agosto 16 de 2024

Señores
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM
Ciudad

Ref.: Contrato de interventoría No.437 de 2023
Asunto: Informe de interventoría No.10

Cordial saludo.

En cumplimiento a las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de la referencia, se hace entrega de los documentos correspondientes al periodo del 01 al 15 de agosto de 2024, los cuales contiene lo siguiente:

1. Informe interventoría No.10
2. Informes semanales del periodo
3. Seguridad social

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Contratista de interventoría.

c.c. Ingeniero JAVIER CARDOSO GUTIERREZ – Coordinador Proyecto Ceibas - Supervisor

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

Ingenieria & Construcción

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	10	Periodo comprendido entre el :	1 de agosto de 2024	y el:	15 de agosto de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
Contrato Nº:	437 DE 2023	
Contratista:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	
Valor Inicial:	$	152.573.345,00
Valor adicional:	$	-
Valor total:	$	152.573.345,00
Valor pagado:	$	83.172.841,92
Valor por pagar:	$	69.400.503,08
Nombre Supervisor:	ING. JAVIER CARDOZO GUTIERREZ	

CONTRATO DE OBRA

Objeto:	"ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"	
Contrato N.º:	423 DE 2023	
Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS	
Plazo Inicial:	DIEZ (10) MESES	
Fecha de Inicio:	NOVIEMBRE 8 DE 2023	
Fecha de Terminación:	SEPTIEMBRE 7 DE 2024	
Valor Inicial:	$	1.505.964.466,00
Valor adicional:		
Valor total:	$	1.505.964.466,00
Valor pagado:	$	820.889.987,00
Valor por pagar:	$	685.074.479,00
Nombre interventor:	ING. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	30/10/2023	22/03/2025	$ 45.772.020,00
Prestaciones sociales	30/10/2023	9/09/2027	$ 15.257.340,00
Calidad del servicio	30/10/2023	12/03/2025	$ 15.257.340,00

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Pago salarios, prestaciones sociales e ind.	8/11/2023	8/09/2027	$ 150.596.446,60
Calidad y correcto func. bienes y equipos	8/11/2023	11/03/2025	$ 301.192.893,20
Estabilidad y calidad de la obra	8/11/2023	8/09/2029	$ 301.192.893,20
Responsabilidad civil extracontractual	8/11/2023	8/09/2024	$ 348.000.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	29/12/2023	$ 19.229.353,00
Acta parcial 2	30/04/2024	$ 22.733.428,42
Acta parcial 3	En proceso	$ 12.434.727,62
Acta parcial 4	En proceso	$ 28.775.332,88
TOTAL		**$ 83.172.841,92**

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Acta parcial 1	5/04/2024	$ 206.778.825,00
Acta parcial 2	25/04/2024	$ 207.328.798,00
Acta parcial 3	24/05/2024	$ 122.766.651,00
Acta parcial 4	En proceso	$ 284.015.713,00
TOTAL		**$ 820.889.987,00**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

10

Ingeniería & Construcción

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	82,39%	16,52%	98,90%
% Ejecutado	70,42%	9,59%	80,00%
Diferencia	-11,97%	-6,93%	-18,90%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 1.240.704,61	$ 248.743,01	$ 1.489.447,62	98,90%
% Ejecutado	$ 1.060.432,66	$ 144.367,48	$ 1.204.800,13	80,00%
Diferencia	$ (180.271,95)	$ (104.375,54)	$ (284.647,49)	-18,90%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

En este periodo se ejecutaron actividades de obra en los siguientes predios del municipio de **Neiva**:

Terminación de aislamientos en: el predio La Carolina 6.450m de 6.450m, en el predio Lote 4 de La Corporacion 960m de 960m, predio La Urraca 230m de 230m de la vereda La Plata; el predio El Cedral 836m de 836m de la vereda Pueblo Nuevo. ***Ejecución de restauración activa en***: el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo 10 ha de 10 ha.

2. PERSONAL


CONTRATO DE CONSULTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL	4		80,00%	0,00%	4
TÉCNICO	1		20,00%	0,00%	1
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	5	0	100,00%	0,00%	5
TOTALES	5		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		4	0,00%	26,67%	4
TÉCNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
M.O.N.C.	9		60,00%	0,00%	9
TOTAL	10	5	66,67%	33,33%	15
TOTALES	15		100,00%		


TIPO DE EMPLEO

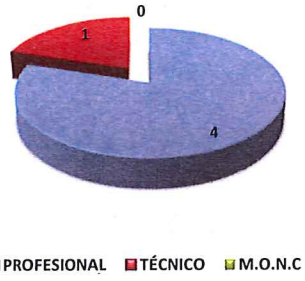


GENERACIÓN DE EMPLEO



TIPO DE EMPLEO

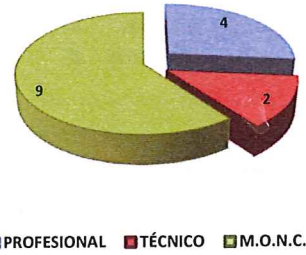


GENERACIÓN DE EMPLEO



CAM ¡Cuida tu naturaleza!	**INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	**10**	Ingeniería & Construcción

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"

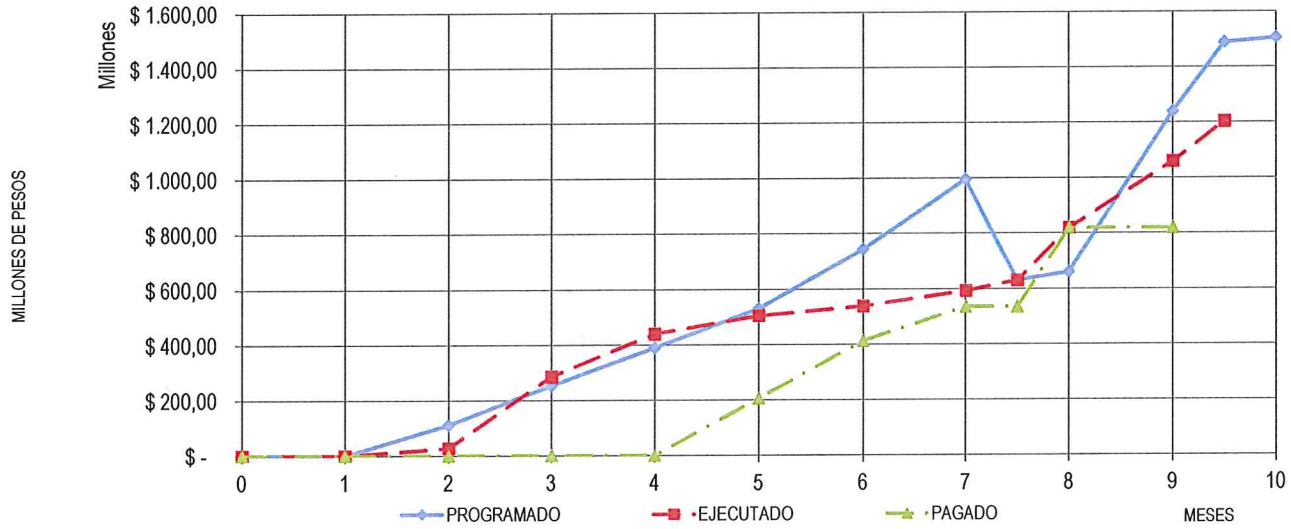

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Durante este periodo se continuó en el proceso de verificación de los aislamientos terminados en los diferentes predios.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Federico Pérez Charry **Cargo:** Inspector de Interventoría	**Nombre:** Hermencia Zambrano Serrato **Cargo:** Coordinador de Interventoría	**Nombre:** Carlos Arturo Quiza Camacho **Cargo:** Contratista de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

ANEXO 1

10

Ingenieria & Construcción

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	423 DE 2023	Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS
Periodo:	1 de agosto de 2024 al 15 de agosto de 2024	Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Coordinador contratista de obra	ANDRES FELIPE SAAVEDRA	Coordinador de Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
	ITEMS				$ 1.197.967.119,00				$ 843.554.734,00	$ 114.841.678,00	$ 958.396.413,00		$ 239.570.706,00
1	Aislamiento en zonas de proteccion de la cuenca hidrigrafica del rio Las Ceibas	ML	35.467,00	$ 23.408	$ 830.215.310,00	31.208,00	3.894,00	35.102,00	$ 730.520.185,00	$ 91.151.166,00	$ 821.671.351,00	365,00	$ 8.543.959,00
2	Procesos de restauracion activa en areas de conservacion de la zona de reserva forestal (predioos adquiridos y otros) en la cuenca hodrografica del rio Las Ceibas	HA	10,00	$ 7.896.838	$ 78.968.375,00	7,00	3,00	10,00	$ 55.277.863,00	$ 23.690.512,00	$ 78.968.375,00	0,00	
3	Implementar procesos de restauracion activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)	HA	30,00	$ 9.626.114	$ 288.783.434,00	6,00	0,00	6,00	$ 57.756.686,00		$ 57.756.687,00	24,00	$ 231.026.747,00
	TOTAL COSTO DIRECTO DE LA OBRA				$ 1.197.967.119,00				$ 843.554.734,00	$ 114.841.678,00	$ 958.396.413,00		$ 239.570.706
	ADMINISTRACION		10,00%		$ 119.796.712,00				$ 84.355.473,00	$ 11.484.168,00	$ 95.839.641,00		$ 23.957.071,00
	IMPREVISTOS		5,00%		$ 59.898.356,00				$ 42.177.737,00	$ 5.742.084,00	$ 47.919.821,00		$ 11.978.535,00
	UTILIDAD		9,00%		$ 107.817.041,00				$ 75.919.926,00	$ 10.335.751,00	$ 86.255.677,00		$ 21.561.364,00
	IVA		19,00%		$ 20.485.238,00				$ 14.424.786,00	$ 1.963.793,00	$ 16.388.579,00		$ 4.096.659,00
	COSTO AIU (24.00%)				$ 307.997.347,00				$ 216.877.922,00	$ 29.525.796,00	$ 246.403.718,00		$ 61.593.629,00
COSTO TOTAL DE OBRA					$ 1.505.964.466,00				$ 1.060.432.656,00	$ 144.367.474,00	$ 1.204.800.131,00		$ 301.164.335,00
											80,00%		

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 1.505.964.466,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 1.505.964.466,00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO: 0,00%
% RETEGARANTIA: 0,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No. 1	FE-96	5/04/2024	$ 206.778.825,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 206.778.825,00	$ 1.299.185.641,00	13,73%
2	Acta parcial No. 2	FE-98 y 99	25/04/2024	$ 207.328.798,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 207.328.798,00	$ 1.091.856.843,00	13,77%
3	Acta parcial No. 3	FE-100 y 101	24/05/2024	$ 122.766.651,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 122.766.651,00	$ 969.090.192,00	8,15%
4	Acta parcial No. 4	FE-107 y 108	En proceso	$ 284.015.713,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 284.015.713,00	$ 685.074.479,00	18,86%
	TOTAL			$ 820.889.987,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 820.889.987,00	$ 685.074.479,00	54,51%

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO: $ 152.573.345,00
V/R ADICIONES: $ 0,00
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 152.573.345,00

V/R ANTICIPO: NA
% ANTICIPO: NA
% RETEGARANTIA: 10,00%

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No.1	FVE 59	29/12/2023	$ 19.229.353,00	$ 0,00	N/A	N/A	$ 19.229.353,00	$ 133.343.992,00	12,60%
2	Acta parcial No.2	FVE 60 y 61	30/04/2024	$ 22.733.428,42	$ 0,00	N/A	N/A	$ 22.733.428,42	$ 110.610.563,58	14,90%
3	Acta parcial No.3	FVE 62 y 64	En proceso	$ 12.434.727,62	$ 0,00	N/A	N/A	$ 12.434.727,62	$ 98.175.835,96	8,15%
4	Acta parcial No.4	FVE 67 y 68	En proceso	$ 28.775.332,88	$ 0,00	N/A	N/A	$ 28.775.332,88	$ 69.400.503,08	18,86%
	TOTAL			$ 83.172.841,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 83.172.841,92	$ 69.400.503,08	54,51%

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA **ANEXO 2**	10	Ingenieria & Construcción

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	SOFOR INGENIERIA SAS	Coordinador de obra:	ANDRES FELIPE SAAVEDRA
Interventor:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	Coordinador Interventoria:	HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO
Fecha del registro fotográfico:	1 de agosto de 2024	al	15 de agosto de 2024

FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		
PREDIO LA URRACA - VDA LA PLATA - NEIVA	PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA	PREDIO LOTE 4 CORPORACION - VDA LA PLATA - NEIVA
FOTOGRAFÍA No.4	**FOTOGRAFÍA No.5**	**FOTOGRAFÍA No.6**
		
PREDIO EL CEDRAL - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA	AISLAMIENTO ADICIONAL - PREDIO LA COLONIA - VDA LA PLATA - NEIVA	RESTAURACION ACTIVA - BARCELONA - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	5-ago-24	PERIODO No.	38	DEL	29/07/2024	AL	4/08/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DIAS POR EJECUTAR	34			DIAS POR EJECUTAR	34		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	270	EQUIVALE AL	88,8%	PLAZO TRANSCURRIDO:	270	EQUIVALE AL	88,8%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	24/06/2024	24/06/2024	0
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.489.447.622,17	98,90%	-27,61%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.073.645.079,88	71,29%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en el municipio de **Neiva**: En el predio San Andrés - La Rosa de la vereda San Bartolo se han ejecutado 1.590m de 1.590; en el predio La Carolina se han ejecutado 4.449m de 6.450m y se continúa con el hincado de postes; se continuó con el hincado de postes en el predio Lote No.4 La Corporación en la vereda La Plata; además se continuó la siembra en el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo con un avance a la fecha de 7ha de 10ha.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se realizo visita en Iquira para conteo de especies muertas o con problemas fitosanitarios para la establecer el porcentaje de mortalidad de las 3 ha sembradas inicialmente, arrojando una tasa de mortalidad del 3,57%, por lo cual el contratista realizó la respectiva resiembra en dichas especies.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



MANTENIMIENTO RESTAURACION - RESGUARDO - RIO NEGRO - IQUIRA



PREDIO SAN ANDRES LA ROSA - VDA SAN BARTOLO - NEIVA



AVANCE - PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA



PREDIO LOTE 4 DE LA CORPORACION - VDA LA PLATA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

***VoBO SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

Ingenieria & Construcción

FECHA REALIZACIÓN	12-ago-24	PERIODO No.	39	DEL	5/08/2024	AL	11/08/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DIAS POR EJECUTAR	27			DIAS POR EJECUTAR	27		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	277	EQUIVALE AL	91,1%	PLAZO TRANSCURRIDO:	277	EQUIVALE AL	91,1%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICION(ES):	$ -			VALOR ADICION(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	24/06/2024	24/06/2024	0
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.489.447.622,17	98,90%	-22,33%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.153.165.466,04	76,57%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACION		TOTAL PERSONAL
		SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en el municipio de **Neiva**: En el predio La Carolina se han ejecutado 5.600m de 6.450m y se continúa con el hincado de postes; se terminaron 960m de 960m en el predio Lote No.4 La Corporación en la vereda La Plata y 836m de 836m en el predio El Cedral de la vereda Pueblo Nuevo; además, se continuó la siembra en el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo con un avance a la fecha de 8ha de 10ha.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



RESTAURACION ACTIVA BARCELONA -VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA



PREDIO LOTE 4 DE LA CORPORACION - VDA LA PLATA - NEIVA



AVANCE - PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA



PREDIO EL CEDRAL - VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

***VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA No. 423 DE 2023

FECHA REALIZACIÓN	16-ago-24	PERIODO No.	40	DEL	12/08/2024	AL	15/08/2024

1. INFORMACION GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "ADELANTAR PROCESOS DE RESTAURACION ACTIVA Y PASIVA PARA CONSOLIDAR LAS AREAS DE RECARGA HIDRICA EN LA ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL RIO LAS CEIBAS, RESERVAS NATURALES DE LA SOCIEDAD CIVIL, BOSQUE SECO TROPICAL, HUMEDALES Y LA EJECUSION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS EN EL MACIZO COLOMBIANO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Departamento del Huila

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO No.:	437 DE 2023			CONTRATO No.:	423 DE 2023		
PLAZO INICIAL (10 MESES):	304			PLAZO INICIAL (5 MESES):	304		
FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023			FECHA DE INICIACIÓN:	8 de noviembre de 2023		
**FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE SUSPENSIÓN:			
**FECHA DE REINICIACIÓN:				FECHA DE REINICIACIÓN:			
DÍAS POR EJECUTAR	23			DÍAS POR EJECUTAR	23		
FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	7 de septiembre de 2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	304			PLAZO ACTUALIZADO:	304		
PLAZO TRANSCURRIDO:	281	EQUIVALE AL	92,4%	PLAZO TRANSCURRIDO:	281	EQUIVALE AL	92,4%
VALOR INICIAL :	$ 152.573.345,00			VALOR INICIAL :	$ 1.505.964.466,00		
VALOR ADICIÓN(ES):	$ -			VALOR ADICIÓN(ES):	$ -		
VALOR ACTUALIZADO:	$ 152.573.345,00			VALOR ACTUALIZADO:	$ 1.505.964.466,00		
VALOR PAGADO:	$ -			VALOR PAGADO:	$ -		
VALOR POR PAGAR:	$ 152.573.345,00			VALOR POR PAGAR:	$ 1.505.964.466,00		

2. CONTROL DE HITOS.

No.	*** DESCRIPCIÓN DEL HITO	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)	19/09/2023	19/09/2023	0
1	**Aislamiento en zonas de protección de la protección de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	4/12/2023	25/12/2023	-21
2	**Procesos de restauración activa en áreas de conservación de la zona de reserva forestal (predios adquiridos y otros) en la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas**	24/06/2024	24/06/2024	0
3	**Implementar procesos de restauración activa para la conectividad en el macizo colombiano (HA)**	11/12/2023	15/01/2024	-35

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
1	Valor acumulado de las actividades o productos conforme a la programación vigente.	$ 1.489.447.622,17	98,90%	-18,90%
2	Valor acumulado de las actividades o productos ejecutados y aprobados por la Interventoría.	$ 1.204.800.131,04	80,00%	


3. PERSONAL EN OBRA

NOMBRE	NUMERO DE INDENTIFICACIÓN	CARGO
ANDRES FELIPE SAAVEDRA	2.236.682	Coordinador
RAMIRO DEVIA GALINDO	93.359.578	Técnico de campo
NICOLAS STEVEN CARDOZO BARRETO	1.110.582.681	Técnico de campo
FERNEY DANILO CASTRO GALINDEZ	1.083.917.582	Técnico de campo
ARIEL ALBEIRO ARIAS SALAS	93.982.899	Técnico de campo
ISABEL TERESA CHAVEZ SAAVEDRA	1.032.363.465	Ingeniera de apoyo
OSCAR HERVEY ARIAS	5.996.146	Ayudante
JHON URIEL MURILLO	93.393.748	Ayudante
JACID CARDOZO	93.371.376	Ayudante
ISRAEL MARTINEZ MONROY	93.128.802	Ayudante
JOSE HERRERA	5.843.980	Ayudante
JHON HERNANDEZ	1.110.531.154	Ayudante
JACOBO VARGAS	1.110.443.170	Ayudante
MIYER ADALBER ARIAS SANCHEZ	1.193.517.973	Ayudante
HENRY VARON BORDA	93.382.205	Ayudante


3.1 COMPOSICION DE PERSONAL EN OBRA

	PERSONAL	LOCAL SI	LOCAL NO	PARTICIPACION LOCAL	PARTICIPACION NO LOCAL	TOTAL PERSONAL
TOTALES	PROFESIONAL	0	4	0,00%	26,67%	4
	TECNICO	1	1	6,67%	6,67%	2
	M.O/N.C	9	0	60,00%	0,00%	9
	TOTALES	**10**	**5**	**66,67%**	**33,33%**	**15**
	TOTAL	**15**		**100%**		

TIPO DE EMPLEO



GENERACION DE EMPLEO



4. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

En este periodo se continuaron actividades en el municipio de **Neiva**: En el predio La Carolina ejecutaron 6.450m de 6.450m y se terminaron 230m de 230m en el predio La Urraca en la vereda La Plata; además, se terminó la siembra en el predio Barcelona de la vereda Pueblo Nuevo con un avance de 10ha de 10ha.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

6. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N/A

7. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Los aislamientos terminados continúan en proceso de verificación por parte de la Interventoría. Se tuvo dificultad en el avance de algunas zonas durante la semana, debido a problemas de orden público; sin embargo, se culminaron las actividades.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



PREDIO LA CAROLINA - VDA LA PLATA - NEIVA



RESTAURACION ACTIVA BARCELONA -VDA PUEBLO NUEVO - NEIVA



PREDIO LA URRACA - VDA LA PLATA - NEIVA



ADICIONAL PREDIO LA COLONIA - VDA LA PLATA - NEIVA

FIRMA INSPECTOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: FEDERICO PÉREZ CHARRY

FIRMA: COORDINADOR DE INTERVENTORIA
NOMBRE: HERMENCIA ZAMBRANO SERRATO

***VoBo SUPERVISOR**
NOMBRE SUPERVISOR: JAVIER CARDOSO GUTIERREZ

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30480313	I	2024-08-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30480313	2024-08-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 79142300	QUIZA CAMACHO CARLOS ARTURO	1.400.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.400.000	224.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.400.000	175.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.400.000	7.400	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	406.400	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	I	01	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-07	30480313	I	2024-08-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	410.800	4.400	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30480313	2024-08-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	224.000	0	2.400	0	226.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	224.000	0	2.400	0	226.400
EPS(Administradoras: 1)				1	175.000	0	1.900	0	176.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	175.000	0	1.900	0	176.900
ARP(Administradoras: 1)				1	7.400	0	100	0	7.500
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	7.400	0	100	0	7.500
Gran Total					406.400	0	4.400	0	410.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05	8757000	CQUIZA@SINCOLTDA.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30615920	E	2024-08-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.519.200	26.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
6	30615920	2024-08-16	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 36152865	ZAMBRANO SERRATO HERMENCIA	1.300.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	1	194.500	S	5711001
2	CC 49609707	DAZA SALGADO LINDSAY VIBED	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.000	280.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
3	CC 1075221485	VARELA RAMOS SANDRA LICETH	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1711001
4	CC 1075263752	ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5711001
5	CC 1080291745	SUAREZ MINU ANDERSON	1.750.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.750.000	280.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.000	70.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.750.000	70.000	1.750.000	121.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	541.800	S	5711001
6	CC 1121917315	LUNA PINZON JULIAN RICARDO	4.000.000	F		X														0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	1.200.000	192.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.200.000	48.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.700.000	108.000	1.200.000	83.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	431.600	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000			CQUIZA@SINCOLTDA.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30615920	E	2024-08-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.519.200	26.300	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	30615920	2024-08-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
7.500.000	8.800.000	8.800.000	10.300.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	1.200.000	0	12.600	0	1.212.600
PROTECCION	230201	800229739	0	2	520.000	0	5.500	0	525.500
PORVENIR	230301	800224808	8	3	680.000	0	7.100	0	687.100
EPS(Administradoras: 3)				6	352.000	0	3.800	0	355.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	48.000	0	500	0	48.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	174.000	0	1.900	0	175.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	130.000	0	1.400	0	131.400
ARP(Administradoras: 1)				6	528.900	0	5.600	0	534.500
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	528.900	0	5.600	0	534.500
CCF(Administradoras: 1)				6	412.000	0	4.300	0	416.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	6	412.000	0	4.300	0	416.300
Gran Total					2.492.900	0	26.300	0	2.519.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30615955	E	2024-08-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.700	16.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30615955	2024-08-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 7729413	GUTIERREZ QUIROGA DIEGO FERNEY	1.300.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	1.300.000	208.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001
2	CC 12118071	PEREZ CHARRY FEDERICO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	2.500.000	400.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.500.000	100.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5711001
3	CC 12124063	TRIVIÑO PEREZ JOSE LIZARDO	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.300.000	52.000	1.300.000	90.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	402.500	S	5711001

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 79142300	0	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO	B	02	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 8C 34 05		8757000		CQUIZA@SINCOLTDA.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-07	2024-08	30615955	E	2024-08-16	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.595.700	16.700	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	30615955	2024-08-16	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				3	816.000	0	8.600	0	824.600
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	608.000	0	6.400	0	614.400
PROTECCION	230201	800229739	0	1	208.000	0	2.200	0	210.200
EPS(Administradoras: 2)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	52.000	0	600	0	52.600

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	152.000	0	1.600	0	153.600
ARP(Administradoras: 1)				3	355.000	0	3.700	0	358.700
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	3	355.000	0	3.700	0	358.700
CCF(Administradoras: 1)				3	204.000	0	2.200	0	206.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	204.000	0	2.200	0	206.200
Gran Total					1.579.000	0	16.700	0	1.595.700

ASOPAGOS s.a.
PAGADO
