INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS
CONTRATO NO.958 DE 2023 – CONTRATO NO. 954 DE 2024, MUNICIPIO DE MELGAR - TOLIMA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN N°3 DEL 01 DE DICIEMBRE A 30 DE DICIEMBRE DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECÓN ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Zona urbana del Municipio de Melgar Tolima Barrios Las vegas-Resacas			
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE MELGAR, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES SGPR**			$149.999.999
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS			$ 0,00
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO			$149.999.999
FECHA SUSCRIPCIÓN	24 DE JULIO DE 2024			
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	23/OCT/2023	**FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO**		31/ENE/2024
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	ING. ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA		**DESDE:** 08/AGO/2023	
SUPERVISORES ANTERIORES	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**	
	Ing. CRISTIAN DANIEL LIEVANO FRANCO	08/08/2023	31/01/2024	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	SGR 2023000125			
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	SGR 2023001663			
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A			
RUBRO PRESUPUESTAL	2320323. R2.02.02.02. 008.003.02 2.2.9.1.0 2022004730081 24 4002 2402119 91199 001			
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	CUMPLIMIENTO	21-46-101073901	08/08/2023	
	RESPONSABILIDAD CIVIL	21-46-101073901	08/08/2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	08 DE AGOSTO DE 2023			
FECHA DE MODIFICACIONES,	N/A		**FECHA:** DD/MM/AAAA	

ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO	16 DE DICIEMBRE (46 DIAS)	**FECHA:** 31/01/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO	04/09/2023 (52 DIAS)	**FECHA:** 27/10/2023
		FECHA: 28/10/2023
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	CUMPLIMIENTO	DESDE 08 de agosto de 2023
	RESPONSABILIDAD CIVIL	DESDE 08 de agosto de 2023
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		$112.208.276
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ 37.056.303
CUOTA DE GERENCIA		$ 0
VALOR DE OBRA		$0
VALOR INTERVENTORÍA		$ 0
VALOR ADICIONAL DE OBRA		$ 0

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO
N/A

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
21-46-101073901	CUMPLIMIENTO	$ 28.052.069	24/07/2023	11/10/2023
21-46-101073901	RESPONSABILIDAD CIVIL	$ 22.441.655,20	24/07/2023	10/10/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y de Obra* – EN EJECUCION**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato: 958 DEL 17 DE JULIO DE 2023	"ESTUDIOS Y DÍSEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECÓN ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		$112.208.276
Adicional en valor	N/A		N/A
Nombre contratista	INGENIERÍA Y DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S BIC		NIT: 901.471.535
Fecha de Acta de inicio del contrato	08/08/2023		HASTA 31 DE ENERO DE 2024
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRÓRROGA 1	N/A	DD/MM/AAAA
	SUSPENSIÓN 1	04/09/ 2023 (53 DIAS)	27/10/2023
	REINICIO 1		28/10/2023
	PRORROGA 1	16/12/2023 (46 DIAS)	31/01/2024

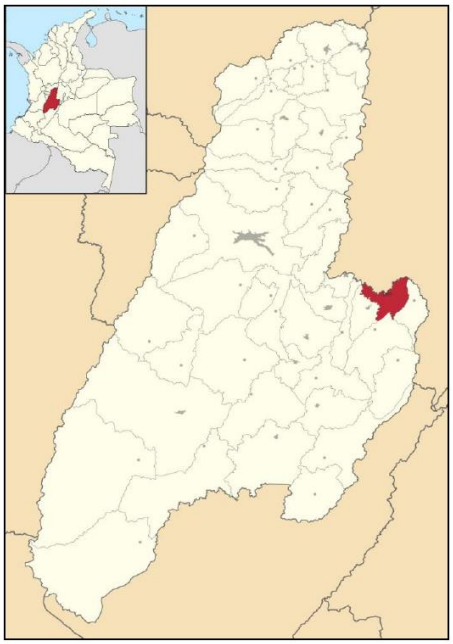
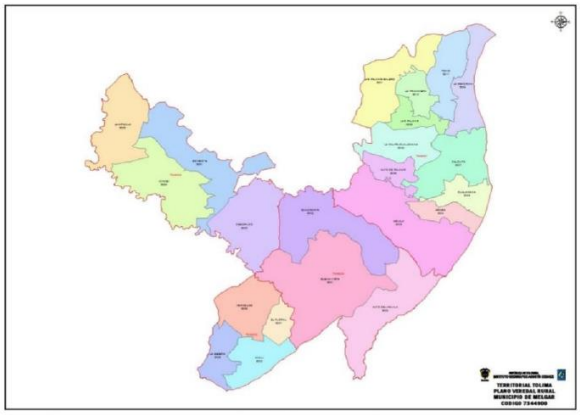
	SUSPENSIÓN 2	N/A	DD/MM/AAAA
	REINICIO 2	N/A	DD/MM/AAAA
Fecha Inicial de terminación del contrato	23/10/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	31/01/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			112.208.276
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**HDI SEGUROS**		
PÓLIZA No.	No. 21-46-101073901 **Aprobada:** 08/12/2023 No. 21-46-101073901 **Aprobada:** 08/12/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DESDE 14/07/2023 HASTA 27/09/2028		
	Responsabilidad Civil: DESDE 14/07/2023 HASTA 27/09/2028		

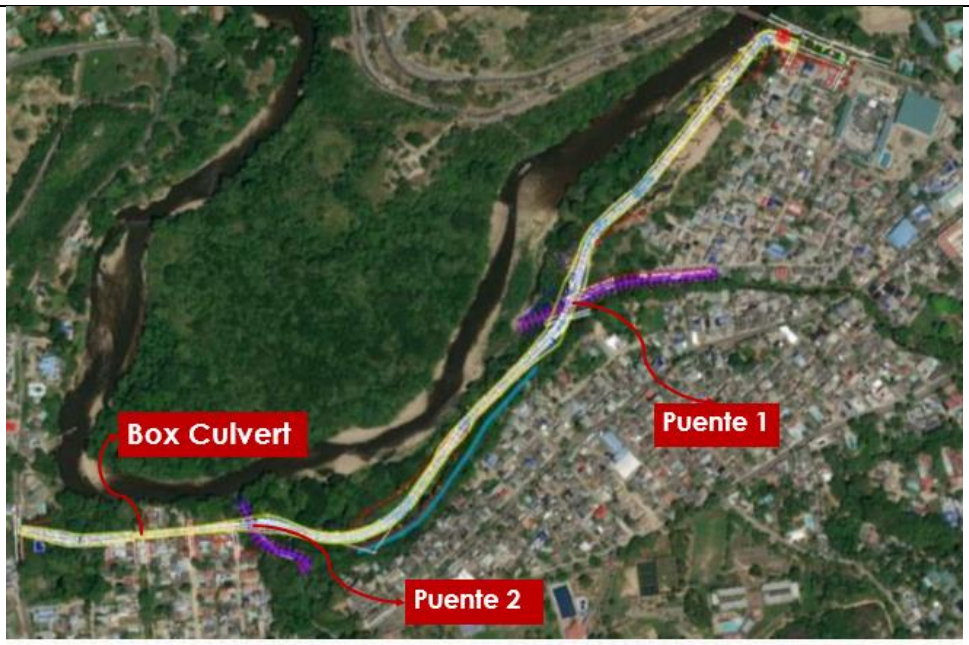
- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y Obra*** **- EN EJECUCIÓN**

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato: 954 del 07 de Julo de 2023	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECON ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		$ 37.056.303
Adicional en valor	N/A		N/A
Nombre contratista	ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA		C.C. 79.965.798-7
Fecha Acta inicio	08/08/2023		HASTA 31 DE ENERO DE 2024
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	PRORROGA 1	16/12/2023 (46 DIAS)	31/01/2024
	SUSPENSIÓN 1	04/09/2023 (52 DIAS)	27/10/2023
	REINICIO 1	28/10/2023	DD/MM/AAAA
	PRORROGA 2	N/A	DD/MM/AAAA
	SUSPENSION 2	N/A	DD/MM/AAAA
	REINICIO 2	N/A	DD/MM/AAAA
Fecha Inicial de terminación del contrato	23/10/2023	**Fecha Actual de terminación del contrato**	31/01/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 37.056.303
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	No. 39-44-101152819 Aprobada**:** 27/07/2023		
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: DESDE 14/07/2023 HASTA 27/09/2028		

5. INFORME TÉCNICO

INTRODUCCIÓN	LA CONTRATACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECÓN ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN MATERIA VIAL Y DE TRANSPORTE PARA QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MELGAR GOZEN DE UNA MEJORA EN LA CONCECTIVIDAD, ADEMÁS DE BUSCAR UN ESPACIO DE ESPARCIMIENTO PARA LOS TURISTAS QUE ALBERGAN EL MUNICIPIO EN TEMPORADAS VACACIONALES, CON LA PROYECCIÓN DE UN MALECÓN TURISTICO, BUSCANDO INTENSIFICAR EL TURISMO DEL MISMO. DE IGUAL FORMA, SE REQUIRIO DE LA CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORÍA INTEGRAL QUE GARANTIZARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECÓN ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR - DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", EL CUAL COMO SE MENCIONO ANTERIORMENTE BUSCA SUPLIR LA NECESIDAD DE CONECTIVIDAD DE LA MALLA VIAL CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA CONECTAR LOS BARRIOS VEGAS, SICOMORO Y RESACAS, ASI COMO, INTENSIFICAR EL COMERCIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN MALECÓN TURISTICO.
ANTECEDENTES	SE CELEBRÓ EL CONCURSO DE MERITOS CMA 003-2023, ENTRE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA INTERVENTORÍA, CON LA FINALIDAD DE PROYECTAR LA INTERVENCIÓN VIAL DE LOS BARRIOS VEGAS, SICOMORO Y RESACAS. EL PROYECTO SE ENMARCA, COMO LA PROYECCIÓN DE 1616M DE TRAMO VIAL ENTRE EL SECTOR DEL BARRIO LAS VEGAS HASTA EL BARRIO RESACAS DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA, DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE CONSULTORA N° 958 - 2023, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE MELGAR Y EL OFERENTE INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO S.A.S DE FORMA ANÁLOGA SE SUSCRIBIÓ ENTRE ALCALDÍA MUNICIPAL DE MELGAR Y ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 954 – 2023, EL CUAL SE ENFOCA EN EL CONTROL Y VIGILANCIA DEL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA.
OBJETIVOS	EL CONSULTOR DEBE EJECUTAR EL CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN CMA 003-2023, LOS CUALES HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. EL CONSULTOR CONTRATADO MEDIANTE CONTRATO 958 DE 2023 SE OBLIGA CON LA ENTIDAD A EJECUTAR, A LOS PRECIOS COTIZADOS EN LA PROPUESTA Y CON SUS PROPIOS MEDIOS –MATERIALES, MAQUINARIA, LABORATORIOS, EQUIPOS Y PERSONAL- EN FORMA INDEPENDIENTE Y CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN Y ACEPTACIÓN FINAL, LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE CONSULTORÍA SEGÚN LO ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, EL PLIEGO DE CONDICIONES, EL ANEXO TÉCNICO Y EL CONTRATO EN EL CUAL SE EJERCERÁ LA CONSULTORÍA.

LOCALIZACIÓN	**LOCALIZACIÓN GENERAL** EL PROYECTO SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, UBICADO AL NORTE DEL CITADO DEPARTAMENTO Y EQUIDISTANTE DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ Y DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C EN APROXIMADAMENTE 92 KILÓMETROS DE CADA UNA DE LAS MENCIONADAS CIUDADES CAPITALES Y SOBRE LA VÍA PRINCIPAL QUE LAS COMUNICA.   **Fuente:** Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC. Recuperado en Agosto de 2015. **LOCALIZACIÓN DE LAS VÍAS INTERVENIDAS ACTUALMENTE** A CONTINUACIÓN, SE PRESENTA EL MAPA DE LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL TRAMO QUE SERA PROYECTADO POR EL CONSULTOR PARA SU PROXIMA INTERVENCIÓN.

	 **DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA** LA PROYECCIÓN DE ESTE PROYECTO PRETENDE BENEFICIAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL, RESIDENTES, PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DEL SECTOR Y DEMÁS PERSONAS QUE TRANSITARAN POR ESTA NUEVA VÍA, MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD Y FACILITANDO EL TRÁNSITO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN EL CASCO URBANO CON LA VIA QUE CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALÁ.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	DENTRO DE LA PROYECCIÓN DE LA CONSULTORIA SE TENDRA EN CUENTA LA INTERVENCIÓN DE 1616 M DE VIA, LOS CUALES SE PRETENDEN SERÁN PAVIMENTADOS MEDIANTE MEZCLA DENSA ASFALTICA, A SU VEZ, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN SISTEMA DE VIGA POS-TENSADO, LOS CUALES TENDRÁN 43 Y 25 M CADA UNO.

- ***AVANCE DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y DE OBRA*** - **<u>EN EJECUCIÓN</u>**

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 958 de 2023	
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	60%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	50%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 0
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 0
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA HAN SOLICITADO 46 DIAS DE PRORROGA, TENIENDO QUE EL ADICONAL EN TIEMPO SERIA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2024	

SE HACE ENTREGA DE LOS TOMOS DE HIDROLOGIA, ASI COMO TAMBIEN SE DETERMINA EL ALCANCE EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BOX CULVERT UBICADO EN EL BARRIO RESACAS SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS POR PARTE DE LA CONSULTORIA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2023. A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA EJECUCION FÍSICA Y UN CERO POR CIENTO (0%) DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

- ***AVANCE DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA* - <u>EN EJECUCIÓN</u>**

CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 108 de 2024	
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO:	60%
AVANCE FISICO EJECUTADO:	50%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO:	$ 0
AVANCE FINANCIERO EJECUTADO	$ 0
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA HAN SOLICITADO 46 DIAS DE PRORROGA, TENIENDO QUE EL ADICONAL EN TIEMPO SERIA DESDE EL 16 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2024 SE HACE ENTREGA DE LOS TOMOS DE HIDROLOGIA, ASI COMO TAMBIEN SE DETERMINA EL ALCANCE EN CUANTO A LA ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL BOX CULVERT UBICADO EN EL BARRIO RESACAS, LOS CUALES SON REVISADOS Y APROBADOS POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SE INFORMA QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE 2024 A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN CINCUENTA POR CIENTO (50%) DE LA EJECUCION FÍSICA Y UN CERO POR CIENTO (0%) DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	

- ***GESTIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTAL.***

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA COMITÉ E INFORMES	ASUNTO	OBSERVACIONES / ACCIONES
28/AGOSTO/2023	SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECÓN ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”	SOCIALIZAR ENTRE LA INTERVENTORIA Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL AVANCE QUE HA TENIDO LA CONSULTORIA DESDE EL INICIO DEL CONTRATO.

27/11/2023	SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECÓN ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	SOCIALIZAR ENTRE LA INTERVENTORIA Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL AVANCE EN LA ENTREGA DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS A LOS CUALES ES NECESARIO REQUERIR ANTE LA ENTREGA DE INFORMACIO QUE SERIA INSUMO NECESARIO PARA LLEV A CABO EL ALCANCE DEL PROYECTO.
14/12/2023	SOCIALIZACIÓN DEL AVANCE DEL PROYECTO "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES Y DE LA AVENIDA MALECÓN ENTRE EL SECTOR LAS VEGAS Y BARRIO RESACAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	SOCIALIZAR ENTRE LA INTERVENTORIA Y LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EL DESARROLLO DE LA CONSULTORIA, TENIENDO COMO PRINCIPALES REVISABLES, EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y EL TOMO HIDROGRAFICO.

FECHA OFICIO	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	CARGO QUIEN ENVIA	CARGO QUIEN RECIBE
22/08/2023	**OFI-02-PR-055-2023**	REITERACIÓN ATENCIÓN A DOCUMENTACIÓN DE INICIO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 958 DE 2023	INTERVENTORIA.	CONSULTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
25/08/2023	**SIDF-364**	SOLICITUD COMITÉ TECNICO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSULTORIA E INTERVENTORIA
28/08/2023	**OFI-03-PR-055-2023**	RECIBIDO, APROBACIÓN Y OBSERVACIONES A DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	INTERVENTORIA	CONSULTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
31/08/2023	**IN-E-480-23**	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN NO. 1 AL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	INTERVENTORIA Y CONSULTORIA
01/09/2023	**OFI-04-PR-055-2023**	SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 958 DE 2023	INTERVENTORIA	CONSULTORIAY SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
30/10/2023	**IN-E-679-23**	AUTORIZACIÓN DE PODA DE VEGETACIÓN Y SOLICITUD DE ACOMPAÑAMIENTO POLICIVO PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	INTERVENTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
01/11/2023	**IN-E-688-23**	SOLICITUD APROBACIÓN PLAN DE TRABAJO LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y EXPLORACIÓN DE SUELOS PARA EL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958-2023.	CONSULTORIA	INTERVENTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
01/11/2023	**OFI 10,11-PR-055-2023**	CORRECIÓN A CRONOGRA PRESENTADO Y	INTERVENTORIA	CONSULTORIA Y SECRETARIA DE

		APROBACIÓN PLAN DE EXPLORACIÓN		INFRAESTRUCTURA.
02/11/2023	**IN-E-694-23**	ENTREGA DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO NO. 21-46-101073901-6 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
07/11/2023	**SIDF-431**	SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORIA 958 DE 2023	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO	CONSULTORIA E INTERVENTORIA
08/11/2023	**0FI 12-PR-055-2023**	APROBACIÓN CRONOGRAMA PRESENTADO	INTERVENTORIA	CONSULTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
20/11/2023	**IN-E-746-23**	SOLICITUD DE INFORMACIÓN EXISTENTE Y/O PROYECTADA DE IDEAM, PARA EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
22/11/2023	**IN-E-756-23**	SOLICITUD DE INFORMACIÓN HIDROMETEREOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA Y SUS ALREDEDORES.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
23/11/2023	**OFI-13-PR-055-2023**	SOLICITUD DE LINKS DE GRABACIONES REUNIONES	INTERVENTORIA	CONSULTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
23/11/2023	**IN-E-760-23**	ENTREGA LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
24/11/2023	**OFI-14-PR-055-2023**	SOLICITUD DE REUNIÓN DE AVANCE LUNES 27 DE NOVIEMBRE	INTERVENTORÍA	CONSULTORIA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.
24/11/2023	**IN-E-766-23**	ESTADO EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
27/11/2023	**IN-E-768-23**	SOLICITUD PRORROGA NO.1 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
27/11/2023	**IN-E-772-23**	SOLICITUD BASE DATOS CATASTRAL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
30/11/2023	**OFI-15-PR-055-**	SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO	INTERVENTORIA	CONSULTORIA Y SECRETARIA DE

	2023	958 DE 2023		INFRAESTRUCTURA.
30/11/2023	**IN-E-768-23**	SOLICITUD PRORROGA NO.1 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
04/12/2023	**IN-E-814-23**	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA BOX CULVERT CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
05/12/2023	**SIDF- 463**	SOLICITUD DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y CONSTRUCTIVA BOX CULVERT CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONSULTORIA E INTERVENTORIA
07/12/2023	**IN-E-833-23**	ENTREGA TOMO HIDROLOGÍA CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
13/12/2023	**IN-E-843-23**	SOLICITUD MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA
21/12/2023	**IN-E-858-23**	ENTREGA DE PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO NO. 21-46-101073901-7 DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA NO. 958 DE 2023.	CONSULTORIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA E INTERVENTORIA

- ***PERSONAL ACTUAL VIGENTE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO.***

NOMBRE	**CARGO**
ING. JULIAN DANIO OCHOA NIÑO	REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CRAIN CONTRATISTA OBRA
ING. ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

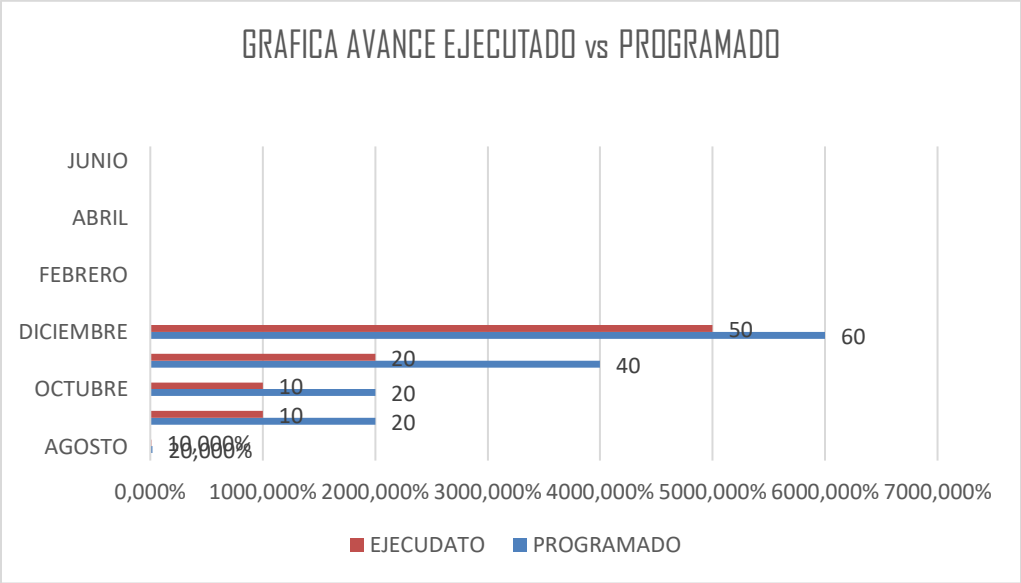
- ***INFORMACIÓN AVANCE FÍSICO – AVANCE FINANCIERO - CONSULTORIA***

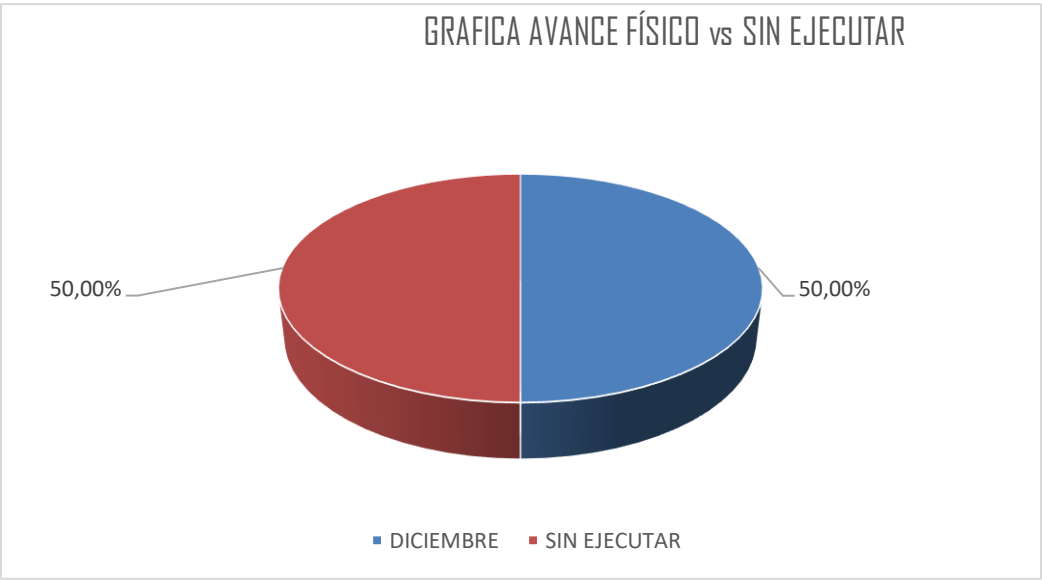
ACTA N°	**% EJECUCION**	**EGRESO N°**	**FECHA**	**VALOR**	**ANTICIPO**		**ACUMULADO**
					AMORTIZADO	**SALDO**	
1	10	N/A	AGOSTO	$ 0	$0,00	N/A	N/A
2	20	N/A	NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	N/A	N/A
3	50	N/A	DICIEMBRE	$ 0	$ 0	N/A	N/A
TOTALES							

➢ ***INFORMACIÓN AVANCE FÍSICO – AVANCE FINANCIERO – INTERVENTORÍA***

ACTA N°	% EJECUCION	EGRESO N°	FECHA	VALOR	ANTICIPO		ACUMULADO
					AMORTIZADO	SALDO	
1	10	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	20	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	50	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							

AVANCE FÍSICO – AVANCE FINANCIERO DE LA CONSULTORIA





ACTIVIDAD	CANTIDAD	
VISITAS TÉCNICAS	**EJECUTADO**	**%**
EL CONTRATO DE OBRA LLEVA UN AVANCE DE EJECUCIÓN SEGÚN LOS INFORMES DE INTERVENTORÍA Y LAS COMUNICACIONES CON EL CONSULTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.	$ 0,00 **(CONSULTORIA)**	50%

- El día 08 de agosto de 2023 se firma el acta de inicio para el contrato de consultoría y así mismo para el contrato de interventoría, iniciando así las actividades contractuales que comprenden el alcance del proyecto.
- El día 28 de agosto de 2023 se realizó reunión virtual mediante el aplicativo Microsoft teams con el objetivo de revisar el avance que ha tenido el contrato 958 de 2023 desde su acta de inicio.
- El día 31 de agosto y 01 de septiembre de 2023 tanto la consultoría como la interventoría solicitan una suspensión a los contratos 958 y 954 respectivamente.
- El día 04 de septiembre los contratos 954 y 958 de suspenden.
- El día 27 de noviembre de 2023 se realizo una socialización del avance del proyecto "estudios y diseños para la construcción de dos puentes y de la avenida malecón entre el sector las vegas y barrio resacas en el municipio de Melgar departamento del Tolima.
- El día 14 de diciembre de 2023 se realizó la socialización entre la interventoría y la administración municipal para evaluar el desarrollo de la consultoría, teniendo como principales revisables, el levantamiento topográfico y el tomo hidrográfico.

5. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

6. SUPERVISOR

En constancia de lo anterior, el presente informe se firma a los treinta (30) días del mes de abril de 2024, en la ciudad de Melgar – Tolima.

ING. ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA Supervisor del Contrato Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico	**ING. CRISTIAN DANIEL LIEVANO FRANCO** Elaboró - Apoyo Profesional a la Supervisión Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Físico

Revisó: ING. ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA
Secretario De Infraestructura Y Desarrollo Físico
