	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. Contrato de 3827 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL SABANA ALTA


Interventoría No. **4383 DE 2023** **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 2 **MES O PERIODO:** ENERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		8
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	34
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	35
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	38
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		No Aplica
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		No Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	42
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		12
5.1	Información general del contrato		13
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		No Aplica
5.3	Informes especialistas y profesionales		No Aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No Aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No Aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No Aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No Aplica
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	46
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	48
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	49
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	50
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		17
8	**Anexos**		52
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		53
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		59
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No Aplicca
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		No Aplica

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____

Nombre: **OMAR EDIL GOMEZ NAVIA**

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No._____de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR
PERIODO MES: ENERO

CONVENIO No.: 3827 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 194.229.801,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4383 DE 2023
INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	ML	140
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	2
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	ML		
Estructuras	Alcantarillas	UNIDAD	2	2
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$141.927.838,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4.183.037,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$47.118.926,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$193.229.801,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	0,00	402.911,50
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	0,00	0,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.558.510,00	8.858.510,00
VALOR EJECUTADO	5.385.720,18	23.895.361,87

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 7.449.052,99
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 402.911,50
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,28%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 8
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **10**


REGISTRO FOTOGRÁFICO







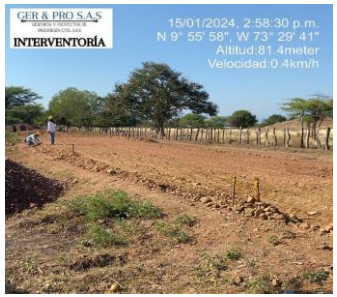

Insumo de materail de subase/ Vereda Sabana Alta	Pajarita , extencion de subases/ Vereda Sabana Alta.
 	 
Nivelacion con topografia y demarcacion	**Compactacion de subase con BENITIN 1,5 TON**
 	
Ensayo de densidad en subase/vereda sabana alta	**vereda sabana alta**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4383/2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

01 de enero al 31 de enero 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVO DEL INFORME 6
1. DATOS GENERALES 6
2. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 6
3. Datos del contrato de Interventoría 7
4. ACTIVIDADES DEL PERIODO 8
4.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 8
4.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 10
4.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 11
4.4. Informes semanales 13
5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 13
6. Seguimiento Gestión Social 13
7. Seguimiento Gestión Ambiental 13
8. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 13
9. Relación de pólizas contrato de obra 13
10. Relación de pólizas contrato de interventoría 14
11. REGISTRO FOTOGRAFICO 15
12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 18

LISTA DE TABLAS

Tabla 0-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado 8
Tabla 0-2: Actividades Programadas Periodo del 01 de enero al 31 de enero 2024. 9
Tabla 0-3. Gastos financieros JAC SABANA ALTA, en el convenio 3827 de 2024. 10
Tabla 0-4. Relación de avance del Convenio 11
Tabla 0-5. Informes semanales elaborados por interventoría 13
Tabla 0-6: Póliza según firma del convenio de obra 14
Tabla 0-7. Póliza según firma del contrato de interventoría 14

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Diana Carolina Polo Brito	Ing. Residente de Interventoría		31/01/2024
Revisó	José Doria Hernández	Rep. Legal Interventoría		31/01/2024
Aprobó	Omar Peralta Carrillo	Dir. Interventoría		31/01/2024
Observaciones:				

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías INVIAS, en cumplimiento de sus funciones ejecuta mediante el convenio solidario No. 3827/2023 el proyecto "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", así como el contrato No. 4383/2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de placa huella y limpieza manual a obras hidráulicas existentes en el tramo a intervenir de la vereda Sabana Alta del municipio de La Paz, Cesar.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de enero de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista en cumplimiento del contrato No 4383 de 2023, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"* correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Enero de 2024.

1. DATOS GENERALES

FECHA:	3/02/2024	**INFORME No.**	**2**

PERIODO No.	2	**DEL**:	01/01/2024	**AL**:	31/01/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	VEREDA SABANA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR.

2. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONTRATO No.:	3827 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SABANA ALTA CTO MINGUILLO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre 2023
FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023

PLAZO TRANSCURRIDO:	2,1 MES
VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

3. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4383 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL – GERYPRO SAS.
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	2,1 MES
VALOR INICIAL:	$ 58.819.465
ANTICIPO:	N.A.

4. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, se desarrollaron actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 0-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	Consistió en la excavación superficial con maquinaria (pajarita) de terreno donde se va a construcción la placa huella.
320.3	Súbase granular clase C	Consistió en la extensión de material seleccionado con maquinarias (pajarita) seguido de un riego con carrotanque y por último un compactador (Benitin) con el fin de dar firmeza y durabilidad a la placa huella. Asimismo, se realizó prueba de densidad con el fin de conocer el análisis de la compactación del terreno. Es importante mencionar que las densidades tomadas, no dieron los resultados óptimos y por tanto no se aprobó el terreno para iniciar actividades de fundición de concreto.

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

4.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear.

En la tabla a continuación se presenta detalle de actividades programadas durante el periodo y porcentajes de avance semanal de acuerdo con ello:

Tabla 0-2: Actividades Programadas Periodo del 01 de enero al 31 de enero 2024.

No	Tarea/actividad	COSTOS	Semana 6 A 7/01/2024	Semana 7 A 14/01/2024	Semana 8 A 21/01/2024	Semana 9 A 28/01/2024
1	Excavacion varia sin clasificar	$142.446	-	-	$142.446	-
2	Subbase granular clase C	$14.092.282,98	-	-	$14.092.282,98	-
3	Concreto reforzado de resistencia 21 Mpa	$72.453.281,46	-	-	-	$36.226.640,73
4	Acero de refuerzo de Fy=4200 kg/cm2 (6000PSI)	$33.406.623,94	-	-	-	$11.135.541
	TOTAL SEMANAL				**$14.234.141,49**	**$47.362.182**
	TOTAL SEMANAL ACUMULADO				-	**$61.596.911**
	% SEMANAL		**0%**	**0%**	**7%**	**24%**
	% SEMANAL ACUMULADO		**0%**	**0%**	**%**	**32%**

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

De acuerdo con el cronograma aprobado, a corte del presente informe, se tiene programado ejecutar un 24% del convenio.

4.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, se giraron recursos para gastos de legalización, administración y a proveedores, se ejecutaron actividades relacionadas con ajustes, diseños previos y limpieza de alcantarillas, en la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 0-3. Gastos financieros JAC SABANA ALTA, en el convenio 3827 de 2024.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	MATERIAL DE ARRASTRE Y SUBBASE AGREGADOS P&M JORGE PEÑA BARRIOS	$ 20.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00
2	RETRO EXCAVADORA	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
3	IMPRESIÓN VALLA 3X2	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
4	CAJA MENOR JAC SABANA ALTA	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
5	EPP, DOTACIÓN NURIS MARIA DAZA	$ 2.066.656,75	$ -	$ 2.066.656,75
6	COMPRA DE MADERA EL BOSQUE CLIMACO ARIZA	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
7	COMPRA DE ALAMBRE Y DISCO DE CORTES FERREVEGA Y/O HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA	$ 376.000,00	$ -	$ 376.000,00
8	VIBRO COMPACTADOR RAUL EDUARDO IBARRA CHACON	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
9	SUBSIDIO DE TRANSPORTE JAC SABANA ALTA AMAURI CHICO PACHECO	$ 600.000,00		$ 600.000,00
	TOTAL	$ 27.092.656,75	$ -	$ 27.092.656,75

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

Hasta la fecha de acuerdo con las actividades ejecutadas, se tiene un avance financiero de acuerdo con el presupuesto del 24%. En la tabla a continuación, se aprecian los porcentajes de avance a corte del presente informe:

Tabla 0-4. Relación de avance del Convenio

Detalle a 31 de diciembre de 2023	Valor	%
Avance global	27.092.656,75 $	24%

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

4.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A continuación, se relaciona lo facturado durante el periodo del presente informe:

Tabla 2-5 Gastos financieros GER & PRO SAS, en el contrato 4383 de 2024.

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4	$ 2.320.000	0,2	$ 1.160.000	0,2	$ 1.160.000
2	Ingeniero Residente	2,00	$ 5.200.000	0,6	$1.560.000	0,6	$1.560.000
3	Profesional Ambiental	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
4	Profesional Social	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS		$3.328.000	GL	$2.500.000	GL	$2.500.000
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
7	Inspector SST	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			**$7.220.000**
				FACTOR MULTIPLICADOR			**1.80**
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			**$ 12.996.000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos directores y/o Especialistas	5	$700.000	2	$280.000	2	$280.000

9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7	$4.200.000	1,2	$720.000	1,2	$720.000
10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5	$2.550.000	1	$1.700.000	1	$1.700.000
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3	$ 1.773.222	1	$591.074	1	$591.074
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3	$1.500.000	1	$500.000	1	$500.000
13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2	$400.000	1	$200.000	1	$200.000
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3	$120.000	1	$40.000	1	$40.000
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3	$111.000	1	$37.000	1	$37.000
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3	$115.500	1	$38.500	1	$38.500
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			**$4.106.574**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			**$17.102.574**
				IVA 19%			**$3.249.489,06**
				COSTO TOTAL			**$20.352.063,06**

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

Hasta la fecha de acuerdo con las actividades ejecutadas, se tiene un avance financiero de acuerdo con el presupuesto del 34,60%. En la tabla a continuación, se aprecian los porcentajes de avance a corte del presente informe:

Tabla 2-6. Relación de avance del Contrato de Obra

Detalle a 31 de diciembre de 2023	Valor	%
Avance global	$ 20.352.063,06	34,60%

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

4.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 04 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 0-5. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 1	Del 01 enero al 7 de enero de 2024
Informe semanal No. 2	Del 8 al 14 de enero de 2024
Informe semanal No. 3	Del 15 al 21 de enero de 2024
Informe semanal No. 4	Del 22 al 28 de enero de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

5. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

6. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar, conformación de comité de participación comunitaria y ficha de caracterización socioeconómica.

7. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

8. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

9. Relación de pólizas contrato de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC-100015367, expedida por la Aseguradora Seguros mundial, a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 0-6: Póliza según firma del convenio de obra

Póliza No.	**CRC-100015367**	
Aseguradora:	**Seguros mundiales**	
Fecha de Expedición:	**13/10/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 09/10/2023 hasta 31/10/2024	$38.845.960,20
Prestaciones sociales	Desde 09/10/2023 hasta 31/12/2026	$9.711.490,05
Estabilidad de la obra	Desde 21/04/2023 hasta 31/12/2028	$58.268.940,30

Fuente: Fuente: GER & PRO SAS, 2023

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

10. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025519, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato firma y acta de inicio de este:

Tabla 0-7. Póliza según firma del contrato de interventoría


Póliza No.	**47-44-101025519**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**21/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/11/2023 a 30/06/2024	$5.881.946,50
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/11/2023 a 31/12/2026	$11.763.893,00
Calidad del servicio	14/11/2023 a 31/12/2024	$17.645.839,50

Fuente: Fuente: GER & PRO SAS, 2023

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.


11. REGISTRO FOTOGRAFICO



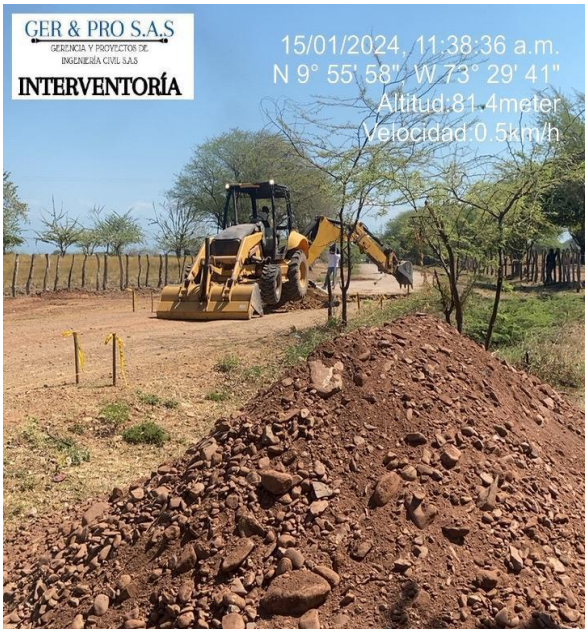



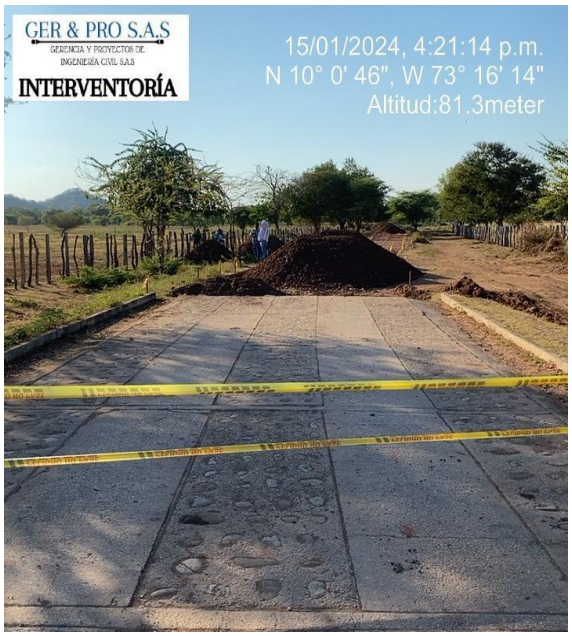


GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
15/01/2024, 4:21:14 p.m.
N 10° 0' 46", W 73° 16' 14"
Altitud:81.3meter


GER & PRO S.A.S
GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
INTERVENTORÍA
17/01/2024, 9:43:48 a.m.
N 9° 55' 59", W 73° 29' 43"
Altitud:82.5meter
Velocidad:1.0km/h


ene 21, 2024, 9:17:22 a.m.


25 ene 2024 5:57:26 p. m.
Vía sin nombre
La Paz
Cesar


JAC
Sabana Alta
ene 29, 2024 11:28:41 a.m.
La Paz
Cesar
Colombia



12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 31 de enero del 2024, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Recomienda al contratista realizar labores de escarificación, humectación homogénea y compactación del terreno. Posterior a esto, realizar ensayos de densidades apenas se realice la compactación con maquinaria nuevamente.
- Entregarle a la interventoría la documentación requerida para aprobar el alquiler de la maquinaria para compactación de súbase.
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 6 del 1-ene al 7-ene Último Informe Semanal | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

CONVENIO No.	3827 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GER & PRO S.A.S

INTEGRANTES:
Representante Legal: Ing. Jose David Doria
Director interventoria: Ing. Omar Peralta
Residente interventoria: Ing.Diana carolina polo brito
Inspector Obra: Ing. Hector Pava
Pofesional Ambiental: Camila Maestre
Profesional Social: Maria Teresa Rumbo
Profesional SST: Carlos Castilla

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-23	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.343.994			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 140.885.807			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 53.343.994,35	27,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.343.994,35	100,00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53.343.994,35	27,46
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.343.994,35	100,00
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.343.994,35	27,46
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 53.343.994,35	100,00

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, no ha adelantado labores de obra. En el periodo reportado, el contratista ha llevado acabo solamente :
- Actas de pago mensual.
- Adquisición de materiales
- Pago de nóminas

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.175.352,92	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.325.544,85	76,19954
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-ajustes y conceptos tecnicos, administrativo,ambiental y social a los pormenores del convenio previo al inicio de la ejecucion de obras.
-solicitando documentacion faltante por parte del contratista.
-Revicion de informacion enviada por parte de JAC

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90% Avance o Atraso Físico % -89,74%

Meta Física Ejecutada % 0,26%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	und	7
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en proceso de cotizaciones y evalaución de fuentes de materiales (canteras) cercanas a la ejecución del proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.Concepto y aprobación de nuevas cotizaciones PAGA.
2.Inicio de labores civil en las obras pertinentes para el proyecto, se dara inicio a la actividad de placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) cotizacion de maquinaria.
2)valla informativa
3)insumos de cartera para dar inicio de ejecucion del proyecto.


VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
90%	0,26%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:

1. Solicitar al contratista de obra toda la documentación que tiene que ver con afiliaciones de trabajadores para el inicio de las obras.
2. Realizar acompañamiento para el día 04 de diciembre de 2023, fecha en la que se dará inicio a las labores de ejecución de obra.
3. Solicitar al contratista cronograma de ejecución de obra en Project y Excel.
4. Solicitar al contratistas de obra, adelantar las diligencias pertinentes para la cotización, adquisición e implementación del PUNTO ECOLÓGICO según lo establecido por la resolución 2184 de 2019, expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, para una adecuada recolección y disposición de residuos sólidos en la obra.
5. Solicitud de diligenciamiento de formatos de asistencia y EPP por parte del contratista de obra.
6. Solicitar realización de exámenes de ingreso a personal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 8/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 7 del 8-ene al 14-ene Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

CONVENIO No.	3827 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 194.229.801,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2023		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GER & PRO S.A.S

INTEGRANTES:
Representante Legal: Ing. Jose David Doria
Director interventoria: Ing. Omar Peralta
Residente interventoria: Ing.Diana carolina polo brito
Inspector Obra: Ing. Hector Pava
Pofesional Ambiental: Camila Maestre
Profesional Social: Maria Teresa Rumbo
Profesional SST: Carlos Castilla

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31-dic-23	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	20XX	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.343.994			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 140.885.807			
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 53.343.994,35	27,46
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 53.343.994,35	100,00
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53.343.994,35	27,46
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.343.994,35	100,00
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.343.994,35	27,46
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 53.343.994,35	100,00

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, no ha adelantado labores de obra. En el periodo reportado, el contratista ha llevado acabo solamente :
- Actas de pago mensual.
- Adquisición de materiales
- Pago de nóminas

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.175.352,92	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 12.325.544,85	76,19954
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-ajustes y conceptos tecnicos, administrativo,ambiental y social a los pormenores del convenio previo al inicio de la ejecucion de obras.
-solicitando documentacion faltante por parte del contratista.
-Revicion de informacion enviada por parte de JAC

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 90% Avance o Atraso Físico % -89,74%

Meta Física Ejecutada % 0,26%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	und	7
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: El contratista se encuentra en proceso de cotizaciones y evalaución de fuentes de materiales (canteras) cercanas a la ejecución del proyecto.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1.Concepto y aprobación de nuevas cotizaciones PAGA.
2.Inicio de labores civil en las obras pertinentes para el proyecto, se dara inicio a la actividad de placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1) cotizacion de maquinaria.
2)valla informativa
3)insumos de cartera para dar inicio de ejecucion del proyecto.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
90%	0,26%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





FOTO 3

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 1. Solicitar al contratista de obra toda la documentación que tiene que ver con afiliaciones de trabajadores para el inicio de las obras. 2. Realizar acompañamiento para el día 04 de diciembre de 2023, fecha en la que se dará inicio a las labores de ejecución de obra. 3. Solicitar al contratista cronograma de ejecución de obra en Project y Excel. 4. Solicitar al contratistas de obra, adelantar las diligencias pertinentes para la cotización, adquisición e implementación del PUNTO ECOLÓGICO según lo establecido por la resolución 2184 de 2019, expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, para una adecuada recolección y disposición de residuos sólidos en la obra. 5. Solicitud de diligenciamiento de formatos de asistencia y EPP por parte del contratista de obra. 6. Solicitar realización de exámenes de ingreso a personal.	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 21/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 8 del 15-ene al 21-ene Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL ES DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

CONVENIO No. 3827 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 194.229.801,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GER & PRO S.A.S

INTEGRANTES:
Representante Legal: Ing. Jose David Doria
Director interventoria: Ing. Omar Peralta
Residente interventoria: Ing.Diana carolina polo brito
Inspector Obra: Ing. Hector Pava
Pofesional Ambiental: Camila Maestre
Profesional Social: Maria Teresa Rumbo
Profesional SST: Carlos Castilla

CONTRATO No. 4383 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 58.819.465,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 194.229.801		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 53.343.994		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 140.885.807		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 141.941.348,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 14.495.194,49	10,23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 402.911,50	0,28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 14.092.282,98	-9,95%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 141.667.372,67	0,10
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 402.911,50	0,28
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 14.092.282,98	-9,95%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.234.729,16	10,05
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 402.911,50	0,00

Observaciones:
Hasta el momento, la JAC de la Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, ha adelantado labores de obra tales como:
- Transporte de materiales de subbase.
- Extensión y compactación de material de subbase.
- Realizacion de examenes ocupacional de personal de obra.
- Uso de maquinaria pesada.

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$53.343.994,35** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA, TIENE PUESTO EL TOTAL DEL MATERIAL DE SUBBASE EN LA OBRA, PERO A LA FECHA DE CORTE DE ESTE INFORME, NO HAN TERMINADO DE EXTENDER Y COMPACTAR EL MATERIAL.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervicion de cumplimiento de material de subbase.
-Revisión de entregables.
-Requerimiento y/o recomendaciones de realización de procedimientos técnicos y administrativos.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 10,23% Avance o Atraso Físico % -9,95%

Meta Física Ejecutada % 0,28%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	und	7
*	Excavacion varia sin clasificar	m3	7,78
*	subbase granular	m3	

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog				10,23%	
Ejec				0,28%	
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Pajarita	1	1
Total	1	1

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	P&M	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: El contratista adquirió el material de subbase necesaria para la ejecución de la obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Cotizacion de maquinaria.
2. Valla informativa.
3. Insumos de cantera (materiales pétreos) para dar inicio con las labores del proyecto.
4. Perfilamiento con maquinaria pesada pajarita en terreno en el tramo a intervenir.
5. Demarcacion con topografia en terreno para la placa huella.
6. Visita de ingeniero ambiental

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Terminacion de compactacion de material para sub base
2. Realizar ensayo de densidad
3. Alquiler de equipos para dar inicio de construccion de placa huella (mezcladora , tanques para almacenar agua, cilindros para ensayos resistencia)
4. Adquision de arena y gravilla.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
10,05%	0,10%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Transporte de material seleccionado para subase



Transporte de material seleccionado para subase



Acopio de material subase



Demarcacion de terreno



Perfilamiento de terreno




Esparcion de material seleccionado para subase



Topografia



Señalizacion

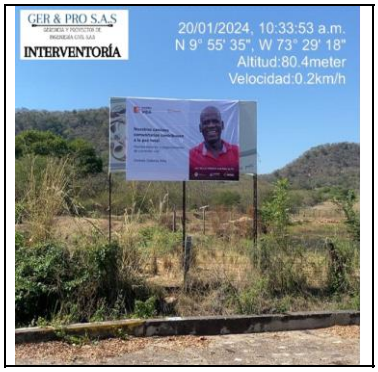

valla informativa



Visita de ingeniero ambiental



Inspeccion de PTAP en presencia del presidente de la JAC, Ing. Residente,Ing.ambiental e interventoria.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:

1. Solicitar al contratista de obra toda la documentación que tiene que ver con afiliaciones de trabajadores para el inicio de las obras.
2. Realizar acompañamiento para el día 04 de diciembre de 2023, fecha en la que se dará inicio a las labores de ejecución de obra.
3. Solicitar al contratista cronograma de ejecución de obra en Project y Excel.
4. Solicitar al contratistas de obra, adelantar las diligencias pertinentes para la cotización, adquisición e implementación del PUNTO ECOLÓGICO según lo establecido por la resolución 2184 de 2019, expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, para una adecuada recolección y disposición de residuos sólidos en la obra.
5. Solicitud de diligenciamiento de formatos de asistencia y EPP por parte del contratista de obra.
6. Solicitar realización de exámenes de ingreso a personal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/01/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 9 del 22-ene al 28-ene — Último Informe Semanal

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

EL ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: CONSTRUCCIÓN DE 140 METROS LINEALES DE PLACA HUELLA (SUJETO A MODIFICACIÓN DE ACUERDO A AJUSTES Y DISEÑOS FINALES)

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda SABANA ALTA CTO DE MINGUILLO, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Sabana Alta Cruce en Km 36+000 de la vía secundaria que comunica Ruta 4901 Codazzi – Corregimiento de Cuatro Vientos y punto de referencia final el PR2+000 ubicado en la vía que conduce al corregimiento de Minguillo, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

CONVENIO No. 3827 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 194.229.801,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/04/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GER & PRO S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria Hérnández

CONTRATO No. 4383 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 58.819.465,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ 24.837.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 83.657.145,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 194.229.801	$ 194.229.801		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 53.178.994	$ 80.271.651		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 141.050.807	$ 113.958.150		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 83.657.145,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 63.305.082		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 194.229.801,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 47.362.182,05	33,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 402.911,50	0,28%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 46.959.270,54	-33,09%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 85.349.826,90	44,05%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 21.336.851,87	11,01%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 64.012.975,03	-33,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.987.997,09	27,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 4.067.305,05	2,10%

Observaciones:
Hasta el momento, la JAC de la Vereda Sabana Alta, corregimiento de Minguillo La Paz - Cesar, ha adelantado labores de obra tales como:
- Insumo de arena.
-Realizacion de examenes ocupacionales de trabajadores.

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$80.271.651** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONTRATISTA DE OBRA, TERMINÓ DE EXTENDER Y COMPACTAR EL MATERIAL DE SUBBASE. SE ESPERA QUE INTERVENTORÍA APRUEBE LOS ENSAYOS DE DENSIDADES, PARA PROCEDER A REALIZAR LABORES DE ARMADO DE RIELES Y FUNDIDA DE LOSAS DE CONCRETO.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervicion de almacenamiento de materiales.
-Requerimiento y/o recomendaciones de realización de procedimientos técnicos y administrativos.
-La interventoría realizó observaciones en los resultados de las densidades realizadas por el contratista, en la que NO SE APROBÓ los resultados preliminares y por tanto se recomendó realizar nuevamente los ensayos. Los resultados de estos arrojaron que el material allí compactado previamente, no cumple de acuerdo a los resultados de estos últimos.

RECOMENDACIONES: LA INTERVENTORÍA RECOMENDÓ LEVANTAR EL MATERIAL, HUMEDECER DE MANERA HOMOGENEA Y COMPACTAR NUEVAMENTE EL MATERIAL DE SUBBASE, HASTA ALCANZAR LOS VALORES ÓPTIMOS DE DENSIDADES

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 33,37% Avance o Atraso Físico % -33,09%

Meta Física Ejecutada % 0,28%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Limpieza a mano de alcantarillas de 600 mm a 900 mm	und	7
*	Excavacion varia sin clasificar	m3	7,78
*	subbase granular	m3	160

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	7			7	100%
Ejec	7			7	100%
Prog	7,78			7,78	100%
Ejec	7,78			7,78	100%
Prog	160			160	100%
Ejec	-			-	-

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Pajarita	1	1
Benitin 1,5 Ton	1	1
Carro tanque	1	1
Total	3	3

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VEREDA SABANA ALTA TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	P&M	PERMISO MINERO: SI	x	NO	
	UBICADA EN LA VÍA ENTRE SAN DIEGO Y CODAZZI	LICENCIA AMBIENTAL: SI	x	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES: El contratista adquirió el material de subbase necesaria para la ejecución de la obra.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	8
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 14

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVCIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Terminacion de copactacion de material de subase.
2. Realizar ensayo de densidad.
3. Alquiler de equipos para dar inicio de construccion de placa huella (mezcladora , tanques para almacenar agua, cilindros para ensayos resistencia)
4. Realizacion de examenes ocupacional al personal ingresado.
5. Ensayo de densidad

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Figurado de hierro.
2. Adquisición de agregado grueso y agregado fino.
3. Levantamiento de material compactado previamente.
4. Extender material levantado, humedecimiento homogeneo y compactacción por tramo.
5. Toma de ensayos de densidades para verificar la compactación del material.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
33,37%	0,28%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




Factura electronica examen medico ocupacional de ingreso para personal



Almacenamiento de materiales (Cemento y Acero)



Compactancion de material subase con BENITIN 1,5 Ton

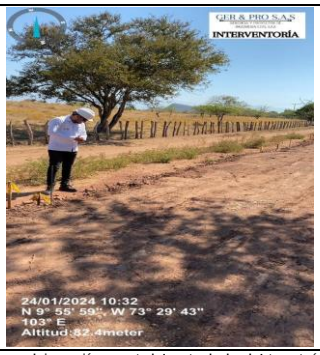

Chequeo de inspección por parte de Inpector de obra de Interventoría a material compactado



Charla de Seguridad y Salud en el trabajo por parte de Inspector SST de Interventoría



Permilamiento final de vía con material de subbase



Perfilamiento de vía a intervenir con subbase



Toma de ensayos de densidades en campo No 1



Toma de ensayo de densiades No 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 1. Solicitar al contratista de obra toda la documentación que tiene que ver con afiliaciones de trabajadores. 2. Solicitar al contratista de obra los informes mensuales de Diciembre y Enero que a la fecha no han sido remitidos. 3. Hacer seguimiento a las labores de levantamiento de material compactado previamente. 4. Hacer seguimiento y velar por la calidad de los ensayos de densidades después de compactar el material de subbase. 5. Recomendar procedimientos técnicos y adecuados para la figuración de hierro.	FIRMA: NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** C E S A R

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31 Enero **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION VEREDA SABANA ALTA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. **INTERVENTORÍA:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
Retroexcavadora tipo pajarita	CAT	-	VEREDA SABANA ALTA															X																
Benitin vibro compactador	CORMAG	5 TON	VEREDA SABANA ALTA																					X										
Carrotanque	-	-	VEREDA SABANA ALTA																					X										
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO																																		
TOTAL ACTIVO																																		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2024 (Día / Mes / Año)

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
La Junta de Acción Comunal no está realizando labores de ejecución de obra, por tanto no se reporta uso de maquinaria durante este periodo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma LAURA DAZA
Nombre: LAURA MARCELA DAZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 071037-0577944 CES

Firma
Nombre DIANA CAROLINA POLO BRITO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20202-394329 CES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

N de oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinario
1	C-4383-2023-028	SOLICITUD DE REALIZACIÓN DE EXAMENES DE INGRESO DE PERSONAL DE NÓMINA	9 de enero de 2024	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO PRESIDENTE OAC VEREDA SABANA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ
2	C-4383-2023-029	CONCEPTO SOBRE APROBACIÓN DE MODELO DE VALLA	10 de enero de 2024	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO PRESIDENTE OAC VEREDA SABANA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ
3	C-4383-2023-030	CONCEPTO SOBRE COTIZACIONES Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS	12 de enero de 2024	AMAURY ENRIQUE CHICO PACHECO PRESIDENTE OAC VEREDA SABANA ALTA, MUNICIPIO DE LA PAZ
4	C-4383-2023-031	REINCORPORACIÓN DE PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE LA REFERENCIA	15 de enero de 2024	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
5	C-4383-2024-032	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 6 Y 7 DE INTERVENTORÍA	18 de enero de 2024	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
6	C-4383-2024-033	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 8 DE INTERVENTORÍA	21 de enero de 2024	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
7	C-4383-2024-034	SOLICITUD DE DOCUMENTOS DEL LABORATORIO DE SUELOS.	25 de enero de 2024	Laura Daza Cure AC. VEREDA SABANA ALTA
8	C-4383-2024-035	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 9 DE INTERVENTORÍA	27 de enero de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

N de oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinario
1		ENVIO MODELO DE VALLA AUTORIZADO POR INVIAS	05 de enero de 2024.	GER&PRO S.A.S
2		ENVIO CONTRATO DE ACTA DE COMPRA DE MATERIALES CANTERA P&M	10 de enero de 2024.	GER&PRO S.A.S
3		COTIZACIÓN DE EXAMENES DE INGRESO DE SALUD OCUPACIONAL	10 de enero de 2024.	GER&PRO S.A.S
4		COTIZACIÓN DE MAQUINARIA	10 de enero de 2024.	GER&PRO S.A.S

5	2024S-VCES-001405	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-042378	2024-01-15	JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS - GER Y PRO SAS
6	2024S-VCES-001748	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-003441	2024-01-17	JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS - GER Y PRO SAS
7	2024S-VCES-001751	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-002848	2024-01-17	JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS - GER Y PRO SAS
8	2024S-VCES-001752	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-001854	2024-01-17	JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ REPRESENTANTE LEGAL GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS - GER Y PRO SAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	5/02/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																												Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Monto Base de Cotización ($)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1																																											
2																																											
3																																											
4																																											
5																																											
6																																											
7																																											
8																																											
9																																											
10																																											
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha ..... a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: LAURA DAZA
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 071037-0577944 CES

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ENERO DEL 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

LAURA DAZA

Firma
Nombre: LAURA DAZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 071037-0577944 CES

Diana Polo Brito.

Firma
Nombre: Diana Carolina Polo Brito
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20202-394329 CES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 5/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No.: 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
1	25/01/2024	Ensayo densidad	INV E-320	RUTA SABANA - ALTA A MINGUILLO	1	95	95,1	SI	SE RECOMIENDA POR PARTE DE INTERVENTORIA HACER NUEVAMENTE COMPACTANCION CON MOTONIVELADORA, LUEGO HACER UN RIEGO CON CARROTANQUE Y DESPUES PASAR UN VIBROCOMPACATDOR
					2	95	90,5	NO	
					3	95	91,4	NO	
					4	95	98,5	SI	
					5	95	88,5	NO	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma LAURA DAZA
Nombre: LAURA DAZA
Residente de Obra

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 9/01/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3827 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Balance de presupuesto de obra: El OAC realizó el balance del presupuesto, teniendo en cuenta cotizaciones de materiales y maquinaria necesario para la ejecución de la obra.
2. La Interventoría ha entregado a cabalidad los informes semanles y mensuales correspondientes.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Cotizaciones finales de materiales.
2. Inicio de labores de figuración de Acero y colocación de sub base granular clase C como actividades preliminares.
3. Inicio de labores de fundida de concreto reforzado y concreto ciclópeo.
4. Utilización de lementos de protección personal por parte de los trabajadores de la obra y seguimiento por parte del profesional SST de Interventoría.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 02:00 pm del día 09 de enero del año 2024, se da inicio al comité de obra, abordando los siguientes temas:

1. El director de interventoría Ing. Omar Peralta Carrillo, realiza observaciones importantes al momento del figurado del acero y acota la importancia de colocar las parrillas de manera continua, respetando los traslapos, tal y como lo indica la cartilla de obras menores.
2. Colocación de sub base granular clase C, se orienta en la colocación de sub base en el tramoi a intervenir con placa huella, dandole importancia al espesor de la colocación de la misma que debe de ser de 15 cm.
3. Se socializa la importancia de llevar a cabo la dosificación del concreto, siguiendo lo establecido en el diseño de mezcla y respetando las cantidades de cada material (agregados pétreos, cemento y agua).
4. Se dan indicaciones precisas de colocación de formaletas para fundida de placas de concreto reforzado y concreto ciclópeo, en aras de que estas queden fijas y se evite desplazamiento de estas en el momento de la fundida de los concretos.
5. Se menciona la importancia de mantener los materiales almacenados de manera adecuada, procurando aislar el cemento de la humedad.
6, Es importante mencionar que los trabajadores deben tener todos los elementos de protección personal necesarios para la ejecución de las labores, tarea que será supervisada y vigilada por el profesional SST de Interventoría.
7. El Organismo de Acción comunal, debe de adelantar los informes de avance de obra de cada mes para revisión por parte de la interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	9/01/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Inicio de labores de obra	lunes, 15 de enero de 2024	OAC Sabana alta

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 12/02/2024
(Día / Mes / Año)






NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	**CARGO**	**EMPRESA / ENTIDAD**	**FIRMA**
OMAR PERALTA CARRILLO	DIR. INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ	RL INTERVENORÍA	GER & PRO SAS	
DIANA POLO BRITO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
HÉCTOR PAVA MORALES	INSPECTOR	GER & PRO SAS	
AMAURI CHICO PACHECO	PRESIDENTE OAC	OAC SABANA ALTA	
LAURA DAZA	ING. RESIDENTE OAC	OAC SABANA ALTA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3827 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 194.229.801,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 38.845.960,20	9	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	Dia	Mes	Año
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 9.711.490,05	9	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 58.268.940,30	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100015367

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	9	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100004741 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 38.845.960,20	30	12	2023	2/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.711.490,05	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 58.268.940,30	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100015367

Certificado de modificación o anexo No.: 350035717
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	28	11	2023	30	4	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100004741 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 350035719
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA PARCIAL DE PAGOS DE CONVENIOS	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5-feb-24 (Día / Mes / Año)

Acta ✓ **No.** 2

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3827 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO DEL CONVENIO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

VÍA INTERVENIDA:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **CONTRATO No.** 4383 DE 2023 (Indique número y año)

FECHA DE INICIO:	28 (Día)	DE	11 (Mes)	DE	2023 (Año)	**VALOR INICIAL:**	$ 194.229.801,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA DE REANUDACIÓN:	(Día)	DE	(Mes)	DE	(Año)	**VALOR ACUMULADO:**	$ -
PLAZO (MESES):	3 MESES						
FECHA INICIAL DE VENCIMIENTO:	31 (Día)	DE	12 (Mes)	DE	2023 (Año)		
FECHA ACTUAL DE VENCIMIENTO	31 (Día)	DE	31 (Mes)	DE	2023 (Año)		

VALOR DEL PAGO

El contratista y el interventor deben relacionar las facturas pagadas en el presente periodo, discriminando la fecha, número de factura, proveedor, NIT; así mismo deberá relacionar el personal vinculado al proyecto y los pagos que se efectúan mensualmente.

Las facturas y pagos del personal vinculado al proyecto deberán anexarse en el informe mensual de interventoría como soporte de este formato. Así mismo, se debe presentar una tabla con la cotizaciones realizadas para la elección del proveedor, con sus respectivos soportes.

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	NIT/CC	No. FACTURA	FECHA	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	MATERIAL DE ARRASTRE Y SUBBASE AGREGADOS P&M JORGE PEÑA BARRIOS			12/01/2024	$ 20.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00
2	RETRO EXCAVADORA			17/01/2024	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00
3	IMPRESIÓN VALLA 3X2			17/01/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
4	CAJA MENOR JAC SABANA ALTA			17/01/2024	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
5	EPP, DOTACIÓN NURIS MARIA DAZA			25/01/2024	$ 2.066.656,75	$ -	$ 2.066.656,75
6	COMPRA DE MADERA EL BOSQUE CLIMACO ARIZA			25/01/2024	$ 450.000,00	$ -	$ 450.000,00
7	COMPRA DE ALAMBRE Y DISCO DE CORTES FERREVEGA Y/O HERMES ENRIQUE VEGA MENDOZA			25/01/2024	$ 376.000,00	$ -	$ 376.000,00
8	VIBRO COMPACTADOR RAUL EDUARDO IBARRA CHACON			25/01/2024	$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
9	SUBSIDIO DE TRANSPORTE JAC SABANA ALTA AMAURI CHICO PACHECO			25/01/2024	$ 600.000,00		$ 600.000,00
10							$ -
	TOTAL				$ 27.092.656,75	$ -	$ 27.092.656,75

PAGOS EFECTUADOS EN EL PERIODO	$ 27.092.657	**PAGOS ACUMULADOS**	$ -
VALOR IVA	$ -	**VALOR IVA ACUMULADO**	$ -
TOTAL PAGOS	$ 27.092.657	**VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS ACUMULADO**	$ -

NOTAS:

1. El Interventor certifica que los pagos relacionados fueron utilizados para la ejecución de las actividades del convenio. De igual manera, deja constancia que se verificaron los aportes de seguridad social integral y parafiscales, así como los demás requisitos exigidos en el anexo técnico que hace parte integral del convenio.

Firma: Amaury G. Chico P.
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista

Firma:
Nombre: JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma: LAURA DAZA
Nombre: **LAURA MARCELA DAZA CURE**
Ingeniero residente del proyecto
Apoyo técnico Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.: **071037-0577944 CES**

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, contratista, Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 31-ene **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** GER & PRO S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA SABANA ALTA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AUTOMOVIL KIA	MBV363 CILINDRAJE 1600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	487904037	9463842205	E	2024/02/06	2024/03/04	BANCOLOMBIA	27	$4,535,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE DANIEL MINDIOLA (13 Afiliados)																							$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800
Centro de Trabajo: OBRA (13 Afiliados)																							$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (13 Afiliados)																							$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800
1	CC	1063491424	ARRIETA JOSE	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
2	CC	1010151400	CASTILLA CARLOS		X					X											231001	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
3	CC	7383389	DORIA JOSE							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1065830598	MAESTRE CAMILA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1063493544	MARTINEZ ANGEL	X																	231001	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
6	CC	1063490944	MENDOZA HELEM	X																	230201	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
7	CC	1062815386	MENDOZA ISMAEL	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
8	CC	1065654021	PAVA HECTOR							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	77019867	PERALTA OMAR							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	1001851828	POLO DIANA	X																	231001	27	$2,340,000	$374,400	EPSIC1	27	$2,340,000	$93,600	CCF15	27	$2,340,000	$93,600	14-4	27	$2,340,000	6.960%	$162,900	27	$0	$0	Si	$724,500
11	CC	1065830672	RUMBO MARIA							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1065886573	SANCHEZ DIMAR	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
13	CC	1118855053	ZAMBRANO JUAN																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	CCFC55	30	$1,560,000	$62,400	CCF15	30	$1,560,000	$62,400	14-4	30	$1,560,000	6.960%	$108,600	30	$0	$0	Si	$483,000
Total			**Afiliados(13)**																				$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	487904037	9463842205	E	2024/02/06	2024/03/04	BANCOLOMBIA	27	$4,535,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,288,000	$55,400	$0	$2,343,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$582,400	$14,100	$0	$596,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$665,600	$16,100	$0	$681,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$520,000	$12,600	$0	$532,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$520,000	$12,600	$0	$532,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$995,800	$24,100	$0	$1,019,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$995,800	$24,100	$0	$1,019,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$572,000	$13,900	$0	$585,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	$572,000	$13,900	$0	$585,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$572,000	$14,200	$0	$586,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$62,400	$1,600	$0	$64,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	4	$249,600	$6,100	$0	$255,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$130,000	$3,200	$0	$133,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$52,000	$1,300	$0	$53,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,000	$700	$0	$26,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
TOTAL				**13**	**$4,427,800**	**$107,600**	**$0**	**$4,535,400**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 23/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 'ENERO 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3827-2023; 3619-2023

CONTRATISTA: OAC SABANA ALTA; OAC PEREIRA (MUNICIPIO DE LA PAZ)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	**1301223**	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**	**11**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 58.819.465**	**$ 58.819.465**
			TOTAL			**$ 58.819.465**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 83.657.145**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**NOVIEMBRE / 2023**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**1301223 de 2023-11-27**	**$ 58.819.465**	**$ 83.657.145**		ACTA 1.
2	**DICIEMBRE / 2023**	$ 17.102.574	$ 3.249.489,06	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	**1301223 de 2023-11-27**	**$ 38.467.401,94**	**$ 63.305.081,94**		ACTA 2.
3	**ENERO / 2024**	$ 14.173.000	$ 2.692.870	**$ 16.865.870,00**	**$ -**	**$ 16.865.870**	**$ -**	**1301223 de 2023-11-27**	**$ 21.601.531,94**	**$ 41.953.595,00**		ACTA 3
TOTALES		**$ 31.275.574**	**$ 5.942.359,06**	**$ 37.217.933,06**		**$ 37.217.933,06**			**$ 21.601.531,94**	**$ 41.953.595,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
INTERVENTORIA CONVENIOS 3827-2023; 3619-2023	**$ 31.275.574**	**$ 5.942.359,06**	**$ 37.217.933,06**
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **OMAR PERALTA CARRILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820247167 ATL**

Firma

Nombre: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023 **INTERVENTOR:** OMAR PERALTA CARRILLO

OBJETO DEL CONTRATO:

NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 4/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.909.548,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 8.365.715	14	11	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 16.731.429	14	11	2023	30	4	2027
Calidad del servicio		$ 25.097.144	14	11	2023	30	4	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S	NIT: 900.764.117-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MZ F CASA NRO. 4 - 1	VALLEDUPAR, CESAR	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA BENETRIO MENDOZA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4383 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL].

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2023	31/10/2024	$8,365,714.50	$5,881,946.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/11/2023	30/04/2027	$16,731,429.00	$11,763,893.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2023	30/04/2025	$25,097,143.50	$17,645,839.50

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR Y LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA ARRIBA SEGUN:
ADICIONAL No 1 Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO N 4383 de 2023
VALOR ADICIONAL No 1: $ (24.837.680.00) INCLUIDO IVA
PLAZO PRORROGA No 1: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERNANECEN IGUALES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,932.00	$ *******8,000.00	$ ******13,097.00	$ **********82,030.00	$ *******50,194,287.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO	143346	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S		**NIT: 900.764.117-6**
DIRECCIÓN: MZ F CASA NRO. 4 - 1	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA BENETRIO MENDOZA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

31 - Diciembre del 2023

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. obra

Res. Interventoria.

01 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. obra

Dina Polo
Res. Interventoria

02 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.

Interventora Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climatéricas: Día soleado y despejado

LAURA DAZA
Res. Obra

Dina Polo.
Res. Interventoría.

03 - Enero - 2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventora Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climatéricas: Día soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Dina Polo
Res. Interventora

04 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventora. Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad en obra, solo ~~Se~~ adelanta actividades de cotización de materiales.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo. — Res. Interventora.

05 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventora Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil.

Desarrollo: Se adelantan actividades de valla publicitaria. informativa del Proyecto, Cartera e insumos.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo. — Res. Interventora.

06 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventora Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo — Res. Interventora.

07 - Enero - 2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Dina Polo
Res. Interventoria.

08 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Dina Polo.
Res. Interventoria.

09 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta

Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Se adelantó actividades tales como:
- Informe Semanal.
- Cotizaciones.
- Ajustes diseño.

Condiciones climáticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria

10-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Se adelantó actividades de informe Semanal y alquiler de maquinaria.

Condiciones climáticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Dina Polo
Res. Interventoría.

11-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería SAS.

Desarrollo: Se siguio con actividades de cotizaciones y alquiler de maquinaria.

Condiciones climaticas: Dio Soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

12-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra.

Diana Polo
Res. Interventoria.

13-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria, Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

14 - Enero-2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Dicra Polo
Res. Interventoria.

15 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: Durante el dia, inicio con Perfilamiento maquinaria Pesada Payorita en el tramo correspondiente a intervenir, de de modo junto al personal de topografia se marcaron puntos significativos con estacas y cabuya sobre la superficie del tramo a intervenir en la vereda. Asimismo llegó a obra el material previamente seleccionado y analizado a utilizar como subase en la placa-huella. (105 m)
- Personal en Obra: Personal Topografia.
Presidente JAC Sabana Alta.
Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones Climaticas: Dia Soleado y despejado.

LAURA DAZA — Dina Polo
Res. Obra — Res. Interventoria

16- Enero -2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: Se adelanta actividades de diseno y ajuste con topografia.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Dina Polo.
Res. Obra — Res. Interventoria.

17- Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Pae, Municipo de la Paz- Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventona Gerencia y Proyectos de Ingeneria Civil SAS.

Desarrollo: Durante el dia, inicio con esparcir el restante de la subase (Material Seleccionado) sobre el tramo a intervenir, Ademas con el equipo topografico se fue analizando las demarcaciones del tramo.
Personal en Obra: Personal Topografico
Presidente JAC Sabana Alta

Res Obra.
Res. Interventoria.
Nocturno.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado

LAURA DAZA
Res. Obra

Dina Polo.
Res Interventoria.

18-Enero-2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingenieria Civil SAS

Desarrollo: Se adelanto actividades para alquiler maquinaria para compactación y riego de material de subase preuamente Seleccionado, Teniendo en cuenta el terreno y el calculo para subase se hizó necesario adquirir.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Dina Polo.
Res. Interventoria.

19-Enero-2024

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingenieria Civil SAS.

Desarrollo: Se adelanta actividades de alquiles de equipos

tales como son: la mezcladora, niveles y cortadora, las cuales son herramientas y equipos para la construcción de la placa huella.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

20- Enero- 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz- Cesar.

Contratista: JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: Se llevó a cabo un visita por parte de ingeniero ambiental, con el fin de dar a conocer al presidente de la JAC y demas Personal en obra., temas en relacion a la parte ambiental tales como: manejo de residuos solidos, Inspección de arboles cerca de la obra. y PTAP. También se colocó valla informativa del proyecto.

Personal en Obra: Personal Topografia.
Ing. Obra residente.
Ing. Res Interventoria.
Maestro.
Ing. Ambiental
Presidente de JAC Sabana alta.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

21 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria: Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: Se realizaron labores de replanteo con topografia y demarcación
Personal en Obra: Topografia.
Maestro.
Ing. Res.
Ing. Res. Interventor.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

22 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad, Estaba a la espera del material faltante para subase.

Condiciones Climaticas: Dia soleado y despejado

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

23-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar

Contratista JAC sabana Alta.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Durante el dia se recibio insumo de material de subase que hacia falta. para completar el tramo a intervenir para la construcción de la placa-huella.
Personal en Obra: Ing. Obra.
Ing. Res. Interventoria.
Maestro.
Presidente JAC.

LAURA DAZA
Res. Obra

Dicna Polo
Res. Interventoria.

24-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Se inicio actividades de muestras para ensayo de densidad, Se tomaron 3 muestras a lo largo del tramo a intervenir.
Personal en Obra. Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo — Res. Interventoria.

25 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la paz., municipio de la Paz - Cesar

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fue que fueron tomado nuevamente las pruebas de densidad del terreno, debido a que las pruebas tomadas anteriormente no se obtuvo los resultados esperados y establecidos por el INVIAS para la subase en la placa-huella

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo. — Res. Interventoria.

26- Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades durante el día fue adquirir equipos y herramientas para empezar el figurado de las vigas riostras.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA — Res. Obra
Diana Polo — Res. Interventoria.

27-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizaron ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado

LAURA DAZA. — Res. Obra
Diana Polo. — Res. Interventoria.

28-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad en obra, en la espera de los resultados del ensayo de densidad y así determinar los pasos a seguir en la construcción de la placa huella.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA. Diana Polo
Res. Obra Res. Interventoría.

29-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoría Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad en obra.

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.

LAURA DAZA Diana Polo
Res. Obra Res. Interventoría

30-Enero-2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoría Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Durante el día siendo las 02:30 pm se realizó una reunión de manera virtual en la plataforma meet, la cual se dio a conocer los problemas presentados en cuanto a la adquisición de maquinaria y adquisición de subbase en el proyecto de placa huella en la vereda Sabana Alta, en la reunión se concluyó analizar y realizar un ajuste en el presupuesto con el fin de cumplir los objetivos del proyecto exitosamente.

Personal presente en la reunión Res. Obra.
Res. Interventoria.
Dir. Int. Omar Peralta.
Ing. Jose David.
Ing.
Ing.
Presidente JAC Amaur:

Condiciones climaticas Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

31 - Enero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz-Cesar

Contratista JAC Sabana Alta.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingenieria Civil SAS.

Desarrollo: Durante el dia se estuvo evaluando y analizando los ajustes necesario en el presupuesto. que permitan dar solución a los problemas presentados.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

LAURA DAZA
Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria

01- febrero - 2024.

Vereda Sabana Alta, Corregimiento de la Paz, Municipio de la Paz - Cesar.
