	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. Contrato de 3619 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL PEREIRA


Interventoría No. 4383 DE 2023 **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 3 **MES O PERIODO:** FEBRERO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		8
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
3	**INFORMACION CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	34
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	35
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	38
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		No Aplica
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		No Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	42
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		12
5.1	Información general del contrato		13
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		No Aplica
5.3	Informes especialistas y profesionales		No Aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No Aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No Aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No Aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No Aplica
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	46
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	48
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	49
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	50
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		17
8	**Anexos**		52
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		53
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		59
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No Aplicca
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		No Aplica

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma: _____

Nombre: **OMAR EDIL GOMEZ NAVIA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No._____de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 4/01/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **PERIODO MES:** FEBRERO

CONVENIO No.: 3619 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 199.909.548,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	Ml	0
Estructuras	Mantenimiento	Ha	1,47
	Concreto reforzado 21 Mpa	M3	86,1908
	Acero de refuerzo	KG	3.956,21
	Concreto de 14 Mpa	M3	31,9734

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	Ml	0	0
Estructuras	Mantenimiento	Ha	1,47	1,47
	Concreto reforzado 21 Mpa	M3	19,3	33,87
	Acero de refuerzo	KG	845,62	1.479,26
	Concreto de 14 Mpa	M3	15,12	18,25

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$147.348.484,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4.420.455,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$47.140.609,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.909.548,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 25.396.555,95	$ 48.422.083,81
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 10.177.019,41	$ 34.429.845,77
VALOR EJECUTADO	$ 35.573.575,36	$ 82.851.929,58

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 42.630.535,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 48.422.083,81
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 3,83%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **6**

REGISTRO FOTOGRÁFICO











PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4383-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

Del 01 de febrero al 29 de febrero de 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 6
OBJETIVO DEL INFORME 7
1. DATOS GENERALES 8
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 8
1.2. Datos del contrato de Interventoría 8
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 10
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 10
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 12
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 14
2.4. Informes semanales 16
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 17
3.1. Seguimiento Gestión Social 17
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 17
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 18
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 18
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 18
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 20
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado 10
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de febrero por JAC Vereda Pereira. 11
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA PEREIRA en el convenio 3619 de 2023 . 12
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra del mes de febrero 14
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría 16
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 18
Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría 19

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Diana Carolina Polo Brito	Ing. Residente de Interventoría		31/03/2024
Revisó	José Doria Hernández	Rep. Legal Interventoría		31/03/2024
Aprobó	Omar Peralta Carrillo	Dir. Interventoría		31/03/2024
Observaciones:				

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Diana Carolina Polo Brito	Ing. Residente de Interventoría		29/02/2024
Revisó	José Doria Hernández	Rep. Legal Interventoría		29/02/2024
Aprobó	Omar Peralta Carrillo	Dir. Interventoría		29/02/2024
Observaciones:				

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 3619 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"; así como el contrato de interventoría No 4383 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 81 metros lineales de placa huella, así como la construcción de cuatro (04) alcantarillas tipo 2, rocería y limpieza manual de 2,45 km del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero al 29 de febrero de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de la Vereda Pereira en cumplimiento del contrato de interventoría No 4383 de 2023, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*

1. DATOS GENERALES

FECHA:	29/02/2024	**INFORME No.**	**3**

PERIODO No.	1	**DEL**:	01/02/2024	**AL**:	29/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR – VEREDA PEREIRA

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	3619 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA
PLAZO INICIAL:	1,1 MESES
FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	3,1 MESES
VALOR INICIAL:	$ 199.909.548
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4383 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	1,1 MESES

FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	3,1 MESES
VALOR INICIAL:	$ 58.819.465
ANTICIPO:	N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, se desarrollaron actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Excavaciones varias sin clasificar	Consiste en hacer una excavación superficial con maquinaria (motoniveladora)
2	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	En actividad consiste en hacer una mezcla de concreto dosificada con la resistencia establecida en el proyecto (arena, cemento, agua y gravilla)
3	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Se realizo un refuerzo longitudinal y transversal de la placa huella lo cual va a permitir dar resistencia a la placa huella al paso de equipos y transporte.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	Consiste en realizar una mezcla de concreto dosificado con la resistencia establecida en el proyecto, el cual no lleva refuerzo y se compone de un material sobre tamaño (piedra pegada), la cual representa el 40%.

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear. Además, se hizo la reprogramación correspondiente a la fecha de ejecución del convenio.

En la tabla a continuación se presenta detalle de actividades programadas durante el periodo y porcentajes de avance semanal de acuerdo con ello:

Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de febrero por JAC Vereda Pereira.

No	Tarea/actividad	COSTOS	Semana 11 A 10/02/2024	Semana 12 A 17/02/2024	Semana 13 A 24/02/2024	Semana 14 A 29/02/2024
1	Concreto reforzada resistencia 21 Mpa in situ	$16.898.252,2	$4.224.563,05	$4.224.563,05	$4.224.563,05	$4.224.563,05
2	Concreto Ciclópeo Resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ	$1.573.331,08				$1.573.331,08
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$7.724.956,52	$1.931.239,13	$1.931.239,13	$1.931.239,13	$1.931.239,13
	TOTAL SEMANAL		**$6.155.802,18**	**$6.155.802,18**	**$6.155.802,18**	**$6.155.802,18**
	TOTAL SEMANAL ACUMULADO		**$30.318.930,63**	**$36.474.732,82**	**$42.630.535,00**	**$50.359.668,26**
	% SEMANAL		**4,08%**	**4,08%**	**4,08%**	**5,12%**
	% SEMANAL ACUMULADO		**20,07%**	**24,15%**	**28,22%**	**33,34%**

Fuente: Fuente: GER & PRO SAS, 2024

De acuerdo con el cronograma aprobado, a corte del presente informe, se tiene programado ejecutar un 33,34% del convenio.

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, se giraron recursos para gastos de legalización, administración y a proveedores, se ejecutaron actividades relacionadas con ajustes, diseños previos y limpieza de alcantarillas, en la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA PEREIRA en el convenio 3619 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	PÓLIZAS LEGALIZACIÓN CONTATO - HOME CENTER EPP JAC PEREIRA- ALFREDO BAQUERO	$ 2.545.504,00	$ -	$ 2.545.504,00
2	GEOREFERENCIACIÓN DE MOJONES Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LUIS RAFAEL ALARCON PANTOJA	$ 2.193.000,00	$ -	$ 2.193.000,00
3	LABORATORIO DE SUELOS, DISEÑO DE CONCRETO, PROCTOR ANTONIO GARCIA MENDOZA	$ 1.377.500,00	$ -	$ 1.377.500,00
4	ANTICIPO DEL 70% DE DISEÑO GEOMETRICO OSCAR ALBERTO LOPEZ NUÑEZ	$ 3.150.000,00	$ -	$ 3.150.000,00
5	PAGO DE SALARIOS, MAQUINAS Y ROCERÍA JAC PEREIRA- ALFREDO BAQUERO	$ 1.536.492,00	$ -	$ 1.536.492,00
6	CAJA MENOR JAC-PEREIRA ALFREDO BAQUERO	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
7	IMPRESIÓN BANNER 3X2, VALLA CONVENIO, HAROLD MARTINEZ	$ 297.000,00	$ -	$ 297.000,00
8	COMPRA DE SUBBASE ALFREDO DECKERS	$ 5.720.000,00	$ -	$ 5.720.000,00

	ROLDAAN-CANTERA CALYMAN			
9	TRANSPORTE DE SUBBASE ALEXI TORRADO ARDILA	$ 1.100.000,00	$ -	$ 1.100.000,00
10	CEMENTO, HIERRO, FORMALETA, TROMPO SANDRA INES GUEVARA CONTRERAS	$ 69.397.129,00	$ -	$ 69.397.129,00
11	SALDO SUBBASE Y PAGO TRITURADO CANETRA CALYMAN Y/O ALFREDO DECKERS ROLDAN	$ 7.001.874,00	$ -	$ 7.001.874,00
12	P.S ING RESIDENTE MES ENERO 2024 RUBIEL ALEXANDER ARIZA	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
13	TRANSPORTE DE CARGA DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO 2023 JAC PEREIRA ALFREDO BAQUERO	$ 792.000,00	$ -	$ 792.000,00
14	P.S CONTADOR MES ENERO 2023 LEWIS FRANSISCO CALDERON	$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00
15	PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES JAC PEREIRA ALFREDO BAQUERO	$ 3.657.371,00	$ -	$ 3.657.371,00
18	COMPRA DE PIEDRA POR 8M3 EDWUN ENRIQUE JIMENEZ ROJAS	$ 456.000,00	$ -	$ 456.000,00
19	TRANSPORTE DE 16 M3 DE ARENA Y SUBBASE 24 M3 ARLEY RAMIREZ BAYONA	$ 1.460.250,00	$ -	$ 1.460.250,00
	TOTAL	$ 105.284.120,00	$ -	$ 105.284.120,00

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

Hasta la fecha de acuerdo con las actividades ejecutadas, se tiene un avance financiero de acuerdo con el presupuesto del 8,16%. En la tabla a continuación, se aprecian los porcentajes de avance a corte del presente informe:

Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra del mes de febrero

Detalle a 29 de febrero de 2024	Valor	%
Avance global	$59.814.555,68	39,60%

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A continuación, se relaciona lo facturado durante el periodo del presente informe:

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4	$ 2.320.000	0,2	$ 1.160.000	0,2	$ 1.160.000
2	Ingeniero Residente	2,00	$ 5.200.000	0,6	$1.560.000	0,6	$1.560.000
3	Profesional Ambiental	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
4	Profesional Social	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS		$3.328.000	GL	$2.500.000	GL	$2.500.000
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
7	Inspector SST	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			**$7.220.000**
				FACTOR MULTIPLICADOR			**1.80**
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			**$ 12.996.000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5	$700.000	2	$280.000	2	$280.000
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7	$4.200.000	1,2	$720.000	1,2	$720.000

10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5	$2.550.000	1	$1.700.000	1	$1.700.000
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3	$ 1.773.222	1	$591.074	1	$591.074
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3	$1.500.000	1	$500.000	1	$500.000
13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2	$400.000	1	$200.000	1	$200.000
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3	$120.000	1	$40.000	1	$40.000
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3	$111.000	1	$37.000	1	$37.000
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3	$115.500	1	$38.500	1	$38.500
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			**$4.106.574**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			**$17.102.574**
				IVA 19%			**$3.249.489,06**
				COSTO TOTAL			**$20.352.063,06**

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 03 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 11	Del 05 febrero al 11 de febrero del 2024
Informe semanal No. 12	Del 12 al 18 de febrero del 2024
Informe semanal No. 13	Del 19 al 25 de febrero de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO

3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar, conformación de comité de participación comunitaria y ficha de caracterización socioeconómica.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental.

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC-100015288, expedida por la Aseguradora Seguros mundial., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC-100015288**	
Aseguradora:	**Seguros mundiales**	
Fecha de Expedición:	**10/10/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 03/10/2023 hasta 31/10/2024	$39.981.909,60
Prestaciones sociales	Desde 03/10/2023 hasta 31/12/2026	$9.995.477,40
Estabilidad de la obra	Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028	$59.972.864,40

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025519, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:



Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría


Póliza No.	**47-44-101025519**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**21/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/11/2023 a 30/06/2024	$5.881.946,50
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/11/2023 a 31/12/2026	$11.763.893,00
Calidad del servicio	14/11/2023 a 31/12/2024	$17.645.839,50

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO
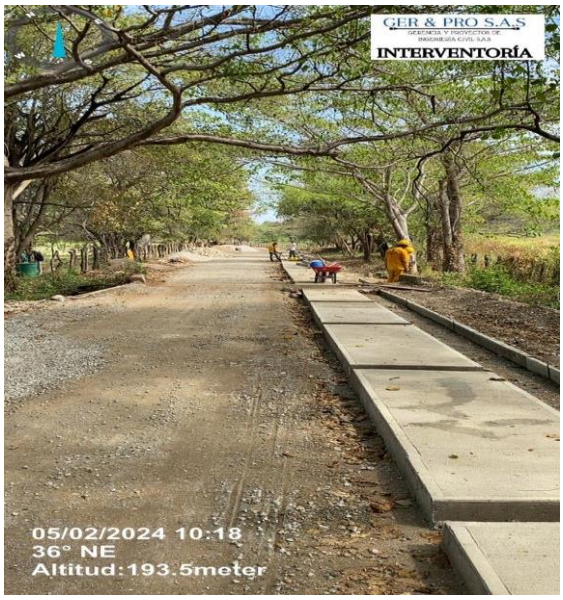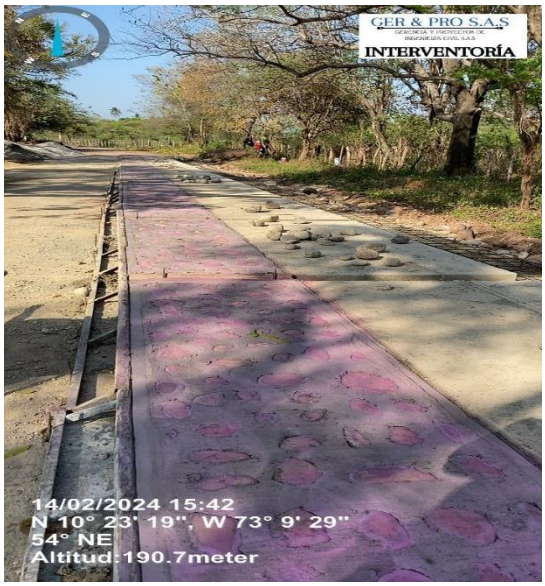
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

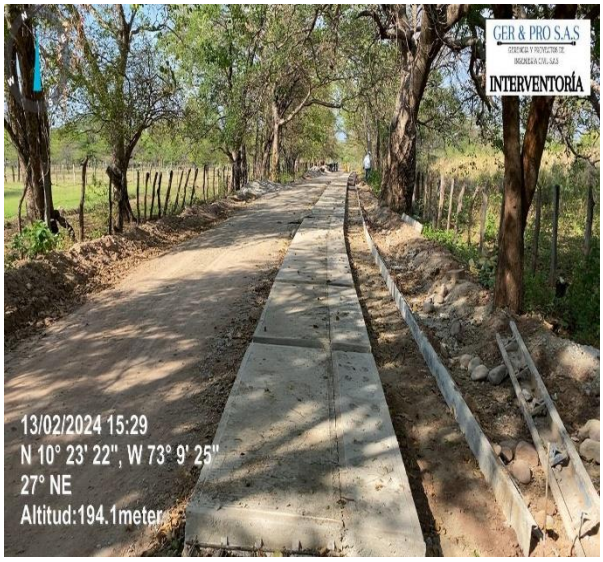
GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
13/02/2024 15:29
N 10° 23' 22", W 73° 9' 25"
27° NE
Altitud:194.1meter


GER & PRO S.A.S
INTERVENTORÍA
N 10° 23' 48", W 73° 9' 19"
La Paz
Cesar
Colombia
Altitud:191.2meter
Velocidad:1.5km/h
Vereda Pereira
Placa huellá





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 29 de febrero del 2024, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Se recomienda aplicación del anti sol en la placa huella para evitar grietas.
- Entregar a interventoría las pruebas de ensayos de concreto para su aprobación.
- Todos los demás documentos que el interventor solicite.
- Hacer buen uso del vibro de hormigón para una mejor compactación en la mezcla de concreto.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 3/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 10 del 29-ene al 4-feb — Último Informe Semanal

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

81 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS TIPO II

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda PEREIRA CTO VARAS BLANCAS, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Pereira, vía al municipio de Manaure. y punto de referencia final el PR2+450 ubicado en la vereda Pereira, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

CONVENIO No.	3619 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.909.548,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 199.909.548		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100.918.499		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 98.991.049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.352.063	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 38.467.402	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.909.548,01	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 24.249.244,72	16,46%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 23.025.527,86	15,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.223.716,86)	-0,83%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 24.226.035,73	12,18%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 51.443.953,59	25,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.251.563,59	23,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.192.390,00)	2,11%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.640.821,88	4,85%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.183.568,36	3,11%

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Pereira, corregimiento de Varas Blancas La Paz - Cesar, ha adelantado labores en el periodo reportado, tales como:
-Construccion de placa huella concreto 21 Mpa
-Acero de refuerzo longitudinal y tranversal acero 3/8".
-Fundición de 46 ml de losa en concreto rígido, equivalente a 6,21 m3.

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$100.918.499** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Formato de control de fundida (nivelacion de rieles y alineamientos longitudinal y tranversal)
-Supervisión de labores de fundida en obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16,46%
Meta Física Ejecutada % 15,63%
Avance o Atraso Físico % -0,83%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,44
*	Excavacaion varias sin clasificar	m3	4,3194
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	86,19
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	3956,21
	concreto ciclopeo resistencia 14Mpa	m3	19,4135
*	Sub base granular	m3	107,1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,44			1,44	100%
Ejec	1,44			1,44	100%
Prog	4,32			4,3194	100%
Ejec					
Prog	86,19			86,19	100%
Ejec	14,58			14,58	16,9%
Prog	3956,21			3956,21	100%
Ejec	574,56			574,56	14,5%
Prog	19,41			19,41	100%
Ejec	3,13			3,13	16,1%
Prog	107,1			107,1	100%
Ejec	107,1			107,1	100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibro de hormigon	1	1
Trompo (Mezcladora de concreto in situ	1	1
Cortadora de acero	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA VEREDA PEREIRA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CANTERA CALYMAN, VÍA MANAURE	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
1. El contratista realizó adquisición de material de sub base necesaria para el desarrollo de la obra.
2, El contratista adquirió agregados grueso y agregado fino.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Fundición de placas 46 ml (1 linea de placa huella)
2. Fundición de concreto ciclopeo 46,4 ml (1 linea de placa huella lateral)
3. Vibrado de concreto para placa huella

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fundición de placa huella con concreto reforzado de 21 Mpa
2. Fundición de concreto ciclopeo lateral
3. Refuerzo en acero y fundida de cuneta.
4. Instalación de valla informativa
5. Instalación de buzón de sugerencias

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
16,46%	15,63%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



fundida de placa huella



placa huella



Estado actual de placa huella



Acabados de placa huella



Riego para fundir concreto ciclopeo



fundicion de concreto ciclopeo



Acabados de concreto ciclopeo

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:

1. Solicitar al contratistas de obra, adelantar las diligencias pertinentes para la cotización, adquisición e implementación del PUNTO ECOLÓGICO según lo establecido por la resolución 2184 de 2019, expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, para una adecuada recolección y disposición de residuos sólidos en la obra.
2. Solicitud de diligenciamiento de formatos de asistencia y EPP por parte del contratista de obra.
3. Control de calidad de concreto en obra.
4. Recomendaciones técnicas en el seguimiento continuo de la obra y calidad de la misma.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 10/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR | SEMANA No.: 11 del 5-feb al 11-feb | Último Informe Semanal | (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

81 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS TIPO II

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda PEREIRA CTO VARAS BLANCAS, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Pereira, vía al municipio de Manaure. y punto de referencia final el PR2+450 ubicado en la vereda Pereira, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

CONVENIO No.	3619 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.909.548,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 199.909.548		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100.918.499		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 98.991.049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.352.063	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 38.467.402	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.909.548,01	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.446.311,39	18,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 30.026.312,12	20,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 2.580.000,73	1,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 30.538.499,50	15,35%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.926.693,39	30,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 60.564.811,62	30,45%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (361.881,77)	0,18%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.482.739,80	4,77%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.286.457,39	6,68%

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Pereira, corregimiento de Varas Blancas La Paz - Cesar, ha adelantado labores en el periodo reportado, tales como:
-Construccion de placa huella concreto 21 Mpa
-Acero de refuerzo longitudinal y tranversal acero 3/8".
-Fundición de 46 ml de losa en concreto rígido, equivalente a 6,21 m3.

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$100.918.499** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Formato de control de fundida (nivelacion de rieles y alineamientos longitudinal y tranversal)
-Supervisión de labores de fundida en obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 18,63%
Meta Física Ejecutada %: 20,38%
Avance o Atraso Físico %: 1,75%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,44
*	Excavacaion varias sin clasificar	m3	4,3194
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	86,19
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	3956,21
	Concreto ciclopeo resistencia 14Mpa	m3	19,4135
*	Sub base granular	m3	107,1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,44			1,44	100%
Ejec	1,44			1,44	100%
Prog	4,32			4,3194	100%
Ejec	2,1597			2,1597	50,0%
Prog	86,19			86,19	100%
Ejec					
Prog	3956,21			3956,21	100%
Ejec	643,64			643,64	16,3%
Prog	19,41			19,41	100%
Ejec					
Prog	107,1			107,1	100%
Ejec	107,1			107,1	100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibro de hormigon	1	1
Trompo (Mezcladora de concreto in situ	1	1
Cortadora de acero	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA VEREDA PEREIRA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	CANTERA CALYMAN, VÍA MANAURE	PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:
1. El contratista realizó adquisición de material de sub base necesaria para el desarrollo de la obra.
2, El contratista adquirió agregados grueso y agregado fino.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Fundición de placas 12,97 ml (1 linea de placa huella)
2. Fundición de concreto ciclopeo 56,5 ml (1 linea de placa huella lateral)
3. Vibrado de concreto para placa huella
4. Armado de formaletas para fundición de cuneta.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fundición de placa huella con concreto reforzado de 21 Mpa
2. Fundición de concreto ciclopeo lateral
3. Refuerzo en acero y fundida de cuneta.
4. Instalación de valla informativa
5. Instalación de buzón de sugerencias

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
18,63%	20,38%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Compactación de suelo para cuneta



Armado de acero de refuerzo para cuneta




Figurado de acero (estribos) para cuneta



Fundida de placas de concreto de 3000 PSI



Fundición de concreto ciclópeo de 2000 PSI

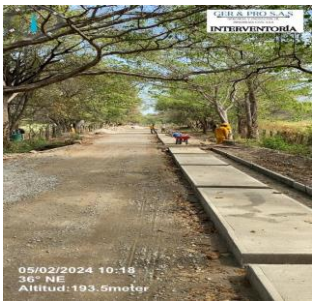

Adecuación de zona de labores



Conformación de rieles para cuneta



Placas de concreto ciclópeo endurecido

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:

1. Solicitar al contratistas de obra, adelantar las diligencias pertinentes para la cotización, adquisición e implementación del PUNTO ECOLÓGICO según lo establecido por la resolución 2184 de 2019, expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, para una adecuada recolección y disposición de residuos sólidos en la obra.
2. Solicitud de diligenciamiento de formatos de asistencia y EPP por parte del contratista de obra.
3. Control de calidad de concreto en obra.
4. Recomendaciones técnicas en el seguimiento continuo de la obra y calidad de la misma.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 12 del 12-feb al 18-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

81 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS TIPO II

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda PEREIRA CTO VARAS BLANCAS, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Pereira, vía al municipio de Manaure. y punto de referencia final el PR2+450 ubicado en la vereda Pereira, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

CONVENIO No.	3619 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.909.548,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 199.909.548		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100.918.499		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 98.991.049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.352.063	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 38.467.402	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.909.548,01	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 42.170.204,56	28,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 31.911.599,07	21,66%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (10.258.605,49)	-6,96%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 32.484.172,64	16,33%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 78.946.259,69	39,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 64.395.771,70	32,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.550.487,99)	7,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.019.566,30	9,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.830.960,08	1,93%

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Pereira, corregimiento de Varas Blancas La Paz - Cesar, ha adelantado labores en el periodo reportado, tales como:
-Construccion de placa huella concreto ciclopeo.

NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$100.918.499** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Formato de control de fundida (nivelacion de rieles y alineamientos longitudinal y tranversal)
-Supervisión de labores de fundida en obra.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28,62% Avance o Atraso Físico % -6,96%

Meta Física Ejecutada % 21,66%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,44
*	Excavacaion varias sin clasificar	m3	4,3194
	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	86,19
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	3956,21
	concreto ciclopeo resistencia 14Mpa	m3	19,4135
*	Sub base granular	m3	107,1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,44			1,44	100%
Ejec	1,44			1,44	100%
Prog	4,32			4,3194	100%
Ejec	2,16			2,159712	50,0%
Prog	86,19			86,19	100%
Ejec	2,30			2,30	2,7%
Prog	3956,21			3956,21	100%
Ejec	643,64			643,64	16,3%
Prog	19,41			19,41	100%
Ejec	6,39			6,39	32,9%
Prog	107,1			107,1	100%
Ejec	107,1			107,1	100%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
vibro de hormigon	1	1
Trompo (Mezcladora de concreto in situ	1	1
Cortadora de acero	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA VEREDA PEREIRA TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA CALYMAN, VÍA MANAURE	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
1. El contratista realizó adquisición de material de sub base necesaria para el desarrollo de la obra.
2. El contratista adquirió agregados grueso y agregado fino.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este ítem del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1. Fundicion de concreto ciclópeo lateral derecho y centro
2. Armado de acero de 3/8"
3. Instalación de valla informativa

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1. Fundicion de concreto ciclopeo centro
2. Armado de refuerzo longitudinal y transversal placa huella.
3. Fundición de placa de concreto ciclópeo de 14 Mpa.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
28,62%	21,66%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Concreto ciclópeo



SIKA anti-sol placa huella



SIKA anti-sol concreto ciclopeo



Valla infomativa



Insumos de material



Placa huella- vereda Pereira



Aplicación del SIKA anti-sol placa huella

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:

1. Solicitar al contratistas de obra, adelantar las diligencias pertinentes para la cotización, adquisición e implementación del PUNTO ECOLÓGICO según lo establecido por la resolución 2184 de 2019, expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, para una adecuada recolección y disposición de residuos sólidos en la obra.
2. Solicitud de diligenciamiento de formatos de asistencia y EPP por parte del contratista de obra.
3. Control de calidad de concreto en obra.
4. Recomendaciones técnicas en el seguimiento continuo de la obra y calidad de la misma.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 25/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 13 del 19-feb al 25-feb (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

81 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS TIPO II

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda PEREIRA CTO VARAS BLANCAS, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Pereira, vía al municipio de Manaure. y punto de referencia final el PR2+450 ubicado en la vereda Pereira, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

CONVENIO No.	3619 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.909.548,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 199.909.548		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100.918.499		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 98.991.049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.352.063	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 38.467.402	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.909.548,01	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 56.894.097,72	38,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 43.931.075,22	29,81%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (12.963.022,50)	-8,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 34.429.845,77	17,31%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 95.615.826,00	48,07%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 78.360.920,99	39,39%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.254.905,00)	8,68%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.669.566,30	8,38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.965.149,29	7,02%

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Pereira, corregimiento de Varas Blancas La Paz - Cesar, ha adelantado labores en el periodo reportado, tales como:
-Construccion de placa huella con concreto ciclópeo de 0,90 m de ancho.
-Fundición de berma cuneta y refuerzo longitudinal y transaversal.
NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$100.918.499** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervisión de labores de fundida en obra de la dosificacion de la mezcla del concreto ciclópeo.
-Supervición de labores de fundida en obra de concreto reforzado para berma cuneta (lado derecho).
-Recomendaciones técnicas, administrativas, legales y ambientales.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 38,61% Avance o Atraso Físico % -8,80%

Meta Física Ejecutada % 29,81%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,44
* Excavacaion varias sin clasificar	m3	4,3194
Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	86,19
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	3956,21
concreto ciclopeo resistencia 14Mpa	m3	19,4135
* Sub base granular	m3	107,1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Prog	1,44			1,44	100%
Ejec	1,44			1,44	100%
Prog	4,32			4,3194	100%
Ejec	2,16			2,159712	50,0%
Prog	86,19			86,19	100%
Ejec	29,31			29,31	34,0%
Prog	3956,21			3956,21	100%
Ejec	1199,31			1199,31	30,3%
Prog	19,41			19,41	100%
Ejec	18,33			18,33	94,4%
Prog	107,1			107,1	100%
Ejec	107,1			107,1	100%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro de hormigon	1	1
Trompo (Mezcladora de concreto in situ	1	1
Cortadora de acero	1	1
Total	3	3

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA VEREDA PEREIRA TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA CALYMAN, VÍA MANAURE	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:
1. El contratista realizó adquisición de material de sub base necesaria para el desarrollo de la obra.
2, El contratista adquirió agregados grueso y agregado fino.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE ELABORACIÓN

OBSERVACIONES: Este ítem del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

1. Fundicion de concreto ciclopeo centro
2. Armado de refuerzo longitudinal y transversal placa huella.
3. Fundición de placa de concreto ciclópeo de 14 Mpa.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Fundision de concreto ciclópeo central.
2. Fundision de berma-cuneta.
3.Refuerzo de cuenta y bordillo.


VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
38,61%	29,81%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

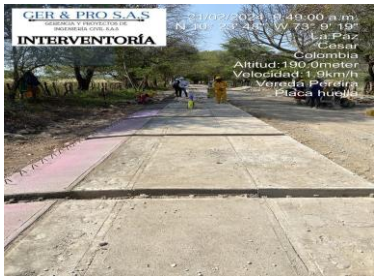

Placa huella con cuneta y refuerzo de la berma.



SIKA anti-sol cuneta.



Placa huella Vereda Pereira.



Fundición de cuneta Vereda Pereira.



Fundición de berma cuneta.



Nivelación e inclinación de berma cuneta.



Fundición de cuneta y vibrado de concreto

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 1. Solicitud al contratista plan de contingencia para minimizar el % de atraso reportado por la interventoría a causa de los días dejados de laborar por fallas mecánica de mezcladora. 2. Solicitud de diligenciamiento de formatos de asistencia y EPP por parte del contratista de obra. 3. Control de calidad de concreto en obra. 4. Recomendaciones técnicas en el seguimiento continuo de la obra y calidad de la misma.	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** C E S A R

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 29 Febrero **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO No. **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION VEREDA PEREIRA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. **INTERVENTORÍA:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**		
MEZCLADORA	-	-	VEREDA PEREIRA	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X		
VIBRO DE HORMIGON	-	-	VEREDA PEREIRA	X	X				X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X		
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica																															
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2				2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2		
TOTAL ACTIVO				2	2				2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2		
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																																		

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	29/02/2024 (Día / Mes / Año)

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
La Junta de Acción Comunal no está realizando labores de ejecución de obra, por tanto no se reporta uso de maquinaria durante este periodo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: RUBIEL ALEXANDER ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0820253015 ATL

Firma

Nombre DIANA CAROLINA POLO BRITO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20202-394329 CES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

N de oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinario
1	C-4383-2023-036	SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS TÉCNICAS, AMBIENTALES, SOCIALES Y RECOMENDACIONES EN GENERAL	02 de febrero de 2024	ALFREDO LUIS BAQUERO GOMEZ PRESIDENTE OAC DE LA VEREDA PEREIRA CORREGIMIENTO DE VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ
2	C-4383-2024-037	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 10 DE INTERVENTORÍA	04 de febrero de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
3	C-4383-2023-039	SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES DE AVANCE DE ACTIVIDADES DE CONVENIOS 3619 Y 3827 DE 2023	05 de febrero de 2024	ALFREDO LUIS BAQUERO GOMEZ PRESIDENTE OAC DE LA VEREDA PEREIRA CORREGIMIENTO DE VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ
4	C-4383-2024-040	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 11 DE INTERVENTORÍA	11 de febrero de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
5	C-4383-2023-041	CONCEPTO SOBRE DOCUMENTO PAGA	13 de febrero de 2024	ALFREDO LUIS BAQUERO GOMEZ PRESIDENTE OAC DE LA VEREDA PEREIRA CORREGIMIENTO DE VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ
6	C-4383-2024-042	SOLICITUD DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA POR INTERRUPCIÓN DE OBRAS DEBIDO A FALLAS EN EQUIPOS.	17 de febrero de 2024	ALFREDO LUIS BAQUERO GOMEZ PRESIDENTE OAC DE LA VEREDA PEREIRA CORREGIMIENTO DE VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ
7	C-4383-2024-044	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 12 DE INTERVENTORÍA	20 de febrero de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
8	C-4383-2023-045	ACTA DE COSTOS 03 PERÍODO ENERO DE 2024	21 de febrero de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
10	C-4383-2023-047	CONCEPTO SOBRE TRÁMITE DE OCUPACIÓN DE CAUCE PREVIO A EJECUCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS DE ALCANTARILLAS	27 de febrero de 2024	ONNA MARÍA ZULETA ARAUJO INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
11	C-4383-2023-048	ENTREGA DE INFORME SEMANAL No 13 DE INTERVENTORÍA	28 de febrero de 2024	OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

N de oficio	Consecutivo	Asunto	Fecha	Destinario
1	2024S-VCES-008605	Oficio de Solicitud Información Atrasos	2024-02-20	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ Representante legal
2	2024S-VCES-009034	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-012683	2024-02-21	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ Representante legal
3	2024S-VCES-010673	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-017297	2024-02-28	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ Representante legal
4	2024S-VCES-011101	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-018062	2024-02-29	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ Representante legal
5	2024S-VCES-011184	Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-017876	2024-02-29	JOSE DAVID DORIA HERNANDEZ Representante legal

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	
FECHA	5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3619 DE 2022 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	JOSE ALIRIO PACHECO DURAN	18972972	MAESTRO	$ 2.320.000	14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 2.320.000	$ 53.824	V	NUEVA EPS	742917669	$ 96.667	PORVENIR	742917669	$ 123.733	$ 30.933			
2	JOSUE PALENCIA GUERRERO	77094617	OBRERO	$ 1.300.000	1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 57.304	V	COOSALUD	742917665	$ 102.917	PORVENIR	742917665	$ 131.733	$ 32.983			
3	MANUEL ALFONSO VALDES GÓMEZ	9176280	OBRERO	$ 1.300.000	1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 87.464	V	ASMET SALUD EPS	742917651	$ 157.083	PORVENIR	742917651	$ 201.067	$ 50.267			
4	BRAYAN ARMANDO TORRADO ARDILA	1067813052	OBRERO	$ 1.300.000	1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 30.160	V	CAJACOPI	742917670	$ 54.167	PORVENIR	742917670	$ 69.333	$ 17.333			
5	LUIS JOSE GARCÍA	77040154	MAESTRO	$ 2.320.000	1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 2.320.000	$ 156.090	V	NUEVA EPS	742917653	$ 280.333	PORVENIR	742917653	$ 358.827	89.707			
6	SAMIR BARRETO GOMEZ	1082375637	OBRERO	$ 1.300.000	15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 45.240	V	COOSALUD	742917658	$ 81.259	PORVENIR	742917658	$ 104.000	$ 26.000			
7	LUIS MIGUEL ARDILA	1067808906	OBRERO	$ 1.300.000	1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 87.464	V	NUEVA EPS	742917656	$ 157.083	PORVENIR	742917656	$ 201.067	$ 50.267			
8	EULOGIO ARENDAS	12642115	MAESTRO	$ 2.320.000	14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 2.320.000	$ 86.118	V	NUEVA EPS	742917652	$ 154.667	PORVENIR	742917652	$ 197.973	49.493			
9	CLAUDIO SOZA ZAMBRANO	196212110	OBRERO	$ 1.300.000	14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	48.256	V	NUEVA EPS	742917649	$ 86.677	PORVENIR	742917649	$ 110.933	$ 27.733			
10	LUIS LABERTO MADRID	1050840203	OBRERO	$ 1.300.000	15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 45.240	V	COOSALUD	742917655	$ 81.250	PORVENIR	742917655	$ 104.000	$ 26.000			
11	EDGAR ANDRES ARDILA DURAN	1007732149	OBRERO	$ 1.300.000	1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 87.464	V	CAJACOPI	742917660	$ 157.083	PORVENIR	742917660	$ 201.067	$ 50.267			
12	CAMILO ANDRES CARDENAS PEREZ	1067592041	OBRERO	$ 1.300.000	1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10 X 11 X 12 X 13 X 14 X 15 X 16 X 17 X 18 X 19 X 20 X 21 X 22 X 23 X 24 X 25 X 26 X 27 X 28 X 29 X	jac de la vereda pereira cto varas blancas municipio la paz departamento del cesar	$ 1.300.000	$ 90.480	V	COOSALUD	742917662	$ 162.500	PORVENIR	742917662	$ 208.000	$ 52.000			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUBIEL ALEXANDER ARIZA ALI
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0820253015 ATL

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DEL 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GER & PRO S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**			**Total**
Seco	X	X	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Lluvias moderadas					X	X	X	X																								
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RUBIEL ALEXANDER ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0820253015 ATL

Firma
Nombre: DIANA CAROLINA POLO BRITO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20202-394329 CES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PAGINA	

FECHA 5/02/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No.: 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATISTA									
1	20/01/2024	ENSAYO DE DENSIDAD	INV-320	Sector - Tramo Vereda Pereira	1	95	100,5	SI	SE RECOMIENDA POR PARTE DE INTEVENTORIA REALIZAR COMPACTACION NUEVAMENTE EN EL SITIO DONDE NO CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES
					2	95	97,1	SI	
					3	95	96,8	SI	
					4	95	89,2	NO	

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.



Firma

Nombre: RUBIEL ALEXANDER ARIZA ALI
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0820253015 ATL



Firma

Nombre:OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 5 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.909.548,00

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA Y PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	17%	$ 39.981.906,60	3	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	4,98%	$ 9.955.477,40	3	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.972.864,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100015288

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE CRC-100004710 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.981.909,60	30	12	2023	2/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.995.477,40	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.972.864,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100015288

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	10	2023	30	4	2024
Otros		$ 260.000.000,00	3	10	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100004710 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 2
		FECHA	12/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3619 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Inicio de labores de obra: El contratista OAC, empezó labores de obra el día 16 de enero de 2024

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra.
2. Recomendaciones técnicas de la interventoría al OAC en los avances de la ejecución de las obras.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 80:50 am del día 12 de febrero del año 2024, se da inicio al comité de obra, abordando los siguientes temas:

1. Habiendo surtido los trabajos de colocación de sub base granular clase C en el punto a intervenir con placa huella, en la cual se utilizó maquinaria amarilla (Motoniveladora, Vibrocompactador y Carro tanque), se constata que esta presentó una muy buena compactación, tal y como lo reflejan los resultados de densidades.
2. Las labores de fundida de concreto reforzado y ciclópeo, han estado en buena marcha, exceptuando los momentos en los que se averió el mezclador y se suspendió las labores por dicha situación.
3. El interventor recomeinda elaborar un plan de contingencia que permita recuperar los días dejados de laborar por situaciones de esta naturaleza, que afectan la correcta ejecución de las labores de obra.
4. A la fecha, se evidencia un porcentaje de avance de obra del 22%, evidenciando un retraso de 5%, habiendo desarrollado labores de colocación de sub base, fundida de concreto reforzado y concreto ciclópeo.
5. Se tratan temas asociados al uso adecuado de EPP por parte de los trabajadores de la obra.
6. El interventor realiza recomendaciones al contratista en aras de presentar un plan de contingencia para no incurrir en retrasos de obra que pueda afectar la correcta ejecución de las labores.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Presentación de plan de contingencia para contrarestar los posibles retrasos en obra.	lunes, 19 de febrero de 2024	OAC Pereira
Presentación de infores mensuales del mes de diciembre y enero.	viernes, 23 de febrero de 2024	OAC Pereira

FECHA PRÒXIMO COMITÈ DE OBRA 11/03/2024 (Día / Mes / Año)






NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OMAR PERALTA CARRILLO	DIR. INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ	RL INTERVENORÍA	GER & PRO SAS	
DIANA POLO BRITO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
HÉCTOR PAVA MORALES	INSPECTOR	GER & PRO SAS	
ALFREDO BAQUERO GÓMEZ	PRESIDENTE OAC	OAC PEREIRA	
RUBIEL ARIZA ALI	ING. RESIDENTE OAC	OAC PEREIRA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19-feb-24 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONVENIO No. 3619 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
1. ESTADO ACTUAL DE AVANCE FÍSICO DE CONVENIO SEGÚN CRONOGRAMA DE OBRA
2. ENTREGA DE DISEÑOS DE CUNETA Y BORDILLO

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN
EL ORDEN DEL DÍA, SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:
1. Información actual del avance físico del convenio.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE DA EN EL SIGUIENTE ORDEN:
1. La interventoría manifiesta preocupación por retrasos en la obra, dado a que se han presentado reiteradas fallas mecánicas en la mezcladora.
2. El Ing. Residente manifiesta que no se encuentra de acuerdo con qué los días dejados de trabajar y que la primera vez, se solucionó el inconveniente, alquilando otra mezcladora. En la 2da ocasión en la que se averió la mezcladora (14 de feb-2024), completandose dos días sin labores de fundida de concreto. El presidente de la JAC. manifiesta que hay desinformación por parte de miembros de la comunidad en cuanto a los días dejados de laborar.
3. Se hace entrega de diseño definitivo de bordillo y cuneta por parte de Interventoría.
4. La interventoría mediante oficio GYP-001-2024 enviado a corpocesar el día 19-Feb-2024, solicitó pronunciamiento formal en lo que tiene que ver con el trámite de

Continúa al Reverso.

Powered by CamScanner

Permiso de Ocupación de cauce para la Construcción de Obra hidráulica (alcantarilla), tal y como se le fue notificado en reunión presencial en instalaciones de Corpocesar entre equipo ambiental de esta interventoría y profesional de Coordinación de recursos hídricos.

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 19-feb-24 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
1. Presentar plan de Contingencia para recuperar días perdidos por daños presentados en mezcladora.		JAC Pereira.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alfredo Baquero	Pres. JAC	JAC Pereira	
Rubiel Ariza	Ing. Residente	JAC Perira	
Omar Peralta	Div. Interventoría	Gery y Pros SAS	
José Doria	RL Interventoría	Gery Pros SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Powered by CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 29-feb **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** GER & PRO S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AUTOMOVIL KIA	MBV363 CILINDRAJE 1600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 29/02/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	487904037	9463842205	E	2024/02/06	2024/03/04	BANCOLOMBIA	27	$4,535,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JOSE DANIEL MINDIOLA (13 Afiliados)																							$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800
Centro de Trabajo: OBRA (13 Afiliados)																							$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (13 Afiliados)																							$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800
1	CC	1063491424	ARRIETA JOSE	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
2	CC	1010151400	CASTILLA CARLOS		X					X											231001	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
3	CC	7383389	DORIA JOSE							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
4	CC	1065830598	MAESTRE CAMILA							X											25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	1063493544	MARTINEZ ANGEL	X																	231001	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
6	CC	1063490944	MENDOZA HELEM	X																	230201	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
7	CC	1062815386	MENDOZA ISMAEL	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
8	CC	1065654021	PAVA HECTOR							X											230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
9	CC	77019867	PERALTA OMAR							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
10	CC	1001851828	POLO DIANA	X																	231001	27	$2,340,000	$374,400	EPSIC1	27	$2,340,000	$93,600	CCF15	27	$2,340,000	$93,600	14-4	27	$2,340,000	6.960%	$162,900	27	$0	$0	Si	$724,500
11	CC	1065830672	RUMBO MARIA							X											230201	30	$1,300,000	$208,000	EPSIC1	30	$1,300,000	$52,000	CCF15	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
12	CC	1065886573	SANCHEZ DIMAR	X																	230301	15	$650,000	$104,000	EPS041	15	$650,000	$26,000	CCF15	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	Si	$201,300
13	CC	1118855053	ZAMBRANO JUAN																		25-14	30	$1,560,000	$249,600	CCFC55	30	$1,560,000	$62,400	CCF15	30	$1,560,000	$62,400	14-4	30	$1,560,000	6.960%	$108,600	30	$0	$0	Si	$483,000
Total			**Afiliados(13)**																				$14,300,000	$2,288,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000	$572,000			$14,300,000		$995,800		$0	$0		$4,427,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900764117	6	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JOSE DANIEL MINDIOLA	Mz F Casa 4 A urb club house	VALLEDUPAR-CESAR	5833615	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	487904037	9463842205	E	2024/02/06	2024/03/04	BANCOLOMBIA	27	$4,535,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,288,000	$55,400	$0	$2,343,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$582,400	$14,100	$0	$596,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$665,600	$16,100	$0	$681,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$520,000	$12,600	$0	$532,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$520,000	$12,600	$0	$532,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$995,800	$24,100	$0	$1,019,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	13	$995,800	$24,100	$0	$1,019,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$572,000	$13,900	$0	$585,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	13	$572,000	$13,900	$0	$585,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$572,000	$14,200	$0	$586,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$62,400	$1,600	$0	$64,000
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	4	$249,600	$6,100	$0	$255,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$130,000	$3,200	$0	$133,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$52,000	$1,300	$0	$53,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$26,000	$700	$0	$26,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$52,000	$1,300	$0	$53,300
TOTAL				**13**	**$4,427,800**	**$107,600**	**$0**	**$4,535,400**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 'FEBRERO 2024

PROYECTO: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3827-2023; 3619-2023

CONTRATISTA: OAC SABANA ALTA; OAC PEREIRA (MUNICIPIO DE LA PAZ)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	**1301223**	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**	**11**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 58.819.465**	**$ 21.601.532**
	1301223	**C-2402-0600-12-0-2402041-02**	**11**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 24.837.680**	**$ 24.837.680**
			TOTAL			**$ 83.657.145**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 83.657.145**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**NOVIEMBRE / 2023**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**1301223 de 2023-11-27**	**$ 58.819.465**	**$ 83.657.145**		ACTA 1.
2	**DICIEMBRE / 2023**	$ 17.102.574	$ 3.249.489,06	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	**1301223 de 2023-11-27**	**$ 38.467.401,94**	**$ 63.305.081,94**		ACTA 2.
3	**ENERO / 2024**	$ 14.173.000	$ 2.692.870	**$ 16.865.870,00**	**$ -**	**$ 16.865.870**	**$ -**	**1301223 de 2023-11-27**	**$ 21.601.531,94**	**$ 41.953.595,00**		ACTA 3
4	**FEBRERO / 2024**	$ 15.414.074	$ 2.928.674	**$ 18.342.748,06**	**$ -**	**$ 18.342.748**	**$ -**	**1301223 de 2023-11-27**	**$ 3.258.783,88**	**$ 23.610.846,94**		ACTA 4
TOTALES		**$ 46.689.648**	**$ 8.871.033,12**	**$ 55.560.681,12**		**$ 55.560.681,12**			**$ 3.258.783,88**	**$ 23.610.846,94**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
INTERVENTORIA CONVENIOS 3827-2023; 3619-2023	**$ 46.689.648**	**$ 8.871.033,12**	**$ 55.560.681,12**
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: **OMAR PERALTA CARRILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820247167 ATL**

Firma

Nombre: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S	NIT: 900.764.117-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MZ F CASA NRO. 4 - 1	VALLEDUPAR, CESAR	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA BENETRIO MENDOZA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4383 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL].

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2023	31/10/2024	$8,365,714.50	$5,881,946.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/11/2023	30/04/2027	$16,731,429.00	$11,763,893.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2023	30/04/2025	$25,097,143.50	$17,645,839.50

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR Y LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA ARRIBA SEGUN:
ADICIONAL No 1 Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO N 4383 de 2023
VALOR ADICIONAL No 1: $ (24.837.680.00) INCLUIDO IVA
PLAZO PRORROGA No 1: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERNANECEN IGUALES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,932.00	$ *******8,000.00	$ ******13,097.00	$ **********82,030.00	$ *******50,194,287.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO	143346	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S		**NIT: 900.764.117-6**
DIRECCIÓN: MZ F CASA NRO. 4 - 1	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA BENETRIO MENDOZA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023 **INTERVENTOR:** OMAR PERALTA CARRILLO

OBJETO DEL CONTRATO:

NTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 4/12/2023

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 194.229.801,00

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20	$ 8.365.715	14	11	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5	$ 16.731.429	14	11	2023	30	4	2027
Calidad del servicio	30	$ 25.097.144	14	11	2023	30	4	2027

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGURO DEL ESTADO SAS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 1/02/2024

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA _____
(Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento								
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones								
Calidad del servicio								

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma _____
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL


Firma _____
Nombre: OMAR EDIL GOMEZ NAVIA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

fue acomodación y nivelación de las formaletas de la placa huella, ya que no se encontraban organizadas y tampoco con los alineamientos establecidos para la fundición

Personal en Obra: Maestro.
Inspector SST Carlos Castilla.
Res Obra.
Res. Interventora.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Diana Polo.
Res. Interventora.

01 - Febrero - 2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, Municipio de la Paz - Cesar.


Contratista JAC Pereira
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniera Civil SAS

Desarrollo: las actividades durante el dia fueron fundición de placa huella, teniendo en cuenta los alineamientos establecidos de formato de fundida. (Nivelación de niveles, refuerzo longitudinal y transversal y dosificación de la mezcla) al final del dia lograron fundir 15 ml de 1 linea de placa huella sin viga riostras, Asimismo se contorneó la parte lateral de la placa para demarcar y poder fundir el concreto ciclopeo, Tambien para el final del dia se logró fundir 15ml de concreto ciclopeo lateral a la placa huella (1ra linea fundida)

Personal en obra: Maestro.
Res. Obra

Res Interventoria.
Inspector SST Carlos Castilla

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Res Obra

Diana Polo
Res Interventoria.

02 - Febrero - 2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Vacas blancas, Municipio de la Paz - Cesar.


Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades durante el dia fue fundición de concreto ciclopeo en la misma linea de la placa huella fundida anteriormente, Al final del dia se logró fundir 30ml de concreto ciclopeo lateral

- Observaciones: Interventoria recomienda al contratista humedecer constantemente las placas minimo 3 veces al dia.
la mezcladora presentó en horas de la tarde falla mecanica. por lo tanto las actividades de fundición quedaron suspendidas. hasta ser reparada el equipo.

Personal en Obra: Maestro.
Inspector SST
Res. Obra.
Res Interventoria.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Res Obra

Diana Polo
Res Interventoria.

03 - febrero - 2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: No se realizaron actividades de fundición, la mezcladora presentó fallas técnicas y no se ha logrado solucionar.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

04 - febrero - 2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Veras blancas, Municipio de la Paz - Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizaron ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

05 - febrero - 2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz - Cesar.


Contratista JAC Pereira
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Durante el día se realizó contaminación de espacio para la construcción de la cuneta, también se verificó la nivelación, Pendiente y medición de la placa y cuneta. No se fundió ya que la mezcladora llegó recien reparada de taller pero no había luz lo cual no permitio el bombeo de agua hasta la obra (Teniendo en cuenta que desde el lugar para llevar agua hasta la obra la distancia es considerable)

Personal en Obra: Res Obra
Res Interventoria.
Inspector SST Carlos Castilla.
Inspector Hector Perez.
Director Int Omar Prieto.
Ing Civil Hidrologo Said Alvarez
Ing jose david Dona Hernandez.

Observaciones: Durante la mañana tuvo lugar la visita del Hidrologo. a obra con el fin de conocer detalles en referencia al paso de agua por las alcantarillas y ademas de las alcantarillas nuevas a construir.

Condiciones climaticas: Dia nublado.



Res Obra

Diana Polo
Res. Interventoria

06-febrero-2024

Vereda Perreira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista: JAC Pereira.

Interventora: Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Durante el día se siguió con la actividad de fundición de la placa (Concreto ciclopeo) lateral a la línea ya fundida de una parte de ella, se tuvo en cuenta la especificación de la mezcla 14 MPa, que permita dar un mejor calidad y durabilidad de la vía, Al final del día se logró fundir 18,5 ml de concreto ciclopeo.

Personal en Obra: Res Obra.
Res. Interventora.
Inspector SST Carlos Castilla.
Maestro.

Condiciones climáticas: Día nublado.

Res Obra

Diana Polo
Res. Interventora.

07-febrero-2024

Vereda Perera, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz-Cesar.


Contratista: IAC Perera.
Interventora: Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Durante el día las actividades realizadas fueron instalación de formaletas para las cunetas y andenes se fundieron placa de concreto reforzado de 3000 psi, al final del día se logro fundir 12,97 ml de placa huella (1 línea)

Personal en Obra: Res Obra.
Res. Interventora

Inspector Obra Hector Pava.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: lluvias moderadas por la mañana y nublado.



Diana Polo
Res. Interventoria.

08-febrero-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria: Gerencia y proyectos de ~~Ingeniería~~ civil SAS

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fue Compactación con rana (vibrocompactador) Para la fundición de la cuneta, Ademas figurado de Hierro para refuerzo de la cuneta.
Ademas se realizó una videoconferencia sobre el Proceso Constructivo de la placa huella donde como principal exponente fue el INVIAS, Asimismo fue dirigido a los Ingenieros, Interventores, contratistas y presidentes de la JAC en el territorio Colombiano donde se este llevando a cabo el proyecto de mejoramiento para placa huella y alcantarillado.

Personal en Obra: Res. Obra
Res Interventoria.
Inspector Obra Hector Pava.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: Dia nublado y lluvias moderadas



Res Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

09-Febrero-2024


Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniera Civil SAS

Desarrollo: las actividades realizadas fueron instalacion de Formaletas para cuneta, Asimismo se fundió placa de Concreto ciclopeó de 2000 psi, Al final del dia fue 12,92 ml de placa de concreto ciclopeó

Personal en Obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Inspector Obra Heder Pava.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas Dia soleado y despejado.



Res Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

10-Febrero-2024

Vereda Pereira, Corregimiento Veras blancas, Municipo de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades durante el dia contramuro y Formaletas para las cunetas, y fundio placa de concreto

Elaboró

Personal en Obra: Res Obra.
Res. Interventoría.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climatéricas: Día soleado y despejado.



Dina Polo
Res. Interventoría.

11-Febrero-2024

Vereda Pereira, Corregimiento Vacas blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoría Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Condiciones climatéricas: Día soleado y despejado.



Dina Polo
Res. Interventoría.


12-Febrero-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Vacas blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoría Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado



Res Obra

Dinca Pato
Res Interventoria.

13-Febrero-2024


Vereda Pereira, Corregimiento Varas blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades durante el dia fueron fundición de placa de concreto ciclopeo central, los laterales derecha ya fueron todos fundidas, Al final del dia lograron fundir 6 plasas de concreto ciclopeo central. Tambien se colocó valla informativa

Personal en Obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Inspector obra ~~Hector~~ Hector Pava.
Inspector SST Carlos Castilla

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Res Obra

Dinca Pato
Res Interventoria

14-Febrero-2024


Vereda Pereira, Corregimiento Varas blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: las actividades durante el día fue fundición de placa concreto ciclopeó y verificación de las formaletas de concreto

Personal en Obra. Res obra.
Res Interventoría.
Inspector obra Hector Pava.
Inspector SST Carlos castilla.

Condiciones clim[illegible] despejado.
Dicna Polo.



15-Febrero-2024.


Vereda Pereira, Corregimiento Vegas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista TAC Pereira.
Interventoría Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades durante el día fueron fundición de placa de concreto ciclopeó, Al final del día el total de placas fundidas hasta el día son 16 placas (ciclopeo Central)

Personal en Obra: Res obra.
Res. Interventoría.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.



Dicna Polo
Res Interventoría.

16-Febrero-2024.


Vereda Pereira, Corregimiento Vegas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista IAC Pereira
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fue fundición de placa de concreto ciclopeo y conformación de cunetas. (Formaletas)

Personal en obra: Res. Obra
Res Interventoria.
Inspector SST.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado



Dinna Polo
Res Interventoria.

17-Febrero 2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista IAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fundición de placa de concreto ciclopeo y conformación de Formaletas

Personal en Obra: Res obra.
Res Interventoria
Inspector obra. SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Dinna Polo
Res. Interventoria.

18-Febrero-2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista: JAC Pereira.
Interventoria: Gerencia y proyectos de ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad en obra.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res Obra

Diana Polo.
Res. Interventoria.

19-Febrero-2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el dia fueron conformación de cunetas, retiro longitudinal y transversal, Aplicación del antisol y humedecimiento de la placas-huellas

Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Inspector SST Carlos Castilla.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res Obra

Diana Polo
Res Interventoria

20- Febrero-2024


Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, Municipio de la Paz Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: Durante el dia las actividades realizadas fueron fundición de 7 placas de concreto ciclopeó y 3 placas de Cunetas.

Personal en Obra: Res Obra.
Res Interventoria.
Inspector SST Carlos Castillos.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado



Diana Polo
Res. Interventoria.

21-Febrero-2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia son fundisión de placas de cuneta-berma, seguido de su retiro longitudinal y transversal Al Final del dia se logró fundir 13 placas de cunetas.

Personal en Obra: Res obra.
Res Interventoria.
Inspector Obra Hector Pava

Maestro.

Condiciones climaticas. Dia soleado y despejado.



Diana Polo
Res Interventoria.

22-Febrero-2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyectos de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Durante el día las actividades desarrolladas fueron fundisión de la placas de la cuneta berma, conformación del terreno para la fundisión del concreto ciclopeo de la parte Central, Ademas aplicación del Anti-sol y fijacion del refuerzo de la placa de la cuneta-berma.

Personal en obra: Res obra.
Res. Interventoria.
Inspector SST Carlos Castilla.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Diana Polo
Res Interventoria.

23-Febrero-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista: JAC Pereira.

Interventoría Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo las actividades desarrolladas durante el día fueron fundisión de las placas concreto brinca, Nivelación e inclinación de las formaletas para las cunetas

Personal en Obra: Res Obra.
Res Interventoria.
Inspecto SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

Res Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

24-Febrero-2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC vereda Pereira.
Interventora Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo las actividades desarrolladas durante el día fueron fundida placas de concreto para cunetas teniendo en cuenta la nivelacion e inclinacion respectiva descritas en el diseño en las normas INVIAS.

Personal en Obra: Res. Obra
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

Res Obra

Diana Polo
Res Interventoria.

25-Febrero-2024

Vereda Pereira, C
Paz-Cesar.

Contratista JAC
Interventoria Ge

Desarrollo: Ne

Res C

26-febrero-2024

Vereda Pere
Paz-Cesar.

Contratista
Interventora

Desarrollo:
cuero, Pa
cuero (3/e

Personal en

Condicio

27-Feb

25-Febro-2024

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad.

Res Obra

Diana Polo
Res. Interventoria.

26-Febrero-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de veras blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: Durante el dia se realizaron labores de figurado de acero, para placa contral del concreto reforzado, refuerzo acero (3/8") longitudinal y transversal.

Personal en obra: Res obra.
Res. Interventoria.
Inspector SST Carlos Castilla.
Inspector obra Hector Pava.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res Obra

Diana Polo
Res Interventoria

27-Febrero-2024

Vereda Perrira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: Se realizaron actividades de armado, nivelacion de Formaletas y excavaciones. Ademas se logró fundir 5 placas de Concreto reforzado de 3000 psi

Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Inspector SST Carlos Castilla.
Inspector obra Hector Pava.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.



Diana Pob.
Res. Interventoria.

28-Febrero-2024

Vereda Perrira, Corregimiento de Veras blancas, Municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron fundida de placa de la linea 2da de la placa-huella. de concreto reforzado, Al Final de la jornada se lleva un acumulado de 41 placas derecha, 41 placas de concreto ciclopeo, 41 placas de cuneta y 26 placas de Concreto ciclopeo central, Asimismo se lleva 20 placas de 2da linea. de placa-huella de concreto reforzado lado izquierdo.

Personal en obra: Res Obra
Res. Interventoria.
Inspector
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Dicno Pdo
Res. Interventoria.

29 Febrero 2024.


Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, Municipio de la paz-Cesar.

Contratista SAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS

Desarrollo: las actividades desarrolladas durente fue fundida de placas 2da linea lado izquierdo, Ubicación de niveles y Formaletas, Adimos del refuerzo longitudinal y transversal de la placa.

Personal en obra: Res Obra.
Res. Interventoria.
Inspector SST Carlos Castilla.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Dicno Pdo.
Res. Interventoria.

01- Marzo- 2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, Municipio de la
