	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. Contrato de 3619 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCION COMUNAL PEREIRA

Interventoría No. **4383 DE 2023** **Interventoría:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL SAS

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** ABRIL

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		8
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		12
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		13
3.3	Seguimiento Items no previstos		No Aplica
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	22
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	32
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	34
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	35
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	37
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	38
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	40
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	No Aplica
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		No Aplica
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento Programa de Obra		No Aplica
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	No Aplica
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	No Aplica
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	42
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		12
5.1	Información general del contrato		13
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		No Aplica
5.3	Informes especialistas y profesionales		No Aplica
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		No Aplica
5.5	Informe matriz de riesgos.		No Aplica
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		No Aplica
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		No Aplica
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		45
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	46
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	48
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	49
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	50
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	No Aplica
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	No Aplica
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	No Aplica
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	No Aplica
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	No Aplica
7	**Conclusiones y recomendaciones**		17
8	**Anexos**		52
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		53
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		59
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		No Aplicca
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		No Aplica

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No._____de fecha _____

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR **PERIODO MES:** ABRIL

CONVENIO No.: 3619 DE 2023

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

PLAZO INICIAL: 3 MESES
FECHA DE INICIO: 28/11/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 199.909.548,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ -
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Mejoramiento	Ml	0
Estructuras	Mantenimiento	Ha	1,47
	Concreto reforzado 21 Mpa	M3	127,3098
	Acero de refuerzo	KG	5.548,21
	Concreto de 14 Mpa	M3	60,0500

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento	Ml		0
Estructuras	Mantenimiento	Ha		1,47
	Concreto reforzado 21 Mpa	M3	54,35	127,31
	Acero de refuerzo	KG	2.309,24	5.548,21
	Concreto de 14 Mpa	M3	12,96	60,05

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	$147.348.484,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$4.420.455,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$47.140.609,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	198.909.548,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS	$ 25.396.555,95	$ 48.422.083,81
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	$ -	$ -
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 10.177.019,41	$ 34.429.845,77
VALOR EJECUTADO	$ 35.573.575,36	$ 82.851.929,58

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 146.573.465
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 155.892.959,44
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	106,36%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	2
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**6**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





	
0	
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)	
Firma Nombre OMAR PERALTA CARRILLO Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 0820247167 ATL Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial	

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4383-2023

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

Periodo:

Del 01 de abril al 30 de abril de 2024

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE TABLAS 3
INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVO DEL INFORME 6
1. DATOS GENERALES 7
1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría 7
1.2. Datos del contrato de Interventoría 7
2. ACTIVIDADES DEL PERIODO 9
2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma 9
2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra 12
2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría 14
2.4. Informes semanales 16
3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO 17
3.1. Seguimiento Gestión Social 17
3.1. Seguimiento Gestión Ambiental 17
4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO 18
4.1. Relación de pólizas convenio de obra 18
4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría 18
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 20
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22

LISTA DE TABLAS

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado 9
Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de abril por JAC Vereda Pereira. 11
Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA PEREIRA en el convenio 3619 de 2023 . 12
Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra del mes de abril 14
Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría 16
Tabla 0-6 Imágenes de ejecución de PAGA 17
Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra 18
Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría 19

CONTROL DE REVISIONES Y MODIFICACIONES

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Diana Carolina Polo Brito	Ing. Residente de Interventoría		30/04/2024
Revisó	José Doria Hernández	Rep. Legal Interventoría		30/04/2024
Aprobó	Omar Peralta Carrillo	Dir. Interventoría		30/04/2024
Observaciones:				

INTRODUCCIÓN

La entidad INVIAS, en cumplimiento de sus funciones, ejecuta a través del convenio solidario 3619 de 2023, el proyecto, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"; así como el contrato de interventoría No 4383 de 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

El proyecto consta de la construcción de 81 metros lineales de placa huella, así como la construcción de cuatro (04) alcantarillas tipo 2, rocería y limpieza manual de 2,45 km del corredor a intervenir.

En el presente documento se presenta a detalle el seguimiento realizado a las actividades asociadas al proyecto durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Presentar el avance de actividades ejecutadas y/o desarrolladas por el contratista de la JAC de la Vereda Pereira en cumplimiento del contrato de interventoría No 4383 de 2023, cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"*

1. DATOS GENERALES

FECHA:	30/04/2024	**INFORME No.**	**5**

PERIODO No.	5	**DEL**:	01/04/2024	**AL**:	30/04/2024

OBJETO DEL CONTRATO:	*INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL*
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE LA PAZ, CESAR – VEREDA PEREIRA

1.1. Datos del contrato de obra objeto de esta interventoría

CONVENIO SOLIDARIO No.:	3619 DE 2023
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA
PLAZO INICIAL:	1,1 MESES
FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	3,1 MESES
VALOR INICIAL:	$ 199.909.548
PORCENTAJE DE ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A

1.2. Datos del contrato de Interventoría

CONTRATO No.:	4383 DE 2023
CONTRATISTA:	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S
PLAZO INICIAL:	1,1 MESES

FECHA DE INICIO:	28/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2024
PLAZO TRANSCURRIDO:	3,1 MESES
VALOR INICIAL:	$ 58.819.465
ANTICIPO:	N.A.

2. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Durante el periodo reportado, se desarrollaron actividades correspondientes a los ítems del presupuesto, tal y como se muestra a continuación:

Tabla 2-1. Descripción de actividades desarrolladas del periodo reportado

No	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Excavaciones varias sin clasificar	Consiste en hacer una excavación superficial con maquinaria (motoniveladora)
2	Concreto reforzada resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	En actividad consiste en hacer una mezcla de concreto dosificada con la resistencia establecida en el proyecto (arena, cemento, agua y gravilla)
3	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Se realizo un refuerzo longitudinal y transversal de la placa huella lo cual va a permitir dar resistencia a la placa huella al paso de equipos y transporte. También refuerzo de la viga riostras de la placa huella.
4	Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)	Consiste en realizar una mezcla de concreto dosificado con la resistencia establecida en el proyecto, el cual no lleva refuerzo y se compone de un material sobre tamaño (piedra pegada), la cual representa el 40%.

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.1. Seguimiento al cumplimiento del cronograma

Previa suscripción del acta de inicio, esta interventoría recomendó la elaboración del cronograma de actividades de obra de acuerdo con el ajuste presupuestal realizado y aprobado, una vez surtida la fase de estudios y diseños. A finales del periodo se revisó y aprobó dicha programación, la cual será la herramienta de seguimiento a emplear. Además, se hizo la reprogramación correspondiente a la fecha de ejecución del convenio.

En la tabla a continuación se presenta detalle de actividades programadas durante el periodo y porcentajes de avance semanal de acuerdo con ello:

Tabla 2-2: Actividades Programadas Mes de abril por JAC Vereda Pereira.

No	Tarea/actividad	COSTOS	Semana 19 A 06/04/2024	Semana 20 A 13/04/2024	Semana 21 A 20/04/2024	Semana 22 27/03/2024
1	Concreto reforzada resistencia 21 Mpa in situ	$83.148.259	$5.939.161,35	$5.939.161,35	$5.939.161,35	$5.939.161,35
2	Concreto Ciclópeo Resistencia 21 MPA (D) – mezcla in situ	$14.360.677	$1.595.630,76	$1.595.630,76	$1.595.630,76	$1.595.630,76
	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	$31.687.165	$2.112.477,69	$2.112.477,69	$2.112.477,69	$2.112.477,69
	TOTAL SEMANAL		**$9.647.269,80**	**$9.647.269,80**	**$9.647.269,80**	**$9.647.269,80**
	TOTAL SEMANAL ACUMULADO		**$117.631.655,56**	**$127.278.925,36**	**$136.926.195,17**	**$146.573.464,97**
	% SEMANAL		**6,58%**	**6,58%**	**6,58%**	**6,58%**
	% SEMANAL ACUMULADO		**80,25%**	**86,84%**	**93,42%**	**100%**

Fuente: Fuente: GER & PRO SAS, 2024

De acuerdo con el cronograma aprobado, a corte del presente informe, se tiene programado ejecutar un 100% del convenio.

2.2. Seguimiento al avance financiero contrato de obra

Durante el periodo reportado, se giraron recursos para gastos de legalización, administración y a proveedores, se ejecutaron actividades relacionadas con ajustes, diseños previos y limpieza de alcantarillas, en la tabla a continuación se presenta el resumen de gastos del contratista:

Tabla 2-3. Gastos financieros JAC VEREDA PEREIRA en el convenio 3619 de 2023

No.	PROVEEDOR (RAZÓN SOCIAL) / PERSONAL	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL
1	PÓLIZAS LEGALIZACIÓN CONTATO - HOME CENTER EPP JAC PEREIRA- ALFREDO BAQUERO	$ 2.545.504,00	$ -	$ 2.545.504,00
2	GEOREFERENCIACIÓN DE MOJONES Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO LUIS RAFAEL ALARCON PANTOJA	$ 2.193.000,00	$ -	$ 2.193.000,00
3	LABORATORIO DE SUELOS, DISEÑO DE CONCRETO, PROCTOR ANTONIO GARCIA MENDOZA	$ 1.377.500,00	$ -	$ 1.377.500,00
4	ANTICIPO DEL 70% DE DISEÑO GEOMETRICO OSCAR ALBERTO LOPEZ NUÑEZ	$ 3.150.000,00	$ -	$ 3.150.000,00
5	PAGO DE SALARIOS, MAQUINAS Y ROCERÍA JAC PEREIRA- ALFREDO BAQUERO	$ 1.536.492,00	$ -	$ 1.536.492,00
6	CAJA MENOR JAC-PEREIRA ALFREDO BAQUERO	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00
7	IMPRESIÓN BANNER 3X2, VALLA CONVENIO, HAROLD MARTINEZ	$ 297.000,00	$ -	$ 297.000,00
8	COMPRA DE SUBBASE ALFREDO DECKERS	$ 5.720.000,00	$ -	$ 5.720.000,00

	ROLDAAN-CANTERA CALYMAN			
9	TRANSPORTE DE SUBBASE ALEXI TORRADO ARDILA	$ 1.100.000,00	$ -	$ 1.100.000,00
10	CEMENTO, HIERRO, FORMALETA, TROMPO SANDRA INES GUEVARA CONTRERAS	$ 69.397.129,00	$ -	$ 69.397.129,00
11	SALDO SUBBASE Y PAGO TRITURADO CANETRA CALYMAN Y/O ALFREDO DECKERS ROLDAN	$ 7.001.874,00	$ -	$ 7.001.874,00
12	P.S ING RESIDENTE MES ENERO 2024 RUBIEL ALEXANDER ARIZA	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00
13	TRANSPORTE DE CARGA DICIEMBRE DE 2023 Y ENERO 2023 JAC PEREIRA ALFREDO BAQUERO	$ 792.000,00	$ -	$ 792.000,00
14	P.S CONTADOR MES ENERO 2023 LEWIS FRANSISCO CALDERON	$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00
15	PAGO DE NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES JAC PEREIRA ALFREDO BAQUERO	$ 3.657.371,00	$ -	$ 3.657.371,00
18	COMPRA DE PIEDRA POR 8M3 EDWUN ENRIQUE JIMENEZ ROJAS	$ 456.000,00	$ -	$ 456.000,00
19	TRANSPORTE DE 16 M3 DE ARENA Y SUBBASE 24 M3 ARLEY RAMIREZ BAYONA	$ 1.460.250,00	$ -	$ 1.460.250,00
	TOTAL	$ 105.284.120,00	$ -	$ 105.284.120,00

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

Hasta la fecha de acuerdo con las actividades ejecutadas, se tiene un avance financiero de acuerdo con el presupuesto del 100%. En la tabla a continuación, se aprecian los porcentajes de avance a corte del presente informe:

Tabla 2-4. Relación de avance del Contrato de Obra del mes de abril

Detalle a 30 de abril de 2024	Valor	%
Avance global	**$146.573.464,97**	100%

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.3. Seguimiento al avance financiero contrato de interventoría

De acuerdo con lo estipulado en el contrato suscrito, el avance de la interventoría se encuentra condicionado al avance del contrato de obra. A continuación, se relaciona lo facturado durante el periodo del presente informe:

Tabla 2-5. Relación de avance financiero contrato de interventoría

No	Concepto	Total, dedicación recurso (Hombre-mes)	Valor Total	Dedicación Recurso utilizado (Hombre-mes)	Valor	Dedicación recurso utilizado ACUMULADO (Hombre-mes)	VALOR ACUMULADO
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
1	Director de interventoría	0,4	$ 2.320.000	0,2	$ 1.160.000	0,2	$ 1.160.000
2	Ingeniero Residente	2,00	$ 5.200.000	0,6	$1.560.000	0,6	$1.560.000
3	Profesional Ambiental	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
4	Profesional Social	0,2	$560.000	0,1	$280.000	0,1	$280.000
5	MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS		$3.328.000	GL	$2.500.000	GL	$2.500.000
	PERSONAL TECNICO						
6	Inspector	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
7	Inspector SST	1,0	$1.200.000	0,6	$720.000	0,6	$720.000
				SUBTOTAL COSTOS DEL PERSONAL			**$7.220.000**
				FACTOR MULTIPLICADOR			**1.80**
				TOTAL COSTOS DEL PERSONAL			**$ 12.996.000**
	OTROS COSTOS DIRECTOS						
8	Viáticos Director y/o Especialistas	5	$700.000	2	$280.000	2	$280.000
9	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	7	$4.200.000	1,2	$720.000	1,2	$720.000

10	Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte)	1,5	$2.550.000	1	$1.700.000	1	$1.700.000
11	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	3	$ 1.773.222	1	$591.074	1	$591.074
12	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	3	$1.500.000	1	$500.000	1	$500.000
13	Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	2	$400.000	1	$200.000	1	$200.000
14	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	3	$120.000	1	$40.000	1	$40.000
15	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	3	$111.000	1	$37.000	1	$37.000
16	Veeduría Técnica Comunitaria	3	$115.500	1	$38.500	1	$38.500
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS			**$4.106.574**
				SUBTOTAL COSTOS BASICOS			**$17.102.574**
				IVA 19%			**$3.249.489,06**
				COSTO TOTAL			**$20.352.063,06**

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

2.4. Informes semanales

Durante el periodo reportado se construyeron 04 informes semanales tal como se indican en la tabla a continuación:

Tabla 2-5. Informes semanales elaborados por interventoría

Informes	Periodo
Informe semanal No. 19	Del 01 abril al 07 de abril del 2024
Informe semanal No. 20	Del 08 al 14 de abril del 2024
Informe semanal No. 21	Del 15 al 21 de marzo de 2024
Informe semanal No. 22	Del 22 al 30 de abril de 2024

Fuente: GER & PRO SAS, 2024

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO


3.1. Seguimiento Gestión Social

Por parte del profesional social, esta interventoría ha realizado visitas y actas de socialización con la comunidad beneficiada del proyecto a ejecutar, conformación de comité de participación comunitaria y ficha de caracterización socioeconómica.

3.1. Seguimiento Gestión Ambiental

Esta interventoría solicitó al contratista la elaboración del PAGA de acuerdo con el Manual De Interventoría Obra Pública del 2022, Instructivo Para El Seguimiento De La Gestión Ambiental. Durante el mes de marzo inicio la ejecución del PAGA por parte del contratista.

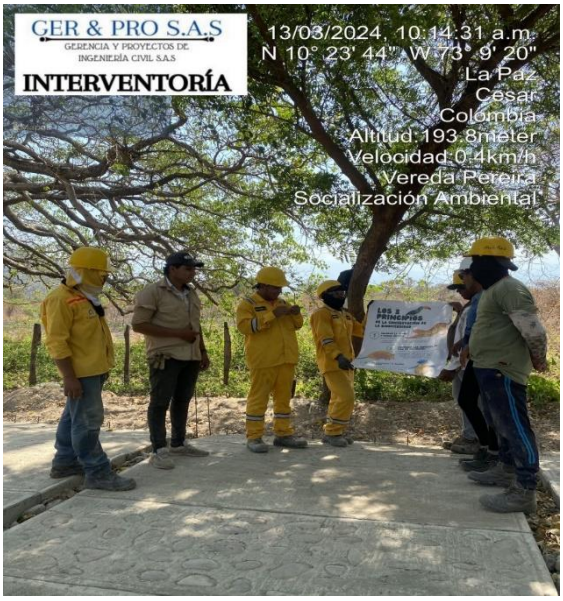Tabla 0-6 Imágenes de ejecución de PAGA

Fuente: GER & PRO SAS.2024

4. SEGUIMIENTO DE POLIZAS DEL PROYECTO

4.1. Relación de pólizas convenio de obra

La Garantía que ampara el contrato de obra es la Póliza No. CRC-100015288, expedida por la Aseguradora Seguros mundial., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio del mismo):

Tabla 4-1: Póliza según firma del Convenio de obra

Póliza No.	**CRC-100015288**	
Aseguradora:	**Seguros mundiales**	
Fecha de Expedición:	**10/10/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento	Desde 03/10/2023 hasta 31/10/2024	$39.981.909,60
Prestaciones sociales	Desde 03/10/2023 hasta 31/12/2026	$9.995.477,40
Estabilidad de la obra	Desde 31/12/2023 hasta 31/12/2028	$59.972.864,40

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

En el anexo 1 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de las mismas.

4.2. Relación de pólizas contrato de interventoría

La Garantía que ampara el contrato de interventoría es la Póliza No. 47-44-101025519, expedida por la Aseguradora Seguros del Estado S.A., a continuación, se presentan los detalles de esta para los dos movimientos que ha tenido el contrato (firma y acta de inicio de este:

Tabla 4-2. Póliza según firma del contrato de interventoría

Póliza No.	**47-44-101025519**	
Aseguradora:	**Seguros del estado S.A**	
echa de Expedición:	**21/11/2023**	
Fecha de Aprobación:		
Amparo	**Vigencia**	**Valor Asegurado**
Cumplimiento del contrato	14/11/2023 a 30/06/2024	$5.881.946,50
Pago de salarios y prestaciones sociales	14/11/2023 a 31/12/2026	$11.763.893,00
Calidad del servicio	14/11/2023 a 31/12/2024	$17.645.839,50

Fuente: GER & PRO SAS, 2023

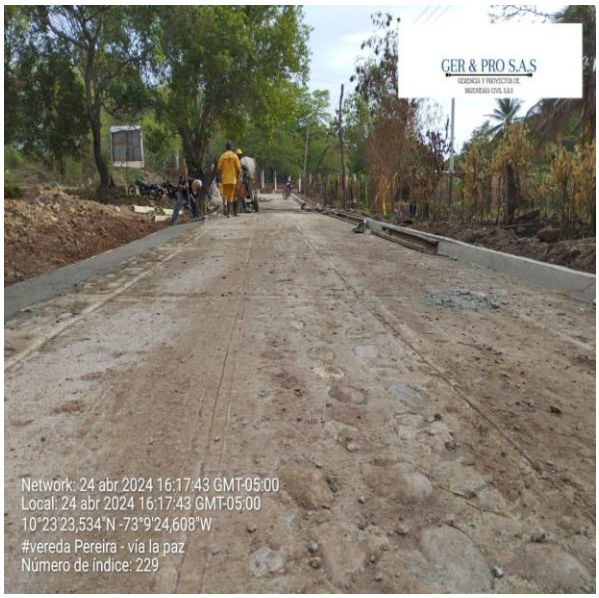
En el anexo 2 se presentan las pólizas aquí indicadas, así como la aprobación de estas.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO









6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Trascurrido el periodo contractual a corte 30 de abril del 2024, esta interventoría recomienda lo siguiente:

- Todos los demás documentos que el interventor solicite.
- Entrega total de los tramos establecidos en el convenio de la placa huella.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 6/04/2024 (Dia / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 19 del 1-abr al 7-abr — Último Informe Semanal

(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

81 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS TIPO II

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda PEREIRA CTO VARAS BLANCAS, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Pereira, vía al municipio de Manaure. y punto de referencia final el PR2+450 ubicado en la vereda Pereira, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

CONVENIO No. 3619 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 199.909.548,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria

CONTRATO No. 4383 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 58.819.465,00

FECHA DE INICIO: 28-nov-23 — VALOR ADICIONES: $ 24.837.680,00

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31-dic-23 — VALOR ACUMULADO: $ 83.657.145,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30-abr-24 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 199.909.548		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100.918.499		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 98.991.049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.352.063	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 38.467.402	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 198.134.528,97	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 117.631.655,56	80,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 104.567.394,19	71,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (13.064.261,37)	-8,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 40.045.836,09	20,20%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 155.017.832,21	78,24%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 144.613.230,28	72,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10.404.601,93)	-5,25%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.674.060,44	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.396.945,26	2,72%

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Pereira, corregimiento de Varas Blancas La Paz - Cesar, ha adelantado labores en el periodo reportado, tales como:
-Fundida de vigas riostras de la placa huella.
-Inicio de replaneto y ubicacion de rieles para la placa huella.
NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$126,414,344,62** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervición de labores de fundida de vigas riostras de la placa huella.
- Supervicion de replanteo y ubicacion de rieles para la placa huella.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 80,25% Avance o Atraso Físico % -8,91%

Meta Física Ejecutada % 71,34%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)		
Descripción de la Meta Física Contractual	**Unidad**	**Cantidad**
* Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,44
* Excavacaion varias sin clasificar	m3	4,3194
* Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	105,09
* Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4882,46
* Concreto ciclopeo resistencia 14Mpa	m3	46,26
* Sub base granular	m3	107,1

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	**Tramo y/o sector 1**	**Tramo y/o sector 2**	**Tramo y/o sector (n)**	**Total**	**%**
Prog	1,44			1,44	100%
Ejec	1,44			1,44	100%
Prog	4,3194			4,3194	100%
Ejec	2,16			2,159712	50,0%
Prog	105,09			86,19	100%
Ejec	66,63			66,63	77,3%
Prog	4882,46			4882,46	100%
Ejec	3437,56			3437,56	70,4%
Prog	46,2600			46,2600	100%
Ejec	31,97			31,9734	69%
Prog	107,1			107,1	100%
Ejec	107,1			107,1	100%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro de concreto	1	1
Mezcladora tipo Trompo In situ	1	1
	2	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA VEREDA PEREIRA TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CANTERA CALYMAN, VÍA MANAURE	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
1. El contratista realizó adquisición de material de sub base necesaria para el desarrollo de la obra.
2, El contratista adquirió agregados grueso y agregado fino.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE EJECUCION

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	6
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1.Sub-base para compactacion de terreno.
2.Fundida de viga riostras.
3.Fundida de cuneta.
4.Replanteo para ubicación de rieles para la fundida de placa huella.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.Sub-base para compactacion de terreno.
2.Refuerzo de placa huella.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
80,25%	71,34%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vigas riostras placa huella vereda Pereira



Placa huella Pereira



Replanteo de terreno para placa huella vereda Pereira

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA: 1. Control de calidad de concreto en obra. 2. Recomendaciones técnicas en el seguimiento continuo de la obra y calidad de la misma. 3. Seguimiento a labores de fundida.	FIRMA NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 12/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 20 del 8-abr al 14-abr Último Informe Semanal (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

81 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS TIPO II

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda PEREIRA CTO VARAS BLANCAS, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Pereira, vía al municipio de Manaure. y punto de referencia final el PR2+450 ubicado en la vereda Pereira, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

CONVENIO No.	3619 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.909.548,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 199.909.548		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100.918.499		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 98.991.049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.352.063	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 38.467.402	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 171.451.065,90	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 127.278.925,36	86,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 124.235.665,54	84,76%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.043.259,82)	-2,08%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 40.072.626,73	20,21%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 178.786.408,09	90,23%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.308.292,27	82,93%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.478.115,82)	-7,31%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.674.060,44	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.695.061,99	9,94%

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Pereira, corregimiento de Varas Blancas La Paz - Cesar, ha adelantado labores en el periodo reportado, tales como:
-Terminacion total del tramo 2 de placa huella.
-IFundida de placa de concreto reforzado en le tramo 2.
NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$164.308.292,27** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
- Supervicion de fundida de bordillos del tramo 1.
-Supervicion de fundida del tramo 2 de placa huella.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 86,84%
Meta Física Ejecutada %: 84,76%
Avance o Atraso Físico %: -2,08%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra)			
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,44
*	Excavacaion varias sin clasificar	m3	4,3194
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	105,09
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4882,46
*	Concreto ciclopeo resistencia 14Mpa	m3	46,26
*	Sub base granular	m3	152,13

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,44			1,44	100%
Ejec	1,44			1,44	100%
Prog	4,32			4,3194	100%
Ejec	2,16			2,159712	50,0%
Prog	105,09			105,09	100%
Ejec	83,67	3,24		86,91	82,7%
Prog	4882,46			4882,46	100%
Ejec	3855,31	140,45		3995,76	81,8%
Prog	46,2600			46,2600	100%
Ejec	31,97			31,9734	69%
Prog	152,13			152,13	100%
Ejec	152,1			152,13	100%

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro de concreto	1	1
	1	1

TRAMO	Placa huella ejecutada	Placa huella ejecutada acumulada	%	observaciones
1	126,22	126,22	100,00%	LA PLACA HUELLA COMPLETA
2	24 ml(linea izquierda de la huella de la placa huella)	24 ml	24%	LINEA IZQUIERDA DE LA PLACA HUELLA

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA VEREDA PEREIRA
TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	CANTERA CALYMAN, VÍA MANAURE	PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:
1. El contratista realizó adquisición de material de sub base necesaria para el desarrollo de la obra.
2, El contratista adquirió agregados grueso y agregado fino.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesaitos para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE EJECUCION

OBSERVACIONES: Este item del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	SEXO	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	6	F	M
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4			4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1.Sub-base para compactacion de terreno.
2.Refuerzo de placa huella.
3.Entrega total de tramo 1 de la placa huella.
4.Fundida de bordillos del tramo 1.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.fundida de placas de concreto reforzado de la placa huella del tramo 2
2.Refuerzo de placa huella del tramo 2.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
86,84%	84,76%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vereda Pereira tramo 1 completado



Vereda Pereira tramo 1 completado



Ubicación de formaletas de tramo 1 placa huella.



Fundida de placa del tramo 2



Inauguracion de entrega de placa huella tramo 1

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:
1. Control de calidad de concreto en obra.
2. Recomendaciones técnicas en el seguimiento continuo de la obra y calidad de la misma.
3.Solo se trabajo dos dias esta semana, ya que empezo la semana santa.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 17/04/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR — SEMANA No.: 21 del 15-abr al 21-abr (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: OMAR GÓMEZ NAVIA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: PEDRO JOSÉ BARÓN ÁVILA

OBJETO CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

81 ML DE PLACA HUELLA Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS TIPO II

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de La Paz del departamento del Cesar, en la vereda PEREIRA CTO VARAS BLANCAS, teniendo como punto de referencia inicial en el PR0+000 en el acceso a la Vereda Pereira, vía al municipio de Manaure. y punto de referencia final el PR2+450 ubicado en la vereda Pereira, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Cesar del INVIAS. El alcance de proyecto consiste en realizar la revisión e implementación del contenido de la cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías, mantenimiento rutinario mediante actividades de rocería, limpieza de obras de drenaje, remoción de derrumbes menores, entre otras y mejoramiento con la construcción de obras de drenaje y/o placa huella y/o construcción de obras de contención de baja complejidad en los sectores priorizados. El OAC deberá gestionar y tramitar los aspectos prediales, sociales y ambientales que apliquen y que den cumplimiento a la normatividad vigente.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

CONVENIO No.	3619 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 199.909.548,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S

INTEGRANTES: Representante Legal: Ing. Jose David Doria

CONTRATO No.	4383 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 58.819.465,00
FECHA DE INICIO:	28-nov-23	VALOR ADICIONES:	$ 24.837.680,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31-dic-23	VALOR ACUMULADO:	$ 83.657.145,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30-abr-24	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 199.909.548		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ 100.918.499		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.909.548	$ 98.991.049		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 58.819.465	$ 58.819.465		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 20.352.063	$ 20.352.063		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 38.467.402	$ 38.467.402		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 171.451.065,90	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 136.926.195,17	93,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 126.963.116,65	86,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (9.963.078,51)	-6,80%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 40.072.626,73	20,22%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 188.460.468,53	95,12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 167.035.743,38	84,30%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (21.424.725,15)	-10,81%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 9.674.060,44	4,88%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.727.451,11	1,38%

Observaciones:
Hasta el momento, el contratista de obra en adelanta JAC Vereda Pereira, corregimiento de Varas Blancas La Paz - Cesar, ha adelantado labores en el periodo reportado, tales como:
-Fundida de concreto ciclopeo tramo 2
-IFundida de placa de concreto reforzado tramo 2.
NOTA: EL VALOR REPORTADO EN LA CELDA "**EJECUTADO DE LA VIGENCIA**" DE **$164.308.292,27** CORRESPONDE AL VALOR TOTAL GIRADO AL CONTRATISTA, POR CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, SUMINISTRO, COMPRA DE MATERIALES Y COSTOS DE OBRA.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.409.732,50	100
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 19.606.488,32	66,67
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.450.811,04	8,33

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO: DICIEMBRE

VALOR FACTURA: $ 10.176.031,53

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
A la fecha, la interventoría ha realizado las siguientes actividades:
-Supervicion de fundida del tramo 2 de placa huella.

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 93,42%
Meta Física Ejecutada %: 86,62%
Avance o Atraso Físico %: -6,80%

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas	Ha	1,44
*	Excavacaion varias sin clasificar	m3	4,3194
*	Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ	m3	105,09
*	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	4882,46
*	Concreto ciclopeo resistencia 14Mpa	m3	46,26
*	Sub base granular	m3	152,13

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog	1,44			1,44	100%
Ejec	1,44			1,44	100%
Prog	4,32			4,3194	100%
Ejec	2,16			2,159712	50,0%
Prog	105,09			105,09	100%
Ejec	83,67	4,86		88,53	84,2%
Prog	4882,46			4882,46	100%
Ejec	3855,31	305,09		4160,40	85,2%
Prog	46,2600			46,2600	100%
Ejec	31,97	1,22		31,9734	69%
Prog	152,13			152,13	100%
Ejec	152,1			152,13	100%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibro de concreto	1	1
	1	1

TRAMO	Placa huella ejecutada	Placa huella ejecutada acumulada	%	observaciones
1	126,22	126,22	100,00%	LA PLACA HUELLA COMPLETA
2	36 ml(linea izquierda de la huella de la placa huella) y 18 ml concreto ciclopeo (linea 1).	36 ml	36%	LINEA IZQUIERDA DE LA PLACA HUELLA

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: VÍA VEREDA PEREIRA
TRAMO Y/O SECTOR 2: VIA VEREDA PEREIRA
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CANTERA CALYMAN, VÍA MANAURE	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:
1. El contratista realizó adquisición de material de sub base necesaria para el desarrollo de la obra.
2, El contratista adquirió agregados grueso y agregado fino.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A	X
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A	X
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO		N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	X

OBSERVACIONES: El contrato no amerita permisos ambientales especiales, salvo los que debe de tener las empresas que suministrarán los materiales necesarios para la ejecución de las obras de placa huella y obras hidráulicas.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN PROCESO DE EJECUCION

OBSERVACIONES: Este ítem del presupuesto se encuentra en proceso de contratación con profesional especializado por parte de la JAC.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER	SEXO	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	6	F	M
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	6	4	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4			4
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		-		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 12

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


1.fundida de placas de concreto reforzado de la placa huella del tramo 2
2.Refuerzo de placa huella del tramo 2.
3.Fundida de concreto ciclopeo tramo 2.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

1.fundida de placas de concreto reforzado de la placa huella del tramo 2
2.Fundida de concreto ciclopeo tramo 2.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

PROGRAMADO	EJECUTADO
93,42%	86,62%



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



Vereda Pereira tramo 2



Vereda Pereira tramo 2 ubicación de formaletas.



Vereda Pereira tramo 2

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORÍA:
1. Control de calidad de concreto en obra.
2. Recomendaciones técnicas en el seguimiento continuo de la obra y calidad de la misma.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: OMAR PERALTA CARRILLO

Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA 5/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-24 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	MANUEL ALFONSO VALDES GÓMEZ	9176280	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 75.400	V	ASMET SALUD EPS	743531527	$ 135.417	PORVENIR	743531527	$ 173.333	$ 43.333				
2	LUIS JOSE GARCÍA	77040154	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					jac de la vereda pereira cto	$ 2.320.000	$ 139.942	V	NUEVA EPS	743531528	$ 351.333	PORVENIR	743531528	$ 321.707	$ 80.427				
3	SAMIR BARRETO GOMEZ	1082375637	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 75.400	V	COOSALUD	743531532	$ 135.417	PORVENIR	743531532	$ 173.333	$ 43.333				
4	LUIS LABERTO MADRID	1050840203	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 75.400	V	COOSALUD	743531529	$ 135.417	PORVENIR	743531529	$ 173.333	$ 43.333				
5	LUIS MANUEL CARBALLO ORTIZ	1046872054	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 78.416	V	NUEVA EPS	743531535	$ 140.833	PORVENIR	743531535	$ 180.267	$ 45.067				
6	JONATAN MAURICIO GARCIA MORALES	1066478201	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X																								jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 18.096	V	COOSALUD	743531537	$ 32.500	PORVENIR	743531537	$ 41.600	$ 10.400				
7	DEYVIS SAMIR MARTINEZ TERAN	1067811045	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 75.400	V	NUEVA EPS	743531530	$ 135.417	PORVENIR	743531530	$ 173.333	$ 43.333				
8	CESAR JAVIER MARTINEZ TERAN	1067811044	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X																								jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 18.096	V	NUEVA EPS	743531533	$ 32.500	PORVENIR	743531533	$ 41.600	$ 10.400				
9	CAMILO ANDRES CARDENAS PEREZ	1067592041	OBRERO	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						jac de la vereda pereira cto	$ 1.300.000	$ 75.400	V	COOSALUD	743531534	$ 135.417	PORVENIR	742924595	$ 173.333	$ 43.333				

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA (Disponibilidad del personal requerido):

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.

2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".

3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.

4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.

5. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado para la ejecución de actividades, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.

6. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.

7. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: RUBIEL ALEXANDER ARIZA ALI
Ingeniero Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0820253015 ATL

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 26/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No: 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DEL 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GER & PRO S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: RUBIEL ALEXANDER ARIZA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 0820253015 ATL

Firma
Nombre: DIANA CAROLINA POLO BRITO
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 20202-394329 CES

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA	31	3	2024
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 28/11/2023

PLAZO INICIAL: 3 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 199.909.548,00

VALOR ACUMULADO: $ -
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA Y PROYECTO DE INGENIERIA CIVIL SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	17%	$ 39.981.906,60	3	10	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	4,98%	$ 9.955.477,40	3	10	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 59.972.864,40	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100015288

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	3	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE CRC-100004710 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 39.981.909,60	30	12	2023	2/03/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 9.995.477,40	30	12	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 59.972.864,40	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CRC-100015288

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	3	10	2023	30	4	2024
Otros		$ 260.000.000,00	3	10	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CRC-100004710 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3619 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Presentación de informes mensuales del mes de diciembre, enero, febrero y marzo de 2024: El contratista NO PRESENTA a la fecha dichos informes para revisión y aprobación por parte de la interventoría.
2. Presentación de nuevo alcance

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra.
2. Recomendaciones técnicas de la interventoría al OAC en los avances de la ejecución de las obras.
3. Presentación de informes mensuales atrasados.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 80:35 am del día 10 de abril del año 2024, se da inicio al comité de obra, abordando los siguientes temas:

1. El contratista de obra adelanta labores de fundida de concreto reforzado y concreto ciclópeo en elementos como: placas de 0,9 m de ancho (huellas), placas de 0,9 y 0,45 m de ancho de ciclópeo, así como funduda de bermacuenta de 0,7 m de ancho.
2. Se destaca la culminación en un 100% del primer tramo con la construcción de 126,22 ml de placa huella.
3. Se evidencia avances de fundida de concreto reforzado en el sugundo tramo a intervenir (entrada que conecta con la vía que vade La Paz a Manaure).
4. El interventor entrega instrucciones precisas que tienen que ver con actividades de limpieza y adecuación final del primer tramo, dada la visita e inaguración por parte del Señor Ministro de Transporte William Camargo Triana, Dirección territorial de Invias por parte de la Ing. Onna Zuleta, equipo de colaboradores e interventoría el día 11 de abril del año en curso.
5. Se tratan temas asociados al uso adecuado de EPP por parte de los trabajadores de la obra y la importancia de realizar una buena presentación del personal el día de la inaguración.
6. El interventor realiza recomendaciones y plantea la necesidad de mejorar los rendimientos de la obra, a fin de alcanzar los tiempos estipulados para culminar la obra.
7. Es importante resaltar que mediante la modificación aprobada en comité operativo en la que se deja estipulado que la no construcción de alcantarilla, los recursos se están ejecutando en la construcción de 50 ml más de placa huella en el sector dos (02) (entrada que conecta con la vía que va de La Paz a Manaure).

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega total de la obra, incluyendo tramo 2	miércoles, 24 de abril de 2024	OAC Pereira
Entrega de informes mensuales de obra	martes, 30 de abril de 2024	OAC Pereira

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:





1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	10/04/2024 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OMAR PERALTA CARRILLO	DIR. INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ	RL INTERVENORÍA	GER & PRO SAS	
DIANA POLO BRITO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
HÉCTOR PAVA MORALES	INSPECTOR	GER & PRO SAS	
ALFREDO BAQUERO GÓMEZ	PRESIDENTE OAC	OAC PEREIRA	
RUBIEL ARIZA ALI	ING. RESIDENTE OAC	OAC PEREIRA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 30-abr **PROYECTO:** PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** GER & PRO S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 3619 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AUTOMOVIL KIA	MBV363 CILINDRAJE 1600	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															
No Aplica	No aplica																															

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 30/04/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: OMAR PERALTA CARRILLO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 820247167 ATL

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/03/2024 (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL 2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No.: 3827-2023; 3619-2023 **CONTRATISTA:** OAC SABANA ALTA; OAC PEREIRA (MUNICIPIO DE LA PAZ)

NOMBRE ARL: AXA COLPATRIA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACESAR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	OMAR PERALTA CARRILLO	77.019.867	Director Interventoría	$ 5.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,2	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 80.800	V	SANITAS	9463842205	$ 46.400	PROTECCION	9463842205	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
2	JOSE DAVID DORIA HERNÁNDEZ	7.383.389	Representante Legal	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 80.800	V	DUSAKAWI	9463842205	$ 46.400	COLPENSIONES	9463842205	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
3	CAMILA ANDREA MAESTRE ARIAS	1.065.830.598	Profesional Ambiental	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,1	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 80.800	V	DUSAKAWI	9463842205	$ 46.400	COLPENSIONES	9463842205	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
4	DIANA POLO BRITO	1.001.851.828	Ing. Residente Interventoría	$ 2.600.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	GER&PRO SAS	$ 2.600.000,00	$ 108.600	V	DUSAKAWI	9463842205	$ 62.400	COLPENSIONES	9463842205	$ 249.600	$ 62.400	$ -	$ -	
5	MARIA TERESA RUMBO AYALA	1.065.830.672	Profesional Social	$ 2.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,1	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 80.800	V	DUSAKAWI	9463842205	$ 46.400	PROTECCIÓN	9463842205	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
6	HECTOR ANTONIO PAVA MORALES	1.065.654.021	Inspector	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 80.800	V	NUEVA EPS	9463842205	$ 46.400	COLPENSIONES	9463842205	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
7	CARLOS EDUARDO CASTILLA FUENTES	1.010.151.400	Inspector SST	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1	GER&PRO SAS	$ 1.300.000,00	$ 80.800	V	SALUD TOTAL	9463842205	$ 46.400	COLFONDOS	9463842205	$ 185.600	$ 46.400	$ -	$ -	
8																				
9																				
10																				
N																				
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 17.900.000**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 15/03/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (X) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **OMAR PERALTA CARILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820247167 ATL

Firma
Nombre: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **19202-099210 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CESAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4383-2023 **INTERVENTOR:** GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 'ABRIL2024 **PROYECTO:** INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE OBRA No: 3827-2023; 3619-2023 **CONTRATISTA:** OAC SABANA ALTA; OAC PEREIRA (MUNICIPIO DE LA PAZ)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	**1342223**	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	**10**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 58.819.465**	**$ 21.601.532**
	1342223	**C-2402-0600-14-0-2402041-02**	**10**	**Nación**	CONTRATO PRINCIPAL	**$ 24.837.680**	**$ 24.837.680**
			TOTAL			**$ 83.657.145**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 83.657.145**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**NOVIEMBRE / 2023**	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**1342223 de 2023-12-07**	**$ 58.819.465**	**$ 83.657.145**		ACTA 1.
2	**DICIEMBRE / 2023**	$ 17.102.574,00	$ 3.249.489,06	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	**$ 20.352.063,06**	**$ -**	**1342223 de 2023-12-07**	**$ 38.467.401,94**	**$ 63.305.081,94**		ACTA 2.
3	**ENERO / 2024**	$ 14.173.000,00	$ 2.692.870,00	**$ 16.865.870,00**	**$ -**	**$ 16.865.870**	**$ -**	**1342223 de 2023-12-07**	**$ 21.601.531,94**	**$ 46.439.211,94**		ACTA 3
4	**FEBRERO / 2024**	$ 15.414.074,00	$ 2.928.674,06	**$ 18.342.748,06**	**$ -**	**$ 18.342.748**	**$ -**	**1342223 de 2023-12-07**	**$ 3.258.783,88**	**$ 28.096.463,88**		ACTA 4
5	**MARZO / 2024**	$ 13.947.074,00	$ 2.649.944,06	**$ 16.597.018,06**	**$ -**	**$ 16.597.018**	**$ -**	**1342223 de 2023-12-07**	**$ 11.499.445,82**	**$ 11.499.445,82**		ACTA 5
6	**ABRIL / 2024**	$ 9.663.400,00	$ 1.836.045,82	**$ 11.499.445,82**	**$ -**	**$ 11.499.445,8**	**$ -**	**1342223 de2023-12-07**	**-$ 0,00**	**$ -**		ACTA 6 FINAL
	TOTALES	**$ 70.300.122**	**$ 13.357.023,00**	**$ 83.657.145,00**		**$ 83.657.145,00**			**-$ 0,00**	**$ -**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
INTERVENTORIA CONVENIOS 3827-2023; 3619-2023	**$ 70.300.122**	**$ 13.357.023,00**	**$ 83.657.145,00**
+			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **OMAR PERALTA CARRILLO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: **0820247167 ATL**

Firma
Nombre: **OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-099210 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S	NIT: 900.764.117-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MZ F CASA NRO. 4 - 1	VALLEDUPAR, CESAR	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	NIT: 800.215.807-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
AVENIDA BENETRIO MENDOZA	CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	3770600

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. 4383 DE 2023, QUE TIENE COMO OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS, SUSCRITO ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ROBLES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL].

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/11/2023	31/10/2024	$8,365,714.50	$5,881,946.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	14/11/2023	30/04/2027	$16,731,429.00	$11,763,893.00
CALIDAD DEL SERVICIO	14/11/2023	30/04/2025	$25,097,143.50	$17,645,839.50

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA EL VALOR Y LA VIGENCIA DE LA POLIZA CITADA ARRIBA SEGUN:
ADICIONAL No 1 Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO N 4383 de 2023
VALOR ADICIONAL No 1: $ (24.837.680.00) INCLUIDO IVA
PLAZO PRORROGA No 1: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS PERNANECEN IGUALES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,932.00	$ *******8,000.00	$ ******13,097.00	$ **********82,030.00	$ *******50,194,287.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
NELLYS MARIA MESTRE IZQUIERDO	143346	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-44-101025519	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
29	12	2023	14	11	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERA CIVIL S.A.S		**NIT: 900.764.117-6**
DIRECCIÓN: MZ F CASA NRO. 4 - 1	**CIUDAD:** VALLEDUPAR, CESAR	**TELÉFONO:**	3103699755

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		**NIT: 800.215.807-2**
DIRECCIÓN: AVENIDA BENETRIO MENDOZA	**CIUDAD:** CUCUTA, NORTE DE SANTANDER	**TELÉFONO:**	3770600

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5858302 - VALLEDUPAR

47-44-101025519

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

01- ABRIL-2024.

Vereda Perrito, Corregimiento de Vegas Blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista Jair Perrito.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fueron fundida de placa huella.

Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado

Recibido

Dicsia Polo
Res Interventoria

02-Abril-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Veras blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas fueron fundida de placa huella de la placa huella.

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Dia pala.
Res Obra. Res. Interventoria.

03-Abril-2024.


Vereda Pereira, Corregimiento Veras blancas, municipio de la paz Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria. Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron fundicion de la placa huella. Hasta el momento se lleva fundida 21 vigas maestras y al final del dia se logró fundir el total de todo la linea de la placa.

Personal en obra: Res. Obra.
Res. Interventoria.
Maestro.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Res Obra.

Dicna polo.

Res Interventoria.

04 Abril-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Veras blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.

Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron replanteo y ubicacion de los ejes en el tramo 2 construccion de la placa-huella.


Personal en obra: Res obra.

Res. Interventoria.

Maestro.

Inspector ssr Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.



Res Obra

Dicna Polo.

Res. Interventoria

05- Abril- 2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Veras blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.

Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron ubicacion de rieles y formaletas para la fundida de la placa huella tramo 2

Personal en obra. Res obra.
Res Interventoria
Maestro.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado

Res Obra
Diana Pola.
Res. Interventoria.

06-Abril-2024.

Vereda Perrera, Corregimiento de Vegas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista INC Perrera.
Interventoria Gerencia y Proyectos de Ingenieria Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron ubicacion de los ejes en el tramo 2 para la placa huella.

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventoria.
maestro.
Ing. Jose David Daza.
Ing. Omar Peralta.
Inspector SST Carlos Castilla.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra
Diana Pola.
Res. Interventoria.

07-Abril-2024.

Vereda Perrera, Corregimiento de vegas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista IAC Pereira.
Interventoría Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: No se realizó ninguna actividad

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.

Res. obra

Diana Polo
Res. Interventoría.

08-Abril-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Veras blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista IAC Pereira.
Interventoría. Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS

Desarrollo: las actividades realizadas fueron fundida de 8 placas de concreto reforzado del tramo 2.

Personal en obra: Res. obra.
Res. Interventoría.
Inspector SST Carlos Castilla.
Inspector obra: Edgar Pava.

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.

Res. Obra

Diana Polo
Res. Interventoría

04 Abril - 2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Veras blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista IAC Pereira.
Interventoría Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el día fueron ubicación de ripio en los bordillos del tramo 1 de la placa huella para luego fundir.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra

Dicna pdo.

Res. Interventoria.

10-Abril-2024

Vereda Perrira, Corregimiento Vacas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.

Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas durante el dia fueron fundida de bordillos del tramo 1 de la placa-huella.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra.

Dicna pdo.

Re. Interventoria.

11-Abril-2024.

Vereda Perrira, Corregimiento Vacas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista: JAC Perrira.

Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: Durante el dia dio apertura a la entrega completa del tramo 1 totalmente terminado con cunetas y bordillos, acto que contó con la presencia de los directivos INVIAS Regional, Gobernadora

del Cesar, Ministro de transporte, Contratista y demas Personal que hacen parte del proyecto.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

Res. Obra — Diana Polo. Res Interventora.

12-Abril-2022.

Vereda Pereira, Corregimiento Varas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventora Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron replanteo y ubicacion de la formaletas del tramo 2 de la placa huella.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

Res. Obra — Diana Polo. Res Interventora.

13-Abril-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Varas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventora. Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas fueron fundida de concreto reforzado de la placa huella tramo 2

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra Diana Polo
Res. Interventora.

14-Abril-2024

Vereda Pereira, Corregimiento Veras Blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventora. Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el día fueron ninguna. (día domingo)

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.

Res Obra Diana Polo.
Res. Interventora.

15-Abril-2024

Vereda Pereira, Corregimiento Veras Blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventora. Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron ubicación de moldes y formaletas para la fundida de concreto ciclópeo y reforzado de la placa huella.

Condiciones climáticas: Día soleado y despejado.

Res. Obra Diana Polo.
Res. Interventora.

16-Abril-2024

Vereda Pereira, Corregimiento Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron fundida de 11 placas de concreto ciclopeo de la placa huella.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Diana Polo.
Res Obra Res. Interventoria

17-Abril-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas durante el dia fueron fundida de 6 placas de concreto ciclopeo y y de reforzado de la placa huella tramo 2.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.
Diana Polo.
Res. Obra. Res. Interventoria

18-Abril-2024.

Vereda Pereira, Corregimiento de Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Pereira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniería Civil SAS.

Desarrollo: las actividades desarrolladas fueron fundida de placa cuneta y ciclopeo de la placa huella tramo 2.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra. Dicaci Polo. Res. Interventoria.

19-Abril-2024.

Vereda Perrira, Corregimiento Varas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.
Interventoria. Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron fundida de placa huella y bordillo del tramo 2.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res. Obra. Res. Interventoria.

20-Abril-2024.

Vereda Perrira, Corregimiento de Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron fundida de placa concreto ciclopeo de la placa huella.

Condiciones climaticas: Dia soleada y despejada.

Res. Obra. Dicaci Polo. Res. Interventoria.

21-Abril-2024.

Vereda Perrira, Corregimiento de Varas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.
Interventoria Gerencia y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se ha realizado ninguna actividad.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res obra Diana Polo.
Res. Interventoria.

22-Abril-2024.

Vereda Perrira, Corregimiento de Varas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.
Interventoria Gerencia y proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: No se realizo fundida, las actividades realizadas fueron armado de refuerzo de la placa huella longitudinal y transversal.

Condiciones climaticas: Dia soleado y despejado.

Res obra Diana Polo.
Res. Interventoria.

23-Abril-2024.

Vereda Perrira, Corregimiento Varas blancas, municipio de la paz-Cesar.

Contratista JAC Perrira.

Interventoria Gerca y Proyecto de Ingeniera Civil SAS

Desarrollo: las actividades realizadas fueron fundida de la placa cuneta y huella del tramo 2.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

Res. Obra. Diana Polo
Res. Interventoria.

24-Abril-2024.

Vereda Perrera, Corregimiento Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Perrera.
Interventoria Gerca y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: las actividades realizadas fueron fundida de la placa huella. tramo 2.

Condiciones climaticas: Dia Soleado y despejado.

Res. obra Diana Polo.
Res. Interventoria

25-Abril-2024

Vereda Perrera, Corregimiento Varas blancas, municipio de la Paz-Cesar.

Contratista JAC Perrera.
Interventoria Gerca y Proyecto de Ingeniera Civil SAS.

Desarrollo: Durante el dia culminación las actividades faltante (fundida de retorcho para cunetas, bordillos y placas) para la entrega total del tramo 2 de la Vereda, Al final se entregó totalmente la placa

huella del tramo 2

Condiciones climaticas. Dia soleado y despejado

Diana Polo.

Res. Intervenida



	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CESAR

CONVENIO No. 3619 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA CTO VARAS BLANCAS MUNICIPIO DE LA PAZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4383 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: GERENCIA & PROYECTOS DE INGENIERÍA S.A.S

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1. Presentación de informes mensuales del mes de diciembre, enero, febrero y marzo de 2024: El contratista NO PRESENTA a la fecha dichos informes para revisión y aprobación por parte de la interventoría.
2. Presentación de nuevo alcance

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Avance de obra.
2. Recomendaciones técnicas de la interventoría al OAC en los avances de la ejecución de las obras.
3. Presentación de informes mensuales atrasados.

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 80:35 am del día 10 de abril del año 2024, se da inicio al comité de obra, abordando los siguientes temas:

1. El contratista de obra adelanta labores de fundida de concreto reforzado y concreto ciclópeo en elementos como: placas de 0,9 m de ancho (huellas), placas de 0,9 y 0,45 m de ancho de ciclópeo, así como funduda de bermacuenta de 0,7 m de ancho.
2. Se destaca la culminación en un 100% del primer tramo con la construcción de 126,22 ml de placa huella.
3. Se evidencia avances de fundida de concreto reforzado en el sugundo tramo a intervenir (entrada que conecta con la vía que vade La Paz a Manaure).
4. El interventor entrega instrucciones precisas que tienen que ver con actividades de limpieza y adecuación final del primer tramo, dada la visita e inaguración por parte del Señor Ministro de Transporte William Camargo Triana, Dirección territorial de Invias por parte de la Ing. Onna Zuleta, equipo de colaboradores e interventoría el día 11 de abril del año en curso.
5. Se tratan temas asociados al uso adecuado de EPP por parte de los trabajadores de la obra y la importancia de realizar una buena presentación del personal el día de la inaguración.
6. El interventor realiza recomendaciones y plantea la necesidad de mejorar los rendimientos de la obra, a fin de alcanzar los tiempos estipulados para culminar la obra.
7. Es importante resaltar que mediante la modificación aprobada en comité operativo en la que se deja estipulado que la no construcción de alcantarilla, los recursos se están ejecutando en la construcción de 50 ml más de placa huella en el sector dos (02) (entrada que conecta con la vía que va de La Paz a Manaure).

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Entrega total de la obra, incluyendo tramo 2	miércoles, 24 de abril de 2024	OAC Pereira
Entrega de informes mensuales de obra	martes, 30 de abril de 2024	OAC Pereira

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 30/04/2024 (Día / Mes / Año)

NOTAS:





1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	3 de 3
		FECHA	10/04/2024 (Día / Mes / Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
OMAR PERALTA CARRILLO	DIR. INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ	RL INTERVENORÍA	GER & PRO SAS	
DIANA POLO BRITO	ING. RESIDENTE INTERVENTORÍA	GER & PRO SAS	
HÉCTOR PAVA MORALES	INSPECTOR	GER & PRO SAS	
ALFREDO BAQUERO GÓMEZ	PRESIDENTE OAC	OAC PEREIRA	
RUBIEL ARIZA ALI	ING. RESIDENTE OAC	OAC PEREIRA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ACTA DE COMITÉ OPERATIVO		
Acta No: 006	**Dirección Territorial INVIAS:** Cesar	**Fecha:** 06/abril/2024

Vereda – Municipio - Departamento: Vereda Pereira, Municipio de La Paz - Cesar
No. Convenio(s) Solidario(s): 3619 DE 2023
Ejecutor(es): JUNTA ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PEREIRA

PARTICIPANTES		
Nombres y Apellidos	Institución u Organización	Cargo
ALFREDO LUIS BAQUERO	JAC PEREIRA	PRESIDENTE
JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ	GERENCIA Y PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL S.A.S	REPRESENTANTE LEGAL
OMAR GÓMEZ NAVIA	INVIAS	SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA
JOSÉ MARÍA OÑATE	COMUNIDAD	REP. COMITÉ SEGUIMIENTO COMUNITARIO
RUBIEL ARIZA ALI	JAC PEREIRA	ING. RESIDENTE
LEWIS CALDERON	JAC PEREIRA	CONTADOR

OBJETIVOS DEL COMITÉ OPERATIVO: *(Incluir solo los objetivos que se quieren lograr en la reunión)*

1. Socialización y aprobación de pagos de cheques.
2. Socialización del estado del avance financiero del convenio.
3. Socialización de trámite adelantado por parte de interventoría ante Corpocesar, frente a concepto de trámite de ocupación de Cauce.

AGENDA DEL COMITE: *(Incluir la lectura del acta del comité operativo anterior y verificar los compromisos)*

1- Apertura del Comité Operativo No 006 por parte de quienes conforman el comité.
2- Lectura de los puntos a socializar y que son objetos de aprobación en el presente comité.
3- Revisión y Aprobación de los puntos socializados en el presente comité.
4- Orientaciones técnicas para la ejecución del convenio en lo que tiene que ver con la etapa de inicio de labores de obra que incluye (Suministro de materiales, figurado de acero, armado de rieles y fundida de concreto).
5- Cierre y conclusiones.

RESUMEN TEMAS TRATADOS: *(escribir la idea completa de lo tratado en cada tema indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Resumen
1.	Se realizó la apertura del comité operativo No 006 por parte del ing. José Doria Hernández, Alfredo Baquero y demás participantes del comité, dando a conocer el orden del día.
2.	Se realizó socialización de los pagos de cheques a proveedores, pago de nómina e impuestos necesarios para el cierre financiero.
3.	Socialización y aprobación de pago de alquiler de mezcladora y rieles a favor de SAC BUILDINGS SAS por valor de $3.365.680,00
4.	Socialización y aprobación de pagos de impuestos por concepto de retención en la fuente del mes de enero y febrero por valor de $2.249.000,00.
5.	Socialización y aprobación de pago de impuestos por concepto de Reteica a la Alcaldía Municipal de La Paz
6.	Socialización y aprobación de pago de impuestos ante DIAN
7.	Socialización y aprobación de pago de nómina del mes de abril por valor de $9.439.400,00.
8.	Socialización y aprobación del pago por concepto de salud, pensión y riesgos laborales del mes de marzo por valor de $2.381.652,00

Orientaciones técnicas para la ejecución de los convenios

DECISIONES TOMADAS POR EL COMITE: *(escribir la decisión tomada indicando si es del caso: modo, unidad, cantidad, precio, tiempo, lugar)*

Tema	Decisión
1.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
2.	No se requería tomar decisiones en este punto del orden del día.
3.	Se aprueba el pago de alquiler de mezcladora y rieles a favor de SAC BUILDINGS SAS por valor de $3.365.680,00
4.	Se aprueba el pago de impuestos por concepto de retención en la fuente del mes de enero y febrero por valor de $2.249.000,00.
5.	Se aprueba el pago de impuestos por concepto de Reteica a la Alcaldía Municipal de La Paz
6.	Se aprueba el pago de impuestos ante DIAN
7.	Se aprueba el pago de nómina del mes de abril por valor de $9.439.400,00.
8.	Se aprueba el pago por concepto de salud, pensión y riesgos laborales del mes de abril por valor de $2.381.652,00

INFORME PRESENTADOS: *(entregados al ejecutor de manera impresa por el equipo técnico y veeduría)*

No.	Anexos
1.	Informe Técnico de Avance: SI _X__ NO ____ No. Folios: _____

2.	Informe Ejecución Financiera: SI __X__ NO ____ No. Folios: _____
3.	Informe de Veeduría Ciudadana: SI ____ NO ____ No. Folios: _____
4.	Informe Medidas Ambientales: SI ____ NO ____ No. Folios: _____

COMPROMISOS ADQUIRIDOS. *(se hará seguimiento al cumplimiento en cada comité técnico)*

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
• Informar a la comunidad sobre las decisiones tomadas en el comité.	JAC PEREIRA	

PROPOSICIONES Y VARIOS.

Actividad	Responsable de la actividad	Medio de verificación


FIRMAS DE ASISTENTES:



Nombre: ALFREDO LUIS BAQUERO
Cargo: Presidente OAC Pereira



Nombre: JOSÉ DAVID DORIA HERNÁNDEZ
Cargo: Interventor




Nombre: LEWIS FRANCISCO CALDERON
Cargo: Contador



Nombre: RUBIEL ARIZA ALI
Cargo: Ingeniero Residente

Nombre:
Cargo: Tesorero (a) JAC



Nombre: JOSÉ MARIA OÑATE
Cargo: Representante Comité de Participación Comunitario

<<<FIN DE DOCUMENTO>>>
