	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 976 de 2021 **Contratista:** Consorcio DSC

Contrato de Interventoría No. 1000 de 2021 **Interventoría:** Consorcio Ecovisión-190

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INFORME MENSUAL No. 33 **MES O PERIODO:** 01/02/2024 al 29/02/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		Anexo 1
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		Anexo 2
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		Anexo 1
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Anexos 3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Anexos 4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Anexos 5
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Anexos 6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Anexos 7
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Anexos 8
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Anexos 9
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Anexos 10
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	Anexos 11
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	Anexos 12
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Anexos 13
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Anexos 14
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Anexos 15
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Anexos 16
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		Anexo 1
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		Anexos al informe
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		Anexo 1
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Anexos 17
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Anexos 18
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Anexos 19
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Anexos 20
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Anexos 21
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Anexos 22
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	Anexos 23
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Anexo 1
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		Anexo 1
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Anexos al informe
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Anexo 1
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Anexos al informe

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: Carlos Corzo Upegui
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 179 de fecha 26-01-2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 3/08/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO ZONA ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** 01/02/2024 al 29/02/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 976 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSE – EL RETORNO – CALAMARI) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030". MÓDULO 5

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

PLAZO INICIAL:	111 meses
FECHA DE INICIO:	29/06/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REANUDACIÓN:	
FECHA DE VENCIMIENTO:	Hasta 31 de agosto 2030
PLAZO ACUMULADO:	111 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 179.689.019.569,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ 18.311.743.031,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 198.000.762.600,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$
ANTICIPO AMORTIZADO:	$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1000 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Carlos German Corzo Upegui

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	25
	Mejoramiento	Km	0
	Rehabilitación	Km	0
Estructuras de drenaje	Alcantarillas	Und	176
	Arcos	Und	42
	Puentes	Und	5
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km	0,1	11,17
	Mejoramiento	Km	0	0
	Rehabilitación	Km	0	0
Estructuras de drenaje	Alcantarillas	Und	0	42
	Arcos	Und	0	0
	Puentes	Und	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 172.957.357.905,00	$ 1.263.919.154,00	$ 174.221.277.059,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 17.560.562.427,00	$ 128.327.187,00	$ 17.688.889.614,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 970.000.000,00	$ 7.088.462,00	$ 977.088.462,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 385.000.000,00	$ 73.150.000,00	$ 458.150.000,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 257.142.857,40	$ 48.857.142,60	$ 306.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 3.654.922.240,30	$ 694.435.225,70	$ 4.349.357.466,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 195.784.985.429,70	$ 2.215.777.171,30	$ 198.000.762.600,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS				$ 71.334.994.946,59
AJUSTES				$ 4.991.107.928,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				$ 3.399.277,36
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				$ 38.756.209,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				$ -
VALOR EJECUTADO				**$ 76.368.258.360,95**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 66.137.448.822,58
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 72.851.449.193,58
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 110,17%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 37
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 351
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **396**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizó riego de liga y mezcla asfáltica en el PR37+050-PR36+410 LI



Se realizó instalacionde filtro en el PR36+880 al PR36+970 LD



Se realizó la construcionde cuneta en el PR 38+430- PR 38+515 LI



Se realizó la construcción de Caissón para puente Caño Canoa PR43+195 LD

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica para el periodo actual del contrato.

Firma:
Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 15202-172989 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1000 DE 2021

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".



INFORME No 33:

DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INTERVENTOR
CONSORCIO ECOVISION-190
ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1000 DE 2021

MES 31. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5

OBJETO INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".



INTERVENTORIA:
CONSORCIO ECOVISION-190

SEGUIMIENTO AL INFORME

COPIAS DIGITALES

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
COPIA 1 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. BOGOTÁ	1
COPIA 2 - OFICINA INTERVENTORÍA. ARCHIVO	1

CONTROLES DE ELABORACIÓN

Elaboración: **ING. OSCAR FERNANDO ALVARADO DÍAZ** Director de la Interventoría Fecha: 29 de febrero de 2024.	Firma
Aprobó: **ING. OSCAR FERNANDO ALVARADO DÍAZ** Director de la Interventoría Fecha: 29 de febrero de 2024.	Firma

1. INTRODUCCIÓN

El CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Así, el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: *"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*, del cual se desprenden los contratos de obra 976 de 2021 *"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5" e interventoría 1000 de 2019* "*INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*"

El presente documento se elabora bajo los estándares establecidos por el Manual de Interventoría del INVIAS para la elaboración de informes mensuales y corresponde al período comprendido entre el 01 de febrero de 2024 y el 29 de febrero de 2024 como treintaitresavo periodo del mensual de ejecución del contrato.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización.

El corredor San José del Guaviare – El Retorno – Calamar tiene una longitud de 73,46 km iniciando en el PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamento del Guavire hasta el PR73+460 en el municipio de San José del Guaviare en el mismo departamento (Ver Imagen 1).



Imagen 1. Localización corredor troncal de la Orinoquia (San José del Guaviare – El retorno – Calamar)

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La vía comunica a los municipios de Calamar - El Retorno, con una longitud de 45.5 Km, los cuales se recorrer con una velocidad promedio de 25km/h en un tiempo aproximado de 01 hora con 48 minutos, gracias a la ejecución del proyecto se obtendrá como beneficio minimizará el tiempo del recorrido a un 36%.

Con la ejecución del proyecto se beneficia de manera directa 83.011 habitantes, en tres municipios del Departamento del Guaviare (Ver Tabla 2)

Población Municipios de Influencia			
Municipio	**Hombres**	**Mujeres**	**Total de Población**
Calamar	5.823	4.676	10.499 hab.
El Retorno	7.653	6.653	14.306 hab.
San José del Guaviare	29.473	28.733	58.206 hab.

Tabla 1: Población municipios de influencia
(https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/95015)

Relación de empleos generados

EMPLEOS GENERADOS				
Contrato	**Empleos Directos Generados**	**Empleos Indirectos Generados**	**Total, Empleos Generados**	**Empleo de la Zona de Influencia**
Interventoría	19	114	133	8
Obra	71	553	624	26

Tabla 2: Empleos Generados

2.3. Inventario y Estado inicial de la vía

La vía actualmente comunica los municipios de Calamar – El Retorno – San José del Guaviare, con una longitud de 73.46 Km con presencia de diferentes tipos de capas de rodadura como lo son material de afirmado, pavimento en concreto y mezcla asfáltica (Ver tabla 1).

Pr de inicio	Pr Finalización	Longitud en Km	Tipo Rodadura	Observación
Pr0+000	Pr0+800	0.8	Pavimento Rígido	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+800	Pr0+895	0.95	Afirmado	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+895	Pr0+930	0.35	Pavimento Rígido	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+930	Pr26+710	25.78	Afirmado	Calamar - Inspección La Libertad
Pr26+710	Pr27+100	0.39	Pavimento Rígido	Paso por Inspección La Libertad
Pr27+100	Pr45+300	18.20	Afirmado	

Pr45+300	Pr46+180	0.88	Pavimento Rígido	Paso por el Municipio de El Retorno
Pr46+180	Pr55+085	8.90	Afirmado	Municipio de El Retronó - Pavimento en Ejecución
Pr55+085	Pr69+080	13.99	Pavimento Flexible	Contrato de pavimentación en ejecución
Pr69+080	Pr73+460	4.38	Pavimento Flexible	Pavimento Flexible
TOTAL				73.46
TOTAL, EN AFIRMADO				53.03
TOTAL, EN PAVIEMENTO FLEXIBLE				18.38
TOTAL EN PAVIMENTO RIGIDO				1.97

Tabla 3. Estado inicial del corredor 7506.

En el tramo comprendido entre el PR 60+080 al PR 69+080 se ejecutó el convenio interadministrativo N° 1217 /2020 suscrito entre el Instituto Nacional de vías y el departamento del Guaviare, mediante el cual se realizó la construcción de estructura de pavimento asfaltico, obras de drenaje transversales y el Puente Agua Bonita II. Así mismo mediante el convenio interadministrativo N° 1818 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el departamento de Guaviare, se pavimenta en concreto flexible el sector entre el PR 55+585 al PR 60+080 de la ruta. Posteriormente se celebró el convenio interadministrativo N° 2084/2021 entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el departamento de Guaviare, con el cual se pavimentó en concreto asfaltico el tramo comprendido entre PR 46+585 al PR 55+585 con las obras de drenaje transversal y el puente Caño Trueno.

2.4. Características Técnicas del Proyecto

El alcance priorizado para el corredor vial corresponde a las siguientes intervenciones:

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**

Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial.

Mejoramiento y pavimentacion en los sectores del corredor vial enunciado, los cuales obedecen a la priorización de las intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores que **se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados**, incluyendo las obras necesarias que aseguren el correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir. Las

intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados.

Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**

Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**



Imagen 2. Vía a nivel de afirmado K34 + 800



Imagen 3. Vía el sector El retorno - Libertad

Dentro de las acciones a emprender en el marco del contrato 976 de 2021, se ha priorizado la pavimentación del tramo Calamar- El Retorno en el departamento del Guaviare, en el sentido El Retorno – Calamar, cuyas características generales son las siguientes:

- Terraplenes

Con el fin de dar cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS en lo referente a la construcción de terraplenes y aprovechar los materiales de calidad provenientes de la excavación, se realiza mejoramiento de estos con CAL VIVA y se incorporan en la construcción a dichas estructuras (Ver Imagen 4).

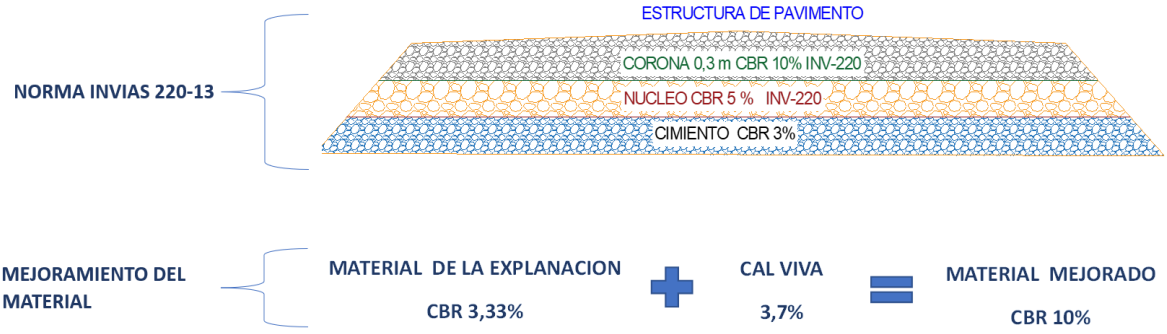


Imagen 4. Terraplén mejorado con Cal.

- Sección tipo

Aplicando la resolución 20213049941135 del 13 de septiembre de 2021 del Ministerio de Transporte, la cual permite ajustar parámetros de diseño, se implementó la sección tipo indicada en la imagen 2. Esto con el fin de aumentar la meta física propuesta en el anexo técnico del contrato 976 de 2021 (Ver Imagen 5).

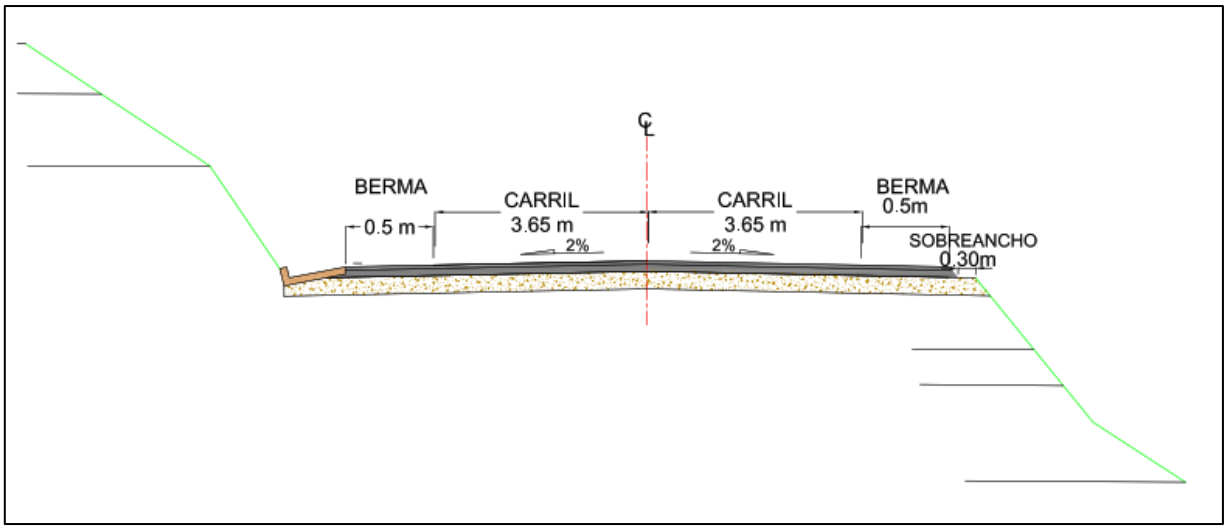


Imagen 5. Sección Típica Transversal.

- **Estructuras de pavimento:**

Se esta ejecutando una estructura de pavimento optimizada con el mejoramiento de la subrasante con CAL VIVA (Ver Imagen 6).

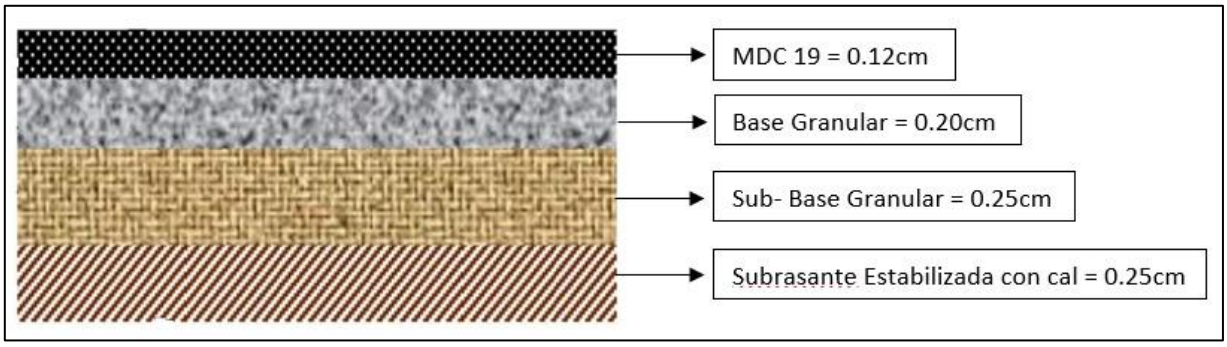
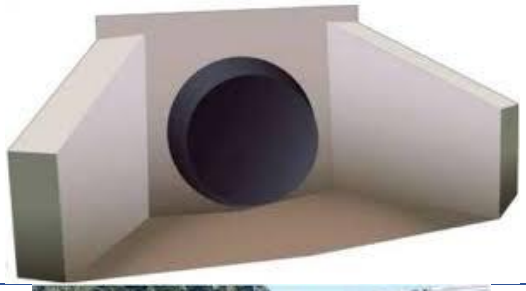


Imagen 6. Estructura de pavimento.

- **Obras transversales**

Se realiza la construcción de obras transversales con diferentes características (Ver Tabla 4), tanto para uso de drenaje como para pasos en fauna en 199 sitios.

N°	TIPO	IMAGEN	USO
1	Alcantarillas de drenaje redondas diámetro de 900 mm a 1200 mm		Uso drenaje
2	Arco metálico de drenaje con base entre 2,74 y 9,45		Uso drenaje


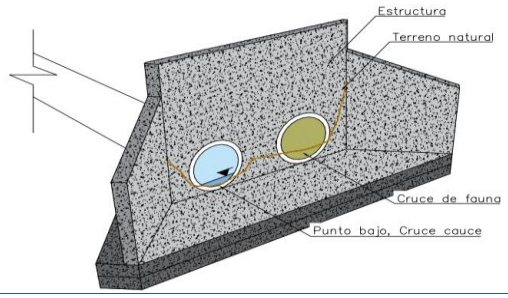



3	Alcantarilla de 900 mm, acondicionada		Uso drenaje y paso de fauna
3	Alcantarillas de drenaje con un paso de fauna, con diámetros entre 900 mm y 1800 mm		Uso hidráulico un ducto y paso de fauna el segundo ducto
4	Alcantarillas con dos pasos de fauna con diámetros de 1800 mm		Uso hidráulico ducto central y 2 ductos paralelos para paso de fauna
5	Arco con dos pasos de fauna con bases entre 2,74 m y 5,94		Uso hidráulico arco central y 2 arcos paralelos para paso de fauna
6	Puentes con luces de 20 m		Uso hidráulico y zona seca para paso de fauna

Tabla 4 Obras trasversales contrato 976 de 2021

- Obras de drenaje longitudinal

Con el fin de drenar la calzada de la vía de manera adecuada y proteger los predios aledaños, se esta ejecutando obras hidráulicas tipo cunetas. (Ver Tabla 5):

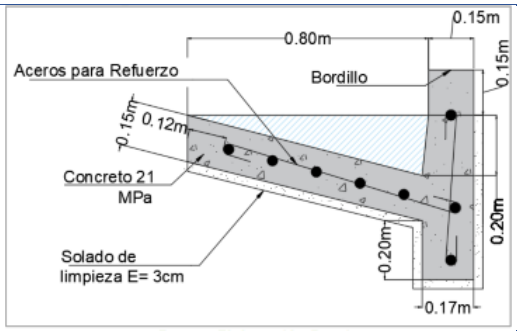
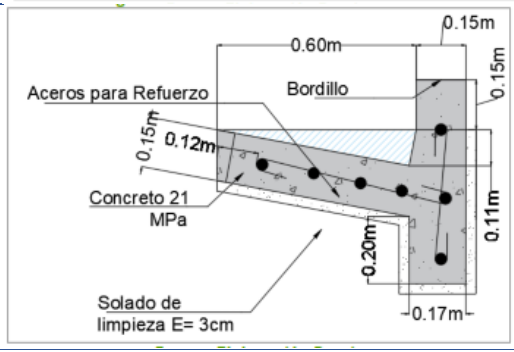

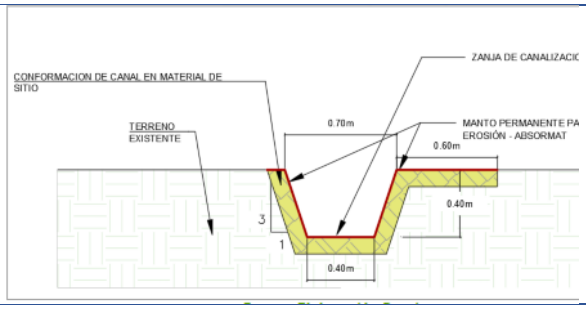
N°	TIPO	IMAGEN	USO
1	Cuneta de base 0,8 m		Paralelo a la vía, zonas con flujo medio
2	Cuneta de base 0,6 m		Paralelo a la vía, zonas con flujo bajo
3	Cuneta de base 0,6 m		Paralela a la vía, Uso berma – cuneta en zonas de alto flujo
4	Zanja de drenaje		En la base del terraplén en sectores sin cuneta, con alto flujo.

Tabla 5 Obras longitudinales contrato 976 de 2021

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General del Contrato

Carretera	Corredor troncal de la Orinoquia (San José del Guaviare– El retorno – Calamar)
Contratista	CONSORCIO DSC
Contrato	976 DE 2021
Objeto	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 5”.
Iniciación	29 de junio de 2021
Plazo Final	114 meses
Plazo final Actualizado	Hasta 31 de agosto de 2030
Valor Básico + IVA	$179.689.019.569,00
Adición 1	$18.311.743.031,00
Valor Actualizado	$198.000.762.600,00
Director de Obra	Edwin Bustos Ibarra
Resiente de Obra	Cesar Lancheros

Tabla 6. Información general del contrato de obra.

Seguimiento de Garantías Contractuales

El contratista mediante Póliza de Cumplimiento No 400033691 y la Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708 de la Compañía nacional de seguros

Póliza de Cumplimiento No 400033691:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2021	31/12/2025	$ 7’971.504.831,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	13/05/2021	31/12/2025	$27’011.743.031,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	30/12/2030	$23’914.514.493,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/05/2021	31/12/2028	$15’943.009.662,60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	30/12/2030	$137.445.000,00

Tabla 7. Pólizas de cumplimiento contrato 976 de 2021.

Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708:

AMPARO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$3’985.752.415,00

Tabla 8. Pólizas de responsabilidad civil contrato 976 de 2021.

Seguimiento al estado actual de las Garantías Contractuales

se realizó una modifica el parágrafo segundo de la cláusula séptima, por lo tanto, se ajustan los valores asegurados en el cuadro de amparos de acuerdo al Anexo N° 8 del 09 de agosto de 2023.

Póliza de Cumplimiento No 400033691:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2023	31/12/2025	$ 9.125.743.101.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	26/07/2023	31/12/2025	$ 27.011.743.031.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	30/12/2030	$ 27.377.229.305.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/07/2023	31/12/2028	$ 18.251.486.203.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	30/12/2030	$137.445.000,00

Tabla 9. Pólizas de cumplimiento contrato 976 de 2021.

se realizó una modifica el parágrafo segundo de la cláusula séptima, por lo tanto, se ajustan los valores asegurados en el cuadro de amparos de acuerdo al Anexo N° 7 del 26 de julio de 2023.

Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708:

AMPARO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 4.562.871.550.75

Tabla 10. Pólizas de responsabilidad civil contrato 976 de 2021

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

- **Trabajo de mejoramiento de puente.**

Durante este periodo se realizó la adecuación del puente Caño canoa con la construcción de los caisson N° 2,5 y 6.

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR43+195		Se realizó trabajo de Excavación, amarre de acero, colocado de formaleta y vaciado de concreto del los Caisson N° 2,5 y 6 para el puente Caño Canoa.

Tabla 11. Abscisas de trabajo de mejoramiento de puente.



Imagen 07. Construcción de Caiissón para puente Caño Canoa PR43+195 LD



Imagen 08. Construcción de Caiissón para puente Caño Canoa PR43+195 LD.

- **Localización, Replanteo y adecuación de cunetas.**

Durante este periodo se realizó la localización y adecuación de terreno para las construcciones de cunetas en la vía en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR 45+030	PR 45+320	Adecuación de cuneta margen izquierda.
PR 38+330	PR38+420	Adecuación de cuneta margen izquierda.
PR36+870	PR37+030	Adecuación de cuneta margen izquierda.
PR 40+860	PR 40+900	Adecuación de cuneta tipo batea protectora para carpeta Asfáltica.
PR38+950	PR 39+900	Adecuación de cuneta margen izquierda.
PR 45+325	PR 45+270	Adecuación de placa de anden para colocado de loseta. margen izquierda.
PR 45+270	PR 45+320	Adecuación de Bordillo de Anden margen izquierda.
PR 40+820		Adecuación de descole de cuneta margen izquierda.
PR 38+515	PR 38+430	Adecuación de descole de cuneta tipo batea margen izquierda.
PR38+985		Adecuación de acceso.
PR1+320	PR1+220	Adecuación de cuneta margen izquierda.
PR37+010	PR36+870	Adecuación de cuneta margen izquierda.

Tabla 12. Abscisas de localización, Replanteo y adecuación de cunetas.



Imagen 09. Adecuación de terreno para construcción de cuneta PR 45+030 - PR 45+320 LI.



Imagen 10. Adecuación de terreno para construcción de cuneta PR 38+330 - PR38+420 LI.

- **Acero de refuerzo Y=420Mpa.**

Durante este periodo se realizó instalación de acero de refuerzo Y-420Mpa en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	
PR43+195,00		Acero de refuerzo para Caisson de puente Caño canoa.
PR 38+430	PR 38+515	Acero de refuerzo para cuneta tipo batea LI.
PR 38+330	PR 38+420	Acero de refuerzo para cuneta tipo 1 a 45° LI
PR 40+860	PR 40+900	Acero de refuerzo para cuneta tipo batea protectora carpeta Asfáltica LD, LI.
PR38+950	PR 39+900	Acero de refuerzo para cuneta tipo 1 a 45° LI
PR43+195		Acero de refuerzo para caissón.
PR 45+325	PR 45+270	Acero de refuerzo para placa de anden, para colocado de loseta. LI
PR 45+270	PR 45+320	Acero de refuerzo para Bordillo de Anden LI
PR 40+820		Adecuación de descole de cuneta LI
PR 38+515	PR 38+430	Acero de refuerzo para cuneta tipo batea LI
PR38+985		Adecuación de acceso LI
PR1+320	PR1+220	Acero de refuerzo para cuneta
PR37+010	PR36+870	Acero de refuerzo para cuneta

Tabla 13. Abscisas de colocado Acero de refuerzo Y=420Mpa.



Imagen 11. Amarre de Acero para Caissón del puente Caño Canoa PR43+195 LI.



Imagen 12. Instalación de acero PR 38+330 - PR38+420 LI.

- **Concreto clase 21 Mpa**

Durante este periodo se realizó instalación de concreta clase 21 Mpa en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	
PR45+030	PR45+320	Cuneta tipo 1 contrapendiente.
PR 38+430	PR 38+515	Cuneta tipo Batea.
PR 40+860	PR 40+900	Cuneta tipo batea protectora carpeta Asfáltica.
PR 38+950	PR 39+900	Cuneta tipo 1 contrapendiente.
PR 45+320	PR 45+270	Placa de anden, para colocado de loseta.
PR 45+270	PR 45+320	Bordillo de Anden
PR 40+820		Adecuación de descole de cuneta.
PR 38+515	PR 38+430	Cuneta tipo batea
PR38+420	PR38+430	Acceso de vivienda
PR38+985		Acceso de vivienda
PR01+320	PR01+220	Cuneta
PR37+010	PR36+870	Cuneta tipo 1

Tabla 14. Abscisas de colocado de Concreto clase 21 Mpa



Imagen 13. Concreto 21 Mpa PR 38+430- PR 38+515 LI.



Imagen 14. Concreto 21 Mpa PR 38+430 – PR 38+515 LI.

- **Excavaciones y adecuación de talud varias sin clasificar**

Durante este periodo se realizaron excavaciones y adecuación de talud varias sin clasificar en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	**ABSCISA FIN**	
PR 40+860	PR 40+830	Adecuación de talud margen derecho y izquierdo.
PR 45+320		Lleno y compactación de poceta margen izquierda
PR 45+305		Lleno y compactación de poceta margen izquierda
PR36+880	PR36+970	Excavación para filtro longitudinal margen derecha
PR36+840	PR36+770	Adecuación y perfilado para paisajismo
		Excavación para filtro longitudinal margen izquierda

Tabla 15. Abscisas de excavaciones y adecuación de talud varias sin clasificar.



Imagen 15. Adecuación de talud PR40+860 - PR40+830 LD.



Imagen 16. Lleno y compactación de poceta PR 45+320 LI.

- **Terraplenes**

Durante este periodo se realizó la ampliación de terraplén con Cal viva (2%) en la siguiente abscisa:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR36+460	PR36+350	Terraplén con material seleccionado.
PR38+420	PR38+430	Lleno y compactación con material de afirmado del acceso de la vereda La Esperanza.

Tabla 16. Abscisas de terraplén.



Imagen 17. Terraplén entre el PR 36+460 al PR 36+350 LI.



Imagen 18. Terraplén en PR 36+460 al PR 36+350 LI.

- **Transporte de materiales**

Durante este periodo se realizó transporte de materiales en las siguientes abscisas:

TRANSPORTE DE MATERIALES		
PR36+460	PR36+350	Ampliación de terraplén, Margen izquierdo
PR36+880	PR36+970	Transporte de materiales de material filtrante.
PR 37+030	PR1+740	Transporte de materiales de material filtrante.
PR37+040	PR36+880	Transporte de materiales de material filtrante
PR38+420	PR38+430	Transporte de material de afirmado del acceso de la vereda La Esperanza.
PR37+050	PR36+550	Transporte de material mezcla MDC 19.
PR36+550	PR36+410	Transporte de material mezcla MDC 19.
PR36+200	PR36+040	Transporte de material mezcla MDC 19.
PR36+040	PR35+540	Transporte de material mezcla MDC 19.

Tabla 17. Abscisas de terraplén transporte de materiales



Imagen 19. Transporte de material para relleno PR36+460 - PR36+350 LD .



Imagen 20. Transporte de material filtrante PR36+880 - PR36+970 LD .

- **Se realizó el levantamiento poligonal, entre el municipio de El Retorno – San Jose.**

Durante este periodo se realizó el levantamiento poligonal de la vía pavimentada entre el Municipio de El Retorno – San José, en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR 46+160	PR 69+100	Levantamiento poligonal de la vía El Retorno – San José.

Tabla 18. Abscisas del levantamiento poligonal.



Imagen 21. Levantamiento poligonal de la vía – Topografía PR 46+160 - PR 69+100.



Imagen 22. Levantamiento poligonal de la vía – Topografía PR 46+160 - PR 69+100.

- **Material Granular drenante**

Durante este periodo se realizó instalación de material granular drenante en las siguientes abscisas:

INICIO	FIN	OBSERVACIONES
PR36+880	PR36+970	Filtro, margen Derecha
PR1+560	PR1+740	Filtro, margen Izquierda
PR1+440	PR1+390	Filtro, margen Izquierda
PR37+030	PR36+880	Filtro, margen izquierda
PR37+040	PR36+880	Filtro, margen Derecha

Tabla 19. Abscisas del material Granular drenante.



Imagen 23. Instalación de material granular drenante Pr36+880 al Pr 36+970 LD.



Imagen 24. Instalación de material granular drenante PR1+560 al PR1+610 LI.

- **Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.**

Durante este periodo se realizó instalación de tubería de plástico tipo corrugada de diámetro 100mm en las siguientes abscisas:

INICIO	FIN	OBSERVACIONES
PR36+880	PR36+970	Elaboración de filtro
PR1+560	PR1+740	Elaboración de filtro
PR1+440	PR1+390	Elaboración de filtro
PR 37+030	PR37+450	Elaboración de filtro
PR37+040	PR36+880	Elaboración de filtro

Tabla 20. Abscisas del tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.



Imagen 25. Instalación de tubería PR36+880 - PR36+970 LD.



Imagen 26. Instalación de tubería PR36+880 - PR36+970 LD.

- **Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.**

Durante este periodo se realizó instalación de geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR36+880	PR36+970	filtro longitudinal
PR1+560	PR1+740	filtro longitudinal
PR1+440	PR1+390	filtro longitudinal
PR 37+030	PR37+450	filtro longitudinal
PR37+040	PR36+880	filtro longitudinal

Tabla 21. Abscisas de la tubería de geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.



Imagen 27. Instalación de geotextil PR 37+030 - PR 37+450 LI.



Imagen 28. Instalación de geotextil PR1+560 - PR1+610 LI.

- **Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)**

Durante este periodo se instalación de mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR37+050	PR36+410	Instalación de liga y asfalto segunda capa, Margen derecha e izquierdo
PR36+200	PR35+540	Instalación de liga y asfalto segunda capa, Margen derecha e izquierdo.

Tabla 22. Abscisas de mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte).



Imagen 29. Instalación de asfalto entre PR 37+050-36+410 LI



Imagen 30. Instalación de asfalto entre PR 36+200-35+540 LD

- **Provisiones ejecutadas**

Durante el periodo del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024 se realizaron provisiones del contrato 976 de 2021.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 12,068,028.00	$ 1,303,218,669.00
2 Sub-bases y bases	$ 169,428,124.00	$ 14,321,376,722.00
3 Transporte de materiales	$ 383,128,555.00	$ 34,075,218,707.00
4 Aceros y elementos metálicos	$ 28,969,767.00	$ 2,447,973,668.00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 924,394,650.00	$ 12,350,757,505.37
6 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 525,977,494.00	$ 8,362,903,921.00
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 2,043,966,618.00**	**$ 72,861,449,192.37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 12,068,028.00	$ 1,433,124,455.00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 180,540,124.00	$ 18,129,282,760.00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ 472,850,710.00	$ 8,282,551,495.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 419,009,366.00	$ 10,034,840,351.37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -

11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 576,369,835.00	$ 902,826,456.00
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 3,604,968.00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 383,128,555.00	$ 34,075,218,707.00
TOTAL	**$ 2,043,966,618.00**	**$ 72,861,449,192.37**

Tabla 23. Provisiones ejecutadas

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades con el acompañamiento y supervisión de la interventoría.

- **Actividades ambientales:**

Se realizó verificación del cumplimiento de las medidas ambientales de los permisos obtenidos por el contratista los cuales se describen a continuación:

Permisos Ambientales obtenidos:

1. **Ocupación de cauces de 6 km:** Resolución DSGV-023- 22 del 1 de marzo de 2022, con una vigencia de 2 años. A la fecha el contratista ha intervenido las 4 obras autorizadas.

2. **Ocupación de cauces de 4 km:** Resolución DSGV-328- 22 del 9 de septiembre de 2022, con una vigencia de 2 años. A la fecha de las 7 obras hidráulicas autorizadas. Se cuenta en el periodo con la resolución modificatoria DSGV-127- 22 del 5 de mayo de 2023, por medio de la cual se autoriza las modificaciones de intervención de 4 puentes para el reemplazo total de los mismos. Al periodo se tiene intervenidas tres (3) obras: PR38+770, PR36+860 y PR35+550. En el mes de febrero de 2024, se interviene una cuarta (4) obra autorizada en el PR43+190.

3. **Ocupación de cauces de 6 km Sector del PR35+600 al PR28+900:** Resolución DSGV-524-22 del 1 de marzo de 2022, con una vigencia de 2 años. Se autoriza la intervención de 9 obras, de las cuales al corte del presente reporte no se ha intervenido ninguna de las obras.

4. **Concesión de aguas: Resolución DSGV-024-22 del 1 de marzo de 2022,** para dos puntos en Caño Canoa y Caño Potosí, con una vigencia de 2 años. En el mes de febrero se realiza la captación e intervención del cauce en Caño Canoa en el PR43+090. Se cuenta con prórroga concesión de aguas con la Resolución DSGV-088-22 del 24 de marzo de 2022 con una vigencia de 6 años y 6 meses, toda vez que se dé cumplido el término de la resolución DSGV-024-22 al 1 de marzo de 2024.

5. **Permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas:** Resolución DSGV-105-22 del 24 de mayo de 2022, para planta de Trituración y Asfalto. El contratista remitió los muestreos isocinéticos de la planta de asfalto ante la Corporación Ambiental CDA y fueron presentados a la interventoría en el informe No 27 de gestión ambiental correspondiente al periodo del 21 de noviembre a 21 de diciembre de 2023. Se espera se programen nuevos monitoreos para el mes de mayo de 2024.

6. **Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados:** Resolución DSGV-312-2022 del 5 de septiembre 2022, este permiso se encuentra en trámite de cierre de expediente, el contratista cumplió con las obligaciones impuestas en las actividades de tala y de igual forma con la medida de compensación con la entrega de 500 plántulas a la Corporación Ambiental CDA. Se cuenta con el cierre del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados mediante la Resolución DSGV-549-2022 del 21 de noviembre de 2022, del, teniendo en cuenta que se cumplió con las obligaciones y medida de compensación a la corporación CDA.

7. **Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados,** sector del PR37+580 al PR28+900: Resolución DSGV-191-2023 del 6 de junio de 2023, este permiso se encuentra vigente, tiene una medida compensatoria de suministro de 2000 plántulas forestales nativas de 60 cm y la siembra y establecimiento de 20 cedros en el sector de intervención. Se cuenta con prórroga del permiso aprovechamiento forestal de árboles aislados: Resolución DSGV-549-2023 del 21 de noviembre de 2023, por un término de dos (2) años, hasta el 21 de noviembre de 2025.

8. **Actividades generales ambientales:**

   - ✓ El contratista tramita en el periodo prórroga del permiso de ocupación de cauces de la Resolución DSGV-023-22.
   - ✓ El contratista informa en comité técnico del 13 de febrero de 2024, que realizara la instalación de las vallas metálicas como cumplimiento a las medidas compensatorias de las resoluciones DSGV-023- 22 y DSGV-328- 22.
   - ✓ Se evidenció en el predio de Las Brisas en el PR38+900 que se mantuvo conformado el material dispuesto.
   - ✓ Se evidenció en el predio de La Cabaña localizado en el PR35+100, el crecimiento de las semillas de la revegetalización, pendiente por parte del contratista la conformación del acceso al predio.
   - ✓ Se realiza captación de agua en el punto autorizado por la CDA en Caño Canoa PR43+160 para la captación de agua, el cual de acuerdo a la dinámica de las obras ha sido el más usado.
   - ✓ Se evidencia acopio de materiales granulares en la Zona Industrial cubiertos con plástico para control de material particulado.

- ✓ El contratista realiza entrega de los informes mensuales de gestión para revisión y concepto de aprobación de la interventoría: No 20, No 21, No 22, No 23, No 24 y No 26; sin embargo, la interventoría remite observaciones para ser subsanadas por el contratista.
- ✓ La interventoría realiza consolidación en el periodo de la información ambiental para la elaboración de informe trimestral Ambiental No 9 del periodo del 21 de septiembre a 21 de diciembre de 2023, el cual debe ser radicado ante la Subdirección de Sostenibilidad INVIAS.
- ✓ Se realiza verificación y seguimiento en campo de las medidas ambientales aplicables en los frentes de obra y áreas intervenidas entre profesionales ambientales.



Imagen 31. Se evidencia captación de agua en el punto autorizado PR 43+090 Caño Canoa.



Imagen 32. Seguimiento en campo de las medidas ambientales Profesionales ambientales Contratista e Interventoría.

- **Actividades Componente de sostenibilidad:**

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades en el componente Social con el acompañamiento y supervisión de la interventoría:

- La interventoría realizó seguimiento al funcionamiento de las oficinas SAU ubicadas en los municipios de El Retorno y Calamar, observando que durante este periodo se prestó el servicio de manera oportuna por parte del contratista.

- El contratista cuenta con tres buzones satélites, ubicados en la Inspección de Policía de La Libertad, en la vereda la Marina Casa de la presidenta del comité de participación comunitaria y en la Alcaldía del municipio de Calamar para la recepción de PQRS.

- El contratista ha gestionado la recepción de PQRS, y durante el periodo actual se han recibido 2 PQRS nuevas. Hasta la fecha, se ha registrado un total de 14 PQRS, de las cuales 12 ya han sido cerradas. Mientras que hay 2 PQRS que permanecen abiertas y están siendo atendidas por el Consorcio DSC.

- La interventoría ha llevado a cabo el seguimiento al cumplimiento de la programación de cierre de compromisos acordados con los propietarios, específicamente en lo que respecta a la adecuación de accesos, entradas, reposición de cercas y perfilación de taludes. En este contexto, se informa que dentro del componente social, se han establecido un total de 36 actas de compromisos con los propietarios, de las cuales 17 ya han sido cerradas, mientras que 19 permanecen abiertas y están siendo atendidas por el contratista.Es importante señalar que en cuanto a las 5 actas ambientales relacionadas con los sitios de disposición, el seguimiento correspondiente se llevará a cabo desde el componente ambiental.

- El contratista cuenta con el levantamiento de 148 actas de vecindad de inicio, 2 actas de vecindad de seguimiento y 13 actas de vecindad de cierre, las cuales se encuentran aprobadas y firmadas por la interventoría.

- La Interventoría efectuó seguimiento a las acciones de divulgación de los principales avances del contrato de obra efectuadas por el contratista mediante la actualización de redes sociales, y el seguimiento a la aplicación de encuestas de satisfacción.

- La interventoría realizó acompañamiento al desarrollo de la reunión mensual con el comité de participación comunitaria en la vereda la Marina del mes de febrero de 2024 efectuada el día martes 27, el propósito de esta reunión fue informar a la comunidad sobre el estado y avance del contrato de obra No 976 de 2021.

- La interventoría realizó mesas de trabajo con el fin de revisar y complementar el informe mensual No. 27 del componente de gestión social correspondiente al periodo del 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2023. Durante estas mesas, se realizaron ajustes a la matriz de compromisos para indicar el estado actual de atención e intervención de los predios involucrados.

- La interventoría llevo a cabo la revisión y aprobación de los informes mensuales del componente social No. 27, No. 28 y No 29 presentados por el contratista.

- La interventoría radico a la Subdirección de Sostenibilidad el informe trimestral social No 9 correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de septiembre al 22 de diciembre de 2024.

- La interventoría reitero al contratista la atención a las observaciones al documento P.A.G.A. versión No 2 en relación a las fichas de gestión social.

- La interventoría realizó seguimiento a la construcción de la unidad sanitaria de la Institución Educativa Cerritos Sede La Marina Uno en el marco de la implementación de la obra de participación comunitaria OPC.



Imagen 33. Seguimiento al cumplimiento de compromisos, reposición de cercas. 09-02-2024.



Imagen 34. Mesas de trabajo revisión documentos sociales. 12-02-2024.



Imagen 35. Seguimiento a la programación de atención de actas de compromisos. 24-02-2024



Imagen 36. Seguimiento a la construcción de la Unidad sanitaria-OPC. 26-02-2024



Imagen 37. Seguimiento a la reunión del comité de participación comunitaria. 27-02-2024



Imagen 38. Seguimiento a la actualización del aviso informativo del SAU municipio de El Retorno 29-02-2024.

- **Actividades Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):**

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades en el componente SST con el acompañamiento y supervisión de la interventoría:

- ✓ Se realizó seguimiento al mantenimiento de dispositivos de señalización como cinta de peligro, delineadores tubulares compuestos, maletines, barricadas de desvió, señales informativas en los PR 01+930, 36+200 al 36+410, 37+470 al 37+870, 43+050 al 43+270, 45+00 al 45+320, de El Retorno – Calamar.

- ✓ Se realizó seguimiento a las entregas de dotación y reposición de elementos de protección personal (EPP) y del uso adecuado por parte del personal del Consorcio DSC.

- ✓ Se realizo recorrido en obra conjunto contratista he interventoría del área de seguridad y salud en el trabajo, llevando a cabo una inspección detallada del lugar de trabajo en la zona industrial y trayecto de la vía en intervención, para verificar que se estén implementando adecuadamente todas las medidas y acciones de mejora en obra.

- ✓ Se realizó seguimiento de los elementos de emergencia en la zona industrial (Botiquín y extintor) con el fin de verificar el estado actual de los mismo y la identificación de rutas de evacuación y punto de encuentro en caso de una emergencia en el Consorcio DSC.

- ✓ Se realizó seguimiento del control vial en los diferentes sitios de intervención del corredor vial de El Retorno -Calamar.

- ✓ Se realizo seguimiento a la actividad del puente caño, PR43+190, en la construcción de caisson, en la implementación de las medidas de protección y prevención contra caídas, con el fin de garantizar la seguridad a los trabajadores.

- ✓ Se continúa realizando orden y aseo en la zona industrial y en la obra de intervención del El Retorno a Calamar.



Imagen 39. Señalización vial en el PR36+200 al PR36+410.



Imagen 40. Uso de dotación y elementos de protección personal.

- **Actividades Topográficas:**

- Se realiza seguimiento a las siguientes excavaciones:

DETALLE	ABSCISA	COSTADO
Excavación para Caisson número 2,5 y 6 de puente	PR 43+180	Der.
Excavación para filtro longitudinal.	PR40+045 – PR40+130	Der.
Excavación para filtro longitudinal.	PR37+030 – PR37+450	Izq.
Excavación para filtro longitudinal.	PR36+980 – PR37+040	Der.
Excavación para filtro longitudinal.	PR01+390 – PR01+740	Izq.
Excavación para bordillo anden.	PR45+050 – PR45+325	Izq.

Tabla 23. Abscisas de actividades Topográficas:

- ✓ Se realiza estabilización con cal en terraplén costado izquierdo, entre PR36+310 a PR36+410.

- ✓ Se realiza seguimiento a los mejoramientos de acceso a vivienda por ambos costados de la vía, entre los PR38+200 a PR44+900.

- ✓ Se realiza acompañamiento a levantamiento topográfico de la vía existente, entre Retorno y San José, por parte del contratista, iniciando del PR 46+160 a PR69+300 para planos récord.

- ✓ Se realiza medición en conjunto con contratista de los empradizados instalados a lo largo del corredor vial de PR34+500 a PR44+660, se solicita realizar una segunda siembra sobre los taludes del PR42+150.

ANEXO FOTOGRÁFICO



Imagen 41. Verificación niveles de Caisson puente PR 43+180



Imagen 42. Tapa de filtro con Sub base, PR37+250 costado izquierdo.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

Para el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento a los ítems no previstos, los cuales fueron aprobados el 28 de enero de 2022;

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-1	(11606)	Tablestacado Metálico	kg
NP-2	(6-11602)	Suministro de Cal Viva	kg
NP-3	(2-11602)	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte	m3
NP-4	(5-11602)	Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3
NP-5	(5-11602)	Cemento hidráulico para suelo cemento	kg
NP-6	(3-11608)	Transporte de materiales provenientes de la excavación, canales y prestamos entre 100metros y 1000metros de distancia.	m3-E

Tabla 24. Seguimiento ítems no previstos.

Para el periodo del 01 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre por parte de la interventoría se realizó el seguimiento a los ítems no previstos, los cuales fueron aprobados el 06 de junio de 2022;

ITEM	GRUP O DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-7	(5-11604)	Rellenos con Material Filtrante	m3
NP-8	(5-11604)	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m
NP-9	(7-11604)	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2
NP-10	(4-11604)	Tubería Metálica Corrugada.	kg
NP-11	(5-11604)	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior.	m
NP-13	(5-11604)	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800mm de diámetro interior.	m

Tabla 25. Seguimiento ítems no previstos grupo 2.

Igualmente se realizó la modificación a los grupos adoptada mediante Resolución No. 2845 de 3 de agosto de 2022, motivada por lo expuesto en el Manual de interventoría de Obra pública vigente, y por la Resolución No. 320 de 26 de enero de 2022; documentos de donde incorpora el índice ICOCIV a los procedimientos de la entidad a causa de la suspensión en la publicación del índice ICCP con el cual se efectuaban los ajustes de los contratos de obra susceptibles a este procedimiento.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

3.4.1 Estado de avance

Para el periodo 01 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023 se realizó seguimiento al contrato de obra 976 de 2021, presentado una inversión de obra programada acumulada de $66.008.912.116,97 , el cual corresponde al 38.16%, así mismo el estado de avance real es del 40.95% que representa $70.817.482.574,37 en inversión ejecutada acumulada (ver grafica 1).


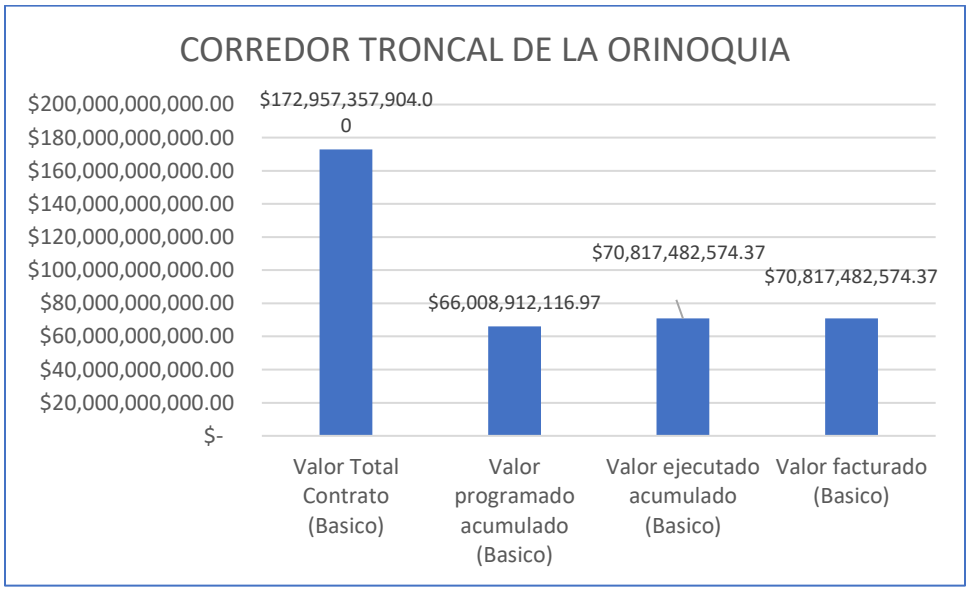


Gráfico 1 Grafico valor programado Vs valor ejecutado acumulado

3.4.2 Acciones a seguir por la interventoría

A la fecha contratista no presenta atraso en la ejecución financiera del contrato, igualmente ya se aprobó la vigencia 2023 para el contrato 976 de 2021.

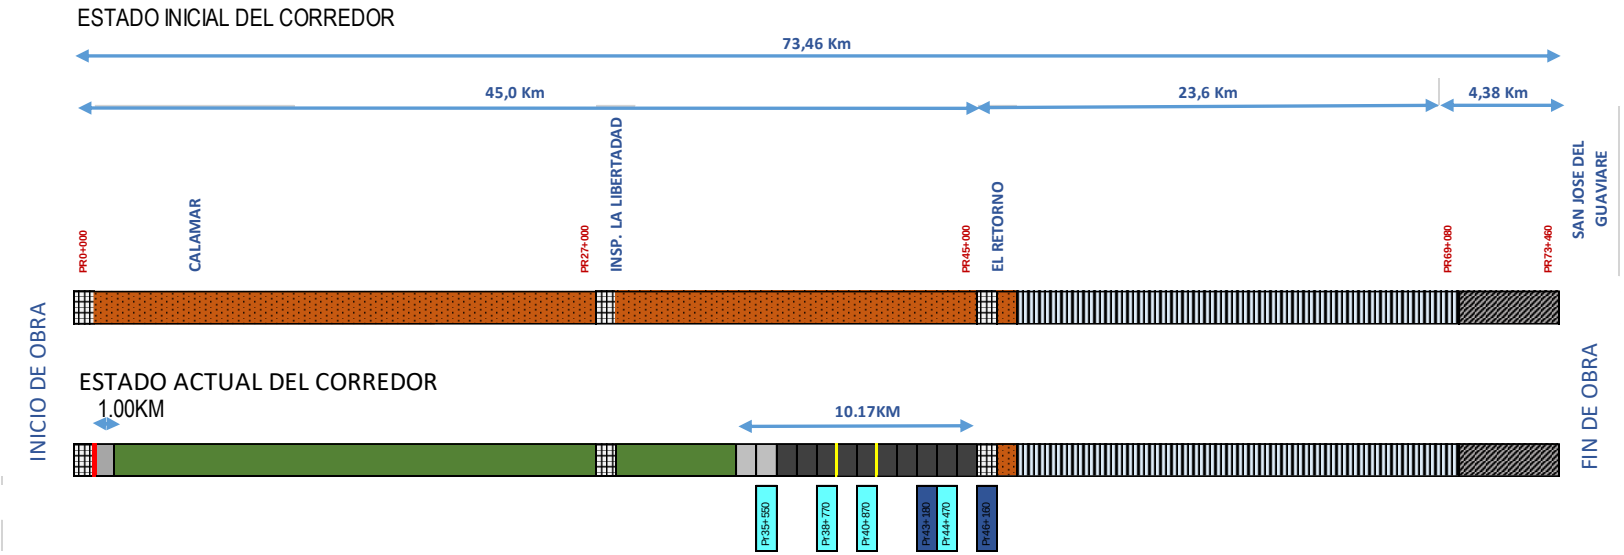

ESTADO INICIAL
PAVIMENTO MAL ESTADO
PAVIMENTO FLEXIBLE BUEN ESTADO
AFIRMADO
PAVIMENTACION POR GOBERNACIÓN
PAVIMENTO RIGIDO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	LONG. KM	PROG. KM
MANTENIMIENTO	69.30	133.30
REHABILITACIÓN	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE PRIMERA CAPA	11.17	11.22
PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE SEGUNDA CAPA	9.99	8.93
PAVIMENTO RIGIDO	103.40	0.80
BASE GRANULAR	11.20	11.36
SUBBASE GRANULAR	11.43	11.36
SUBRASANTE MEJORADA	11.69	11.96
PASO DE FAUNAS	4.00	0.00
PUENTES	1.00	2.00

Gráfico 2 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe semanal

(MEPI-MN1-IN-15-FR-3)

Anexo 3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
(MEPI-MN1-IN-15-FR-4)
Anexo 4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-6)
Anexo 5

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

Anexo 6

4.5 Estado General del Tiempo
(MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

Anexo 7

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio (MEPI-MN1-IN-15-FR-11)

Anexo 8

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-12)

Anexo 9

4.8 **Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra**

(MEPI-MN-1IN-15-FR-14)

Anexo 10

4.9 Otros documentos seguimiento
a. Seguimiento a la inversión del Anticipo
(MEPI-MN-IN-2-FR-1)
Anexo 11

b. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-2-FR-2)
Anexo 12

c. Seguimiento programa de obra.

(MEPI-MN-IN-6-FR-1)

Anexo 13

d. Seguimiento al programa de inversiones

(MEPI-MN-IN-6-FR-2)

Anexo 14

e. Actas de comité de obra

(MEPI-MN-IN-14-FR-1)

Anexo 15

.

f. Actas de reunión

(MEPI-MN-IN-14-FR-2)

Anexo 16

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. Información General del Contrato

Carretera	Corredor troncal de la Orinoquia (San José – El retorno – Calamar)
Contratista	CONSORCIO ECOVISION-190
Contrato	1000 DE 2021
Objeto	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
Iniciación	Junio 29 de 2021
Plazo Final	114 meses
Plazo final Actualizado	31 DE AGOSTO DE 2030
Valor Básico + IVA	$ 21.999.237.400,00
Valor Actualizado	$ 21.999.237.400,00
Director de Interventoría	Oscar Fernando Alvarado Díaz

Tabla 26 Información general contrato 1000 de 2021.

Seguimiento de Garantías Contractuales

La interventoría, mediante Póliza No NB-100164311 de compañía mundial de seguros S.A:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	07/07/2023	31/12/2025	$824.256.899,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	07/07/2023	31/12/2025	$755.300.879,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	07/07/2023	31/12/2028	$1.648.513.797,00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2023	13/05/2026	$6.599.771.220,00

Tabla 27 Pólizas de cumplimiento contrato 1000 de 2021.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA MES FEBRERO 2024

ÍTEM	ENTIDAD O PERSONA	LUGAR	No DE CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REFERENCIA
1	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1217-2024	01/02/2024	Solicitud de informe de gestión ambiental No Informe No 28 del periodo del 21 de diciembre de 2023 a 21 de enero de 2024. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
2	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1218-2024	01/02/2024	Tramite al comunicado 2024-DSC-CENV-0014 con asunto “Solicitud de anticipo No 2” - Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS	Contrato 1000 de 2021

					PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
3	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1219-2024	02/02/2024	Respuesta a oficio 2023S-VBOG-025991 con asunto: Respuesta a oficio 2023E-VUVRAZ-031578 del 24 de noviembre de 2023, Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
4	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1220-2024	02/02/2024	Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0012 con asunto: Oficio 056-0-1180-2023, Informe Ambiental No 27 y anexos, periodo noviembre 22 a diciembre 21 de 2023. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
5	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA	Bogotá D.C	056-0-1221-2024	02/02/2024	Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0021 con asunto: Oficio 056-0-1173-2023, Informe Mensual No. 26, periodo octubre 22 a noviembre 21 de 2023.Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN	Contrato 1000 de 2021

	CONSORCIO DSC				EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
6	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1222-2024	02/02/2024	Daños en pavimento Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
7	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1223-2024	05/02/2024	Reiteración del comunicado 056-0-1163-2023 observaciones Documento PAGA - Contrato No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
8	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1224-2024	11/01/2024	Solicitud de información de retiro de personal Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

9	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1225-2024	05/02/2024	Solicitud de acta de obra contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
10	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1226-2024	05/02/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0024 Hoja de Vida Profesional Social “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
11	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1227-2024	06/02/2024	Estudios y diseños puente Caño Canoa Pr43+180 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
12	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI DIRECTOR TERRITORIAL (E) INVIAS	Villavicencio - Meta	056-0-1228-2024	08/02/2024	Radicación de Acta de Costos e Informe mensual 32 del periodo enero 2024 – contrato de interventoría 1000 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL	Contrato 1000 de 2021

					PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4.	
13	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI DIRECTOR TERRITORIAL (E) INVIAS	Villavicencio - Meta	056-0-1229-2024	08/02/2024	Radicación de plan de cargas vigencia 2024 – contrato de interventoría 1000 de 2021. INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR), EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MODULO 4.	Contrato 1000 de 2021
14	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1230-2024	09/02/2024	Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0020 con asunto "Oficio 056-0-1133-2023 ajustes 2 Informe Mensual No. 25 componente Ambiental, periodo septiembre 22- octubre 21 de 2023."Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
15	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1231-2024	10/02/2024	Respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0017 con asunto: Oficio 056-0-1204-2024, cotizaciones ciclo de vida 2024. Contrato 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS	Contrato 1000 de 2021

					PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
16	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1232-2024	10/02/2024	Tramite a comunicado 2024-DSC-CENV-0018 con asunto "Ajuste y complementación Plan de Gestión del Riesgo, de acuerdo Apéndice G, componente Sostenibilidad" – contrato 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
17	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1233-2024	10/02/2024	Respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0019 con asunto "Monitoreo y seguimiento a los pasos de fauna construidos." – contrato 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
18	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1234-2024	10/02/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0030 Acta de modificación de cantidades de obra N.º 7 – Contrato de Obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

19	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1235-2024	12/02/2024	Acta de obra 32 correspondiente al periodo enero de 2024 del contrato 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
20	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1236-2024	12/02/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0023 con asunto "Propuesta fortalecimiento de viveros, componente Sostenibilidad" Contrato 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
21	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1237-2024	12/02/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0013 con asunto: oficio 056-0-1181-2024 Ajustes Informe Mensual N°25 Componente Sostenibilidad, periodo septiembre 21 – octubre 21 de 2023 y anexos, Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
					Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0016, con asunto: Oficio 056-0-1181-2023:Ajustes Informe Mensual N°26 Componente Sostenibilidad, periodo	

22	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1238-2024	12/02/2024	octubre 21 – noviembre 21 de 2023 y anexos, Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
23	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI DIRECTOR TERRITORIAL (E) INVIAS	Villavicencio - Meta	056-0-1239-2024	12/02/2024	Radicación de Acta de obra 32 mes de enero 2024. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”.	Contrato 1000 de 2021
24	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1240-2024	13/02/2024	Hoja de Vida Profesional Social. Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
25	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1241-2024	13/02/2024	Presunto incumplimiento al Contrato de obra 976 de 2021 “Plan de Gestión de Riesgos y Desastres”. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,	Contrato 1000 de 2021

					MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	
26	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1242-2024	12/02/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0035 Acta de modificación de cantidades de obra N.º 7. Contrato de Obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
27	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1243-2024	14/02/2024	Trabajos en espacios confinados y trabajo en alturas en el puente caño canoa PR 43+190 Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
28	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1244-2024	16/02/2024	Seguimiento a mezcla asfáltica Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
	EDWIN JAVIER BUSTOS				Solicitud de plan de intervención ajustado vigencia 2024 contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	

29	IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1245-2024	15/02/2024	DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
30	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1246-2024	16/01/2024	Respuesta oficio 2024S-VBOG-005990, contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
31	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI DIRECTOR TERRITORIAL (E) INVIAS	Villavicencio - Meta	056-0-1247-2024	16/02/2024	Plan de intervención vigencia 2026 Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
32	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1248-2024	19/02/2024	Solicitud de información de retiro de personal Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021

33	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1249-2024	19/02/2024	Solicitud de constancias de pagos a trabajadores. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
34	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1250-2024	19/02/2024	Instalación de vallas metálicas como medida de compensación de las Resoluciones DSGV-023-22 y DSGV-524-22. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
35	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1251A-2024	20/02/2024	Solicitud de comunicado sobre las acciones sociales propuestas para la vigencia 2024- Componente de sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 y contrato de interventoría 1000 de 2021. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
	GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS				Información hallazgo 08 Procuraduría General de la República IUS E-2022-421699 - IUC D-2022-2528090 V-Contrato de obra 976 de 2021	

36	GODOY SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES INVIAS	Bogotá D.C	056-0-1251B-2024	20/02/2024	"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
37	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1252-2024	20/02/2024	Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0032 con asunto: Oficio 056-0-1217-2023, Informe Ambiental No 28 y anexos, periodo diciembre 22 de 2023 al enero 21 de 2024. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
38	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1253-2024	21/02/2024	Reiteración comunicado 056-0-1243-2024 con asunto trabajos en espacios confinados y trabajo en alturas en el puente caño canoa PR 43+190 del Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ –EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
	GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY				Información hallazgo 11 Procuraduría General de la República IUS E-2022-421699 - IUC D-2022-2528090 V-Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO,	

39	SUBDIRECTOR DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES INVIAS	Bogotá D.C	056-0-1254-2024	21/02/2024	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
40	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1255-2024	22/02/2024	Reiteración comunicado 056-0-1196-2024 con asunto: Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV0005: Informe Mensual N°27 Componente Sostenibilidad, periodo noviembre 21 – diciembre 21 de 2023 y anexos. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
41	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1256-2024	22/02/2024	Reiteración comunicado 056-0-1210-2024 con asunto: Solicitud de Informe Mensual de Sostenibilidad No 28 correspondiente al periodo 21 de diciembre 2023 al 21 de enero 2024. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
					Reiteración comunicado 056-0-1197-2024 con asunto: Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV0006, con asunto: Informe Trimestral No 9 Componente Sostenibilidad, periodo septiembre 21 -	

42	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1257-2024	22/02/2024	diciembre 21 de 2023 y anexos. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
43	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1258-2024	23/02/2024	Respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0026, se solicita el ajuste de los estudios y diseños Pr70+000 al Pr74+198.182 - Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
44	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1259-2024	23/02/2024	Respuesta a comunicado 2024-DSC-CENV-0027, Diseño Geométrico K46+000 AL K46+650 - Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
	ROBERT ESNEYDER CAMPOS NAVARRO				Solicitud para intervención sobre la vía Calamar-Retorno con postes y luminarias solar - Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN	

45	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS	Bogotá D.C	056-0-1260-2024	23/02/2024	JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
46	GABRIEL DAVID SOLARTE VIVEROS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1261-2024	26/02/2024	Presunto incumplimiento numeral 7 "Información sobre el personal profesional" del anexo 1 "Anexo Técnico". “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
47	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1262-2024	26/02/2024	Aprobación de Informe Mensual No 27. Área de Gestión Social- Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
48	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1263-2024	27/02/2024	Remisión Informe Trimestral del área de Gestión Social No 9. Periodo 22 de septiembre al 21 de diciembre de 2023 del Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS	Contrato 1000 de 2021

					PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
49	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1264-2024	27/02/2024	Aprobación de Informe Mensual No 28. Área de Gestión Social- Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
50	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1265-2024	28/02/2024	-Aprobación de Informe Mensual No 29. Área de Gestión Social- Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
51	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1266-2024	29/02/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0022 con asunto: Oficio 056-0-1023-2023, 056-0-1045- 2023, Documento Componente Sostenibilidad V15 y Plan de Inversión Sostenibilidad V2.Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
					Reiteración de constancia a trabajadores de pagos Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO,	

52	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1267-2024	29/02/2024	MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
53	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1268-2024	29/02/2024	Respuesta a los comunicados: 2024-DSC-CENV-0041 con asunto: "Oficio 056-0-1178-2023, Ajustes 2, Informe Mensual Ambiental No. 20 – V3, período abril 22 – mayo 21 de 2023" y 2024-DSCCENV-0049 con asunto: "Alcance Oficio 2024-DSC-CENV-0041, Informe Mensual Ambiental No. 20 – v3, período abril 22 – mayo 21 de 2023". Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
54	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1269-2024	29/02/2024	Respuesta a los comunicados: 2024-DSC-CENV-0040 con asunto "Oficio 056-0-1062-2023, ajustes Informe Mensual Ambiental No. 21, periodo mayo 22 a junio 21 de 2023" y 2024-DSC-CENV-0050: con asunto "Alcance Oficio 2024-DSC-CENV-0040, Informe Mensual Ambiental No. 21 – v3, período mayo 22 – junio 21 de 2023".Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

55	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1270-2024	29/02/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0051 con asunto: Oficio 056-0-1186-2023, Ajustes 2, Informe Mensual Ambiental No. 22 – V3, período junio 22 – julio 21 de 2023. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

Tabla 28 correspondencia enviada mes de febrero 2024.

- *Se realizo elaboración de informes semanales de obra y actualización de la plataforma CIFRA.*
- *La interventoría realizó control y calidad de equipos en obra.*
- *La interventoría realizó control de cantidades en obra para dar cumplimiento con las especificaciones técnica.*
- *La interventoría realizó el seguimiento de las actividades diarias, evidenciado en el libro de Bitácora de obra.*
- *La interventoría realizó verificación de los planos definitivos, así mismo verificar que se están ejecutando los aprobados.*
- *La interventoría realizó durante el mes ejecutado el estado, calidad y cantidad de los equipos mínimos requeridos.*
- *La interventoría realizó seguimiento al avance físico y financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión.*
- *La interventoría realizó comité técnico semanal acompañado por el contratista e INVIAS, para mostrar los avances de obra.*
- *La interventoría elaboración de informes mensuales.*

5.3. Informes especialistas y profesionales

Se presenta informe de los siguientes especialistas, igualmente se encuentran anexos en la carpeta del informe.

Especialista Ambiental	Profesional Ambiental
Especialista en Sostenibilidad	Profesional en apoyo a la sostenibilidad
Especialista Geología y/o geotecnia	Profesional Social
Especialista en Diseño Geométrico	Profesional SST
Líder de Integración	Topografía
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	

. *Tabla 29. Informes especialistas y profesionales*

5.4. Informe del programa anual de caja – PAC

ACTA No.	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
Registro Presupuestal No.420421 De 2021			
Valor del Registro 2021:			$ 1.046.856.448,00
1	$ 0,00	$ 0	$ 1.046.856.448,00
2	$ 16.245.642,00	$ 16.245.642,00	$ 598.877.977,00
3	$ 53.775.264,00	$ 70.021.266,00	$ 567.697.153,00
4	$ 68.842.833,00	$ 138.864.099,00	$ 527.779.880,00
5	$ 111.045.088,00	$ 249.909.187,00	$ 463.392.392,00
6	$ 129.168.239,00	$ 379.077.426,00	$ 388.496.523,00
7	$ 126.021.524,00	$ 505.098.950,00	$ 315.445.229,00
Registro Presupuestal No.136422 De 2022			
Valor del Registro 2022:			$2.095.218.085,00
8	$ 144.993.170,00	$ 650.092.120,00	$ 2.011.166.425,00
9	$ 168.065.628,00	$818.157.748,00	$ 1.913.716.607,00

10	$ 161.311.212,00	$979.468.960,00	$ 1.820.183.215,00
11	$ 185.541.968,00	$1.165.010.928,00	$1.712.580.047,00
12	$ 198.933.085,00	$1.363.944.013,00	$1.597.232.292,00
13	$ 194.142.264,00	$1.558.086.277,00	$1.484.662.408,00
14	$ 232.250.834,00	$1.790.332.111,00	$1.310.962.204,00
15	$ 235.811.012,00	$2.026.148.123,00	$1.115.946.192,00
16	$ 232.470.384,00	$2.258.618.507,00	$883.475.808,00
17	$ 235.477.048,00	$2.494.095.555,00	$647.998.760,00
18	$ 230.652.314,00	$2.724.747.869,00	$417.346.446,00
19	$250.267.860,00	$2.975.015.729,00	$167.078.586,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 136422 De 2022			$0.00
Registro Presupuestal No. 126523 De 2023			$1.047.619.048,00
20	$226.663.842,00	$3.201.679.571,00	$998.033.792,00
21	$216.854.481,00	$3.418.534.052,00	$771.179.311,00
22	$239.954.857,00	$3.658.488.909,00	$531.224.454,00
23	$237.133.604,00	$3.895.622.513,00	$294.090.850,00
24	$227.617.229,00	$4.123.239.742,00	$66.473.621,00
25	$66.406.355,00	$4.189.646.097,00	$67.266,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 1422 De 2022			$0,00
Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$1.957.617.298,00
26	$216.684.237,00	$4.399.400.551,00	$1.747.930.110,00
27	$245.353.526,00	$4.651.683.860,00	$1.741.000.555,00
28	$255133812,00	$4.906.817.672,00	$1.240.512.989,00
29	$261.974.918,00	$5.168.792.590,00	$978.538.071.00
30	$288.073.755,00	$5.456.866.345,00	$690.464.316,00
31	$258.968.662,00	$5.715.835.007,00	$431.495.654,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$431.495.654,00

32	$222.803.305,00	$5.938.638.312,00	$208.692.349,00
Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$1.043.064.183,00
33	$ 248.276.999,00	$ 6.186.915.311,00	$ 1.003.479.533,00


Tabla 30 Información financiera contrato 1000 de 2021

5.5 Informe matriz de riesgos

Se adjunta como anexo al documento informe mensual matriz de riego del contrato de obra 976 de 2021 y contrato 1000 de 2021.

5.6 Informe otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Se realizo el diligenciamiento del programa aplicativo CIFRA, donde se lleva a cabo el reporte semanal del proyecto de obra 976 de 2021.

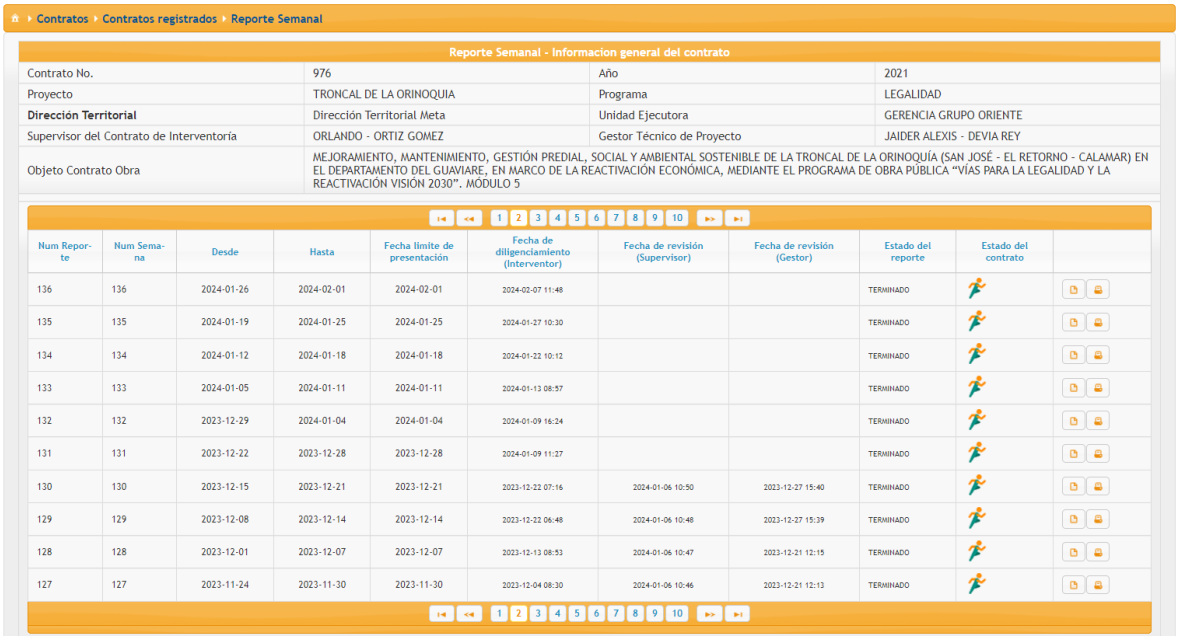

Contratos › Contratos registrados › Reporte Semanal

Reporte Semanal - Informacion general del contrato

Contrato No.	976	Año	2021
Proyecto	TRONCAL DE LA ORINOQUIA	Programa	LEGALIDAD
Dirección Territorial	Dirección Territorial Meta	Unidad Ejecutora	GERENCIA GRUPO ORIENTE
Supervisor del Contrato de Interventoría	ORLANDO - ORTIZ GOMEZ	Gestor Técnico de Proyecto	JAIDER ALEXIS - DEVIA REY
Objeto Contrato Obra	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Num Reporte	Num Semana	Desde	Hasta	Fecha límite de presentación	Fecha de diligenciamiento (Interventor)	Fecha de revisión (Supervisor)	Fecha de revisión (Gestor)	Estado del reporte	Estado del contrato	
136	136	2024-01-26	2024-02-01	2024-02-01	2024-02-07 11:48			TERMINADO		
135	135	2024-01-19	2024-01-25	2024-01-25	2024-01-27 10:30			TERMINADO		
134	134	2024-01-12	2024-01-18	2024-01-18	2024-01-22 10:12			TERMINADO		
133	133	2024-01-05	2024-01-11	2024-01-11	2024-01-13 08:57			TERMINADO		
132	132	2023-12-29	2024-01-04	2024-01-04	2024-01-09 16:24			TERMINADO		
131	131	2023-12-22	2023-12-28	2023-12-28	2024-01-09 11:27			TERMINADO		
130	130	2023-12-15	2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22 07:16	2024-01-06 10:50	2023-12-27 15:40	TERMINADO		
129	129	2023-12-08	2023-12-14	2023-12-14	2023-12-22 06:48	2024-01-06 10:48	2023-12-27 15:39	TERMINADO		
128	128	2023-12-01	2023-12-07	2023-12-07	2023-12-13 08:53	2024-01-06 10:47	2023-12-21 12:15	TERMINADO		
127	127	2023-11-24	2023-11-30	2023-11-30	2023-12-04 08:30	2024-01-06 10:46	2023-12-21 12:13	TERMINADO		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imagen 43. Informe de programa CIFRA

a. Seguimiento estado del trámite certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

A la fecha no se han realizado tramites.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

Anexo 17

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría (MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

Anexo 18

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-9)

Anexo 19

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-13)

Anexo 20

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-15)

Anexo 21

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

a. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-3-FR-1)

Anexo 22

a. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-3-FR-2)

Anexo 23

b. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

(MEPI-MN-IN-9-FR-2)

Anexo 24

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente periodo se generaron los siguientes requerimientos y recomendaciones las cuales fueron citadas mediante comunicados y en las actas de control y seguimiento de obra:

- ✓ En el periodo informado contamos con carpeta asfáltica en primera capa acumulado de 11.17 ml y en segunda capa 8.690 ml.
- ✓ Para el periodo el contratista no presente atraso en la ejecución física, con una inversión ejecutada acumulada del 44.14%, frente a una inversión programada 42.65%.
- ✓ En el mes de enero de 2024, la contratista continua con los permisos ambientales vigentes para el desarrollo de las obras en cuanto a: Ocupación de cauces (3 permisos) concesión de aguas (1 permiso), aprovechamiento forestal (1 permiso vigente y 1 permiso ya cerrado con la corporación ambiental), emisiones atmosféricas (1 permiso). Cabe resaltar que están pendientes las medidas de compensación para dos (2) permisos de ocupación de cauces cuyo plazo se vence en el mes de marzo de 2024, la interventoría en este sentido generó un comunicado 056-0-1213-2024 del 30 de enero de 2024, con la solicitud de implementación inmediata de las medias de compensación resoluciones DSGV-023-22 y DSGV-524-22
- ✓ La interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de la programación de cierre de los compromisos establecidos con los propietarios, en relación a la adecuación de accesos, entradas y perfilación de taludes, en ese sentido se informa que se cuenta con 41 actas de compromisos de las cuales 10 están cerradas y 31 abiertas en atención por parte del contratista.
- ✓ A la fecha se ha girado al consorcio Ecovisión-190 $755 millones por concepto de anticipo, de un total de $9.243 millones a girar según lo establecido por el contrato 1000 de 2021, lo que indica que se ha girado el 8.17% del anticipo.
- ✓ A la fecha se ha girado al consorcio DSC $27.011 millones por concepto de anticipo, de un total de $86.654 millones a girar según lo establecido por el contrato 976 de 2021, lo que indica que se ha girado el 38.17% del anticipo

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha recibo

Anexos en la carpeta del informe

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

8.4 Bitácora

Se encuentran anexos en la carpeta del informe
