23-ABRIL 2024 MARTES

DIA: SOLEADO

PERSONAL: DIRECTOR DE OBRA

ACTIVIDAD: RECIBO FISICO DEL ESPACIO A INTERVENIR.



29 ABRIL: LUNES.

DIA: NUBLADO

PERSONAL: CUADRILLA TOPOGRAFICA

EQUIPO: ESTACIÓN TOPOGRAFICA, ESTACAS HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE REALIZA TOMA DE NIVELES Y TOPOGRAFIA DEL PARQUE. DESDE LA CALLE 143 CON CARRERA 8 HASTA LA CARRERA 10ª SE REALIZAN MEMORIAS DE CANTIDADES EN OFICINA Y SE REALIZA (AD) LISTADO DE DUDAS PARA HACER SOLICITUD. DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..

CONSTRUCTORA CONCONCRETAR SA.







UBICACIÓN PUNTOS DELTA DE REFERENCIA EN ANDENES PARA TOMAR NIVELES

Powered by CamScanner

JUEVES 2 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL: COMISIÓN TOPOGRÁFICA 1 OFICIAL 1 AYUDANTE

EQUIPO: ESTACIÓN TOPOGRÁFICA

ACTIVIDAD: SE REALIZA VERIFICACIÓN Y VISITA DE OBRA PARA TERMINAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO / SE CONTINUA EN OFICINA CON MEMORIAS DE CANTIDADES EN PLANOS. / SE REALIZA DOCUMENTACIÓN PARA SOCIALIZACIÓN DIA MARTES 7 DE MAYO EN EL SECTOR. CON VECINOS PARA ACTAS DE VECINDAD Y REUNIÓN LUNES 6 DE MAYO PARA SOCIALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN PERSONAL A LA COMUNIDAD.

RESIDENTE OBRA

EDUARDO.

LUNES 6 DE MAYO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 DIRECTOR DE OBRA, 1 RESIDENTE OBRA, 1 COMUNICADORA SOCIAL 1 PROFESIONAL SST.

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: REUNIÓN SOCIALIZACIÓN DE PROYECTO Y PRESENTACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA. A LA COMUNIDAD.

RESIDENTE OBRA



EDUARDO.

MARTES 7 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 DIRECTOR, 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: SE DESARROLLA VISITAS DE LAS CASAS O CONSTRUCCIONES AL FRENTE DE LA OBRA PARA REALIZAR ACTAS DE VECINDAD QUEDANDO PENDIENTE LA IGLESIA POR NO ENCONTRARSE NADIE EN ÉSTE DIA.

RESIDENTE OBRA

Powered by CamScanner






MIERCOLES 8 DE MAYO

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 DIRECTOR 1 RESIDENTE DE OBRA

EQUIPO: N/A

ACTIVIDAD: SE REALIZA VISITA DE OBRA PARA ENTREVISTAR MAESTROS CONSTRUCTORES PARA CONTRATAR MANO DE OBRA CALIFICADA Y SE BUSCA UN PREDIO O CASA PARA OFICINA Y BODEGA.

EDUBAR SA. [illegible] RESIDENTE OBRA

JUEVES 9 DE MAYO


DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR DE OBRA


EQUIPO: N/A.


ACTIVIDAD: SE REALIZA VISITA O REUNIÓN PROGRAMADA EN LA ALCALDIA SEPTIMO PISO CON EDUBAR, SUPERVISOR, PARA TOCAR TEMAS RELACIONADOS AL PROYECTO

NIVEL ANDEN Y HUELLA

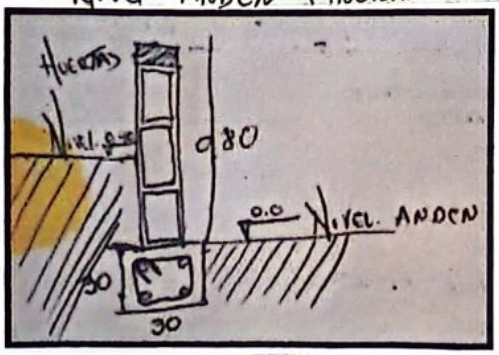

NIVEL BORDILLO

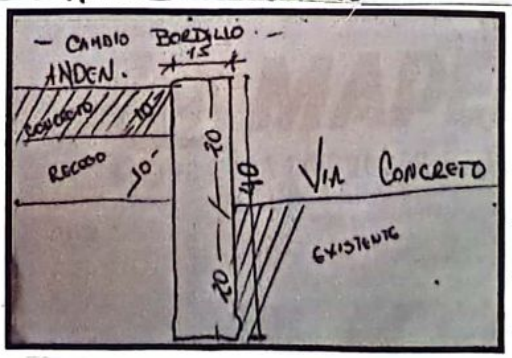

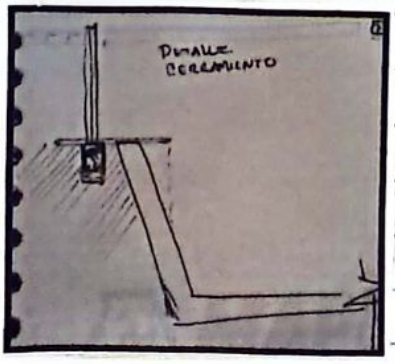

LOCALIZACION CERRAMIENTO A CANAL.

[illegible] RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

13 MAYO LUNES FESTIVO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 OPERARIO MINICARGADOR.

EQUIPO: BOBCAT.

ACTIVIDAD SE DA INICIO CON DESCAPOTE MECANICO Y LIMPIEZA DE BASURA ACTIVIDAD SE GENERA DE 7:00AM A 1:00 PM

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.

14 MAYO MARTES.

DIA SOLEADO

PERSONAL: 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT:, 1 [illegible]

EQUPO: BOBCAT.

ACTIVIDAD: SE CONTINUA CON DESCAPOTE CAPA VEGETAL Y LIMPIEZA DEL PREDIO SE TRABAJO 2:30 HORAS DE BOBCAT. Y SE RETIRA 4 VIAJES DE MATERIAL.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA.





15 DE MAYO MIERCOLES

DIA NUBLADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 DIRECTOR, 1 PERSONA TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERARIO BOBCAT

EQUIPO BOBCAT.

ACTIVIDAD: SE REALIZA LIMPIEZA Y DESCAPOTE EN LA PARTE POSTERIOR DEL PREDIO SOBRE CALLE 29 / SE RECIBE VISITA POR PARTE DE EDUBAR ARQ. JOSÉ HERNÁNDEZ ACOMPAÑADO DE ING AMBIENTAL Y SST. TOMAN REGISTRO CON DRON Y REALIZAN RECOMENDACIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD DEJANDO COMO OBSERVACIÓN NO TALAR 2 ARBOLES REPRESENTATIVOS LOS DEMAS SON MALEZA QUE SE PUEDE LIMPIAR., LLUEVE DOS HORAS EN LA TARDE POR TAL MOTIVO NO SE PUEDE CONTINUAR CON LA ACTIVIDAD.

RESIDENTE OBRA

EDUBAR SA









Powered by CamScanner

16 MAYO JUEVES
DIA NUBLADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES.
EQUIPO: BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE INICIA CON EXCAVACIÓN MECANICA Y SE TERMINA DESCAPOTE SOBRE LA CALLE 143 B SOBRE FRANJA DE 12 MTS PARA PRIORIZAR EJECUCIÓN OBRA DE ANDEN.



17 MAYO VIERNES
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT.
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
EQUIPO BOBCAT Y HERRAMIENTA MENOR
ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN EN FRENTE DE LA FERRETERIA Y SE CONTINUA CON LA INSTALACIÓN DE MADERA PARA ESTRUCTURA EN CERRAMIENTO COSTADO CANAL SE COMPLETA 80 M/L APROX.






18 MAYO SABADO
DIA SOLEADO
PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT
1 MAESTRO, 4 AUXILIARES
EQUIPO BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR.
ACTIVIDAD SE CONTINUA CON INSTALACIÓN ESTRUCTURA EN MADERA PARA CERRAMIENTO Y EXCAVACIÓN MECANICA PARA ANDEN. PROCESO SE REALIZA CORTE DE 0.40 CM DE PROFUNDIDAD

19 MAYO DOMINGO

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINA

EQUIPO BOB CAT: HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD SE CONTINUA CON UNA EXCAVACIÓN DE APROXIMADAMENTE 150M² EN PROFUNDIDAD DE 0,20 MTS SE TRABAJA DE 7:00AM A 3:00PM EN JORNADA CONTINUA.

RESIDENTE OBRA

20 MAYO LUNES

DIA SOLEADO


PERSONAL 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINA 1 OFICIAL 4 AUXIL.

EQUIPO BOB CAT. - VOLQUETAS - HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD /SE REALIZA RETIRO DE 20 VIAJES DE VOLQUETAS 160 M3 APROX DE MATERIAL / SE CONTINUA APERTURA DE HUECOS, INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA MADERA PARA CERRAMIENTO E INSTALACIÓN DE TEJA ZINC. PODA DE ARBOLES NO MADERABLES Y NO REPRESENTATIVOS (MALEZA).

RESIDENTE OBRA

21 MAYO MARTES



DIA LLUVIOSO

PERSONAL 1 RESIDENTE 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR MAQUINARIA BOBCAT 1 OFICIAL 4 AUXILIARES

EQUIPO BOB CAT. - HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: CONTINUA LA EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN MECANICA 30 M3 PARA TOTAL DE 390 M3 DE EXCAVACIÓN. INSTALACIÓN DE MADERA PARA CERRAMIENTO 286 ML. / INSTALACIÓN DE LAMINA DE ZINC. 253 ML. Y PODA DE MALEZA RAMAS Y LIMPIEZA DE BASURA / SE REALIZA TRABAJO EN CONJUNTO CON CLARO PARA TOMAR NIVELES Y TAPAR TUBERIA EXPUESTA POR EXCAVACIÓN SIN NINGÚN CONTRATIEMPO

RESIDENTE DE OBRA

Powered by CamScanner

los M3 indiquen el Volumen de Descapote (e=0.25).





22 DE MAYO MIERCOLES

DIA LLUVIOSO

PERSONAL: 1 RESIDENTE · 1 TRABAJADORA SOCIAL · 1 OPERADOR BOBCAT, 1 TRABAJADORA SST, 1 OFICIAL, 4 AUXILIARES

EQUIPO: BOB-CAT HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: SE CONTINUA EXCAVACIÓN MECANICA SEGUNDA CAPA 20cm ENTRE LA CABRERA 28D-28C. TOTAL 28 M3 APROX. / COLOCACIÓN ARMADO ESTRUCTURA MADERA PARA CERRAMIENTO E INSTALACIÓN TEJA DE ZINC TOTAL 286.39 ML / SE REALIZA ACTIVIDAD EN CONJUNTO CON LA EMPRESA CLARO PARA CAMBIO DE TUBERIA Y EXCAVACIÓN PARA ENTERRAR TUBERIA EXPUESTA. SE LES INFORMA QUE EL NIVEL DEL ANDEN ESTA SOBRE LA VIA A 20CM Y ELLOS TIENEN CAJA DE INSPECCIÓN SOBRE 50cm SOBRE SALE DEL NIVEL DEL ANDEN., MANIFIESTA QUE SE DEBE PASAR SOLICITUD PARA MODIFICAR NIVEL DE CAJA EXISTENTE. X TAL MOTIVO SE SOCIALIZARA CON INTERVENTORIA PARA NO TENER INCONVENIENTES EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. EDWIN PEREZ RESIDENTE — EQUIVIAL SA.

23 DE MAYO JUEVES

DIA SOLEADO

PERSONAL 1 RESIDENTE, 1 TRABAJADORA SOCIAL, 1 OPERADOR BOBCAT, 1 MAESTRO, 4 AUXILIARES DE OBRA

EQUIPO: 1 BOBCAT, HERRAMIENTA MENOR

ACTIVIDAD: RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 33 VIAJES DE 8M3 CONTINUACIÓN EXCAVACION Y NIVELACIÓN CON MAQUINARIA h= 60 CMS CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO PROVICIONAL PARA FIGURAR ACERO EN OBRA, SE CONTINUA CON PODA DE VEGETACIÓN PARA CONTINUAR LIMPIEZA DEL PREDIO / EDWIN PEREZ RESIDENTE OBRA — EQUIVIAL SA

Powered by CamScanner
