MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL META

INTERSA S.A.

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 1 LOTE 6

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS
CONTRATO N° 2619-2023

PERÍODO: DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

VILLAVICENCIO-META

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7/112023

Contrato de Obra No. ---------- **Contratista:** ----------

Contrato de Interventoría No. 2619 DE 2023 **Interventoría:** INTERSAS.A

Objeto Contrato de Obra:

INFORME MENSUAL No. 1 **MES O PERIODO:** OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	2
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCION**		4
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		5
2.1	Localización		6
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		10
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		17
2.4	Caracteristicas técnicas del proyecto		11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		17
3.1	Información general del contrato		17
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		20
3.3	Seguimiento Items no previstos		23
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	34
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	38
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	39
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	40
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	41
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	42
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	72
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	73
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	74
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	75
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		77
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre: WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. de fecha

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe hace referencia a lo ejecutado por la Administración de Mantenimiento Vial Grupo 1 Modulo 4 a cargo de la empresa INTERSA S.A.**,** dentro de la ejecución del Contrato de Consultoría N°2619 de 2023, durante el Período Nº 2 comprendido entre el 1 al 31 de Octubre de 2023 y está dirigido a que el **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS,** se informe sobre lo sucedido en los sectores a cargo de esta Administración, que le permita tomar las decisiones pertinentes y que posteriormente sea un referente de consulta.

Este documento resume la descripción de las actividades desarrolladas mediante el seguimiento y la observación física de:

- Las actividades que se han ejecutado y de la confrontación técnica de la metodología de ejecución.

- Características y evaluación del producto ante las especificaciones que lo rigen. (Indicadores de Mantenimiento Rutinario).

Durante el periodo en mención la Administración de Mantenimiento Vial ha contado con toda la logística suficiente requerida para la labor encomendada.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


El Instituto Nacional de Vías, considerando que dentro de los planes y programas del Instituto Nacional de Vías se encuentra prevista la ejecución de la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL META**; con base al cual adjudicó el Contrato de ADMINISTRACION VIAL a la firma **INTERSA S.A.** NIT 860.450.644-3, de acuerdo con la oferta presentada por un valor de $ 382.195.352, incluido el IVA.

El objeto de dicho Contrato es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 1 LOTE 6

Las vías, sectores y longitudes a cargo del Grupo 1 de la Territorial Meta, son de gran importancia, ya que permiten la comunicación y transporte de carga desde los Departamentos del Guaviare, Guainía, Vichada y Casanare hacia el Meta y de todos ellos con la capital y el resto del país. Tienen un gran flujo vehicular que se desplaza desde los llanos orientales hacia el centro y resto del país; siendo destacados los renglones de hidrocarburos, ganadería, agricultura y turismo.

2.1 LOCALIZACION VIAS A CARGO

- **RUTA 40MTA VIA PIPIRAL VILLAVICENCIO**

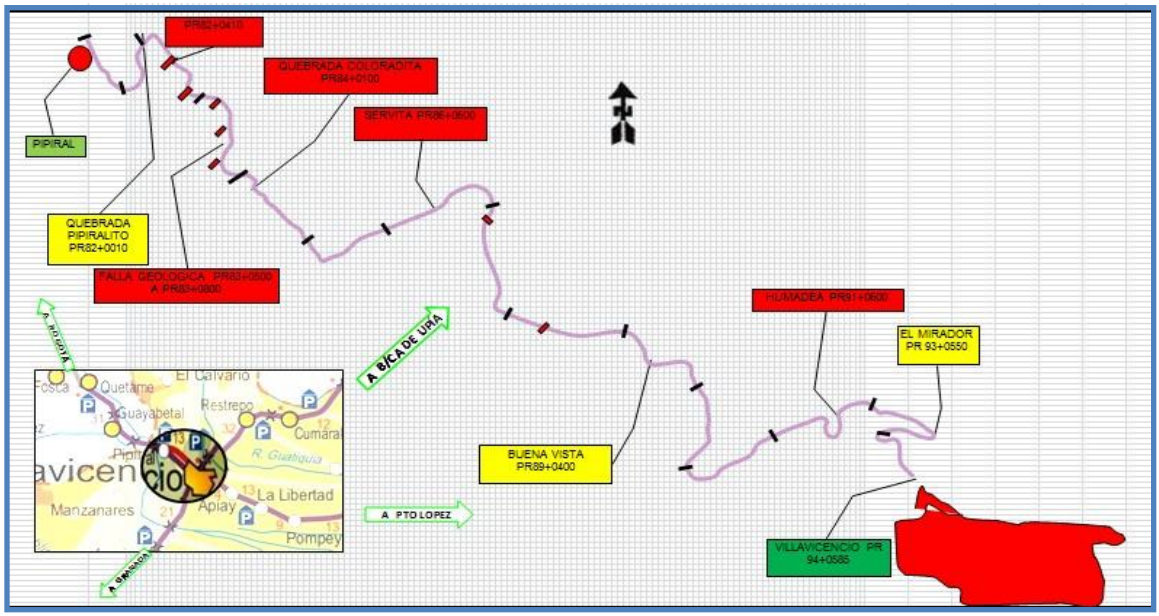

La Ruta 40 MTA: Pipiral - Villavicencio, es el sector comprendido entre el PR 80+0000, Centro poblado Pipiral, hasta el PR 94+0500, sitio denominado La Casa del Tigre (entrada a Villavicencio) por la vía antigua, está emplazada en terreno montañoso y escarpado, presentando diversos problemas de inestabilidad resultado de las fallas geológicas que atraviesan la cordillera.


Esta vía está ubicada en la estribación derecha de la cordillera oriental en el Departamento del Meta, por estar en el pie de monte llanero, su clima es variable dada la altura sobre el nivel de mar donde está ubicada la vía entre 900 y 500 msnm afectada por los vientos cálidos de los Llanos Orientales y muy lluviosa todo el año donde puede llegar a tener una precipitación anual de 3000 a 4000 mm.

Por el trazado de la vía confluyen diferentes fallas geológicas que la hacen altamente inestable. El flujo vehicular en un alto porcentaje está constituido por vehículos de transporte de hidrocarburos, cargas peligrosas, cargas extra dimensionadas, semovientes y de motocicletas, tráfico que tiene restricción para circular por los túneles de Bijagüal y Buenavista de la nueva carretera Bogotá - Villavicencio: Ruta 4006. Así mismo la vía cuenta con una ruta transporte urbano y una ruta de camperos que viajan hasta los municipios de Guayabetal, Puente Quetame, San Juanito, El calvario, entre otros.

El fondo de adaptación hizo una inversión en esta vía con el Contrato 1230 de 2013 cuyo fin fue mejorar la movilidad sobre todo en el sector urbano del PR94+500 a la Glorieta de la Grama donde se reemplazó


totalmente la estructura de la vía, se hicieron obras de urbanismo entre otras, también se intervinieron en algunos puntos críticos de la vía 40MTA donde se hizo la construcción total del puente la Colorada, se hizo una estructura en voladizo anclada a la montaña terminada con New Jersey en el PR 82+300, rehabilitaron cunetas, alcantarillas que se encontraban deterioradas y construyeron disipadores para mitigar la acción del agua en los predios donde están ubicados algunos descoles de las alcantarillas y/o drenajes.

- **RUTA 65MTE VIA PUENTE GUATIQUIA (VIEJO) – CRUCE LOS CABALLOS**

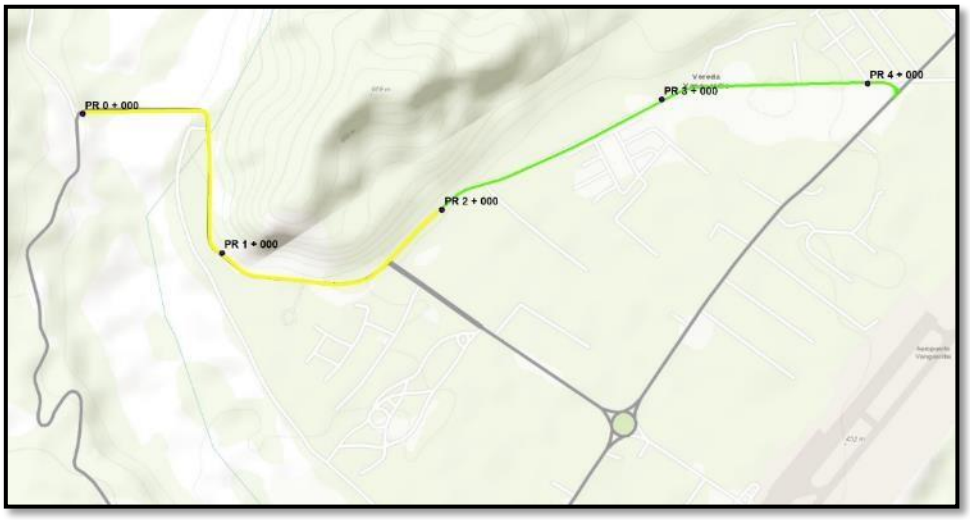

La Ruta 65MTE Puente Guatiquia – Los Caballos, es jurisdicción del Municipio de Villavicencio, tiene una longitud de 3,8 Km con una estructura de pavimento flexible su totalidad, se encuentra deteriorada en algunos puntos dada la falta de obras de drenaje y el mal funcionamiento de las existentes. Es un terreno empotrado en el pie de monte llanero, en el que el talud izquierdo es escarpado y el derecho plano. La importancia de este corredor actualmente radica en que, debido al crecimiento de la ciudad, se ha convertido en la vía que comunica los barrios periféricos del norte de Villavicencio, con el centro de la misma. Pertenece a esta ruta el río Guatiquia como principal fuente hídrica, que es represada en su parte alta para dar origen junto a al rio Chuza y la Quebrada Leticia a la hidroeléctrica de Chingaza, la cual surte la energía eléctrica de gran parte del país.

❖ **RUTA 6509 VIA YE GRANADA - VILLAVICENCIO**

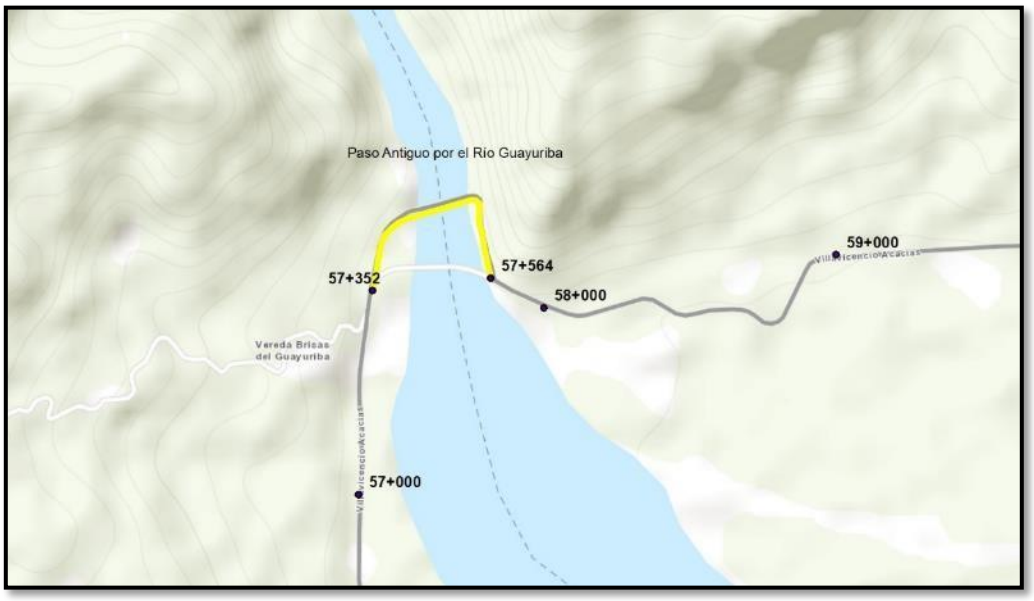


La Ruta 6509: Ye de Granada – Villavicencio, es de gran importancia no solo para el Departamento del Meta sino para el centro del país, puesto que a través de ella salen los productos provenientes de la región del Ariari que es potencialmente "*La Despensa Agrícola de Colombia*", además es la Ruta de entrada y salida hacia la región de la Amazonía Colombiana, ya que a través de ella se comunica con el Departamento del Guaviare.

El relieve de esta zona varía desde las cálidas praderas de la región del Ariari, donde se encuentra enclavado el municipio de Granada hasta las características propias de las zonas de ladera de la cordillera oriental en la que se ubican los municipios de San Martín, Guamal, Acacias y Villavicencio.

Esta importante ruta tiene una longitud de 72,809 Km, que en su totalidad se encuentran en pavimento flexible en buen estado, corredor que el Estado entregó a la firma Autopistas de los Llanos bajo el modelo de Concesión Vial siendo ella la encargada de los estudios, diseños definitivos, obras de rehabilitación, operación, mantenimiento y administración de la misma desde 1994, permaneciendo bajo competencia del INVIAS y por ende de la AMV solamente la atención del puente Guayuriba en la Ruta, de Guayuriba que suma 1,212 Km, quedando modificada parcialmente mediante la Resolución Nº3720 del 5 de Junio de 2015, haciendo entrega de los sitios a la Concesión Vial de los Llanos.

El paso por el puente Guayuriba viejo queda a cargo del Instituto Nacional de Vías y por ende su mantenimiento lo seguirá realizando la Administración Vial.

- **RUTA 4010 VIA PUENTE ARIMENA – LA AREPA 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 – EL PORVENIR**

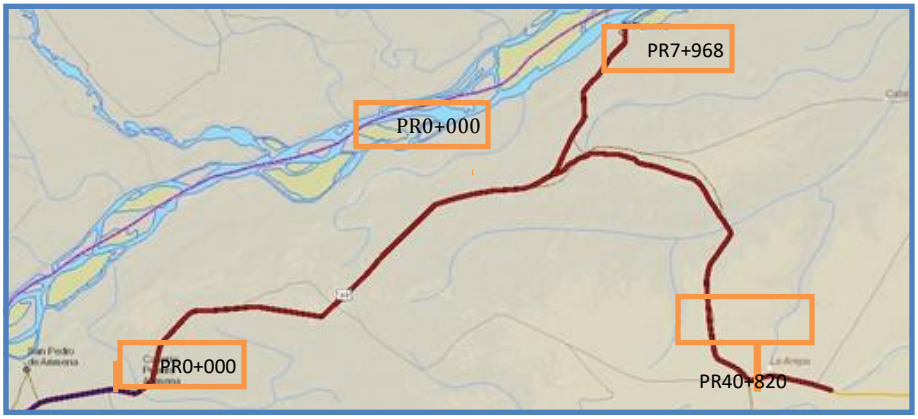

La Ruta Nacional 38 fue una carretera nacional en Colombia que iniciaba en el cruce de la Ruta 40 cerca al Puente Arimena en el Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta y finaliza en el Centro Poblado de Puerto Nariño en el Departamento del Vichada.

La Resolución 3700 de 1995 estableció 3 tramos contiguos. Del cruce de la Ruta 40 al Sitio conocido como La Arepa, de La Arepa al sitio conocido como Gaviotas y de Gaviotas al municipio de Cumaribo. No fue diseñado tramo entre Cumaribo y Puerto Nariño. La Resolución 339 de 1999 elimina la Ruta.

En la actualidad la ruta 4010 tiene su PR0+0000 saliendo del centro poblado de Puente Arimena; en el PR 21+0000 de esta ruta 4010, se encuentra el inicio PR0+0000 de la ruta 40MT01, la cual cuenta con menos de 8 km de vía.

Para retomar el recorrido por la ruta 4010 hay que tomar un acceso distinto para llegar al punto donde debe continuar el trazado de la vía, de dicho punto en adelante, a 9 km aproximadamente se encuentra el Puente y Gloria, y 7 km después se encuentra el cruce sector Carimagua, para continuar y finalizar en el Cruce Guacacias.

De acuerdo a los recorridos hechos por la AMV GRUPO 1 a los corredores viales correspondientes, en los cuales se realizan las inspecciones a la vía, se detalla lo siguiente:

- **RUTA 40MTA**

La AMV-G1 realiza la inspección de la vía y hace seguimiento a la empresa de mantenimiento rutinario en su respectivo sector a cargo.

Durante el periodo que se informa se presentaron pequeños derrumbes en el sitio crítico 83+500los cuales caen en el encole del Box, los cuales fueron removidos con la maquinaria del contrato 1646-2021, destinado para tal fin. Es necesario señalar la existencia de sitios de inestabilidad geológica en la Ruta 40MTA, de los cuales se advierte de la continua ocurrencia de derrumbes en las épocas de lluvias asociados a lo anterior, en diferentes puntos ya que se presentan pequeños derrumbes en diferentes PRs cada vez que llueve. En caso de presentarse, la empresa de mantenimiento rutinario trabajará con mano de obra, removiendo material y señalizando estos puntos siempre y cuando los derrumbes sean de menor tamaño de lo contrario se atenderán con el contrato de monto agotable o el contrato que se encuentre en ejecución en este corredor vial y haga sus veces, con el fin de mitigar los daños causados por los puntos de inestabilidad geológica. En los PR 86+500 y 86+650 es necesario realizar la limpieza de los box culvert 1,2 y 3 de forma mecánica dadas las dimensiones de estos y la cantidad de material que se presenta continuamente, construidos por CONSORCIO PIPIRAL a través del contrato 1301 de 2018.

La AMV G-1, cuenta con información actualizada del inventario de Señalización Vertical y obras de arte (Alcantarillas) ubicadas a lo largo de la Vía 40 MTA Pipiral – Villavicencio; en el recorrido se observan varias que se encuentran totalmente obstruidas, otras colmatadas debido a que en algunos casos las tuberías empleadas para estas alcantarillas son de 24 Pulgadas, tubería que no se considera apta por las nuevas normas para este tipo de alcantarillas, y que datan de bastantes años, sumado a la cantidad de material que se desprende del talud superior cada vez que llueve, lo que genera que sus condiciones dificulten el mantenimiento rutinario, y las secciones laterales de encoles y descoles tampoco ayudan al mantenimiento de estas obras hidráulicas por lo reducido de sus dimensiones.

Se realiza continuamente la inspección del estado del pavimento flexible vía Pipiral – Villavicencio vía 40MTA entre el PR 80+0000 AL PR 94+0583; Se encontraron en los tramos observados patologías como: fisuras longitudinales, fallas de media luna, deformación vertical permanente (ahuellamiento), entre otros. Los sectores con mayor severidad de daño y a los que se debe enfocar la intervención en la recuperación de la estructura del pavimento, debido al estado de los daños que presenta, son: PR 86+0200 al PR 86+0650; PR 88+0000 al PR 88 +0250, PR 91+0000 al PR 91+0780 y del PR 92+0000 al PR93+0380. Adicionalmente sobre la longitud de la vía se hacen visibles algunas de las fallas geológicas que causan grandes desplazamientos de la estructura de la vía y demás estructuras hidraulicas, que se presentan en los PR (83+0600 – 83+0800) Sitio con mayor afectación debido a que se desplaza alrededor de 20 cm por año, lo que hace necesario realizar re nivelación y rectificación de la curva vertical por lo menos una vez cada año para poder garantizar la transitabilidad de los vehículos pesados; el otro punto de falla geológica es el PR(89+300 – 89+450) donde se desplaza verticalmente uniformemente formando un escalón que dificulta la transitabilidad y genera riesgo de accidentalidad en mayor grado para los motociclistas. En cuanto al PR(91+400 – 91+500) donde se afecta por la falla el Mirador se presenta falla de media luna con un desplazamiento acelerado, se está revisando que

tipo de solución se puede construir para controlar la reptación del talud inferior y así controlar el desplazamiento de la estructura de la vía, lo anterior lo realiza el contrato 1646-2021 con quien se están realizando estudios y diseños de los sitios críticos.

Adicionalmente, en los puntos críticos 82+000, 82+0500, 83+500, 84+0500, 88+0800 y 94+0350 presentan perdida de banca por socavación y falla rotacional del talud, por lo anterior, es necesaria la intervención urgente de los mencionados puntos ya que está en alto riesgo la seguridad de los usuarios y la estabilidad de la vía. Como se dijo anteriormente el contrato 1646-2021 está realizando los estudios y diseños y/o actualización de los existentes pero aún no se ha definido cuales se van a intervenir según los recursos asignados a este tramo vial.

La empresa Mantenvial JP Ltda realiza actividades de mantenimiento rutinario en la vía limpiando continuamente las obras de drenaje que se obstruyen por el material de arrastre, así mismo se realiza la remoción de material vegetal que se deposita sobre la carretera a causa de las fuertes lluvias.

Se debe tener en cuenta que las obras de drenaje de esta vía fueron construidas hace más de 20 años, lo cual indica que no están diseñadas para el caudal actual teniendo en cuenta la precipitación que se presentan en esta zona del país y el cambio climático que hoy se enfrenta.

Desde hace varios meses se informó del deterioro de la carpeta asfáltica y estructura de la vía, en el PR92+900 a 93+000 tramo que fue rehabilitado en el año 2020 por el contratista Consorcio OIS 2019, por lo que se realiza informe dirigido a la territorial con el fin que se realice la gestión pertinente. Respecto a este tramo en garantía, se realizó presupuesto donde se estima el valor de la obra para garantizar la estabilidad de la vía y la seguridad de los usuarios. Mientras INVIAS realiza el trámite del llamado en garantía al contratista, la empresa de mantenimiento rutinario Mantenvial JP Ltda. Está encargada de realizar el bacheo diariamente con material granular y garantizar la seguridad de los usuarios. Se recibió comunicación del Contratista donde programa realizar obras para reparar los daños antes descritos en la tercera semana de enero de 2023, a la fecha de este informe no se ha presentado el contratista ni ha dado inicio a dichas obras.

En este mes se presenta avance en las obras de mitigación de los sitios críticos 82+700, 83+350, 88+800 y 84+500 con la construcción de caisson para la cimentación de muros de contención, en la perdida de banca del PR82+700 el INVIAS sigue vigente la resolución No 04156 de 04-11-2022 para el cierre total de la vía entre las 20:000 horas y 4:00 horas, por seguridad de los usuarios, igualmente el contrato 1545 de 2021 debe realizar el control del trafico ya que esta restringido a un carril.

RESUMEN	LONGITUD Km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%
PAVIEMNTADO	14,583			7,283	49,94%	4,1	28,11	3,2	21,94		
NO PAVIMENTADO	0										

- **RUTA 65MTE**

En los recorridos rutinarios que hace esta administración en compañía del señor José Tito Parrado Representante legal del contrato de mantenimiento rutinario número 2085 de 2019 se pueden evidenciar los siguientes daños importantes en las estructuras:

La mayoría de las alcantarillas continúan con conexiones de aguas servidas y negras de las casas y negocios cercanos a estas, lo cual ya es de conocimiento de INVIAS y Cormacarena, se encuentra en proceso de sanción.

En los PR2+060 y PR2+180 donde en anteriores meses se reportó el riesgo por socavación del talud en el encole y descole de las alcantarillas, se realizó la obra de cambio de diámetro de las dos alcantarillas, el descole al que el contratista conecto la salida de las alcantarillas no entrega a una fuente hídrica, simplemente se termina el canal ya que los propietarios de los predios adyacentes a la vía rellenaron los descoles para construir los accesos a dichos predios, se realizó la adecuación del descole para dar solución al tema con mano de obra de la empresa de mantenimiento rutinario Mantenvial JP Ltda

Se continúa esperando que INVIAS realice los estudios y diseños para determinar si el Puente Guatiquia requiere obras de reforzamiento estructural y si es necesario restringir el paso de todo vehículo pesado.

RESUMEN	LONGITUD Km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%
PAVIEMNTADO	3,740		0,00%	2,800	74,87%	0,940	0,251				
NO PAVIMENTADO	0										

- **RUTA 6509 PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA**

Cabe mencionar que La Variante Puente Antiguo Guayuriba, es un tramo en desuso. En el tramo de esta Ruta 6509 PR 57+0352 – PR 58+0564 “Guayuriba Viejo”, se evidencia la necesidad de realizar estudios y diseños de manera inmediata para asi poder determinar que tipo de obras son las necesarias para controlar la afectación que se presenta en el PR 58+230

En cuanto al Puente, a nivel de superestructura se aprecia la falta de andenes, la necesidad de

recuperación de la losa y en las barandas metálicas se hace necesario Sandblasting y pintura, a nivel de infraestructura se evidencia sedimentación, y posible socavación en pilas y estribos, al igual que erosión y socavación del talud superior.

Se realizan las jornadas de mantenimiento rutinario programadas para mejorar en el cumplimiento de algunos indicadores como limpieza del puente, limpieza de cunetas, poda de árboles y limpieza de la calzada, entre otros.

En el seguimiento a las obras de mitigación realizadas en diciembre de 2021, donde se construyó un muro de gaviones para proteger el estribo No 1 del Puente Guayuriba; se evidencia que el día 7 de Septiembre se presenta creciente súbita del caudal del Rio Guayuriba que inunda el área del estribo y causa el fallo por socavación de parte de la estructura, se realiza visita con el Ing. Rory especialista en Geotecnia de INVIAS y se espera el informe de la visita.

Se recomienda realizar con prioridad los estudios y diseños para proponer la solución de los dos sitios críticos de esta vía, el periodo de invierno que causa crecientes súbitas del rio Guayuriba que va deteriorado cada vez más la estructura de contención, lo que ya se ve reflejado en la perdida de relleno del aproche y daño en la carpeta asfáltica.

RUTA	RESUMEN	LONGITUD Km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
			LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%
PUENTE GUAYURIBA	PAVIMENTADO	1,021			0,48	47,01%			0,541	52,99%		
	NO PAVIMENTADO	0										

- **RUTA 4010 – 40MT01**


La Ruta 4010 inicia en el Centro poblado de puente Arimena, Municipio de Puerto Gaitán, los primeros 350 metros fueron pavimentados a través de un convenio interadministrativo con el municipio, en pavimento rígido, aproximadamente los 9 a 10 km iniciales de vía están en condiciones medianamente en aceptables para su transitabilidad; condiciones que pasado el kilómetro 12 y hasta el kilómetro 20 cambian de regular a malo.

En el PR 21+0000 de la Ruta 4010, los mojones de referencia se encuentran con el PR 0+0000 de la Ruta 40MT01 concluyendo allí su trazado, dado que al lado de la vía se encuentran lotes cercados que impiden el acceso al trazado original de la vía, situación que se ha informado desde el mes de diciembre de 2016 por las administraciones viales anteriores, las cuales realizaron informes técnicos y de invasiones al respecto y realizaron la denuncia en la alcaldía de Puerto Gaitán; debido a lo anterior, se debe tomar un acceso distinto para llegar al punto donde debe continuar el recorrido. De este punto en adelante, se ha perdido el trazado de la vía, sólo se encuentran huellas, no existen mojones de referenciarían a los lados, ni delimitación alguna, además hay que abrir broches para acceder a

continuar con el recorrido de la misma; se logró detectar que a lo largo de la ruta después del PR 21+0000 hasta el Cruce sector Carimagua, existe gran cantidad baches de gran tamaño lo que dificulta su transitabilidad.

En el tramo 4010 se presentan grandes baches que se llenan de agua y vuelven intransitable la vía, el contratista del nuevo trazado Puente Arimena – Puerto Carreño está ejecutando este mes la conformación y de más actividades correspondientes en el 9+000.

- **RUTA 4010 VIA PUENTE ARIMENA – LA AREPA 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 – EL PORVENIR**

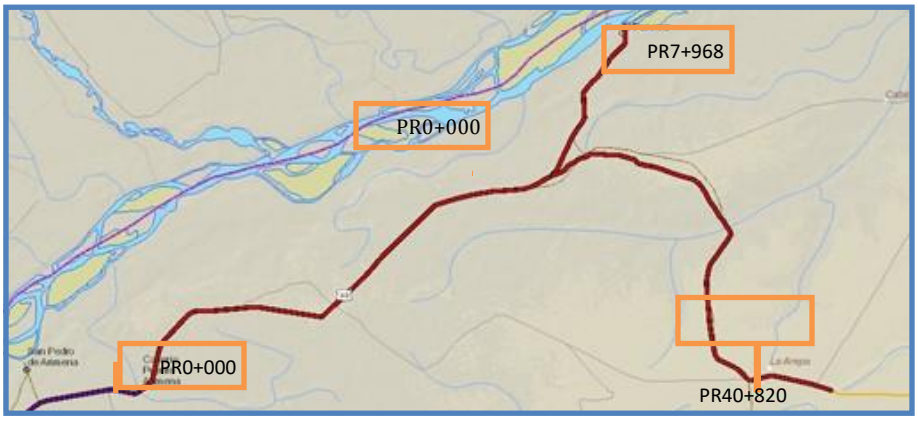

La Ruta Nacional 38 fue una carretera nacional en Colombia que iniciaba en el cruce de la Ruta 40 cerca al Puente Arimena en el Municipio de Puerto Gaitán, Departamento del Meta y finaliza en el Centro Poblado de Puerto Nariño en el Departamento del Vichada.

La Resolución 3700 de 1995 estableció 3 tramos contiguos. Del cruce de la Ruta 40 al Sitio conocido como La Arepa, de La Arepa al sitio conocido como Gaviotas y de Gaviotas al municipio de Cumaribo. No fue diseñado tramo entre Cumaribo y Puerto Nariño. La Resolución 339 de 1999 elimina la Ruta.

En la actualidad la ruta 4010 tiene su PR0+0000 saliendo del centro poblado de Puente Arimena; en el PR 21+0000 de esta ruta 4010, se encuentra el inicio PR0+0000 de la ruta 40MT01, la cual cuenta con menos de 8 km de vía.

Para retomar el recorrido por la ruta 4010 hay que tomar un acceso distinto para llegar al punto donde debe continuar el trazado de la vía, de dicho punto en adelante, a 9 km aproximadamente se encuentra el Puente y Gloria, y 7 km después se encuentra el cruce sector Carimagua, para continuar y finalizar

en el Cruce Guacacias.

El contratista que realiza la construcción de la vía Puente Arimena – Puerto Carreño ya ha conformado y han instalado sub base, base y asfalto hasta el PR 9+000 del trazado de la ruta 4010.

RESUMEN	LONGITUD Km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%
PAVIMENTADO	0,500	0,500	1,22%								
NO PAVIMENTADO	40,32							40,32	98,78 %		

La ruta 40MT01 presenta un estado malo para la transitabilidad, no existe conformación del terraplén de la vía ni afirmado alguno, el material de la zona es arcilloso y tiene un índice alto de plasticidad , lo anterior provoca que con las lluvias se generen grandes zonas de inundación en la vía, cambiando su estado de aceptable a malo, así mismo, obligando a los usuarios de vía a buscar otros trazados de vía o vías de sabana como son conocidas en la región, estas son hechas por el transito constante de los vehículos por los terrenos paralelos a la vía y van dejando un nuevo trazado. Esta vía concluye en el Centro Poblado de El Porvenir donde termina la vía y se llega al muelle en el Rio Meta donde un planchón pasa los vehículos a la otra orilla donde a unos 15 minutos se encuentra el municipio de Orocue- Casanare.

RESUMEN	LONGITUD Km	MUY BUENO		BUENO		REGULAR		MALO		MUY MALO	
		LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%	LONG	%
PAVIMENTADO	0,000	0,000	0,00%								
NO PAVIMENTADO	7,968							7,968	100,00 %		

2.2 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Se entiende por conservación vial al conjunto de actividades técnicas, de naturaleza periódica o rutinaria, que deben realizar los organismos responsables de la gestión vial para cuidar las vías y mantenerlas en estado óptimo de operación. Estas acciones tienen como propósito inmediato brindar fluidez al tránsito vehicular en todas las épocas del año, pero también, en un sentido más amplio, buscan proporcionar comodidad y seguridad a los usuarios y preservar las inversiones efectuadas en la construcción o rehabilitación de las vías.

A mediados de 1984 El Ministerio de Obras Públicas y Transporte decidió desarrollar con Microempresas Asociativas un proyecto para el mantenimiento y la conservación de las carreteras nacionales, con el auspicio del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- y la Organización Internacional del Trabajo - OIT.

Al iniciar actividades en 1994 el Instituto Nacional de Vías advirtió que, por deficiencias en su mantenimiento, una gran proporción de la red nacional de carreteras se encontraba en avanzado estado de deterioro y que, en consecuencia, el patrimonio vial se encontraba notoriamente comprometido, con el efecto adverso que dicha situación producía sobre la economía nacional.

El Fondo Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre 1984 y 1994 creó, un total de 400 microempresas asociativas, cooperativas de trabajo asociado encargadas de hacer labores de mantenimiento rutinario, garantizando un buen nivel de servicio en los 21.500 km de la red vial nacional y secundaria, compuesta principalmente por vías pavimentadas.

Esto permitió la generación de 4,900 empleos directos, permanentes y de buena calidad. Al finalizar 1998 operaban en Colombia 299 microempresas en las que participaban 3,257 personas como socios - trabajadores, las cuales atendían 11,676 km de vías nacionales.

La baja inversión asignada para su conservación en las vías pavimentadas, hace que el deterioro de las mismas se acelere; en el caso de las carreteras en afirmado, el mal estado se incrementaba con la ola invernal, ocasionando que estas vías se vuelvan intransitables e incrementando con ello costos de operación vehicular, mayor tiempo de desplazamiento, aumento en el costo de los productos, y en ocasiones, escasez de los mismos por la falta de oferta, debido a la incapacidad de llevarlos a los lugares de consumo.

En favor de la adecuada y oportuna conservación de las carreteras y las vías, el Instituto Nacional de Vías, INVIAS, incorporó dentro del Programa la figura de los Administradores Viales, profesionales contratados para efectuar el control de este mantenimiento programación y seguimiento de los contratos con las cooperativas de trabajo asociado, De esta manera los administradores viales son responsables de la planeación, dirección, coordinación y control del mantenimiento rutinario y son las microempresas quienes lo ejecutan.

El Documento CONPES 3272 de 2004, que establece La “política Integral De Infraestructura Vial”, determinó que las microempresas fueran incorporadas al nuevo esquema de mantenimiento rutinario, bajo una modalidad contractual que posibilitara ahorro fiscal, el mejoramiento de la eficiencia administrativa y la capacitación del recurso humano. Pero es el Documento CONPES 3396 del 28 de noviembre de 2005, que determina El Programa de Microempresas Y Administradores Viales como uno de los Proyectos Estratégicos del INVIAS, En Consecuencia, el mantenimiento vial rutinario realizado por las Microempresas y los Administradores de Mantenimiento Vial, ha permitido la conservación del patrimonio vial del país y la entrega de información oportuna y confiable que requiere el INVIAS.

En Consecuencia, el mantenimiento vial rutinario realizado por las Microempresas y los Administradores de Mantenimiento Vial, ha permitido la conservación del patrimonio vial del país y la entrega de información oportuna y confiable que requiere el INVIAS, la atención inmediata ante las emergencias y la simplificación de la gestión administrativa.

Es por estas razones que el programa se ha señalado como de Importancia estratégica para el País, convirtiéndolo en política de Estado, siendo fundamental para la generación de empleo regional, traducido en seguridad ciudadana, calidad de vida y paz como desestimulo a la emigración.

La Administración Vial realiza la Supervisión y Coordinación de las Actividades de Mantenimiento Rutinario de las Empresas de Trabajo Asociado de acuerdo con la Programación asignada a cada una. Así mismo elaborará los informes semanales de Interventoría con su respectivo Registro Fotográfico, mostrando de esta forma el avance de cada Contrato.

Las Actividades de Mantenimiento Rutinario que se programan de acuerdo a la necesidad de su ejecución y comprenden:

- Rocería y Desmonte Manual;
- Poda, Corte y Retiro de Árboles;
- Empradización con Semillas;
- Jardinería; Arborización;
- Reposición de Señales (Laminas, Postes);
- Bacheo
- Limpieza de:
    - Encoles
    - Descoles
    - Alcantarillas
    - Canales
    - Cunetas
    - Puentes
    - Lecho del Río
    - Barandas
    - Señales
    - Mojones
    - Bermas
    - Calzada
    - Defensas
- Extracción de Derrumbes
- Disponibilidad del personal para la atención de las Emergencias.

3. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA

La administración vial grupo 1, territorial meta, realiza la interventoría de los contratos de mantenimiento Instituto Nacional de Vías, los contratos en mención son el No. 2862 - 2023, 2770 - 2023 y 2771 – 2023. A continuación, se presenta la información de los contratos mencionados:

Contrato 2862 de 2023 – MANTENVIAL JP LTDA

Contrato de Obra	2862 – 2023
Objeto	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 40MTA PIPIRAL -V/CENCIO, PR 80+0000 -PR 94+0500 /6509. YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO. YE DE GRANADA-VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA), PR57+0352 - PR58+0564/65MTE PTE GUATIQUÍA-LOS CABALLOS, PR 0+0000 - PR 3+0795.
Contratista	Empresa de mantenimiento vial logística y mantenimiento JP LTDA – MANTENVIAL JP LTDA
Nit.	900.901.401-1
Representante Legal	José Tito Parrado Murcia
Identificación	17'328.669
Dirección	Vereda Buena Vista sector la U
Teléfono	6642373
E-Mail	*mantenvialjp@gmail.com*
V/r Inicial Contrato	$186.240.000
V/r Actual Contrato	$186.240.000
V/r Adicional	
Fecha de Inicio	01 de Septiembre de 2023
Fecha de Terminación	31 de Diciembre de 2023

Contrato 2770 de 2023 – Arimena Vial S.A.S

Contrato de Obra	2770 – 2023
Objeto	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACÍAS (VICHADA), SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA: PR 0+0000 - PR 40+0820/40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR, PR 0+0000 - PR 7+0654 LOTE 2
Contratista	Empresa de mantenimiento vial ARIMENA VIAL SAS
Nit.	900.856.007-1
Representante Legal	José Ramón Jiménez Palacios
Identificación	17'349.141 de Villavicencio
Dirección	Inspección De Puente Arimena
Teléfono	3164618590
E-Mail	*arimenavialsas@gmail.com*
V/r Inicial Contrato	$181.308.400
V/r Actual Contrato	$181.308.400
V/r Adicional	
Fecha de Inicio	01 de Septiembre de 2023
Fecha de Terminación	31 de Diciembre de 2023

Contrato 2771 de 2023 – Arimena Vial S.A.S

Contrato de Obra	2771 – 2023
Objeto	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 4009 PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA, PR33+0000 - PR68+1000 LOTE 4

INTERSA S.A.
INGENIERIA

Contratista	Empresa de mantenimiento vial ARIMENA VIAL SAS
Nit.	900.856.007-1
Representante Legal	José Ramón Jiménez Palacios
Identificación	17'349.141 de Villavicencio
Dirección	Inspección De Puente Arimena
Teléfono	3164618590
E-Mail	*arimenavialsas@gmail.com*
V/r Inicial Contrato	$1.230.626.600
V/r Actual Contrato	$1.230.626.600
V/r Adicional	
Fecha de Inicio	01 de Septiembre de 2023
Fecha de Terminación	31 de Diciembre de 2023
Nueva Terminación	31 de Diciembre de 2023

INTERSA S.A.
INGENIERIA

3.2 DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

CONTRATO 2862 DE 2023 MANTENVIAL JP LTDA

En la ruta 40MTA Se realizó rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas, se realizó remoción de material de derrumbes y material vegetal que se depositó sobre la carretera como resultado de las fuertes lluvias. En la ruta 65MTE se realizó rocería, limpieza de cunetas y alcantarillas y en la via 6509 se realizó mantenimiento rutinario del Puente y la instalación de la señalización en las barandas del Puente.
Actividades diarias:

1/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
2/10/2023 Mantenimiento del PR 87+00 a PR 88+200 ruta 40MTA
3/10/2023 Mantenimiento del PR 88+200 al PR 89+200 ruta 40MTA
4/10/2023 Mantenimiento PR 89+200 al PR 90+200 ruta 40MTA
5/10/2023 Mantenimiento PR 0+000 al PR 2+000 ruta 65MTE
6/10/2023 Mantenimiento PR 2+000 AL PR4+000 ruta 65MTE
7/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
8/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
9/10/2023 Mantenimiento del PR 90+00 a PR 91+000 ruta 40MTA
10/10/2023 Retiro de árboles ruta 40MTA
11/10/2023 Mantenimiento PR 91+800 al PR 92+700 40MTA
12/10/2023 Mantenimiento PR 92+700 al PR 93+600 ruta 40MTA
13/10/2023 Mantenimiento PR 93+600 AL PR94+500 ruta 40MTA
14/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
15/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
16/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
17/10/2023 Retiro de árboles y derrumbes ruta 40MTA
18/10/2023 Limpieza de cunetas y descoles ruta 65MTE Retiro de árboles ruta 40MTA
19/10/2023 Mantenimiento puente antiguo Guayuriba ruta 6509
20/10/2023 Limpieza de cunetas PR 84+200 ruta 40MTA
21/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
22/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
23/10/2023 Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, disipadores del PR 80+000 al PR 82+300 ruta 40MTA
24/10/2023 Limpieza de descoles, disipadores revestidos ruta 40MTA
25/10/2023 Limpieza de descoles, disipadores revestidos ruta 40MTA
26/10/2023 Capacitación
27/10/2023 Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, disipadores ruta 40MTA
28/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
29/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
30/10/2023 Limpieza de descoles, disipadores revestidos ruta 40MTA

31/10/2023 Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA

CONTRATO 2770 DE 2023 ARIMENA VIAL SAS

Se realizó el mantenimiento rutinario de las rutas, dando cumplimiento a los indicadores establecidos en el contrato. En la ruta 4010 se realizó rocería, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles y zanjas de desagüe, además limpieza de PR y señales. En la ruta 40MT01 se realizó rocería, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles y zanjas de coronación.

Actividades diarias

1/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
2/10/2023 Recolección de basuras y limpieza de calzada PR 00+000 a PR 01+000 ruta 4010
3/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 01+000 a PR 02+000 ruta 40MT01
4/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 02+000 a PR 04+000 ruta 40MT01
5/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 04+000 a PR 06+000 ruta 40MT01
6/10/2023 Recolección de basuras y limpieza de calzada PR 06+000 a PR 07+000 ruta 40MT01
7/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
8/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
9/10/2023 Limpieza de descoles PR 09+000 a PR 10+000 ruta 4010
10/10/2023 Lluvias y tormenta eléctrica ruta 4010
11/10/2023 Limpieza de descoles PR 11+000 a PR 12+000 ruta 4010
12/10/2023 Limpieza puente Gloria PR 30+000 ruta 4010
13/10/2023 Limpieza de señalización ruta 4010
14/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
15/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
16/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
17/10/2023 Limpieza PR 00+000 a PR 01+000 ruta 4010
18/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 1+000 al PR 2+000 ruta 4010
19/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 2+000 al PR 4+000 ruta 4010
20/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 4+000 al PR 6+000 ruta 4010
21/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
22/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
23/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 6+000 al PR 8+000 ruta 4010
24/10/2023 Desmonte manual PR 9+000 a PR 11+000 ruta 4010
25/10/2023 Poda de árboles PR 0+000 al PR 1+000 uta 4010
26/10/2023 Recolección de basura PR 0+000 ruta 4010
27/10/2023 Limpieza de descoles PR 12+000 al PR 13+000 ruta 4010
28/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
29/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
30/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 8+000 al PR 9+000 ruta 4010
31/10/2023 Limpieza de descoles PR12+000 ruta 4010

CONTRATO 2771 DE 2023 ARIMENA VIAL SAS

Se realizó el mantenimiento rutinario de las rutas, dando cumplimiento a los indicadores establecidos en el contrato. En la ruta 4009 se realizó rocería, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles y zanjas de desagüe, además limpieza de PR y señales. En la ruta 40MT01 se realizó rocería, limpieza de alcantarillas, encoles, descoles y zanjas de coronación.

Actividades diarias

1/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
2/10/2023 Rocería de PR 60+000 a PR 58+000 ruta 4009
3/10/2023 Rocería de PR 58+000 a PR 57+000 ruta 4009
4/10/2023 Rocería de PR 57+000 a PR 55+000 ruta 4009
5/10/2023 Rocería PR 55+000 a PR 53+000 ruta 4009
6/10/2023 Rocería PR 53+000 al PR 52+000 ruta 4009
7/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
8/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
9/10/2023 Rocería de PR 52+000 a PR 50+300 ruta 4009
10/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 55+000 a PR 56+000 ruta 4009
11/10/2023 limpieza de (Box coulvert y alcantarillas) PR 57+000 a PR 59+000 ruta 4009
12/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 64+000 a PR 65+000 ruta 4009
13/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 68+1000 ruta 4009
14/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
15/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
16/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
17/10/2023 Limpieza de rejillas y barrido de pavimento PR 00+000 ruta 4009
18/10/2023 Limpieza de rejilla y barrido de pavimento PR 00+000 ruta 4009
19/10/2023 Recolección de basura y lavado de señalización PR 00+000 ruta 4009
20/10/2023 Limpieza de alcantarillas del PR 52+900 al 54+000 ruta 4009
21/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
22/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
23/10/2023 Rocería PR 50+300 al PR 49+000 margen derecha ruta 4009
24/10/2023 Rocería PR 50+300 al PR 49+ 000 margen izquierda ruta 4009
25/10/2023 Rocería PR 49+000 al PR 48+000 ruta 4009
26/10/2023 Rocería del PR 48+000 al PR 46+000 ruta 4009
27/10/2023 Roceria del PR 46+000 al PR 45+000 ruta 4009
28/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
29/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
30/10/2023 Barrida de pavimento y limpieza de rejillas PR 68+1000 ruta 4009
31/10/2023 Poda y desmonte manual PR 68+000 al PR 65+000 ruta 4009

CONTRATOS EN EJECUCION VIA 40MTA QUE CUENTAN CON INTERVENTORIA

- **CONTRATO 1646 DE 2021 (CONTRATISTA KM58 VIA 4006)**

El mes de Octubre se realizó las siguientes actividades:

PR82+700 Perforaciones y anclajes activos
PR83+500 Colocación del acero de refuerzo de caisson
PR84+450 Vaciado pantallas
PR90+600 Vaciado de concreto pantallas
PR94+500 Demolición y manejo de aguas



El Instituto Nacional de Vías, considerando que dentro de los planes y programas del Instituto Nacional de Vías se encuentra prevista la ejecución de la **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL META**; con base al cual adjudicó el Contrato de ADMINISTRACION VIAL, a la firma INTERSA S.A. NIT 860.450.644-3, de acuerdo

con la oferta presentada por un valor de $ 1.277.023.624,00 incluido el IVA.

El objeto de dicho Contrato es: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META GRUPO AMV 1 LOTE 6

Contratista	**INTERSA S.A.**
Nit	NIT. 860.450.644-3
Dirección Oficina	Av 15 No 124-29 Of 601
Dirección Oficina Local	Calle 50 a No 41b-14 Los Alcazares, Villavicencio- Meta
Teléfono	3188023096
Correo Electrónico	amv1meta@intersaingenieria.com
Valor Inicial Contrato	$ 1.277.023.624,00 incluido el IVA
Valor Actual del Contrato	$ 1.459.448.240,00 incluido el IVA
Fecha de Inicio	01 de Septiembre de 2023
Fecha de Terminación	31 de Diciembre de 2023

Nueva Fecha de Terminación	31 de Diciembre de 2023	
Ingeniero Residente	Carolina Reina Peláez	3188023096
Ingeniero Auxiliar I	Juan Carlos Boyaca Hendes	3223652757
Ingeniero Auxiliar II	Alix Xiomara Pardo Ortiz	3193195321
Inspector Siso	Maria Margarita Linares Lemus	321 3257043

.1 <u>INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO</u> (Incluye seguimiento a las garantías contractuales) Formato Anexo MSR-MN-FR-022-11-1

.2 <u>DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR EN EL MES</u>

2.1 RUTA 40MTA VIA PIPIRAL – VILLAVICENCIO

01 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
02 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
03 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
04 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
05 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
06 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
07 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
08 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
09 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

10 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

11 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

12 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

13 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión

14 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

15 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

16 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

17 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

18 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

19 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

20 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

21 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

22 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

23 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

24 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

25 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

26 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

27 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

28 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

29 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

30 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos

bajo supervisión.
31 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

- **PENDIENTES Y COMPROMISOS**

  Se continua con la programación de actividades de mantenimiento Rutinario en la cual se debe dar prioridad limpieza de obras de drenaje, disipadores y limpieza de encoles y descoles con el fin de garantizar el correcto flujo del agua de escorrentía.

  Por otro lado, como se mencionó en informes anteriores, el disipador ubicado en el PR 81+700 continúa obstruido por material de derrumbe proveniente del talud superior, su limpieza no se justifica ya que requiere dos semanas de trabajo de la EMR y el material volverá a obstruir el disipador en la siguiente precipitación, por lo tanto, se requiere estabilizar el talud superior antes de continuar con la limpieza del disipador.

  Se presenta deterioro en la mayoría de las estructuras de drenaje de la via, cunetas, disipadores y alcantarillas debido a los movimientos causados por las fallas geológicas lo que hace necesario que se realice de manera urgente el reemplazo de dichas obras, esta administración incluyo todas las necesidades de la vía en el ante proyecto para las vigencias 2023-2026.

  Se continua esperando que se realicen las reparaciones correspondientes en la carpeta asfáltica y estructura de la vía, en el PR92+900 a 93+000 tramo que fue rehabilitado en el año 2020 por el contratista Consorcio OIS 2019 y que el Invias llamo en garantía.

2.2 RUTA 65MTE VIA PUENTE GUATIQUIA – LOS CABALLOS

1 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
2 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
3 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
4 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
5 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
6 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
7 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

8 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

9 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

10 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

11 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

12 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

13 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión

14 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

15 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

16 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

17 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

18 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

19 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

20 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

21 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

22 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

23 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

24 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

25 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

26 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

27 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

28 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos

bajo supervisión.
29 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
30 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
31 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

- **PENDIENTES Y COMPROMISOS**

- Se hace necesaria la construcción de cuenta en los tramos faltantes más de 1000 m en total, lo que genera daños en la estructura de la vía y constante aparición de baches.
- Se hace necesario realizar bacheo para garantizar la transitabilidad y seguridad de los usuarios de la vía.
- Se solicita estudios y diseños para realizar obras de protección estribo No 1 Puente Guatiquia

1. RUTA 6509 PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA

1 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
2 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
3 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
4 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
5 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
6 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
7 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
8 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
9 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.
10 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

11 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

12 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

13 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión

14 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

15 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

16 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

17 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

18 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

19 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

20 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

21 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

22 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

23 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

24 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

25 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

26 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

27 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

28 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

29 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

30 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

31 de Octubre de 2023: Se realiza recorrido de inspección, vigilancia y seguimiento a contratos bajo supervisión.

PENDIENTES Y COMPROMISOS

- En el PR58+0100 es necesaria la estabilización del talud. por lo que se espera que el INVIAS determine el plan de acción para dar solución a este punto crítico.
- Se hace seguimiento al Puente Guayuriba antiguo ya que con la temporada invernal el nivel del rio llega hasta el tablero, hasta el día de elaboración de este informe no se han presentado afectaciones en el Puente, las obras de mitigación y protección para el estribo No 1 realizadas con el contrato de monto agotable se afectaron los gaviones siendo socavados por el rio, lo que causo perdida de parte del relleno del aproche.

2.2.1 RUTA 4010 – 40MT01. PUENTE ARIMENA – LA AREPA / CRUCE 40 – EL PORVENIR

- **28 de Octubre de 2023:** Visita realizada a la Ruta 4010 y 40 MT01 Puente Arimena – La Arepa - Cruce Guacacias (Vichada), Sector Puente Arimena – La Arepa: PR 0+0000 – PR 40+0820, Código 40MT01 Ramal Cruce Ruta 40 – El Porvenir, PR 0+0000 – PR 7+0968. Se realiza capacitación mensual.

PENDIENTES Y COMPROMISOS

- Se debe realizar la conformación de la calzada existente para mejorar la sección de las cunetas ya que en la mayor parte de la vía se ha perdido el terraplén debido a la composición del terreno y el tránsito de vehículos pesados.
- Dadas la temporada de lluvias que se presenta, la ruta ha desmejorado su transitabilidad de aceptable a mala. Lo anterior, debido a que las arcillas que componen la mayor parte de la subrasante se vuelven plásticas, formando un lodo que dificultad el tránsito vehicular.

3 INFORMACION DE GESTION SOCIO AMBIENTAL

En la ejecución de este contrato y como es política del INTERSA S.A. el medio ambiente es prioridad en la ejecución de cualquier tipo de obra y así mismo se han hecho las debidas denuncias ante la autoridad ambiental en el departamento del Meta CORMACARENA, la cual adelanta ya varios procesos producto de las denuncias hechas donde además de velar por el medio ambiente se quiere dar estabilidad y calidad en el servicio a los usuarios de las vías Nacionales a cargo de esta administración vial.

4 INFORME DE GESTION AL PLAN DE CALIDAD

En el desarrollo del contrato 2619 de 2023 se han cumplido todas las directrices del plan de calidad de INVIAS, cumpliendo con todos los formatos, siguiendo todos los procesos y demás iniciativas correspondientes de dicho plan.

5 CUADRO RESUMEN (AVANCE FISICO-FINANCIERO) FORMATO ANEXO MSE-MN-FR-022-10

INTERSA S.A.
INGENIERIA

Contrato 2862 de 2023
MANTENVIAL JP LTDA

Dirección Calle 50A #41B-14 Los Alcázares, Villavicencio-Meta email amv1meta@intersaingenieria.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 10/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 40MTA(PIPIRAL - VILLAVICENCIO) 65 MTE (PTE GUATIQUÍA - LOS CABALLOS) 6509 (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA).

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) — 2/10/2023 al 8/10/2023

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING WENDY QUEVEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 40MTA PIPIRAL -VICENCIO, PR 80+0000 -PR 94+0500 /6509. YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO. YE DE GRANADA-VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA) PR57+0352 - PR58+0564/MTE PTE GUATIQUÍA - LOS CABALLOS, PR 0+0000 - PR 3+0795.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 40MTA-65MTE-6509

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	MANTENVIAL SA LTDA	INTERVENTOR:	INTEGRA S A
INTEGRANTES:	(N/A)	INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	2867 de 2023	CONTRATO No.	7810 2023
FECHA DE INICIO:	21/9/2023	FECHA DE INICIO:	19/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	
VALOR INICIAL:	$ 221.625.600,00	VALOR INICIAL:	$ 382.195.352,00
VALOR ADICIONES:	$	VALOR ADICIONES:	$
VALOR ACUMULADO:	$ 221.625.600,00	VALOR ACUMULADO:	$ 382.195.352,00
	$	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$	VALOR AMORTIZADO:	$
	$	SALDO POR AMORTIZAR:	$

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 221.625.600,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.468.800,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.156.800	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 221.625.600,00		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.703.200,00	12,50%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 27.703.200,00	12,50%	
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%	
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 27.703.200,00	12,50%	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.703.200,00	12,50%	
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 13.851.600,00	6,25%	
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 13.851.600,00	6,25%	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 18.468.800,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 72,297,832.39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACION:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO:	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

2/10/2023 Mantenimiento del PR 87+00 a PR 88+200 ruta 40MTA
3/10/2023 Mantenimiento del PR 88+200 al PR 89+200 ruta 40MTA
4/10/2023 Mantenimiento PR 89+200 al PR 90+200
5/10/2023 Mantenimiento PR 0+000 al PR 2+000 ruta 65MTE
6/10/2023 Mantenimiento PR 2+000 AL PR4+000 ruta 65MTE
7/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
8/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

9/10/2023 Mantenimiento del PR 90+00 a PR 91+000 ruta 40MTA
10/10/2023 Mantenimiento del PR 91+00 al PR 91+800 ruta 40MTA
11/10/2023 Mantenimiento PR 91+800 al PR 92+700
12/10/2023 Mantenimiento PR 92+700 al PR 93+600 ruta 40MTA
13/10/2023 Mantenimiento PR 93+600 AL PR94+500 ruta 40MTA
14/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
15/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento del PR 87+00 a PR 88+200 ruta 40MTA



Mantenimiento del PR 88+200 al PR 89+200 ruta 40MTA



Mantenimiento PR 89+200 al PR 90+200



Mantenimiento PR 0+000 al PR 2+000 ruta 65MTE



Mantenimiento PR 2+000 AL PR4+000 ruta 65MTE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 40MTA(PIPIRAL - VILLAVICENCIO) 65 MTE (PTE GUATIQUÍA - LOS CABALLOS), 6509 (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA).

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) — 9/10/2023 al 15/10/2023 — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING WENDY QUEVEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 40MTA PIPIRAL - VICENCIO, PR 80+0000 -PR 94+0500 /6509. YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO. YE DE GRANADA-VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA) PR57+0352 -PR58+0564/MTE PTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS, PR 0+0000 - PR 3+0795.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 40MTA-65MTE-6509

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	MANTENIVIAL SP LTDA	INTERVENTOR:	INTEINCA S.A.
INTEGRANTES:	(N/A)	INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	2867 de 2023	VALOR INICIAL: $	221.625.600,00	CONTRATO No.	2810 2023	VALOR INICIAL: $	382.195.352,00
FECHA DE INICIO:	21/9/2023	VALOR ADICIONES: $	-	FECHA DE INICIO:	19/9/2023	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ACUMULADO: $	221.625.600,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023	VALOR ACUMULADO: $	382.195.352,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$	-	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $	-
		$	-			VALOR AMORTIZADO: $	-
		$	-			SALDO POR AMORTIZAR: $	-

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 221.625.600,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.468.800,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.156.800,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 221.625.600,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 41.554.800,00	18,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41.554.800,00	18,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.554.800,00	18,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41.554.800,00	18,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.851.600,00	8,75%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 18.851.600,00	8,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 9/09/23
VALOR FACTURA: $ 18.468.800,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 9/09/23
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACION:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL: SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

9/10/2023 Mantenimiento del PR 90+00 a PR 91+000 ruta 40MTA
10/10/2023 Retiro de arboles ruta 40MTA
11/10/2023 Mantenimiento PR 91+800 al PR 92+700
12/10/2023 Mantenimiento PR 92+700 al PR 93+600 ruta 40MTA
13/10/2023 Mantenimiento PR 93+600 AL PR94+500 ruta 40MTA
14/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
15/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

17/10/2023 Retiro de arboles y derrumbes via 40MTA
18/10/2023 Limpieza de cunetas y descoles ruta 65MTE
19/10/2023 Retiro de arboles ruta 40MTA
20/10/2023 Mantenimiento PR 80+000 al PR 81+300 ruta 40MTA
21/10/2023 Mantenimiento del puente antiguo Guayuriba ruta 6509
22/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
23/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 40 MTA — PR 80+0000 — PR 94+0500
RUTA No. 65MTE — PR 0+0000 — PR 03+0795
6509 Paso Antiguo RUTA No. — PR 57+0352 — PR 58+0564

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Mantenimiento del PR 90+00 a PR 91+000 ruta 40MTA



Retiro de arboles ruta 40MTA



Mantenimiento PR 91+800 al PR 92+700



Mantenimiento PR 92+700 al PR 93+600 ruta 40MTA



Mantenimiento PR 93+600 AL PR94+500 ruta 40MTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 40MTA(PIPIRAL - VILLAVICENCIO) 65 MTE (PTE GUAYUYUBA - LOS CABALLOS) 6509 (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA).

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 4 (Numeración consecutiva) — 16/10/2023 al 22/10/2023 — Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING WENDY QUEVEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 40MTA PIPIRAL - VICENCIO, PR 80+0000 -PR 94+0500 /6509. YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO. YE DE GRANADA-VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA) PR57+0352 -PR58+0564/65MTE PTE GUAYUYUBA - LOS CABALLOS, PR 6+0000 - PR 3+0795.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 40MTA-65MTE-6509

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	MANTENIVIAL SP LTDA	INTERVENTOR:	INTEGRA S A
INTEGRANTES:	(N/A)	INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	2867 de 2023	CONTRATO No.	2810 2023
VALOR INICIAL:	$ 221.625.600,00	VALOR INICIAL:	$ 382.195.352,00
FECHA DE INICIO:	21/9/2023	FECHA DE INICIO:	19/9/2023
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ACUMULADO:	$ 221.625.600,00	VALOR ACUMULADO:	$ 382.195.352,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	
VALOR ANTICIPO:	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
VALOR AMORTIZADO:	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
SALDO POR AMORTIZAR:	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 221.625.600,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.468.800,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.156.800,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 221.625.600,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 55.406.400,00	25,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 55.406.400,00	25,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 55.406.400,00	25,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 55.406.400,00	25,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.851.600,00	6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.851.600,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 2023 9/1
VALOR FACTURA: $ 18.468.800,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 2023
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

16/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
17/10/2023 Retiro de arboles y derrumbes ruta 40MTA
18/10/2023 Limpieza de cunetas y descoles ruta 65MTE Retiro de arboles ruta 40MTA
19/10/2023 Mantenimiento puente antiguo Guayuriba ruta 6509
20/10/2023 Limpieza de cunetas PR 84+200 ruta 40MTA
21/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
22/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

23/10/2023 Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores del PR 80+000 al PR 82+300 ruta 40MTA
24/10/2023 Lavado de señales,Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores ruta 40MTA
25/10/2023 Lavado de señales,Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores ruta 40MTA
26/10/2023 Capacitación.
27/10/2023 Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores ruta 40MTA
28/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
29/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Retiro de arboles y derrumbes ruta 40MTA



Limpieza de cunetas y descoles ruta 65MTE Retiro de arboles ruta 40MTA



Mantenimiento puente antiguo Guayuriba ruta 6509



Limpieza de cunetas PR 84+200 ruta 40MTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INAVG.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 40MTA(PIPIRAL - VILLAVICENCIO) 65 MTE (PTE GUATIQUÍA - LOS CABALLOS) 6509 (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA).

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) | 23/10/2023 al 29/10/2023 | Ultimo Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING WENDY QUEVEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: OBLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 40MTA PIPIRAL -VICENCIO, PR 80+0000 -PR 94+0500 /6509. YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO. YE DE GRANADA-VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA) PRETAL65 (PASO PRESENTEMENTE PTE GUATIQUÍA - LOS CABALLOS) PR 0+0000 - PR 57+0925.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 40MTA-65MTE-6509

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA:	MANTENIVIAL SP LTDA	INTERVENTOR:	INTEGRA S A
INTEGRANTES:	(N/A)	INTEGRANTES:	
CONTRATO No.	2867 de 2023	CONTRATO No.	2810 2023
FECHA DE INICIO:	21/9/2023	FECHA DE INICIO:	19/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	
VALOR INICIAL:	$ 221.625.600,00	VALOR INICIAL:	$ 382.195.352,00
VALOR ADICIONES:	$ -	VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 221.625.600,00	VALOR ACUMULADO:	$ 382.195.352,00
	$ -	VALOR ANTICIPO:	$ -
	$ -	VALOR AMORTIZADO:	$ -
	$ -	SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 221.625.600,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 18.468.800,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 203.156.800,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 221.625.600,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 69.258.000,00	31,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 69.258.000,00	31,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 69.258.000,00	31,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 69.258.000,00	31,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.951.600,00	5,75%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.951.600,00	5,75%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 2023 9 5
VALOR FACTURA: $ 18.468.800,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA		
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA		

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 2023
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	13	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

23/10/2023 Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores del PR 80+000 al PR 82+300 ruta 40MTA
24/10/2023 Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA
25/10/2023 Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA
26/10/2023 Capacitación
27/10/2023 Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores ruta 40MTA
28/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
29/10/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

30/10/2023 Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA
31/10/2023 Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA
1/11/2023 Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA
2/11/2023 Roseria poda manual de árboles ruta 40MTA
3/11/2023 Roseria poda manual de árboles ruta 40MTA
4/11/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.
5/11/2023 Disponibilidad de personal para vigilancia y emergencias.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores del PR 80+000 al PR 82+300 ruta 40MTA



Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA



Limpieza de descoles , discipadores revestidos ruta 40MTA



Capacitación



Limpieza de alcantarillas descoles revestidos, discipadores ruta 40MTA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **META**

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCT 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO No. 2862 DE 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO J.P. LTDA.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2619 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** INTERSA S.A.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
GUADAÑAS	HUSBARNA/2019			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
GUADAÑAS	SHINDAIWA/ 2019			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CAMIONETA	NISAN / 2012			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
TOTAL ACTIVO				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

RESUMEN PERIODO / MES	**No.**	**%**
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	360	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	360	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: JOSÉ TITO PARRADO MURCIA
Representante Legal
CC No. 17.328.669 de Villavicencio – Meta
Contratista

Firma

Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2862 DE 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO J.P. LTDA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM - META

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	DIAZ TORRES DANIEL ALEJANDRO	CC 1000940897		$ 154.667	27 X, 28 X, 29 X, 30 X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO J.P. LTDA.	$ 154.667	$ 10.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 6.200	25-14 COLPENSIONES	7902344009	$ 24.800	$ 6.200			Ingreso
2	TRUJILLO SARAY YIMY ALEXANDER	CC 1003649578		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	230301-PORVENIR	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
3	TRUJILLO SARAY EDWARD ALEXIS	CC 1003649792		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	230201-PROTECCION	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
4	PARRADO HERNANDEZ JUAN PABLO	CC 1121857928		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	25-14 COLPENSIONES	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
5	DIAZ ROMERO HENRY FERNANDO	CC 1121942061		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	231001-COLFONDOS	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
6	CLAVIJO ORTIZ VICTOR MANUEL	CC 17322802		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS005-SANITAS S.A.	7902344009	$ 46.400	230201-PROTECCION	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
7	PARRADO MURCIA JOSE TITO	CC 17328669		$ 2.500.000	X en todos los días		$ 2.500.000	$ 174.000	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 100.000	25-14 COLPENSIONES	7902344009	$ 400.000	$ 100.000			
8	TORRES CABALLERO MARIELA	CC 40440373		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	230301-PORVENIR	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
9	RODRIGUEZ PINZON NICOLAS	CC 80386395		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	25-14 COLPENSIONES	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
10	TRUJILLO PARDO FREDY	CC 80498411		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	25-14 COLPENSIONES	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
11	MARTINEZ ARDILA OMAR ALONSO	CC 86079203		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	25-14 COLPENSIONES	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			
12	DIAZ MENDEZ JOSE MANUEL	CC 92256460		$ 1.160.000	X en todos los días		$ 1.160.000	$ 80.800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902344009	$ 46.400	230301-PORVENIR	7902344009	$ 185.600	$ 46.400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 02/11/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúa por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada *uno de conformidad con la normatividad* vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSÉ TITO PARRADO MURCIA
Representante Legal
CC No. 17.328.669 de Villavicencio – Meta
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Reorepresentante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE OBRA No: 2862 DE 2023

CONTRATISTA: EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO J.P. LTDA.

MES INFORME MENSUAL: OCT 2023

PROYECTO: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2619 DE 2023

INTERVENTOR: INTERSA S.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1029523	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 221,625,600.00	
			TOTAL			$ 221,625,600.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 221,625,600.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									RP No. 1029523 del 16/09/2023	**$ 221,625,600.00**	**$ 221,625,600.00**				
1	Parcial	sep-23	$ 15,520,000.00	$ 2,948,800.00	$ 18,468,800.00	$ -	$ -	$ -		$ 203,156,800.00	$ 203,156,800.00				
2	Parcial	oct-23	$ 46,560,000.00	$ 8,846,400.00	$ 55,406,400.00					$ 147,750,400.00	$ 147,750,400.00				
TOTALES			**$ 62,080,000.00**	**$ 11,795,200.00**	**$ 73,875,200.00**	**$ -**				**$ 147,750,400.00**	**$ 147,750,400.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR ACTA	$ 62,080,000.00	$ 11,795,200.00	**$ 73,875,200.00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 62,080,000.00	$ 11,795,200.00	**$ 73,875,200.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOSÉ TITO PARRADO MURCIA
Representante Legal
CC No. 17.328.669 de Villavicencio – Meta
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2862 DE 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO J.P. LTDA.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	22	20	24	24	21	24	24	22	24	24	24	21	24	22	24	24	17	24	21	24	24	24	21	12	24	21	700
Lluvias moderadas						2	4			3			2				3		2			7		3				3	12		3	44
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSÉ TITO PARRADO MURCIA
Representante Legal
17.328.669 de Villavicencio – Meta
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 2862-2023 **CONTRATISTA:** MANTENVIAL J.P LTDA

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 40MTA PIPIRAL -V/CENCIO, PR 80+0000 -PR 94+0500 /6509. YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO. YE DE GRANADA-VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA), PR57+0352 - PR58+0564/65MTE PTE GUATIQUÍA- LOS CABALLOS, PR 0+0000 - PR 3+0795.

FECHA DE INICIO: 21/9/2023
PLAZO INICIAL: 31/12/2023
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 221,625,600.00
VALOR ACUMULADO: $ 221,625,600.00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2619 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 22,162,560.00	25	8	2023	30	6	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 44,325,120.00	25	8	2023	31	12	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 66,487,680.00	25	8	2023	30	6	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 30-44-101054707

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros del estado S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/9/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	105%	$ 232,000,000.00	25	8	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 30-40-101019733 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Del Estado S.A

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/9/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

FECHA	2 (Día)	10 (Mes)	2023 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde Día	Desde Mes	Desde Año	Hasta Día	Hasta Mes	Hasta Año
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)								
Otros								

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Ing. **Carolina Reina Pelaez**
Residente: INTERSA S.A
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERSA S.A.
INGENIERIA

Contrato 2770 de 2023
Arimena Vial S.A.S

Dirección Calle 50A #41B-14 Los Alcázares, Villavicencio-Meta email amv1meta@intersaingenieria.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	8/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACAS (VICHADA) 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 2 del 2/10/2023 al 8/10/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING WENDY QUEVEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CRIVANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACAS (VICHADA), SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA: PR 0+0000 - PR 40+0829,0000 Y 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR: PR 0+0000 - PR 7+0654,1 CTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	ARIMENA VIAL SAS	VALOR INICIAL:	$ 181.308.400,00
INTEGRANTES:	(N/A)	VALOR ADICIONES:	$ -
CONTRATO No.	2023-01-0049	VALOR ACUMULADO:	$ 181.308.400,00
FECHA DE INICIO:	20/09/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INTERSA S.A.	VALOR INICIAL:	$ 382.195.352,00
INTEGRANTES:		VALOR ADICIONES:	$ -
CONTRATO No.	2023-2021	VALOR ACUMULADO:	$ 382.195.352,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ANTICIPO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR AMORTIZADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 181.308.400,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 13.598.130,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ 167.710.270
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.308.400,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 22.663.550,00	12,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 22.663.550,00	12,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 22.663.550,00	12%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 22.663.550,00	12%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 13.598.130,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC

En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS

Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

2/10/2023 Recolección de basuras y limpieza de calzada PR 00+000 a PR 01+000 ruta 4010
3/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 01+000 a PR 02+000 ruta 40MT01
4/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 02+000 a PR 04+000 ruta 40MT01
5/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 04+000 a PR 06+000 ruta 40MT01
6/10/2023 Recolección de basuras y limpieza de calzada PR 06+000 a PR 07+000 ruta 40MT01
7/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
8/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

9/10/2023 Limpieza de descoles PR 09+000 a PR 10+000 ruta 4010
10/10/2023 Limpieza de descoles PR 11+000 a PR 12+000 ruta 4010
11/10/2023 Limpieza puente Gloria PR 30+000 ruta 4010
12/10/2023 Limpieza de señalizacion ruta 4010
13/10/2023 Limpieza de calzada PR 00+00 ruta 4010
14/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
15/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNG-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Recolección de basuras y limpieza de calzada PR 00+000 a PR 01+000 ruta 4010



Limpieza de alcantarillas de PR 01+000 a PR 02+000 ruta 40MT01



Limpieza de alcantarillas de PR 02+000 a PR 04+000 ruta 40MT01



Limpieza de alcantarillas de PR 04+000 a PR 06+000 ruta 40MT01



Recolección de basuras y limpieza de calzada PR 06+000 a PR 07+000 ruta 40MT01

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No. 252202-152822 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNG-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	15/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACAS (VICHADA) 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 3 del 9/10/2023 al 15/10/2023 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING WENDY QUEVEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: CRIVANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACAS (VICHADA), SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA: PR 0+0000 - PR 40+0829/40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR: PR 0+0000 - PR 7+0654 | LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	ARIMENA VIAL SAS		
INTEGRANTES:	(N/A)		
CONTRATO No.	1070 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 181.308.400,00
FECHA DE INICIO:	20/9/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 181.308.400,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	INTERSA S.A.		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	2046 2023	VALOR INICIAL:	$ 382.195.352,00
FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 382.195.352,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 181.308.400,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 13.598.130,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ 167.710.270
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.308.400,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 33.995.325,00	18,75%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 33.995.325,00	18,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 33.995.325,00	18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 33.995.325,00	19%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SET/DIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 13.598.130,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	19,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: 9/9/9
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD


VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

9/10/2023 Limpieza de descoles PR 09+000 a PR 10+000 ruta 4010
10/10/2023 Lluvias y tormenta electrica ruta 4010
11/10/2023 Limpieza de descoles PR 11+000 a PR 12+000 ruta 4010
12/10/2023 Limpieza puente Gloria PR 30+000 ruta 4010
13/10/2023 Limpieza de señalizacion ruta 4010
14/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
15/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

16/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
17/10/2023 Limpieza PR 00+000 a PR 01+000 ruta 4010
18/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 1+000 al PR 2+000 uta 4010
19/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 2+000 al PR 4+000 ruta 4010
20/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 4+000 al PR 6+000 ruta 4010
21/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
22/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNG-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de descoles PR 09+000 a PR 10+000 ruta 4010



Lluvias y tormenta electrica ruta 4010



Limpieza de descoles PR 11+000 a PR 12+000 ruta 4010



Limpieza puente Gloria PR 30+000 ruta 4010



Limpieza de señalizacion ruta 4010

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No 252202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Concesiones, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	22/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACIAS (VICHADA); 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 4 del 16/10/2023 al 22/10/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. WENDY CUEVEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META, SECTORES 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACIAS (VICHADA), SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA: PR 0+0000 - PR 40+0820/40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR, PR 0+0000 - PR 7+0654 LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	ARIMENA VIAL SAS		INTERVENTOR:	INTEGRA S.A.S	
INTEGRANTES:	(N/A)		INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	2109 de 2023	VALOR INICIAL: $ 181.306.400,00	CONTRATO No.	2110 de 2023	VALOR INICIAL: $ 382.195.352,00
FECHA DE INICIO:	21/09/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:		VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ACUMULADO: $ 181.306.400,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ACUMULADO: $ 382.195.352,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA:	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 181.308.400,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 13.598.130,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ 167.710.270,00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.308.400,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 45.327.100,00	25,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 45.327.100,00	25,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	-
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	0%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 45.327.100,00	25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.327.100,00	25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 13.598.130,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

16/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
17/10/2023 Limpieza PR 00+000 a PR 01+000 ruta 4010
18/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 1+000 al PR 2+000 ruta 4010
19/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 2+000 al PR 4+000 ruta 4010
20/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 4+000 al PR 6+000 ruta 4010
21/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
22/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

23/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 6+000 al PR 8+000 ruta 4010
24/10/2023 Poda de arboles y desmonte manual PR 9+000 a PR 11+000 ruta 4010
25/10/2023 Poda de arboles PR 0+000 al PR +000 uta 4010
26/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 29+000 ruta 4010
27/10/2023 Poda de arboles PR 0+000 al PR 2+000 ruta 40MT01
28/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
29/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 4010
PR 0+0000 — PR 40+0820

RUTA No. 40MT01
PR 0+0000 — PR 07+0654

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI.MNL.IN.15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza PR 00+000 a PR 01+000 ruta 4010



Limpieza de alcantarillas PR 1+000 al PR 2+000 ruta 4010



Limpieza de alcantarillas PR 2+000 al PR 4+000 ruta 4010



Limpieza de alcantarillas PR 4+000 al PR 6+000 ruta 4010

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No. 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MNU-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACIAS (VICHADA); 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETE | DIRECCIÓN TERRITORIAL: META | SEMANA No.: 5 del 23/10/2023 al 29/10/2023 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. WENDY OVIEDO | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META. SECTORES 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACIAS (VICHADA); SECTOR PUENTE ARMENA - LA AREPA: PR 0+0000 - PR 40+0820/40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR: PR 0+0000 - PR 7+0654 LOTE 2

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA:	ARMENA VIAL SAS		INTERVENTOR:	INTEPRO S.A.S	
INTEGRANTES:	(N/A)		INTEGRANTES:		
CONTRATO No.	2700 de 2023	VALOR INICIAL: $ 181.306.400,00	CONTRATO No.	2535 de 2023	VALOR INICIAL: $ 382.195.352,00
FECHA DE INICIO:	21/06/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	21/06/2023	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ACUMULADO: $ 181.306.400,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023	VALOR ACUMULADO: $ 382.195.352,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:		VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
					SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA:	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 181.308.400,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 13.598.130,00
	SALDO DE VIGENCIA	$ 167.710.270,00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 181.308.400,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 56.606.875,00	31,25%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.606.875,00	31,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 56.606.875,00	31%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 56.606.875,00	31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.331.775,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: SEPTIEMBRE
VALOR FACTURA: $ 13.598.130,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA	$ -	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: AGOSTO
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR IIC	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oleoo de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACION:	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	10	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

23/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 6+000 al PR 8+000 ruta 4010
24/10/2023 Desmonte manual PR 9+000 a PR 11+000 ruta 4010
25/10/2023 Poda de arboles PR 0+000 al PR 1+000 uta 4010
26/10/2023 Recoleccion de basura PR 0+000
27/10/2023 Limpieza de descoles PR 12+000 al PR 13+000 ruta 4010
28/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
29/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

30/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 8+000 al PR 9+000 ruta 4010
31/10/2023 Limpieza de descoles PR 12+000 ruta 4010
1/11/2023 Limpieza de alcantarillas PR 13+000 al PR 15+000 ruta 4010
2/11/2023 Limpieza de alcantarillas PR 29+000 ruta 4010
3/11/2023 Barrer calles PR 6+000 al PR 7+000 ruta 4010
4/11/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
5/11/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 4010
PR 0+0000 — PR 40+0820

RUTA No. 40MT01
PR 0+0000 — PR 07+0654

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNU-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de alcantarillas PR 6+000 al PR 8+000 ruta 4010



Desmonte manual PR 9+000 a PR 11+000 ruta 4010



Poda de arboles PR 0+000 al PR 1+000 uta 4010



Recoleccion de basura PR 0+000



Limpieza de descoles PR 12+000 al PR 13+000 ruta 4010

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No. 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCT 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO No. 2770 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2619 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** INTERSA S.A.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GUADAÑAS	HUSBARNA/2019			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
GUADAÑAS	SHINDAIWA/ 2019			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL ACTIVO				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	180	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	180	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACION= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORIA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MINIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obl
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOSÉ RAMON JIMENEZ PALACIOS
Representante Legal
CC No. 17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEON REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCION TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2770 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM META

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	GARCIA QUINTERO CESAR AUGUSTO	CC 1006219819		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ARIMENA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL S.A.S. – ARIMENA VIAL S.A.S.	$1,600,000	$80,800	V	EPS037-NUEVA EPS	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
2	JIMENEZ MALAVER JOHAN ALDAIR	CC 1006775170		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
3	GONZALEZ MARTINEZ ALBEIRO	CC 1117323028		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
4	CARRANZA CASTAÑO DUBAN	CC 1117325455		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	NUEVA EPS CM	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
5	ESPINOSA URBANO LUIS ERIKSON	CC 1124822874		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	EPS037-NUEVA EPS	7902255121	$46,400	25-14 COLPENSIONES	7902255121	$185,600	$46,400			
6	JIMENEZ PALACIOS MANUEL ARNOLDO	CC 17344696		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	25-14 COLPENSIONES	7902255121	$185,600	$46,400			
7	JIMENEZ PALACIOS JOSE	CC 17341420		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	EPS005-SANITAS S.A.	7902255121	$46,400	25-14 COLPENSIONES	7902255121	$185,600	$46,400			
8	GONZALEZ TRIVIÑO ISRAEL	CC 17387893		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	CCFC55-CAJACOPI EPS S.A.S	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
9	MORENO ALDANA JESUS MERARDO	CC 17596559		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
10	MENDEZ LANDAETA JOSE WILLIAM	CC 86049785		$1,160,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		$1,600,000	$80,800	V	EPS005-SANITAS S.A.	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 2/11/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúa por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSE RAMON JIMENEZ PALACIOS
Representante Legal
CC No. 17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C.
Interventor

Original. Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias. Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2770 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: OCT 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1028123	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 181,308,400.00	
			TOTAL			$ 181,308,400.00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 181,308,400.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									RP No. 1028123 del 45184	**$ 181,308,400.00**	**$ 181,308,400.00**				
01	Parcial	25-30 SEP/23	$ 7,618,000.00	$ 1,447,420.00	$ 9,065,420.00	$ -	$ -	$ -		$ 172,242,980.00	$ 172,242,980.00				
02	Parcial	1 - 31 oct/23	$ 38,090,000.00	$ 7,237,100.00	$ 45,327,100.00					$ 126,915,880.00	$ 126,915,880.00				
TOTALES			**$ 45,708,000.00**	**$ 8,684,520.00**	**$ 54,392,520.00**	**$ -**				**$ 126,915,880.00**	**$ 126,915,880.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR ACTA	$ 45,708,000.00	$ 8,684,520.00	**$ 54,392,520.00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 45,708,000.00	$ 8,684,520.00	**$ 54,392,520.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor *realizar la comparación del formato* con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOSÉ RAMON JIMENEZ ACACIOS
Representante Legal
CC No. 17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2770 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT 2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco																																0
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSE RAMON JIMENEZ PALACIOS
Representante Legal
17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEON REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 2770 de 2023 **CONTRATISTA:** ARIMENA VIAL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 4010 PUENTE ARIMENA – LA AREPA - CRUCE GUACACÍAS (VICHADA), SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA: PR 0+0000 - PR 40+0820/40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR, PR 0+0000 - PR 7+0654 LOTE 2.

FECHA DE INICIO: 22/9/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 181,308,400.00

VALOR ACUMULADO: $ 181,308,400.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **2619 - 2023** **INTERVENTOR:** INTERSA S.A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10.00%	$ 18,130,840.00	11	9	2023	11	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20.00%	$ 36,261,680.00	11	9	2023	11	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30.00%	$ 54,392,520.00	11	9	2023	11	7	2024
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		**N.A.**						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620-47-620- 47 - 994000050517

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/9/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	128%	$ 232,000,000.00	11	9	2023	31	12	2023
Otros		**N.A.**						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620- 74 – 994000011606 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/9/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		**N.A.**						
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		**N.A.**						

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2022 (Año)

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		**N.A.**			
Calidad de Estudios y Diseños		**N.A.**			
Estabilidad y/o Calidad de Obra		**N.A.**			

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		**N.A.**						
Otros		**N.A.**						

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Ing. **Carolina Reina Pelaez**
Residente: INTERSA S.A
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INTERSA S.A.
INGENIERIA

Contrato 2771 de 2023
Arimena Vial S.A.S

Dirección Calle 50A #41B-14 Los Alcázares, Villavicencio-Meta email amv1meta@intersaingenieria.com

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MNS-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4009 PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 2 (Numeración consecutiva) del 2/10/2023 al 8/10/2023 — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. WENDY QUEVEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META SECTORES 4009 PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA, PR33+0000 PR68+1000 LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ARIMENA VIAL SAS
INTEGRANTES: JVAV
CONTRATO No.: 2773 de 2023
FECHA DE INICIO: 22/8/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR INICIAL: $ 197.097.800,00
VALOR ADICIONES: $
VALOR ACUMULADO: $ 197.097.800,00
$
$
$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: INTERSA S.A.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 2618 2023
FECHA DE INICIO: 1/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR INICIAL: $ 382.195.352,00
VALOR ADICIONES: $
VALOR ACUMULADO: $ 382.195.352,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR: $

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 132.232.800,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 9.917.460,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 249.962.552,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.519,61	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 197.232.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 16.529.100,00	12,50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 16.529.100,00	12,50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.529.100,00	12,50%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.529.100,00	12,50%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA:	$ 8.264.550,00	6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA:	$ 8.264.550,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 9.917.460,00

(En el evento de no haber facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haber facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI		NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A
EMISIONES:	SI		NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

2/10/2023 Rocería de PR 60+000 a PR 58+000 ruta 4009
3/10/2023 Rocería de PR 58+000 a PR 57+000 ruta 4009
4/10/2023 Rocería de PR 57+000 a PR 55+000 ruta 4009
5/10/2023 Rocería PR 55+000 a PR 53+000 ruta 4009
6/10/2023 Rocería PR 53+000 al PR 52+000 ruta 4009
7/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
8/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

9/10/2023 Rocería de PR 52+000 a PR 50+300 ruta 4009
10/10/2023 Rocería de PR 55+000 a PR 56+000 ruta 4009
11/10/2023 limpieza de(Box coulvert y alcantarillas) PR 57+000 a PR 59+000 ruta 4009
12/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 64+000 a PR 65+000 ruta 4009
13/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 68+1000 ruta 4009
14/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
15/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 4009
PR 33+0000 — PR 68+1000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNL-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rocería de PR 60+000 a PR 58+000 ruta 4009



Rocería de PR 58+000 a PR 57+000 ruta 4009



Rocería de PR 57+000 a PR 55+000 ruta 4009



Rocería PR 55+000 a PR 53+000 ruta 4009



Rocería PR 53+000 al PR 52+000 ruta 4009

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CODIGO	MEPI-MNS-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 1/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4009 PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 3 (Numeración consecutiva) del 9/10/2023 al 15/10/2023. Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. WENDY QUEVEDO — GESTOR TÉCNICO DE PROYE: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META SECTORES 4009 PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA, PR33+0000 PR68+1000 LOTE 4

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ARIMENA VIAL SAS
INTEGRANTES: JVIAL
CONTRATO No. 3771 de 2023
FECHA DE INICIO: 22/8/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR INICIAL: $ 197.097.800,00
VALOR ADICIONES: $
VALOR ACUMULADO: $ 197.097.800,00
$
$
$

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: INTERSA S.A.
INTEGRANTES:
CONTRATO No. 2618 2023
FECHA DE INICIO: 1/9/2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:

VALOR INICIAL: $ 382.195.352,00
VALOR ADICIONES: $
VALOR ACUMULADO: $ 382.195.352,00
VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $
SALDO POR AMORTIZAR: $

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 132.232.800,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 9.917.460,00	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 122.315.340,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39	
	SALDO DE VIGENCIA	$ 309.897.520	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 197.232.800,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 36.793.650,00 — 18,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ 36.793.650,00 — 18,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 36.793.650,00 — 18,75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 36.793.650,00 — 18,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ — %

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 8.264.550,00 — 6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 8.264.550,00 — 6,25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 9.917.460,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 72.297.832,39 — 18,92%

INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ — %

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A
EMISIONES:	SI	NO	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

9/10/2023 Rocería de PR 52+000 a PR 50+300 ruta 4009
10/10/2023 Limpieza de alcantarillas de PR 55+000 a PR 56+000 ruta 4009
11/10/2023 limpieza de(Box coulvert y alcantarillas) PR 57+000 a PR 59+000 ruta 4009
12/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 64+000 a PR 65+000 ruta 4009
13/10/2023 Limpieza de alcantarillas PR 68+1000 ruta 4009
14/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
15/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

16/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
17/10/2023 Limpieza de caja y barrido de pavimento PR 00+000
18/10/2023 Limpieza de caja y barrido de pavimento PR 00+000
19/10/2023 Recoleccion de basura y lavado de señalizacion PR 00+000
20/10/2023 Limpieza de alcantarillas del PR 52+900 al 54+000
21/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
22/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 4009
PR 33+0000 — PR 68+1000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNS-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rocería de PR 52+000 a PR 50+300 ruta 4009



Limpieza de alcantarillas de PR 55+000 a PR 56+000 ruta 4009



limpieza de(Box coulvert y alcantarillas) PR 57+000 a PR 59+000 ruta 4009



Limpieza de alcantarillas PR 64+000 a PR 65+000 ruta 4009



Limpieza de alcantarillas PR 68+1000 ruta 4009

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 22/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4009 PUERTO GAITAN- PUENTE ARIMENA

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 4 del 16/10/2023 al 22/10/2023 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. WENNY CHEVEDD — GESTOR TÉCNICO DE PROYE: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META SECTORES 4009 PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA PR31+0000 PR68+1000 LOTE A

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ARIMENA VIAL SAS
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No.: 2171 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 132.232.800,00
FECHA DE INICIO: 22/9/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 132.232.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — $ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: INTERVIAS S.A.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 2619 2023 — VALOR INICIAL: $ 382.195.352,00
FECHA DE INICIO: 1/9/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 382.195.352,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 132.232.800,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 9.917.460,00
	SALDO DE VIGENCIA:	$ 122.315.340,00
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39
	SALDO DE VIGENCIA:	$ 309.897.520

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 132.232.800,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 33.058.200,00 — 25,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 33.058.200,00 — 25,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA: $ - — %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ - — %
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: $ 33.058.200,00 — 25,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 33.058.200,00 — 25,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: $ - — %
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ 8.264.550,00 — 6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ 8.264.550,00 — 6,25%

SI	NO
X	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 9.917.460,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 72.297.832,39 — 18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA: $ - — %
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA: $ - — %

SI	NO
x	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:
Meta Física Ejecutada %:
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:		DISPONIBLE
	PERMISO MINERO: SI ____ NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO	
UBICACIÓN:		
	PERMISO MINERO: SI ____ NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	
EMISIONES:	SI	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

16/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
17/10/2023 Limpieza de rejillas y barrido de pavimento PR 00+000
18/10/2023 Limpieza de rejilla y barrido de pavimento PR 00+000
19/10/2023 Recoleccion de basura y lavado de señalizacion PR 00+000
20/10/2023 Limpieza de alcantarillas del PR 52+900 al 54+000
21/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
22/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

23/10/2023 Roceria PR 50+300 al PR 49+00 ruta 4009
24/10/2023 Roceria PR 50+300 al PR 49 4009
25/10/2023 Roceria PR 49+000 al PR 48+000 ruta 4009
26/10/2023 Roceria del PR 48+000 al PR 46+000
27/10/2023 Roceria del PR 46+000 al PR 45+000
28/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
29/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 4009

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Limpieza de rejillas y barrido de pavimento PR 00+000



Limpieza de rejilla y barrido de pavimento PR 00+000



Recoleccion de basura y lavado de señalizacion PR 00+000



Limpieza de alcantarillas del PR 52+900 al 54+000

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Supervisión de Responsabilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

CÓDIGO	MEPI-MNL-IN-15-FR-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 29/10/2023 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: 4009 PUERTO GAITAN- PUENTE ARIMENA

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: META — SEMANA No.: 5 (Numeración consecutiva) del 23/10/2023 al 29/10/2023. Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. WENNY CHEVEDD — GESTOR TÉCNICO DE PROYE: ORLANDO ORTIZ GOMEZ

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL META SECTORES 4009 PUERTO GAITAN - PUENTE ARIMENA PR33+0000 PR68+1000 LOTE A

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS 4010 Y 40MT01

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: ARIMENA VIAL SAS
INTEGRANTES: (N/A)
CONTRATO No.: 2771 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 132.232.800,00
FECHA DE INICIO: 23/8/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 132.232.800,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — $ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: INTERSA S.A.
INTEGRANTES:
CONTRATO No.: 2619 2023 — VALOR INICIAL: $ 382.195.352,00
FECHA DE INICIO: 1/9/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 382.195.352,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 132.232.800,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 9.917.460,00	
	SALDO DE VIGENCIA:	$ 122.315.340,00	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 382.195.352,00	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ 72.297.832,39	
	SALDO DE VIGENCIA:	$ 309.897.520	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 132.232.800,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 41.322.750,00	31,25%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ 41.322.750,00	31,25%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.322.750,00	31,25%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 41.322.750,00	31,25%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.264.550,00	6,25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.264.550,00	6,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 9.917.460,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 72.297.832,39	18,92%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	x	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: sep-23
VALOR FACTURA: $ 72.297.832,39

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C

En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)
Estudios y diseños				
*				
*				
*				

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el oficio de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

					DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO		N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO		N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO		N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A
EMISIONES:	SI		NO		N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	8	7
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	7
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	1	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALUOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

23/10/2023 Rocería PR 50+300 al PR 49+000 margen derecha ruta 4009
24/10/2023 Rocería PR 50+300 al PR 49+ 000 margen izquierda ruta 4009
25/10/2023 Rocería PR 49+000 al PR 48+000 ruta 4009
26/10/2023 Rocería del PR 48+000 al PR 46+000 ruta 4009
27/10/2023 Rocería del PR 46+000 al PR 45+000 ruta 4009
28/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
29/10/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

30/10/2023 Barrida de pavimento y limpieza de rejillas en el PR 68+1000 ruta 4009
31/10/2023 Poda y desmonte manual PR 68+000 al PR 65+000 ruta 4009
1/11/2023 Poda y desmonte manual PR 65+000 al PR 64+000 y limpieza de alcantarillas del PR 64+000 al PR 66+000 ruta 4009
2/11/2023 Rocería del PR 46+000 al PR 45+000
3/11/2023 Barrida de pavimento y limpieza de rejillas en el PR 68+1000 ruta 4009
4/11/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia
5/11/2023 Disponibilidad para atención de emergencias y vigilancia

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 4009
PR 33+0000 — PR 68+1000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MNL-IN-15 del Manual de Interventoría

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Rocería PR 50+300 al PR 49+000 margen derecha ruta 4009



Rocería PR 50+300 al PR 49+ 000 margen izquierda ruta 4009



Rocería PR 49+000 al PR 48+000 ruta 4009



Rocería del PR 48+000 al PR 46+000 ruta 4009

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:
NOMBRE: CAROLINA REINA
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Supervisión de Responsabilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 02/11/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 - 31 OCT2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO No. 2771 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2619 DE 2023 **INTERVENTORÍA:** INTERSA S.A.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GUADAÑAS	HUSBARNA/2019			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
GUADAÑAS	SHINDAIWA/ 2019			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL ACTIVO				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	150	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	150	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JOSÉ RAMON JIMENEZ PALACIOS
Representante Legal
CC No. 17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2771 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 31 OCT2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COFREM META

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 30)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	QUINTERO MALABERT YAIR SANIT	CC 1006556016		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S	$1,160,000	$80,800	V	NUEVA EPS CM	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
2	ROBLEDO RODRIGUEZ RAMIRO EDUARDO	CC 1124827799		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1,160,000	$80,800	V	EPS017-FAMISANAR	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
3	RODRIGUEZ GAITAN ANCELMO	CC 1125000877		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1,160,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			
4	JIMENEZ PALACIOS JOSE OSVALDO	CC 17341420		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1,160,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	230201-PROTECCION	7902255121	$185,600	$46,400			
5	ESPINOSA MADRID LUIS IGNACIO	CC 17343493		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1,160,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	231001-COLFONDOS	7902255121	$185,600	$46,400			
6	ROBLEDO ALAPE RAMIRO	CC 8190883		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1,160,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	25-14 COLPENSIONES	7902255121	$185,600	$46,400			
7	LIZARAZO CARRILLO JOSE OBED	CC 96126086		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1,160,000	$80,800	V	EPS002-SALUD TOTAL	7902255121	$46,400	231001-COLFONDOS	7902255121	$185,600	$46,400			
8	QUINTERO MALABERT KEVIN ALEXANDER	CC 1117325905		$ 1.160.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1,160,000	$80,800	V	EPS005-SANITAS S.A.	7902255121	$46,400	230301-PORVENIR	7902255121	$185,600	$46,400			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 02/11/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúa por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: JOSÉ RAMON JIMENEZ PALACIOS
Representante Legal
CC No. 17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Boootá D.C.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2771 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.S

MES INFORME MENSUAL: 1 - 31 OCT2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1029623	C-2401-0600-103-0-2401023-02	21	PROPIOS	CONTRATO PRINCIPAL	$ 132,232,800.00	$ 132,232,800.00
TOTAL						$ 132,232,800.00	$ 132,232,800.00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 132,232,800.00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
									RP No. 1029623 del 16/09/2023	**$ 132,232,800.00**	**$ 132,232,800.00**				
1	Parcial	sep-23	$ 9,260,000.00	$ 1,759,400.00	$ 11,019,400.00	$ -	$ -	$ -		$ 121,213,400.00	$ 121,213,400.00				
2	Parcial	oct-23	$ 27,780,000.00	$ 5,278,200.00	$ 33,058,200.00					$ 88,155,200.00	$ 88,155,200.00				
3	Parcial	nov-23													
4	Parcial	dic-23													
TOTALES			**$ 37,040,000.00**	**$ 7,037,600.00**	**$ 44,077,600.00**	**$ -**				**$ 88,155,200.00**	**$ 88,155,200.00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR ACTA	$ 37,040,000.00	$ 7,037,600.00	**$ 44,077,600.00**
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 37,040,000.00	$ 7,037,600.00	**$ 44,077,600.00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: JOSÉ RAMON JIMENEZ PALACIOS
Representante Legal
CC No. 17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 02/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No: 2771 de 2023 **CONTRATISTA:** EMPRESA DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN VIAL BRISAS DEL ARIMENA S.A.S – ARIMENA VIAL S.A.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 31 OCT2023 **PROYECTO:** CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 2619 DE 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	24	24	24	24	24	24	24	21	24	24	24	19	24	24	24	24	24	24	24	732
Lluvias moderadas												4								3				5								12
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: JOSÉ RAMÓN JIMÉNEZ PALACIOS
Representante Legal
17.349.141 de Puerto Gaitán (Meta)
Contratista

Firma
Nombre: ISABEL VICTORIA LEÓN REYES
Representante Legal INTERSA S.A.
CC No. 39.778.286 de Bogotá D.C.
Interventor

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE OBRA No. 2771-2023 **CONTRATISTA:** ARIMENA VIAL S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL META. SECTORES 4009 PUERTO GAITÁN - PUENTE ARIMENA, PR33+0000 - PR68+1000 LOTE 4

FECHA DE INICIO: 21/9/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 132,232,800.00

VALOR ACUMULADO: $ 132,232,800.00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2619 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 13,223,280.00	11	9	2023	11	7	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 26,446,560.00	11	9	2023	11	1	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30%	$ 39,669,840.00	11	9	2023	11	7	2024
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 620- 47 - 994000050518

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 21/9/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	175%	$ 232,000,000.00	11	9	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 620- 74 – 994000011607 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/9/2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 2 (Día) 10 (Mes) 2023 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Cumplimiento			Día / Mes / Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde (Día / Mes / Año)	VIGENCIA Hasta (Día / Mes / Año)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Ing. **Carolina Reina Pelaez**
Residente: INTERSA S.A
Matrícula Profesional No.: 25202-152822 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

8. OFICIOS E INFORMES ENVIADOS

OFICIO No	DIRIGIDO	ENTIDAD	ASUNTO	RADICACIÓN
CTO		POLICIA DE CARRETERAS	Solicitud información de accidentalidad mes de Septiembre de 2023	
2023S-VMET-000379	ISABEL VICTORIA LEÓN REYES	INVIAS TERRITORIAL META	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-001889 Aprobación de personal, vehículos y oficina AMVG1 INTERSA S.A.	24/8/2023
2023S-VMET-000869	ISABEL VICTORIA LEÓN REYES	INVIAS TERRITORIAL META	Aprobación de personal, vehículos y oficina AMVG1 INTERSA S.A.	29/8/2023
2023S-VMET-000976	ISABEL VICTORIA LEÓN REYES	INVIAS TERRITORIAL META	Orden de inicio contrato 2619 de 2023	30/8/2023
2023S-VMET-006397	JIMENEZ PALACIOS JOSE RAMON	INVIAS TERRITORIAL META	Orden de inicio contrato 2770 de 2023	22/9/2023
2023S-VMET-009398	ISABEL VICTORIA LEÓN REYES	INVIAS TERRITORIAL META	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-000894 (Aprobación de especialista AMVG1)	3/10/2023
2023S-VMET-009455	ISABEL VICTORIA LEÓN REYES	INVIAS TERRITORIAL META	Respuesta al radicado No 2023E-VUVRAZ-000068 (aprobación especialistas AMVG1)	3/10/2023
2023S-VMET-009945	ISABEL VICTORIA LEÓN REYES	INVIAS TERRITORIAL META	Solicitud de Información Adicional sobre Programación de Limpieza de Alcantarillas en Ruta 40MTA	4/10/2023
DT-MET 47351	ISABEL VICTORIA LEON REYES	INVIAS TERRITORIAL META	Aprobación de pólizas del contrato 2619 de 2023	14/09/2023
2023S-VMET-005951	JIMENEZ PALACIOS JOSE RAMON	INVIAS TERRITORIAL META	Aprobación pólizas contrato 2770 de 2023	21/09/2023
2023S-VMET-006397	JIMENEZ PALACIOS JOSE RAMON	INVIAS TERRITORIAL META	Orden de inicio contrato 2770 de 2023	21/09/2023
2023S-VMET-005982	JIMENEZ PALACIOS JOSE RAMON	INVIAS TERRITORIAL META	Aprobación pólizas contrato 2771 de 2023	21/09/2023

2023S-VMET-006485	JIMENEZ PALACIOS JOSE RAMON	INVIAS TERRITORIAL META	Orden de inicio contrato 2771 de 2023	21/09/2023
2023S-VMET-005544	JOSE TITO PARRADO MURCIA	INVIAS TERRITORIAL META	Aprobación pólizas contrato 2862 de 2023	20/09/2023
2023S-VMET-006100	JOSE TITO PARRADO MURCIA	INVIAS TERRITORIAL META	Orden de inicio contrato 2862 de 2023	21/09/2023
INVAMV-2619-001	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	RADICADO HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE TÉCNICO PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	75289
INVAMV-2619-002	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	RADICADO HOJA DE VIDA INGENIERO AUXILIAR II, AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y CONDUCTOR PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	78162
INVAMV-2619-003	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA: ESPECIALISTA EN VÍAS Y PAVIMENTOS, ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO, ESPECIALISTA AMBIENTAL Y ESPECIALISTA EN GEOTECNIA PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	2023E-VUVRAZ-000068
INVAMV-2619-004	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	RADICADO HOJA DE VIDA ESPECIALISTA EN HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	2023E-VUVRAZ-000894
INVAMV-2619-005	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	PRESENTACIÓN VEHÍCULOS CONSULTORÍA CONTRATO N° 2619 DE 2023.	22/8/2023
INVAMV-2619-006	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	RADICACIÓN HOJAS DE VIDA AUXILIAR I E INSPECTOR SISO PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	23/8/2023

INVAMV-2619-007	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	RADICACIÓN HOJA DE VIDA ESPECIALISTA ESTRUCTURAL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	2023E-VUVRAZ-001920
INVAMV-2619-008	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	ALCANCE AL COMUNICADO GEN-005-INVMETA-2619-2023 CON RESPECTO AL REEMPLAZO DEL VEHÍCULO DE PLACA KPW964 PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	2023E-VUVRAZ-002405
INVAMV-2619-009	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	PRESENTACIÓN OFICINA CONTRATO N° 2619 DE 2023.	2023E-VUVRAZ-002399
INVAMV-2619-010	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	ALCANCE AL COMUNICADO GEN-002-INVMETA-2619-2023 CON RESPECTO AL REEMPLAZO DE LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y RADICACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DEL SEGUNDO CONDUCTOR PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	2023E-VUVRAZ-003388
INVAMV-2619-011	INVIAS TERRITORIAL META	INTERSA S.A	ALCANCE AL COMUNICADO GEN-002-INVMETA-2619-2023 CON RESPECTO AL REEMPLAZO DEL AUXILIAR II PARA EL CONTRATO N° 2619 DE 2023.	4/9/2023

9. REGISTRO FOTOGRAFICO (ANEXO)

MANTENVIAL 40MTA (PIPIRAL - VILLAVICENCIO); 65 MTE (PTE GUATIQUÍA - LOS CABALLOS); 6509 (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA









INTERSA S.A.
INGENIERIA

ARIMENA S.A 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACIAS (VICHADA); 40MT01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR.









ARIMENA S.A 4009 PUERTO GAITAN- PUENTE ARIMENA









	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 9/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2023 **PROYECTO:** PIPIRAL-VILLAVICENCIO/P. GUATIQUIA-LOS CABALLOS/ YE GRANADA -VILLAVICENCIO/ VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ/ PUENTE ARIMENA-LA AREPA/ CRUCE 40 - EL PORVENIR

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 2619-23 **INTERVENTORÍA:** INTERSA SA

CONTRATO DE OBRA No. **CONTRATISTA:**

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHICULO AMV 1	PLACA FLX 153	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO AMV 2	PLACA GJO 855	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: DRA ISABEL VICTORIA LEON REYES
Representante Legal

Firma
Nombre:ING WENDY QUEVEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 25202- CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 9/11/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2619-23

INTERVENTOR: INTERSA SA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: oct-23

PROYECTO: PIPIRAL-VILLAVICENCIO/P. GUATIQUIA-LOS CABALLOS/ YE GRANADA -VILLAVICENCIO/ PTO GAITAN -PUENTE ARIMENA/ PUENTE ARIMENA-LA AREPA/ CRUCE 40 - EL PORVENIR

CONTRATO DE OBRA No.:

CONTRATISTA:

NOMBRE ARL: SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COFREM

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	AMPARO CAROLINA REINA	35262854	ING RESIDENTE	$ 6,600,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INTERSA SA	$ 6,600,000	$ 459,400	V	SALUD TOTAL	66628487	$ 264,000	SKANDIA	66628487	$ 1,056,000	$ 264,000	$ -	$ -	
3	JUAN CARLOS BOYACA	79952967	AUXILIAR I	$ 4,200,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INTERSA SA	$ 4,200,000	$ 292,400	V	NUEVA EPS	66628487	$ 168,000	PORVENIR	66628487	$ 672,000	$ 168,000	$ -	$ -	
3	ALIX XIOMARA PARDO	1,030,649,545	AUXILIAR II	$ 2,900,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INTERSA SA	$ 2,900,000	$ 201,900	V	FAMISANAR	66628487	$ 116,000	PROTECCIÓN	66628487	$ 464,000	$ 116,000	$ -	$ -	
4	MARIA MARGARITA LINARES LAMUS	1123532699	INSP SISO	$ 1,075,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	50	INTERSA SA	$ 1,160,000	$ 80,800	V	NUEVA EPS	66628487	$ 46,400	PORVENIR	66628487	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
5	PAULA ANDREA FINO MERCADO	1020839773	AUX ADMINISTRATIVA	$ 1,356,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INTERSA SA	$ 1,356,000	$ 94,400	V	SANITAS	66628487	$ 54,300	PORVENIR	66628487	$ 217,000	$ 54,300	$ -	$ -	
6	RUBEN DARIO REINA PELAEZ	86077389	CONDUCTOR	$ 1,413,600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INTERSA SA	$ 1,413,600	$ 98,400	V	SANITAS	66628487	$ 56,600	PROTECCIÓN	66628487	$ 226,200	$ 56,600	$ -	$ -	
7	PEDRO NEL CASTRO HERNANDEZ	17321120	CONDUCTOR	$ 1,413,600	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	100	INTERSA SA	$ 1,413,600	$ 98,400	V	CAJACOPI	66628487	$ 56,600		66628487	$ -	$ 56,600	$ -	$ -	
8																				
9																				
N																				
									$ 1,325,700				$ 761,900			$ 2,820,800	$ 761,900	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 18,958,200**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha 9/11/2023 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.

7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: DRA ISABEL VICTORIA LEON REYES
REPRESENTANTE LEGAL

Firma

Nombre: ING WENDY QUEVEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202- CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 9/11/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2619 - 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA SA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBREBRE DE 2023 **PROYECTO:** PIPIRAL-VILLAVICENCIO/P. GUATIQUIA-LOS CABALLOS/ YE GRANADA -VILLAVICENCIO/ VILLAVICENCIO-PTO LOPEZ/ PUENTE ARIMENA-LA AREPA/ CRUCE 40 - EL PORVENIR

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATISTA:**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	902423	C-2401-0600-103-0-2401054-02	21	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 382,195,362	
			TOTAL			$ 382,195,362	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 382,195,362**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**sep-23**	$ 59,362,481.00	$ 11,278,871.39	$ 70,641,352.39				902423 - 2/08/2023	$ 311,554,010	$ 311,554,009.61		
2	**oct-23**	$ 60,821,579.00	$ 11,556,100.01	$ 72,377,679.01					$ 239,176,331	$ 239,176,330.60		
3	**nov-23**											
4	**dic-23**											
5												
TOTALES		**$ 120,184,060.00**	**$ 22,834,971.40**	**$ 143,019,031.40**		**$ -**			**$ 239,176,330.60**	**$ 239,176,330.60**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 120,184,060.00	$ 22,834,971.40	$ 143,019,031.40
*			
*			
VALOR TOTAL	$ 120,184,060.00	$ 22,834,971.40	$ 143,019,031.40

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: Dra ISABEL VICTORIA LEON REYES
Representante Legal

Firma
Nombre: ING WENDY QUEVEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202- 62943CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: **1/10/2023** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2619 de 2023 **INTERVENTOR:** INTERSA S.A

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE INVIAS DIRECCION TERRITORIAL META, MODULO 4, GRUPO 1 (CODIGO 40 MTA PIPIRAL - VILLAVICENCIO, CODIGO 6509 YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO (PASO ANTIGUO PUENTE GUAYURIBA), PR 57+0352 - PR 58+0584, CODIGO 65 MTE PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS PR 0+0000 - PR 3+0740, CODIGO 4010 PUENTE ARIMENA - LA AREPA - CRUCE GUACACIAS (VICHADA), SECTOR PUENTE ARIMENA - LA AREPA PR 0+0000 - PR 40+0820, CODIGO 40 MT 01 RAMAL CRUCE RUTA 40 - EL PORVENIR, PR 0+0000 - PR 7+0968.)

FECHA DE INICIO: 1/9/2023

PLAZO INICIAL: 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 382,195,352.00

VALOR ACUMULADO: $ 382,195,352.00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: Ing. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento	10.00%	$ 38,219,535.20	27	7	2023		27	5	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20.00%	$ 76,439,070.40	27	7	2023		27	11	2026
Calidad del servicio	30.00%	$ 114,658,605.60	27	11	2023		27	5	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-10205061

Certificado de modificación o anexo No.: Contrato inicial
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial De Seguros S.A

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 14/8/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Ing. Carolina Reina Pelaez
Residente AMV Grupo 1 de Interventoría
Matricula No.: 25202-152822 CND

Firma

Nombre: ING. WENDY YOHANNA QUEVEDO PARDO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-262943 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

10. INVENTARIO POSIBLES SITIOS DE EXPLOTACIÓN DE MATERIALES.

El inventario sobre posibles sitios para explotación de materiales en la zona de influencia de las vías donde ejerce su función la AMV-G1, indicando ubicación, clase de material y uso posible se relacionan en la siguiente tabla, actualizada a la fecha:

POSIBLES SITIOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES				
RUTA	**PR**	**LUGAR**	**DATOS DE CONTACTO**	**USO POSIBLE**
65 09: YE DE GRANADA - VILLAVICENCIO	36+0500	RIO GUAMAL		BASE, SUBBASE, CONCRETO HIDRÁULICO, GAVIONES
	57+0500	RIO GUAYURIBA		
	58+0500	CEMENTOS CEMEX		
	61+0500	ECOBRAS	Cra 32 Nº 38 - 70 Edif. ROMARCO Ofic. 1204 Tel 6 71 51 00 - 6 71 54 23 - Villavicencio	BASE, SUBBASE, CONCRETO HIDRÁULICO, CONCRETO ASFÁSLTICO GAVIONES
	63+0200	MURCIA MURCIA	205 World Trade Center PBX 2 18 77 09 - Bogotá D.C. murcia@murcia.com.co	BASE, SUBBASE, CONCRETO HIDRÁULICO, CONCRETO ASFÁSLTICO GAVIONES
65 10: VILLAVICENCIO - BARRANCA DE UPÍA	A 500 M DEL PR 57+130 MARGEN DERECHA	CONSORCIO VIAL DEL ORIENTE	Casanare Calle 153 Nº 6 - 22 Bogotá Tel 6 74 39 99 - 6 77 17 47 civialdeloriente@gmail.com	BASE, SUBBASE, CONCRETO HIDRÁULICO, CONCRETO ASFÁSLTICO GAVIONES
65 MTE: PUENTE GUATIQUIA - LOS CABALLOS	01+0000	RÍO GUATIQUÍA		BASE Y SUBBASE
	01+0000	ARENA DE PEÑA		BASE Y SUBBASE
VILLAVICENCIO	ZONA URBANA	ARENAS EL TRIUNFO		BASE Y SUBBASE
40 07: VILLAVICENCIO PUERTO LOPEZ	A 1 Km DEL PR 00+0000 MARGEN DERECHA	NACIONAL DE PAVIMENTOS	Calle 38 Nº 31 - 58 Ofic 703 Tel 6 62 68 80 - 6 62 16 06 oficinavillavicencio@nacionaldepavimentos.com	AGREGADOS PÉTREOS MEZCLA ASFÁLTICA
	40+0600	CANTERA MURUJUY		BASE, SUBBASE, CONCRETO, GAVIONES

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se debe coordinar de manera precisa la programación de las actividades de los contratos de mantenimiento rutinario, para cumplir con los indicadores y mantener en óptimo estado las vías asignadas a la AMVG1.

- Es importante solicitar los recursos para estudios, diseños y obras de estabilización de taludes en la ruta 40MTA en los PR´s 81+0500, 81+0600, 81+0700, 82+0100, 82+0200, 82+0500, 83+0200, 83+0350, 83+0500, 84+0120, 84+0300, 84+0400, 84+0600, 84+0900, 84+0960, 85+0400, 85+0900, 86+0000, 86+0300, 86+0500, 87+0000, 91+0460, 92+0000, 92+0860, sitios donde se han presentado deslizamientos.

- Se deben cambiar las estructuras de contención en la vía 40MTA ya que en algunos casos han cumplido su vida útil, como en el caso de los gaviones, donde las mallas están en mal estado y han comenzado a desintegrarse, perdiendo su funcionalidad, algunos fueron reparados por el contrato 1545-2021 pero aún se necesita realizar otras reparaciones.

- Se continúa reportando las invasiones que se presentan en las vías a cargo y se continúa haciendo el seguimiento a las denuncias hechas ante la secretaria de control físico de la Alcaldía de Villavicencio.

- Es importante revisar y/o evaluar la capacidad hidráulica de las obras de drenaje de la vía 40MTA y 65MTE que debido a los cambios climáticos son insuficientes para el caudal que se tiene en época de invierno

- Se hace necesario realizar mantenimiento de las vías 4010 y 40MT01 en verano ya que en los meses de invierno es casi imposible realizarlo dadas las condiciones del terreno.

- Es necesario realizar un análisis de estabilidad del talud en los puntos donde se están presentando hundimientos y fallas en medialuna en la ruta 40MTA, puesto que rehabilitarlos implica añadir más peso al talud inferior y puede provocar daños mayores. Por lo anterior es necesario determinar la solución idónea para estabilizar los taludes y luego poder realizar intervenciones para rehabilitar el ancho total de la calzada.

- Se recomienda que se realicen los estudios y diseños pendientes para la ruta 6509 ya que no se cuenta con la suficiente información técnica para proponer obras de mitigación en dicho tramo.
- Se elabora y envía las actas de obra de los contratos de mantenimiento rutinario 2770,2771 y 2862 de 2023
- Se realiza y envía informe del estado actual de los sitios críticos todos los miercoles
- Se realiza seguimiento a las obras de mitigación realizadas en el estribo No 1 del Puente Guayuriba, donde sigue la socavación del muro de gaviones.
- Se realiza seguimiento al Puente Guatiquia, se realizan informes del estado actual del mismo.
- Se realiza informe del estado de la via 65MTE donde se recomienda realizar rehabilitación en el tramos del PR0+0000 al PR1+300.
- Se solicita información de accidentalidad a la policía de carreteras
- Se realiza informe de necesidades de señalización en las vias a cargo
- Se envía información técnica solicitada por la territorial
- Se realizan cotizaciones y se suben al aplicativo INVICOSTOS

CARO[illegible]REINA PEREZ
Ing. Residente AMV-G1
