	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 976 de 2021 **Contratista:** Consorcio DSC

Contrato de Interventoría No. 1000 de 2021 **Interventoría:** Consorcio Ecovisión-190

Objeto Contrato de Obra:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INFORME MENSUAL No. 36 **MES O PERIODO:** 01/05/2024 al 31/05/2024

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	Anexo 1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		Anexo 2
2.4	Características técnicas del proyecto		Anexo 1
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	Anexos 3
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	Anexos 4
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	Anexos 5
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	Anexos 6
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	Anexos 7
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	Anexos 8
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	Anexos 9
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	Anexos 10
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	Anexos 11
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	Anexos 12
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	Anexos 13
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	Anexos 14
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	Anexos 15
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	Anexos 16
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		Anexo 1
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		Anexos al informe
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		Anexo 1
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	Anexos 17
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	Anexos 18
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	Anexos 19
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	Anexos 20
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	Anexos 21
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	Anexos 22
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	Anexos 23
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	Anexo 1
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	N/A
7	**Conclusiones y recomendaciones**		Anexo 1
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		Anexos al informe
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		Anexo 1
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		Anexos al informe

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 179 DE 26 DE ENERO DE 2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	
FECHA	5/06/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO CENTRO ORIENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **PERIODO MES:** 01/05/2024 al 31/05/2024

CONTRATO DE OBRA No.: 975 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", MÓDULO 6

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

PLAZO INICIAL: 111 meses
FECHA DE INICIO: 29/06/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 31 de agosto 2030
PLAZO ACUMULADO: 111 meses

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 179.689.018.569,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 18.311.743.031,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 198.000.760.600,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $
ANTICIPO AMORTIZADO: $

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1000 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ECOVISIÓN 190 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** Carlos German Cocas Urequi

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción	Km	25
	Mejoramiento	Km	0
	Rehabilitación	Km	0
Estructuras de drenaje	Alcantarillas	Und	176
	Arcos	Und	42
	Puentes	Und	5
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción	Km	0,1	11,17
	Mejoramiento	Km	0	0
	Rehabilitación	Km	0	0
Estructuras de drenaje	Alcantarillas	Und	0	42
	Arcos	Und	0	3
	Puentes	Und	0	0
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 172.957.357.905,00	$ 1.263.919.154,00	$ 174.221.277.059,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 17.560.562.427,00	$ 128.327.187,00	$ 17.688.889.614,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 970.000.000,00	$ 7.088.462,00	$ 977.088.462,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 385.000.000,00	$ 73.150.000,00	$ 458.150.000,00
GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 257.142.857,40	$ 48.857.142,60	$ 306.000.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 3.654.922.240,30	$ 694.435.225,70	$ 4.349.357.466,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 195.784.985.429,70	$ 2.215.777.171,30	$ 198.000.762.600,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 75.157.094.460,37	$ 549.224.920,22	$ 75.706.319.380,59	$ 75.706.319.380,59
AJUSTES	$ 5.845.990.545,00	$ 42.720.702,00	$ 5.888.711.247,00	$ 5.888.711.247,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS				$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 3.399.277,36		$ 3.399.277,36	$ 3.399.277,36
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 41.173.002,00	$ 190.802,00	$ 41.363.804,00	$ 41.363.804,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)				$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				$ -
VALOR EJECUTADO				**$ 81.639.793.708,95**

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 70.319.833.601,06
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 75.157.094.460,40
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	106,88%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	44
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	16
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	468
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	528

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Se realizó la revegtalizacion latera de la via para protección del talud PR35+310 - PR35+560 LD.



Se realizó instalacionde filtro en el PR35+080 - PR34+804 LI.



Se realizó la instalación de geotextil PR35+010-PR35+076 LI



Se realizó la construcción de Caissón para puente Caño Canoa PR43+195 LD

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

No aplica para el periodo actual del contrato.

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No. 15202-172889 BYC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Director Territorial.

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1000 DE 2021

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".



INFORME No 36:

DEL 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

INTERVENTOR
CONSORCIO ECOVISION-190
ORIGINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
DIRECCION OPERATIVA

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1000 DE 2021

MES 31. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5

OBJETO INTERVENTORIA:

INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".



INTERVENTORIA:
CONSORCIO ECOVISION-190

SEGUIMIENTO AL INFORME

COPIAS DIGITALES

DEPENDENCIA	No. DE COPIAS
COPIA 1 - INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS. BOGOTÁ	1
COPIA 2 - OFICINA INTERVENTORÍA. ARCHIVO	1

CONTROLES DE ELABORACIÓN

Elaboración: **ING. OSCAR FERNANDO ALVARADO DÍAZ** Director de la Interventoría Fecha: 05 de junio de 2024.	 Firma
Aprobó: **ING. OSCAR FERNANDO ALVARADO DÍAZ** Director de la Interventoría Fecha: 05 de junio de 2024.	 Firma

1. INTRODUCCIÓN

El CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Así, el Gobierno Nacional a través del Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: *"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"*, del cual se desprenden los contratos de obra 976 de 2021 *"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5" e interventoría 1000 de 2019* "*INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030*"

El presente documento se elabora bajo los estándares establecidos por el Manual de Interventoría del INVIAS para la elaboración de informes mensuales y corresponde al período comprendido entre el 01 de mayo de 2024 y el 31 de mayo de 2024 como el trigésimo sexto periodo del mensual de ejecución del contrato.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1. Localización.

El corredor San José del Guaviare – El Retorno – Calamar tiene una longitud de 73,46 km iniciando en el PR00+000 de la Ruta 7605 en el Municipio de Calamar departamento del Guavire hasta el PR73+460 en el municipio de San José del Guaviare en el mismo departamento (Ver Imagen 1).



Imagen 1. Localización corredor troncal de la Orinoquia (San José del Guaviare – El retorno – Calamar)

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

La vía comunica a los municipios de Calamar - El Retorno, con una longitud de 45.5 Km, los cuales se recorrer con una velocidad promedio de 25km/h en un tiempo aproximado de 01 hora con 48 minutos, gracias a la ejecución del proyecto se obtendrá como beneficio minimizará el tiempo del recorrido a un 36%.

Con la ejecución del proyecto se beneficia de manera directa 83.011 habitantes, en tres municipios del Departamento del Guaviare (Ver Tabla 2)

Población Municipios de Influencia			
Municipio	**Hombres**	**Mujeres**	**Total de Población**
Calamar	5.823	4.676	10.499 hab.
El Retorno	7.653	6.653	14.306 hab.
San José del Guaviare	29.473	28.733	58.206 hab.

Tabla 1: Población municipios de influencia
(https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/95015)

Relación de empleos generados

EMPLEOS GENERADOS				
Contrato	**Empleos Directos Generados**	**Empleos Indirectos Generados**	**Total, Empleos Generados**	**Empleo de la Zona de Influencia**
Interventoría	14	84	98	6
Obra	60	468	528	17

Tabla 2: Empleos Generados

2.3. Inventario y Estado inicial de la vía

La vía actualmente comunica los municipios de Calamar – El Retorno – San José del Guaviare, con una longitud de 73.46 Km con presencia de diferentes tipos de capas de rodadura como lo son material de afirmado, pavimento en concreto y mezcla asfáltica (Ver tabla 3).

Pr de inicio	Pr Finalización	Longitud en Km	Tipo Rodadura	Observación
Pr0+000	Pr0+800	0.8	Pavimento Rígido	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+800	Pr0+895	0.95	Afirmado	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+895	Pr0+930	0.35	Pavimento Rígido	Zona Urbana Calamar Guaviare
Pr0+930	Pr26+710	25.78	Afirmado	Calamar - Inspección La Libertad

Pr26+710	Pr27+100	0.39	Pavimento Rígido	Paso por Inspección La Libertad
Pr27+100	Pr45+300	18.20	Afirmado	
Pr45+300	Pr46+180	0.88	Pavimento Rígido	Paso por el Municipio de El Retorno
Pr46+180	Pr55+085	8.90	Afirmado	Municipio de El Retronó - Pavimento en Ejecución
Pr55+085	Pr69+080	13.99	Pavimento Flexible	Contrato de pavimentación en ejecución
Pr69+080	Pr73+460	4.38	Pavimento Flexible	Pavimento Flexible
TOTAL				73.46
TOTAL, EN AFIRMADO				53.03
TOTAL, EN PAVIEMENTO FLEXIBLE				18.38
TOTAL EN PAVIMENTO RIGIDO				1.97

Tabla 3. Estado inicial del corredor 7506.

En el tramo comprendido entre el PR 60+080 al PR 69+080 se ejecutó el convenio interadministrativo N° 1217 /2020 suscrito entre el Instituto Nacional de vías y el departamento del Guaviare, mediante el cual se realizó la construcción de estructura de pavimento asfaltico, obras de drenaje transversales y el Puente Agua Bonita II. Así mismo mediante el convenio interadministrativo N° 1818 celebrado entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el departamento de Guaviare, se pavimenta en concreto flexible el sector entre el PR 55+585 al PR 60+080 de la ruta. Posteriormente se celebró el convenio interadministrativo N° 2084/2021 entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y el departamento de Guaviare, con el cual se pavimentó en concreto asfaltico el tramo comprendido entre PR 46+585 al PR 55+585 con las obras de drenaje transversal y el puente Caño Trueno.

2.4. Características Técnicas del Proyecto

El alcance priorizado para el corredor vial corresponde a las siguientes intervenciones:

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños a Fase III debidamente aprobados del corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**

Mejoramiento, gestión predial, social, ambiental sostenible de conformidad con los estudios y diseños aprobados para dicho corredor vial.

Mejoramiento y pavimentacion en los sectores del corredor vial enunciado, los cuales obedecen a la priorización de las intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del alcance. Priorizando aquellos sectores que **se encuentran a nivel de afirmado y/o NO pavimentados**, incluyendo las obras necesarias que aseguren el

correcto funcionameinto de la via en las temporadas de lluvias, mejoramiento de las condiciones actuales de rodadura y de su desempeño hidraulico, asi como tambien, la de garantizar los tipos de estructuras necesarios para lograr la conectividad y funcionalidad de los tramos a intervenir. Las intervenciones deberan acometer priorizando el inicio de los trabajos en el sentido previamente acordado con el Instituto. En todo caso, el contratista promoverá la optimización técnica de las intervenciones, evaluando nuevas altenativas de materiales y procesos constructivos que permitan la optimizacion de los materiales de la zona, disminuyendo asi, longitudes de acarreo y espesores de intervencion, entre otros, enfocadas a garantizar el mayor número de kilómetros pavimentados.

Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a los largo del corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**

Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en corredor vial **"San José del Guaviare - El Retorno – Calamar".**



Imagen 2. Vía a nivel de afirmado K34 + 800



Imagen 3. Vía el sector El retorno - Libertad

Dentro de las acciones a emprender en el marco del contrato 976 de 2021, se ha priorizado la pavimentación del tramo Calamar- El Retorno en el departamento del Guaviare, en el sentido El Retorno – Calamar, cuyas características generales son las siguientes:

- Terraplenes

Con el fin de dar cumplimiento a las Especificaciones Generales de Construcción del INVIAS en lo referente a la construcción de terraplenes y aprovechar los materiales de calidad provenientes de la excavación, se realiza mejoramiento de estos con CAL VIVA y se incorporan en la construcción a dichas estructuras (Ver Imagen 4).

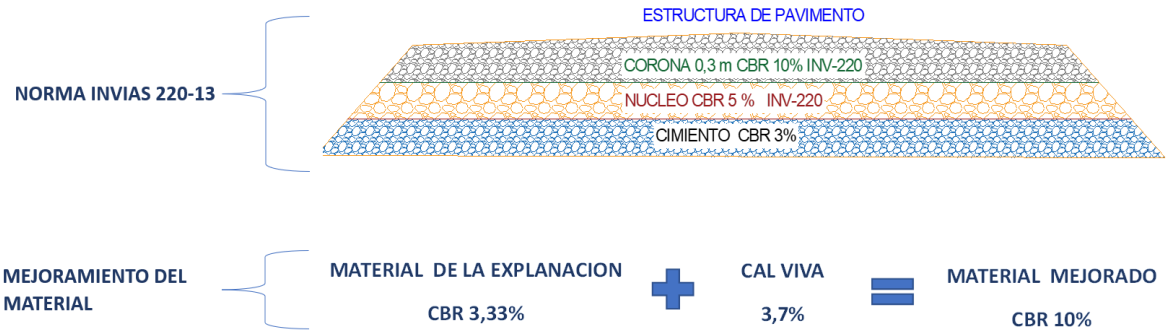


Imagen 4. Terraplén mejorado con Cal.

- Sección tipo

Aplicando la resolución 20213049941135 del 13 de septiembre de 2021 del Ministerio de Transporte, la cual permite ajustar parámetros de diseño, se implementó la sección tipo indicada en la imagen 2. Esto con el fin de aumentar la meta física propuesta en el anexo técnico del contrato 976 de 2021 (Ver Imagen 5).

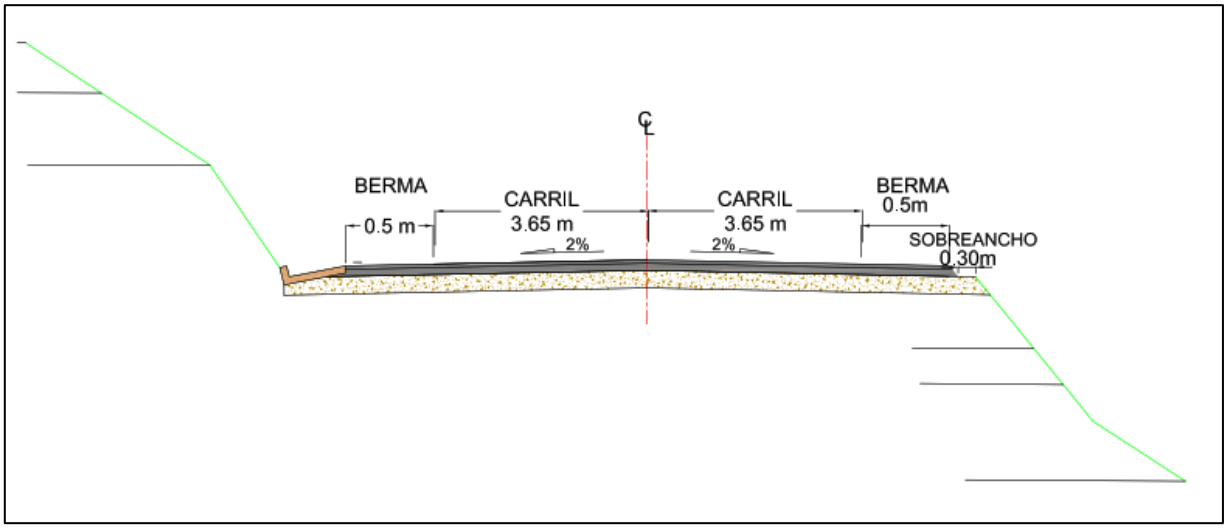


Imagen 5. Sección Típica Transversal.

- **Estructuras de pavimento:**

Se esta ejecutando una estructura de pavimento optimizada con el mejoramiento de la subrasante con CAL VIVA (Ver Imagen 6).

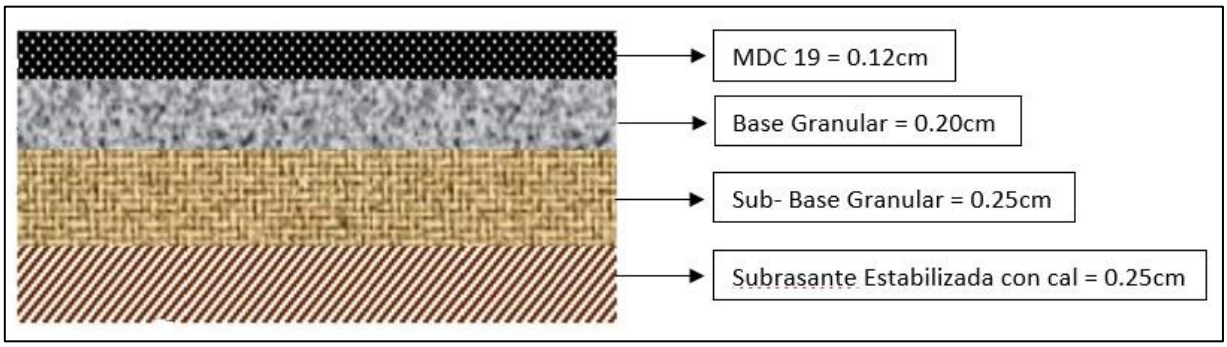

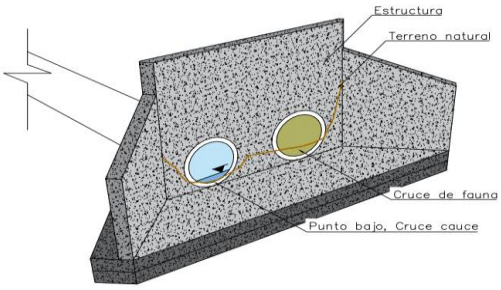



Imagen 6. Estructura de pavimento.

- **Obras transversales**

Se realiza la construcción de obras transversales con diferentes características (Ver Tabla 4), tanto para uso de drenaje como para pasos en fauna en 199 sitios.

N°	TIPO	IMAGEN	USO

1	Alcantarillas de drenaje redondas diámetro de 900 mm a 1200 mm		Uso drenaje
2	Arco metálico de drenaje con base entre 2,74 y 9,45		Uso drenaje
3	Alcantarilla de 900 mm, acondicionada		Uso drenaje y paso de fauna
3	Alcantarillas de drenaje con un paso de fauna, con diámetros entre 900 mm y 1800 mm		Uso hidráulico un ducto y paso de fauna el segundo ducto
4	Alcantarillas con dos pasos de fauna con diámetros de 1800 mm		Uso hidráulico ducto central y 2 ductos paralelos para paso de fauna



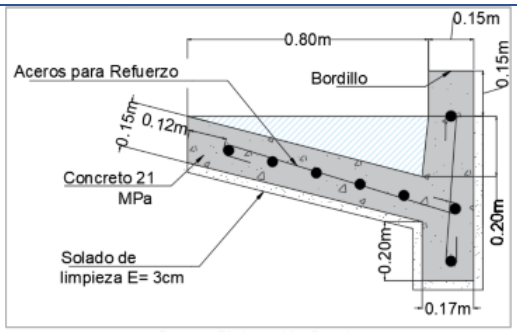
5	Arco con dos pasos de fauna con bases entre 2,74 m y 5,94		Uso hidráulico arco central y 2 arcos paralelos para paso de fauna
6	Puentes con luces de 20 m		Uso hidráulico y zona seca para paso de fauna

Tabla 4 Obras trasversales contrato 976 de 2021

- Obras de drenaje longitudinal

Con el fin de drenar la calzada de la vía de manera adecuada y proteger los predios aledaños, se esta ejecutando obras hidráulicas tipo cunetas. (Ver Tabla 5):

N°	TIPO	IMAGEN	USO
1	Cuneta de base 0,8 m		Paralelo a la vía, zonas con flujo medio

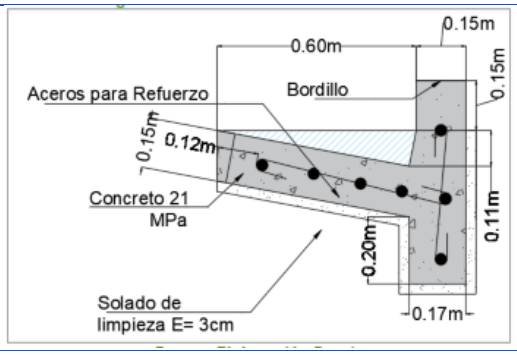

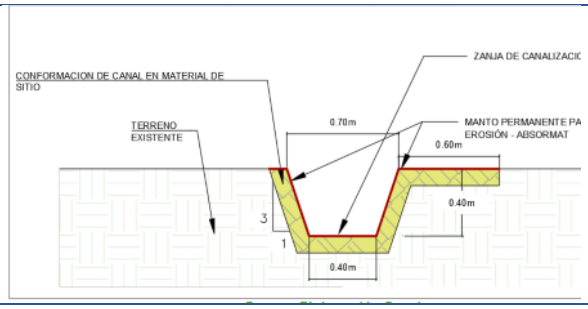
2	Cuneta de base 0,6 m		Paralelo a la vía, zonas con flujo bajo
3	Cuneta de base 0,6 m		Paralela a la vía, Uso berma – cuneta en zonas de alto flujo
4	Zanja de drenaje		En la base del terraplén en sectores sin cuneta, con alto flujo.

Tabla 5 Obras longitudinales contrato 976 de 2021

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información General del Contrato

Carretera	Corredor troncal de la Orinoquia (San José del Guaviare– El retorno – Calamar)
Contratista	CONSORCIO DSC
Contrato	976 DE 2021

Objeto	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 5".
Iniciación	29 de junio de 2021
Plazo Final	114 meses
Plazo final Actualizado	Hasta 31 de agosto de 2030
Valor Básico + IVA	$179.689.019.569,00
Adición 1	$18.311.743.031,00
Valor Actualizado	$198.000.762.600,00
Director de Obra	Edwin Bustos Ibarra
Resiente de Obra	Cesar Lancheros

Tabla 6. Información general del contrato de obra.

Seguimiento de Garantías Contractuales

El contratista mediante Póliza de Cumplimiento No 400033691 y la Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708 de la Compañía nacional de seguros

Póliza de Cumplimiento No 400033691:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	13/05/2021	31/12/2025	$ 7'971.504.831,30
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	13/05/2021	31/12/2025	$27'011.743.031,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	30/12/2030	$23'914.514.493,90
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	13/05/2021	31/12/2028	$15'943.009.662,60
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	30/12/2030	$137.445.000,00

Tabla 7. Pólizas de cumplimiento contrato 976 de 2021.

Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708:

AMPARO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$3’985.752.415,00

Tabla 8. Pólizas de responsabilidad civil contrato 976 de 2021.

Seguimiento al estado actual de las Garantías Contractuales

se realizó una modifica el parágrafo segundo de la cláusula séptima, por lo tanto, se ajustan los valores asegurados en el cuadro de amparos de acuerdo al Anexo N° 8 del 09 de agosto de 2023.

Póliza de Cumplimiento No 400033691:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/07/2023	31/12/2025	$ 9.125.743.101.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	26/07/2023	31/12/2025	$ 27.011.743.031.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	31/12/2025	30/12/2030	$ 27.377.229.305.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	26/07/2023	31/12/2028	$ 18.251.486.203.00
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2025	30/12/2030	$137.445.000,00

Tabla 9. Pólizas de cumplimiento contrato 976 de 2021.

se realizó una modifica el parágrafo segundo de la cláusula séptima, por lo tanto, se ajustan los valores asegurados en el cuadro de amparos de acuerdo al Anexo N° 7 del 26 de julio de 2023.

Póliza de Responsabilidad Civil No 400033708:

AMPARO	SUMA ASEGURADA
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$ 4.562.871.550.75

Tabla 10. Pólizas de responsabilidad civil contrato 976 de 2021

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

- **Trabajo de mejoramiento de puente.**

Durante este periodo se realizó la adecuación del puente Caño canoa con la construcción de los caisson N° 1, 2 y 5:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR43+195		Se realizó trabajo de Excavación, colocado de formaleta y vaciado de concreto de los Caisson N° 1,2 y 5 para el puente Caño Canoa.

Tabla 11. Abscisas de trabajo de mejoramiento de puente.



Imagen 07. Extracción de material de excavación de Caissón para puente Caño Canoa PR43+195 LD



Imagen 08. Construcción de Caiissón para puente Caño Canoa PR43+195 LD.

- **Excavaciones y adecuación de talud varias sin clasificar**

Durante este periodo se realizaron excavaciones y adecuación de talud varias sin clasificar en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		LOBSERVACIONES
ABSCISA INICIO	ABSCISA FIN	
PR43+850		Adecuación y de acceso vivienda en material afirmado margen derecha.
PR35+010	PR35+076	Excavación para filtro longitudinal margen izquierda.
PR35+080	PR34+804	Excavación para filtro longitudinal margen izquierda.

PR35+570	PR35+720	Adecuación y perfilado de hombro para paisajismo.
PR36+310	PR36+480	Adecuación y perfilado y confirmar terraplén.
PR40+040	PR40+100	Adecuación y perfilado para paisajismos detrás de cunetas margen derecha.
PR44+710		Adecuación de acceso vivienda margen izquierdo.

Tabla 12. Abscisas de excavaciones y adecuación de talud varias sin clasificar.



Imagen 09. Adecuación y perfilado y confirmar terraplén *PR36+310 - PR36+480 LD.*



Imagen 10. Excavación de Filtro en el *PR40+040 – PR40+100 LD.*

- **Atención de puntos críticos de la Ruta 7506 – El Retorno – Calamar**

Durante este periodo Se realizo la atención de puntos críticos de la ruta 7506, con material de afirmado, conformación de bancada y adecuación de cunetas en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	**FIN**	
PR16+000	PR17+100	Atención de puntos críticos de la Ruta 7506
PR15+000	PR15+850	Atención de puntos críticos de la Ruta 7506
PR14+100	PR14+280	Atención de puntos críticos de la Ruta 7506

PR14+000	PR14+050	Atención de puntos críticos de la Ruta 7506

Tabla 13. Abscisas de atención puntos críticos.



Imagen 11. Atención de puntos críticos de la Ruta 7506, con afirmado en el PR16+000 – PR17+100.



Imagen 12. Atención de puntos críticos de la Ruta 7506, adecuación de cunetas PR16+000 – PR17+100.

- **Transporte de materiales**

Durante este periodo se realizó transporte de materiales en las siguientes abscisas:

TRANSPORTE DE MATERIALES		
PR35+010	PR35+076	Transporte de materiales de material filtrante.
PR35+080	PR34+804	Transporte de materiales de material filtrante.
PR16+000	PR17+100	Transporte de material de afirmado.
PR15+000	PR05+550	Transporte de material de afirmado.
PR35+570	PR35+720	Transporte de material estabilización de hombro terraplén
PR36+310	PR36+480	Transporte de material estabilización de hombro terraplén
PR14+100	PR14+280	Transporte de material de afirmado.
PR14+000	PR14+050	Transporte de material de afirmado.

Tabla 14. Abscisas de terraplén transporte de materiales



Imagen 13. Transporte de material para lleno de hombro PR*36+310 – PR36+480.*



Imagen 14. Transporte de material de afirmado para estabilización en el PR35+500 - PR35+550 LI.

- **Se realizó la revegtalizacion lateral de la vía.**

Durante este periodo se realizó la revegtalizacion lateral y detrás de cuneta de la vía para la protección del talud.

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR34+740	PR34+850	Se realizó revegtalizacion detrás de cuneta y protección de talud.
PR35+310	PR35+560	Se realizó revegtalizacion detrás de cuneta y protección de talud.
PR34+820	PR34+900	Se realizó revegtalizacion detrás de cuneta y protección de talud.

Tabla 15. Abscisas del revegtalizacion detrás de cuneta y protección de talud,



Imagen 15. Revegtalizacion latera de la vía para protección del talud PR34+740 - PR34+850 LD.



Imagen 16. Revegtalizacion latera de la vía para protección del talud PR35+310 - PR35+560 LD

- **Material Granular drenante**

Durante este periodo se realizó instalación de material granular drenante en las siguientes abscisas:

INICIO	FIN	OBSERVACIONES
PR35+010	PR35+076	Filtro, margen Izquierda
PR35+080	PR34+804	Filtro, margen Izquierda

Tabla 16. Abscisas del material Granular drenante.



Imagen 17. Instalación de material granular drenante PR35+010 - PR35+076 LI.



Imagen 18. Instalación de material granular drenante PR35+080 - PR34+804 LI

- **Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.**

Durante este periodo se realizó instalación de tubería de plástico tipo corrugada de diámetro 100mm en las siguientes abscisas:

INICIO	FIN	OBSERVACIONES
PR35+010	PR35+076	Elaboración de filtro
PR35+080	PR34+804	Elaboración de filtro

Tabla 17. Abscisas del tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.



Imagen 19. Instalación de tubería PR 35+010 - 35+076 LI



Imagen 20. Instalación de tubería PR35+080 - 34+804 LI

- **Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.**

Durante este periodo se realizó instalación de geotextil tipo NT-2500 o similar no tejido en las siguientes abscisas:

ABSCISAS		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	
PR35+010	PR35+076	filtro longitudinal
PR35+080	PR34+804	filtro longitudinal

Tabla 18. Abscisas de la tubería de geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.



Imagen 21. Instalación de geotextil PR35+010 - PR35+076 LI .



Imagen 22. Instalación de geotextil PR35+080 - PR34+804 LI

- **Provisiones ejecutadas**

Durante el periodo del 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 se realizaron provisiones del contrato 976 de 2021.

GRUPOS ICCP	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 63.882.229,00	$ 1.387.586.748,00
2 Sub-bases y bases	$ 1.133.536.867,00	$ 15.677.137.979,00
3 Transporte de materiales	$ 32.777.525,00	$ 34.175.212.232,00
4 Aceros y elementos metálicos	$ -	$ 2.486.040.527,00
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 269.940.456,00	$ 13.009.334.031,37
6 Concreto para superestructuras	$ -	$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ 49.433.976,00	$ 8.421.782.943,00

(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
TOTAL	**$ 1.549.571.053,00**	**$ 75.157.094.460,37**

GRUPOS ICOCIV	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11601 Preliminares y explanación	$ 80.739.725,00	$ 1.537.338.876,00
11602 Afirmados, subbases y bases	$ 1.133.536.867,00	$ 19.485.044.017,00
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	$ -	$ 8.283.951.495,00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	$ 185.156.051,00	$ 10.446.017.097,37
11605 Obras de urbanismo	$ -	$ -
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	$ 117.360.885,00	$ 1.225.925.775,00
11607 Señalización y control de transito	$ -	$ 3.604.968,00
11608 Transporte y sobre acarreos	$ 32.777.525,00	$ 34.175.212.232,00
TOTAL	**$ 1.549.571.053,00**	**$ 75.157.094.460,37**

Tabla 19. Provisiones ejecutadas

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades con el acompañamiento y supervisión de la interventoría.

- **Actividades ambientales:**

Se realizó verificación del cumplimiento de las medidas ambientales de los permisos obtenidos por el contratista los cuales se describen a continuación:

Permisos Ambientales obtenidos:

1. Ocupación de cauces de 6 km: Resolución DSGV-023-22 del 1 de marzo de 2022, con una vigencia de 2 años. A la fecha se ha intervenido cuatro (4) obras. Se obtiene en el periodo prórroga del permiso por un tiempo de dos años DSGV-034-24 de marzo de 2024. En el

periodo se realizó acompañamiento a los funcionarios de la CDA para la visita de seguimiento del permiso.

2. Ocupación de cauces de 4 km: Resolución DSGV-328- 22 del 9 de septiembre de 2022, con una vigencia de 2 años. A la fecha de las 7 obras hidráulicas autorizadas. Se cuenta en el periodo con la resolución modificatoria DSGV-127- 22 del 5 de mayo de 2023, por medio de la cual se autoriza las modificaciones de intervención de 4 puentes para el reemplazo total de los mismos. Al periodo se tiene intervenidas tres (3) obras: PR38+770, PR36+860 y PR35+550. Se continua con la intervención de una cuarta (4) obra autorizada en el PR43+190, con la construcción de caisson en el Puente Caño Canoa. En el periodo se realizó acompañamiento a los funcionarios de la CDA para la visita de seguimiento del permiso.

3. Ocupación de cauces de 6 km Sector del PR35+600 al PR28+900: Resolución DSGV-524-22 del 1 de marzo de 2022, con una vigencia de 2 años. Se autoriza la intervención de 9 obras, de las cuales al corte del presente reporte no se ha intervenido ninguna de las obras. Se obtuvo en el periodo prórroga de 60 días para el cumplimiento de la medida de compensación DSGV-036-24 de marzo de 2024. Para el suministro de 2700 plántulas e instalación de 4 vallas metálicas. En el periodo el contratista ha instalado dos vallas metálicas ubicadas en el PR1+740 en el municipio de Calamar y en el PR36+850 en el municipio de El Retorno. Las otras dos vallas pendientes no se han instalado dado que tienen diseños diferentes. En cuanto al suministro de las 2700 plántulas, el contratista reporta factura de compra de las plántulas de un vivero con certificado ICA. De esta manera la interventoría ha solicitado mediante comunicado 056-0-1389-2024 del 28 de mayo de 2024, se comunique a la corporación ambiental CDA el cumplimiento de la medida de compensación de manera perentoria. En el periodo se realizó acompañamiento a los funcionarios de la CDA para la visita de seguimiento del permiso.

4. Concesión de aguas: Resolución DSGV-024-22 del 1 de marzo de 2022, para dos puntos en Caño Canoa y Caño Potosí. En el mes de abril se realiza la captación e intervención del cauce en Caño Canoa en el PR43+090. Se cuenta con prórroga concesión de aguas con la Resolución DSGV-088-22 del 24 de marzo de 2022 con una vigencia de 6 años y 6 meses. En el periodo se realizó acompañamiento a los funcionarios de la CDA para la visita de seguimiento del permiso ambiental.

5. Permiso de emisiones atmosféricas de fuentes fijas: Resolución DSGV-105-22 del 24 de mayo de 2022, para planta de Trituración y Asfalto, por una vigencia de 5 años. La interventoría realiza solicitud de adelantar los monitoreos isocinéticos en el periodo dado que se deben adelantar con periodicidad anual, de acuerdo al permiso ambiental. En este sentido se reitera el comité ambiental del 27 de mayo de 2024, que contó con la participación de la

Gestora Ambiental INVIAS. En el periodo se realizó acompañamiento a los funcionarios de la CDA para la visita de seguimiento del permiso ambiental.

6. Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados: Resolución DSGV-312-2022 del 5 de septiembre 2022, el contratista cumplió con las obligaciones impuestas en las actividades de tala y de igual forma con la medida de compensación con la entrega de 500 plántulas a la Corporación Ambiental CDA. Se cuenta con el cierre del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados mediante la Resolución DSGV-549-2022 del 21 de noviembre de 2022, teniendo en cuenta que se cumplió con las obligaciones y medida de compensación a la corporación CDA.

7. Permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, sector del PR37+580 al PR28+900: Resolución DSGV-191-2023 del 6 de junio de 2023, este permiso se encuentra vigente, tiene una medida compensatoria de suministro de 2000 plántulas forestales nativas de 60 cm y la siembra y establecimiento de 20 cedros en el sector de intervención. Se cuenta con prórroga del permiso aprovechamiento forestal de árboles aislados: Resolución DSGV-549-2023 del 28 de noviembre de 2023, por un término de dos (2) años. En estes sentido la medida de compensación tiene el mismo plazo de la fecha de vigencia del acto administrativo. En el mes de mayo de 2024, no se tienen obras que se hayan intervenido en este sector.

8. **Actividades generales ambientales:**

- ✓ Se evidenció uso del predio Las Brisas en el PR38+900 para la disposición de material sobrante de excavación.
- ✓ Se instaló vallas metálicas para el cumplimiento de la Resolución DSGV-524-23.
- ✓ Se realiza captación de agua en el punto autorizado por la CDA en Caño Canoa PR43+160 para la captación de agua, el cual de acuerdo a la dinámica de las obras ha sido el más usado.
- ✓ Se realizó acompañamiento a los funcionarios de la Corporación Ambiental CDA a los permisos ambientales: tres (3) ocupaciones de cauces y (1) una concesión de aguas.
- ✓ Se realizó suministro de combustible a la maquinaria y equipos en los frentes de obra por medio de carrotanque, cuenta con kit antiderrames y documentación vigente.
- ✓ El contratista obtiene concepto de aprobación del informe de gestión ambiental No 25 del 21 de septiembre a 21 de octubre de 2024 con el comunicado 056-0-1365-2024 del 15 de mayo de 2024.
- ✓ El contratista desarrolla temas de capacitación con el personal de obra en aspectos ambientales del proyecto.
- ✓ Se uso unidades sanitarias en el frente de obra PR43+190 y PR33+000, se realiza mantenimiento y disposición de aguas residuales domesticas con EMPOAGUAS en el municipio de San José del Guaviare.

- ✓ Se realizó Comité ambiental mensual contando con la participación de la Gestora Ambiental del INVIAS y las Especialistas y Profesionales ambientales del contratista e interventoría para realizar seguimiento de los aspectos ambientales del contrato de obra No 976 de 2021.



Imagen 23. Instalación de valla metálica en el PR36+850 en cumplimiento de la Res. DSGV-524-23.



Imagen 24. Acompañamiento a los funcionarios para las visitas de seguimiento de los permisos ambientales obtenidos por el contratista.

- **Actividades Componente de sostenibilidad:**

Para el mes de abril de 2024, se avanzaron con las actividades del componente de sostenibilidad con las gestiones realizadas por la Interventoría, las cuales se describen a continuación:

- Reunión virtual el día 02 de mayo de 2024 interna con el equipo de socioambiental y técnico de interventoría con el fin de revisar de manera previa los temas de la mesa de Trabajo con el contratista este mismo día. ***Anexo 1. (Invitación reunión interna virtual del 02-05-2024).***

- Participación de mesa de trabajo virtual con el contratista el día 02 de mayo de 2024 con el fin de aclarar dudas para implementar el Plan de Contingencia propuesto por este mismo, tratándose este día temas relacionados con la aclaración de un volumen de un ZODME, Ajuste del Plan de Gestión del Riesgo, Identificación y fortalecimiento de iniciativas y/o emprendimientos turísticos de naturaleza sostenible y/o turismo regenerativo, negocios verdes y paisajismo de zonas de depósito. ***Anexo 2. (Invitación mesa de trabajo con el contratista el 02-05-2024).***

- Reunión virtual interna el día 06 de mayo de 2024 con la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de revisar oficios y temas pendientes. ***Anexo 3. (Invitación reunión interna virtual del 06-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de dar respuesta a comunicado del contratista comunicado 2024-

DSC-CENV-0116 “Oficio 056-0-1318-2024, propuesta fortalecimiento de viveros. ***Anexo 4. (Revisión de comunicado correo electrónico 7-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de solicitarle al contratista elaborar y presentar los Términos de Referencia previa a la presentación de cotizaciones que se requieran para la ejecución de acciones y/o actividades del Componente de Sostenibilidad. ***Anexo 5. (Revisión de comunicado correo electrónico 7-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de solicitarle al contratista la Entrega Informe Mensual N°31. ***Anexo 6. (Revisión de comunicado correo electrónico 7-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de solicitarle al contratista la Entrega Informe Mensual N°31. ***Anexo 6. (Revisión de comunicado correo electrónico 7-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de reiterarle la entrega de acciones sociales y ambientales propuestas para la vigencia 2024-Componente de sostenibilidad. ***Anexo 7. (Revisión de comunicado correo electrónico 7-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional social de Interventoría con el fin de remitir a la SS de INVIAS la programación de actividades implementación del código de conducta. Contrato de obra 976 de 2021. ***Anexo 8. (Revisión de comunicado correo electrónico 9-05-2024).***

- Revisión de acta de comité proyectada por la profesional de sostenibilidad de Interventoría realizada el día 25 de abril de 2024 en compañía de las Gestoras de Sostenibilidad de la SS del INVIAS y Contratista. ***Anexo 9. (Revisión de acta de comité correo electrónico 9-05-2024).***

- Revisión de presentación elaborada por la profesional de sostenibilidad de Interventoría de acuerdo a solicitud realizada por la Entidad. ***Anexo 10. (Revisión presentación correo electrónico 9-05-2024).***

- Reunión virtual interna el día 14 de mayo de 2024 con la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de revisar oficios y temas pendientes. ***Anexo 11. (Invitación reunión interna virtual del 14-05-2024).***

- Reunión virtual interna el día 14 de mayo de 2024 con la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de revisar informe trimestral N°10 elaborado por ésta. ***Anexo 12. (Invitación reunión interna virtual de fecha 14-05-2024. Revisión informe trimestral N°10).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de dar respuesta a comunicado del contratista 2024-DSC-CENV-0134 con asunto: Oficio 056-0-1357-2024 acciones sociales y ambientales propuestas para la vigencia 2024, donde se le requiere al contratista que la programación de las acciones debe ser con relación al documento de Sostenibilidad aprobado en mayo de 2022 e inversión de recursos a ser ejecutados en la presente vigencia 2024, y de acuerdo a requerimiento de la Subdirección mediante oficio 2024S-VBOG-028442. ***Anexo 13. (Revisión de comunicado correo electrónico 14-05-2024).***

- Revisión de presentación elaborada por la profesional de sostenibilidad de Interventoría para comité técnico de obra realizado el día 15 de mayo de 2024, en el cual se participó. ***Anexo 14. (Revisión presentación correo electrónico 15-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de reiterar al contratista la entrega de informe mensual N°31. ***Anexo 15. (Revisión de comunicado correo electrónico 16-05-2024).***

- El día 16 de mayo de 2024 se realizó revisión de pendientes del componente de sostenibilidad, remitiendo estos a la profesional de apoyo de sostenibilidad de la interventoría. ***Anexo 16. (Pendientes de sostenibilidad correo electrónico 16-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de dar respuesta a comunicado del contratista número 2024-DSC-CENV-0133 de solicitud de plazo de entrega de informe mensual N°31 periodo marzo 21 – abril 21 de 2024. ***Anexo 17. (Revisión de comunicado correo electrónico 16-05-2024).***

- Reunión virtual el día 17 de mayo de 2024 interna con el equipo de socioambiental y técnico de interventoría con el fin de revisar y elaborar respuesta del contratista a comunicado de interventoría 056-0-1355-2024 en relación a la entrega de términos de referencia para las acciones que están relacionadas con el Plan de Inversión del componente Sostenibilidad. ***Anexo 18ayb. (Invitación reunión interna virtual del 17-05-2024).***

- Revisión de comunicado proyectado por la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de dar respuesta a comunicado del contratista número 2024-DSC-CENV-0144: Oficio 056-0-1363-2024, Informe Mes 1 PGRD.***Anexo 19. (Revisión de comunicado correo electrónico 17-05-2024).***

- Reunión virtual el día 20 de mayo de 2024 interna con la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de revisar el documento de sostenibilidad V17 entregado por el contratista el día 15 de mayo de 2024. ***Anexo 20. (Invitación reunión interna virtual del 20-05-2024).***

- El día 20 de mayo mediante correo electrónico se reviso y se emitió aportes para el acta de comité técnico realizado el día 15 de mayo de 2024. ***Anexo 21. (Correo electrónico de fecha 20-05-2024).***

- Reunión virtual el día 21 de mayo de 2024 interna con la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría y con la profesional ambiental con el fin de continuar revisando el documento de sostenibilidad V17 entregado por el contratista el día 15 de mayo de 2024. ***Anexo 22. (Invitación reunión interna virtual del 20-05-2024).***

- Reunión virtual el día 22 de mayo de 2024 interna con la profesional de sostenibilidad de apoyo de interventoría con el fin de revisar la presentación para el comité de sostenibilidad que se realizó el mismo día 22 de mayo de 2024. ***Anexo 23. (Invitación reunión interna virtual del 22-05-2024).***

- Revisión de comunicado el dia 24 de mayo de 2024 proyectado por la profesional social de interventoría con el fin de solicitar al contratista atención a oficio remitido por la Subdirección de Sostenibilidad 2024S-VBOG-031914- Cronograma de la implementación del Código de conducta. Acción 21 del Documento de Sostenibilidad titulada: "Enfoque diferencial, aspectos de género (código de conducta) y promoción de la equidad poblacional en el proyecto. ***Anexo 24. (Comunicado 056-0-1381-2024 de fecha 24 de mayo de 2024).***

- Revisión de comunicado de respuesta el día 24 de mayo de 2024 a comunicado N° 2024-DSC-CENV-0152 de fecha 22 de mayo de 2024 que remitió el contratista, solicitándole en un cuadro la programación de actividades y/o acciones y de inversión de recursos a ser ejecutados en la presente vigencia 2024 y las acciones que a la fecha se encontraban en ajustes en el documento de sostenibilidad. ***Anexo 24A. (Correo electrónico de fecha 24 de mayo de 2024).***

- Participación de comité de seguimiento del contrato de obra el día 27 de mayo de 2024 en conjunto con Supervisor técnico del INVIAS, contratista e interventoría. ***Anexo 25. (Reunión virtual de fecha 27 de mayo de 2024).***

- Reunión virtual el día 27 de mayo de 2024 interna con el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de continuar revisando el documento de sostenibilidad V17 entregado por el contratista el día 15 de mayo de 2024. ***Anexo 26. (Invitación reunión interna virtual del 27-05-2024).***

- Participación de reunión virtual el día 27 de mayo de 2024 en compañía de funcionario de la CDA e interventoría con el fin de socializarnos un video institucional a ser realizado por la Corporación para lo cual requería del apoyo de la Interventoría y el Contratista. ***Anexo 27. (Reunión virtual de fecha 27 de mayo de 2024).***

- Reunión virtual el día 27 de mayo de 2024 interna con el equipo de socioambiental y técnico de interventoría con el fin de revisar la presentación de los LIVV presentada por el contratista mediante comunicado. ***Anexo 28. (Invitación reunión interna virtual del 27-05-2024).***

- Reunión virtual el día 29 de mayo de 2024 interna con el apoyo de sostenibilidad de interventoría con el fin de continuar revisando el documento de sostenibilidad V17 entregado

por el contratista el día 15 de mayo de 2024. ***Anexo 29. (Invitación reunión interna virtual del 27-05-2024).***

- El día 29 de mayo de 2024 producto de las diferentes reuniones virtuales internas con los diferentes profesionales de interventoría se termino de elaborar el comunicado de respuesta de revisión del documento de sostenibilidad V17 remitido por el contratista el 15 de mayo de 2024. ***Anexo 30. (Comunicado proyectado de respuesta a la revisión del documento de sostenibilidad de fecha 29-05-2024).***

- El día 30 de mayo de 2024 se revisó documento remitido por la profesional social de interventoría con la estrategia estructurada de formación dirigida a empleados y comunidad. ***Anexo 31. (Revisión de estrategia estructurada de formación dirigida a empleados y comunidad de fecha 30-05-2024).***

- Reunión virtual el día 30 de mayo de 2024 interna con el apoyo de sostenibilidad y profesionales social, ambiental y técnico de interventoría con el fin de revisar comunicado elaborado por el Director de interventoría en respuesta a la presentación de los LIVV remitida por el contratista mediante correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2024, el cual fue remitida la respuesta al contratista mediante comunicado 056-0-1394-2024 de fecha 30 de mayo de 2024. ***Anexo 32. (Invitación reunión interna virtual del 30-05-2024).***

- Reunión virtual el día 31 de mayo de 2024 interna con el apoyo de sostenibilidad y profesionales social y ambiental de interventoría con el fin de revisar comunicado de acciones sociales y ambientales para la vigencia 2024 remitido por el contratista. ***Anexo 33 y 33A. (Invitación reunión interna virtual del 31-05-2024 y comunicado 056-0-1394-2024).***

- Reunión virtual el día 31 de mayo de 2024 interna con el equipo de socioambiental con el fin de revisar comunicado elaborado por el Director de interventoría en cuanto a respuesta de comunicado del contratista N° 2024-DSC-CENV-0159 con asunto “Oficio 056-0-1375-2024 –Formulación Términos de Referencia Plan de Inversión, mediante el cual se le informa este no da cumplimiento a lo requerido en el comunicado 056-0-1375-2024 de fecha 20 de mayo de 2024. Dicho comunicado, de manera clara, solicitaba al contratista que reestructurara el contenido de los términos de referencia de acuerdo con el contenido propuesto y/o con lo que considere pertinente adicionar. Por lo anterior, se solicitó de manera inmediata la reestructuración del contenido de los términos de referencia conforme a lo requerido, para evitar mayores dilaciones en la ejecución del contrato y asegurar que las actividades contenidas en el plan de inversión de sostenibilidad V2 se desarrollen conforme a los estándares de calidad esperados. Lo anterior se remitió al contratista mediante comunicado 056-0-1395-2024. ***Anexo 34. (Revisión de comunicado).***

- **Actividades Componente social:**

En el presente período del mes de abril, el contratista llevó a cabo diversas actividades en el componente social, con el acompañamiento y la supervisión de la interventoría:

1. Durante el presente período, el contratista llevó a cabo diversas actividades en el componente social, con el acompañamiento y la supervisión de la interventoría:
2. Durante este período, la interventoría llevó a cabo seguimiento del funcionamiento de las oficinas SAU, ubicadas en los municipios de El Retorno y Calamar, garantizando la prestación oportuna del servicio por parte del contratista.
3. El contratista ha establecido tres buzones satélites en distintas ubicaciones: uno en la Inspección de Policía de La Libertad, otro en la residencia de la presidenta del comité de participación comunitaria en la vereda La Marina, y el último en la Alcaldía del municipio de Calamar. Estos buzones están destinados a la recepción de PQRS.
4. La interventoría realizó un seguimiento a la implementación de las estrategias de divulgación empleadas por el contratista durante este período, como cuñas radiales, volantes, la red social Facebook y grupos de WhatsApp.
5. La interventoría efectuó acompañamiento a la aplicación de encuestas de sastifacción y caracterización a usuarios y trabajadores de la vía.
6. La interventoría llevo a cabo seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados con los propietarios, especialmente en lo concerniente con la adecuación de accesos, entradas, reposición de cercas y perfilación de taludes. Se establecieron un total de 39 actas de compromiso, de las cuales 22 han sido cerradas y 17 permanecen abiertas y están siendo atendidas por el contratista.
7. El contratista cuenta con el levantamiento de 148 actas de vecindad de inicio, 2 actas de vecindad de seguimiento y 13 actas de vecindad de cierre, las cuales se encuentran aprobadas y firmadas por la interventoría. Adicional, en este periodo se realizó el diligenciamiento de 8 actas de vecindad de cierre en el municipio de Calamar, estas se encuentran en revisión de interventoría para su respectiva aprobación y firma, una vez se surta todo el proceso para su aprobación se contaría con un total de 21 actas de vecindad de cierre.
8. La Interventoría efectuó seguimiento a las acciones de divulgación de los principales avances del contrato de obra efectuadas por el contratista mediante la actualización de redes sociales, y el seguimiento a la aplicación de encuestas de satisfacción.
9. La interventoría desarrolló reuniones entre las profesionales sociales del contratista e interventoría, a fin de revisar el estado y avance de implementación de las fichas de gestión social aprobadas en el PAGA V No1.
10. La interventoría realizó acompañamiento a la actividad de ornamentación organizada por la comunidad en general de la Institución Educativa Cerritos Sede La Marina Uno a la comunidad de la Institución Educativa Cerritos Sede La Marina Uno el 10 de mayo de 2024, así como a la entrega parcial de la unidad sanitaria de la misma institución a la comunidad en general el 17 de mayo de 2024, en el contexto de la implementación de la obra de participación comunitaria OPC aprobada.
11. Durante este periodo, el contratista llevó a cabo la reunión mensual con el comité de participación comunitaria en la vereda la Marina el martes 17 de mayo de 2024. El propósito de esta reunión fue realizar la entrega parcial de la unidad sanitaria de la Institución Educativa Cerritos Sede La Marina Uno.

12. La interventoría emitió concepto de aprobación del Informe de Gestión Social No. 32 correspondiente al periodo del 22 de abril al 21 de mayo de 2024.



Imagen No. 25. Establecimiento de compromisos con propietarios/adecuación de entradas. 08-05-2024.



Imagen No 26. Seguimiento de atención a compromisos establecidos con propietarios. 10-05-2024



Imagen No. 17. ornada de ornamentación IE Cerritos Sede La Marina Uno. 10-05-2024.



Imagen No 28. Entrega parcial de la OPC a la comunidad en general de la vereda La Marina. 17-05-2024.



Imagen No.29. Entrega parcial de la OPC a la comunidad en general de la vereda La Marina. 17-05-2024.



Imagen No 30. Levantamiento actas de vecindad de cierre municipio de Calamar. 23-05-2024.

- **Actividades Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):**

En el presente periodo el contratista ejecuto las siguientes actividades en el componente SST con el acompañamiento y supervisión de la interventoría:

1. Se realizó seguimiento al mantenimiento de dispositivos de señalización como cinta de peligro, delineadores tubulares compuestos, maletines, barricadas de desvió, señales informativas en los PR 01+930, 36+200 al 36+410, 37+470 al 37+870, 43+050 al 43+270, 45+00 al 45+320, de El Retorno – Calamar.

2. Se realizó seguimiento a las entregas de dotación y reposición de elementos de protección personal (EPP) y del uso adecuado por parte del personal del Consorcio DSC.

3. Se realizó seguimiento del control vial en los diferentes sitios de intervención del corredor vial de El Retorno - Calamar.

4. Se realizo seguimiento a la actividad del puente caño canoa, PR43+190, en la construcción de caisson, en la implementación de las medidas de protección y prevención contra caídas, con el fin de garantizar la seguridad a los trabajadores.

5. Se realizo seguimiento a los elementos de primeros auxilios (botiquín y extintor) de los vehículos y maquinaria del Consorció DSC.

6. Se radico al contratista comunicado 056-0-1359-2024 del 08 de mayo del 2024- asunto señalización de obra del contrato de obra 976 de 2021.



Imagen 31. Señalización vial en el PR33+000.



Imagen 32. Verificación de estado actual de elementos de emergencia a vehículos y maquinas..

- **Actividades Topográficas:**

Se realiza seguimiento y control topográfico a las siguientes excavaciones:

DETALLE	ABSCISA	COSTADO
Excavación para caisson número 1,2, y 5 de puente.	PR 43+180	Der.
Excavación filtro longitudinal.	PR 34+150 – PR 34+280	Der.
Excavación filtro longitudinal.	PR 34+280 – PR 34+480	Der.
Excavación filtro longitudinal.	PR 34+280 – PR 34+495	Izq.
Excavación para filtro transversal.	PR 34+340	Eje.
Excavación filtro longitudinal.	PR 34+804 – PR 34+890	Izq.
Cajeos para mejoramiento de subrasante y terraplén.	PR 34+150 – PR 34+500	Der e Izq.
Excavación canal para manejo de agua.	PR 34+390 – PR 34+530	Izq.

Tabla 20. Provisiones ejecutadas

1. Se realiza medición en conjunto con contratista de zonas de siembra para protección de hombros y taludes, en distintos tramos de la vía, y se continua con labores de siembra para el siguiente mes.
2. Se realiza medición en conjunto con contratista de cercas de alambre instaladas en distintos predios entre PR41+260 a PR42+350, a derecha e izquierda de la vía respectivamente.
3. Se realiza seguimiento y levantamiento topográfico a zona de disposición denominada Las Brisas, para el cálculo de volumen de material dispuesto, en PR39+850.
4. Se realiza seguimiento a llenos de mejoramiento en subrasante y mejoramiento en cimentación de terraplenes para garantizar niveles de subrasante desde el PR34+150 a PR34+500

ANEXO FOTOGRÁFICO



Imagen 33. Control niveles de excavación en cajeo, PR34+460 costado derecho.



Imagen 34. Excavación canal en PR34+670 costado izquierdo.

3.3. Seguimiento Ítems no previstos

Para el periodo del 01 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento a los ítems no previstos, los cuales fueron aprobados el 28 de enero de 2022;

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-1	(11606)	Tablestacado Metálico	kg
NP-2	(6-11602)	Suministro de Cal Viva	kg
NP-3	(2-11602)	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte	m3
NP-4	(5-11602)	Suelo cemento (No incluye suministro del cemento)	m3
NP-5	(5-11602)	Cemento hidráulico para suelo cemento	kg
NP-6	(3-11608)	Transporte de materiales provenientes de la excavación, canales y prestamos entre 100metros y 1000metros de distancia.	m3-E

Tabla 24. Seguimiento ítems no previstos.

Para el periodo del 01 de abril de 2024 al 31 de abril 2024 por parte de la interventoría se realizó el seguimiento a los ítems no previstos, los cuales fueron aprobados el 06 de junio de 2022;

ITEM	GRUP O DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD
NP-7	(5-11604)	Rellenos con Material Filtrante	m3
NP-8	(5-11604)	Tubería de Plástico Tipo corrugada de Diámetro 100mm.	m
NP-9	(7-11604)	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	m2
NP-10	(4-11604)	Tubería Metálica Corrugada.	kg

NP-11	(5-11604)	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200mm de diámetro interior.	m
NP-13	(5-11604)	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800mm de diámetro interior.	m

Tabla 21. Seguimiento ítems no previstos grupo 2.

Igualmente se realizó la modificación a los grupos adoptada mediante Resolución No. 2845 de 3 de agosto de 2022, motivada por lo expuesto en el Manual de interventoría de Obra pública vigente, y por la Resolución No. 320 de 26 de enero de 2022; documentos de donde incorpora el índice ICOCIV a los procedimientos de la entidad a causa de la suspensión en la publicación del índice ICCP con el cual se efectuaban los ajustes de los contratos de obra susceptibles a este procedimiento.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

3.4.1 Estado de avance

Para el periodo 01 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024 se realizó seguimiento al contrato de obra 976 de 2021, presentado una inversión de obra programada acumulada de $70.474.745.352,28 el cual corresponde al 40.75%, así mismo el estado de avance real es del 46.86% que representa 81047657284,73 en inversión ejecutada acumulada (ver grafica 1).


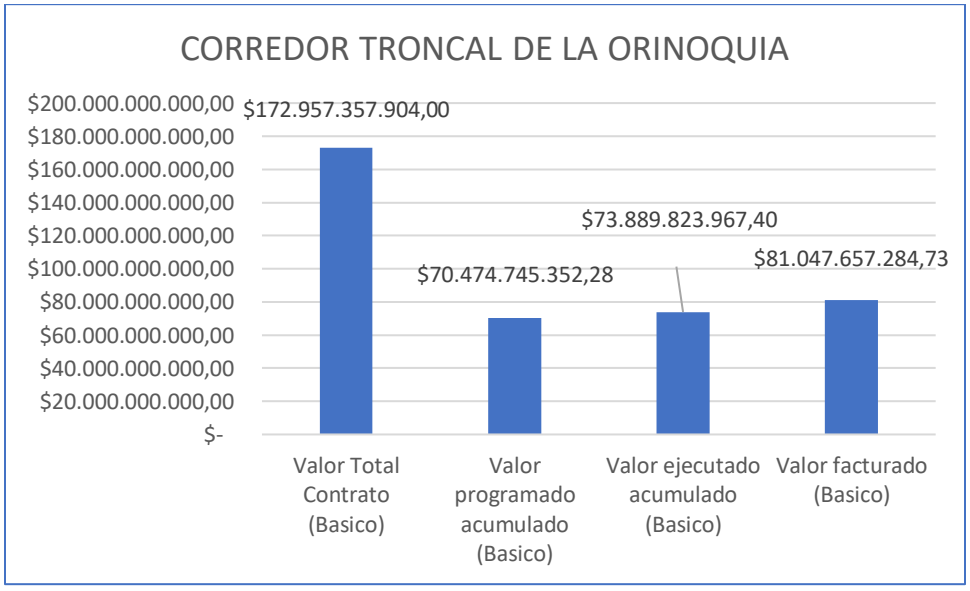


Gráfico 1 Grafico valor programado Vs valor ejecutado acumulado

3.4.2 Acciones a seguir por la interventoría

A la fecha contratista no presenta atraso en la ejecución financiera del contrato, igualmente ya se aprobó la vigencia 2024 para el contrato 976 de 2021.

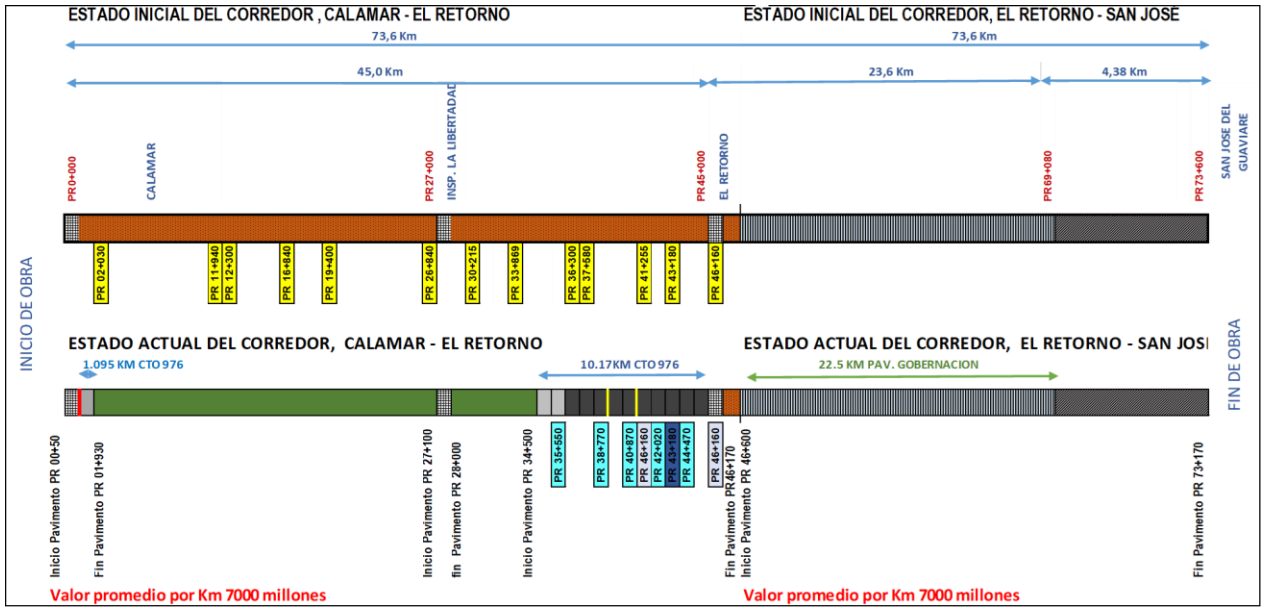

ESTADO INICIAL
PAVIMENTO MAL ESTADO
PAVIMENTO FLEXIBLE BUEN ESTADO
AFIRMADO
PAVIMENTACION POR GOBERNACIÓN
PAVIMENTO RIGIDO

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	LONG. KM	PROG. KM	AVACE. %
MANTENIMIENTO	34,00	133,30	26%
REHABILITACIÓN	0,00	0,00	0%
PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE PRIMERA CAPA	11,17	25,00	45%
PAVIMENTACIÓN FLEXIBLE SEGUNDA CAPA	9,99	25,00	40%
PAVIMENTO RIGIDO	0,85	0,930	91%
BASE GRANULAR	11,20	25,00	45%
SUBBASE GRANULAR	11,43	25,00	46%
SUBRASANTE MEJORADA	11,69	25,00	47%
PASO DE FAUNAS	4,00	15,00	27%
PUENTES NUEVO EN CONSTRUCCION	1,00	1,00	0,33%
PUENTE EN AJUSTES A DISEÑOS	2,00	2,00	57%

Gráfico 2 Seguimiento al avance de la ejecución del contrato

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1 Informe semanal

(MEPI-MN1-IN-15-FR-3)

Anexo 3

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
(MEPI-MN1-IN-15-FR-4)
Anexo 4

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-6)

Anexo 5

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-8)

Anexo 6

4.5 Estado General del Tiempo
(MEPI-MN1-IN-15-FR-10)

Anexo 7

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio
(MEPI-MN1-IN-15-FR-11)

Anexo 8

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra (MEPI-MN1-IN-15-FR-12)

Anexo 9

4.8 **Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra**

(MEPI-MN-1IN-15-FR-14)

Anexo 10

4.9 Otros documentos seguimiento
a. Seguimiento a la inversión del Anticipo
(MEPI-MN-IN-2-FR-1)
Anexo 11

b. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-2-FR-2)
Anexo 12

c. Seguimiento programa de obra.

(MEPI-MN-IN-6-FR-1)

Anexo 13

d. Seguimiento al programa de inversiones

(MEPI-MN-IN-6-FR-2)

Anexo 14

e. Actas de comité de obra

(MEPI-MN-IN-14-FR-1)

Anexo 15

.

f. Actas de reunión

(MEPI-MN-IN-14-FR-2)

Anexo 16

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1. Información General del Contrato

Carretera	Corredor troncal de la Orinoquia (San José – El retorno – Calamar)
Contratista	CONSORCIO ECOVISION-190
Contrato	1000 DE 2021
Objeto	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ - EL RETORNO - CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
Iniciación	Junio 29 de 2021
Plazo Final	114 meses
Plazo final Actualizado	31 DE AGOSTO DE 2030
Valor Básico + IVA	$ 21.999.237.400,00
Valor Actualizado	$ 21.999.237.400,00
Director de Interventoría	Oscar Fernando Alvarado Díaz

Tabla 22. Información general contrato 1000 de 2021.

Seguimiento de Garantías Contractuales

La interventoría, mediante Póliza No NB-100164311 de compañía mundial de seguros S.A:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	07/07/2023	31/12/2025	$824.256.899,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	07/07/2023	31/12/2025	$755.300.879,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	07/07/2023	31/12/2028	$1.648.513.797,00
CALIDAD DEL SERVICIO	07/07/2023	13/05/2026	$6.599.771.220,00

Tabla 23. Pólizas de cumplimiento contrato 1000 de 2021.

5.2. Descripción de las actividades realizadas por el interventor

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA MES MAYO 2024

ÍTEM	ENTIDAD O PERSONA	LUGAR	No DE CONSECUTIVO	FECHA	ASUNTO	REFERENCIA
1	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1350-2024	03/05/2024	Seguimiento de la programación de cierre de actas de compromisos. -Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
2	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1351-2024	03/05/2024	Solicitud de informe de gestión ambiental No Informe No 31 del periodo del 21 de marzo a 21 de abril de 2024. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA	Contrato 1000 de 2021

					PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	
3	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1352-2024	06/05/2024	Tramite a su comunicado 2024-DSC-CENV-0121 con asunto: “Solicitud de Aprobación Plan de Contingencia, Cumplimiento Pendientes Componente Sostenibilidad” Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
4	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1353-2024	07/05/2024	Solicitud de Informe mensual de Sostenibilidad No 31 correspondiente al periodo 21 de marzo 2024 al 21 de abril 2024. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
5	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILI	Bogotá D.C	056-0-1354-2024	07/05/2024	Respuesta radicado 2024S-VBOG-013845 “Respuesta al radicado No 2024E-VUVRAZ-013975” referente al análisis de ciclo de vida. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO –	Contrato 1000 de 2021

	DAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS				CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
6	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1355-2024	07/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0116 "Oficio 056-0-1318-2024, propuesta fortalecimiento de viveros". Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
7	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1356-2024	07/05/2024	Solicitud de elaboración y entrega de Términos de Referencia Acciones y/o actividades a ejecutar en el marco del Componente de Sostenibilidad – Plan de Inversión de Sostenibilidad". Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
8	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA	Bogotá D.C	056-0-1357-2024	07/05/2024	Reiteración comunicado 056-0-1299-2024 con asunto: Reiteración comunicado 056-0-1283-2024 Solicitud de comunicado sobre las acciones sociales propuestas para la vigencia 2024 - Componente de sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 y contrato de interventoría 1000 de 2021. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA	Contrato 1000 de 2021

	CONSORCIO DSC				(SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
9	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS	Villavicencio - Meta	056-0-1358-2024	08/05/2024	Información Oficio Contraloría General de la República 2024EE0084230" - Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
10	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1359-2024	08/05/2024	Señalización de obra del contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
11	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1360-2024	08/05/2024	Permiso de ocupación de cauces Res. DSGV-023-22. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

12	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1361-2024	09/05/2024	Tramite a comunicado 2024-DSC-CENV-0043 del Consorcio DSC - Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
13	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1362-2024	09/05/2024	Remisión de programación de actividades implementación del código de conducta. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
14	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1363-2024	10/05/2024	Solicitud de informe de la implementación Sistema de Gestión de riesgo del contrato de obra 976 de 2021. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
15	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR	Bogotá D.C	056-0-1364-2024	14/05/2024	Solicitud de cumplimiento del compromiso de comité de obra Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO	Contrato 1000 de 2021

	DE OBRA CONSORCIO DSC				DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	
16	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1365-2024	15/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0122 con asunto: "Oficio 056-0-1290-2024; ajuste 3 del Informe Mensual Ambiental No. 25 – v4, periodo septiembre 22 a octubre 21 de 2023.". Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
17	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1366-2024	14/05/2024	Presencia Ingenieros Residentes. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
18	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1367-2024	14/05/2024	Entrega Informe Trimestral N°10 V0 correspondiente al Componente de Sostenibilidad. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021

19	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1368-2024	14/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0134 con asunto: Oficio 056-0-1357-2024 acciones sociales y ambientales propuestas para la vigencia 2024, Componente de sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 y contrato de interventoría 1000 de 2021. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
20	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1369-2024	14/05/2024	Actividades en obra sin autorización contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
21	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1370-2024	15/05/2024	Medida de compensación por el Permiso de ocupación de cauces Res. DSGV-524-23. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021

22	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1371-2024	16/05/2024	Reiteración comunicado 056-0-1360-2024 con asunto: “Permiso de ocupación de cauces Res. DSGV-023-22”. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
23	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1372-2024	16/05/2024	Respuesta Comunicado 2024-DSC-CENV-0133 con asunto: OFICIO 056-0-1353-2024 Solicitud Informe Mensual de Sostenibilidad N°31, periodo marzo 21 – abril 21 de 2024. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
24	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1373-2024	17/05/2024	Respuesta al comunicado 2024-DSC-CENV-0130 con asunto: Comunicado 056-0-1291-2024; Entrega del ajuste 2 del Informe Mensual Ambiental No. 26 – v3 del periodo del 22 de octubre al 21 de noviembre de 2023.Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
					Cumplimiento de la medida de compensación Resolución DSGV-023-	

25	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1374-2024	20/05/2024	2024- Instalación de valla metálica. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
26	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1375-2024	20/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0135: Oficio 056-0-1356-2024, Términos de Referencia – Cotizaciones Plan de Inversión, componente Sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
27	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1376-2024	20/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0129 “Oficio 056-0-1342-2024 “Plan de Gestión de Riesgo y atención de Desastres”. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
					Tramite al comunicado 2024-DSC-CENV-0141 con asunto “Oficio 056-0-1364-2024 Compromiso Comité Integral de Obra Abril 28 2024, Programación detallada Construcción Puente Caño Canoa –	

28	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1377-2024	21/05/2024	PR43+170" - Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
29	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1378-2024	22/05/2024	Tramite al comunicado 2024-DSC-CENV-0145 con asunto "Oficio 056-0-1341-2024 – Diseño Pasos de Fauna Aéreos" - Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
30	CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI DIRECTOR TERRITORIAL INVIAS	Villavicencio - Meta	056-0-1379-2024	23/05/2024	Estado del Informe de Presunto Incumplimiento del TITULO 8 "INFORMES DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DEL PAGA, E INFORME FINAL" del Apéndice D "APÉNDICE AMBIENTAL del Contrato No. 976 de 2021, remitido mediante el comunicado 056-1-262-2024 del 5 de febrero de 2024. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
					Respuesta comunicado. 2024-DSC-CENV-0151 con asunto: Oficio 056-0-	

31	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1380-2024	24/05/2024	1344-2024, permiso ambiental de ocupación de cauces de las Resoluciones DSGV-328-22 y DSGV-127-23 – PRORROGA DEL PERMISO AMBIENTAL. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
32	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1381-2024	24/05/2024	Solicitud de atención a oficio remitido por la Subdirección de Sostenibilidad 2024S-VBOG-031914- Cronograma de la implementación del Código de conducta. Contrato de obra 976 de 2021. "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
33	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1382-2024	24/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0147 con asunto "Oficio 056-0-1366-2024, Hoja de Vida Residente Técnico de Obra" Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
					Solicitud de atención del acta de compromiso No 38 Sra. Olga Novoa. -	

34	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1383-2024	24/05/2024	Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
35	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1384-2024	24/05/2024	Reiteración de comunicado 056-0-1343-2024 con asunto “Solicitud de señalización sector pavimentado”. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
36	JAIRO ARGUELLO URREGO SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Bogotá D.C	056-0-1385-2024	24/05/2024	Remisión acto administrativo: Resolución DSGV-117-2024 relacionado al permiso de ocupación de causes: Resolución DSGV-328-22. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
37	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA				Solicitud de cumplimento de compromisos con la comunidad. -Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO –	

	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1386-2024	24/05/2024	CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
38	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1387-2024	27/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0152: Oficio 056-0-1363-2024, Oficio 056-0-1368-2024, acciones sociales y ambientales propuestas para la vigencia 2024, Componente Sostenibilidad. Contrato de obra No 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
39	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1388-2024	25/05/2024	Trámite y gestiones ambientales del Permiso de ocupación de cauces Res. DSGV-023-22. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN".	Contrato 1000 de 2021
40	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1389-2024	28/05/2024	Radicado de cumplimiento ante la CDA de la medida de compensación por el Permiso de ocupación de cauces Res. DSGV-524-23. Contrato de obra 976 de 2021 "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA,	Contrato 1000 de 2021

					MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	
41	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1390-2024	28/05/2024	Solicitud de informe de gestión ambiental No Informe No 32 del periodo del 21 de abril a 21 de mayo de 2024. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
42	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1391-2024	28/05/2024	Aprobación de Informe Mensual No 32. Área de Gestión Social- Contrato de obra 976 de 2021. “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
43	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1392-2024	30/05/2024	Respuesta comunicado 2024-DSC-CENV-0142 con asunto: Oficio 056-0-1319-2024 Ajustes a observaciones componente de sostenibilidad V17. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
					Solicitud de Informe mensual de Sostenibilidad No 32 correspondiente al	

44	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1393-2024	30/05/2024	periodo 21 de abril 2024 al 21 de mayo 2024. Contrato de obra No 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021
45	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO DSC	Bogotá D.C	056-0-1394-2024	30/05/2024	Tramite a correo electrónico de fecha 22 de mayo de 2024 “Respuesta al comunicado 056-0-1341- 2024”. Contrato de obra 976 de 2021 “MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN”.	Contrato 1000 de 2021

Tabla 24. correspondencia enviada mes de mayo 2024.

- *Se realizo elaboración de informes semanales de obra y actualización de la plataforma CIFRA.*
- *La interventoría realizó control y calidad de equipos en obra.*
- *La interventoría realizó control de cantidades en obra para dar cumplimiento con las especificaciones técnica.*
- *La interventoría realizó el seguimiento de las actividades diarias, evidenciado en el libro de Bitácora de obra.*
- *La interventoría realizó verificación de los planos definitivos, así mismo verificar que se están ejecutando los aprobados.*
- *La interventoría realizó durante el mes ejecutado el estado, calidad y cantidad de los equipos mínimos requeridos.*

- *La interventoría realizó seguimiento al avance físico y financiero del contrato de obra de acuerdo con los programas de obra e inversión.*
- *La interventoría realizó comité técnico semanal acompañado por el contratista e INVIAS, para mostrar los avances de obra.*
- *La interventoría elaboración de informes mensuales.*

5.3. Informes especialistas y profesionales

Se presenta informe de los siguientes especialistas, igualmente se encuentran anexos en la carpeta del informe.

Especialista Ambiental	Profesional Ambiental
Especialista en Sostenibilidad	Profesional en apoyo a la sostenibilidad
Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	Profesional Social
Líder de Integración	Profesional SST
Topografía	

. *Tabla 25. Informes especialistas y profesionales*

5.4. Informe del programa anual de caja – PAC

ACTA No.	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR POR EJECUTAR
Registro Presupuestal No.420421 De 2021			
Valor del Registro 2021:			$ 1.046.856.448,00
1	$ 0,00	$ 0	$ 1.046.856.448,00
2	$ 16.245.642,00	$ 16.245.642,00	$ 598.877.977,00
3	$ 53.775.264,00	$ 70.021.266,00	$ 567.697.153,00
4	$ 68.842.833,00	$ 138.864.099,00	$ 527.779.880,00
5	$ 111.045.088,00	$ 249.909.187,00	$ 463.392.392,00
6	$ 129.168.239,00	$ 379.077.426,00	$ 388.496.523,00
7	$ 126.021.524,00	$ 505.098.950,00	$ 315.445.229,00

Registro Presupuestal No.136422 De 2022			
Valor del Registro 2022:			$2.095.218.085,00
8	$ 144.993.170,00	$ 650.092.120,00	$ 2.011.166.425,00
9	$ 168.065.628,00	$818.157.748,00	$ 1.913.716.607,00
10	$ 161.311.212,00	$979.468.960,00	$ 1.820.183.215,00
11	$ 185.541.968,00	$1.165.010.928,00	$1.712.580.047,00
12	$ 198.933.085,00	$1.363.944.013,00	$1.597.232.292,00
13	$ 194.142.264,00	$1.558.086.277,00	$1.484.662.408,00
14	$ 232.250.834,00	$1.790.332.111,00	$1.310.962.204,00
15	$ 235.811.012,00	$2.026.148.123,00	$1.115.946.192,00
16	$ 232.470.384,00	$2.258.618.507,00	$883.475.808,00
17	$ 235.477.048,00	$2.494.095.555,00	$647.998.760,00
18	$ 230.652.314,00	$2.724.747.869,00	$417.346.446,00
19	$250.267.860,00	$2.975.015.729,00	$167.078.586,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 136422 De 2022			$0.00
Registro Presupuestal No. 126523 De 2023			$1.047.619.048,00
20	$226.663.842,00	$3.201.679.571,00	$998.033.792,00
21	$216.854.481,00	$3.418.534.052,00	$771.179.311,00
22	$239.954.857,00	$3.658.488.909,00	$531.224.454,00
23	$237.133.604,00	$3.895.622.513,00	$294.090.850,00
24	$227.617.229,00	$4.123.239.742,00	$66.473.621,00
25	$66.406.355,00	$4.189.646.097,00	$67.266,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 1422 De 2022			$0,00
Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$1.957.617.298,00
26	$216.684.237,00	$4.399.400.551,00	$1.747.930.110,00
27	$245.353.526,00	$4.651.683.860,00	$1.741.000.555,00
28	$255133812,00	$4.906.817.672,00	$1.240.512.989,00

29	$261.974.918,00	$5.168.792.590,00	$978.538.071.00
30	$288.073.755,00	$5.456.866.345,00	$690.464.316,00
31	$258.968.662,00	$5.715.835.007,00	$431.495.654,00
Saldo del Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$431.495.654,00
32	$222.803.305,00	$5.938.638.312,00	$208.692.349,00
Registro Presupuestal No. 788623 De 2023			$1,047,619,048.00
33	$ 248.276.999,00	$ 6.186.915.311,00	$ 1.008.034.398,00
34	$ 232.269.584,00	$ 6.419.184.895,00	$ 775.764.814,00
35	$ 197.744.334,00	$ 6.616.929.229,00	$ 578.020.480,00
36	$ 196.237.524,00	$ 6.813.166.753,00	$ 381.782.956,00

Tabla 26. Información financiera contrato 1000 de 2021

5.5 Informe matriz de riesgos

Se adjunta como anexo al documento informe mensual matriz de riego del contrato de obra 976 de 2021 y contrato 1000 de 2021.

5.6 Informe otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Se realizo el diligenciamiento del programa aplicativo CIFRA, donde se lleva a cabo el reporte semanal del proyecto de obra 976 de 2021.

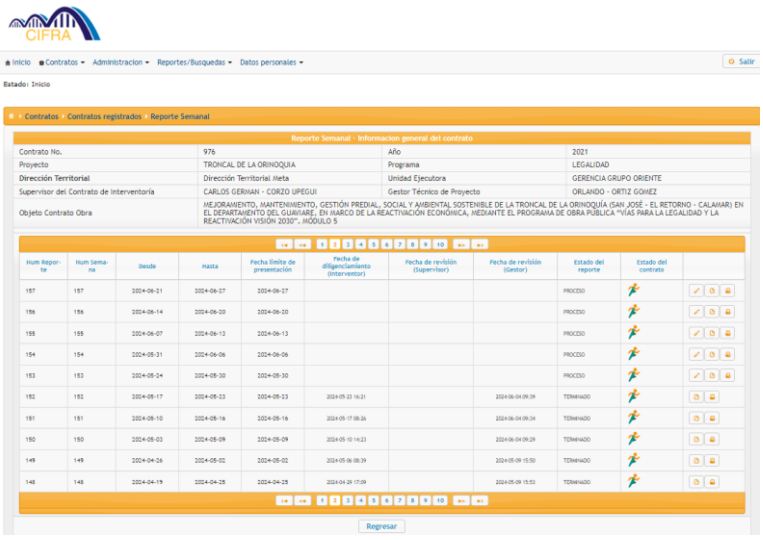


Imagen 45. Informe de programa CIFRA

a. Seguimiento estado del trámite certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.

A la fecha no se han realizado tramites.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-5)

Anexo 17

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-7)

Anexo 18

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-9)

Anexo 19

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-13)

Anexo 20

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

(MEPI-MN1-IN-15-FR-15)

Anexo 21

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

a. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-3-FR-1)

Anexo 22

a. Seguimiento a la inversión del anticipo

(MEPI-MN-IN-3-FR-2)

Anexo 23

b. Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado

(MEPI-MN-IN-9-FR-2)

Anexo 24

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el presente periodo se generaron los siguientes requerimientos y recomendaciones, las cuales, fueron citadas mediante comunicados y en las actas de control y seguimiento de obra:

- ✓ En el periodo informado contamos con carpeta asfáltica en primera capa acumulado de 11.17 ml y en segunda capa 9.99 ml.

- ✓ Para el periodo el contratista no presente atraso en la ejecución física, con una inversión ejecutada acumulada del 46.42%, frente a una inversión programada 40.75%.

- ✓ El contratista cuenta con siete (7) permisos ambientales obtenidos para el desarrollo de las obras, entre los cuales se tiene los permisos de: tres (3) ocupación de cauces, una (1) concesión de aguas, dos (2) aprovechamiento forestal (1 vigente y 1 cerrado con la corporación ambiental CDA) y uno (1) de emisiones atmosféricas. De los siete permisos ambientales, se tienen medidas de compensación por cinco permisos ambientales , de los cuales al mes de mayo de 2024 se han cumplido de acuerdo a los tiempos de la corporación ambiental para 3 permisos (2 ocupaciones de cauces y 1 permiso de aprovechamiento). Se tiene pendiente el cumplimiento de las medidas de compensación por dos permisos (1 ocupación de cauces y 1 permiso de aprovechamiento forestal) que aún cuentan con el tiempo para realizar estas compensaciones ante la autoridad ambiental.

- ✓ La interventoría llevo a cabo seguimiento al cumplimiento de los compromisos acordados con los propietarios, especialmente en lo concerniente con la adecuación de accesos, entradas, reposición de cercas y perfilación de taludes. Se establecieron un total de 39 actas de compromiso, de las cuales 22 han sido cerradas y 17 permanecen abiertas y están siendo atendidas por el contratista.

- ✓ A la fecha se ha girado al consorcio Ecovisión-190 $755 millones por concepto de anticipo, de un total de $9.243 millones a girar según lo establecido por el contrato 1000 de 2021, lo que indica que se ha girado el 8.17% del anticipo.

- ✓ A la fecha se ha girado al consorcio DSC $27.011 millones por concepto de anticipo, de un total de $86.654 millones a girar según lo establecido por el contrato 976 de 2021, lo que indica que se ha girado el 38.17% del anticipo

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha recibo

Anexos en la carpeta del informe

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales

8.4 Bitácora

Se encuentran anexos en la carpeta del informe
