Consorcio HDC

018-24

Puerto Carreño, 2 de septiembre de 2024

Señores
CONSORCIO SAN RAFAEL
Atn.: Javier Francisco Sabogal
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: Entrega informe de obra N°8 - Contrato HDSJDD-CP-2374-2023

Objeto:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega del informe de obra N°8 para su respectiva aprobación con el fin de dar cumpliendo con la cláusula segunda, obligación octava del contrato.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS
CC.: 86.072.395 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO HDC

Recibido consorcio San Rafael
2/09/2024

consorciohdc23@gmail.com
Calle 23 No. 6 – 35 – Cel.: 313 420 66 05
Puerto Carreño - Vichada

INFORME DE OBRA N° 8

CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO

CONTRATISTA:

CONSORCIO HDC

R/L: ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS



INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN RAFAEL

R/L JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS

CONTRATANTE: E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO

PERIODO: 1 DE AGOSTO DE 2024 – 31 DE AGOSTO DE 2024

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 3
OBJETO DEL INFORME 4
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 5
1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS) 6
1.2.1. INICIAL 6
1.2.2. AJUSTE 6
1.2.3. ACTA DE INICIO 7
1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO 7
2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023 10
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA 10
2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO: 11
2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES 11
2.3. CUADRO DE AVANCE 21
2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES 22
2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO 22
2.6. CLIMATOLOGIA 23
2.7. COMPROMISOS LABORALES 24
2.8. PERSONAL 24
2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL 24
2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO 24
2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 26
2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 26
2.11. MAQUINARIA 29
3. FINANCIERO 29
3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO 30
3.2. AVANCE FINANCIERO 33
3.3. CONTROL PRESUPUESTAL 34
4. INFORMACION LEGAL 34
4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS 34
5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO. 34
6. CONCLUSIONES 35
7. ANEXOS 36

INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende el periodo del **1 DE AGOSTO DE 2024 – 31 DE AGOSTO DE 2024** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023** con fecha de firma el 28 de diciembre de 2023, acta de inicio el día 16 de enero de 2024 y licencia de construcción **SPIM-05-2023** de fecha 11 de diciembre de 2023, celebrado entre **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO Y CONSORCIO HDC** identificado con **NIT. 901.783.555-3** el cual se encuentra representada legalmente por **JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS,** cuyo objeto es. "**REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** Por la suma de **VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS M/CTE ($20,856,846,224.00).** El presente informe contine la descripción de las labores llevadas a cabo durante el periodo en mención.

OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las diferentes actividades técnicas, administrativas, ambientales y financieras desarrolladas en el periodo del **1 DE AGOSTO DE 2024 – 31 DE AGOSTO DE 2024** del contrato de obra **HDSJDD-CP-2374-2023.**

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

1.1. FICHA TECNICA DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	E.S.E. Hospital Departamental San Juan De Dios de Puerto Carreño
Interventor:	Consorcio San Rafael
Objeto del Contrato:	Reposición De La Infraestructura Del Hospital Departamental San Juan De Dios, E.S.E. Sede Cumaribo
Contrato No:	HDSJDD-CP-2374-2023
Contratista:	Consorcio HDC
Representante Legal:	Ing. Juan Sebastián Serna Arias
Valor del Contrato:	$ 20,856,846,224.00
Valor del Anticipo (50%):	$ 10,428,423,112.00
Fecha desembolso anticipo:	13/02/2023
Plazo de ejecución:	Quince (15) Meses
Fecha de inicio:	16 de enero de 2024
Fecha de terminación:	15 de abril de 2025
INFORMACION FINANCIERA PAGOS PARCIALES	
Acta parcial 1:	$ 1,202,976,129.00
Amortización Acta parcial 1:	$ 601,488,064.50
Acta parcial 2:	$ 842,463,948.00
Amortización Acta parcial 2:	$ 421,231,974.00
Acumulado:	$ 2,045,440,077.00
Pendiente por amortizar:	$ 9,405,703,073.50

1.2. GARANTIA UNICA (VIGENCIAS)

1.2.1. INICIAL

CONDICIONES INICIALES (ANEXO 0)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-03-2025	$1.042.842.311,00

1.2.2. AJUSTE

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 1)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-07-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-09-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y	SGPL-126634013-1	28-12-2023	28-03-2028	$1.042.842.311,20

PRESTACIONES SOCIALES				
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	28-03-2023	28-03-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	28-12-2023	28-06-2025	$1.042.842.311,00

1.2.3. ACTA DE INICIO

CONDICIONES SEGÚN ACTA DE INICIO (ANEXO 2)				
COMPAÑÍA ASEGURADORA: ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.				
GARANTIAS	**No POLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-08-2025	$10.428.423.112,00
CUMPLIMIENTO	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-10-2025	$2.085.684.622,40
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SGPL-126634013-1	16-01-2024	15-04-2028	$1.042.842.311,20
ESTABILIDAD Y CÁLIDAD DE LA OBRA	SGPL-126634013-1	15-04-2024	15-04-2030	$2.085.684.622,40
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCERO	LBCO-126670761-1	16-01-2024	15-07-2025	$1.042.842.311,00

1.3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

La E.S.E Hospital San Juan de Dios, es una entidad descentralizada del Orden Departamental; se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Carreño del departamento del Vichada y sedes ubicadas en centros urbanos que, en el marco de la organización de red del departamento, prestan los servicios de baja y mediana complejidad para la población vichadense.

La división del territorio para la prestación de los servicios de salud, se realiza por subregiones y microrregiones que se definen a partir de la agrupación de municipios

según la ubicación geográfica, las comunidades indígenas y la dispersión de la población, para organizarla de forma funcional y operativa, facilitando la articulación, gestión e integralidad de la misma, según la capacidad instalada de las IPS, las vías de acceso que facilitan en el tiempo de invierno el transporte fluvial, (ríos Meta, Vichada y Guaviare) y en verano las vías terrestres que cruzan de igual forma cada subregión.

La función primordial de la E.S.E. radica en la atención de salud, en cumplimiento de principios constitucionales que orientan la prestación del servicio público de salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, entre otros, bajo la premisa de la garantía de la calidad del servicio y de su efectiva prestación, para lo cual debe contar con una infraestructura apropiada y dotación acorde con el nivel de servicios ofertados.

La demanda de servicios de salud de la E.S.E. proviene de la zona urbana y rural, debido a que el mercado actual está dado en su mayor parte por las EPS del Régimen Subsidiado, seguida de las EPS de Régimen Contributivo y por último régimen especial y particular Se ha presentado un incremento en la población perteneciente al régimen subsidiado en razón a la población desplazada que llega de otros municipios, desde Venezuela y al crecimiento propio poblacional.

La E.S.E ha realizado una distribución de sus servicios en las diferentes sedes de tal forma que se garantiza una adecuada, optima y oportuna atención a dichos usuarios, con base a los principios de calidad y eficiencia, que le permita ser autosuficiente y sostenible en el tiempo como Empresa Social del Estado para cumplir con los requerimientos que le exige el Ministerio de salud y protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.

Sin embargo, a pesar de los diferentes esfuerzos efectuados por la entidad, en donde se ha dotado de equipos biomédicos de última generación, ampliado el personal especializado para la atención de pacientes y una progresiva ampliación de servicios, es evidente que la infraestructura física de la entidad resulta insuficiente y vetusta de cara a la normatividad constructiva y hospitalaria, generando consigo riesgos frente a la atención de usuarios y trabajadores de la entidad.

Ha de recordarse que la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño, Vichada, fue creada como Empresa Social del Estado a través de la Ordenanza 048 del 22 d noviembre de 1994. Previo a su nacimiento, la institución hospitalaria prestaba sus servicios a cargo de la dirección seccional de salud en el Departamento del Vichada, en la misma infraestructura física.

Revisando el archivo histórico de la entidad, se colige que la infraestructura física data de alrededor de 40 años de construcción y en la actualidad no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10, ni de habilitación hospitalaria, pese a que se

han efectuado adecuaciones para tratar de acompasar la edificación frente a las modificaciones normativas.

CAUSAS QUE GENERAN EL PROBLEMA

Causas directas: infraestructura hospitalaria mayor a 40 años de construcción, la cual no cumple con las normas de sismo resistencia, NSR 10 y de habilitación hospitalaria, Resolución 3100 de 2019.

Causas indirectas: Deficiente prestación de los Servicios de Salud a la población, en la ESE Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño y sus sedes.

EFECTOS QUE GENERA EL PROBLEMA

Efectos directos: Riesgo en la prestación del servicio de salud e incremento de los usuarios y baja calidad en la prestación de los servicios de salud.

Efectos indirectos: Disminución de la calidad del Servicio de Salud en el Departamento del Vichada.

Por esta razón y bajo el entendiendo que parte esencial de la calidad de la prestación del servicio de salud es la infraestructura física hospitalaria, desde la gerencia de la ESE Departamental Hospital San Juan de Dios, junto con el acompañamiento de la Secretaría Departamental de Salud, se presentó un proyecto de modernización de la infraestructura física ante el Ministerio de Salud Protección Social.

Por lo anterior, la ESE Departamental Hospital San juan de Dios de Puerto Carreño, junto con la Administración Departamental presento ante el Ministerio de Salud y Protección Social la iniciativa para la **" REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO"** para lo cual el Ministerio de Salud y Protección Social dio concepto de viabilidad técnica al proyecto (Resolución No. 1353 de 2023), a efectos de lograr la financiación de los recursos necesarios para sufragar los costos del proyecto.

En respuesta a las diferentes gestiones administrativas, mediante documento del 31 de agosto de 2023, el Ministerio de Salud comunica viabilidad técnica, financiera del proyecto, determinando una financiación de la entidad nacional por valor de $22.164.988.792,00.

Resultado de lo anterior, y acorde con el Plan de Desarrollo **"TRABAJO PARA TODO VICHADA 2020- 2023"** , línea Estratégica 2. Desarrollo Social Integral Para Vida Digna, Programa 5. Salud y protección social para el Vichada; 4.3.1.3 Subprograma 7. Prestación de servicios de salud OBJETIVO 8. Garantizar el cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación de

los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población afiliada.

Por tal razón, **LA E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS**, contemplo llevar a cabo el proceso de selección de un contratista que cumpla con los requerimientos legales, técnicos y financieros, necesarios para la **REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO**.

2. EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA HDSJDD-CP-2374-2023

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La ubicación de la ejecución de la obra física es Cumaribo – Vichada.



El proyecto se ubica en un lote esquinero entre la calle 6 y la carrera 15 de Cumaribo Vichada, comprende la construcción Hospital San Juan de Dios Sede Cumaribo. El propósito es mejorar la calidad de la atención de la E.S.E departamental a las personas.

2.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO:

2.2.1. EJECUCION DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

ITEM 2.3. Excavación manual en conglomerado.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de excavación manual en material conglomerado para vigas de cimentación ubicadas en la zona de rampa y ascensores, se realizaron excavaciones para tubería sanitaria y cajas de inspección que conforman el sistema de aguas negras del proyecto, así como para la viga de cimentación del cerramiento. Para esta actividad se emplearon picas, palas, barras y carretillas. Posteriormente, se vertió concreto de limpieza en cada uno de los elementos estructurales pendientes de ejecutar.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 2.4. Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (área restringida).

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la excavación mecánica en material común para las zapatas del Eje 1, zapatas Z-1R, Z-2R, Z-3R y Z-8, tanque subterráneo y planta de tratamiento de aguas hospitalarias. Para esta actividad, se emplearon picas, palas, barras, carretillas y una retroexcavadora de llantas. Posteriormente, se vertió concreto de limpieza en cada uno de los elementos estructurales pendientes de ejecución.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 2.6. Relleno con material sub base triturado tamaño máximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.

Se llevó a cabo, dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, la actividad de relleno con material sub base en los rectángulos que se generan entre vigas de cimentación y zapatas del Eje 1. Este material fue debidamente compactado en las excavaciones realizadas para las zapatas y vigas de cimentación ya fundidas. Para esta tarea, se utilizaron carretillas, palas, un pisón manual y una plancha compactadora.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 3.1. Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi.

Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el vertido de concreto para solado de baja resistencia para las vigas de cimentación del cerramiento, tanque subterráneo y planta de tratamiento de aguas hospitalarias. Esta acción tenía como objetivo aislar el terreno natural, asegurando la protección del acero y del concreto que se utilizarán en los diversos elementos estructurales que se fundirán posteriormente. Para esta actividad se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 3.2. Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para zapatas de cimentación con una resistencia de 3000 psi, específicamente en las zapatas Z-4, Z-5, Z-6, Z-8 y zapatas para cimentación de la rampa. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 3.3. Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para viga de cimentación con una resistencia de 3000 psi. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 3.18. Acero de Refuerzo Grado 60.

Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el amarrado de acero de refuerzo grado 60 para las vigas de cimentación del cerramiento, tanque subterráneo, muros pantalla y figurado de vigas áreas N+8.05. Para esta actividad se emplearon bichiroques, alambre negro.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 3.25. Concreto viga de cimentación cerramiento no incluye refuerzo.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para viga de cimentación para cerramiento con una resistencia de 3000 psi. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 3.28. Concreto de 3000 Psi para muro pantalla.

Dentro del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, se llevó a cabo la actividad de verter concreto para inicio de muros pantalla con una resistencia de 3000 psi. Para esta tarea se emplearon cemento, arena, una mezcladora, palas, palustre, boquillera, nivel, carretillas y baldes.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

ITEM 4.6. Suministro e instalación de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura.


Se realizó, como parte del proceso de reposición del Hospital Departamental San Juan de Dios, sede Cumaribo, el suministro e instalación de tubo 2” galvanizado. Para esta actividad se emplearon niveles de pared, equipos de soldadura, alambre negro, pulidora y tronzadora.



Las cantidades de obra ejecutadas durante el periodo están registradas en la hoja de control de avance mensual, la cual se adjunta a este informe.

2.3. CUADRO DE AVANCE

AVANCE FISICO				
INFORME N°	PROGRAMADO	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO PERIODO	EJECUTADO ACUMULADO
1	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	0.97%	0.97%	0.00%	0.00%
4	3.27%	4.24%	4.31%	4.31%
5	1.96%	6.20%	2.28%	6.59%
6	1.52%	7.73%	1.16%	7.75%
7	1.51%	9.24%	3.10%	10.85%
8	1.81%	11.05%	4.79%	15.64%
9	2.50%	13.55%		
10	4.51%	18.05%		
11	9.03%	27.08%		
12	8.71%	35.80%		
13	7.00%	42.80%		
14	6.44%	49.24%		
15	20.05%	69.29%		
16	30.71%	100.00%		

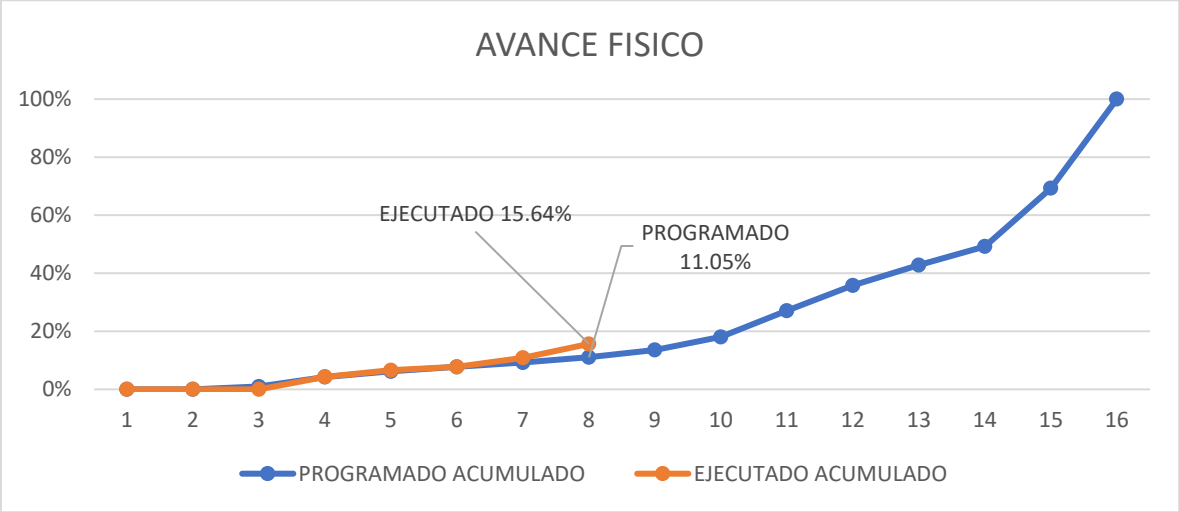

Nota: el avance de obra plasmado en la anterior tabla corresponde a lo registrado en la sabana de control de avance del presente informe, la aritmética de la tabla se puede alterar debido a decimales ocultos por el formato anteriormente mencionado.

El avance físico programado versus ejecutado que se muestra en el presente informe, ya cuenta con los porcentajes actualizados entregados con la

reprogramación del 16 de julio de 2024 que incluye la modificación No 1 a las cantidades iniciales del contrato HDSJDD-CP-2374.

2.4. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Para el presente periodo se utilizaron los siguientes materiales en los cuales se adjunta el correspondiente certificado de calidad:

- Acero grado 60.
- Cemento hidráulico tipo ug marca Fortecem.

2.5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Durante el periodo actual, se realizaron actividades de construcción que incluyeron el uso de concreto. Como parte del control de calidad, se tomaron cilindros de laboratorio de los elementos fundidos hasta la fecha. Estos cilindros serán enviados al laboratorio Ingegar Ingeniería S.A.S. para someterlos a las pruebas de compresión correspondientes. Los resultados obtenidos se adjuntarán en los siguientes informes.



TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi PARA ZAPATAS			
ITEM: 3,2 Zapata en concreto para cimentación de resistencia 3000 Psi			
FECHA	FECHA DE FALLO	ZAPATA TIPO	EJE DE LOCALIZACIÓN
16/08/2024	13/09/2024	Z-4	E-1

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi VIGA DE CIMENTACION CERRAMIENTO			
ITEM: 3,25 Concreto viga de cimentación cerramiento no incluye refuerzo			
FECHA	FECHA DE FALLO	UBICACIÓN VIGA	EJE DE LOCALIZACIÓN
6/08/2024	3/09/2024	CERRAMIENTO NORTE	N-A

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi PARA COLUMNAS			
ITEM: 3,4 Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m			
FECHA	FECHA DE FALLO	ZAPATA TIPO	EJE DE LOCALIZACIÓN
20/08/2024	17/09/2024	C-1	D-1

TOMA DE MUESTRAS DE CILINDROS EN CONCRETO DE 3000 Psi PARA VIGAS DE CIMENTACION			
ITEM: 3,3 Viga de amarre para cimentación en concreto de 3000 Psi			
FECHA	FECHA DE FALLO	VIGA TIPO	EJE DE LOCALIZACIÓN
22/08/2024	19/09/2024	VG-A	A
23/08/2024	20/09/2024	VG-11	11

2.6. CLIMATOLOGIA

Para el presente periodo comprendido entre 1 DE AGOSTO DE 2024 – 31 DE AGOSTO DE 2024 el estado del clima fue el siguiente:

ESTADO GENERAL DEL CLIMA MES DE AGOSTO

1	2	3	4	5	6
Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado		Soleado	Soleado-Lluvioso
7	8	9	10	11	12

Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso		Lluvioso
13	14	15	16	17	18
Soleado-Lluvioso	Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado	
19	20	21	22	23	24
Soleado	Soleado	Soleado	Soleado	Soleado-Lluvioso	Soleado
25	26	27	28	29	30
	Soleado-Lluvioso	Soleado	Soleado-Nublado	Soleado	Soleado
31					
Soleado-Lluvioso					

2.7. COMPROMISOS LABORALES

Para el presente periodo no se generaron compromisos laborales por parte de la entidad contratante hacia el contratista de obra.

2.8. PERSONAL

Para el presente periodo se contó con la siguiente relación de personal profesional y operativo.

2.8.1. REGISTRO DE PERSONAL PROFESIONAL

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	ASESOR ESTRUCTURAL
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	ARQUITECTO
ANDREA DEL PILAR BALLEN	COORDINADORA DE LOGISTICA

2.8.2. REGISTRO DE PERSONAL OPERATIVO

NOMBRE	CARGO DESEMPEÑADO
HECTOR FABIO SERNA SERNA	CADENERO
JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	CONDUCTOR

ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ENRIQUE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	AYUDANTE DE OBRA
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
ORLANDO FONSECA GOMEZ	AYUDANTE DE OBRA
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	AYUDANTE DE OBRA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	ALMACENISTA
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
JAIRO GAITAN GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	AYUDANTE DE OBRA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	AUXILIAR SST
BILCEN REINA GALINDO	AYUDANTE DE OBRA
ANTONIO ENRIQUE JIMENEZ PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
CHARLES BRAYAN REINA CAPA	AYUDANTE DE OBRA
DUBIER ARLEY ROBAYO OSPINA	SOLDADOR
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	AYUDANTE DE OBRA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	AYUDANTE DE OBRA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	CELADOR
JHON JAIRO GRISALES RINCON	SOLDADOR
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	MAESTRO DE OBRA
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	AYUDANTE DE OBRA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	AYUDANTE DE OBRA
SANTIAGO AMAYA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
GUILLERMO RIOS GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	AYUDANTE DE OBRA
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	AYUDANTE DE OBRA
JULIO CESAR PONARE GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
PABLO EMILIO PONARE CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
RAMON ARTURO PONARE CHIPIAJE	AYUDANTE DE OBRA
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	AYUDANTE DE OBRA
FABIAN RICARDO BUITRAGO OTALORA	AYUDANTE DE OBRA
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	AYUDANTE DE OBRA

JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
JORGE DARBEY SANCHEZ CARIBAN	AYUDANTE DE OBRA
EDWIN ANDRES NOVOA PULIDO	AYUDANTE DE OBRA
YORMAN SOSA GAITAN	AYUDANTE DE OBRA
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
WILSON PONARE PONARE	AYUDANTE DE OBRA
BRIAN FARID VARGAS SALCEDO	AYUDANTE DE OBRA

2.9. AFILIACION DE PERSONAL PROFESIONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	DIRECTOR DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
WILSON ANDRES LEAL DIAZ	86.062.674	RESIDENTE DE OBRA	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	86.072.395	ASESOR ESTRUCTURAL	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO	1.121.958.635	ASESOR EN INGENIERIA AMBIENTAL	FAMISANAR	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
EDITH YOLANDA HERNANDEZ SABOGAL	1.122.118.138	COORDINADOR DE CALIDAD Y SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO	SANITAS	POSITIVA	COLFONDOS	COMCAJA
DAVID ALEJANDRO VASQUEZ PEÑA	1.020.761.432	ARQUITECTO	SANITAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ANDREA DEL PILAR BALLEN	32.264.916	COORDINADORA DE LOGISTICA	SANITAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA

2.10. AFILIACION DE PERSONAL OPERATIVO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	EPS	ARL	AFP	CAJA DE COMPENSACION

HECTOR FABIO SERNA SERNA	17.304.466	CADENERO	CAPITAL SALUD	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JOSE DEL CARMEN MOYANO LEON	86.731.110	CONDUCTOR	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ARISTIDEZ HERNAN LARROSA GONZALEZ	1.125.010.065	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
JOSE ENRIQUE PONARE	5.722.870	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
CIRO JAIR ARANGO CASTILLO	1.124.993.310	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LUIS EMMIRO PONARE PONARE	1.124.998.948	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ORLANDO FONSECA GOMEZ	1.127.382.860	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
RAFAEL ARCANGEL MENDEZ RIVAS	1.124.991.167	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
NESTOR JHAIR ALGARRA PEREZ	1.124.993.341	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
LEIDY CATHERINE SALCEDO RODRIGUEZ	1.192.772.735	ALMACENISTA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA
COSTMETH DAMIAN ZULUAGA BONILLA	1.125.002.345	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JAIRO GAITAN GALINDO	1.006.950.328	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ALFREDO RODRIGUEZ GUEVARA	1.124.990.520	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
NOELLY GALVIZ BENJUMEA	1.124.997.772	AUXILIAR SST	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
BILCEN REINA GALINDO	6.848.517	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ANTONIO ENRIQUE JIMENEZ PEREZ	1.125.007.320	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA

CHARLES BRAYAN REINA CAPA	1.124.990.631	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
DUBIER ARLEY ROBAYO OSPINA	1.193.117.578	SOLDADOR	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
HECTOR CIPRIANO SANCHEZ ERRENUMA	1.006.951.188	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
FELIX LUIS SANCHEZ GONDELLEZ	8.190.705	AYUDANTE DE OBRA	CAJA COPI	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
LUIS GERARDO ALGARRA ALFONSO	11.280.464	CELADOR	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
JHON JAIRO GRISALES RINCON	17.588.928	SOLDADOR	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ALEX CONSOLACION RODRIGUEZ	1.127.923.922	MAESTRO DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA
HERNEY ANTONIO RUIZ CHIPIAJE	1.121.944.520	AYUDANTE DE OBRA	SALUD TOTAL	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
ARIES GERMAN AGUDELO BONILLA	1.125.004.538	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
HOSMAN CARDONA RODRIGUEZ	1.124.994.614	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JHON FREDY CARIBAN DIAZ	1.124.991.490	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
SANTIAGO AMAYA GAITAN	1.124.991.155	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PROTECCION	COMCAJA
GUILLERMO RIOS GAITAN	17.316.132	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
DIOMEDEZ SILVA PEREZ	1.125.001.121	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
ENRRIQUE CARIBAN RODRIGUEZ	18.262.093	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JULIO CESAR PONARE GAITAN	6.848.141	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
PABLO EMILIO PONARE CHIPIAJE	1.125.010.797	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
RAMON ARTURO	6.848.740	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA

PONARE CHIPIAJE						
CESAR AUGUSTO BARRERA MANCIPE	1.124.989.245	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
FABIAN RICARDO BUITRAGO OTALORA	1.006.951.096	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JOSE ANTONIO DASILVA FORERO	1.119.890.549	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
JAIRO HUMBERTO GOMEZ GAITAN	7.243.305	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
JORGE DARBEY SANCHEZ CARIBAN	1.192.757.402	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
EDWIN ANDRES NOVOA PULIDO	1.124.990.124	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
YORMAN SOSA GAITAN	1.136.278.055	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
JHORMAN SAMUEL PONARE PONARE	1.124.990.027	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	COLPENSIONES	COMCAJA
WILSON PONARE PONARE	1.124.996.599	AYUDANTE DE OBRA	MALLAMAS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA
BRIAN FARID VARGAS SALCEDO	1.125.003.293	AYUDANTE DE OBRA	NUEVA EPS	POSITIVA	PORVENIR	COMCAJA


2.11. MAQUINARIA

Para el presente periodo se utilizó una retroexcavadora para las excavaciones de zapatas, tanque de agua y planta de tratamiento de aguas sanitarias, mezcladora para concreto de bulto y medio de cemento y plancha compactadora para compactar el relleno.

3. FINANCIERO

En el presente periodo el Consorcio HDC cuenta con Diez Mil Cuatrocientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Veintitrés Mil Ciento Doce pesos M/CTE

($10,428,423,112.00) entregados por la entidad contratante Hospital Departamental San Juan De Dios E.S.E. Sede Puerto Carreño por concepto de anticipo del cual se ha amortizado Mil veintidós millones setecientos veinte mil treinta y ocho pesos con cincuenta M/CTE ($ 1,022,720,038.50) para un valor pendiente por amortizar de Nueve mil cuatrocientos cinco millones setecientos tres mil setenta y tres pesos con cincuenta M/CTE ($ 9,405,703,073.50)

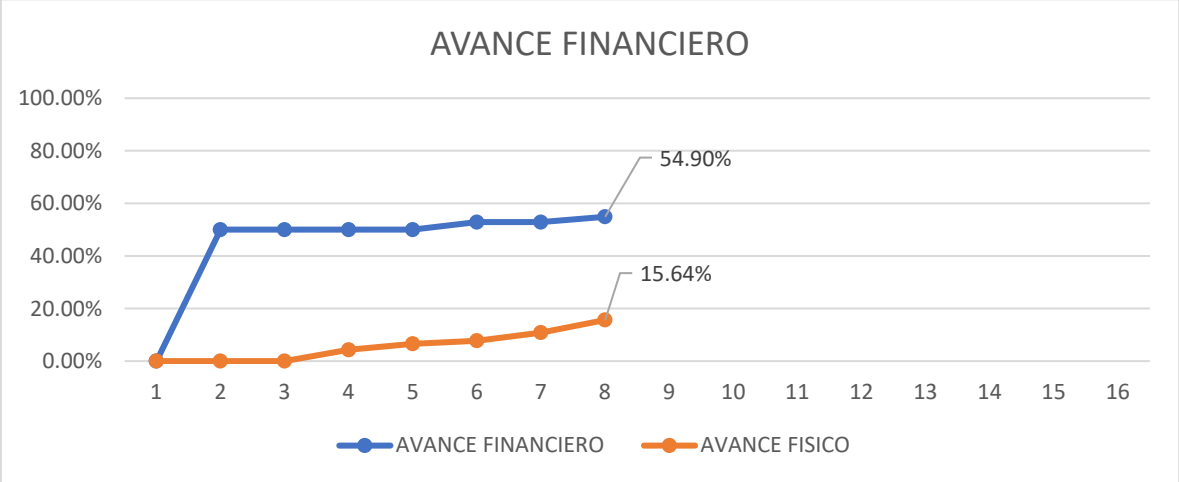

El Consorcio HDC hasta el momento del presente informe a tramitado ante la entidad dos (2) actas parciales por un valor de dos mil cuarenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta mil setenta y siete pesos m/cte. ($ 2,045,440,077.00), las cuales serán discriminadas a continuación:

Acta parcial N°1: $ 1,202,976,129.00
Acta parcial N°2: $ 842,463,948.00

3.1. CONTROL DE INVERSION DEL ANTICIPO

Para el presente periodo se elaboraron órdenes de pago los cuales fueron invertidos de acuerdo a los rubros relacionados en el plan de inversión del anticipo previamente presentado, a continuación, se relacionan las ordenes de pagos emitidas a la fecha:

Orden	1. Pago de personal	2. Compra de equipos y repuestos	3. Transporte y alquiler de maquinaria	4. Compra de materiales y accesorios.	Estado
N° 1	$ 500,000,000.00				APROBADA
N° 2					**ANULADA**
N° 3			$ 110,240,000.00		APROBADA
N° 4				$ 99,000,000.00	APROBADA
N° 5				$ 78,750,000.00	APROBADA
N° 6			$ 560,000,000.00		APROBADA
N° 7			$ 99,840,000.00		APROBADA
N° 8	$ 350,000,000.00				APROBADA
N° 9			$ 33,636,482.00		APROBADA
N° 10					**ANULADA**

N° 11				$ 24,434,807.02	APROBADA
N° 12				$ 98,736,000.00	APROBADA
N° 13				$ 219,768,800.00	APROBADA
N° 14		$ 37,115,000.00			APROBADA
N° 15				$ 209,625,000.00	APROBADA
N° 16				$ 952,756,550.00	APROBADA
N° 17				$ 30,870,000.00	APROBADA
N° 18				$ 129,121,600.00	APROBADA
N° 19				$ 8,000,000.00	APROBADA
N° 20				$ 219,163,200.00	APROBADA
N° 21	$ 683,246,500.00				APROBADA
N° 22					**ANULADA**
N° 23				$ 137,500,000.00	APROBADA
N° 24				$ 15,040,000.00	APROBADA
N° 25				$ 39,481,373.00	APROBADA
N° 26				$ 36,745,470.00	APROBADA
N° 27				$ 284,722,200.00	APROBADA
N° 28				$ 1,120,500.00	APROBADA
N° 29				$ 270,000,000.00	APROBADA
N° 30			$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 31			$ 13,320,000.00		APROBADA
N° 32			$ 47,521,408.00		APROBADA
N° 33			$ 40,000,000.00		APROBADA
N° 34			$ 294,367,000.00		APROBADA
N° 35				$ 439,270,000.00	APROBADA
N° 36				$ 25,683,000.00	APROBADA
N° 37				$ 6,500,504.00	APROBADA
N° 38			$ 10,320,000.00		APROBADA
N° 39			$ 16,320,000.00		APROBADA
N° 40			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 41		$ 4,500,000.00			APROBADA
N° 42				$ 15,249,850.00	APROBADA
N° 43			$ 20,706,000.00		APROBADA
N° 44			$ 4,680,000.00		APROBADA
N° 45			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 46				$ 12,750,000.00	APROBADA
N° 47		$ 5,500,000.00			APROBADA
N° 48				$ 14,400,500.00	APROBADA
N° 49					**ANULADA**
N° 50			$ 14,574,000.00		APROBADA
N° 51			$ 4,560,000.00		APROBADA
N° 52				$ 1,040,000.00	APROBADA
N° 53				$ 3,022,147.00	APROBADA
N° 54					**ANULADA**
N° 55			$ 23,300,000.00		APROBADA
N° 56			$ 19,700,000.00		APROBADA
N° 57					**ANULADA**
N° 58				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 59			$ 20,400,000.00		APROBADA
N° 60					**ANULADA**
N° 61				$ 406,050.00	APROBADA
N° 62				$ 183,427,000.00	APROBADA
N° 63				$ 1,402,500.00	APROBADA
N° 64				$ 2,511,140.00	APROBADA
N° 65			$ 10,353,000.00		APROBADA
N° 66				$ 870,000.00	APROBADA
N° 67			$ 9,720,000.00		APROBADA
N° 68				$ 1,311,868.00	APROBADA
N° 69				$ 6,320,650.00	APROBADA
N° 70				$ 4,313,900.00	APROBADA
N° 71			$ 12,920,000.00		APROBADA
N° 72			$ 3,045,000.00		APROBADA
N° 73			$ 26,227,600.00		APROBADA
N° 74				$ 25,201,300.00	APROBADA

N° 75			$ 1,134,000.00		APROBADA
N° 76				$ 3,618,901.00	APROBADA
N° 77				$ 19,611,300.00	APROBADA
N° 78				$ 11,502,500.00	APROBADA
N° 79				$ 11,281,720.00	APROBADA
N° 80			$ 39,951,500.00		APROBADA
N° 81			$ 22,664,000.00		APROBADA
N° 82			$ 13,113,800.00		APROBADA
N° 83				$ 175,430,235.00	APROBADA
N° 84				$ 4,976,180.00	APROBADA
N° 85			$ 3,600,000.00		APROBADA
N° 86			$ 75,832,000.00		APROBADA
N° 87	$ 1,700,000.00				APROBADA
N° 88					**ANULADA**
N° 89				$ 692,548.00	APROBADA
N° 90			$ 17,000,000.00		APROBADA
N° 91				$ 1,251,548.50	APROBADA
N° 92	$ 32,859,000.00				APROBADA
N° 93				$ 1,121,600.00	APROBADA
N° 94				$ 2,004,000.00	APROBADA
N° 95			$ 41,250,000.00		APROBADA
N° 96					**ANULADA**
N° 97				$ 2,523,100.00	APROBADA
N° 98				$ 5,304,000.00	APROBADA
N° 99				$ 23,500,000.00	APROBADA
N° 100			$ 3,030,000.00		APROBADA
N° 101			$ 4,860,000.00		APROBADA
N° 102	$ 2,600,000.00				APROBADA
N° 103				$ 3,150,000.00	APROBADA
N° 104			$ 16,821,600.00		APROBADA
N° 105			$ 20,682,000.00		APROBADA
N° 106			$ 8,500,000.00		APROBADA
N° 107				$ 4,092,140.00	APROBADA
N° 108				$ 100,000,000.30	APROBADA
N° 109	$ 368,950,000.00				APROBADA
N° 110			$ 32,130,000.00		APROBADA
N° 111				$ 1,547,000.00	APROBADA
N° 112				$ 24,077,700.00	APROBADA
N° 113					**ANULADA**
N° 114			$ 1,884,500.00		APROBADA
N° 115					**ANULADA**
N° 116			$ 18,650,000.00		APROBADA
N° 117				$ 1,280,000.00	APROBADA
N° 118				$ 8,384,550.00	APROBADA
N° 119			$ 12,789,000.00		APROBADA
N° 120				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 121			$ 25,996,000.00		APROBADA
N° 122				$ 103,200,000.00	APROBADA
N° 123				$ 1,474,100.00	APROBADA
N° 124				$ 928,000.00	APROBADA
N° 125			$ 4,594,800.00		APROBADA
N° 126				$ 193,256,000.00	APROBADA
N° 127		$ 144,900,000.00			APROBADA
N° 128	$ 213,800,000.00				APROBADA
N° 129			$ 11,907,000.00		APROBADA
N° 130				$ 560,500.00	APROBADA
N° 131				$ 573,000.00	APROBADA
N° 132			$ 15,000,000.00		APROBADA
N° 133				$ 5,000,000.00	APROBADA
N° 134				$ 26,553,541.00	APROBADA
N° 135	$ 3,299,870.00				APROBADA
N° 136				$ 6,200,000.00	APROBADA
N° 137				$ 61,706,115.00	APROBADA
N° 138				$ 6,255,950.00	APROBADA
N° 139				$ 3,161,700.00	APROBADA

N° 140			$ 5,372,000.00		APROBADA
N° 141			$ 7,480,000.00		APROBADA
N° 142				$ 8,759,000.00	APROBADA
N° 143				$ 8,358,188.50	APROBADA
N° 144			$ 44,730,000.00		APROBADA
N° 145			$ 8,640,000.00		APROBADA
N° 146				$ 3,952,200.00	APROBADA
N° 147	$ 62,200,000.00				APROBADA
N° 148				$ 58,754,723.00	APROBADA
N° 149				$ 920,000.00	APROBADA
N° 150	$ 4,500,000.00				APROBADA
SUB-TOTAL	$ 2,223,155,370.00	$ 192,015,000.00	$ 1,887,282,690.00	$ 4,503,477,949.32	
VALOR X RUBRO	$ 3,337,095,395.84	$ 312,852,693.36	$ 2,085,684,622.40	$ 4,692,790,400.40	
SALDO X RUBRO	$ 1,113,940,025.84	$ 120,837,693.36	$ 198,401,932.40	$ 189,312,451.08	
SALDO				$ 1,622,492,102.68	

A continuación, se relacionan los saldos por rubro de acuerdo al plan de inversión del anticipo presentado:

No.	DESCRIPCION	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y jornales	$ 1,113,940,025.84	10.68%
2	Compra de equipos y repuestos	$ 120,837,693.36	1.16%
3	Transporte y alquiler de maquinaria	$ 198,401,932.40	1.90%
4	Compra de materiales y accesorios	$ 189,312,451.08	1.82%
	TOTALES	$ 1,622,492,102.68	16.17%

3.2. AVANCE FINANCIERO

A continuación, se relaciona el cuadro de control presupuestal del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 firmado con el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. de Puerto Carreño.

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 20.856.846.224,00	28/12/2023		
VALOR GIRADO ANTICIPO	$ 10,428,423,112.00	13/02/2024		50%
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 1,202,976,129.00	29/05/2024	5.77%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50	29/05/2024		

VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	$ 601,488,064.50		2.88%	
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 842,463,948.00	06/08/2024	4.04%	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00	06/08/2024		
VALOR NETO PAGADO ACTA PARCIAL DE OBRA No. 2	$ 421,231,974.00		2.02%	
TOTAL, AVANCE FINANCIERO	$ 11,451,143,150.50			54.90%

3.3. CONTROL PRESUPUESTAL

A la fecha del presente informe se han generado dos (2) actas parciales.

ACTA No	% EJECU	FECHA	EGRESO	VALOR ACTA PAGO MENSUAL	VALOR NETO PAGO
1	5.77%	29/05/2024	EOB 26508	$ 1,202,976,129.00	$ 601,488,064.50
2	4.04%	06/08/2024	EOB 28615	$ 842,463,948.00	$ 421,231,974.00
			TOTALES	$ 2,045,440,077.00	$ 1,022,720,038.50

4. INFORMACION LEGAL

4.1. CONTROL DE LICENCIAS, PERMISOS Y LEGALIZACION DE PREDIOS

El contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023 cuenta con licencia de construcción SPIM-05-2023, con fecha 11 de diciembre de 2023. La información de la licencia de construcción está expuesta en la valla instalada por parte del consorcio HDC.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE EL PERIODO.

Durante este periodo, las constantes precipitaciones típicas de la temporada invernal han generado interrupciones significativas en las actividades de construcción. Estas condiciones climáticas han afectado especialmente la etapa de cimentación, donde las excavaciones, los rellenos y las fundiciones de concreto han sufrido retrasos debido a inundaciones recurrentes. Como resultado, se han experimentado pérdidas de tiempo considerables al tener que drenar las áreas inundadas antes de continuar con las tareas programadas. Además, el transporte de materiales hacia la obra se ha visto comprometido debido a una huelga de camioneros en la vía que conecta con el municipio de Cumaribo.


6. CONCLUSIONES

- En el presente periodo se han enviado órdenes de pago para la compra de materiales para continuar la ejecución física del contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023.

- Se genera el presente informe cumpliendo la cláusula segunda del contrato, obligación 8. *"Rendir y elaborar informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se soliciten en el desarrollo del contrato.".*

- Se hizo entrega de los elementos de protección personal al personal operativo con el que conto el consorcio HDC en el presente periodo.
- Actualmente el avance de obra ejecutado para este periodo es del 4.79% generando un avance de obra ejecutado acumulado del 15.64%. Para el presente periodo se tenía programado un avance de obra del 1.81% el cual genera un avance de obra programado acumulado del 11.05%.

- En el presente periodo se continua él envió de materiales para la ejecución de actividades contractuales.



ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS
Representante Legal
Consorcio HDC

7. ANEXOS

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG- SST

Calle 23 #6-35 – Cel: 313 420 6605 – consorciohdc23@gmail.com – Puerto Carreño - Vichada

INFORME DE SISTEMA DE GESTION Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

N° 8



CONTRATANTE:

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUAMRIBO VICHADA

CONTRATISTA

CONSORCIO HDC
NIT:901.783.555

OBJETO

CONTRATO

2374_20

Contenido

INTRODUCIÓN 4
OBJECTIVO GENERAL 5
MARCO LEGAL 5
CICLO PHV 6
Objetivos 7
Objetivos Específicos 7
ACTIVIDADES EJECUTADAS 7
AFILIACIÓN A ARL 8
ACCIDENTES DE TRABAJO 9
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 9
CHARLAS DE SEGURIDAD 11
SEGUIMIENTO AUSENTISMO LABORAL 12
NOVEDADES: 16
INSPECCION DEL USO DE EPP Y EL BUEN USO DE HERREMIENTAS 17
ALMACENAMIENTO Y ACOPIO EN LA CONSTRUCCIÓN 18
MEDIDAS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO 19
FORMATOS DE ARL 20
FORMATO DE AFILIACION A EPS 31
FORMATOS DE COMCAJA 42
PLANILLAS PAGAS 64
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES 64
PLANILLAS DEPENDIENTES 65
INCAPACIDADES 67
PLANILLAS DE CHARLAS 89

Índice de imágenes

IMAGEN 1 ENTRAGA DE EPP *10*
IMAGEN 2 ENTREGA DE EPP *10*
IMAGEN 3 ENTREGA DE EPP *10*
IMAGEN 4 ENTREGA DE EPP *10*
IMAGEN 5 CHARLA DE 5MN DE HERRAMIENTAS MANUALES *11*
IMAGEN 6 CHARLA DE 5MN DE ESTRÉS TERMICO POR CALOR EN EL TRABAJO *12*
IMAGEN 7 ESTRÉS TERMICO POR CALOR EN EL TRABAJO *13*
IMAGEN 8 CHARLA DE 5MN DE MANEJO MANUAL DE MATERIAL *13*
IMAGEN 9 CHARLA DE 5MN DE EL PELIGRO DE LA RUTINA *14*
IMAGEN 10 CHARLA DE 5MN DE EL CUIDADO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO *15*
IMAGEN 11 BUEN USO DE HERRAMIENTAS *17*
IMAGEN 12 INSPECCION DE TRABAJO *17*
IMAGEN 13 BUEN USO DE HERRAMIENTAS *17*
IMAGEN 14 BUENA POSTURA *17*
IMAGEN 15 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS *18*
IMAGEN 16 ORGANIZACIÓN DE MATERIAL *18*
IMAGEN 17 LIMPEZA DE MAQUINAS *18*
IMAGEN 18 ACOPIO DE CAJONES *18*

INDICE DE TABLAS

TABLA 1 DE ACTIVIDADES _____ *7*
TABLA 2 AFILIACION ARL _____ *8*
TABLA 3 ACCIDENTES DE TRABAJO _____ *9*
TABLA 4 ASISTENCIA DE TRABAJADORES _____ *16*

INTRODUCIÓN

El proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en las empresas del sector de la construcción y la importancia que tiene en la prevención, promoción de la salud de los trabajadores; teniendo en cuenta que es este uno de los sectores con el mayor índice de accidentabilidad y consecución de enfermedades laborales.

Partiendo del valor que tiene cada uno de los empleados en las organizaciones, se les debe suministrar una adecuada información que les permita identificar los riesgos a los que se exponen en la ejecución de sus actividades, es por ello que los empleadores deben implementar un SG-SST acorde con la naturaleza de la empresa y dando cumplimiento a los requisitos legales exigidos, de esta manera el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo no es solo una obligación legal, sino también una estrategia de gran importancia para la gestión organizacional de las empresas, la promoción de ambientes sanos y el autocuidado como valor de vida

. Esto permite que el COSORCIO HDC de cumplimiento a los establecido en la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1443 de 31 de julio 2014, el Decreto Único Reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, la Resolución 1111 de 2017, requiere brindar a sus colaboradores condiciones óptimas de trabajo y dar cumplimiento a la normatividad como la Resolución 0312 (2019) y así establecer acciones de mejora puntuales que permitan alinearse a las metas establecidas en seguridad y salud en el trabajo (SST).

OBJECTIVO GENERAL


Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades que se llevaran a cabo en el HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUAMRIBO VICHADA, llevando así la evaluación y control de los peligros, con el fin de evitar y prevenir la presencia de accidentes de trabajo, enfermedades de origen laboral y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores. teniendo en cuenta los requisitos definidos en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y velar por el bienestar de los trabajadores

MARCO LEGAL

- Ley 1295 de 1994.
- Ley 1562 de 2012.
- Decreto 0723 de 2013.
- Decreto 1443 de 2014.
- Decreto 1072 de 2015.
- Resolución 1111 de 2017.
- Resolución 0312 de 201

CICLO PHV

Teniendo en cuenta la importancia de prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a los cuales están expuestos los trabajadores, el SG-SST más que una herramienta es un conjunto de procedimientos que permite desarrollar de manera organizada, las fases de PLANEAR, HACER, VERIFICAR y ACTUAR (ciclo PHVA), de la seguridad y salud en el trabajo para el CONSORCIO HDC.

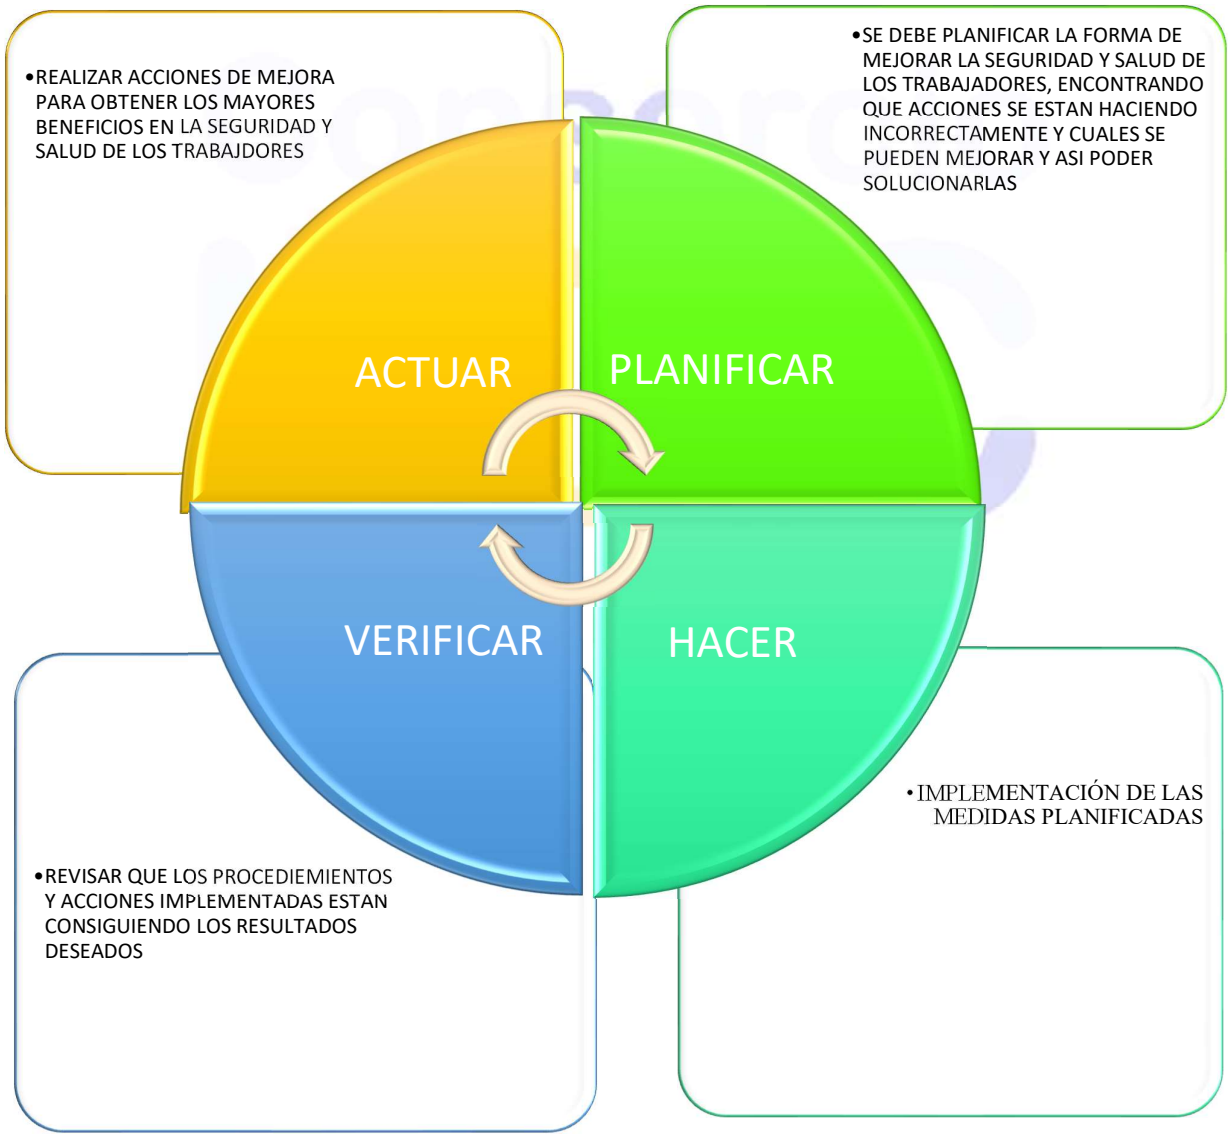

ACTIVIDADES

Objetivos

Diseñar y estructurar un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST de CONSORCIO HDC con actividades dispuestas a cumplir un alto estándar de productividad con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores. De acuerdo a las necesidades establecidas para el mejoramiento de los ambientes laborales con el cumplimiento de la normatividad legal vigente.

Objetivos Específicos

- Desarrollar las actividades de los diferentes subprogramas con el fin de mantener los ambientes labores en optas condiciones.
- Desarrollar planes de mejoras continuos con el objetivo de velar por el bienestar laboral de los colaboradores y contratistas.
- Cumplir con la normatividad legal vigente de seguridad y salud en el trabajo.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES SST
Verificación de afiliación ARL, EPS Y AFP
Reporte de accidentes laborales
Seguimientos indicadores al SST
Entrega de implementos de seguridad y dotación
Seguimiento de ausentismo laboral

TABLA 1 DE ACTIVIDADES

AFILIACIÓN A ARL

Para el CONSORCIO HDC es de gran importancia cumplir con la normatividad legal vigente en la afiliación al sistema de riesgos profesionales, cuyo fin es proteger la salud de los trabajadores y atender las contingencias derivadas de las condiciones propias del trabajo para proteger, conservar la salud y seguridad de todos los trabajadores.

Tipo Docum	Documento	Trabajador	Departamen	Municipio d	Fecha ultim	Fecha Fin V	Actividad Ec	Riesgo	Estado	Tipo vincula
CC	1193117578	DUBIER ARL	VICHADA	CUMARIBO	04/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1006951096	FABIAN RICA	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1124989245	CESAR AUG	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1136278055	YORMAN S	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
PT	7243305	JAIRO HUME	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1125003293	BRIAN FARI	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1124990124	EDWIN ANDI	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1119890549	JOSE ANTON	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1192757402	JORGE DAR	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1124990027	JHORMAN S	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente
CC	1124996599	WILSON P	VICHADA	CUMARIBO	25/07/2024		5411201	5	Activo	Dependiente

TABLA 2 AFILIACION ARL

ACCIDENTES DE TRABAJO

Para **EL CONSORCIO HDC** es de gran importancia llevar el control e información sobre sucesos peligrosos e incidentes o accidentes y así establecer medidas de prevención y control para evitar la ocurrencia de riesgos profesionales. Con esto damos a conocer el desarrollo de los acontecimientos y determinar por qué ha sucedido, para poder adoptar las medidas necesarias tendentes a que no se vuelva a repetir. Para el mes de agosto no se registró ninguna novedad de accidentes.



TABLA 3 ACCIDENTES DE TRABAJO

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CONSORCIO HDC garantiza a sus trabajadores su respectiva dotación y sus elementos de protección personal (EPP) que sea el adecuado y esté disponible, para proteger a la persona de todo peligro que pudiera causar lesión o enfermedad en sus tareas diarias. Es obligatorio que todos los trabajadores usen los equipos y vestimentas de trabajo proporcionados por la empresa. Los preserven, mantengan limpios y estén en condiciones seguras.

Los elementos de protección personal deben ser considerados como dispositivos de defensa de tipo personal, se debe concientizar a los trabajadores, que, sin el uso debido de estos elementos, están expuestos a una serie de contingencias y/o peligro.

Se hace entrega de elementos de protección a cada uno de los trabajadores del CONSORCIO HDC en el mes de agosto.



IMAGEN 2 ENTREGA DE EPP



IMAGEN 1 ENTRAGA DE EPP



IMAGEN 3 ENTREGA DE EPP



IMAGEN 4 ENTREGA DE EPP

CHARLAS DE SEGURIDAD

CHARLA DE HERRAMIENTAS MANUALES

Dentro de estas charlas abordamos el tema de herramientas manuales. Se denomina herramientas manuales o de mano al utensilio, generalmente metálico de acero, madera, fibra, plástico o goma, que se utiliza para ejecutar de manera más apropiada sencilla y con el uso de menor energía, tareas constructivas o de reparación, que solo con un alto grado de dificultad y esfuerzo se podría hacer sin ello

Causas que se provocan el mal uso de las herramientas manuales:

- Golpes y cortes por la propia herramienta.
- Lesiones oculares por proyecciones.
- Heridas punzantes.
- Machucones, cortadas y amputaciones



IMAGEN 5 CHARLA DE 5MN DE HERRAMIENTAS MANUALES

CHARLA DE ESTRÉS TERMICO POR CALOR EN EL TRABAJO

El estrés térmico por calor es la carga de calor que las personas trabajadoras reciben y acumulan en su cuerpo como resultado de la interacción entre las condiciones ambientales es del lugar donde trabajan, la actividad física que realiza y la ropa de trabajo que llevan puesta.

Causas que provocan el estrés térmico por calor en el trabajo.

- Dolor de cabeza
- Debilidad
- Fatiga
- Nauseas
- Abundante sudoración
- Confusión
- El calor excesivo.



IMAGEN 6 CHARLA DE 5MN DE ESTRÉS TERMICO POR CALOR EN EL TRABAJO

CHARLA DE MANEJO MANUAL DE MATERIAL

Implica todo aquella labor, actividad o acción realizada por un trabajador en donde principalmente utilice su fuerza humana para mover levantar, sostener, empujar y transportar un objeto pesado**.**

Causas que provocan el manejo manual de material.

- Dolores lumbares.
- Lesiones en los brazos.
- Fatiga física.



IMAGEN 8 CHARLA DE 5MN DE MANEJO MANUAL DE MATERIAL

CHARLA DE PELIGRO DE LA RUTINA

El exceso de confianza es uno de los principales factores que llevan a un accidente, porque con frecuencia realizamos trabajos de alta complejidad y con la rutina nos sentimos mas seguros de afrontar el trabajo, dejando de advertir el peligro y el riesgo que conlleva.

Causas que provocan el peligro de la rutina:

- Cortadas.
- Lesiones en los dedos.
- Golpes por herramientas.
- Resbalones por mal estado del terreno.



IMAGEN 9 CHARLA DE 5MN DE EL PELIGRO DE LA RUTINA

CHARLA DE EL AUTOCUIDADO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

El autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de las personas para elegir libremente la forma segura de trabajar, se relaciona con el conocimiento de los factores de riesgo que pueden afectar su desempeño y/o producir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Causas que con llevan el autocuidado en el ambiente de trabajo:


- Enfermedades respiratorias.
- Dolores por malas posturas.
- Cortadas por no usar los elementos epp.
- No realizar trabajos si no sabe.



IMAGEN 10 CHARLA DE 5MN DE EL CUIDADO EN EL AMBIENTE DE TRABAJO

SEGUIMIENTO AUSENTISMO LABORAL

El área SST se encarga de llevar un control de asistencia diaria del personal, esto por medio de un formato, en el cual nos ayuda a registrar el ausentismo de los trabajadores y nos permite llevar el control del indicador, que son de gran ayuda para la toma de decisiones en diferentes aspectos; para el mes de agosto se no presentaron ausencias.

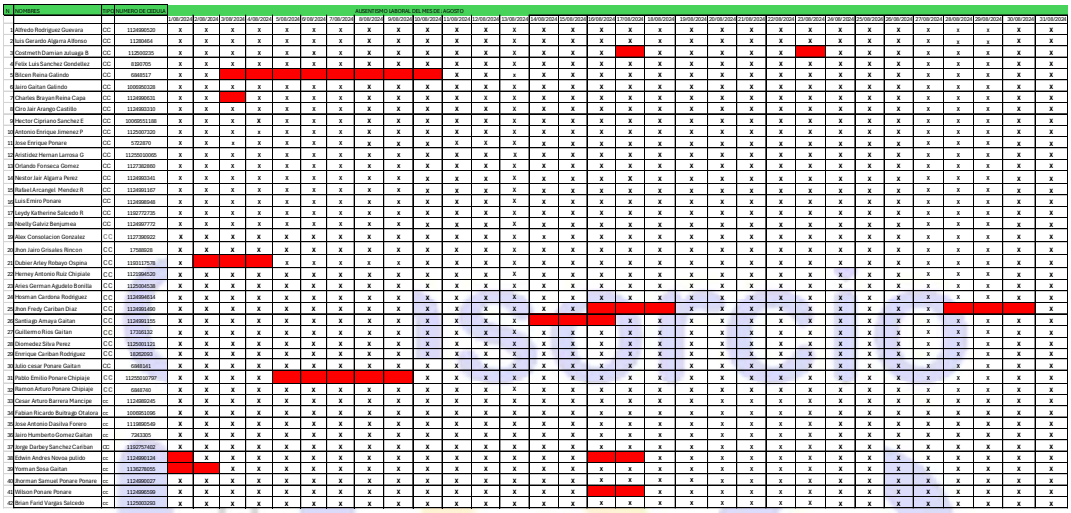

#	NOMBRES	TIPO	NUMERO DE CEDULA	AUSENTISMO LABORAL DEL MES DE AGOSTO																												
				1/08/2024	2/08/2024	3/08/2024	4/08/2024	5/08/2024	6/08/2024	7/08/2024	8/08/2024	9/08/2024	10/08/2024	11/08/2024	12/08/2024	13/08/2024	14/08/2024	15/08/2024	16/08/2024	17/08/2024	18/08/2024	19/08/2024	20/08/2024	21/08/2024	22/08/2024	23/08/2024	24/08/2024	25/08/2024	26/08/2024	27/08/2024	28/08/2024	29/08/2024	30/08/2024	31/08/2024
1	Alfredo Rodriguez Guevara	CC	1124998520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Luis Gerardo Algarra Alfonso	CC	11284664	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Costmeth Damian Jutuaga B	CC	112599235	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Felix Luis Sanchez Gendelaz	CC	8190705	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Bibian Reina Galindo	CC	6998317	x	x									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Jairo Garlan Galindo	CC	1069956328	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Charles Brayan Reina Caja	CC	1124998631	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Ciro Jair Arango Castillo	CC	1124998330	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Hector Cipriano Sanchez E	CC	1006855188	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Antonio Enrique Jimenez P	CC	1125007326	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Jose Enrique Ponare	CC	5722870	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Aristidez Herman Larrosa G	CC	1125019066	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Orlando Fonseca Gomez	CC	1127382860	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	Nestor Jair Algarra Perez	CC	1124998341	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	Rafael Arcangel Mendez R	CC	1124998187	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Luis Enrro Ponare	CC	1124998548	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17	Leydy Katherine Salcedo R	CC	1192772735	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
18	Neelly Galviz Benjumea	CC	1124997772	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
19	Alex Consetacion Gonzalez	CC	1127386922	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
20	Jhon Jairo Grisales Rincon	CC	17588826	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
21	Dubier Arley Robayo Ospina	CC	1193117539	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
22	Hernay Antonio Ruiz Chipiale	CC	1121084520	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
23	Aries German Agudelo Bonilla	CC	1125564139	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
24	Yoainan Cardona Rodriguez	CC	1124984614	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
25	Jhon Freidy Cariban Diaz	CC	1124998496	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x			
26	Santiago Amaya Garlan	CC	1124998155	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
27	Guillermo Rios Garlan	CC	17398132	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
28	Osmedez Silva Perez	CC	1125003121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
29	Enrrique Cariban Rodriguez	CC	16382503	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
30	Julio cesar Ponare Garlan	CC	6998161	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	Pablo Emilio Ponare Chipiaje	CC	1125010797	x	x	x	x						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	Ramon Arturo Ponare Chipiaje	CC	6998760	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	Cesar Arturo Barrera Mancipe	cc	1124988045	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	Fabian Ricardo Buitrago Otalora	cc	1006951096	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	Jose Antonio Dashia Forero	cc	1113985549	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	Jairo Humberto Gomez Galian	cc	7261305	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	Jorge Darbey Sanchez Cariban	cc	1122757402	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
38	Edwin Andres Novoa pulido	cc	1124998124		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
39	Yorman Sosa Galian	cc	1126276655			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
40	Aroman Samuel Ponare Ponare	cc	1124998227	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
41	Wilson Ponare Ponare	cc	1124998599	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
42	Brian Farid Vargas Salcedo	cc	1125003293	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

TABLA 4 ASISTENCIA DE TRABAJADORES

NOVEDADES:

Al final anexamos las incapacidades de los trabajadores que estuvieron incapacitados por motivos de salud.

INSPECCION DEL USO DE EPP Y EL BUEN USO DE HERREMIENTAS.

Las inspecciones en el lugar de trabajo son fundamentales para ayudar a prevenir lesiones y enfermedades, accidentes o incidentes en el trabajo. Para hacer esto, no solo es necesario detectar los peligros sino también registrarlos para que puedan corregirse. Es responsabilidad del área de seguridad y salud en trabajo (SISO) inspeccionar los ambientes laborales y de igual forma verificar el buen uso de los elementos de protección personal y las herramientas de trabajo.



IMAGEN 12 INSPECCION DE TRABAJO



IMAGEN 11 BUEN USO DE HERRAMIENTAS



IMAGEN 14 BUENA POSTURA



IMAGEN 13 BUEN USO DE HERRAMIENTAS

ALMACENAMIENTO Y ACOPIO EN LA CONSTRUCCIÓN

En el sector de la construcción, como en cualquier otra actividad laboral, el mantenimiento de unos niveles aceptables de seguridad, pasa en gran medida por conseguir unas adecuadas condiciones de orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. Todos nos hemos encontrado en alguna ocasión con situaciones de riesgo asociadas a la ausencia de orden y limpieza. Una de esas situaciones puede ser la acumulación de material sobrante o inservible.

En este sentido el artículo 10 del Real Decreto 1627/97 ya establece el mantenimiento del orden y limpieza como uno de los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra. Asimismo, cabe mencionar otras actividades claramente relacionadas con el orden y limpieza.

- Organización de formaletas y otros elementos.
- Limpieza de las herramientas de trabajo.
- Mantenimiento a las maquinas.
- Almacenamiento de tubos.



IMAGEN 16 ORGANIZACIÓN DE MATERIAL



IMAGEN 15 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS



IMAGEN 18 ACOPIO DE CAJONES



IMAGEN 17 LIMPEZA DE MAQUINAS

MEDIDAS DE CONTROL Y CUMPLIMIENTO

El CONSORCIO HDC vela por promover las actividades y el desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el fin de brindar los elementos necesarios para proteger a los trabajadores y visitantes de los diversos riesgos, logrando así la disminución de accidentes de trabajo en la labor que desempeñen, con el objetivo de aplicar los requisitos normativos, legales, contractuales que deben cumplir todos los empleados, Contratistas y terceros en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de sus actividades contractuales, deben cumplir con las normas y procedimientos de seguridad, con el fin de realizar un trabajo seguro y productivo.

Nota: dando cumpliendo a sistema de gestión y seguridad En el trabajo se comunica que se toman medidas y restricciones al ingreso de La obra;

- Es necesario el uso del siguiente equipo de protección personal (EPP) como es el casco, zapatos de seguridad.
- No está permitido zapatos abiertos con tacos, chatitas, sandalias, ropa adecuada, pantalones largos, no está permitido utilizar ropa extremadamente holgada**.**

EL NO CUMPLIMIENTO NO PODRÁ INGRESAR A LA OBRA

FORMATOS DE ARL

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **BRIAN FARID VARGAS SALCEDO** identificado con **CC** No. **1125003293**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
CONSORCIO HDC - N. 901783555	**Fecha de inicio de cobertura :** 25/07/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401017399381.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 24 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 03/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	43	04/07/2024	CC 1193117578	ROBAYO OSPINA DUBIER	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MDS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

B405C9F066C3D2641CDAC6CFAF4E2698 Certificado impreso el día 7/3/2024 4:46:47 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	49	25/07/2024	CC 1124989245	BARRERA MANCIPE CASEAR	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MRS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD8666C4A2C8326CA33745D3D3057368 Certificado impreso el día 7/24/2024 10:07:50 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	48	25/07/2024	CC 1124990124	NOVOA PULIDO EDWIN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD8666C4A2C8326CA33745D3D3057368 Certificado impreso el día 7/24/2024 10:05:08 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	50	25/07/2024	PT 7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD8666C4A2C8326CA33745D3D3057368 Certificado impreso el día 7/24/2024 10:12:07 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	52	25/07/2024	CC 1124990027	PONARE PONARE JHORMAN	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD8666C4A2C8326CA33745D3D3057368 Certificado impreso el día 7/24/2024 10:17:39 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	51	25/07/2024	CC 1192757402	SANCHEZ CARIBAN JORGE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD8666C4A2C8326CA33745D3D3057368 Certificado impreso el día 7/24/2024 10:13:46 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	47	25/07/2024	CC 1119890549	DASILVA FORERO JOSE	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD8666C4A2C8326CA33745D3D3057368 Certificado impreso el día 7/24/2024 10:03:09 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 24/07/2024

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	**Número de documento:**	901783555	**Cédula Usuario:**	CC 86072395
Nombre:	CONSORCIO HDC				
Dirección:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO				
Departamento:	VICHADA		**Municipio:**	PUERTO CARREÑO	
Correo electrónico:	CONSORCIOHDC23@GMAIL.COM				
Teléfono:	3134206605		**Tarifa:**	6.960	
Actividad Económica:	5411201 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, INCLUYE CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, REFORMA O RENOVACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES, CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 86072395	JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	53	25/07/2024	CC 1124996599	PONARE PONARE WILSON	5	6.96000	**Dependiente**

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

CD8666C4A2C8326CA33745D3D3057368 Certificado impreso el día 7/24/2024 10:20:59 PM por el portal de empresas Edesk

Consorcio HDC

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **YORMAN SOSA GAITAN** identificado con **CC** No. **1136278055**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
CONSORCIO HDC - N. 901783555	**Fecha de inicio de cobertura :** 25/07/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401017399370.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 24 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Consorcio HDC

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **FABIAN RICARDO BUITRAGO OTALORA** identificado con **CC** No. **1006951096**, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
CONSORCIO HDC - N. 901783555	**Fecha de inicio de cobertura :** 25/07/2024 **Estado Afiliación:** ACTIVO **Tipo Vinculación:** TRABAJADOR DEPENDIENTE **Clase de Riesgo:** 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401017399410.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 24 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

FORMATO DE AFILIACION A EPS

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN		CÓDIGO: AS-FR-008 VERSIÓN: 02 Vigencia: 22/12/2021

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	SOSA GAITAN YORMAN
Identificación:	CC: 1136278055
Tipo Cotizante:	Dependiente
Aportante:	CONSORCIO HDC
Municipio:	CUMARIBO
IPS Asignada:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - SEDE CUMARIBO
Estado:	Activo
Fecha de Afiliación:	2024-07-17
Regimen:	Contributivo
Fecha Aplicación Relación :	2024-07-25
Condición Discapacidad:	N
Tipo Discapacidad:	NA
Tipo Afiliación:	Por Formulario Res. 974 de 2016
Nivel :	A
Cuota moderadora :	$4.500

Observación :

Dada el lunes, 12 de agosto de 2024

Cordialmente

OSCAR FERNEY AGREDA

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contibutivo@mallamaseps.com

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 31/07/2024, el empleador CONSORCIO HDC identificado con NIT número 901783555 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
7466508	31/07/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1192757402	JORGEDARBEY SANCHEZ CARIBAN	1300000	AYUDANTE DE OBRA	2024-07-25

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 31 días del mes de Julio del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Consorcio HDC

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS "El autocuidado en salud para un buen vivir"	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN		CÓDIGO: AS-FR-008
			VERSIÓN: 02
			Vigencia: 22/12/2021

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO
Identificación:	PT: 7243305
Tipo Cotizante:	Dependiente
Aportante:	CONSORCIO HDC
Municipio:	CUMARIBO
IPS Asignada:	IPS MATAVEN SALUD SAS - PRINCIPAL
Estado:	Activo
Fecha de Afiliación:	2023-05-24
Regimen:	Contributivo
Fecha Aplicación Relación :	2024-07-25
Condición Discapacidad:	N
Tipo Discapacidad:	NA
Tipo Afiliación:	SAT Res. 768 de 2018
Nivel :	A
Cuota moderadora :	$4.500

Observación :

Dada el lunes, 12 de agosto de 2024

Cordialmente

OSCAR FERNEY AGREDA

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contibutivo@mallamaseps.com

Consorcio HDC

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN	CÓDIGO: AS-FR-008
		VERSIÓN: 02
		Vigencia: 22/12/2021

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO
Identificación:	CC: 1006951096
Tipo Cotizante:	Dependiente
Aportante:	CONSORCIO HDC
Municipio:	CUMARIBO
IPS Asignada:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - SEDE CUMARIBO
Estado:	Activo
Fecha de Afiliación:	2017-02-01
Regimen:	Contributivo
Fecha Aplicación Relación :	2024-07-25
Discapacidad:	Ninguna
Tipo Afiliación:	Masiva ley 691 de 2001
Nivel :	A
Cuota moderadora :	No Aplica

Observación :

Dada el martes, 6 de agosto de 2024

Cordialmente

OSCAR FERNEY AGREDA

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contibutivo@mallamaseps.com

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS "El autocuidado en salud para un buen vivir"	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN		CÓDIGO: AS-FR-008 VERSIÓN: 02 Vigencia: 22/12/2021

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL
Identificación:	CC: 1124990027
Tipo Cotizante:	Dependiente
Aportante:	CONSORCIO HDC
Municipio:	CUMARIBO
IPS Asignada:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - SEDE CUMARIBO
Estado:	Activo
Fecha de Afiliación:	2012-05-18
Regimen:	Contributivo
Fecha Aplicación Relación :	2024-07-25
Discapacidad:	N
Tipo Afiliación:	No registra
Nivel :	A
Cuota moderadora :	$4.500

Observación :

Dada el martes, 6 de agosto de 2024

Cordialmente

OSCAR FERNEY AGREDA

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contibutivo@mallamaseps.com

Consorcio HDC

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS "El autocuidado en salud para un buen vivir"	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN		CÓDIGO: AS-FR-008
			VERSIÓN: 02
			Vigencia: 22/12/2021

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO
Identificación:	CC: 1119890549
Tipo Cotizante:	Dependiente
Aportante:	CONSORCIO HDC
Municipio:	CUMARIBO
IPS Asignada:	IPS MATAVEN SALUD SAS - PRINCIPAL
Estado:	Activo
Fecha de Afiliación:	2017-02-01
Regimen:	Contributivo
Fecha Aplicación Relación :	2024-07-25
Discapacidad:	Ninguna
Tipo Afiliación:	Masiva ley 691 de 2001
Nivel :	A
Cuota moderadora :	$4.500

Observación :

Dada el lunes, 5 de agosto de 2024

Cordialmente

OSCAR FERNEY AGREDA

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contibutivo@mallamaseps.com

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN	CÓDIGO: AS-FR-008 VERSIÓN: 02 Vigencia: 22/12/2021

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	**BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO**
Identificación:	**CC: 1124989245**
Tipo Cotizante:	**Dependiente**
Aportante:	**CONSORCIO HDC**
Municipio:	**CUMARIBO**
IPS Asignada:	**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - SEDE CUMARIBO**
Estado:	**Activo**
Fecha de Afiliación:	**2017-02-01**
Regimen:	**Contributivo**
Fecha Aplicación Relación :	**2024-07-25**
Discapacidad:	**Ninguna**
Tipo Afiliación:	**Masiva ley 691 de 2001**
Nivel :	**A**
Cuota moderadora :	**$4.500**

Observación :

Dada el martes, 6 de agosto de 2024

Cordialmente

OSCAR FERNEY AGREDA

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contibutivo@mallamaseps.com

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 31/07/2024, el empleador CONSORCIO HDC identificado con NIT número 901783555 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
7466354	31/07/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1124990124	EDWINANDRES NOVOA PULIDO	1300000	AYUDANTE DE OBRA	2024-07-25

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 31 días del mes de Julio del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

GRAN TERRITORIO DE LOS PASTOS E.P.S. INDÍGENA MALLAMAS "El autocuidado en salud para un buen vivir"	CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN	CÓDIGO: AS-FR-008 VERSIÓN: 02 Vigencia: 22/12/2021

COORDINACION DE AFILIACIÓN Y REGISTRO

CERTIFICA :

Que el (la) señor(a):	PONARE PONARE WILSON
Identificación:	CC: 1124996599
Tipo Cotizante:	Dependiente
Aportante:	CONSORCIO HDC
Municipio:	CUMARIBO
IPS Asignada:	E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS - SEDE CUMARIBO
Estado:	Activo
Fecha de Afiliación:	2024-07-22
Regimen:	Contributivo
Fecha Aplicación Relación :	2024-07-25
Tipo Afiliación:	Por Formulario Res. 974 de 2016
Nivel :	A
Cuota moderadora :	$4.500

Observación :

Dada el martes, 27 de agosto de 2024

Cordialmente

OSCAR FERNEY AGREDA

Certficación Válida 7 Días únicamente para Servicios de Salud
E.P.S INDIGENA MALLAMAS
Carrrera 1N 4-56 Av Panamericana Ipiales - Colombia
PBX: 7731757 - 7738725 - 7738726
contibutivo@mallamaseps.com

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 31/07/2024, el empleador CONSORCIO HDC identificado con NIT número 901783555 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
7466071	31/07/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1125003293	BRIANFARID VARGAS SALCEDO	13000000	AYUDANTE DE OBRA	2024-07-25

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 31 días del mes de Julio del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/07/2024, el empleador CONSORCIO HDC identificado con NIT número 901783555 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
7350379	03/07/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1193117578	DUBIERARLEY ROBAYO OSPINA	1300000	AYUDANTE DE OBRA	2024-07-04

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Julio del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

FORMATO DE COMCAJA

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **VARGAS SALCEDO BRIAN FARID**, identificado con cédula de ciudadanía número **1125003293**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

VIGILADO Supersubsidio

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY**, identificado con cédula de ciudadanía número **1193117578**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/07/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los nueve (09) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

Supersubsidio

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES**, identificado con cédula de ciudadanía número **1124990124**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLÁUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA (Cra 12 No 96 – 23 Barrio Chicó Reservado) Teléfono (601-8418441) (Bogotá)
e-mail: (dir.admin@comcaja.gov.co) Pagina Web: www.comcaja.gov.co

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO**, identificado con cédula de ciudadanía número **1006951096**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA (Cra 12 No 96 – 23 Barrio Chicó Reservado) Teléfono (601-8418441) (Bogotá)
e-mail: (dir.admin@comcaja.gov.co) Pagina Web: www.comcaja.gov.co

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO**, identificado con cédula de ciudadanía número **7243305**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA (Cra 12 No 96 – 23 Barrio Chicó Reservado) Teléfono (601-8418441) (Bogotá)
e-mail: (dir.admin@comcaja.gov.co) Pagina Web: www.comcaja.gov.co

VIGILADO SUPERSUBSIDIO

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL**, identificado con cédula de ciudadanía número **1124990027**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

VIGILADO Supersubsidio

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **SANCHEZ CARIBAN JORGE DARBEY**, identificado con cédula de ciudadanía número **1192757402**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

VIGILADO Supersubsidio

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **DASILVA FORERO JOSE ANTONIO**, identificado con cédula de ciudadanía número **1119890549**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

VIGILADO Supersubsidio

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **PONARE PONARE WILSON**, identificado con cédula de ciudadanía número **1124996599**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

SISU 0 CCF

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **SOSA GAITAN YORMAN**, identificado con cédula de ciudadanía número **1136278055**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

VIGILADO Supersubsidio

Consorcio HDC

COMCAJA
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA

Agricultura

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA
"COMCAJA"
N.I.T No 800.231.969 – 4
DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR
NIVEL CENTRAL

CERTIFICA QUE:

Luego de revisados los registros arrojados por nuestro sistema de información sobre afiliados en el SISU, el señor **BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO**, identificado con cédula de ciudadanía número **1124989245**, aparece actualmente en estado **ACTIVO** con la Caja de Compensación Familiar Campesina 'COMCAJA' según la siguiente trayectoria de afiliación:

TRAYECTORIA DE AFILIACIÓN

NIT	RAZÓN SOCIAL	DEPARTAMENTAL	FECHA INGRESO MES/DÍA/AÑO	FECHA RETIRO MES/DÍA/AÑO
901783555	CONSORCIO HDC	VICHADA	07/25/2024	

La presente certificación se expide por el Departamento de Subsidio Familiar COMCAJA, a los quince (15) días del mes Agosto de 2024.

Cordialmente,

CLAUDIA LUCIA PINZON DOMINGUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE SUBSIDIO FAMILIAR

Elaboro: Mayerly Seas

GRADO Supersubsidio

FORMATOS EPP

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC			
NOMBRE: Dubier Arley Robayo Ospina				
CARGO Ayudante del soldador		CEDULA 1193117578		
UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS				
ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	04/07/2024	
2	Guantes	1	04/07/2024	
3	Gafas	1.	04/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas	1.	04/07/2024	
6	Arnes			
RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS				
me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social. Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.				
usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras. el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.				
fecha de entrega de elementos y compromiso:				
Firma:				

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Brian Farid Vargas Salcedo

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.125.003.293

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	23/07/2024	
2	Guantes	1.	23/07/2024	
3	Gafas	1.	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma: Brayan Farid Vargas S.

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Cesar Augusto Barrera Honcape

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.124.989.245

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	23/07/2024	
2	Guantes	1.	23/07/2024	
3	Gafas	1.	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma: Cesar Augusto B. M.

Consorcio HDC

ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Edwin Andres Novoa Pulido

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.124.990.124

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	23/07/2024	
2	Guantes	1.	23/07/2024	
3	Gafas	1	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma:

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: : Jose Antonio Dasilva Forero

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA : 1.119.890.549

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1	23/07/2024	
2	Guantes	1	23/07/2024	
3	Gafas	1	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma:

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Jairo Humberto Gomez Gaitan

CARGO Ayudante de obra | CEDULA: 7243305

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	23/07/2024	
2	Guantes	1.	23/07/2024	
3	Gafas	1	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma: Jairo Humberto Gomez Gaitan

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Yorman Soso Gaitan

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.136.278.055

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1	23/07/2024	
2	Guantes	1	23/07/2024	
3	Gafas	1	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma: yorman

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Wilson Ponare Ponare

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.124.996.599

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	23/07/2024	
2	Guantes	1.	23/07/2024	
3	Gafas	1.	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma:

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Fabian Ricardo Buitrago Otalora

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.006.951.096

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	23/07/2024	
2	Guantes	1.	23/07/2024	
3	Gafas	1.	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma:

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Jharman Samuel Ponare Ponare

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.124.990.027

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1	23/07/2024	
2	Guantes	1	23/07/2024	
3	Gafas	1	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma:

Consorcio HDC

Consorcio HDC	ENTREGA DE DOTACION EPP CONSORCIO HDC

NOMBRE: Jorge Darbey Sanchez Carbon

CARGO: Ayudante de obra | CEDULA: 1.192.757.402

UNIDADES DE DOTACION ENTREGADAS

ITEM	DOTACION ENTREGADA	CANTIDAD	FECHA	OBSERVACIONES
1	Casco	1.	23/07/2024	
2	Guantes	1	23/07/2024	
3	Gafas	1.	23/07/2024	
4	Tapa oidos			
5	Tapa bocas			
6	Arnes			

RECUERDE QUE PARA EL CAMBIO DE DOTACION ES NECESARIO ENTREGAR LOS USADOS

me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal y dotacion en buen estado, dando el cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuye al bienestar fisico, psicologico y social.
Declaro que he recibido informacion sobre el uso adeacuado de los mismos.

usando los equipos y elemntos de proteccion personal y dotacion esta dando cumplimiento a sus deberes como trabajador definidos en la ley a ravez de la siguiente normatividad: codigo sustantivo del trabajo, ley 9 de 1979, decreto 1295 de 1994, entre otras.
el presente compromiso queda pactado y de no ser cumplido se presta a ver implicado en faltas disciplinarias dentro del consorcio HDC.

fecha de entrega de elementos y compromiso:

Firma: Jorge Sanchez

PLANILLAS PAGAS
DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor	
2024-07	2024-07	83969407	947125000	I	2024/08/12	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	$741,000	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1122118138	HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA																	231001	30	$2,600,000	$416,000	EPS005	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	No	$741,000
Total	Afiliados(1)																					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$741,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122118138		HERNANDEZ SABOGAL EDITH YOLANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13A 32 41 BRR NUTIBARA	ACACIAS-META	3112454198	No


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-07	2024-07	83969407	947125000	I	2024/08/12	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	$741,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$416,000	$0	$0	$416,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$416,000	$0	$0	$416,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				1	$741,000	$0	$0	$741,000

PLANILLAS DEPENDIENTES

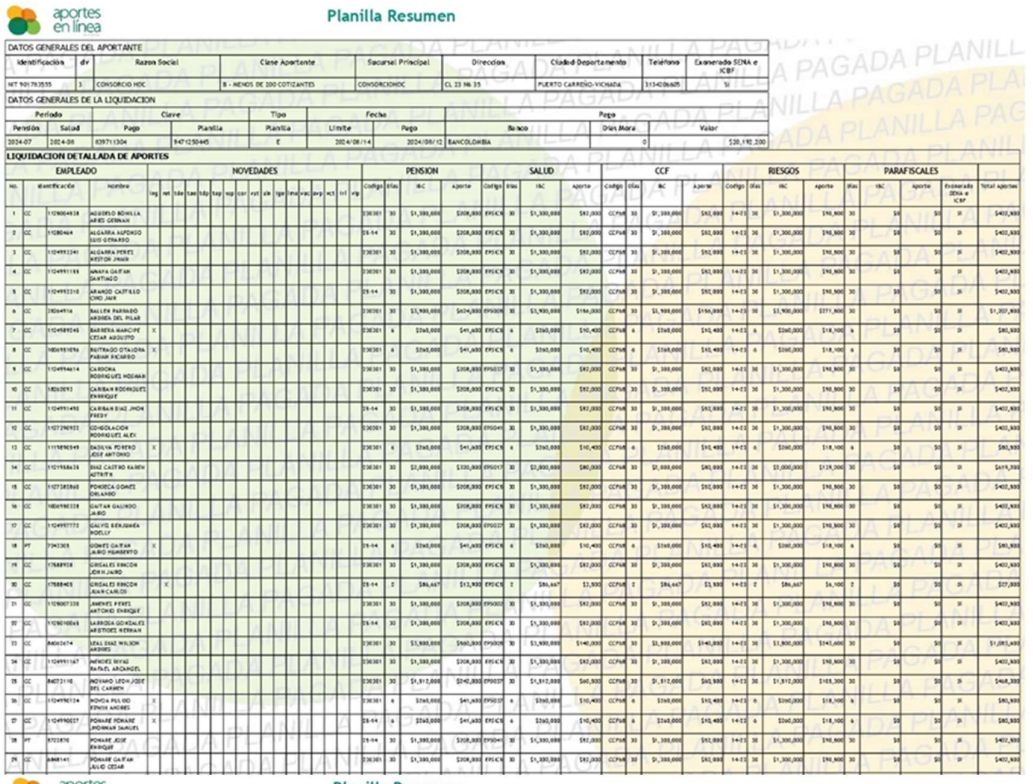

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901793555	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 96 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3134086635	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite Pago	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	83971304	947125945	E	2024/08/14	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	538,192,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES


No.	EMPLEADO			NOVEDADES																			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
		Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	irl	vac	avp	ect	inf	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1120064838	AGUDELO ROMILLA ARIEL GERMAN																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	$0	$0	SI	$402,800
2	CC	1120064064	ALGARRA ALFONSO LUIS GERARDO																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
3	CC	1124932241	ALGARRA PEREZ HECTOR JHAIR																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
4	CC	1124951188	ARAFA GAITAN SANTIAGO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
5	CC	1124952310	ARANGO CASTILLO CHO JAIR																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
6	CC	1026049116	BALLEN PARRADO ARDIRA DEL PILAR																		03030	30	$3,900,000	$624,000	09SGEN	30	$3,900,000	$156,000	CCFM	30	$3,900,000	$156,000	14-03	30	$3,900,000	$371,800	30	$0	$0	SI	$1,307,800
7	CC	1124989240	BARRERA MARCIPE CESAR AUGUSTO	X																	03030	6	$260,000	$41,600	03ICBX	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
8	CC	1006951696	BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO	X																	03030	6	$260,000	$41,600	03ICBX	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
9	CC	1124996614	CARDONA RODRIGUEZ NOEMAR																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
10	CC	1026130193	CARIBAN RODRIGUEZ ENRRIQUE																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
11	CC	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
12	CC	1122769925	CONSOLACION RODRIGUEZ ALEX																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
13	CC	1115876549	DAZOVA PERTUZ JOSE ANTONIO	X																	03030	6	$260,000	$41,600	03ICBX	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
14	CC	1121958636	DIAZ CASTRO KAREN ESTHER																		03030	30	$2,080,000	$332,800	09SGEN	30	$2,080,000	$83,200	CCFM	30	$2,080,000	$83,200	14-03	30	$2,080,000	$129,500	30	$0	$0	SI	$619,300
15	CC	1123738868	FONSECA GOMES DIMANDO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
16	CC	1006998328	GAITAN GALINDO JAIRO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
17	CC	1124997770	GALVIS BERMUDEZ ROELLY																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
18	PT	7343305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO	X																	04-04	6	$260,000	$41,600	03ICBX	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
19	CC	1768898	GRISALES RINCON JOHN JAIRO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
20	CC	1768898	GRISALES RINCON JUAN CARLOS	X																	04-04	7	$86,667	$13,900	03ICBX	7	$86,667	$3,500	CCFM	7	$86,667	$3,500	14-03	7	$86,667	$6,100	7	$0	$0	SI	$27,000
21	CC	1120807330	JIMENEZ PEREZ ANTONIO ENRIQUE																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
22	CC	1124010065	LABRADA GONZALEZ ARISTIDES HERNAN																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
23	CC	8600674	LEAL DIAZ WILSON ANDRES																		03030	30	$3,900,000	$560,000	09SGEN	30	$3,900,000	$140,000	CCFM	30	$3,900,000	$140,000	14-03	30	$3,900,000	$343,600	30	$0	$0	SI	$1,083,600
24	CC	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
25	CC	8602110	MOYANO LEON JOSE DEL CARMEN																		03030	30	$1,512,000	$242,880	09SGEN	30	$1,512,000	$60,500	CCFM	30	$1,512,000	$60,500	14-03	30	$1,512,000	$168,300	30	$0	$0	SI	$468,380
26	CC	1124976124	MUNOZ PULIDO EDWIN ANDRES	X																	03030	6	$260,000	$41,600	09SGEN	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
27	CC	1124990027	PONARE ROMARE JHONNAR SAMUEL	X																	04-04	6	$260,000	$41,600	03ICBX	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
28	PT	9722870	PONARE JOSE ENRIQUE																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
29	CC	8600141	PONARE GAITAN ALEX CESAR																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800

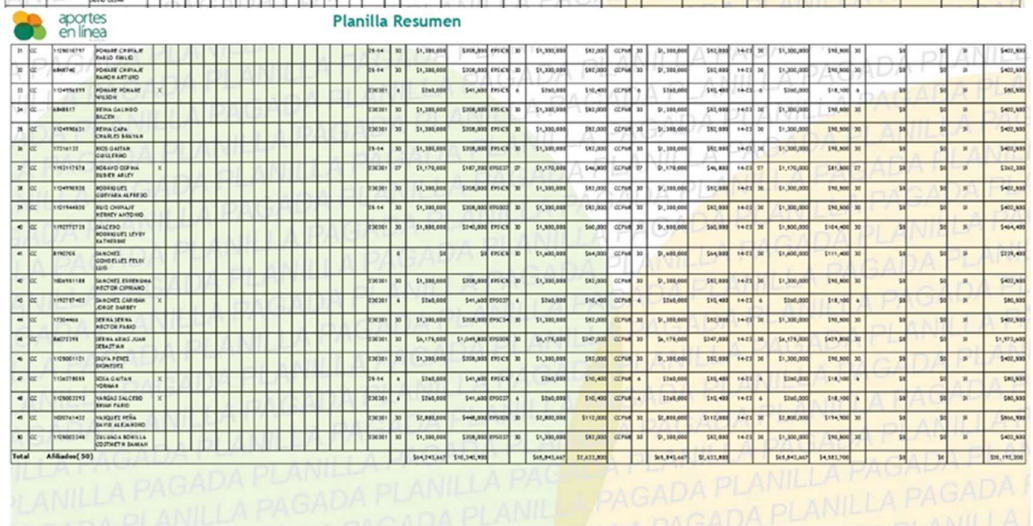

aportes en línea

Planilla Resumen

31	CC	1120074797	PONARE CARVAJLIE PABLO EMILIO																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
32	CC	6868740	PONARE CARVAJLIE RAMON ARTURO																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
33	CC	1124956599	PONARE PONARE WILSON	X																	03030	6	$260,000	$41,600	03ICBX	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
34	CC	8868817	REINA GALINDO BALCEN																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
35	CC	1124996631	REINA CAPA CHARLES BASILIO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
36	CC	1726132	RIOS GAITAN GUILLERMO																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
37	CC	1192117678	ROSARIO OSPINA DIDIER ARLEY	X																	03030	27	$1,170,000	$187,200	09SGEN	27	$1,170,000	$46,800	CCFM	27	$1,170,000	$46,800	14-03	27	$1,170,000	$81,500	27	$0	$0	SI	$362,300
38	CC	1124976520	RODRIGUEZ CURIYAKA ALFREDO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	03ICBX	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
39	CC	1121944030	RUIZ CHAPALIE HENRRY ANTONIO																		04-04	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
40	CC	1192777735	SALCEDO RODRIGUEZ LEYDY KATHERINE																		03030	30	$1,800,000	$240,000	09SGEN	30	$1,800,000	$60,000	CCFM	30	$1,800,000	$60,000	14-03	30	$1,800,000	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
41	CC	8740765	SANCHEZ GONDELUIS FELIX LUIS																			0	$0	$0	09SGEN	30	$1,600,000	$64,000	CCFM	30	$1,600,000	$64,000	14-03	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	SI	$239,400
42	CC	1004951188	SANCHEZ RIVERIRA HECTOR CIPRIANO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
43	CC	1192757402	SANCHEZ CARIBAN JORGE DARREY	X																	03030	6	$260,000	$41,600	09SGEN	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
44	CC	1730446	SERNA SERNA HECTOR FABIO																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09NOV	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
45	CC	8602398	SERNA ARIAS JUAN SEBASTIAN																		03030	30	$6,179,000	$1,049,800	09SGEN	30	$6,179,000	$247,000	CCFM	30	$6,179,000	$247,000	14-03	30	$6,179,000	$469,800	30	$0	$0	SI	$1,913,600
46	CC	1120051121	SILVA PEREZ JHONFERS																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
47	CC	1126078069	SOSA GAITAN YOMAR	X																	04-04	6	$260,000	$41,600	03ICBX	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
48	CC	1120002193	VARGAS SALCEDO BRIAN FABIO	X																	03030	6	$260,000	$41,600	09SGEN	6	$260,000	$10,400	CCFM	6	$260,000	$10,400	14-03	6	$260,000	$18,500	6	$0	$0	SI	$80,900
49	CC	1020741403	VASQUEZ PEÑA DAVID ALEJANDRO																		03030	30	$2,800,000	$448,000	09NOV	30	$2,800,000	$112,000	CCFM	30	$2,800,000	$112,000	14-03	30	$2,800,000	$174,900	30	$0	$0	SI	$846,900
50	CC	1120001349	ZULUAGA ROMILLA JUDITHETH DAMIAN																		03030	30	$1,300,000	$208,000	09SGEN	30	$1,300,000	$52,000	CCFM	30	$1,300,000	$52,000	14-03	30	$1,300,000	$98,800	30	$0	$0	SI	$402,800
Total		Afiliados(50)																					$64,845,667	$10,340,900			$65,845,667	$2,633,800			$65,845,667	$2,633,800			$65,845,667	$4,583,700	$0	$0		$86,197,300

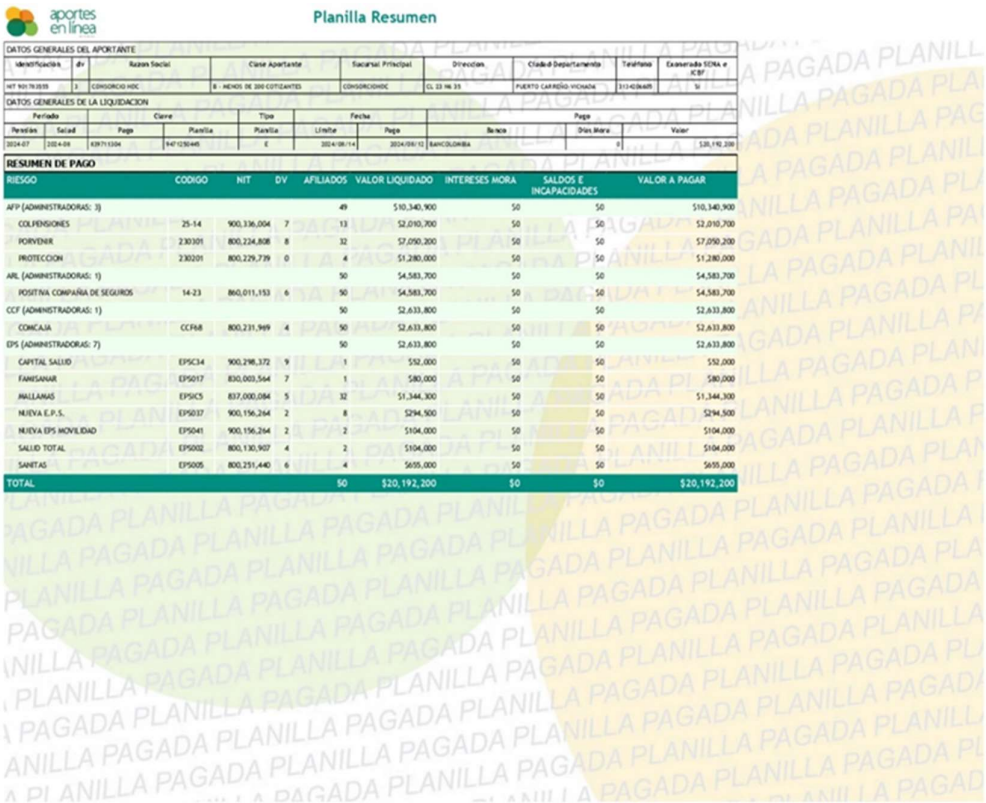

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901793535	3	CONSORCIO HDC	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIOHDC	CL 23 96 35	PUERTO CARREÑO-VICHADA	3124036685	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	43971304	947125044S	E	2024/08/14	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	20,192,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				49	$10,340,900	$0	$0	$10,340,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$2,010,700	$0	$0	$2,010,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$7,050,200	$0	$0	$7,050,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,280,000	$0	$0	$1,280,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$4,583,700	$0	$0	$4,583,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	$4,583,700	$0	$0	$4,583,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	$2,633,800	$0	$0	$2,633,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	50	$2,633,800	$0	$0	$2,633,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				50	$2,633,800	$0	$0	$2,633,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	32	$1,344,300	$0	$0	$1,344,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$294,500	$0	$0	$294,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$655,000	$0	$0	$655,000
TOTAL				$0	$20,192,200	$0	$0	$20,192,200

2024/08/26 10:50 AM

INCAPACIDADES

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE: AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)

Atencion: 54
Fecha: Ago.14/2024

Nombre:	AMAYA GAITAN SANTIAGO	Edad:	37 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3222921409	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1124991155	Id:	CC 1.124.991.155		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	11:12		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

ANAMNESIS

Motivo de Consulta: TENGO TOS Y FIEBRE

Enfermedad Actual: USUARIO DE 37 AÑOS, ACUDE POR PRESENTAR SINTOMAS GRIPALES DADO POR TOS, FIEBRE, ESCALOFRIOS, DOLOR DE CABEZA Y ARTICULAR, MALESTAR GENERAL. SINTOMAS DESDE HACE 2 DIAS. NIEGA OTROS SINTOMAS.

Revision por Sistemas: FIEBRE.

Antecedentes:

Personales: TOXICO-ALERGICOS: NIEGA CONOCIDOS. GASTROINTESTINALES: GASTRITIS. QUIRURGICOS: CALCULOS DE VESICULA BILIAR.. OTRAS ENFERMEDADES: NO MANFIESTA PATOLOGIAS ASOCIADAS. RESPIRATORIOS: NIEGA. INGESTION DE MEDICAMENTOS: NIEGA. PATOLOGICOS: NIEGA

Familiares: OTRAS ENFERMEDADES: NO REIFERE ANTECEDENTES PATOLOGICÓS FAMILIARES ASOCIADOS

Psico-Sociales: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Examen Fisico:

Estado General: BUENO

Signos Vitales: Peso: 79.00 KG Kg, Talla: 151 Mts, IMC: 34,64, Clasificacion: Obesidad Grado I, Riegos: Moderado, Pulso: 87 Xm, Frecuencia Cardiaca: 87 Xm, Ritmo Cardiaco: NORMAL, Frecuencia Respiratoria: 21, P.Sistolica: 90, P.Diastolica: 60, P.Arterial Media: 70, Temperatura: 36, Sitio de toma: AXILAR.

Aparatos y Sistemas: PIEL Y FANERAS: NORMAL,. CABEZA: NORMAL,. OJOS: NORMAL,. OIDOS: NORMAL,. BOCA: NORMAL,. GARGANTA: NORMAL,. CUELLO: NORMAL,. TORAX: NORMAL,. SIST.RESPIRATORIO: NORMAL,. SIST.CARDIOVASCULAR: NORMAL,. SIST.VASCULAR PERIFERICO: NORMAL,. ABDOMEN: NORMAL,. SIST.GENITOURINARIO: NORMAL,. TACTO RECTAL: NORMAL,. SIST.LOCOMOTOR: NORMAL,. SIST.NEUROLOGICO: NORMAL,. EX.GANGLIONAR: NORMAL,. EX.MENTAL: NORMAL,. OTROS: NORMAL,. NARIZ: NORMAL,

Paraclinicos:

Laboratorio: NO PRESENTA

Pagina: 1 de 3 Imprime: CRA	Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma
Fecha Sistema:14/08/2024 Hora:15:16:20	Cedula: 80.063.856 Registro:	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE: AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)

Atencion: 54
Fecha: Ago.14/2024

Nombre:	AMAYA GAITAN SANTIAGO	Edad:	37 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3222921409	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1124991155	Id:	CC 1.124.991.155		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	11:12		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

Otros: NO PRESENTA

Concepto Medico: EXAMEN FISICO: NORMOCEFALO, PUPILAS ISOCORICAS NORMOREACTIVAS A LA LUZ, CUELLO MOVIL SIN ADENOPATIAS, OROFAINGE NORMAL, SIN PLACAS EN AMIGDALINAS. TORAX SIMETRICO NORMOEXPANSIBLE, PULMONES CLAROS BIEN VENTILADOS SIN AGREGADOS, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS SIN SOPLOS, ABDOMEN BLANDO DEPRESIEBLE SIN DOLOR A LA PALPACION, GU: NORMOCONFIGURADO PARA SEXO Y EDAD, EXT: EUTROFICAS SIN EDEMA, SNC: SIN DEFICIT APARENTE. USUARIO CON IRA ALTA NO COMPLICADA, PERO CON TOMA DEL ESTADO GENERAL Y CON DOLOR DOLOROSA. SE INICIA MANEJO DEL CUADRO CLINICO. SE ORDENAN PARACLINICOS Y SE DA INCAPACIDAD POR 3 DIAS.

Diagnostico: Dx.Principal: J069-INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESP, Dx.Relacionado1: L309-DERMATITIS, NO ESPECIFICADA, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: CONFIRMADO NUEVO, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Obs del Dx: .

Finalidad: Fuente de información: EL MISMO, Finalidad Causa: NO APLICA, Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL, Sintomatico o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Conductas: Se envia:

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - W01 95709 - Ago.14/2024
1. ACETAMINOFEN TAB. 500 MG - TAB., Via:ORAL, Cantidad:40, Dosis:2 TABLETA CADA 8 HORAS.
2. ASCORBICO ACIDO 500 MG TAB (MERCK) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:10, Dosis:1 TABLETA CADA DIA.
3. DIHIDROCODEINA JBE 12,1 MG/ - FCO X 120ML, Via:ORAL, Cantidad:2, Dosis:10 ML CADA 6 HORAS.
4. JERINGA DESECHABLE 10 ML - UNIDAD, Via:NO APLICA, Cantidad:1, Dosis:-.
5. BETAMETASONA CREMA 0.05 % T x 40 G(PENTACOOP) -, Via:TOPICO, Cantidad:1, Dosis:APLICAR CADA 12 HORAS.
6. CLOTRIMAZOL CREMA TOPICA 1% (LAFRANCOL) - TUBO X 40G, Via:TOPICO, Cantidad:1, Dosis:APLICAR MEZCLADA CON CLOTRIMAZOL..
7. SALES DE REHIDRAT. POLVO P RECONST.(LABINCO) - POLVO P RECONSTRUIR, Via:ORAL, Cantidad:3, Dosis:DILUIR 1 SOBRE EN 1 LITRO DE AGUA HERVIDA. TOMAR 200 ML CADA 1 HORA.

ORDEN DE LABORATORIO - W05 39364 - Ago.14/2024

Pagina: 2 de 3 Imprime: CRA	Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma
Fecha Sistema:14/08/2024 Hora:15:16:20	Cedula: 80.063.856 Registro:	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE: AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)

Atencion: 54
Fecha: Ago.14/2024

Nombre:	AMAYA GAITAN SANTIAGO	Edad:	37 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3222921409	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1124991155	Id:	CC 1.124.991.155		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	11:12		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

1. HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO -, Cantidad:1, Obs:.
2. HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA -, Cantidad:1, Obs:.

RECOMENDACIONES - W10 157236 - Ago.14/2024
1. Evitar cambios bruscos de temperatura (Exceso de Frio corrientes de aire).
2. Si utiliza oxigeno: Colocarse el oxigeno durante la noche y en el dia en el horario indicado por el médico.
3. Realizar las inhalaciones con la cámara y en los horarios indicados por el médico.
4. Realizar 5 series de ejercicios fortalecimiento toráxico, 3 veces al dia.
5. En momentos de crisis de dificultad respiratoria incrementar las inhalaciones según lo indicado por el médico.
6. Dormir cómodamente con almohada alta o con la cabecera de la cama elevada comodamente.
7. No dejar acabar los medicamentos, solicitarlos oportunamente en atención médica.
8. Evitar consumir alimentos fríos o helados.
9. No fumar, ni exponerse al cigarrillo o humo.

INCAPACIDADES - W16 3205 - Ago.14/2024
Dias: 3 Prorroga: N Fecha Inicial: Ago.14/2024 Fecha Final: Ago.16/2024 Tipo: ENFERMEDAD GENERAL Observaciones: INCAPACIDAD MEDICA POR 3 DIAS.

DX: INFECCION RESPIRATORIA AGUDA.

Pagina: 3 de 3 Imprime: CRA	Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma
Fecha Sistema:14/08/2024 Hora:15:16:20	Cedula: 80.063.856 Registro:	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 3205
Fecha: Ago.14/2024

Nombre:	AMAYA GAITAN SANTIAGO	Edad:	37 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3222921409	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1124991155	Id:	CC 1.124.991.155		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT	Nro Aten:	54		
T.Atencion:	AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)	Codigo Dx:	J069 - L309		

Dias de incapacidad:	3	Fecha Inicial:	Ago.14/2024
Es una prorroga?:	NO	Fecha Final:	Ago.16/2024
Tipo de incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL		

Observaciones: INCAPACIDAD MEDICA POR 3 DIAS.

DX: INFECCION RESPIRATORIA AGUDA.

Firma usuario: _____ Cedula:		Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma
Fecha Sistema:14/08/2024 Hora:11:33:48	Pagina: 1 de 1 Imprime: CRA	Cedula: 80.063.856 Registro:	

Consorcio HDC

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE: **PACIENTE EN TRATAMIENTO - ODONTOLOGIA GENERAL**

Atencion: 15
Fecha: Ago.05/2024

Nombre:	NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES	Edad: 38 Años	Sexo: MASCULINO
Telefono:	3112415123	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1
Historia:	1124990124	Id: CC	1.124.990.124
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	16:35
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO PGP INT		

ANAMNESIS

Motivo de Consulta: "VENGO PARA QUE ME SAQUE UNA MUELA"

Enfermedad Actual: 05/08/2024 HISTORIA CLINICA DE ATENCION REMDADA EN LA ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SEDE CUMARIBO VICHADA CONSULTORIO ODONTOLOGICO NUMERO 1 PACIENTE DE GENERO MASCULINO DE 38 AÑOS DE EDAD, RESIDENTE DEL BARRIO ALCANAVAN QUE ASISTE AL SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL ASINTOMATICO, PARA VALORACION ODONTOLOGICA E INICIO DE TRATAMIENTO REQUERIDO.

Antecedentes:

Medico-Odontologicos: OTRAS ENFERMEDADES: NIEGA ANTECIENTES. EXODONCIAS: MULTIPLES EXODONCIA

Familiares: OTRAS ENFERMEDADES: NIEGA ANTECIENTES

Hallazgos Clinicos: A EL EXAMEN CLÍNICO ESTOMATOGNÁTICO EL PACIENTE PRESENTA MUCOSA LISA BRILLANTE BIEN VASCULARIZADA, PAPILAS LINGUALES SIN ALTERACIÓN ALGUNA, PLACA BLANDA GENERALIZADA ENCÍA MARGINAL LEVEMENTE INFLAMADA PRESENCIA DE MÚLTIPLES CARIES ACTIVAS CON DESTRUCCIÓN CORONAL Y EXPOSICIÓN PULBAR.

Lectura Radiografica: NO FUERA DE SERVICIO.

Diagnostico: Dx.Principal: 2012-EXAMEN ODONTOLOGICO, Dx.Relacionado1: K021-CARIES DE LA DENTINA, Dx.Relacionado2: K083-RAIZ DENTAL RETENIDA, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: IMPRESION DIAGNOSTICA, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Pronostico: MALO, Obs del Dx: PRESENTA MUCOSA LISA BRILLANTE BIEN VASCULARIZADA, PAPILAS LINGUALES SIN ALTERACIÓN ALGUNA, PLACA BLANDA GENERALIZADA ENCÍA MARGINAL LEVEMENTE INFLAMADA PRESENCIA DE MÚLTIPLES CARIES ACTIVAS CON DESTRUCCIÓN CORONAL Y EXPOSICIÓN PULBAR.

Finalidad: Fuente de información: PACIENTE, Finalidad Causa: NO APLICA, Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL, Sistomatico o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Procedimiento Realizado: SE VERIFICA CONDICION SISTEMICA DEL PACIENTE. TOMA DE PRESION ARTERIAL. APLICACION DE ANESTESIA TOPICA (BENZOCAINA AL 20%) SOBRE EL SURCO YUGAL Y DEJAR ACTUAR DURANTE 1 MINUTO, APLICACION DE ANESTESIA CON LIDOCAINA AL 2% CON EPINEFRINA AL 1:80.00, TEST DE ANESTESIA, SINDESMOTOMIA DE DIENTE 47 LUXACION Y EXTRACCION, LIMPIEZA DE ALVEOLO, CONFORMACION DE FORMACION DE COAGULO EN ALVEOLO, COMPRESIÓN CON GASAS. DEPOSITO DE GELAMTAP EN EL ALVEOLO, SE LE MUESTRA AL PACIENTE QUE EL DIENTE SALIO COMPLETO. SE EXPLICA EL MANEJO DEL GELAMTAP EXPLICANDO QUE NO LO DEBE RETIRAR YA QUE ESTE AYUDA A LA FORMACION DEL COAGULO Y QUE ESTE SE DESCOMPONE EN TRES DIAS APROXIMADAMENTE Y NO ES NECESARIO SACARLO, SE DAN RECOMENDACIONES POST-EXODONCIA VERBALES Y ESCRITAS.

EL PACIENTE SE RETIRA EN BUENAS CONDICIONES GENERALES

RECOMENDACIONES:
TOMAR LOS MEDICAMENTOS EN LOS HORARIOS ESTABLECIDOS.
NO ENJUAGUES LARGOS VIGOROSOS AL SOL.
NO CONSUMIR ALIMENTOS CALIENTES, ACIDOS O SALADOS.
DIETA BLANDA.
EN CASO DE SANGRADO MORDER UNA GASA DURANTE 15 MINUTOS.
HIELO LOCAL EN LA ZONA.
NO CONSUMIR ALCOHOL, NI TABACO.
REALIZAR ADECUADA HIGIENE ORAL.
NO REALIZAR ENJUAGUES DE NINGUN TIPO LOS PRIMEROS DOS DIAS
NO INTRODUCIR PALILLOS, COPITOS, AGUJAS O LA LENGUA EN EL ALVEOLO.
EN CASO DE SER SUTURADO LA SUTURA ES REABSORVIBLE, EL DECIR, NO ES NECESARIO RETIRARLA YA QUE ELLA SE DEGRADA CON EL TIEMPO

TOMAR UNA CAPS CADA 8 HORAS POR 7 DIAS
TOMAR UNA TAB CADA 6 HORAS POR 5 DIAS


HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: PACIENTE EN TRATAMIENTO - ODONTOLOGIA GENERAL
Atencion: 15
Fecha: Ago.05/2024
Nombre: NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES | Edad: 38 Años | Sexo: MASCULINO
Telefono: 3112415123 | Estrato: CONTRIBUTIVO-1
Historia: 1124990124 | Id: CC 1.124.990.124
Estado Civil: UNIÓN LIBRE | Hora Ate: 16:35
Entidad: NUEVA EPS CONTRIBUTIVO PGP INT

Conducta: Se envia:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: PACIENTE EN TRATAMIENTO - ODONTOLOGIA GENERAL
Atencion: 15
Fecha: Ago.05/2024
Nombre: NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES | Edad: 38 Años | Sexo: MASCULINO
Telefono: 3112415123 | Estrato: CONTRIBUTIVO-1
Historia: 1124990124 | Id: CC 1.124.990.124
Estado Civil: UNIÓN LIBRE | Hora Ate: 16:35
Entidad: NUEVA EPS CONTRIBUTIVO PGP INT

ODONTOGRAMA PROCEDIMIENTO:

Caries	Obturación Buena	Obturación a Cambiar	Endodoncia Presente	Endodoncia a Realizar	Indicativo a Realizar	Angulo a Realizar	Sin Registrar	Extraido	Caries Detectada
Endodonci a Simple	Endodoncia Abierta	Sellante a Realizar	Sellante Presente	Diente Sano	Corona en Buen Estado	Corona en Mal Estado	Erosión o Abrasión	Caries Incipiente	



Diente	Superficie	Hombre	Fecha	Profesional

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: PACIENTE EN TRATAMIENTO - ODONTOLOGIA GENERAL
Atencion: 15
Fecha: Ago.05/2024
Nombre: NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES | Edad: 38 Años | Sexo: MASCULINO
Telefono: 3112415123 | Estrato: CONTRIBUTIVO-1
Historia: 1124990124 | Id: CC 1.124.990.124
Estado Civil: UNIÓN LIBRE | Hora Ate: 16:35
Entidad: NUEVA EPS CONTRIBUTIVO PGP INT

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - MO1 95521 - Ago.05/2024
1. AMOXICILINA 500MG CAP. (LASANTE) - CAPSULA, Via:ORAL, Cantidad:21, Dosis:TOMAR UNA CAPSULA CADA 8 HORAS DURANTE 9 DIAS.
2. ACETAMINOFEN TAB. 500 MG - TAB., Via:ORAL, Cantidad:21, Dosis:TOMAR 1 TABLITA CADA 8 HORAS DURANTE 9 DIAS.

ORDEN PROCEDIMIENTOS/ACTIVIDADES POS - MO5 25271 - Ago.05/2024
1. CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ODONTOLOGIA GENERAL -, Cantidad:1, Obs:.
2. EXODONCIA DE DIENTE PERMANENTE MULTIRADICULAR -, Cantidad:1, Obs:DIENTE 47.

RECOMENDACIONES - W10 156834 - Ago.05/2024
1. EVITAR EXPOSICION AL SOL. NO REALIZAR EJERCICIOS FISICOS DURANTE LOS PRIMEROS DIAS
2. DIETA BLANDA. EL PRIMER DIA DIETA FRIA
3. NO SALIVAR CONSTANTEMENTE NI REALIZAR BUCHES NI ENJUAGUES, YA QUE PUEDE PRODUCIR HEMORRAGIA O RETARDAR CICATRIZACION
4. TOMAR MEDICAMENTOS FORMULADOS POR EL ODONTOLOGO, NO CAMBIARLOS. NO INGERIR ASPIRINA YA QUE PUEDE GENERAR HEMORRAGIA
5. COLOCAR HIELO LOCAL DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS (CADA HORA DURANTE 10 MINUTOS)
6. SI HAY INFLAMACION DESPUES DE 24 HORAS, APLICAR CALOR HUMEDO (COMPRESAS DE AGUA CALIENTE)
7. MANTENER HIGIENE ORAL RIGUROSA PARA EVITAR INFECCIONES, TENIENDO CUIDADO DE NO LASTIMARSE
8. NO FUMAR NI INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS DURANTE LOS PROXIMOS 8 DIAS
9. EN CASO DE HEMORRAGIA, PRESIONAR LA ZONA CON GASA HUMEDA, DE CONTINUAR SANGRADO ACUDIR AL HOSPITAL
10. SI SE LE COLOCARON PUNTOS, CONSULTAR PARA RETIRARLOS EN 8 DIAS (NO REQUIERE CITA)

CERTIFICADOS MEDICOS - W17 5225 - Ago.05/2024
PACIENTE ASISTE A CONSULTA ODONTOLOGICA PARA REALIZARSE EXTRACCION DEL 47 .ES REALIZA SE LE RECOMIENDA 3 DIAS DE REPOSO ,NO HACER ESFUERZO ,NO ESCUPIR, NO ESTAR HABLANDO.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

CERTIFICADOS MEDICOS
Especialidad Solicitada:
-

Docto Nro: W17 5225
Fecha: Ago.05/2024

Código: Versión:

Nombre:	NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES	Edad:	38 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3112415123	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1124990124	Id:	CC 1.124.990.124		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO PGP INT	Nro Aten:	15		
T.Atencion:	PACIENTE EN TRATAMIENTO - ODONTOLOGIA GENERAL	Codigo Dx:	Z012 - K021 - K083		

Observaciones: PACIENTE ASISTE A CONSULTA ODONTOLOGICA PARA REALIZARSE EXTRACCION DEL 47 .SE REALIZA SE LE RECOMIENDA 3 DIAS DE REPOSO ,NO HACER ESFUERZO ,NO ESCUPIR, NO ESTAR HABLANDO.

Firma usuario: Cedula:		Medico:RUDAS BRANGO NESTOR LUIS	Firma
Fecha Sistema:05/08/2024 Hora:17:02:45	Pagina: 1 de 1 Imprime: CRA	Cedula: 15.705.360 Registro:	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4			
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS	Docto Ing:	X83	38679
	Fecha Ing:	Ago.02/2024	

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	17:01		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS				

DATOS DE INGRESO

ANAMNESIS

Datos de Llegada Del Paciente: Llego por sus propios medios?: SI, Por cual Medio: CAMIANNDO, Estado de Llegada: CONSCIENTE, Estado de Embriaguez: NO.

En Caso De Accidente,Intoxicacion O Violencia: Sitio de ocurrencia: , Causa: , Se notifico a la policia: NO, Se notifico a la Familia: NO.

Motivo de Consulta: " DOLOR DE CABEZA, ESCALOSFRIO"

Enfermedad Actual: PACIENTE DE 23 AÑOS DE EDAD RESIDENTE DEL BARRIO NICLINO MATAR, CON CUADRO CLINICO DE CUATRO DIAS DE EVOLUCION CONSISTETNE EN FIEBRE, CEFALEA, MALESTAR GENERAL Y DISURIA.

Revision por Sistemas: LO REFERIDO

Antecedentes:

Personales: TOXICO-ALERGICOS: NIEGA. CARDIOVASCULARES: NIEGA. GASTROINTESTINALES: NIEGA. GENITOURINARIOS: NIEGA. HEMATOLOGICOS: NIEGA. DERMATOLOGICOS: NIEGA. NEUROLOGICOS: NIEGA. OSTEOMUSCULARES: NIEGA. QUIRURGICOS: NIEGA. INFECCIOSOS: NIEGA. PSIQUIATRICOS: NIEGA. TRAUMATICOS: NIEGA. OTRAS ENFERMEDADES: PALUDISMO Y VARICELA EN EL AÑO PASADO. CANCER: NIEGA. PERINATALES: NIEGA. TRANSFUNCIONALES: NIEGA. PATOLOGICOS: NIEGA. INMUNIZACIONES: NIEGA

Familiares: TOXICO-ALERGICOS: NIEGA. CARDIOVASCULARES: NIEGA. GASTROINTESTINALES: NIEGA. GENITOURINARIOS: NIEGA. HEMATOLOGICOS: NIEGA. DERMATOLOGICOS: NIEGA. NEUROLOGICOS: NIEGA. OSTEOMUSCULARES: NIEGA. QUIRURGICOS: NIEGA. INFECCIOSOS: NIEGA. PSIQUIATRICOS: NIEGA. TRAUMATICOS: NIEGA. OTRAS ENFERMEDADES: NIEGA. RESPIRATORIOS: NIEGA. CANCER: NIEGA. EPILEPSIA: NIEGA. ENFERMEDADES CORONARIAS: NIEGA. HIPERTENSION ARTERIAL: NIEGA. DIABETES MELLITUS: NIEGA. DISLIPIDEMIAS: NIEGA

Psico-Sociales: CONSUMO TABACO: NIEGA. CONSUMO DE ALCOHOL: NIEGA. DROGAS PSICOACTIVAS: NIEGA. EJERCICIOS: NIEGA. DIETA BALANCEADA: NIEGA. OTROS: COCINAN CON LEÑA

Pagina: 1 de 7 Imprime: ODMR	Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:17:04:20	Cedula: 1.121.954.079 Registro: 1121954079	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4			
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS	Docto Ing:	X83	38679
	Fecha Ing:	Ago.02/2024	

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	17:01		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS				

Examen Fisico:

Estado General: BUNOE

Signos Vitales: Peso: 57.60 KG Kg, Talla: 164 Mts, IMC: 21,41, Clasificacion: Rango Normal, Riesgos: Promedio, Pulso: 95 Xm, Frecuencia Cardiaca: 95 Xm, Ritmo Cardiaco: NORMAL, Frecuencia Respiratoria: 95, P.Sistolica: 135, P.Diastolica: 83, P.Arterial Media: 100.33, Temperatura: 36,4, Sitio de toma: AXILAR.

Aparatos y Sistemas: PIEL Y FANERAS: NORMAL,. CABEZA: NORMAL,. OJOS: NORMAL,. OIDOS: NORMAL,. BOCA: NORMAL,. GARGANTA: NORMAL,. CUELLO: NORMAL,. TORAX: NORMAL,. SIST.RESPIRATORIO: NORMAL,. SIST.CARDIOVASCULAR: NORMAL,. SIST.VASCULAR PERIFERICO: NORMAL,. ABDOMEN: NORMAL,. SIST.GENITOURINARIO: NORMAL,. TACTO RECTAL: NORMAL,. SIST.LOCOMOTOR: NORMAL,. SIST.NEUROLOGICO: NORMAL,. EX.GANGLIONAR: NORMAL,. EX.MENTAL: NORMAL,. OTROS: NORMAL,. NARIZ: NORMAL,

Paraclinicos:

Laboratorio: NO PRESENTA

Otros: NO PRESENTA

Concepto Medico: ANTECEDENTES

- PATOLÓGICOS: NIEGA
- QUIRÚRGICOS: NIEGA
- TRAUMÁTICOS: NIEGA
- HOSPITALARIOS: NIEGA
- FARMACOLÓGICOS: NIEGA
- TRANSFUSIONALES: NIEGA
- TOXICOLÓGICOS: NIEGA
- ALÉRGICOS: NIEGA
- FAMILIARES: NIEGA

EXAMEN FISICO:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL HIDRATADO, AFEBRIL
-CABEZA Y CUELLO: ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL NO DOLOROSO, NO INGURGITACIÓN YUGULAR, NO SE PALPAN MASAS NI ADENOPATÍAS.

Pagina: 2 de 7 Imprime: ODMR	Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:17:04:20	Cedula: 1.121.954.079 Registro: 1121954079	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4			
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS	Docto Ing:	X83	38679
	Fecha Ing:	Ago.02/2024	

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	17:01		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS				

-TORAX: NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS NI AGREGADOS, RUIDOS RESPIRATORIOS CONSERVADOS SIN AGREGADOS PULMONARES.
-ABDOMEN: RUIDOS HIDROAÉREOS CONSERVADOS, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN PROFUNDA, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS.
-EXTREMIDADES: EUTRÓFICAS, LLENADO CAPILAR < 2 SEGUNDOS, NO EDEMAS, PULSOS PERIFÉRICOS SIMÉTRICOS.
-NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADO EN SUS 3 ESFERAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, NO FOCALIZACIÓN.

ANALISIS:
PACIENTE DE 23 AÑOS DE EDAD RESIDENTE DEL BARRIO NICLINO MATAR, CON CUADRO CLINICO DE CUATRO DIAS DE EVOLUCION CONSISTETNE EN FIEBRE, CEFALEA, MALESTAR GENERAL Y DISURIA. AL EXAMEN FISICO BUEN ESTADO GENERAL, HIDRATADO, AFEBRIL, BUEN ESTADO GENERAL, SE SOLICITAN PARACLINICOS PARA DEFINIR CONDUCTAS ADICIONALES

IDX
SX FEBRIL EE

PLAN
OBSERVACION
SS// HEMOGRAMA, HEMOPARASITOS, UROANALISIS

Diagnostico: Dx.Principal: R509-FIEBRE, NO ESPECIFICADA, Dx.Relacionado1: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Dx.Muerte: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: IMPRESION DIAGNOSTICA, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Obs del Dx: .

Finalidad: Fuente de información: PACIENTE, Finalidad Causa: NO APLICA, Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL, Sintomatico o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Observacion/Tratamiento: Dejar en observación?: SI, Fecha ingreso: Ago.02/2024, Hora ingreso: 17:01, Dejar en tratamiento?: SI, Cubiculo: ** NO EXISTE, Observaciones: .

Datos Salida del Paciente: Dar salida?: NO, Condicion salida del paciente: ** NO PRESENTA **, Destino del paciente: ** NO PRESENTA **, Motivo de salida/Egreso: ** NO PRESENTA **, Observaciones: .

Pagina: 3 de 7 Imprime: ODMR	Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:17:04:20	Cedula: 1.121.954.079 Registro: 1121954079	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4			
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS	Docto Ing:	X83	38679
	Fecha Ing:	Ago.02/2024	

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	17:01		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS				

PARACLINICOS

LABORATORIO
Examen: UROANALISIS ** DATOS LECTURA **Fecha: Ago.02/2024 Hora: 19:20 Profesional: HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN Especialidad: MEDICINA GENERAL

IVU

Examen: HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA ** DATOS LECTURA **Fecha: Ago.02/2024 Hora: 19:20 Profesional: HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN Especialidad: MEDICINA GENERAL

NEGATIO

Examen: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO ** DATOS LECTURA **Fecha: Ago.02/2024 Hora: 19:20 Profesional: HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN Especialidad: MEDICINA GENERAL

SIN LECUCOTISOS, SIN ANEMIA, SIN TROMBCITOPENIA

OTROS
** NO PRESENTA **

EVOLUCION

Fecha: Ago.02/2024 Hora: 17:01 Nro Atencion: 16 Profesional: HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN Especialidad: MEDICINA GENERAL

ANTECEDENTES

- PATOLÓGICOS: NIEGA
- QUIRÚRGICOS: NIEGA
- TRAUMÁTICOS: NIEGA
- HOSPITALARIOS: NIEGA
- FARMACOLÓGICOS: NIEGA

Pagina: 4 de 7 Imprime: ODMR	Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:17:04:20	Cedula: 1.121.954.079 Registro: 1121954079	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS
Docto Ing: X83 38679
Fecha Ing: Ago.02/2024

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	17:01		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS				

- TRANSFUSIONALES: NIEGA
- TOXICOLÓGICOS: NIEGA
- ALÉRGICOS: NIEGA
- FAMILIARES: NIEGA

EXAMEN FISICO:

PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL HIDRATADO, AFEBRIL
-CABEZA Y CUELLO: ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL NO DOLOROSO, NO INGURGITACIÓN YUGULAR, NO SE PALPAN MASAS NI ADENOPATÍAS.
-TÓRAX: NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS NI AGREGADOS, RUIDOS RESPIRATORIOS CONSERVADOS SIN AGREGADOS PULMONARES.
-ABDOMEN: RUIDOS HIDROAÉREOS CONSERVADOS, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN PROFUNDA, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS.
-EXTREMIDADES: EUTRÓFICAS, LLENADO CAPILAR < 2 SEGUNDOS, NO EDEMAS, PULSOS PERIFÉRICOS SIMÉTRICOS.
-NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADO EN SUS 3 ESFERAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, NO FOCALIZACIÓN.

ANALISIS:
PACIENTE DE 23 AÑOS DE EDAD RESIDENTE DEL BARRIO NICLINO MATAR, CON CUADRO CLINICO DE CUATRO DIAS DE EVOLUCION CONSISTETNE EN FIEBRE, CEFALEA, MALESTAR GENERAL Y DISURIA. AL EXAMEN FISICO BUEN ESTADO GENERAL, HIDRATADO, AFEBRIL, BUEN ESTADO GENERAL, SE SOLICITAN PARACLINICOS PARA DEFINIR CONDUCTAS ADICIONALES

IDX
SX FEBRIL EE

PLAN
OBSERVACION
SS// HEMOGRAMA, HEMOPARASITOS, UROANALISIS

Fecha: Ago.02/2024 Hora: 19:20 Nro Atencion: 18 Profesional: HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN Especialidad: MEDICINA GENERAL

SE REVALORA PACIENTE DE 23 AÑOS DE EDAD RESIDENTE DEL BARRIO NICLINO MATAR, CON CUADRO CLINICO DE CUATRO DIAS DE EVOLUCION CONSISTETNE EN FIEBRE, CEFALEA,

Pagina: 5 de 7 Imprime: ODMR	Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:17:04:20	Cedula: 1.121.954.079 Registro: 1121954079	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS
Docto Ing: X83 38679
Fecha Ing: Ago.02/2024

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	17:01		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS				

MALESTAR GENERAL Y DISURIA. AL EXAMEN FISICO BUEN ESTADO GENERAL, HIDRATADO, AFEBRIL, BUEN ESTADO GENERAL, CON RREPORTE DE UROANALISIS SUGESTIVO DE INFECCION, HEMOGRAMA SIN LEUCOCITOSIS, HEMOPARASITOS NEGATIVOS, SE DECIDE DAR EGRESO CON ANTIBIOTICOTERAPIA, CONTROL AMBULATORIO DE UROANALISIS Y CONTROL POR CONSULTA EXTERNA, SE DAN SIGNOS DE ALARMA PARA RECONSULTAR POR URGENCIAS, SE EXPIDE INCAPACIDAD MEDICA.

IDX
IVU

PLAN
EGRESO
CEFALEXINA 500MG VO CADA 6 HORAS POR 7 DIAS
ACETAMINOFEN 1GR VO CADA 8 HORAS POR 3 DIAS
UROANALISIS DE CONTROL EN 7 DIAS
CONTROL POR CONSULTA EXTERNA PARA LECTURA DE RESULTADOS
SE EXPIDE INCAPACIDAD MEDICA

DATOS DE EGRESO

Diagnostico: Dx.Principal: N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO, Dx.Relacionado1: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Dx.Muerte: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: CONFIRMADO REPETIDO, Pronostivo: BUENO, Obs del Dx: .

Datos Salida del Paciente: Dar salida?: SI, Condicion salida del paciente: VIVO, Destino del paciente: DOMICILIO, Motivo de salida/Egreso: CULMINACION, Observaciones: .

CONDUCTAS

Fecha: Ago.02/2024 Hora: 19:20 Profesional: HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN Especialidad: MEDICINA GENERAL

Pagina: 6 de 7 Imprime: ODMR	Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:17:04:20	Cedula: 1.121.954.079 Registro: 1121954079	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS
Docto Ing: X83 38679
Fecha Ing: Ago.02/2024

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	17:01		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS				

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - W01 95472 - Ago.02/2024
1. CEFALEXINA. CAP. 500 MG (GENFAR) - CAP., Via:ORAL, Cantidad:28, Dosis:TOMAR 1 TABLETA CADA 6 HORAS POR 7 DIAS.
2. ACETAMINOFEN TAB. 500 MG - TAB., Via:ORAL, Cantidad:18, Dosis:TOMAR 2 TABLETAS CADA 8 HORAS.

ORDEN DE LABORATORIO - W05 39287 - Ago.02/2024
1. UROANALISIS -, Cantidad:1, Obs:CONTROL AMBULATORIO EN 7 DIAS.

RECOMENDACIONES - W10 156744 - Ago.02/2024
1. ACUDIR POR URGENCIAS SI TIENE FIEBRE PERSISTENTE, MUCHO DOLOR ABDOMINAL, SE SIENTE MAL A PESAR DEL MANEJO MEDICO


INCAPACIDADES - W16 3184 - Ago.02/2024
Dias: 3 Prorroga: Fecha Inicial: Ago.02/2024 Fecha Final: Ago.04/2024 Tipo: ENFERMEDAD GENERAL Observaciones: SE EXPIDE INCAPACIDAD MEDICA

BOLETA DE SALIDA - X94 37705 - Ago.02/2024
SALIDA.

NOTAS DE ENFERMERIA

NO PRESENTA

Pagina: 7 de 7 Imprime: ODMR	Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:17:04:20	Cedula: 1.121.954.079 Registro: 1121954079	

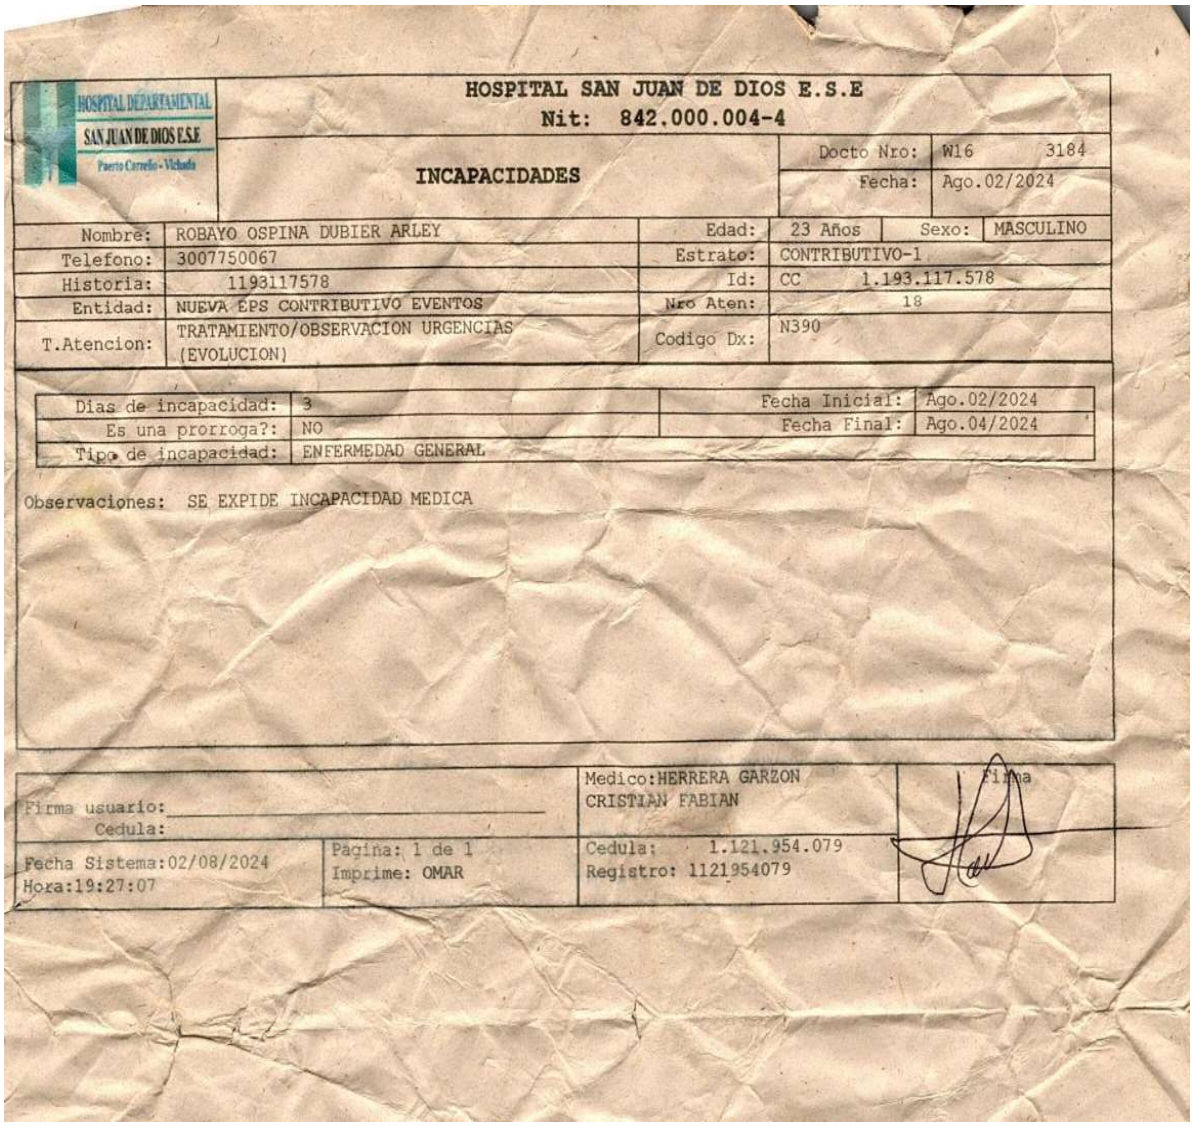

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 3184
Fecha: Ago.02/2024

Nombre:	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	Edad:	23 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3007750067	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1193117578	Id:	CC 1.193.117.578		
Entidad:	NUEVA EPS CONTRIBUTIVO EVENTOS	Nro Aten:	18		
T.Atencion:	TRATAMIENTO/OBSERVACION URGENCIAS (EVOLUCION)	Codigo Dx:	N390		

Dias de incapacidad:	3	Fecha Inicial:	Ago.02/2024
Es una prorroga?:	NO	Fecha Final:	Ago.04/2024
Tipo de incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL		

Observaciones: SE EXPIDE INCAPACIDAD MEDICA

Firma usuario: _____
Cedula:

Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN

Firma

Fecha Sistema:02/08/2024
Hora:19:27:07

Pagina: 1 de 1
Imprime: OMAR

Cedula: 1.121.954.079
Registro: 1121954079

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4				
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS		Docto Ing:	X83	38685
		Fecha Ing:	Ago.03/2024	
Nombre:	REINA GALINDO BILCEN	Edad:	43 Años	Sexo: MASCULI NO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1	
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517	
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	08:08	
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT			

DATOS DE INGRESO

ANAMNESIS

Datos de Llegada Del Paciente: Llego por sus propios medios?: SI, Por cual Medio: MOTO, Estado de Llegada: CONSCIENTE, Estado de Embriaguez: NO.

En Caso De Accidente,Intoxicacion O Violencia: Sitio de ocurrencia: , Causa: , Se notifico a la policia: NO, Se notifico a la Familia: NO.

Motivo de Consulta: "TENGO FIEBRE Y DOLOR EN EL CUERPO DESDE HACE TRES DIAS"

Enfermedad Actual: PACIENTE MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD BELEN, RESGUARDO TOMO BEBERY QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE TRES DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A ESCALOFRIOS, CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, TOS SECA OCASIONAL, MIALGIA, ALTRALGIA.

Revision por Sistemas: LO REFERIDO EN LA ENFERMEDAD ACTUAL.

Antecedentes:

Personales: OTRAS ENFERMEDADES: NIEGA TODAS

Familiares: OTRAS ENFERMEDADES: NIEGA ANTECEDENTES FAMILIARES. DIABETES MELLITUS: MADRE

Psico-Sociales: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Examen Fisico:

Estado General: AL INGRESO LEVE TAQUICARDIA, FEBRIL (38°C), HIDRATADO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

Signos Vitales: Peso: 70.00 KG Kg, Talla: 163 Mts, IMC: 26,34, Clasificacion: Sobrepeso, Riesgos: Aumentado, Pulso: 100 Xm, Frecuencia Cardiaca: 100 Xm, Ritmo Cardiaco: NORMAL, Frecuencia Respiratoria: 19, P.Sistolica: 142, P.Diastolica: 79, P.Arterial Media: 100, Temperatura: 38, Sitio de toma: AXILAR.

Pagina: 1 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:12:59:43	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4				
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS		Docto Ing:	X83	38685
		Fecha Ing:	Ago.03/2024	
Nombre:	REINA GALINDO BILCEN	Edad:	43 Años	Sexo: MASCULI NO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1	
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517	
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	08:08	
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT			

Aparatos y Sistemas: PIEL Y FANERAS: NORMAL,. CABEZA: NORMAL,. OJOS: NORMAL,. OIDOS: NORMAL,. BOCA: NORMAL,. GARGANTA: NORMAL,. CUELLO: NORMAL,. TORAX: NORMAL,. SIST.RESPIRATORIO: NORMAL,. SIST.CARDIOVASCULAR: NORMAL,. SIST.VASCULAR PERIFERICO: NORMAL,. ABDOMEN: NORMAL,. SIST.GENITOURINARIO: NORMAL,. TACTO RECTAL: NORMAL,. SIST.LOCOMOTOR: NORMAL,. SIST.NEUROLOGICO: NORMAL,. EX.GANGLIONAR: NORMAL,. EX.MENTAL: NORMAL,. OTROS: NORMAL,. NARIZ: NORMAL,.

Paraclinicos:

Laboratorio: EXAMEN: HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA:NEGATIVO
EXAMEN: UROANALISIS:INFECCION DE VIAS URINARIAS
EXAMEN: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO:LEUCOCITOSIS A EXPENSAS DE NEUTROFILIA.

Otros: NO PRESENTA

Concepto Medico: PACIENTE MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD BELEN, RESGUARDO TOMO BEBERY QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE TRES DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A ESCALOFRIOS, CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, TOS SECA OCASIONAL, MIALGIA, ALTRALGIA.- AL INGRESO LEVE TAQUICARDIA, FEBRIL (38°C), HIDRATADO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, LEVE PALIDEZ CUTANEA, DADA SINTOMATOLOGIA DE INGRESO SE INGRESA PARA SOLICITUD DE EXAMANES, DESCARTAR ENFERMEDAD TROPICAL, SE ORDENA ANTIPIRETICO. SE REVALORA CON RESULTADOS.

EXAMEN FISICO.
- CABEZA: NORMOCEFALO, SIN EVIDENCIA DE NISTAGMO, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, LEVE PALIDEZ CUTANEA, ESCLERAS ANICTERICAS, NARINAS CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE, DE CONFIGURACION NORMAL, MUCOSA ORAL HUMEDA
- TORAX: SIMETRICO, EXPANSIBLE, SIN USO DE MUSCULATURA ACCESORIA, PULMONES CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, RUIDOS RESPIRATORIOS BILATERALES SIN AGREGADOS PATOLOGICOS.
- CARDIACO: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, DE BUEN TONO E INTENSIDAD SIN SOPLOS NI AGREGADOS.
- ABDOMEN: NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION SIN EVIDENCIA DE SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS.
- GENITOURINARIO: PUÑO PERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA.
-SNC: ALERTA, CONSCIENTE, ESFERA MENTAL SIN ALTERACIONES.

Pagina: 2 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:12:59:43	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4				
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS		Docto Ing:	X83	38685
		Fecha Ing:	Ago.03/2024	
Nombre:	REINA GALINDO BILÇEN	Edad:	43 Años	Sexo: MASCULI NO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1	
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517	
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	08:08	
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT			

PLAN
URGENCIAS OBSERVACION
ACETAMINOFEN 1 GR VO AHORA
SS/ HEMOGRAMA, GOTA GRUESA
REVALORAR

Diagnostico: Dx.Principal: R509-FIEBRE, NO ESPECIFICADA, Dx.Relacionado1: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Dx.Muerte: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: IMPRESION DIAGNOSTICA, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Obs del Dx: .

Finalidad: Fuente de información: PACIENTE, Finalidad Causa: NO APLICA, Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL, Sintomatico o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Observacion/Tratamiento: Dejar en observación?: SI, Fecha ingreso: Ago.03/2024, Hora ingreso: 08:08, Dejar en tratamiento?: SI, Cubiculo: ** NO EXISTE, Observaciones: .

Datos Salida del Paciente: Dar salida?: NO, Condicion salida del paciente: VIVO, Destino del paciente: ** NO PRESENTA **, Motivo de salida/Egreso: ** NO PRESENTA **, Observaciones: ,

PARACLINICOS

LABORATORIO
Examen: HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA ** DATOS LECTURA **Fecha: Ago.03/2024 Hora: 08:08 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

NEGATIVO

Examen: UROANALISIS ** DATOS LECTURA **Fecha: Ago.03/2024 Hora: 08:08 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

INFECCION DE VIAS URINARIAS

Examen: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO ** DATOS LECTURA **Fecha: Ago.03/2024 Hora: 08:08 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

Pagina: 3 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:12:59:43	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4				
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS		Docto Ing:	X83	38685
		Fecha Ing:	Ago.03/2024	
Nombre:	REINA GALINDO BILCEN	Edad:	43 Años	Sexo: MASCULI NO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1	
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517	
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	08:08	
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT			

LEUCOCITOSIS A EXPENSAS DE NEUTROFILIA.

OTROS
** NO PRESENTA **

EVOLUCION

Fecha: Ago.03/2024 Hora: 08:08 Nro Atencion: 9 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

PACIENTE MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD BELEN, RESGUARDO TOMO BEBERY QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE TRES DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A ESCALOFRIOS, CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, TOS SECA OCASIONAL, MIALGIA, ALTRALGIA. AL INGRESO LEVE TAQUICARDIA, FEBRIL (38°C), HIDRATADO, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, LEVE PALIDEZ CUTANEA, DADA SINTOMATOLOGIA DE INGRESO SE INGRESA PARA SOLICITUD DE EXAMANES, DESCARTAR ENFERMEDAD TROPICAL, SE ORDENA ANTIPIRETICO. SE REVALORA CON RESULTADOS.

EXAMEN FISICO.
- CABEZA: NORMOCEFALO, SIN EVIDENCIA DE NISTAGMO, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, LEVE PALIDEZ CUTANEA, ESCLERAS ANICTERICAS, NARINAS CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE, DE CONFIGURACION NORMAL, MUCOSA ORAL HUMEDA
- TORAX: SIMETRICO, EXPANSIBLE, SIN USO DE MUSCULATURA ACCESORIA, PULMONES CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, RUIDOS RESPIRATORIOS BILATERALES SIN AGREGADOS PATOLOGICOS.
- CARDIACO: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, DE BUEN TONO E INTENSIDAD SIN SOPLOS NI AGREGADOS.
- ABDOMEN: NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION SIN EVIDENCIA DE SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS.
- GENITOURINARIO: PUÑO PERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA.
-SNC: ALERTA, CONSCIENTE, ESFERA MENTAL SIN ALTERACIONES.

PLAN
URGENCIAS OBSERVACION
ACETAMINOFEN 1 GR VO AHORA

Pagina: 4 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:12:59:43	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4					
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS			Docto Ing:	X83	38685
			Fecha Ing:	Ago.03/2024	
Nombre:	REINA GALINDO BILCEN	Edad:	43 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	08:08		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

SS/ HEMOGRAMA, GOTA GRUESA
REVALORAR

Fecha: Ago.03/2024 Hora: 12:41 Nro Atencion: 11 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

PACIENTE MASCULINO DE 43 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DE LA COMUNIDAD BELEN, RESGUARDO TOMO BEBERY QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE TRES DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A ESCALOFRIOS, CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, TOS SECA OCASIONAL, MIALGIA, ALTRALGIA. EN EL MOMENTO PACIENTE AFEBRIL, EN BUEN ESTADO GENERAL, SIGNOS VITALES EN META. SE RECIBE RESULTADOS DE PARACLINICOS QUE EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON LEUCOCITOSIS A EXPENSAS DE NEUTROFILIA, GOTA GRUESA NEGATIVO. UROANALISIS SUGIESTIVO DE INFECCION DE VIAS URINARIAS TRACTO BAJO NO COMPLICADA. SE DECIDE DAR EGRESO CON FORMULA MEDICA, CITA POR CONSULTA EXTERNA PARA EL LUNES. SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA RECONSULTAR.

IDX.
ITU BAJA NO COMPLICADA.

PLAN
EGRESO
ACETAMINOFEN TABLETAS 500 MG TOMAR UNA TABLETA CADA 6 HORAS POR 3 DIAS
NITROFURANTOINA TABLETAS 100 MG, TOMAR UNA TABLETA CADA 6 HORAS POR 7 DIAS
INDICACIONES:
REALIZAR UROANALISIS CONTROL PARA EL VIERNES 09 DE AGOSTO
CITA POR MEDICINA GENERAL PARA LECTURA DE RESULTADOS EL LUNES 12 DE AGOSTO
SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA

DATOS DE EGRESO

Diagnostico: Dx.Principal: N390-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO, Dx.Relacionado1: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Dx.Muerte: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: CONFIRMADO NUEVO, Pronostivo: BUENO, Obs del Dx: .

Pagina: 5 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:12:59:43	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4					
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS			Docto Ing:	X83	38685
			Fecha Ing:	Ago.03/2024	
Nombre:	REINA GALINDO BILCEN	Edad:	43 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	08:08		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

Fecha: Ago.03/2024 Hora: 12:41 Profesional: MEDRANO MEDRANO SANDRA LUCIA

ENFERMERIA - NOTAS DE ENFERMERIA - W64 121969
1. 08+15 PACIENTE ES VALORADO POR LA DOCTORA EN TURNO QUIEN ORDENA LABORATORIOS CLINICOS + MEDICAMENTO ACETAMINOFEN TAB 1 GM V,O Y CONTINUAR EN OBSERVA CION

09+30 LLEGA BACTERIOLOGO DE TURNO QUIEN TOMA MUESTRA DE SANGRE .
12+30 LLEGAN RESULTADO QUIEN SON VALORADO JUNTO A PACIENTE Y DEFINIR CINDUCTA .
12+41 SALE PACIENTE DEL SERVICIO DE URGENCIA POR MEJORIA SALE CON RECOMENDACIONES MEDICAS EN BUEN ESTADO DE SALUD Y RECOMENDACIONES MEDICAS .

Pagina: 7 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:12:59:43	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4					
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS			Docto Ing:	X83	38685
			Fecha Ing:	Ago.03/2024	
Nombre:	REINA GALINDO BILCEN	Edad:	43 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	08:08		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

Datos Salida del Paciente: Dar salida?: SI, Condicion salida del paciente: VIVO, Destino del paciente: DOMICILIO, Motivo de salida/Egreso: CULMINACION, Observaciones: .

CONDUCTAS

Fecha: Ago.03/2024 Hora: 12:41 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - W01 95476 - Ago.03/2024
1. NITROFURANTOINA TAB. 100 MG (AVANPHARMA) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:28, Dosis:TOMAR UNA TABLETA CADA 6 HORAS POR 7 DIAS.
2. ACETAMINOFEN TAB. 500 MG - TAB., Via:ORAL, Cantidad:12, Dosis:TOMAR UNA TABLETA CADA 6 HORAS POR 3 DIAS.

ORDEN DE LABORATORIO - W05 39288 - Ago.03/2024
1. UROANALISIS -, Cantidad:1, Obs:REALIZAR UROANALISIS CONTROL PARA EL VIERNES 09 DE AGOSTO.

RECOMENDACIONES - W10 156748 - Ago.03/2024
1. SE SOLICITA ALBERGUE PARA PACIENTE Y ACOMPAÑANTE
2. REALIZAR UROANALISIS CONTROL EN UNA SEMANA EL VIERNES 09 DE AGOSTO
3. CITA POR MEDICINA GENERAL PARA LECTURA DE RESULTADOS EL LUNES 12 DE AGOSTO
4. RECONSULTAR EN CASO DE PRESENTAR FIEBRE ALTA PERSISTENTE QUE NO BAJA CON ACETAMINOFEN, SI PRESENTA VOMITOS PERSISTENTES, DESMAYOS O DESVANECIMIENTO.

INCAPACIDADES - W16 3185 - Ago.03/2024
Dias: 8 Prorroga: Fecha Inicial: Ago.03/2024 Fecha Final: Ago.10/2024 Tipo: ENFERMEDAD GENERAL Observaciones: SE ORDENA INCAPACIDAD MEDICA POR 8 DIAS

BOLETA DE SALIDA - X94 37712 - Ago.03/2024
SALIDA.

NOTAS DE ENFERMERIA

Pagina: 6 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:12:59:43	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 3185
Fecha: Ago.03/2024

Nombre:	REINA GALINDO BILCEN	Edad:	43 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3209057611	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	6848517	Id:	CC 6.848.517		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT	Nro Aten:	11		
T.Atencion:	TRATAMIENTO/OBSERVACION URGENCIAS (EVOLUCION)	Codigo Dx:	N390		

Dias de incapacidad:	8	Fecha Inicial:	Ago.03/2024
Es una prorroga?:	NO	Fecha Final:	Ago.10/2024
Tipo de incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL		

Observaciones: SE ORDENA INCAPACIDAD MEDICA POR 8 DIAS

Firma usuario: _____ Cedula:		Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:03/08/2024 Hora:12:52:31	Pagina: 1 de 1 Imprime: ODMR	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

CC. 1234097735

ANAMNESIS

Motivo de Consulta: DOLOR DE ESPALDA

Enfermedad Actual: USUARIO DE 39 AÑOS, ACUDE POR PRESENTAR DOLOR EN LA ESPALDA QUE SE IRRADIA POR EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA, REFIERE QUE EL DOLOR LO RELACIONA CON UNA FUERZA MAL HECHA EN SU LUGAR DE TRABAJO Y QUE ASEGURA HA SENTIDO DOLOR TESTICULAR. SINTOMAS DE 10 DIAS DE EVOLUCION. SE LE HACE ATENCION AL ADULTO.

Antecedentes:

Personales: TOXICO-ALERGICOS: NIEGA. QUIRURGICOS: NIEGA. TRAUMATICOS: TRAUMA EN MIMEBRO SUPERIOR IZQUIERDO POR CAIDA DE MOTO. OTRAS ENFERMEDADES: NIEGA

Familiares: OTRAS ENFERMEDADES: NIEGA. ANTECEDENTES FAMILIARES

Psicosociales: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Hábitos y Observaciones:

Consumos y hábitos alimentarios:

Prácticas y hábitos saludables:

Desarrollo y aprendizaje:

Prácticas de crianza y cuidado:

Factores de riesgo, prácticas y hábitos saludables:

Actividad Fisica: SI.

Higiene oral y corporal: 2 Y 2.

Hábitos de descanso y sueño: 8 HORAS.

Habito intestinal y urinario: 1 Y 4.

Foto protección: NO.

Prácticas de autoexamen de seno: NO.

Auto examen de testiculo: NO.

Prevención de accidentes: SI.

Uso del tiempo libre y ocio: TERTULIAS, DEPORTE.

Manejo del estrés y situaciones de alta tensión: SI.

Exposición a la violencia: NO.

Exposición a factores de riesgo derivados del trabajo: SI.

Antecedentes tocológicos: SI.

Exposición al humo de leña o carbón: SI.

Consumo de tabaco: NO.

N°paquetes/año: .

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: ADULTEZ-MEDICINA GENERAL
Atención: 27
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad: 39 Años	Sexo: MASCULINO
Teléfono:	NO TIENE	Estrato:	SUBSIDIADO-1
Historia:	1124991490	Id: CC	1.124.991.490
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	09:08
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD		

¿Hay factores de riesgo EPOC?: No.

Observaciones: .

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica:

Total preguntas con SI: 1

Clasificación: 1-NO PRESENTA SOSPECHA DE EPOC

Observación:

Consumo y hábitos alimentarios:

Consumo y hábitos alimentarios: NO BALANCEADA

Tipo de alimentos consumidos: VARIADOS

Dietas que lleva: NINGUNA

Actividad laboral o económica actual:

Edad de inicio de su actividad laboral: NO APLICA

Tipo de labor:

Tipo de vinculación laboral:

Antigüedad:

Cargo laboral

¿Exposición a factores de riesgo? ¿Cuales?:

¿Relacionados con la actividad laboral o económica?: No

Observaciones:

Derechos sexuales y reproductivos y la vivencia de la sexualidad:

Orientación Sexual: HETEROSEXUAL

Identidad de género: MASCULINO

Numero de compañeros sexuales: 1

Métodos anticoncepción y protección contra ITS/VIH: NO

Deseo: SI

Excitación: SI

Lubricación: SI

Orgasmo: SI

Satisfacción: SI

Pagina: 2 de 9
Imprime: LLAA
Fecha Sistema:28/08/2024
Hora:12:01:41
Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR
Cedula: 80.063.856
Registro:
Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: ADULTEZ-MEDICINA GENERAL
Atención: 27
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad: 39 Años	Sexo: MASCULINO
Teléfono:	NO TIENE	Estrato:	SUBSIDIADO-1
Historia:	1124991490	Id: CC	1.124.991.490
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	09:08
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD		

Erección: SI

Eyaculación: SI

Dolor: NO

Dificultades y/o disfunciones sexuales: SI

Toma de decisiones alrededor de la sexualidad y la reproducción: SI

Violencia sexual: NO

Violencia contra la mujer y/o violencia de género y conocimientos: SI

Creencias y actitudes sobre las relaciones sexuales: SI

Anticoncepción: NO

ITS: SI

Observaciones:

Riesgo Psicológico para violencias:

¿Exposición a la violencia?: No

Observaciones:

Preguntas de WHOOLEY para tamización de depresión:

A. ¿Durante los últimos 30 días se ha sentido a menudo desanimado, deprimido o con pocas esperanzas?: **SI:** 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

B. ¿Durante los últimos 30 días ha sentido poco placer o interés al hacer cosas que habitualmente disfrutaba?: **SI:** 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

Clasificación: POSITIVA - PASA LA PRUEBA.

Observaciones: .

Escala para desorden de ansiedad generalizada GAD - 2:

1. Sentirse nervioso(a), ansioso(a), o inquieto: Para nada: 1-** NO EXISTE **, **Algunos días:** -** NO EXISTE **, **Mas de la mitad de los días:** -** NO EXISTE **, **Casi todos los días:** -** NO EXISTE **.

2. No poder controlar la preocupación: Para nada: 1-** NO EXISTE **, **Algunos días:** -** NO EXISTE **, **Mas de la mitad de los días:** -** NO EXISTE **, **Casi todos los días:** -** NO EXISTE **.

Puntaje: . **Clasificación:** NEGATIVA - PASO LA PRUEBA SATISFACTORIAMENTE

Descripción:

Assist - Pregunta 1:

¿Tampoco Incluso cuando iba al colegio?: No, **Puntaje:** , **Clasificación:** 1-Normal - Pare la entrevista

Assist - Pregunta 2:

Pagina: 3 de 9
Imprime: LLAA
Fecha Sistema:28/08/2024
Hora:12:01:41
Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR
Cedula: 80.063.856
Registro:
Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: ADULTEZ-MEDICINA GENERAL
Atención: 27
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad: 39 Años	Sexo: MASCULINO
Teléfono:	NO TIENE	Estrato:	SUBSIDIADO-1
Historia:	1124991490	Id: CC	1.124.991.490
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	09:08
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD		

Ha consumido algunas de las sustancias de la pregunta 2 en los últimos 3 meses: No, **Puntaje:** , **Clasificación:** 1-Salte a la Pregunta 6.

Assist - Pregunta 3:

Puntaje:

Assist - Pregunta 4:

Puntaje:

Assist - Pregunta 5:

Puntaje:

Assist - Pregunta 6:

Puntaje:

Assist - Pregunta 7:

Puntaje:

Assist - Pregunta 8:

Puntaje:

Patrón de inyección y guias de intervención:

Puntaje: 0-No Aplica

Test Audit (Alcohol Use Disorders Identification Test):

Puntaje: , **Clasificación:** Normal

Observaciones:

ESCALA DE ZARIT:

1. ¿Cree que su familiar solicita más ayuda de la que realmente necesita?: Nunca: 1-** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

2. ¿Cree que debido al tiempo que dedica a su familiar ya no dispone de tiempo suficiente para usted?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

3. ¿Se siente agobiado entre cuidar a su familiar y atender además otras responsabilidades de su trabajo o familia?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

4. ¿Se siente avergonzado por la conducta de su familia?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

5. ¿Se siente enfadado cuando está cerca de su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

Pagina: 4 de 9
Imprime: LLAA
Fecha Sistema:28/08/2024
Hora:12:01:41
Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR
Cedula: 80.063.856
Registro:
Firma

Consorcio HDC

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE:
ADULTEZ-MEDICINA GENERAL

Atención: 27
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad: 39 Años	Sexo: MASCULINO
Teléfono:	NO TIENE	Estrato:	SUBSIDIADO-1
Historia:	1124991490	Id: CC	1.124.991.490
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	09:08
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD		

6. ¿Piensa que su familiar afecta negativamente a su relación con otros miembros de su familia?: Nunca: -** NO EXISTE **; **Rara vez:** -** NO EXISTE **; **Alguna vez:** -** NO EXISTE **; **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

7. ¿Tiene miedo de lo que el futuro depare a su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **; **Rara vez:** -** NO EXISTE **; **Alguna vez:** -** NO EXISTE **; **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

8. ¿Cree que su familiar depende de usted?: Nunca: -** NO EXISTE **; **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

9. ¿Se siente tenso cuando está cerca de su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **; **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

10. ¿Cree que su salud se ha resentido por cuidar a su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

11. ¿Cree que no tiene tanta intimidad como le gustaria debido a su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

12. ¿Cree que su vida socia se ha resentido por cuidar a su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

13. ¿Se siente incómodo por desatender a sus amistades debido a su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

14. ¿Cree que su familiar parece esperar que usted sea la persona que le cuide, como si usted fuera la única persona de quien depende?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

15. ¿Cree que no tiene suficiente dinero para cuidar a su familiar además de sus otros gastos?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

16. ¿Cree que será incapaz de cuidarle/a por muchas más tiempo?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

17. ¿Siente que ha perdido el control de su vida desde la enfermedad de su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

18. ¿Desearia poder dar el cuidado de su familiar a otros?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

19. ¿Se siente indeciso sobre qué hacer con su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

20. ¿Cree que deberia hacer más por su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

21. ¿Cree que podria cuidar mejor de su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **, **Rara vez:** -** NO EXISTE **, **Alguna vez:** -** NO EXISTE **, **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **, **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR
Cedula: 80.063.856
Registro:

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE:
ADULTEZ-MEDICINA GENERAL

Atención: 27
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad: 39 Años	Sexo: MASCULINO
Teléfono:	NO TIENE	Estrato:	SUBSIDIADO-1
Historia:	1124991490	Id: CC	1.124.991.490
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	09:08
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD		

22. Globalmente ¿Qué grado de carga experimenta por el hecho de cuidar a su familiar?: Nunca: -** NO EXISTE **; **Rara vez:** -** NO EXISTE **; **Alguna vez:** -** NO EXISTE **; **Bastantes veces:** -** NO EXISTE **; **Casi Siempre:** -** NO EXISTE **

Puntaje Total: .

Clasificación: 1-NO SOBRECARGA.

APGAR familiar:

1. ¿Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema o necesidad?: NUNCA: , CASI NUNCA: , ALGUNAS VECES: , CASI SIEMPRE: , SIEMPRE: X.

2. ¿Me satisface la participación que mi familia brinda y permite: NUNCA: , CASI NUNCA: , ALGUNAS VECES: , CASI SIEMPRE: , SIEMPRE: X.

3. ¿Me satisface como mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas actividades: NUNCA: , CASI NUNCA: , ALGUNAS VECES: , CASI SIEMPRE: , SIEMPRE: X.

4. ¿Me satisface como mi familia expresa afectos y responde a mis emociones como rabia, tristeza y amor: NUNCA: , CASI NUNCA: , ALGUNAS VECES: , CASI SIEMPRE: , SIEMPRE: X.

5. ¿Me satisface como compartimos en familia: -El tiempo para estar juntos, -Los espacios en la casa, -El dinero: NUNCA: , CASI NUNCA: , ALGUNAS VECES: , CASI SIEMPRE: , SIEMPRE: X.

Puntaje Total: 20, **Clasificación:** Buena Función Familiar - (18-99).

Examen Fisico:

Estado General: BUENO

Signos Vitales: Peso: 68.00 KG Kg, Talla: 158 Mts, IMC: 27,23, Clasificación: Sobrepeso, Riesgo: Aumentado, Pulso: 89 Xm, Frecuencia Cardiaca: 89 Xm, Ritmo Cardiaco: NORMAL, Frecuencia Respiratoria: 21, P.Sistolico: 100, P.Diastolico: 60, P.Arterial Media: 73,33, Temperatura: 36, Sitio de toma: AXILAR.

Observaciones Signos Vitales:

Aparatos y Sistemas: PIEL Y FANERAS: NO EVALUADO. CABEZA: NO EVALUADO. OJOS: NO EVALUADO. OIDOS: NO EVALUADO. BOCA: NO EVALUADO. GARGANTA: NO EVALUADO. CUELLO: NO EVALUADO. TORAX: NO EVALUADO. SIST.RESPIRATORIO: NO EVALUADO. SIST.CARDIOVASCULAR: NO EVALUADO. SIST.VASCULAR PERIFERICO: NO EVALUADO. ABDOMEN: NO EVALUADO. SIST.GENITOURINARIO: NO EVALUADO. TACTO RECTAL: NO EVALUADO. SIST.LOCOMTOR: NO EVALUADO. SIST.NEUROLOGICO: NO EVALUADO. EX.GANGLIONAR: NO EVALUADO. EX.MENTAL: NO EVALUADO. OTROS: NO EVALUADO. MANII: NO EVALUADO. LABIO INTERIOR: NORMAL,. LABIO SUPERIOR: NORMAL,. COMISURAS: NORMAL,. MUCOSA ORAL: NORMAL,. SURCOS YUGALES: NORMAL,. FRENILLOS: NORMAL,. OROFARINGE: NORMAL,. PALADAR: NORMAL,. GLANDULAS SALIVALES: NORMAL,. PISO DE BOCA: NORMAL,. DORSO DE LENGUA: NORMAL,. VIENTRE DE LENGUA: NORMAL,. MAXILARES: NORMAL,. SENOS MAXILARES: NORMAL,. MUSC.MASTICADORES: NO EVALUADO. OTROS: NORMAL,. TEJIDO LINFOIDE: NORMAL,. ** NO EXISTE NORMAL.

Valoración del Estado Nutricional:

Riesgo cardiovascular:

¿Es usted diabético?: SI: 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

Tipo de diabetes: N/A: 1-** NO EXISTE **, **1:** 1-** NO EXISTE **, **2:** 1-** NO EXISTE **, **Gestacional:** 1-** NO EXISTE **.

¿FUMA?: SI: 1-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR
Cedula: 80.063.856
Registro:

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE:
ADULTEZ-MEDICINA GENERAL

Atención: 27
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad: 39 Años	Sexo: MASCULINO
Teléfono:	NO TIENE	Estrato:	SUBSIDIADO-1
Historia:	1124991490	Id: CC	1.124.991.490
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	09:08
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD		

¿Tiene ya diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular?: SI: 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

¿Tiene usted el dato del colesterol total?: SI: 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

Colesterol total:

Colesterol HDL:

%Riesgo cardiovascular CMS: <10%. **Riesgo cardiovascular x CMS:** 01-Riesgo Bajo

Finnish Risk Score: .

¿Realiza normalmente al menos 30 minutos diarios de actividad física?: SI: 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

¿Con que frecuencia come frutas, verduras y hortalizas?: A diario: 2-** NO EXISTE **, **No a diario** 2-** NO EXISTE **.

¿Le han recetado alguna vez medicamentos contra la HTA?: SI: 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **.

¿Le han detectado alguna vez niveles altos de glucosa en la sangre?: SI: No a diario, **NO:** No a diario.

¿Ha habido un diagnóstico de diabetes en, por lo menos, un miembro de la familia?: NO: -** NO EXISTE **, SI Abuelos, tios o primos hermanos (Pero no padre hermanos o hijos): -** NO EXISTE **, SI padres, hermanos o hijos: -** NO EXISTE **.

Puntaje Total: 4. **Clasificación:** 1-Riesgo Bajo Para Desarrollar Diabetes.

Observaciones: .

Valoración de la salud sexual:

Conocimientos y practicas relacionadas con la sexualidad: SI

Observaciones:

Valoración de la salud auditiva y comunicativa:

1. ¿Tiene usted o ha tenido algún problema en el oído?: SI: 2-** NO EXISTE **, **NO:** 2-** NO EXISTE **

2. ¿Cree usted que escucha bien?: SI: 1-** NO EXISTE **, **NO:** -** NO EXISTE **.

Observaciones: .

Otros aspectos fisicos:

Observaciones: SIN ALTERACIONES.

Paraclinicos:

Laboratorio: NO PRESENTA

Otros: NO PRESENTA

Concepto Medico: PACIENTE EN ACEPTABLE ESTADO GENERAL HIDRATADO, AFEBRIL CABEZA Y CUELLO: ESCLERAS ANICTÉRICAS, CONJUNTIVAS NORMOCRÓMICAS, MUCOSA ORAL HÚMEDA, CUELLO MÓVIL NO DOLOROSO, NO INGURGITACIÓN YUGULAR, NO SE PALPAN MASAS NI ADENOPATÍAS.

Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR
Cedula: 80.063.856
Registro:

Firma

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

HISTORIA CLINICA DE:
ADULTEZ-MEDICINA GENERAL

Atención: 27
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad: 39 Años	Sexo: MASCULINO
Teléfono:	NO TIENE	Estrato:	SUBSIDIADO-1
Historia:	1124991490	Id: CC	1.124.991.490
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	09:08
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD		

TORAX: NORMOEXPANSIBLE, RUIDOS CARDÍACOS RÍTMICOS SIN SOPLOS NI AGREGADOS, RUIDOS RESPIRATORIOS CONSERVADOS SIN AGREGADOS PULMONARES.
ABDOMEN: RUIDOS HIDROAÉREOS CONSERVADOS, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACIÓN PROFUNDA, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS.
EXTREMIDADES: EUTRÓFICAS, LLENADO CAPILAR < 2 SEGUNDOS, NO EDEMAS, PULSOS PERIFÉRICOS SIMÉTRICOS.
NEUROLÓGICO: ALERTA, ORIENTADO EN SUS 3 ESFERAS, NO SIGNOS DE IRRITACIÓN MENÍNGEA, NO FOCALIZACIÓN.
GENITARIO CON DOLOR TESTICULAR, SIN INFLAMACION Y SIN CAMBIO DE COLORACION, CON LIMPIADO Y POSIBLE CISTALGIA. SE INICIA MANEJO SINTOMATICO Y SE DAN RECOMENDACIONES GENERALES.

Diagnóstico: Dx.Principal: Z108-OTROS CONTROLES GENERALES DE SALUD DE RUTINA DE OTRAS SUBPOB, Dx.Relacionado1: M545-LUMBAGO NO ESPECIFICADO, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnóstico: CONFIRMADO NUEVO, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Causa Ext: .

Finalidad: Fuente de información: PACIENTE, Finalidad Causa: DETECCION DE ALTERACIONES DEL ADULTO, Causa Externa: OTRA, Sintomático o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Plan De Cuidado: Se envia:

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - MO1 96029 - Ago.28/2024
1. DEXAMETAZONA 8MG/ML - AMP., Via:INTRAMUSCULAR, Cantidad:3, Dosis:1 AMPOLLA IM DIA POR 3 DIAS.
2. DICLOFENACO SODICO 25G. INY. 75 MG / 3 ML (VITALIS) - AMPOLLA X 3ML, Via:INTRAMUSCULAR, Cantidad:3, Dosis:1 AMPOLLA IM DIA POR 3 DIAS.
3. JERINGA DESECHABLE 5 CC - UNIDAD, Via:NO APLICA, Cantidad:3, Dosis:.
4. METOCARBAMOL TAB. 750 MG (LARIMOL) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:30, Dosis:1 TABLETA CADA 12 HORAS.
5. NAPROXENO 500 MG - TABLETA, Via:ORAL, Cantidad:30, Dosis:1 TABLETA CADA 8 HORAS.
6. TIAMINA /VIT. B1 TAB. o CAP. 300 MG (ECAR) - TAB, Via:ORAL, Cantidad:30, Dosis:1 TABLETA CADA DIA.
7. PREDNISONA TAB. 50 MG (PENTACORT) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:5, Dosis:1 TABLETA DIA POR 5 DIAS.

ORDEN PROCEDIMIENTOS/ACTIVIDADES POS - MO9 25654 - Ago.28/2024
1. INYECCION O INFUSION DE OTRA SUSTANCIA TERAPEUTICA O PROFILA -, Cantidad:1, Obs:.

RECOMENDACIONES - M10 157827 - Ago.28/2024
1. REALIZAR EJERCICIO CON FRECUENCIA, MINIMO 3 A 4 VECES POR SEMANA POR 30 MINUTOS
2. CONSUMO BAJO DE SAL, GRASAS, HARINAS, BUEN CONSUMO DE FRUTAS, VERDURAS, AGUA Y FIBRA.
3. EVITAR EL CONSUMO DE CIGARRILLO, TABACO, LICOR, DROGAS PSICOACTIVAS. CONTROLAR EL ESTRES, TENSION O ANSIEDAD.
4. EN MUJERES AUTOEXAMEN DE SENO CADA MES, CITOLOGIA CADA AÑO EN MENORES DE TREINTA, MAMOGRAFIA CADA AÑO EN MAYORES DE 50 AÑOS
5. EN HOMBRES AUTOEXPLORACION TESTICULAR, EXAMEN DE PROSTATA CADA AÑO EN MAYORES DE 45 AÑOS
6. REVISION DE AGUDEZA VISUAL, REVISION OFTALMOLOGICA.
7. CITA CONTROL CON RESULTADOS DE EXAMENES.

INCAPACIDADES - M16 3223 - Ago.28/2024
Dias: 3 (tercigas) M Fecha Inicial: Ago.28/2024 Fecha Final: Ago.30/2024 Tipo: ENFERMEDAD GENERAL
Observaciones: INCAPACIDAD MEDICA POR 3 DIAS.

LUMBAGO MECANICO.

ORDEN DE LABORATORIO DE PTP - M75 8191 - Ago.28/2024
1. HEMOGRAMA IV (HEMATOLOGIA) AUTOMATIZADO NO INCLUYE DE ERITROCITO -, Cantidad:1, Obs:.
2. GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA -, Cantidad:1, Obs:.
3. TRIGLICERIDOS -, Cantidad:1, Obs:.
4. COLESTEROL TOTAL -, Cantidad:1, Obs:.
5. COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD -, Cantidad:1, Obs:.
6. COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO -, Cantidad:1, Obs:.
7. CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS -, Cantidad:1, Obs:.
8. UROANALISIS -, Cantidad:1, Obs:.
9. Helicobacter pylori ANTICUERPOS TOTALES INMUNOTAMIZADO O A -, Cantidad:1, Obs:.
10. HEMOGLOBINA GLICOSILADA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADA -, Cantidad:1, Obs:.

Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR
Cedula: 80.063.856
Registro:

Firma

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 3223
Fecha: Ago.28/2024

Nombre:	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	Edad:	39 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	NO TIENE}	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:	1124991490	Id:	CC 1.124.991.490		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD	Nro Aten:	27		
T.Atencion:	ADULTEZ-MEDICINA GENERAL	Codigo Dx:	Z108 - M545		

Dias de incapacidad:	3	Fecha Inicial:	Ago.28/2024
Es una prorroga?:	NO	Fecha Final:	Ago.30/2024
Tipo de incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL		

Observaciones: INCAPACIDAD MEDICA POR 3 DIAS.

LUMBAGO MECANICO.

Firma usuario: _____
Cedula:

Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR

Firma

Fecha Sistema:28/08/2024
Hora:10:01:11

Pagina: 1 de 1
Imprime: LLAA

Cedula: 80.063.856
Registro:

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E** **Nit: 842.000.004-4**		
	HISTORIA CLINICA DE: **AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)**	Atencion:	13
		Fecha:	Ago.05/2024

Nombre:	PONARE CHIPIAJE PABLO EMILIO	Edad:	36 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3102892001	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1125010797	Id:	CC 1.125.010.797		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	15:29		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

ANAMNESIS

Motivo de Consulta: TENGO GRIPA

Enfermedad Actual: USUARIO DE 36 AÑOS, ACUDE POR PRESENTAR DESDE HACE 2 DIAS, SINTOMAS GRIPALES, CON FIEBRE, ESCALOFRIOS, DOLOR DE CABEZA, DE HUESOS. MALESTAR GENERAL, DOLOR RETRO OCULAR. NO VE MEJORIA CON LA MEDICACION PREVIAMENTE PRESCRITA EN URGENCIAS.

Revision por Sistemas: GRIPA

Antecedentes:

Personales: TOXICO-ALERGICOS: NIEGA. QUIRURGICOS: COLESCISTECTOMIA.. PATOLOGICOS: NIEGA

Familiares: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Psico-Sociales: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Examen Fisico:

Estado General: BUENO

Signos Vitales: Peso: 67.70 KG Kg, Talla: 152 Mts, IMC: 29,3, Clasificacion: Sobrepeso, Riegos: Aumentado, Pulso: 78 Xm, Frecuencia Cardiaca: 78 Xm, Ritmo Cardiaco: NORMAL, Frecuencia Respiratoria: 21, P.Sistolica: 100, P.Diastolica: 70, P.Arterial Media: 80, Temperatura: 36, Sitio de toma: AXILAR.

Aparatos y Sistemas: PIEL Y FANERAS: NORMAL,. CABEZA: NORMAL,. OJOS: NORMAL,. OIDOS: NORMAL,. BOCA: NORMAL,. GARGANTA: NORMAL,. CUELLO: NORMAL,. TORAX: NORMAL,. SIST.RESPIRATORIO: NORMAL,. SIST.CARDIOVASCULAR: NORMAL,. SIST.VASCULAR PERIFERICO: NORMAL,. ABDOMEN: NORMAL,. SIST.GENITOURINARIO: NORMAL,. TACTO RECTAL: NORMAL,. SIST.LOCOMOTOR: NORMAL,. SIST.NEUROLOGICO: NORMAL,. EX.GANGLIONAR: NORMAL,. EX.MENTAL: NORMAL,. OTROS: NORMAL,. NARIZ: NORMAL,

Paraclinicos:

Laboratorio: NO PRESENTA

Otros: NO PRESENTA

Pagina: 1 de 3 Imprime: CRA	Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma
Fecha Sistema:05/08/2024 Hora:15:52:37	Cedula: 80.063.856 Registro:	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4**				
	HISTORIA CLINICA DE: AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)		Atencion:		13
			Fecha:		Ago.05/2024
Nombre:	PONARE CHIPIAJE PABLO EMILIO	Edad:	36 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3102892001	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1125010797	Id:	CC 1.125.010.797		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	15:29		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

Concepto Medico: ALERTA, CONCIENTE, NORMOCEFALICO, CAVIDAD ORAL NORMAL, MUCOSAS HUMEDAS Y ROSADAS, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, RUIDOS RESPIRATORIOS CON MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, SIN TIRAJES, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, TORAX SIMETRICO NORMOEXPANDIBLE , ABDOMEN BLANDO, NO PRESENCIA DE MASA, EXTREMIDADES SIN PRESENCIA DE EDEMA, NEUROLOGICO SIN DEFICIT. OROFARINGE ENROJECIDA, NO PLACAS NI EXUDADOS.
USAURIO CON IRA ALTA NO COMPLICADA, SIN PLACAS NO EXUDADOS. SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, PERO CON TOMA DEL ESTADO GENERAL. SE INICIA MANEJO DEL CUADRO CLINICO Y SE SOLICITAN PARACLINICOS. SE DAN RECOMENDACIONES GENERALES.

Diagnostico: Dx.Principal: J069-INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESP, Dx.Relacionado1: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: CONFIRMADO NUEVO, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Obs del Dx: .

Finalidad: Fuente de información: EL MISMP, Finalidad Causa: NO APLICA, Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL, Sintomatico o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Conductas: Se envia:

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - W01 95516 - Ago.05/2024
1. ACETAMINOFEN TAB. 500 MG - TAB., Via:ORAL, Cantidad:30, Dosis:2 TABLETAS CADA 8 HORAS.
2. ASCORBICO ACIDO 500 MG TAB (MERCK) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:10, Dosis:1 TABLETA CADA DIA.
3. LORATADINA. TAB. 10 MG (AMERICAN GENERICS) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:10, Dosis:1 TABLETA CADA DIA.
4. SALES DE REHIDRAT. POLVO P´RECONST.(LABINCO) - POLVO P RECONSTRUIR, Via:ORAL, Cantidad:3, Dosis:DILUIR 1 SOBRE EN 1 LITRO DE AGUA POTABLE. TOMAR 200 ML CADA 1 HORA..

ORDEN DE LABORATORIO - W05 39299 - Ago.05/2024
1. HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO -, Cantidad:1, Obs:.
2. HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA -, Cantidad:1, Obs:.
3. UROANALISIS -, Cantidad:1, Obs:.

RECOMENDACIONES - W10 156827 - Ago.05/2024
1. Evitar cambios bruscos de temperatura (Exceso de Frío corrientes de aire).

Pagina: 2 de 3 Imprime: CRA	Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma 
Fecha Sistema:05/08/2024 Hora:15:52:37	Cedula: 80.063.856 Registro:	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 3189
Fecha: Ago.05/2024

Nombre:	PONARE CHIPIAJE PABLO EMILIO	Edad:	36 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3102892001	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	1125010797	Id:	CC 1.125.010.797		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT	Nro Aten:	13		
T.Atencion:	AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)	Codigo Dx:	J069		

Dias de incapacidad:	3	Fecha Inicial:	Ago.05/2024
Es una prorroga?:	NO	Fecha Final:	Ago.07/2024
Tipo de incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL		

Observaciones: INCAPACIDAD MEDICA POR 3 DIAS.

DIAGNOSTICO: INFECCION RESPIRATORIA ALTA AGUDA.

Firma usuario: _____
Cedula:

Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR

Firma

Fecha Sistema:05/08/2024
Hora:15:51:21

Pagina: 1 de 1
Imprime: CRA

Cedula: 80.063.856
Registro:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4					
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS			Docto Ing:	XB3	38655
			Fecha Ing:	Jul.31/2024	
Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	10:31		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD				

DATOS DE INGRESO

ANAMNESIS

Datos de Llegada Del Paciente: Llego por sus propios medios?: NO, Por cual Medio: MOTO, Estado de Llegada: CONSCIENTE, Estado de Embriaguez: NO.

En Caso De Accidente,Intoxicacion O Violencia: Sitio de ocurrencia: , Causa: , Se notifico a la policia: NO, Se notifico a la Familia: NO.

Motivo de Consulta: DOLOR DE HUESOS, DOLOR DE GARGANTA Y FIEBRE

Enfermedad Actual: PACIENTE MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD PROVIENE DE LA VEREDA MALACIA OMANAPE QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE 4 DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, ARTRALGIA, MIALGIA, FARINGITIS, TOS PRODUCTIVA, SIN ANTECEDENTES RESPIRATORIOS, NIEGA VOMITOS, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR ABDOMINAL, NIEGA SINTOMAS IRRITATIVOS URINARIOS.

Revision por Sistemas: LO REFERIDO EN LA ENFERMEDAD ACTUAL

Antecedentes:

Personales: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Familiares: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Psico-Sociales: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Examen Fisico:

Estado General: AL INGRESO PACIENTE AFEBRIL, LEVE TAQUICARDIA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

Signos Vitales: Peso: 84.20 ** Kg, Talla: 171 Mts, IMC: 0,02, Clasificacion: Bajo Peso, Riegos: Desnutricion, Pulso: 120 Xm, Frecuencia Cardiaca: 120 Xm, Ritmo Cardiaco: NORMAL, Frecuencia Respiratoria: 20, P.Sistolica: 121, P.Diastolica: 71, P.Arterial Media: 87,66, Temperatura: 36,1, Sitio de toma: AXILAR.

Pagina: 1 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:13:05:25	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4					
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS			Docto Ing:	XB3	38655
			Fecha Ing:	Jul.31/2024	
Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	10:31		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD				

Aparatos y Sistemas: PIEL Y FANERAS: NORMAL,. CABEZA: NORMAL,. OJOS: NORMAL,. OIDOS: NORMAL,. BOCA: NORMAL,. GARGANTA: NORMAL,. CUELLO: NORMAL,. TORAX: NORMAL,. SIST.RESPIRATORIO: NORMAL,. SIST.CARDIOVASCULAR: NORMAL,. SIST.VASCULAR PERIFERICO: NORMAL,. ABDOMEN: NORMAL,. SIST.GENITOURINARIO: NORMAL,. TACTO RECTAL: NORMAL,. SIST.LOCOMOTOR: NORMAL,. SIST.NEUROLOGICO: NORMAL,. EX.GANGLIONAR: NORMAL,. EX.MENTAL: NORMAL,. OTROS: NORMAL,. NARIZ: NORMAL.

Paraclinicos:

Laboratorio: EXAMEN: .HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO:NEUTROFILIA
EXAMEN: HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA:NEGATIVO

Otros: NO PRESENTA

Concepto Medico: PACIENTE MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD PROVIENE DE LA VEREDA MALACIA OMANAPE QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE 4 DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, ARTRALGIA, MIALGIA, FARINGITIS, TOS PRODUCTIVA, SIN ANTECEDENTES RESPIRATORIOS, NIEGA VOMITOS, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR ABDOMINAL, NIEGA SINTOMAS IRRITATIVOS URINARIOS. AL INGRESO PACIENTE AFEBRIL, LEVE TAQUICARDIA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, OROFARINGE SIN ALTERACIONES, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. PUÑO PERCUSION BILATERAL NEGATIVA, PULMONES CLAROS VENTILADOS SIN SOBREAGREGADOS. SE INGRESA PARA SOLICITUD DE EXAMANES, DESCARTAR PROCESO INFECCIOSO Y ENFERMEDAD TROPICAL TENIENDO EN CUENTA SINTOMATOLOGIA DE INGRESO. SE REVALORA CON RESULTADOS.

EXAMEN FISICO.
- CABEZA: NORMOCEFALO, SIN EVIDENCIA DE NISTAGMO, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS, NARINAS CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE, DE CONFIGURACION NORMAL, MUCOSA ORAL HUMEDA.
- TORAX: SIMETRICO, EXPANSIBLE, SIN USO DE MUSCULATURA ACCESORIA, PULMONES CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, RUIDOS RESPIRATORIOS BILATERALES SIN AGREGADOS PATOLOGICOS.
- CARDIACO: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, DE BUEN TONO E INTENSIDAD SIN SOPLOS NI AGREGADOS.
- ABDOMEN: NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION SIN EVIDENCIA DE SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS.

Pagina: 2 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:13:05:25	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4					
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS			Docto Ing:	XB3	38655
			Fecha Ing:	Jul.31/2024	
Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	10:31		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD				

- GENITOURINARIO: PUÑO PERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA.
-SNC: ALERTA, CONSCIENTE, ESFERA MENTAL SIN ALTERACIONES.

PLAN
URGENCIAS OBSERVACION
ACETAMINOFEN 1 GR VO EN CASO DE FIEBRE
NAPROXENO 500 MG VO AHORA
GUAYAPROFF 15 CC VO AHORA
SS/ HEMOGRAMA, GOTA GRUESA
REVALORAR

Diagnostico: Dx.Principal: J00X-RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN], Dx.Relacionado1: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Dx.Muerte: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: IMPRESION DIAGNOSTICA, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Obs del Dx: .

Finalidad: Fuente de información: PACIENTE, Finalidad Causa: NO APLICA, Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL, Sintomatico o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Observacion/Tratamiento: Dejar en observación?: SI, Fecha ingreso: Jul.31/2024, Hora ingreso: 10:31, Dejar en tratamiento?: SI, Cubiculo: ** NO EXISTE, Observaciones: .

Datos Salida del Paciente: Dar salida?: NO, Condicion salida del paciente: VIVO, Destino del paciente: ** NO PRESENTA **, Motivo de salida/Egreso: ** NO PRESENTA **, Observaciones: .

PARACLINICOS

LABORATORIO
Examen: HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO ** DATOS LECTURA **Fecha: Jul.31/2024 Hora: 10:31 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

NEUTROFILIA

Examen: HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA ** DATOS LECTURA **Fecha: Jul.31/2024 Hora: 10:31 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

Pagina: 3 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:13:05:25	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4					
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS			Docto Ing:	XB3	38655
			Fecha Ing:	Jul.31/2024	
Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	10:31		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD				

NEGATIVO

OTROS
** NO PRESENTA **

EVOLUCION

Fecha: Jul.31/2024 Hora: 10:31 Nro Atencion: 3 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

PACIENTE MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD PROVIENE DE LA VEREDA MALACIA OMANAPE QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE 4 DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, ARTRALGIA, MIALGIA, FARINGITIS, TOS PRODUCTIVA, SIN ANTECEDENTES RESPIRATORIOS, NIEGA VOMITOS, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR ABDOMINAL, NIEGA SINTOMAS IRRITATIVOS URINARIOS. AL INGRESO PACIENTE AFEBRIL, LEVE TAQUICARDIA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, OROFARINGE SIN ALTERACIONES, ABDOMEN BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO A LA PALPACION SUPERFICIAL O PROFUNDA. PUÑO PERCUSION BILATERAL NEGATIVA, PULMONES CLAROS VENTILADOS SIN SOBREAGREGADOS. SE INGRESA PARA SOLICITUD DE EXAMANES, DESCARTAR PROCESO INFECCIOSO Y ENFERMEDAD TROPICAL TENIENDO EN CUENTA SINTOMATOLOGIA DE INGRESO. SE REVALORA CON RESULTADOS.

EXAMEN FISICO.
- CABEZA: NORMOCEFALO, SIN EVIDENCIA DE NISTAGMO, CONJUNTIVAS NORMOCROMICAS, ESCLERAS ANICTERICAS, NARINAS CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE, DE CONFIGURACION NORMAL, MUCOSA ORAL HUMEDA.
- TORAX: SIMETRICO, EXPANSIBLE, SIN USO DE MUSCULATURA ACCESORIA, PULMONES CON ADECUADA ENTRADA DE AIRE BILATERAL, RUIDOS RESPIRATORIOS BILATERALES SIN AGREGADOS PATOLOGICOS.
- CARDIACO: RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, DE BUEN TONO E INTENSIDAD SIN SOPLOS NI AGREGADOS.
- ABDOMEN: NO DISTENDIDO, BLANDO, DEPRESIBLE, NO DOLOROSO A LA PALPACION SIN EVIDENCIA DE SIGNOS DE IRRITACION PERITONEAL, NO SE PALPAN MASAS NI MEGALIAS.
- GENITOURINARIO: PUÑO PERCUSION RENAL BILATERAL NEGATIVA.
-SNC: ALERTA, CONSCIENTE, ESFERA MENTAL SIN ALTERACIONES.

Pagina: 4 de 7 Imprime: ODMR	Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma
Fecha Sistema:09/08/2024 Hora:13:05:25	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	10:31		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD				

PLAN
URGENCIAS OBSERVACION
ACETAMINOFEN 1 GR VO EN CASO DE FIEBRE
NAPROXENO 500 MG VO AHORA
GUAYAPROFF 15 CC VO AHORA
SS/ HEMOGRAMA, GOTA GRUESA
REVALORAR

Fecha: Jul.31/2024 Hora: 14:10 Nro Atencion: 5 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

PACIENTE MASCULINO DE 30 AÑOS DE EDAD PROVIENE DE LA VEREDA MALACIA OMANAPE QUIEN INGRESA AL SERVICIO DE URGENCIAS POR CUADRO CLINICO DE 4 DIAS DE EVOLUCION CONSISTENTE EN PICOS FEBRILES NO CUANTIFICADOS ASOCIADO A CEFALEA DE MODERADA INTENSIDAD, ARTRALGIA, MIALGIA, FARINGITIS, TOS PRODUCTIVA, SIN ANTECEDENTES RESPIRATORIOS, NIEGA VOMITOS, NIEGA DIARREA, NIEGA DOLOR ABDOMINAL, NIEGA SINTOMAS IRRITATIVOS URINARIOS. EN EL MOMENTO PACIENTE AFEBRIL, SIGNOS VITALES EN META. SE RECIBE RESULTADOS DE PARACLINICOS QUE EVIDENCIAN HEMOGRAMA CON LEVE NEUTROFILIA, RESTO LINEAS CELULARES EN META. SE CONSIDERA CUADRO DE INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS, SIN EMBARGO POR ESTADO CLINICO ACTUAL SE ORDENA INCAPACIDAD MEDICA POR 4 DIAS TENIENDO EN CUENTA TIPO DE OCUPACION DE PACIENTE PARA LOGRAR MEJORIA CLINICA. SE SOLICITA CITA POR CONSULTA EXTERNA EN 4 DIAS. SE DA EGRESO CON FORMULA MEDICA. RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA PARA RECONSULTAR.

PLAN
EGRESO
ACETAMINOFEN TABLETAS, TOMAR UNA TABLETA CADA 6 HORAS POR 3 DIAS
NAPROXENO TABLETAS 250 MG, TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 3 DIAS
GUAYAPROFF JARABE, TOMAR 15 CC CADA 6 HORAS POR 3 DIAS
JERINGA 15 CC
NEBULIZACION CON BERODUAL 20 GOTAS + SSN 0.9% 3 CC CADA 20 MINUTOS POR 1 HORA EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE POR 3 DIAS
CITA POR CONSULTA EXTERNA EN 4 DIAS
SE DAN RECOMENDACIONES Y SIGNOS DE ALARMA

DATOS DE EGRESO

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS
Docto Ing: X83 38655
Fecha Ing: Jul.31/2024

Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	10:31		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD				

2. VENIR EN LOS SIGUIENTES 3 DIAS EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE PARA REALIZACION DE NEBULIZACIONES POR URGENCIAS CON ORDEN DE PROCEDIMIENTO
3. TOMAR MEDICAMENTOS COMO INDICA ORDEN MEDICA
4. EN CASO DE PERSISTIR CON FIEBRE A PESAR DE TOMAR ACETAMINOFEN, SI PRESENTA DIFICULTAD RESPIRATORIA, SI SIENTE OPRESION EN EL PECHO CONSULTAR POR URGENCIAS

INCAPACIDADES - W16 3179 - Jul.31/2024
Dias: 4 Prorroga: Fecha Inicial: Jul.31/2024 Fecha Final: Ago.03/2024 Tipo: ENFERMEDAD GENERAL Observaciones: SE ORDENA INCAPACIDAD MEDICA POR 4 DIAS

BOLETA DE SALIDA - X94 37681 - Jul.31/2024
SALIDA.

NOTAS DE ENFERMERIA

Fecha: Jul.31/2024 Hora: 18:15 Profesional: GOMEZ ESPINOSA BRAYAN STIVEN

ENFERMERIA - NOTAS DE ENFERMERIA - W64 121832
1. 10+31 MEDICO DE TURNO ORDENA ADMINISTRAR 1 GR ACETAMINOFEN VO + SE ADMINISTRA 500 MG NAPROXENO VO + SE ADMINISTRA 15 CC GUAYACOLACO VO
10+40 SE DMINISTRA 15 CC GUAYACOLACO VO + SE ADMINISTRA 1 GR ACETAMINOFEN VO + SE ADMINISTRA 500 MG NAPROXENO VO
10+10 MEDICO DE TURNO ORDENA SALIDA POR MEJORIA.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4
HISTORIA CLINICA DE: EPICRISIS DE ATENCION DE URGENCIAS
Docto Ing: X83 38655
Fecha Ing: Jul.31/2024

Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	SUBSIDIADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Estado Civil:	SOLTERO	Hora Ate:	10:31		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO SUBSIDIAD				

Diagnostico: Dx.Principal: J069-INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESP, Dx.Relacionado1: J00X-RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMUN], Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Dx.Muerte: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: CONFIRMADO REPETIDO, Pronostivo: BUENO, Obs del Dx: .

Datos Salida del Paciente: Dar salida?: SI, Condicion salida del paciente: VIVO, Destino del paciente: DOMICILIO, Motivo de salida/Egreso: CULMINACION, Observaciones: .

CONDUCTAS

Fecha: Jul.31/2024 Hora: 14:10 Profesional: ROYERT PALMA RACHELLE Especialidad: MEDICINA GENERAL

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - W01 95377 - Jul.31/2024
1. ACETAMINOFEN TAB. 500 MG - TAB., Via:ORAL, Cantidad:12, Dosis:TOMAR UNA TABLETA CADA 6 HORAS POR 3 DIAS.
2. NAPROXENO TAB. 250 MG (GENFAR) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:9, Dosis:TOMAR UNA TABLETA CADA 8 HORAS POR 3 DIAS.
3. GUAYACOLATO - SOLUCION ORAL, Via:ORAL, Cantidad:1, Dosis:TOMAR 15 CC CADA 6 HORAS POR 3 DIAS.
4. JERINGA DESECHABLE 20 ML - UNIDAD, Via:ORAL, Cantidad:1, Dosis:PARA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO.
5. MICRONEBULIZADOR ADULTO-EQ - UNIDAD, Via:NO APLICA, Cantidad:1, Dosis:PARA REALIZACION DE NEBULIZACIONES.
6. BERODUAL(FENOTEROLO.SO/ BROMURO IPRATROIO 0.2(GOTAS.NEBULI - SOL.NEBULIZACION, Via:NO APLICA, Cantidad:1, Dosis:PARA REALIZACION DE NEBULIZACIONES.

ORDEN PROCEDIMIENTOS/ACTIVIDADES POS - W09 25158 - Jul.31/2024
1. NEBULIZACION -, Cantidad:18, Obs:NEBULIZACION CON BERODUAL 20 GOTAS + SSN 0.9% 3 CC CADA 20 MINUTOS POR 1 HORA EN LA MAÑANA Y EN LA TARDE POR 3 DIAS.

RECOMENDACIONES - W10 156547 - Jul.31/2024
1. INCAPACIDAD MEDICA POR 4 DIAS

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 3179
Fecha: Jul.31/2024

Nombre:	SOSA GAITAN YORMAN	Edad:	30 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3208480293	Estrato:	VINCULADO-1		
Historia:		Id:	CC 1.136.278.055		
Entidad:	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SAL	Nro Aten:	5		
T.Atencion:	TRATAMIENTO/OBSERVACION URGENCIAS (EVOLUCION)	Codigo Dx:	J069 - J00X		

Dias de incapacidad:	4	Fecha Inicial:	Jul.31/2024
Es una prorroga?:	NO	Fecha Final:	Ago.03/2024
Tipo de incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL		

Observaciones: SE ORDENA INCAPACIDAD MEDICA POR 4 DIAS

Firma usuario: _____ Cedula:		Medico:ROYERT PALMA RACHELLE	Firma Rachele. 1234097735.
Fecha Sistema:31/07/2024 Hora:14:39:25	Pagina: 1 de 1 Imprime: CRA	Cedula: 1.234.097.735 Registro: 1234097735	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4**				
	HISTORIA CLINICA DE: AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)		Atencion:		13
			Fecha:		Ago.12/2024
Nombre:	RIOS GAITAN GUILLERMO	Edad:	64 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3203867679	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	17316132	Id:	CC 17.316.132		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	10:06		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

Concepto Medico: ALERTA, CONCIENTE, NORMOCEFALICO, CAVIDAD ORAL NORMAL, MUCOSAS HUMEDAS Y ROSADAS, RUIDOS CARDIACOS RITMICOS, RUIDOS RESPIRATORIOS CON MURMULLO VESICULAR CONSERVADO, SIN TIRAJES, NO SIGNOS DE DIFICULTAD RESPIRATORIA, TORAX SIMETRICO NORMOEXPANDIBLE , ABDOMEN BLANDO, NO PRESENCIA DE MASA, EXTREMIDADES SIN PRESENCIA DE EDEMA, NEUROLOGICO SIN DEFICIT. USUARIO CON IRA ALTA NO COMPLICADA, SIN SIGNOS DE DIFICULTAD PARA RESPIRAR. SE LE INICIA MANEJO DEL CUADRO CLINICO Y SE DAN RECOMENDACIONES GENERALES. SE ORDENAN PARACLINICOS. CITA CON RESULTADOS DE EXAMENES.

Diagnostico: Dx.Principal: J069-INFECCION AGUDA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESP, Dx.Relacionado1: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado2: ** NO PRESENTA **, Dx.Relacionado3: ** NO PRESENTA **, Tipo de diagnostico: CONFIRMADO NUEVO, Tipo Discapacidad: NINGUNA, Grado Discapacidad: NINGUNA, Obs del Dx: .

Finalidad: Fuente de información: EL MISMO, Finalidad Causa: NO APLICA, Causa Externa: ENFERMEDAD GENERAL, Sintomatico o Respiratorio: NO, Paciente Nuevo: NO.

Conductas: Se envia:

ORDEN MEDICAMENTOS P.O.S - W01 95641 - Ago.12/2024

1. ACETAMINOFEN TAB. 500 MG - TAB., Via:ORAL, Cantidad:40, Dosis:1 TABLETA CADA 6 HORAS.
2. ASCORBICO ACIDO 500 MG TAB (MERCK) - TAB., Via:ORAL, Cantidad:10, Dosis:1 TABLETA CADA DIA.
3. SALES DE REHIDRAT. POLVO P´RECONST.(LABINCO) - POLVO P RECONSTRUIR, Via:ORAL, Cantidad:4, Dosis:DILUIR 1 SOBRE EN 1 LITRO DE AGUA HERVIDA. TOMAR 200 ML CADA 1 HORA.
4. DIHIDROCODEINA JBE 12,1 MG/ - FCO X 120ML, Via:ORAL, Cantidad:2, Dosis:10 ML CADA 6 HORAS.
5. JERINGA DESECHABLE 10 ML - UNIDAD, Via:NO APLICA, Cantidad:1, Dosis:..

ORDEN DE LABORATORIO - W05 39338 - Ago.12/2024

1. HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITO -, Cantidad:1, Obs:.
2. HEMOPARASITOS EXTENDIDO DE GOTA GRUESA -, Cantidad:1, Obs:.
3. Dengue ANTICUERPOS Ig G -, Cantidad:1, Obs:.
4. Dengue ANTICUERPOS Ig M -, Cantidad:1, Obs:.
5. UROANALISIS -, Cantidad:1, Obs:.

RECOMENDACIONES - W10 157089 - Ago.12/2024

Pagina: 2 de 3 Imprime: ODMR	Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma
Fecha Sistema:12/08/2024 Hora:10:47:14	Cedula: 80.063.856 Registro:	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Nit: 842.000.004-4		
	HISTORIA CLINICA DE: AMBULATORIA (CONSULTA 1RA VEZ MEDICINA GENERAL)	Atencion:	13
		Fecha:	Ago.12/2024

Nombre:	RIOS GAITAN GUILLERMO	Edad:	64 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3203867679	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	17316132	Id:	CC 17.316.132		
Estado Civil:	UNIÓN LIBRE	Hora Ate:	10:06		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT				

ANAMNESIS

Motivo de Consulta: TENGO GRIPA Y ORINO POCO

Enfermedad Actual: USUARIO DE 64 AÑOS, ACUDE POR PRESENTAR DESDE HACE 6 DIAS, CUADRO CLINICO DE TOS, DOLOR DE CABEZA, FIEBRE, ESCALOFRIOS, DOLOR DE GRGANTA, MALESTAR GENERAL, RINORREA, HIPOREXIA. NIEGA OTROS SINTOMAS.

Revision por Sistemas: FIEBRE. TOS

Antecedentes:

Personales: TOXICO-ALERGICOS: NIEGA. QUIRURGICOS: NIEGA. TRAUMATICOS: NIEGA TODOS. PATOLOGICOS: NIEGA

Familiares: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Psico-Sociales: **NO REFIERE NINGUN ANTECEDENTE**

Examen Fisico:

Estado General: BUENO

Signos Vitales: Peso: 53.40 KG Kg, Talla: 153 Mts, IMC: 22,81, Clasificacion: Rango Normal, Riegos: Promedio, Pulso: 87 Xm, Frecuencia Cardiaca: 87 Xm, Ritmo Cardiaco: NORMAL, Frecuencia Respiratoria: 21, P.Sistolica: 90, P.Diastolica: 40, P.Arterial Media: 56,66, Temperatura: 36, Sitio de toma: AXILAR.

Aparatos y Sistemas: PIEL Y FANERAS: NORMAL,. CABEZA: NORMAL,. OJOS: NORMAL,. OIDOS: NORMAL,. BOCA: NORMAL,. GARGANTA: NORMAL,. CUELLO: NORMAL,. TORAX: NORMAL,. SIST.RESPIRATORIO: NORMAL,. SIST.CARDIOVASCULAR: NORMAL,. SIST.VASCULAR PERIFERICO: NORMAL,. ABDOMEN: NORMAL,. SIST.GENITOURINARIO: NORMAL,. TACTO RECTAL: NORMAL,. SIST.LOCOMOTOR: NORMAL,. SIST.NEUROLOGICO: NORMAL,. EX.GANGLIONAR: NORMAL,. EX.MENTAL: NORMAL,. OTROS: NORMAL,. NARIZ: NORMAL,

Paraclinicos:

Laboratorio: NO PRESENTA

Otros: NO PRESENTA

Pagina: 1 de 3 Imprime: ODMR	Medico:GUERRA ESTRADA LEIVAR	Firma
Fecha Sistema:12/08/2024 Hora:10:47:14	Cedula: 80.063.856 Registro:	

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Puerto Carreño - Vichada.

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E
Nit: 842.000.004-4

INCAPACIDADES

Docto Nro: W16 3208
Fecha: Ago.16/2024

Nombre:	RIOS GAITAN GUILLERMO	Edad:	64 Años	Sexo:	MASCULINO
Telefono:	3203867679	Estrato:	CONTRIBUTIVO-1		
Historia:	17316132	Id:	CC 17.316.132		
Entidad:	MALLAMAS EPSI EVENTO CONTRIBUT	Nro Aten:	14		
T.Atencion:	CONSULTA DE URGENCIAS	Codigo Dx:	J00X		

Dias de incapacidad:	3	Fecha Inicial:	Ago.16/2024
Es una prorroga?:	NO	Fecha Final:	Ago.18/2024
Tipo de incapacidad:	ENFERMEDAD GENERAL		

Observaciones: SE EXPIDE INCAPACIDAD POR 3 DIAS

Firma usuario: _____
Cedula:

Medico:HERRERA GARZON CRISTIAN FABIAN
Cedula: 1.121.954.079
Registro: 1121954079
Firma

Fecha Sistema:16/08/2024
Hora:10:39:56

Pagina: 1 de 1
Imprime: LLAA

PLANILLAS DE CHARLAS

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR: CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD

FECHA: Viernes 02 de agosto de 2024 HORA: 7:00 AM

		# DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1	cc	1124990520	Alfredo Rodriguez Guevara	Ayudante de obra	
2	CC	1125002345	Costmeth Damian Zuluaga Bonilla	ayudante de obra	
3	cc	8190705	Felix Luis Sanches Gondellez	Ayudante de obra	enFermo
4	cc	6848517	Bilcen Reina Galindo	Ayudante de obra	enFermo
5	cc	1006950328	Jairo Gaitan Galindo	Ayudante de obra	
6	cc	1124990631	Charles Brayan Reina Capa	Ayudante de obra	no vino
7	cc	1124993310	Ciro Jair Arango Castillo	Ayudante de obra	
8	cc	1006951188	Hector Cipriano Sanches Errenuma	Ayudante de obra	
9	cc	1125007320	Antonio Enrrique Jimenez Perez	Ayudante de obra	incapacitado
10	cc	5722870	Jose Enrique Ponare	Ayudante de obra	
11	cc	1125010065	Aristidez Hernandez Larrosa G	Ayudante de obra	
12	cc	1127382860	Orlando Fonseca Gomez	Ayudante de obra	
13	cc	1124993341	Nestor Jair Algarra Perez	Ayudante de obra	
14	cc	1124991167	Rafael Arcangel Mendez Rivas	Ayudante de obra	incapacitado
15	cc	1124998948	Luis Emiro Ponare Ponare	Ayudante de obra	
16	cc	1192772735	Leydy katherine Salcedo Rodriguez	Almacenista	
17	cc	1127390922	Alex Consolacion Rodriguez	Maestro Estructural	
18	cc	17588928	Jhon Jairo Grisales Rincon	Soldador	
19	cc	1193117578	Dubier Arley Robayo Ospina	Ayudante soldador	incapacitado
20	cc	1121994520	Herney Antonio Ruiz Chipiaje	Ayudante de obra	
21	cc	1125004538	Aries German Agudelo Bonilla	Ayudante de obra	
22	cc	1124994614	Hosman Cardona Rodriguez	Ayudante de obra	
23	cc	1124991490	Jhon Fredy Cariban Diaz	Ayudante de obra	
24	cc	1124991155	Santiago Amaya Gaitan	Ayudante de obra	
25	cc	17316132	Guillermo Rio Gaitan	Ayudante de obra	
26	cc	1125001121	Diomedez Silva Perez	Ayudante de obra	
27	cc	18262093	Enrrique Cariban Rodriguez	Ayudante de obra	
28	cc	6848141	Julio Cesar Ponare Gaitan	Ayudante de obra	Julio Cesar Ponare
29	cc	1125010797	Pablo Emilio Chipiaje Ponare	Ayudante de obra	
30	cc	6848740	Ramon Arturo Ponare Chipiaje	Ayudante de obra	
31	cc	1124989245	Cesar Augusto Barrera Mancipe	Ayudante de obra	
32	cc	1006651096	Fabian Ricardo Buitrago Otalora	Ayudante de obra	
33	cc	1119890549	Jose Antonio Dasilva Forero	Ayudante de obra	
34	cc	7243305	Jairo HumbertoGomez Gaitan	Ayudante de obra	
35	cc	1192757402	Jorge Darbey Sanchez Cariban	Ayudante de obra	
36	cc	1124990124	Edwin Andres Novoa Pulido	Ayudante de obra	
37	cc	1136278055	Yorman Sosa Gaitan	Ayudante de obra	incapacitado
38	cc	1124990027	Jhorman Samuel Ponare Ponare	Ayudante de obra	
39	cc	1124996599	Wilson Ponare Ponare	Ayudanye de obra	
40	cc	1125003293	Brian Farid vargas Salcedo	Ayudante de obra	

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional FIRMA

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR: CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD

FECHA: viernes 02 de agosto de 2024 HORA: 7:00 AM

	# DOCUMENTO		NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1	cc	1124990520	Alfredo Rodriguez Guevara	Ayudante de obra	
2	CC	1125002345	Costmeth Damian Zuluaga Bonilla	ayudante de obra	
3	cc	8190705	Felix Luis Sanches Gondellez	Ayudante de obra	enFermo
4	cc	6848517	Bilcen Reina Galindo	Ayudante de obra	enFermo
5	cc	1006950328	Jairo Gaitan Galindo	Ayudante de obra	
6	cc	1124990631	Charles Brayan Reina Capa	Ayudante de obra	no vino
7	cc	1124993310	Ciro Jair Arango Castillo	Ayudante de obra	CE.
8	cc	1006951188	Hector Cipriano Sanches Errenuma	Ayudante de obra	Hector
9	cc	1125007320	Antonio Enrrique Jimenez Perez	Ayudante de obra	incapacitado
10	cc	5722870	Jose Enrique Ponare	Ayudante de obra	
11	cc	1125010065	Aristidez Hernandez Larrosa G	Ayudante de obra	
12	cc	1127382860	Orlando Fonseca Gomez	Ayudante de obra	
13	cc	1124993341	Nestor Jair Algarra Perez	Ayudante de obra	
14	cc	1124991167	Rafael Arcangel Mendez Rivas	Ayudante de obra	incapacitado
15	cc	1124998948	Luis Emiro Ponare Ponare	Ayudante de obra	Luis Emiro Ponare
16	cc	1192772735	Leydy katherine Salcedo Rodriguez	Almacenista	Leidy Salcedo.
17	cc	1127390922	Alex Consolacion Rodriguez	Maestro Estructural	
18	cc	17588928	Jhon Jairo Grisales Rincon	Soldador	
19	cc	1193117578	Dubier Arley Robayo Ospina	Ayudante soldador	incapacitado
20	cc	1121994520	Herney Antonio Ruiz Chipiaje	Ayudante de obra	
21	cc	1125004538	Aries German Agudelo Bonilla	Ayudante de obra	
22	cc	1124994614	Hosman Cardona Rodriguez	Ayudante de obra	
23	cc	1124991490	Jhon Fredy Cariban Diaz	Ayudante de obra	
24	cc	1124991155	Santiago Amaya Gaitan	Ayudante de obra	
25	cc	17316132	Guillermo Rio Gaitan	Ayudante de obra	
26	cc	1125001121	Diomedez Silva Perez	Ayudante de obra	
27	cc	18262093	Enrrique Cariban Rodriguez	Ayudante de obra	
28	cc	6848141	Julio Cesar Ponare Gaitan	Ayudante de obra	Julio Cesar Ponare
29	cc	1125010797	Pablo Emilio Chipiaje Ponare	Ayudante de obra	Ramon A. P.
30	cc	6848740	Ramon Arturo Ponare Chipiaje	Ayudante de obra	Pablo Emilio
31	cc	1124989245	Cesar Augusto Barrera Mancipe	Ayudante de obra	Cesar B.
32	cc	1006651096	Fabian Ricardo Buitrago Otalora	Ayudante de obra	
33	cc	1119890549	Jose Antonio Dasilva Forero	Ayudante de obra	
34	cc	7243305	Jairo HumbertoGomez Gaitan	Ayudante de obra	Jairo Humberto G.
35	cc	1192757402	Jorge Darbey Sanchez Cariban	Ayudante de obra	Jorge Sanchez
36	cc	1124990124	Edwin Andres Novoa Pulido	Ayudante de obra	
37	cc	1136278055	Yorman Sosa Gaitan	Ayudante de obra	incapacitado
38	cc	1124990027	Jhorman Samuel Ponare Ponare	Ayudante de obra	
39	cc	1124996599	Wilson Ponare Ponare	Ayudanye de obra	
40	cc	1125003293	Brian Farid vargas Salcedo	Ayudante de obra	Brian Vargas S.

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional FIRMA

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR: CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD

FECHA: Lunes 05 de Agosto de 2024 **HORA:** 7:00 AM

	# DOCUMENTO		NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1	cc	1124990520	Alfredo Rodriguez Guevara	Ayudante de obra	
2	CC	1125002345	Costmeth Damian Zuluaga Bonilla	ayudante de obra	
3	cc	8190705	Felix Luis Sanches Gondellez	Ayudante de obra	
4	cc	6848517	Bilcen Reina Galindo	Ayudante de obra	Incapacitado
5	cc	1006950328	Jairo Gaitan Galindo	Ayudante de obra	no vino
6	cc	1124990631	Charles Brayan Reina Capa	Ayudante de obra	no vino
7	cc	1124993310	Ciro Jair Arango Castillo	Ayudante de obra	
8	cc	1006951188	Hector Cipriano Sanches Errenuma	Ayudante de obra	no vino
9	cc	1125007320	Antonio Enrrique Jimenez Perez	Ayudante de obra	
10	cc	5722870	Jose Enrique Ponare	Ayudante de obra	
11	cc	1125010065	Aristidez Hernandez Larrosa G	Ayudante de obra	
12	cc	1127382860	Orlando Fonseca Gomez	Ayudante de obra	
13	cc	1124993341	Nestor Jair Algarra Perez	Ayudante de obra	
14	cc	1124991167	Rafael Arcangel Mendez Rivas	Ayudante de obra	
15	cc	1124998948	Luis Emiro Ponare Ponare	Ayudante de obra	Luis Emiro Ponare
16	cc	1192772735	Leydy katherine Salcedo Rodriguez	Almacenista	
17	cc	1127390922	Alex Consolacion Rodriguez	Maestro Estructural	
18	cc	17588928	Jhon Jairo Grisales Rincon	Soldador	no vino
19	cc	1193117578	Dubier Arley Robayo Ospina	Ayudante soldador	
20	cc	1121994520	Herney Antonio Ruiz Chipiaje	Ayudante de obra	
21	cc	1125004538	Aries German Agudelo Bonilla	Ayudante de obra	
22	cc	1124994614	Hosman Cardona Rodriguez	Ayudante de obra	
23	cc	1124991490	Jhon Fredy Cariban Diaz	Ayudante de obra	
24	cc	1124991155	Santiago Amaya Gaitan	Ayudante de obra	
25	cc	17316132	Guillermo Rio Gaitan	Ayudante de obra	
26	cc	1125001121	Diomedez Silva Perez	Ayudante de obra	
27	cc	18262093	Enrrique Cariban Rodriguez	Ayudante de obra	
28	cc	6848141	Julio Cesar Ponare Gaitan	Ayudante de obra	Julio Cesar P
29	cc	1125010797	Pablo Emilio Chipiaje Ponare	Ayudante de obra	Incapacitado
30	cc	6848740	Ramon Arturo Ponare Chipiaje	Ayudante de obra	Ramon Arturo Ponare
31	cc	1124989245	Cesar Augusto Barrera Mancipe	Ayudante de obra	
32	cc	1006651096	Fabian Ricardo Buitrago Otalora	Ayudante de obra	Incapacitado
33	cc	1119890549	Jose Antonio Dasilva Forero	Ayudante de obra	
34	cc	7243305	Iairo HumbertoGomez Gaitan	Ayudante de obra	
35	cc	1192757402	Jorge Darbey Sanchez Cariban	Ayudante de obra	
36	cc	1124990124	Edwin Andres Novoa Pulido	Ayudante de obra	Incapacitado
37	cc	1136278055	Yorman Sosa Gaitan	Ayudante de obra	yorman
38	cc	1124990027	Jhorman Samuel Ponare Ponare	Ayudante de obra	
39	cc	1124996599	Wilson Ponare Ponare	Ayudanye de obra	
40	cc	1125003293	Brian Farid vargas Salcedo	Ayudante de obra	Brayan Vargas

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional

FIRMA

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR: CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD

FECHA: viernes 09 de Agosto de 2024 **HORA:** 7:00 AM

	# DOCUMENTO		NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1	cc	1124990520	Alfredo Rodriguez Guevara	Ayudante de obra	
2	CC	1125002345	Costmeth Damian Zuluaga Bonilla	ayudante de obra	
3	cc	8190705	Felix Luis Sanches Gondellez	Ayudante de obra	
4	cc	6848517	Bilcen Reina Galindo	Ayudante de obra	Incapacitado
5	cc	1006950328	Jairo Gaitan Galindo	Ayudante de obra	
6	cc	1124990631	Charles Brayan Reina Capa	Ayudante de obra	
7	cc	1124993310	Ciro Jair Arango Castillo	Ayudante de obra	
8	cc	1006951188	Hector Cipriano Sanches Errenuma	Ayudante de obra	
9	cc	1125007320	Antonio Enrrique Jimenez Perez	Ayudante de obra	
10	cc	5722870	Jose Enrique Ponare	Ayudante de obra	
11	cc	1125010065	Aristidez Hernandez Larrosa G	Ayudante de obra	
12	cc	1127382860	Orlando Fonseca Gomez	Ayudante de obra	
13	cc	1124993341	Nestor Jair Algarra Perez	Ayudante de obra	
14	cc	1124991167	Rafael Arcangel Mendez Rivas	Ayudante de obra	
15	cc	1124998948	Luis Emiro Ponare Ponare	Ayudante de obra	
16	cc	1192772735	Leydy katherine Salcedo Rodriguez	Almacenista	
17	cc	1127390922	Alex Consolacion Rodriguez	Maestro Estructural	
18	cc	17588928	Jhon Jairo Grisales Rincon	Soldador	
19	cc	1193117578	Dubier Arley Robayo Ospina	Ayudante soldador	
20	cc	1121994520	Herney Antonio Ruiz Chipiaje	Ayudante de obra	
21	cc	1125004538	Aries German Agudelo Bonilla	Ayudante de obra	
22	cc	1124994614	Hosman Cardona Rodriguez	Ayudante de obra	
23	cc	1124991490	Jhon Fredy Cariban Diaz	Ayudante de obra	
24	cc	1124991155	Santiago Amaya Gaitan	Ayudante de obra	
25	cc	17316132	Guillermo Rio Gaitan	Ayudante de obra	enfermo
26	cc	1125001121	Diomedez Silva Perez	Ayudante de obra	
27	cc	18262093	Enrrique Cariban Rodriguez	Ayudante de obra	
28	cc	6848141	Julio Cesar Ponare Gaitan	Ayudante de obra	Julio Cesar P.
29	cc	1125010797	Pablo Emilio Chipiaje Ponare	Ayudante de obra	Pablo emilio
30	cc	6848740	Ramon Arturo Ponare Chipiaje	Ayudante de obra	Ramon Arturo Pon.
31	cc	1124989245	Cesar Augusto Barrera Mancipe	Ayudante de obra	cesar B
32	cc	1006651096	Fabian Ricardo Buitrago Otalora	Ayudante de obra	
33	cc	1119890549	Jose Antonio Dasilva Forero	Ayudante de obra	
34	cc	7243305	Jairo HumbertoGomez Gaitan	Ayudante de obra	~~Julio Gomez~~
35	cc	1192757402	Jorge Darbey Sanchez Cariban	Ayudante de obra	Jorge Sanchez
36	cc	1124990124	Edwin Andres Novoa Pulido	Ayudante de obra	
37	cc	1136278055	Yorman Sosa Gaitan	Ayudante de obra	Yorman
38	cc	1124990027	Jhorman Samuel Ponare Ponare	Ayudante de obra	
39	cc	1124996599	Wilson Ponare Ponare	Ayudanye de obra	
40	cc	1125003293	Brian Farid vargas Salcedo	Ayudante de obra	Brayan Vargas S.

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional

FIRMA

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR:			**CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD**		
FECHA:			Viernes 09 de Agosto de 2024	**HORA:**	7:00 AM
	# DOCUMENTO		**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**	**FIRMA**
1	cc	1124990520	Alfredo Rodriguez Guevara	Ayudante de obra	
2	CC	1125002345	Costmeth Damian Zuluaga Bonilla	ayudante de obra	
3	cc	8190705	Felix Luis Sanches Gondellez	Ayudante de obra	
4	cc	6848517	Bilcen Reina Galindo	Ayudante de obra	incapacitado
5	cc	1006950328	Jairo Gaitan Galindo	Ayudante de obra	
6	cc	1124990631	Charles Brayan Reina Capa	Ayudante de obra	
7	cc	1124993310	Ciro Jair Arango Castillo	Ayudante de obra	
8	cc	1006951188	Hector Cipriano Sanches Errenuma	Ayudante de obra	
9	cc	1125007320	Antonio Enrrique Jimenez Perez	Ayudante de obra	
10	cc	5722870	Jose Enrique Ponare	Ayudante de obra	
11	cc	1125010065	Aristidez Hernandez Larrosa G	Ayudante de obra	
12	cc	1127382860	Orlando Fonseca Gomez	Ayudante de obra	
13	cc	1124993341	Nestor Jair Algarra Perez	Ayudante de obra	
14	cc	1124991167	Rafael Arcangel Mendez Rivas	Ayudante de obra	
15	cc	1124998948	Luis Emiro Ponare Ponare	Ayudante de obra	
16	cc	1192772735	Leydy katherine Salcedo Rodriguez	Almacenista	
17	cc	1127390922	Alex Consolacion Rodriguez	Maestro Estructural	
18	cc	17588928	Jhon Jairo Grisales Rincon	Soldador	
19	cc	1193117578	Dubier Arley Robayo Ospina	Ayudante soldador	
20	cc	1121994520	Herney Antonio Ruiz Chipiaje	Ayudante de obra	
21	cc	1125004538	Aries German Agudelo Bonilla	Ayudante de obra	
22	cc	1124994614	Hosman Cardona Rodriguez	Ayudante de obra	
23	cc	1124991490	Jhon Fredy Cariban Diaz	Ayudante de obra	
24	cc	1124991155	Santiago Amaya Gaitan	Ayudante de obra	
25	cc	17316132	Guillermo Rio Gaitan	Ayudante de obra	enfermo
26	cc	1125001121	Diomedez Silva Perez	Ayudante de obra	
27	cc	18262093	Enrrique Cariban Rodriguez	Ayudante de obra	
28	cc	6848141	Julio Cesar Ponare Gaitan	Ayudante de obra	Julio Cesar P.
29	cc	1125010797	Pablo Emilio Chipiaje Ponare	Ayudante de obra	Pablo Emilio
30	cc	6848740	Ramon Arturo Ponare Chipiaje	Ayudante de obra	Ramon Arturo Pon
31	cc	1124989245	Cesar Augusto Barrera Mancipe	Ayudante de obra	cesar B
32	cc	1006651096	Fabian Ricardo Buitrago Otalora	Ayudante de obra	
33	cc	1119890549	Jose Antonio Dasilva Forero	Ayudante de obra	
34	cc	7243305	Jairo HumbertoGomez Gaitan	Ayudante de obra	Jairo Gomez
35	cc	1192757402	Jorge Darbey Sanchez Cariban	Ayudante de obra	Jorge Sanchez
36	cc	1124990124	Edwin Andres Novoa Pulido	Ayudante de obra	
37	cc	1136278055	Yorman Sosa Gaitan	Ayudante de obra	Yorman
38	cc	1124990027	Jhorman Samuel Ponare Ponare	Ayudante de obra	
39	cc	1124996599	Wilson Ponare Ponare	Ayudanye de obra	
40	cc	1125003293	Brian Farid vargas Salcedo	Ayudante de obra	Brayan Vargas S.

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional **FIRMA**

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR:			**CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD**		
FECHA:			Miercoles 14 de Agosto de 2024	**HORA:**	7:00 AM
	# DOCUMENTO		**NOMBRE Y APELLIDO**	**CARGO**	**FIRMA**
1	cc	1124990520	Alfredo Rodriguez Guevara	Ayudante de obra	
2	CC	1125002345	Costmeth Damian Zuluaga Bonilla	ayudante de obra	
3	cc	8190705	Felix Luis Sanches Gondellez	Ayudante de obra	
4	cc	6848517	Bilcen Reina Galindo	Ayudante de obra	
5	cc	1006950328	Jairo Gaitan Galindo	Ayudante de obra	
6	cc	1124990631	Charles Brayan Reina Capa	Ayudante de obra	
7	cc	1124993310	Ciro Jair Arango Castillo	Ayudante de obra	
8	cc	1006951188	Hector Cipriano Sanches Errenuma	Ayudante de obra	Hector Sanchez
9	cc	1125007320	Antonio Enrrique Jimenez Perez	Ayudante de obra	
10	cc	5722870	Jose Enrique Ponare	Ayudante de obra	
11	cc	1125010065	Aristidez Hernandez Larrosa G	Ayudante de obra	
12	cc	1127382860	Orlando Fonseca Gomez	Ayudante de obra	
13	cc	1124993341	Nestor Jair Algarra Perez	Ayudante de obra	
14	cc	1124991167	Rafael Arcangel Mendez Rivas	Ayudante de obra	
15	cc	1124998948	Luis Emiro Ponare Ponare	Ayudante de obra	
16	cc	1192772735	Leydy katherine Salcedo Rodriguez	Almacenista	
17	cc	1127390922	Alex Consolacion Rodriguez	Maestro Estructural	
18	cc	17588928	Jhon Jairo Grisales Rincon	Soldador	
19	cc	1193117578	Dubier Arley Robayo Ospina	Ayudante soldador	
20	cc	1121994520	Herney Antonio Ruiz Chipiaje	Ayudante de obra	
21	cc	1125004538	Aries German Agudelo Bonilla	Ayudante de obra	
22	cc	1124994614	Hosman Cardona Rodriguez	Ayudante de obra	
23	cc	1124991490	Jhon Fredy Cariban Diaz	Ayudante de obra	
24	cc	1124991155	Santiago Amaya Gaitan	Ayudante de obra	
25	cc	17316132	Guillermo Rio Gaitan	Ayudante de obra	
26	cc	1125001121	Diomedez Silva Perez	Ayudante de obra	
27	cc	18262093	Enrrique Cariban Rodriguez	Ayudante de obra	
28	cc	6848141	Julio Cesar Ponare Gaitan	Ayudante de obra	Julio Cesar Ponare
29	cc	1125010797	Pablo Emilio Chipiaje Ponare	Ayudante de obra	Pablo Emilio
30	cc	6848740	Ramon Arturo Ponare Chipiaje	Ayudante de obra	Ramón Arturo P.
31	cc	1124989245	Cesar Augusto Barrera Mancipe	Ayudante de obra	Cesar B.
32	cc	1006651096	Fabian Ricardo Buitrago Otalora	Ayudante de obra	
33	cc	1119890549	Jose Antonio Dasilva Forero	Ayudante de obra	
34	cc	7243305	Jairo HumbertoGomez Gaitan	Ayudante de obra	Jairo Gomez
35	cc	1192757402	Jorge Darbey Sanchez Cariban	Ayudante de obra	Jorge Sanchez
36	cc	1124990124	Edwin Andres Novoa Pulido	Ayudante de obra	
37	cc	1136278055	Yorman Sosa Gaitan	Ayudante de obra	yorman
38	cc	1124990027	Jhorman Samuel Ponare Ponare	Ayudante de obra	
39	cc	1124996599	Wilson Ponare Ponare	Ayudanye de obra	
40	cc	1125003293	Brian Farid vargas Salcedo	Ayudante de obra	Brayan Vargas S.

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional FIRMA

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR: CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD

FECHA: Miércoles 21 de agosto de 2024 HORA: 7:00 AM

	# DOCUMENTO		NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1	cc	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY	ADM.SISO	Noelly Galviz B
2	cc	1192772735	SALCEDO RODRIGUEZ LEIDY	ALMACENISTA	Leidy Salcedo.
3	cc	1124998948	PONARE PONARE LUIS EMIRO	AYUDANTE DE BODEGA	Luis Emiro Ponare
4	cc	17588928	GRISALES RINCON JHON JAIRO	SOLDADOR	
5	cc	1193117578	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	AYUDANTE SOLDADOR	
6	cc	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JAIR	MAESTRO	
7	cc	1127390922	RODRIGUEZ CONSOLACION ALEX	MAESTRO	
8	cc	8190705	SANCHEZ GONDELLEZ FELIX LUIS	MAESTRO	
9	cc	11280464	ALFONSO ALGARRA LUIS GERARDO	CELADOR	
10	cc	1125004538	AGUDELO BONILLA ARIES GERMAN	AYUDANTE DE OBRA	
11	cc	1124991155	AMAYA GAITAN SANTIAGO	AYUDANTE DE OBRA	
12	cc	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO	AYUDANTE DE OBRA	
13	cc	18262093	CARIBAN RODRIGUEZ ENRRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	
14	cc	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	AYUDANTE DE OBRA	Jhon Fredy
15	cc	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN	AYUDANTE DE OBRA	Permiso
16	cc	1124991490	FONSECA GOMEZ ORLANDO	AYUDANTE DE OBRA	Orl Fonseca
17	cc	1006950328	GAITAN GALINDO JAIRO	AYUDANTE DE OBRA	
18	cc	1125007320	JIMENEZ PEREZ ANTONIO ENRRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	
19	cc	1125010065	LARROSA GONZALEZ ARISTIDEZ HERNA	AYUDANTE DE OBRA	
20	cc	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL	AYUDANTE DE OBRA	
21	cc	1124990520	RODRIGUEZ GUEVARA ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	
22	cc	1124990631	REINA CAPA CHARLES BRAYAN	AYUDANTE DE OBRA	Charles
23	cc	6848517	REINA GALINDO BILCEN	AYUDANTE DE OBRA	
24	cc	17316132	RIOS GAITAN GUILLERMO	AYUDANTE DE OBRA	
25	cc	1121944520	RUIZ CHIPIAJE HERNEY ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	
26	cc	1006951188	SANCHEZ ERRENUMA HECTOR SANCHE	AYUDANTE DE OBRA	Hector Sanchez
27	cc	1125001121	SILVA PEREZ DIOMEDEZ	AYUDANTE DE OBRA	
28	cc	5722870	PONARE JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	
29	cc	6848141	PONARE GAITAN JULIO CESAR	AYUDANTE DE OBRA	Julio Cesar Ponare
30	cc	1125010797	PONARE CHIPIAJE PABLO EMILIO	AYUDANTE DE OBRA	Pablo Emilio
31	cc	6848740	PONARE CHIPIAJE RAMON ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	Ramon Arturo Ponare
32	cc	1125002345	BONILLA ZULUAGA COSTMETH DAMIAN	AYUDANTE DE OBRA	
33	cc	1124989245	BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO	AYUDANTE DE OBRA	Cesar B.
34	cc	1006951096	BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO	AYUDANTE DE OBRA	
35	cc	1119890549	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	
36	cc	7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO	AYUDANTE DE OBRA	Jairo Gomez
37	cc	1192757402	SANCHEZ CARIBAN JORGE DARBEY	AYUDANTE DE OBRA	Jorge Sanchez
38	cc	1124990124	NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	
39	cc	1136278055	SOSA GAITAN YORMA	AYUDANTE DE OBRA	Yorma
40	cc	1124990027	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL	AYUDANTE DE OBRA	
41	cc	1124996599	PONARE PONARE WILSON	AYUDANTE DE OBRA	
42	cc	1125003293	VARGAS SALCEDO BRIAN FARID	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Vargas S.

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional

FIRMA

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

CONSORCIO HDC

LUGAR: CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD

FECHA: Lunes 26 de Agosto de 2019 HORA: 7:00 AM

		# DOCUMENTO	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
1	cc	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY	ADM.SISO	
2	cc	1192772735	SALCEDO RODRIGUEZ LEIDY	ALMACENISTA	Leidy Salcedo
3	cc	1124998948	PONARE PONARE LUIS EMIRO	AYUDANTE DE BODEGA	
4	cc	17588928	GRISALES RINCON JHON JAIRO	SOLDADOR	
5	cc	1193117578	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY	AYUDANTE SOLDADOR	
6	cc	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JAIR	MAESTRO	
7	cc	1127390922	RODRIGUEZ CONSOLACION ALEX	MAESTRO	
8	cc	8190705	SANCHEZ GONDELLEZ FELIX LUIS	MAESTRO	
9	cc	11280464	ALFONSO ALGARRA LUIS GERARDO	CELADOR	
10	cc	1125004538	AGUDELO BONILLA ARIES GERMAN	AYUDANTE DE OBRA	
11	cc	1124991155	AMAYA GAITAN SANTIAGO	AYUDANTE DE OBRA	
12	cc	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO	AYUDANTE DE OBRA	
13	cc	18262093	CARIBAN RODRIGUEZ ENRRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	
14	cc	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY	AYUDANTE DE OBRA	
15	cc	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN	AYUDANTE DE OBRA	
16	cc	1124991490	FONSECA GOMEZ ORLANDO	AYUDANTE DE OBRA	
17	cc	1006950328	GAITAN GALINDO JAIRO	AYUDANTE DE OBRA	
18	cc	1125007320	JIMENEZ PEREZ ANTONIO ENRRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	
19	cc	1125010065	LARROSA GONZALEZ ARISTIDEZ HERN	AYUDANTE DE OBRA	
20	cc	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL	AYUDANTE DE OBRA	
21	cc	1124990520	RODRIGUEZ GUEVARA ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	
22	cc	1124990631	REINA CAPA CHARLES BRAYAN	AYUDANTE DE OBRA	
23	cc	6848517	REINA GALINDO BILCEN	AYUDANTE DE OBRA	
24	cc	17316132	RIOS GAITAN GUILLERMO	AYUDANTE DE OBRA	
25	cc	1121944520	RUIZ CHIPIAJE HERNEY ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	
26	cc	1006951188	SANCHEZ ERRENUMA HECTOR SANCHE	AYUDANTE DE OBRA	
27	cc	1125001121	SILVA PEREZ DIOMEDEZ	AYUDANTE DE OBRA	
28	cc	5722870	PONARE JOSE ENRIQUE	AYUDANTE DE OBRA	
29	cc	6848141	PONARE GAITAN JULIO CESAR	AYUDANTE DE OBRA	Julio Cesar P.
30	cc	1125010797	PONARE CHIPIAJE PABLO EMILIO	AYUDANTE DE OBRA	Pablo Emilio
31	cc	6848740	PONARE CHIPIAJE RAMON ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	Ramón Arturo P.
32	cc	1125002345	BONILLA ZULUAGA COSTMETH DAMIAN	AYUDANTE DE OBRA	
33	cc	1124989245	BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO	AYUDANTE DE OBRA	
34	cc	1006951096	BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO	AYUDANTE DE OBRA	
35	cc	1119890549	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	
36	cc	7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO	AYUDANTE DE OBRA	
37	cc	1192757402	SANCHEZ CARIBAN JORGE DARBEY	AYUDANTE DE OBRA	
38	cc	1124990124	NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES	AYUDANTE DE OBRA	
39	cc	1136278055	SOSA GAITAN YORMA	AYUDANTE DE OBRA	
40	cc	1124990027	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL	AYUDANTE DE OBRA	
41	cc	1124996599	PONARE PONARE WILSON	AYUDANTE DE OBRA	
42	cc	1125003293	VARGAS SALCEDO BRIAN FARID	AYUDANTE DE OBRA	Brayan Vargas

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional FIRMA

Consorcio HDC

PLANILLA DE CAPACITACION Y CHARLAS DIARIAS

Se deja constancia que los abajo firmantes asistieron a la actividad de Capacitación detallada precedentemente y declaran haber comprendido el contenido y alcance del temario desarrollado, comprometiendo la aplicación de los conocimientos, acciones y actitudes para minimizar los riesgos, prevenir y evitar accidentes de trabajo.

LUGAR:			CONSORCIO HDC CENTRO DE ACOPIO OBRA HDSJDD			
FECHA:			Miercoles 28 de Agosto de 2024		HORA:	7:00 AM
	# DOCUMENTO		NOMBRE Y APELLIDO		CARGO	FIRMA
1	cc	1124997772	GALVIZ BENJUMEA NOELLY		ADM.SISO	Noelly Galviz
2	cc	1192772735	SALCEDO RODRIGUEZ LEIDY		ALMACENISTA	Leidy Salcedo
3	cc	1124998948	PONARE PONARE LUIS EMIRO		AYUDANTE DE BODEGA	Luis Emiro Ponare
4	cc	17588928	GRISALES RINCON JHON JAIRO		SOLDADOR	
5	cc	1193117578	ROBAYO OSPINA DUBIER ARLEY		AYUDANTE SOLDADOR	
6	cc	1124993341	ALGARRA PEREZ NESTOR JAIR		MAESTRO	
7	cc	1127390922	RODRIGUEZ CONSOLACION ALEX		MAESTRO	
8	cc	8190705	SANCHEZ GONDELLEZ FELIX LUIS		MAESTRO	
9	cc	11280464	ALFONSO ALGARRA LUIS GERARDO		CELADOR	Gerardo Algarra
10	cc	1125004538	AGUDELO BONILLA ARIES GERMAN		AYUDANTE DE OBRA	
11	cc	1124991155	AMAYA GAITAN SANTIAGO		AYUDANTE DE OBRA	
12	cc	1124993310	ARANGO CASTILLO CIRO		AYUDANTE DE OBRA	
13	cc	18262093	CARIBAN RODRIGUEZ ENRRIQUE		AYUDANTE DE OBRA	
14	cc	1124991490	CARIBAN DIAZ JHON FREDY		AYUDANTE DE OBRA	Incapacitado
15	cc	1124994614	CARDONA RODRIGUEZ HOSMAN		AYUDANTE DE OBRA	
16	cc	1124991490	FONSECA GOMEZ ORLANDO		AYUDANTE DE OBRA	
17	cc	1006950328	GAITAN GALINDO JAIRO		AYUDANTE DE OBRA	
18	cc	1125007320	JIMENEZ PEREZ ANTONIO ENRRIQUE		AYUDANTE DE OBRA	Antonio Jimenez
19	cc	1125010065	LARROSA GONZALEZ ARISTIDEZ HERNA		AYUDANTE DE OBRA	
20	cc	1124991167	MENDEZ RIVAS RAFAEL ARCANGEL		AYUDANTE DE OBRA	
21	cc	1124990520	RODRIGUEZ GUEVARA ALFREDO		AYUDANTE DE OBRA	
22	cc	1124990631	REINA CAPA CHARLES BRAYAN		AYUDANTE DE OBRA	
23	cc	6848517	REINA GALINDO BILCEN		AYUDANTE DE OBRA	
24	cc	17316132	RIOS GAITAN GUILLERMO		AYUDANTE DE OBRA	
25	cc	1121944520	RUIZ CHIPIAJE HERNEY ANTONIO		AYUDANTE DE OBRA	
26	cc	1006951188	SANCHEZ ERRENUMA HECTOR SANCHE		AYUDANTE DE OBRA	
27	cc	1125001121	SILVA PEREZ DIOMEDEZ		AYUDANTE DE OBRA	
28	cc	5722670	PONARE JOSE ENRIQUE		AYUDANTE DE OBRA	
29	cc	6848141	PONARE GAITAN JULIO CESAR		AYUDANTE DE OBRA	Julio Cesar Ponare
30	cc	1125010797	PONARE CHIPIAJE PABLO EMILIO		AYUDANTE DE OBRA	Pablo Emilio
31	cc	6848740	PONARE CHIPIAJE RAMON ARTURO		AYUDANTE DE OBRA	Ramon Arturo P
32	cc	1125002345	BONILLA ZULUAGA COSTMETH DAMIAN		AYUDANTE DE OBRA	
33	cc	1124989245	BARRERA MANCIPE CESAR AUGUSTO		AYUDANTE DE OBRA	Cesar B
34	cc	1006951096	BUITRAGO OTALORA FABIAN RICARDO		AYUDANTE DE OBRA	
35	cc	1119890549	DASILVA FORERO JOSE ANTONIO		AYUDANTE DE OBRA	
36	cc	7243305	GOMEZ GAITAN JAIRO HUMBERTO		AYUDANTE DE OBRA	Jairo Gomez
37	cc	1192757402	SANCHEZ CARIBAN JORGE DARBEY		AYUDANTE DE OBRA	Jorge Sanchez
38	cc	1124990124	NOVOA PULIDO EDWIN ANDRES		AYUDANTE DE OBRA	
39	cc	1136278055	SOSA GAITAN YORMA		AYUDANTE DE OBRA	YORMA
40	cc	1124990027	PONARE PONARE JHORMAN SAMUEL		AYUDANTE DE OBRA	
41	cc	1124996599	PONARE PONARE WILSON		AYUDANTE DE OBRA	
42	cc	1125003293	VARGAS SALCEDO BRIAN FARID		AYUDANTE DE OBRA	Brayan Vargas S.

Responsable:
Profesional en Salud Ocupacional FIRMA

INFORME AMBIENTAL

Calle 23 #6-35 – Cel: 313 420 6605 – consorciohdc23@gmail.com – Puerto Carreño - Vichada

CLASE DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP2374-2023**
CONTRATANTE:	**E.S.R. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO HDC**
NIT.:	**901783555-3**
VALOR:	**VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SES MIL DOSCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS ($ 20.856.846.224.00)**
PLAZO:	**QUINCE (15) MESES**
OBJETO:	**REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURADEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN JUAN DE DIOS E.S.E. SEDE CUMARIBO**

Contenido

Introducción 3

Descripción del Proyecto 3

Cumplimiento Legal y Normativo 3

Licencia Ambiental 3

Normativa: 4

La Ley 99 de 1993 4

DECRETO 2820 DEL 5 DE AGOSTO DEL 2010 5

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 6

La Resolución 3100 del 2019 7

El Decreto 357 de 1997 8

La Resolución 8321 de 1993 9

REMOSION Y LIMPIEZA 10

La Resolución 250 de 1997 12

El Decreto 1697 de 1997 13

La Resolución 822 de 1998 20

El Decreto 619 de 2000 21

Medidas de Mitigación Ambiental 22

Conclusiones y Recomendaciones 22

INDICE DE IMÁGENES

ILUSTRACIÓN 1 CIELO RASO DRYWALL 10
ILUSTRACIÓN 2 CIELO RASO PVC 10
ILUSTRACIÓN 3 CIELO RASO PVC Y MANGUERAS 11
ILUSTRACIÓN 4 BODEGA HDC 11
ILUSTRACIÓN 5 TABLAS 11
ILUSTRACIÓN 6 PUERTAS 12
ILUSTRACIÓN 7 MADERA 12
ILUSTRACIÓN 8 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TEMPORAL 14
ILUSTRACIÓN 9 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TEMPORAL 15
ILUSTRACIÓN 10 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TEMPORAL 15
ILUSTRACIÓN 11 GRAVILLA EN EL PUNTO DE ACOPIO 16
ILUSTRACIÓN 12 PUNTO ECOLOGICO 17
ILUSTRACIÓN 13 ACOPIO DE MATERIAL DE OBRA (ARENA) 17
Ilustración 14 ORDEN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE TRABAJO 18
Ilustración 15 PUNTO DE HIDRATACIÓN DE OBRA 18
Ilustración 16 TABLONES EN BUEN ESTADO EN SU PUNTO DE ACOPIO 19
Ilustración 17 ESPACIOS SIN CONTAMICACIÓN VISUAL 19
Ilustración 18 PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL (CEMENTO) 20

Introducción

El presente informe tiene como objetivo evaluar el cumplimiento ambiental durante la construcción del Hospital San Juan de Dios, ubicado en Cumaribo Vichada. Este informe aborda las medidas adoptadas para mitigar impactos ambientales negativos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales pertinentes.

Descripción del Proyecto
EL proyecto, reposición de la infraestructura del Hospital Departamental San Juan De Dios Sede Cumaribo. Su objetivo principal del proyecto es proporcionar instalaciones médicas de vanguardia para la comunidad, garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente durante todas las etapas de construcción.

Cumplimiento Legal y Normativo
Se han identificado y cumplido todas las regulaciones ambientales relevantes a nivel local, regional y nacional. Esto incluye permisos de construcción, evaluaciones de impacto ambiental, y cumplimiento de normativas relacionadas con la gestión de residuos, protección de recursos hídricos, control de emisiones atmosféricas, entre otros aspectos.

Licencia Ambiental

En la Ley 99 se define la Licencia Ambiental como un instrumento de gestión y planificación para prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los efectos ambientales durante el desarrollo de cualquier obra o actividad. La licencia Ambiental se estableció como requisito para cualquier obra o proyecto que genere deterioro grave a los recursos naturales renovables o al ambiente y modificaciones considerables o cambios notorios al paisaje.

En el Decreto 1753 de 1994, se reglamentó la Licencia Ambiental y su contenido. Se establecen los trámites para la obtención de las licencias definiendo los alcances de los estudios, como el DAA o EIA De acuerdo con este decreto, la Licencia Ambiental de los proyectos de gran minería, como la exploración, explotación. producción, almacenamiento, acopio y transporte será otorgada de manera privativa por el Ministerio del Medio Ambiente. Es competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR's) otorgar la Licencia Ambiental a las actividades de explotación, beneficio y transporte que se realizan en la mediana y pequeña minería. Además de las licencias Ambientales también se establece la necesidad de permisos para el uso racional de los recursos naturales que el proyecto requiera para su ejecución.

la autoridad ambiental competente para la realización de un proyecto que, de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta el beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma.

Área de influencia: Área en la cual se manifiestan de manera objetiva y en lo posible cuantificable, los impactos ambientales significativos ocasionados por la ejecución de un proyecto, obra o actividad, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en cada uno de los componentes de dichos medios (Decreto 1076, 2015).

Impacto ambiental: Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o actividad (Decreto 1076, 2015).

Medidas de compensación: Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados (Decreto 1076, 2015).

Medidas de corrección: Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad (Decreto 2041, 2014).

Medidas de mitigación: Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (Decreto 2041, 2014).

Medidas de prevención: Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente (Decreto 2041, 2014).

Normativa:

La Ley 99 de 1993

La Ley 99 de 1993 es una ley colombiana que establece las disposiciones para la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales en Colombia. Esta ley es de gran importancia en el país y establece las bases legales para la gestión ambiental integral. A continuación, se resumen algunos de los aspectos más relevantes de la Ley 99 de 1993:

- Objetivos Ambientales: La ley tiene como objetivo principal garantizar la protección, conservación, restauración y ordenamiento del medio ambiente y los recursos naturales en Colombia, así como promover el desarrollo sostenible.
- Sistema Nacional Ambiental (SINA): La ley establece la creación del Sistema Nacional Ambiental (SINA), el cual es un conjunto de entidades, normas,

recursos y procedimientos destinados a la gestión y protección del medio ambiente.

- Autoridad Ambiental: La ley define las competencias y funciones de las autoridades ambientales a nivel nacional, regional y local, y establece los instrumentos de gestión ambiental que deben ser implementados por estas autoridades.
- Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): La ley establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental para proyectos, obras o actividades que puedan generar impactos significativos en el medio ambiente.
- Conservación de Recursos Naturales: La ley establece medidas para la conservación y protección de los recursos naturales, incluyendo la biodiversidad, los suelos, el agua y el aire.
- Participación Ciudadana: La Ley 99 promueve la participación ciudadana en la gestión ambiental, garantizando el acceso a la información ambiental y la participación en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
- Responsabilidad Ambiental: La ley establece los principios de responsabilidad ambiental, incluyendo la responsabilidad por daño ambiental y la obligación de reparar y compensar los daños causados al medio ambiente.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la ley 99 de 1993 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

DECRETO 2820 DEL 5 DE AGOSTO DEL 2010

El Decreto 2820 del 5 de agosto de 2010 es una normativa colombiana que regula el sistema de gestión ambiental en el país. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes de este decreto:

- Objetivo: El decreto tiene como objetivo establecer las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en las entidades públicas y privadas de Colombia.
- Aplicación: El Decreto 2820 aplica a todas las entidades públicas y privadas que desarrollen actividades susceptibles de generar impacto ambiental significativo.
- Requisitos del SGA: El decreto establece los requisitos que deben cumplir las organizaciones para implementar un Sistema de Gestión Ambiental efectivo, incluyendo la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos, la elaboración de planes y programas ambientales, y la realización de seguimiento y control ambiental.
- Certificación Ambiental: El decreto establece la posibilidad de que las organizaciones certifiquen su Sistema de Gestión Ambiental bajo normas reconocidas internacionalmente, como la norma ISO 14001.

- Obligaciones de las Autoridades Ambientales: El decreto establece las obligaciones de las autoridades ambientales para supervisar y controlar el cumplimiento de las disposiciones ambientales por parte de las entidades sujetas al decreto.
- Instrumentos de Gestión Ambiental: El decreto establece la creación de instrumentos de gestión ambiental, como los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) y los Programas de Gestión Ambiental Sectorial (PGAS).
- Sanciones por Incumplimiento: El decreto establece las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones ambientales, las cuales pueden incluir multas, suspensiones de actividades y clausuras temporales o definitivas.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento del decreto 2820 del 5 de agosto del 2010 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012

La Ley 1523 del 24 de abril de 2012 es una legislación colombiana que establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) y define las políticas, estrategias y acciones para la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción frente a los desastres en el país. A continuación, se resumen los aspectos más relevantes de esta ley:

- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD): La Ley 1523 establece la creación del SNGRD como un conjunto de políticas, estructuras, mecanismos y recursos para la gestión integral del riesgo de desastres en Colombia.
- Políticas y Estrategias: La ley establece las políticas y estrategias para la gestión del riesgo de desastres, incluyendo la participación activa de la comunidad, la promoción de la cultura de prevención, la integración de la gestión del riesgo en los planes de desarrollo y la coordinación interinstitucional.
- Prevención y Mitigación: La ley prioriza la prevención y mitigación de desastres a través de acciones como la identificación y evaluación de riesgos, la implementación de medidas estructurales y no estructurales, y la promoción de la investigación y la educación en gestión del riesgo.
- Preparación y Respuesta: La ley establece lineamientos para la preparación y respuesta frente a desastres, incluyendo la elaboración de planes de contingencia, la capacitación del personal y la coordinación de acciones de emergencia.
- Rehabilitación y Reconstrucción: La ley contempla la rehabilitación y reconstrucción de áreas afectadas por desastres, asegurando la

participación de las comunidades afectadas y promoviendo la recuperación sostenible y resiliente.

- Coordinación Interinstitucional: La ley establece la coordinación interinstitucional entre entidades del gobierno central, entidades territoriales, organismos de socorro, sector privado, academia y sociedad civil para la gestión del riesgo de desastres.
- Financiamiento: La ley contempla la asignación de recursos financieros para la implementación de acciones de gestión del riesgo, así como la promoción de mecanismos de financiamiento público y privado para la prevención y atención de desastres.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la ley 1523 del 24 de abril del 2012 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

La Resolución 3100 del 2019

La Resolución 3100 del 2019 es una normativa colombiana emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Esta resolución establece disposiciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos en el país. Aquí hay un resumen de los puntos más importantes de la Resolución 3100:

- Objetivo: La resolución tiene como objetivo principal establecer los criterios técnicos, administrativos y operativos para la gestión integral de los residuos sólidos en Colombia, con el fin de proteger el medio ambiente y la salud pública.
- Alcance: La Resolución 3100 aplica a todas las personas naturales o jurídicas que generen, transporten, aprovechen, recolecten, almacenen, traten, dispongan y aprovechen residuos sólidos en el territorio colombiano.
- Gestión Integral de Residuos: La normativa establece los principios de la gestión integral de residuos sólidos, incluyendo la prevención, reducción, reutilización, reciclaje, aprovechamiento y disposición final adecuada de los residuos.
- Responsabilidades: La resolución establece las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en la gestión de residuos sólidos, incluyendo a los generadores, transportadores, recolectores, operadores de plantas de tratamiento y disposición final, entre otros.
- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): La normativa establece la obligación para los municipios y distritos de elaborar, adoptar, implementar, evaluar y ajustar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), como instrumento para la adecuada gestión de los residuos sólidos en su jurisdicción.
- Incentivos y Estímulos: La resolución contempla la promoción de incentivos y estímulos para fomentar la separación en la fuente, la recolección selectiva, el reciclaje y la disposición final adecuada de los residuos sólidos.

- Vigilancia y Control: La normativa establece los mecanismos de vigilancia y control para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución, así como para sancionar el incumplimiento de las mismas.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la resolución 3100 del 2019 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

El Decreto 357 de 1997

El Decreto 357 de 1997 es una normativa colombiana que regula aspectos relacionados con la gestión del riesgo de desastres y la prevención de emergencias y desastres en el país. A continuación, se resumen los puntos más relevantes de este decreto:

- Objetivo: El Decreto 357 tiene como objetivo establecer las normas y procedimientos para la prevención y atención de emergencias y desastres en Colombia.
- Creación del Consejo Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (CNPAD): Este decreto establece la creación del CNPAD como la máxima autoridad en materia de prevención y atención de desastres a nivel nacional. El CNPAD es responsable de coordinar las acciones de los diferentes entes gubernamentales y de la sociedad civil en situaciones de emergencia.
- Coordinación Interinstitucional: El decreto establece la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) para la prevención y atención de desastres. Asimismo, promueve la participación de la sociedad civil y otros actores relevantes en estas actividades.
- Identificación y Evaluación de Riesgos: El Decreto 357 establece la necesidad de identificar y evaluar los riesgos de desastres en las diferentes regiones del país. Esta evaluación permite determinar las zonas de mayor vulnerabilidad y tomar medidas preventivas adecuadas.
- Elaboración de Planes de Emergencia y Contingencia: El decreto establece la obligación de las entidades territoriales de elaborar y mantener actualizados los planes de emergencia y contingencia, los cuales deben contemplar acciones específicas para la prevención, mitigación y respuesta ante diferentes tipos de desastres.
- Coordinación con Entidades Internacionales: El decreto faculta al gobierno colombiano para establecer convenios de cooperación con organizaciones internacionales y otros países en materia de prevención y atención de desastres.
- Divulgación y Sensibilización: El Decreto 357 establece la necesidad de llevar a cabo campañas de divulgación y sensibilización sobre la importancia de la prevención y la preparación para situaciones de emergencia y desastre.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a el decreto357 de 1997 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

La Resolución 8321 de 1993

La Resolución 8321 de 1993 es una normativa colombiana que establece disposiciones relacionadas con la gestión ambiental, específicamente en lo que concierne a la protección de los recursos naturales y la regulación de actividades que puedan afectar el medio ambiente. A continuación, se resumen los puntos principales de esta resolución:

- Objetivo: La Resolución 8321 tiene como objetivo establecer los criterios y las normas para la elaboración, evaluación y seguimiento de los estudios de impacto ambiental en Colombia.
- Ámbito de Aplicación: Esta resolución aplica a todos los proyectos, obras o actividades que puedan generar impactos significativos en el medio ambiente, y que estén sujetos a la elaboración de estudios de impacto ambiental de acuerdo con la normativa vigente.
- Contenido de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA): La resolución establece los requisitos y la estructura que deben tener los estudios de impacto ambiental, incluyendo la descripción del proyecto, la identificación y evaluación de impactos ambientales, la identificación de medidas de prevención, mitigación y compensación, entre otros aspectos.
- Autoridades Competentes: La resolución establece las autoridades ambientales competentes para la evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental, así como los procedimientos y plazos para su tramitación.
- Participación Ciudadana: La resolución establece la obligación de realizar procesos de consulta y participación ciudadana en la elaboración y evaluación de los estudios de impacto ambiental, garantizando la participación activa de las comunidades y grupos de interés afectados por el proyecto.
- Seguimiento y Control Ambiental: La resolución establece la necesidad de realizar seguimiento y control ambiental durante todas las etapas del proyecto, con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el estudio de impacto ambiental y prevenir posibles impactos negativos en el medio ambiente.

REMOSIÓN Y LIMPIEZA

Durante el desarrollo de cada una de las etapas de la obra, es posible incorporar elementos tendientes a reducir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos, así como potencializar los positivos. Al hacer un análisis cruzado entre el proyecto y el medio, se podrá identificar cuáles son las actividades que requieren un manejo más cuidadoso y los programas más importantes para reducir impactos significativos

El consorcio HDC cumpliendo con la resolución abarca la actividad de Remoción y limpieza, consiste en el desmonte y limpieza del terreno natural del área intervenida por la obra. Se remueven puertas, ventanas, drywall, cielo raso PVC, tablas, cables, mangueras de modo que el terreno quede limpio y su superficie resulte apta para iniciar los trabajos.

El residuo se debe clasificar con el objeto de reutilizarlo o de reciclarlo. Consorcio hdc dispone de algunos elementos en bodegas ya que este material se reutilizará dentro de obra en el transcurso de los días.



ILUSTRACIÓN 1 CIELO RASO DRYWALL



ILUSTRACIÓN 2 CIELO RASO PVC



ILUSTRACIÓN 3 CIELO RASO PVC Y MANGUERAS



ILUSTRACIÓN 4 BODEGA HDC



ILUSTRACIÓN 5 TABLAS

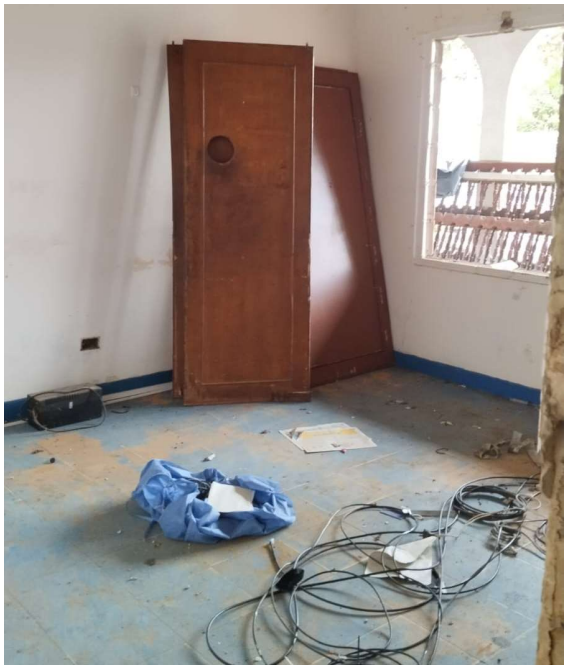


ILUSTRACIÓN 6 PUERTAS



ILUSTRACIÓN 7 MADERA

La Resolución 250 de 1997

La Resolución 250 de 1997 es una normativa colombiana que establece disposiciones relacionadas con la gestión y control de la calidad del agua para consumo humano en el país. A continuación, se resumen los puntos más relevantes de esta resolución:

- Objetivo: La Resolución 250 tiene como objetivo establecer los requisitos y criterios técnicos para garantizar la calidad del agua destinada al consumo humano, con el fin de proteger la salud de la población.
- Alcance: Esta resolución aplica a todas las entidades responsables de la producción, tratamiento, distribución y suministro de agua potable para consumo humano en Colombia.
- Parámetros de Calidad del Agua: La resolución establece los parámetros físicos, químicos y microbiológicos que deben cumplir las aguas destinadas al consumo humano, incluyendo aspectos como la turbidez, el pH, la presencia de metales pesados, microorganismos patógenos, entre otros.
- Fuentes de Abastecimiento: La resolución establece requisitos específicos para la protección y conservación de las fuentes de abastecimiento de agua potable, como ríos, lagos, embalses y acuíferos.
- Sistemas de Tratamiento: La normativa establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de

tratamiento de agua potable, con el fin de garantizar la eliminación o reducción de contaminantes y agentes patógenos.

- Monitoreo y Control de la Calidad del Agua: La resolución establece la obligación de realizar monitoreo continuo y sistemático de la calidad del agua en las fuentes de abastecimiento, en los sistemas de tratamiento y en los puntos de distribución, con el fin de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.
- Vigilancia Sanitaria: La resolución establece los procedimientos y responsabilidades para la vigilancia sanitaria del agua para consumo humano, incluyendo la toma de muestras, análisis de laboratorio, evaluación de riesgos para la salud, y la adopción de medidas correctivas en caso de incumplimiento de los estándares de calidad.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la resolución 250 de 1997 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

El Decreto 1697 de 1997

El Decreto 1697 de 1997 es una normativa colombiana que establece disposiciones relacionadas con el manejo**, transporte y disposición final de residuos peligrosos** en el país. A continuación, se resumen los puntos más relevantes de este decreto:

- Objetivo: El Decreto 1697 tiene como objetivo regular el manejo integral de los residuos peligrosos en Colombia, con el fin de prevenir daños a la salud humana y al medio ambiente.
- Definición de Residuos Peligrosos: El decreto define los residuos peligrosos como aquellos que, por sus características físicas, químicas, biológicas o radiactivas, pueden representar un riesgo para la salud humana o el ambiente.
- Responsabilidades: Establece las responsabilidades de los generadores, transportadores, receptores y autoridades ambientales en el manejo de los residuos peligrosos, desde su generación hasta su disposición final.
- Manejo Integral: El decreto establece la obligación de los generadores de residuos peligrosos de implementar planes de manejo integral, que incluyan medidas de prevención, minimización, segregación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos.
- Transporte de Residuos Peligrosos: Establece los requisitos y medidas de seguridad que deben cumplir los vehículos y los conductores que transportan residuos peligrosos, así como los procedimientos para la documentación y el registro de las operaciones de transporte.
- Disposición Final: Regula los requisitos y criterios técnicos para la selección, diseño, operación y monitoreo de los sitios de disposición final de residuos peligrosos, garantizando la protección del medio ambiente y la salud pública.

- Sanciones: Establece las sanciones administrativas y penales aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto, así como los procedimientos para la imposición de las mismas

ALMACENAMIENTO TEMPORAL EN LA CONSTRUCCIÓN

Es primordial disminuir al máximo el tiempo en el que los materiales se encuentran en el área del proyecto, manteniendo como límite veinticuatro horas después de haber concluido la obra.

CONSORCIO HDC ESTÁ EN EL PROCESO DE DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, debido a que los escombros suelen producirse en enormes cantidades y estos pueden ocupar un gran espacio, desecharlos en contenedores convencionales de la vía pública sería muy engorroso e incluso peligroso. por ende, se obtuvo un terreno privado apto, para disponer temporalmente los residuos generados en obra. con esto brindamos a los trabajadores, ingenieros y visitantes una mayor flexibilidad al realizar sus actividades diarias y éxito en los procesos de remodelación de la infraestructura del hospital.

Contamos con patios donde se efectúa el cargue, descargue y almacenamiento de materiales y elementos, además con sistemas de lavado para llantas, evitando así el daño a los espacios públicos.



ILUSTRACIÓN 8 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TEMPORAL



ILUSTRACIÓN 9 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TEMPORAL



ILUSTRACIÓN 10 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TEMPORAL

ACOPIO DEL MATERIAL EN OBRA

cuando iniciamos nuestra obra de construcción es muy importante determinar la forma de acopio del material a utilizar. esto nos permitirá el correcto avance de la misma. de igual forma contribuirá a la conservación de los mismos y a la utilización necesaria sin desperdiciar nada, **CONSORCIO HDC** cuenta con un lugar de acopio asignada exactamente para la disposición de material y desechos que se encuentra dentro de las instalaciones.

este el proceso nos ha ayudado con la contaminación visual dentro de las instalaciones ya que, a través de la recuperación de los materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se realiza su reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente eficiente por medio de procesos como la reutilización y el reciclaje.

Esto nos permite definir, implementar, controlar y realizar seguimiento a las actividades de obra.



ILUSTRACIÓN 11 GRAVILLA EN EL PUNTO DE ACOPIO



ILUSTRACIÓN 12 PUNTO ECOLOGICO



ILUSTRACIÓN 13 ACOPIO DE MATERIAL DE OBRA (ARENA)



Ilustración 14 ORDEN Y LIMPIEZA DE ESPACIOS DE TRABAJO



Ilustración 15 PUNTO DE HIDRATACIÓN DE OBRA



Ilustración 16 TABLONES EN BUEN ESTADO EN SU PUNTO DE ACOPIO



Ilustración 17 ESPACIOS SIN CONTAMICACIÓN VISUAL



Ilustración 18 PUNTO DE ACOPIO DE MATERIAL (CEMENTO)

La Resolución 822 de 1998

La Resolución 822 de 1998 es una normativa colombiana que establece disposiciones relacionadas con la gestión integral de residuos sólidos en el país. A continuación, se resumen los puntos principales de esta resolución:

- Objetivo: La Resolución 822 tiene como objetivo establecer los lineamientos y criterios técnicos para la gestión integral de residuos sólidos, con el fin de prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud pública.
- Alcance: Esta resolución aplica a todas las personas naturales o jurídicas que generen, manejen, transporten, recolecten, aprovechen, reciclen, traten, almacenen, dispongan y aprovechen residuos sólidos en el territorio colombiano.
- Definiciones: La resolución define los términos relacionados con la gestión de residuos sólidos, estableciendo las bases para una comprensión uniforme de los conceptos utilizados en la normativa.
- Responsabilidades: Establece las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en la gestión de residuos sólidos, incluyendo a los generadores, transportadores, prestadores de servicios públicos, autoridades ambientales y la comunidad en general.

- Prevención y Minimización: La normativa promueve la prevención y minimización de la generación de residuos sólidos, así como la adopción de prácticas de consumo responsable y la implementación de medidas de reducción en la fuente.
- Separación en la Fuente: Establece la obligación de los generadores de residuos sólidos de separar en la fuente los materiales reciclables, orgánicos y no reciclables, con el fin de facilitar su aprovechamiento y tratamiento adecuado.
- Educación Ambiental: La resolución promueve la realización de programas de educación ambiental dirigidos a la comunidad, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la gestión adecuada de los residuos sólidos y fomentar prácticas ambientalmente responsables.
- Sanciones: Establece las sanciones administrativas aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en la resolución, así como los procedimientos para la imposición de las mismas.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento a la resolución 822 de 1998 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

El Decreto 619 de 2000

El Decreto 619 de 2000 en Colombia establece disposiciones relacionadas con la gestión integral de los residuos sólidos y la prestación del servicio público de aseo. A continuación, se resumen los puntos más relevantes de este decreto:

- Objeto: El decreto tiene como objetivo regular la prestación del servicio público de aseo y la gestión integral de los residuos sólidos en el territorio colombiano.
- Competencias: Establece las competencias de las autoridades ambientales, municipales y de las empresas prestadoras del servicio público de aseo en la gestión de los residuos sólidos.
- Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS): Establece la obligación para los municipios y distritos de elaborar, adoptar, implementar y actualizar los PGIRS, los cuales deben contemplar medidas de prevención, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos.
- Separación en la Fuente: Promueve la separación de residuos en la fuente de origen, con el fin de facilitar su reciclaje y aprovechamiento.
- Responsabilidad Extendida del Productor (REP): Introduce el concepto de responsabilidad extendida del productor, que implica que los fabricantes,

importadores y distribuidores de productos son responsables de la gestión de los residuos generados por sus productos, incluso después de su uso.

- Participación Ciudadana: Establece la participación de la comunidad en la gestión integral de los residuos sólidos, promoviendo la educación ambiental y la sensibilización sobre la importancia del adecuado manejo de los residuos.
- Control y Vigilancia: Determina las funciones y responsabilidades de las autoridades ambientales y de control en la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el decreto.
- Sanciones: Establece las sanciones administrativas que se pueden aplicar en caso de incumplimiento de las disposiciones contenidas en el decreto.

El consorcio HDC se compromete a dar cumplimiento del decreto 619 del 2000 teniendo en cuenta los aspectos más relevantes reseñados anteriormente.

Medidas de Mitigación Ambiental

- Gestión de Residuos: Se implementó un plan integral de gestión de residuos que incluyó la clasificación, reciclaje y disposición adecuada de los desechos generados durante la construcción. Se promovió la reutilización de materiales siempre que fuera posible.
- Conservación de Recursos Hídricos: Se establecieron medidas para minimizar el uso de agua durante la construcción, incluyendo la reutilización de agua de lluvia y la implementación de sistemas de captación y tratamiento de aguas residuales.
- Control de Emisiones Atmosféricas: Se utilizaron tecnologías y prácticas constructivas que redujeron al mínimo las emisiones de polvo y gases contaminantes, así como la generación de ruido que pudiera afectar a las comunidades circundantes.
- Protección de la Biodiversidad: Se llevó a cabo una evaluación de la biodiversidad en el área de construcción y se implementaron medidas para proteger y preservar la flora y fauna local.
- Energías Renovables y Eficiencia Energética: Se incorporaron prácticas de eficiencia energética y se promovió el uso de energías renovables siempre que fuera posible, con el objetivo de reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Conclusiones y Recomendaciones

El proyecto de construcción del Hospital San Juan de Dios ha demostrado un compromiso significativo con el cumplimiento ambiental. Se han implementado


medidas efectivas para mitigar los impactos ambientales negativos y cumplir con las regulaciones pertinentes. No obstante, se recomienda continuar monitoreando y evaluando el desempeño ambiental durante todas las etapas del proyecto, así como promover la conciencia ambiental entre los trabajadores y la comunidad local.

En resumen, el Hospital San Juan de Dios no solo contribuirá al bienestar de la comunidad mediante la prestación de servicios médicos de calidad, sino que también servirá como un ejemplo de buenas prácticas ambientales en el sector de la construcción.

KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO

KAREN ASTRITH DIAZ CASTRO
INGENIERA AMBIENTAL

LICENCIA AMBIENTAL.

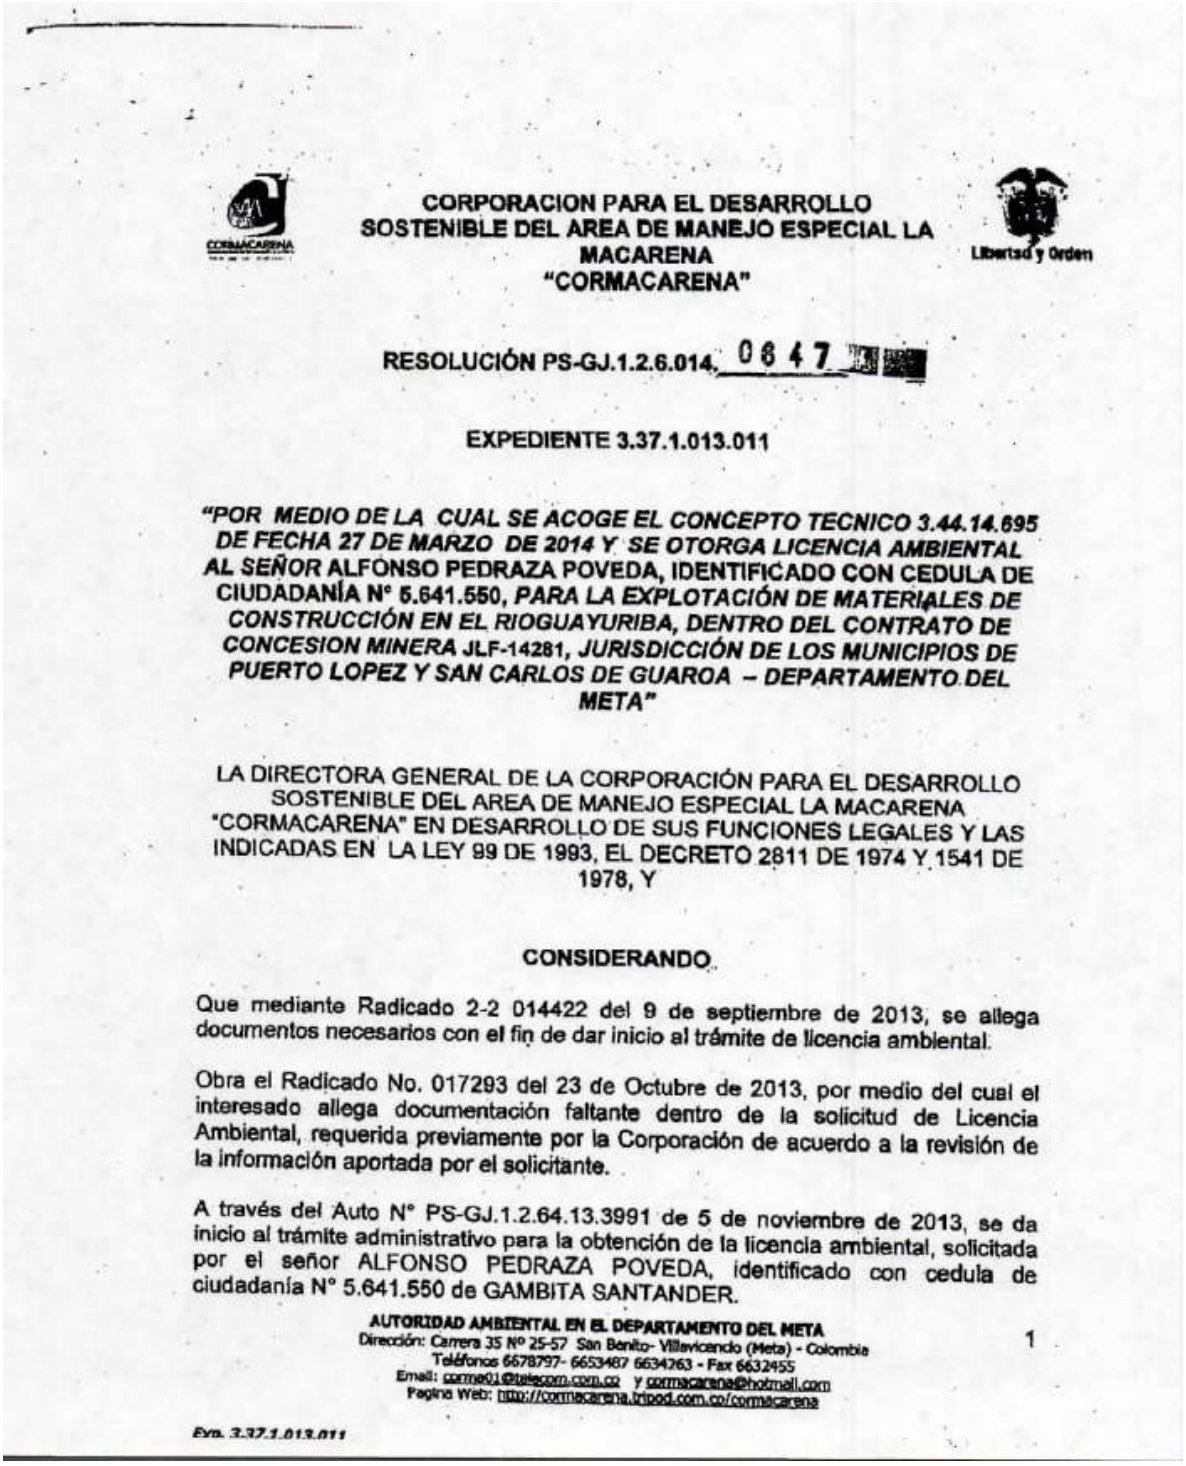

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
"CORMACARENA"

Libertad y Orden

RESOLUCIÓN PS-GJ.1.2.6.014. 0647

EXPEDIENTE 3.37.1.013.011

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACOGE EL CONCEPTO TECNICO 3.44.14.695 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2014 Y SE OTORGA LICENCIA AMBIENTAL AL SEÑOR ALFONSO PEDRAZA POVEDA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA N° 5.641.550, PARA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN EL RIOGUAYURIBA, DENTRO DEL CONTRATO DE CONCESION MINERA JLF-14281, JURISDICCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO LOPEZ Y SAN CARLOS DE GUAROA – DEPARTAMENTO DEL META"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA "CORMACARENA" EN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES LEGALES Y LAS INDICADAS EN LA LEY 99 DE 1993, EL DECRETO 2811 DE 1974 Y 1541 DE 1978, Y

CONSIDERANDO

Que mediante Radicado 2-2 014422 del 9 de septiembre de 2013, se allega documentos necesarios con el fin de dar inicio al trámite de licencia ambiental.

Obra el Radicado No. 017293 del 23 de Octubre de 2013, por medio del cual el interesado allega documentación faltante dentro de la solicitud de Licencia Ambiental, requerida previamente por la Corporación de acuerdo a la revisión de la información aportada por el solicitante.

A través del Auto N° PS-GJ.1.2.64.13.3991 de 5 de noviembre de 2013, se da inicio al trámite administrativo para la obtención de la licencia ambiental, solicitada por el señor ALFONSO PEDRAZA POVEDA, identificado con cedula de ciudadanía N° 5.641.550 de GAMBITA SANTANDER.

recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje requerirán de una Licencia Ambiental.

El Artículo 50 de la Ley 99 de 1993, que define la Licencia Ambiental como la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por parte del beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada.

Que el artículo 03 del Decreto 2820 de 2010 establece: La licencia ambiental, es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje; la cual sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevará implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, que sean necesarios para el desarrollo y operación del proyecto, obra o actividad.

La licencia ambiental deberá obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad. Ningún proyecto, obra o actividad requerirá más de una licencia ambiental.

Que el artículo 6 ibidem establece: La licencia ambiental se otorgará por la vida útil del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, operación, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminación.

El artículo el artículo 09 numeral 01 literal b del Decreto 2820 de 2010, en concordancia con el artículo 53 de la Ley 99 de 1993, radica en las Corporaciones Autónomas regionales la competencia para otorgar Licencia Ambiental en el caso de Extracción de Material de Arrastre para Construcción.

Que de igual forma, en el decreto 2820 de 2010, se establece el proceso para la obtención de licencia ambiental, por lo tanto en su artículo 25, previene "*De la evaluación del estudio de impacto ambiental.* Una vez realizada la solicitud de Licencia Ambiental se surtirá el siguiente procedimiento:

1. A partir de la fecha de radicación del Estudio de Impacto Ambiental con el lleno de los requisitos establecidos para el efecto en los artículos 21 y 24 del presente decreto, la autoridad ambiental competente, contará con cinco (5) días hábiles para expedir el auto de inicio de trámite de Licencia Ambiental el cual deberá publicarse en los términos del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

2. Ejecutoriado el auto de inicio de trámite, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes la autoridad ambiental, solicitará a otras autoridades o entidades los conceptos técnicos o informaciones pertinentes, que deben ser remitidos en un plazo no superior a veinte (20) días hábiles, contados desde la fecha de radicación de la comunicación correspondiente.

3. Recibida la información o vencido el término de requerimiento de informaciones a otras autoridades o entidades, la autoridad ambiental podrá solicitar al interesado dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes mediante el correspondiente acto administrativo, la información adicional que se considere pertinente. En este caso se suspenderán los términos que tiene la autoridad para decidir de conformidad con lo establecido en el artículo 12 y 13 del C.C.A.

4. Allegada la información por parte del interesado, la autoridad ambiental en un término de cinco (5) días hábiles expedirá el auto de trámite que declare reunida toda la información requerida para decidir.

Así mismo, el interesado podrá hasta antes de la expedición del citado auto, aportar nuevos documentos o informaciones relacionados con el proyecto, obra o actividad, caso en el cual los plazos y términos que tiene la autoridad para decidir comenzarán a contarse desde la ejecutoria del auto que da inicio al trámite siempre y cuando dicha información implique una nueva visita de evaluación o un nuevo requerimiento por parte de la autoridad ambiental a cargo.

5. La autoridad ambiental competente decidirá la viabilidad del proyecto, obra o actividad, en un término no mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados a

RECURSO A MONITOREAR	LUGAR DE EJECUCIÓN	PARAMETROS A EVALUAR	EJECUCIÓN
Componente Socio - Económico	proyecto	molestias durante la operación	comunidad al inicio y durante el proyecto.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Se reitera al beneficiario de la licencia ambiental el deber de ejecutar todos los programas y proyectos ambientales establecidos en el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, los cuales serán de obligatorio cumplimiento durante la fase de operación del Proyecto.

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: El señor **ALFONSO PEDRAZA POVEDA**, debe crear el Departamento de Gestión Ambiental, según lo establecido en el Artículo Cuarto del Decreto 1299 de 2008, encaminado a dirigir la Gestión Ambiental de las empresas a nivel Industrial; velar por el cumplimiento de la Normatividad Ambiental; prevenir, minimizar y controlar la generación de cargas contaminantes; promover prácticas de producción limpia y el uso racional de recursos naturales.

PARÁGRAFO PRIMERO: Dicho Departamento de Gestión Ambiental del proyecto será responsable por el control de la aplicación y funcionalidad de los planes de manejo y de seguridad, por lo tanto debe vigilar que se cumplan todas las normatividades impuestas al personal operativo y en general a todas aquellas personas que tengan que ver con el proyecto.

ARTICULO TRIGESIMO: La responsabilidad de la explotación deberá estar a cargo de un profesional idóneo y no delegar en los operadores de las máquinas excavadoras, en los conductores de las volquetas, ni en el administrador de los frentes de trabajo, por lo cual el beneficiario de la licencia ambiental debe allegar la hoja de vida del profesional que haga las veces de Ingeniero residente y responsable del proyecto minero.

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: Durante la operación del proyecto, con una periodicidad semestral, el señor **ALFONSO PEDRAZA POVEDA**, debe allegar el Informe de Cumplimiento Ambiental de las labores desarrolladas de acuerdo a las obligaciones ambientales estipuladas por la Corporación, conforme al Formato de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) establecido por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial con sus respectivos soportes donde se demuestre la veracidad de la información de cada una de las actividades que se

CERTIFICADO MINERO

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

Fecha de 23/08/2022 Hora: 16:06:52 Página 1 de 3

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: JLF-14281 RMN: JLF-14281
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 21/03/2013 Hasta: 20/03/2043	Fecha y Hora de Registro: 21/03/2013 00:00:00

TITULARES: IDENTIFICACIÓN
TRITURADORA BOCAS DEL GUAYURIBA S.A.S NN 9007787714
PETREUS S.A.S. 9008260951

AREA TOTAL: 440 Hectárea(s) y 2608 mt(s)2

MUNICIPIOS: PUERTO LÓPEZ-META\ SAN CARLOS DE GUAROA-META

MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL ÁREA

AREA: 1
PUNTO ARCIFINIO: VERTCI NUMERO 1 DEL POLIGONO
NORTE: 927372,3536
ESTE: 1105898,4367
PLANCHA IGAC: 267

ALINDERACIÓN

Coordenada Norte	Coordenada Este
925933,2440	1109233,3040
924820,3200	1108753,0400
926259,4290	1105418,1710
927372,3540	1105898,4350

ANOTACIONES

ANOTACIÓN: 1 FECHA ANOTACIÓN: 21/03/2013
TIPO ANOTACIÓN: CONTRATO UNICO DE CONCESION FECHA EJECUTORIA: 19/02/2013
DOCUMENTO CONTRATO NÚMERO: JLF-14281
EXPEDIDO POR: REGIONAL BOGOTA FECHA DOCUMENTO: 19/02/2013
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN INSCRIPCION EN EL CATASTRO Y REGISTRO MINERO DEL CONTRATO UNICO DE CONCESION JLF-14281

ANOTACIÓN: 2 FECHA ANOTACIÓN: 28/10/2014

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: JLF-14281 RMN: JLF-14281
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 21/03/2013 Hasta: 20/03/2043	Fecha y Hora de Registro: 21/03/2013 00:00:00

22/09/2014

DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: GSCZC-000214
EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 08/08/2014
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN MODIFICAR LAS ETAPAS CONTACTUALES DEL TITULO MINERO No JLF-14281, LAS CUALES QUEDARAN ASI:EXPLORACION:DIEZ(10)MESES Y 6 DIAS, CONSTRUCCION Y MONTAJE:CERO(0)AÑOS Y EL TIEMPO RESTANTE, ESTO ES EN PRINCIPIO VEINTINUEVE(29)AÑOS,1 MES Y 24 DIAS PARA EXPLOTACION, CONTADO DESDE EL 27 DE ENERO DE 2014.

ANOTACIÓN: 3 FECHA ANOTACIÓN: 16/01/2015
TIPO ANOTACIÓN: CESION PARCIAL DE DERECHOS FECHA EJECUTORIA: 05/12/2014
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 004784
EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 01/12/2014
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN ARTÍCULO PRIMERO: PERFECCIONAR LA CESIÓN DEL 50% DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES del título minero JLF-14281, presentada por el señor ALFONSO PEDRAZA POVEDA, a favor del señor LUIS CARLOS PRECIADO HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.318.190.

ARTÍCULO SEGUNDO: En firme la presente providencia, y realizada su inscripción en el Registro Minero Nacional, téngase como cootitulares del Contrato de Concesión No. JLF-14281 a los señores ALFONSO PEDRAZA POVEDA, identificado con C.C. 5.641.550 con el 50% y al señor LUIS CARLOS PRECIADO HERRERA, identificado con C.C. 17.318.190 con el 50%; de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la Resolución No. 004784 del 01 de Diciembre de 2014.

ANOTACIÓN: 4 FECHA ANOTACIÓN: 03/06/2021
TIPO ANOTACIÓN: CESION TOTAL DE DERECHOS FECHA EJECUTORIA: 23/04/2021
DOCUMENTO RESOLUCION NÚMERO: 001536
EXPEDIDO POR: PAR CENTRO FECHA DOCUMENTO: 04/11/2020
LUGAR: BOGOTÁ, D.C.
ESPECIFICACIÓN Inscripcion en el Registro Minero Nacional de la CESION TOTAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES del señor LUIS CARLOS PRECIADO HERRERA a favor de la sociedad TRITURADORA BOCAS DEL GUAYURIBA S.A.S. identificada con NIT No. 900.778.771-4

Consorcio HDC

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

GERENCIA DE CATASTRO Y REGISTRO MINERO

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO	Expediente: JLF-14281 RMN: JLF-14281
MODALIDAD: CONTRATO DE CONCESION (L 685)	
Vigencia Desde: 21/03/2013 Hasta: 20/03/2043	Fecha y Hora de Registro: 21/03/2013 00:00:00

			23/06/2022
TIPO ANOTACIÓN:	CESION TOTAL DE DERECHOS	FECHA EJECUTORIA:	02/08/2021
DOCUMENTO	RESOLUCION	NÚMERO:	VCT ¿ 000623
EXPEDIDO POR:	PAR CENTRO	FECHA DOCUMENTO:	01/06/2020
LUGAR:	BOGOTÁ, D.C.		

ESPECIFICACIÓN: INSCRIPCIÓN en el Registro Minero Nacional de la la cesión de derechos y obligaciones del Contrato de Concesión No. JLF- 14281 que, le corresponden al señor ALFONSO PEDRAZA POVEDA, identificado con la cedula de ciudadanía 5.641.550 a favor de la sociedad PETREUS S.A.S identificada con el Nit. 900826095-1.

NOTA ACLARATORIA

De acuerdo con la circular Número 0010 del 18 de junio de 2015 expedida por la Agencia Nacional de Mineria ANM -, se fija la directriz relacionada con la inscripción de prendas mineras, donde se determina que "Por disposición de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 400 de 2014 las garantías mineras o cualquier gravamen que recaiga sobre el derecho a explorar y explotar en los términos de la señalada norma, deben ser consultadas en el registro de Garantías Mobiliarias, el cual se desarrollará por parte de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecamaras)".

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA

********** FIN DE ESTE DOCUMENTO **********

Ana María González Borrero
Coordinadora de Catastro y Registro Minero

CERTIFICADOS DE CALIDAD



FICHA TÉCNICA CEMENTOS

USO GENERAL TIPO UG

FORTECEM
Buenas Obras

PARÁMETROS FÍSICOS	MÉTODO DE ENSAYO	NTC 121:2014 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2018	N/A	**4700 - 5200**
Autoclave Expansión (%)	NTC 107:2017	Máx. 0.8	**Máx. 0.2**
Fraguado inicial (mín.)	NTC 118:2017	Mín. 45-Máx. 420	**220 - 250**
Fraguado final (mín.)	NTC 118:2017	N/A	**300 - 380**
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2018	Máx. 0.02	**Máx. 0.015**
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2017	Máx. 12	**Máx. 8**
Peso específico (g/cm^3)	NTC 221:2017	N/A	**2.85 - 2.95**
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	**MÉTODO DE ENSAYO**	**NTC 121:2014 TIPO UG**	**FORTECEM TIPO UG**
1 Día (MPa)	NTC 220:2017	N/A	**4-6**
3 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 8	**12-14**
7 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 15	**16-18**
28 Días (MPa)	NTC 220:2017	Mín. 24	**28-32**

Ultima actualización: 19-02-2019

USOS

- Estructuras de concreto: placas, columnas, escaleras y cimentaciones
- Morteros para pega de Mampostería estructural y no estructural
- Pañetes
- Grouting de relleno de celdas
- Afinado de pisos
- Andenes y pavimentos
- Prefabricados

Presentaciones: 50 kg 42,5 kg



Línea corporativa: (57-1) 869 7700 | Servicio al cliente: 01 8000 180 113
servicioalcliente@fortecem.net | @fortecem | www.fortecem.net

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	24/05/2024
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2021(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2019	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2020	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2019	N/A	520,00
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,87
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	Máx 0.8	0,028
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	255
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	345
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2020	Máx. 0.02	0,008
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	5,00
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2021	N/A	0,521
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	5,96
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,16
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	17,00
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	25,12

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Abril de 2024
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Jesu Andres Londoño Silva
Lider de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	19/02/2024
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2021(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2019	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2020	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2019	N/A	4230,00
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,99
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	Máx 0.8	0,080
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	235
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	340
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2020	Máx. 0.02	0,010
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	4,75
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2021	N/A	0,506
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,53
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,04
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	16,03
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	24,20

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Enero de 2024
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Maria Mercedes Peñaloza
Jefe Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/07/2024
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2023(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2024	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2020	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2024	N/A	5342,00
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,85
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	Máx 0.8	0,030
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	245
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	321
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2020	Máx. 0.02	0,010
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	5,12
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2022	N/A	0,504
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,66
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,90
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	18,77
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	28,76

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Junio de 2024
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Jesu Andres Londoño Silva
Lider de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	22/04/2024
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2021(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2019	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2020	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2019	N/A	4757,00
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,94
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	Máx 0.8	0,010
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	258
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	353
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2020	Máx. 0.02	0,009
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	5,40
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2021	N/A	0,504
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,22
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,00
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	16,56
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	25,03

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Marzo de 2024
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Jesu Andres Londoño Silva
Lider de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

FORTECEM	CONTROL DE CALIDAD	FECHA: 18/02/2019
	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	VERSIÓN: 03
		Página **1** de **1**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN	26/06/2024
PRODUCTO	**Cemento Hidráulico Tipo UG**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El cemento ***Fortecem*** es un producto pulverizado, químicamente compuesto por óxidos de: calcio, sílice, alúmina y hierro, que en presencia de una cantidad apropiada de agua, genera propiedades físicas de adhesión, con el cual se realizan obras estructurales, de mampostería y construcción en general.

NORMA TÉCNICA APLICABLE

Fortecem certifica que el cemento al que hace referencia este documento cumple con la norma técnica NTC 121:2021(Colombia).

MÉTODOS DE ANÁLISIS UTILIZADOS

METODO	DESCRIPCIÓN
NTC 33:2019	Método para determinar finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine
NTC 221:2019	Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico
NTC 107:2019	Método de ensayo para determinar la expansión en autoclave del cemento portland
NTC 118:2022	Método para determinar el tiempo de fraguado mediante aparato de Vicat
NTC 220:2022	Determinación de la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico
NTC 224:2020	Método de ensayo para determinar el contenido de Aire en Mortero
NTC 4927:2020	Método para determinar la expansión en barras de mortero

REQUISITOS NORMATIVOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

PARÁMETROS FÍSICOS	METODO	NTC 121:2021 TIPO UG	FORTECEM TIPO UG
Superficie específica Blaine (cm^2/g)	NTC 33:2019	N/A	5192,00
Densidad (g/cm^3)	NTC 221:2019	N/A	2,88
Expansión en Autoclave (%)	NTC 107:2019	Máx 0.8	0,020
Fraguado inicial (min)	NTC 118:2022	Mín. 45 Máx. 420	265
Fraguado final (min)	NTC 118:2022	N/A	342
Expansión en barras de mortero a 14 días (%)	NTC 4927:2020	Máx. 0.02	0,010
Contenido de Aire en Mortero (%)	NTC 224:2020	Máx. 12	5,00
Relación Agua/Cemento	NTC 220:2021	N/A	0,510
Resistencia 1 Día (MPa)	NTC 220:2022	N/A	6,41
Resistencia 3 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 8	13,91
Resistencia 7 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 15	18,00
Resistencia 28 Días (MPa)	NTC 220:2022	Mín. 24	26,82

Esta información corresponde al promedio de los datos del cemento tipo UG despachado durante el mes de Mayo de 2024
Los resultados de calidad de cementos individuales puede variar respecto a este valor.

Jesu Andres Londoño Silva
Lider de Control de Calidad
Molienda de la Sabana S.A.S
Km 1.5 via Briceño - Zipaquira

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. FIG-59644

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 3/04/2024

CLIENTE	**SODIMAC COLOMBIA S.A. (VILLAVICENCIO)**	**DESTINO**	VILLAVICENCIO	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	CARRO 15	**GRADO**	420

PEDIDO No. TM8V

		ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.											RESULTADOS DIMENSIONALES				
			RESULTADOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	**COLADA**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 4	20240663	✓	480.4	616.0	15.9	1.28	0.24	1.19	0.0108	0.034	0.20	0.28	0.11	0.07	0.022	0.00057	0.0020	0.46	0.967	0.890	8.420	72.3	2.020
R - No. 5	20240078	✓	492.8	625.7	17.1	1.27	0.26	1.19	0.01213	0.030	0.19	0.17	0.09	0.07	0.021	0.00063	0.0021	0.47	1.540	1.220	10.530	68.6	2.160
R - No. 6	20240316	✓	472.1	619.0	15.9	1.31	0.25	1.05	0.01133	0.031	0.21	0.17	0.07	0.07	0.019	0.00039	0.0022	0.44	2.174	1.380	13.040	70.6	2.640
	20240715	✓	463.0	613.6	15.5	1.33	0.28	1.03	0.01083	0.026	0.21	0.18	0.08	0.06	0.021	0.00049	0.0022	0.46	2.149	1.370	13.090	70.2	2.300
R - No. 7	20240470	✓	484.1	642.1	14.3	1.33	0.26	1.08	0.01367	0.032	0.22	0.25	0.10	0.05	0.014	0.00052	0.0022	0.46	2.925	1.420	14.820	69.7	3.170
R - No. 8	20240526	✓	453.1	612.0	14.2	1.35	0.26	0.96	0.0152	0.026	0.17	0.18	0.10	0.10	0.016	0.00062	0.0023	0.44	3.867	1.680	16.820	70.3	4.020

ESPECIFICACIONES DE NORMA

R - No. 4			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(0.934 - 0.994)	Min: 0.51	Max: 8.9	Min: 45	Max: 4.9
R - No. 5			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(1.459 - 1.552)	Min: 0.71	Max: 11.1	Min: 45	Max: 6.1
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5
R - No. 8			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(3.735 - 3.973)	Min: 1.27	Max: 17.8	Min: 45	Max: 9.7

OBSERVACIONES

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. FIG-59645

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 3/04/2024

CLIENTE	**SODIMAC COLOMBIA S.A. (TIENDA 18 VILLAVICENCIO FUNDADORES)**	**DESTINO**	VILLAVICENCIO	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	CARRO 15	**GRADO**	420
				PEDIDO No.	TM8W

		ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.											RESULTADOS DIMENSIONALES				
			RESULTADOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	**COLADA**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	20240715	✔	463.0	613.6	15.5	1.33	0.28	1.03	0.01083	0.026	0.21	0.18	0.08	0.06	0.021	0.00049	0.0022	0.46	2.149	1.370	13.090	70.2	2.300
R - No. 7	20240470	✔	484.1	642.1	14.3	1.33	0.26	1.08	0.01367	0.032	0.22	0.25	0.10	0.05	0.014	0.00052	0.0022	0.46	2.925	1.420	14.820	69.7	3.170
ESPECIFICACIONES DE NORMA																							
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru

GRUPO SIDERÚRGICO REYNA
NIT 900.601.327-7

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE CALIDAD
BARRAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

NUESTRO ACERO SISMORRESISTENTE CUMPLE CON LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2289

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2020 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Res 1856:2017 Barras corrugadas de acero de baja aleación para refuerzo de concreto

No. FIG-59646

FECHA DESPACHO DD/MM/AAAA 3/04/2024

CLIENTE	**SODIMAC COLOMBIA S.A. (TIENDA 18 VILLAVICENCIO FUNDADORES)**	**DESTINO**	VILLAVICENCIO	**NORMA**	NTC 2289
		PLACA	CARRO 15	**GRADO**	420
				PEDIDO No.	TM8Y

		ENSAYOS FÍSICOS					ANALISIS DE COMPOSICIÓN QUÍMICA % Max.											RESULTADOS DIMENSIONALES				
			RESULTADOS DE TRACCIÓN																			
PRODUCTO	**COLADA**	**DOBLADO**	**FLUENCIA (Mpa)**	**RESISTENCIA (Mpa)**	**ELONGACIÓN (%)**	**R/F**	**C (%)**	**Mn (%)**	**P (%)**	**S (%)**	**Si (%)**	**Cu (%)**	**Ni (%)**	**Cr (%)**	**Mo (%)**	**Nb (%)**	**V (%)**	**CE (%)**	**PESO NOMINAL(kg/m)**	**ALTURA RESALTE (mm)**	**ESPACIAMIENTO RESALTES (mm)**	**ANGULO RESALTE (°)**	**SEPARACION RESALTES (mm)**
R - No. 6	20233328	✔	485.3	633.6	15.1	1.31	0.26	1.08	0.00777	0.034	0.20	0.28	0.09	0.10	0.020	0.00076	0.0005	0.46	2.182	1.260	12.770	71.1	2.520
R - No. 7	20240469	✔	488.6	631.9	15.3	1.29	0.27	1.04	0.01023	0.030	0.21	0.22	0.13	0.05	0.017	0.00079	0.0021	0.46	2.935	1.490	14.780	69.7	3.220
ESPECIFICACIONES DE NORMA																							
R - No. 6			(420 - 540)	Min: 550	Min: 14	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.101 - 2.235)	Min: 0.97	Max: 13.3	Min: 45	Max: 7.3
R - No. 7			(420 - 540)	Min: 550	Min: 12	Min: 1.25	Max: 0.30	Max: 1.50	Max: 0.035	Max: 0.045	Max: 0.50							Max: 0.55	(2.859 - 3.042)	Min: 1.12	Max: 15.5	Min: 45	Max: 8.5

OBSERVACIONES

CE: CARBONO EQUIVALENTE

"EL MATERIAL DESPACHADO SE ENCUENTRA LIBRE DE CONTAMINACIÓN RADIACTIVA-EXTRAPOLARIUM SRPM -210"

DIRECTOR CALIDAD

29/04/2023 Ver. 02 CCA-FOR-017

Enviado: cbravo@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;recibovillavicencio@homecenter.co;drodriguez@homecenter.co;ocardenas@homecenter.co;lgaleanoo1@homecenter.co;comercial2@gruposiderurgico.com;asistenteventas@gruposideru

SABANA DE AVANCE MENSUAL

Calle 23 #6-35 – Cel: 313 420 6605 – consorciohdc23@gmail.com – Puerto Carreño - Vichada

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

CANTIDADES ACTUALIZADAS MODIFICACION No 1 DEL 16/JULIO/2024							ACTIVIDADES EJECUTADAS		CANTIDAD EJECUTADA EN EL		CANTIDAD ACUMULADA EJECUTADA		% ITEM-PROG.	% EJECUCION ITEM ACUMULADO
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL	PESO %	CANT. ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VR. TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	CANT. EJECUTADO MES ACTUAL.	VR. TOTAL ACUMULADO MES ACTUAL.	CANTIDAD ACUMULADA	VR. TOTAL ACUMULADO		
1	DEMOLICIONES Y DESMONTE													
1,1	Desmonte Marcos y puertas con transporte.	m2	186.70	$ 11,075.00	$ 2,067,702.50		186.70	$ 2,067,702.50		$ 0.00	186.70	$ 2,067,702.50	0.01%	0.01%
1,2	Desmonte de Ventanas, con transporte.	m2	199.25	$ 7,666.00	$ 1,527,450.50		199.25	$ 1,527,450.50		$ 0.00	199.25	$ 1,527,450.50	0.01%	0.01%
1,3	Desmonte Aparatos Sanitarios	und	50.00	$ 16,522.00	$ 826,100.00		50.00	$ 826,100.00		$ 0.00	50.00	$ 826,100.00	0.00%	0.00%
1,4	Desmonte de Cielo Raso con retiro.	m2	1,675.92	$ 12,411.00	$ 20,799,843.12		1,675.92	$ 20,799,843.12		$ 0.00	1675.92	$ 20,799,843.12	0.10%	0.10%
1,5	Desmonte de Luminarias,con retiro.	und	102.00	$ 20,711.00	$ 2,112,522.00		102.00	$ 2,112,522.00		$ 0.00	102.00	$ 2,112,522.00	0.01%	0.01%
1,6	Demolicion a mano de tableta piso,	m2	1,189.70	$ 13,434.00	$ 15,982,429.80		1,189.70	$ 15,982,429.80		$ 0.00	1189.70	$ 15,982,429.80	0.08%	0.08%
1,7	Desmonte Cubierta, con correas y transporte.	m2	1,493.37	$ 13,688.00	$ 20,441,248.56		1,493.37	$ 20,441,248.56		$ 0.00	1493.37	$ 20,441,248.56	0.10%	0.10%
1,8	Demolición Mecánica de Edificaciones con Equipo Pesado.(Inc. Vigas columnas,muros,cimentación con Retro excavadora con martillos hidráulico,cargue mecánico y retiro de escombros hasta 6km).	m3	1,346.12	$ 328,158.00	$ 441,740,046.96	2.42%	1,346.12	$ 441,740,046.96		$ 0.00	1346.12	$ 441,740,046.96	2.12%	2.12%
TOTAL CAPITULO					$ 505,497,343.44		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 505,497,343.44	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 505,497,343.44	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	2.42%
2	PRELIMINARES													
2,1	Cerramiento en teja de Zinc	ml	156.00	$ 55,862.00	$ 8,714,472.00		156.00	$ 8,714,472.00		$ 0.00	156.00	$ 8,714,472.00	0.04%	0.04%
2,2	Replanteo y localizacion para arquitectura, sobre terreno	m2	3,142.13	$ 5,734.00	$ 18,016,973.42		3000	$ 17,202,000.00		$ 0.00	3000.00	$ 17,202,000.00	0.09%	0.08%
2,3	Excavacion manual en conglomerado	m3	257.40	$ 54,147.00	$ 13,937,437.80		100	$ 5,414,700.00	157.40	$ 8,522,737.80	257.40	$ 13,937,437.80	0.07%	0.07%
2,4	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	685.78	$ 20,081.00	$ 13,771,148.18		346.49	$ 6,957,865.69	339.29	$ 6,813,282.49	685.78	$ 13,771,148.18	0.07%	0.07%
2,5	Relleno en tierra negra abonada	m3	28.463	$ 93,409.00	$ 2,658,700.37			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
2,6	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación.	m3	1,018.06	$ 133,049.00	$ 135,451,864.94	0.92%	334.88	$ 44,555,449.12	683.18	$ 90,896,415.82	1018.06	$ 135,451,864.94	0.65%	0.65%
TOTAL CAPITULO					$ 192,550,596.71		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 82,844,486.81	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 106,232,436.11	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 189,076,922.92	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.91%
3	CIMENTACION Y ESTRUCTURA													
3,1	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm2 -2500 psi	m3	43.90	$ 1,253,553.00	$ 55,030,976.70		37.04	$ 46,431,603.12	6.86	$ 8,599,373.58	43.90	$ 55,030,976.70	0.26%	0.26%
3,2	Zapata en concreto para cimentacion de resistencia 3000 Psi	m3	159.31	$ 1,424,598.00	$ 226,952,707.38		134.99	$ 192,306,484.02	24.32	$ 34,646,223.36	159.31	$ 226,952,707.38	1.09%	1.09%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	m3	124.33	$ 1,398,866.00	$ 173,921,009.78			$ 0.00	124.33	$ 173,921,009.78	124.33	$ 173,921,009.78	0.83%	0.83%
3,4	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 3-6 m	m3	66.95	$ 1,600,704.00	$ 107,167,132.80		11.88	$ 19,016,363.52		$ 0.00	11.88	$ 19,016,363.52	0.51%	0.09%
3,5	Columna en concreto de resistencia 3000 psi 6-9 m	m3	47.87	$ 1,778,552.00	$ 85,139,284.24			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.41%	0.00%
3,6	Columna de 0.15 x 0.25 en concreto de 3000 Psi 9-12 m	ml	23.00	$ 189,936.00	$ 4,368,528.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
3,7	Muro en concreto de 3000 psi impermeabilizado de resistencia 210 kg/cm². 0-3 m, TANQUE SUBTERRANEO	m3	17.50	$ 1,721,705.00	$ 30,129,837.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
3,8	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 3-6m	m3	181.0518	$ 1,830,947.00	$ 331,496,250.05			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.59%	0.00%
3,9	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi 6-9m	m3	134.4717	$ 1,870,473.00	$ 251,525,684.11			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.21%	0.00%
3,10	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	355.85	$ 247,718.00	$ 88,150,450.30			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.42%	0.00%
3,11	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi	ml	172.30	$ 315,229.00	$ 54,313,956.70			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.26%	0.00%
3,12	Viga aerea de 0.25 x 0.60 en concreto de 3000 Psii 6-9 m	ml	64.84	$ 259,088.00	$ 16,799,265.92			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

3,13	Viga aerea de 0.30 x 0.60 en concreto de 3000 Psi 6-9 m	ml	5.90	$ 319,663.00	$ 1,886,011.70			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
3,14	Columna concreto de resistencia 3000 psi (0.20 x 0.12 x 1)	ml	2,889.432	$ 40,167.00	$ 116,059,815.14			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.56%	0.00%
3,15	Viga cinta de 0.12 x 0.20 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ml	2,154.55	$ 41,783.00	$ 90,023,562.65	21.05%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.43%	0.00%
3,16	Viga canal concreto impermeabilizado de resistencia 3000 Psi	ml	78.40	$ 637,576.00	$ 49,985,958.40			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
3,17	Formaleta entrepiso (incluye: parales, cerchas y cruzetas)	m2	2,057.58	$ 26,457.00	$ 54,437,394.06			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.26%	0.00%
3,18	Acero de Refuerzo Grado 60	Kg	116,394.28	$ 11,144.00	$ 1,297,097,856.32		78000.00	$ 869,232,000.00	24,960.71	$ 278,162,152.24	102960.71	$ 1,147,394,152.24	6.22%	5.50%
3,19	Malla electrosoldada	Kg	10,559.103427896	$ 10,215.00	$ 107,861,241.52		2500.00	$ 25,537,500.00		$ 0.00	2500.00	$ 25,537,500.00	0.52%	0.12%
3,20	Losa maciza elevada para entrepiso	m2	2,057.58	$ 128,715.00	$ 264,841,409.70			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.27%	0.00%
3,21	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m	m2	2,176.07	$ 142,638.00	$ 310,390,272.66			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.49%	0.00%
3,22	Dintel en concreto de 3000 psi 12 x 15 reforzado	ml	229.80	$ 65,910.00	$ 15,146,118.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
3,23	Mesones en concreto de 3000 psi 0.10 m, A = 0.60 m	m2	92.0265	$ 312,479.00	$ 28,756,348.69			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
3,24	Granito pulido travertino peruano No 2, para enchape mesón A=0.50 a 0.60 m	m2	92.0265	$ 75,479.00	$ 6,946,068.19			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
3,25	concreto viga de cimentacion cerramiento no incluye refuerzo	m3	45.55564	$ 1,495,710.00	$ 68,138,026.30			$ 0.00	23.50	$ 35,149,185.00	23.5	$ 35,149,185.00	0.33%	0.17%
3,26	Concreto para escalera	m3	27.961726	$ 1,910,522.00	$ 53,421,492.68			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.26%	0.00%
3,27	Concreto de 3000 Psi para losas para tanque subterraneo	m3	18.50	$ 1,721,705.00	$ 31,851,542.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
3,28	Concreto de 3000 Psi para muro pantalla	m3	40.01	$ 1,910,526.00	$ 76,440,145.26			$ 0.00	4.34	$ 8,291,682.84	4.34	$ 8,291,682.84	0.37%	0.04%
3,29	Losa para rampa en concreto de 3000 Psi	m3	21.821184	$ 1,910,526.00	$ 41,689,939.38			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
3,30	Lamina metaldeck 2" Cal. 22 Suministro e Instal.	m2	2,611.284	$ 134,441.00	$ 351,063,632.24			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.68%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 4,391,031,918.90**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 1,152,523,950.66**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 538,769,626.80**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 1,691,293,577.46**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**8.11%**
4	**CUBIERTA Y CIELORASO**													
4,1	suministro e instalación cubierta en teja panel metálico de aluzinc - aluzinc cal 26 tipo sandwich, con icopor, acabado en pintura poliester horneada en ambas caras. espesor de 2``.	m2	1,405.74	$ 254,888.00	$ 358,306,257.12			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.72%	0.00%
4,2	tapas protectoras de remates para teja flanching y cumbrera calibre 26	ml	338.66	$ 80,901.00	$ 27,397,932.66			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
4,3	Cielo raso en lamina PVC 9 mm, incluye estructura	m2	3,218.4025	$ 131,627.00	$ 423,628,665.87			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.03%	0.00%
4,4	Estructura metalica en Acero ASTM-500 C para estructura de cubierta (Incluye: suministro - fabricacion - pintura - montaje)	kg	14,225.8684	$ 25,829.00	$ 367,439,954.90	6.80%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.76%	0.00%
4,5	acero estructural t astm a36 (incluye suministro montaje y pintura)	kg	135.00	$ 25,101.00	$ 3,388,635.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
4,6	suministro e instalacion de tubo 2" galvanizado L=3m; incluye platina de 4"x1/4" anticorrosivo y pintura	und	1,143.23529411765	$ 208,821.00	$ 238,731,537.35			$ 0.00	588.00	$ 122,786,748.00	588.00	$ 122,786,748.00	1.14%	0.59%
TOTAL CAPITULO					**$ 1,418,892,982.90**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 122,786,748.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 122,786,748.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.59%**
5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**													
5,1	Muro en bloque No. 4 de 0.10 m con andamio	m2	7,711.6275	$ 82,304.00	$ 634,697,789.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	3.04%	0.00%
5,2	Pañete liso impermeabilizado muros 1:4	m2	14,827.345	$ 36,808.00	$ 545,764,914.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.62%	0.00%
5,3	Filos y dilataciones 1:4	ml	7,097.60	$ 12,396.00	$ 87,981,849.60	6.08%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.42%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

	TOTAL CAPITULO				**$ 1,268,444,554.12**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
6	**PISOS Y ENCHAPES**													
6,1	Alistado impermeabilizado de pisos e= 0.04	m2	3,263.6275	$ 36,852.00	$ 120,271,200.63			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.58%	0.00%
6,2	Baldosa grano de marmol 30*30 / 33x33 cm blanco incluye destronque, pulida y brillado a todo costo	m2	2,720.9607	$ 172,550.00	$ 469,501,768.79			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	2.25%	0.00%
6,3	Guardaescoba mediacaña en granito	ml	2,905.78	$ 38,562.00	$ 112,052,688.36			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.54%	0.00%
6,4	Mediacaña mortero imp 1:3 0.12*0.12m	ml	2,905.78	$ 24,797.00	$ 72,054,626.66			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.35%	0.00%
6,5	Dilatacion palstica para mediacaña	ml	2,905.78	$ 4,160.00	$ 12,088,044.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
6,6	Enchape pared cerámica rectificada 30x60 cm brllante de 1a calidad instalada	m2	1,332.1053	$ 64,486.00	$ 85,902,142.38			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.41%	0.00%
6,7	Win media luna plastico	ml	370.70	$ 4,160.00	$ 1,542,112.00	5.16%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
6,8	Enchape de piso en ceramica antideslizante 45 x 45	m2	269.3446	$ 41,535.00	$ 11,187,227.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
6,9	Piso en concreto estampado. Suministro e instal.	m2	826.29	$ 201,270.00	$ 166,307,388.30			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
6,10	sardinel h=0.40 m, e=0.15 m concreto 3,000 psi (fundido en sitio, mezcla en obra. incluye suministro, formaleta y construcción)	ml	153.55	$ 164,298.00	$ 25,227,957.90			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 1,076,135,157.77**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
7	**ESTUCO Y PINTURA**													
7,1	Estuco plástico muros. Suministro e instal.	m2	11,794.5637	$ 27,240.00	$ 321,283,915.19			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.54%	0.00%
7,2	Estuco en filos y dilataciones	ml	7,097.60	$ 10,690.00	$ 75,873,344.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.36%	0.00%
7,3	Pintura exterior tipo koraza o similar 3 manos sobre muros	m2	1,700.676	$ 29,611.00	$ 50,358,717.04			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
7,4	Pintura Antibacterial 1 mano o similar	m2	11,794.5637	$ 19,555.00	$ 230,642,693.15	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.11%	0.00%
7,5	Lineas de trafico de ancho 0.10 m, demarcacion	ml	59.44	$ 7,078.00	$ 420,716.32			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 678,579,385.70**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
8	**CARPINTERIA METALICA - MADERA**													
8,1	Ventana aluminio, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	521.4117	$ 462,017.00	$ 240,901,069.40			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.16%	0.00%
8,2	Puerta en RH incluye marco y chapa	m2	436.32	$ 767,518.00	$ 334,883,453.76			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.61%	0.00%
8,3	Puerta doble en RH con batiente incluye protector de acero y manija de seguridad	m2	115.20	$ 986,466.00	$ 113,640,883.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.54%	0.00%
8,4	Puerta en vidrio templado 10 mm, con zocalo, chapa e Instalada	m2	10.80	$ 1,967,605.00	$ 21,250,134.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
8,5	zocalo de proteccion	ml	649.88	$ 55,564.00	$ 36,109,932.32			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
8,6	Puerta en aluminio con marco y chapa	m2	4.32	$ 462,350.00	$ 1,997,352.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
8,7	Puerta doble en aluminio con marco y chapa	m2	3.60	$ 924,700.00	$ 3,328,920.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
8,8	Puerta Antipanico incluye accesorios	m2	13.20	$ 1,235,450.00	$ 16,307,940.00	4.71%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
8,9	Ventana aluminio tipo celosia o similar, con vidrio 4 mm. Suministro e instal.	m2	127.21	$ 468,520.00	$ 59,600,429.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
8,10	Baranda en acero inoxidable 2" con anclajes	ml	79.16	$ 796,520.00	$ 63,053,952.65			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.30%	0.00%
8,11	Suministro e instalación de lamina en acero inoxidable pintada para fachada incluye accerios de anclaje	m2	319.06	$ 283,480.00	$ 90,446,988.91			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.43%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

	TOTAL CAPITULO				**$ 981,521,055.44**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
9	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
9,1	Sanitario discapacitados incluye griferia antivandalica	und	29.00	$ 1,654,305.00	$ 47,974,845.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
9,2	Lavamanos pedestal con griferia cromada	und	57.00	$ 299,325.00	$ 17,061,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,3	lavamanos de empotrar	und	26.00	$ 566,382.00	$ 14,725,932.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
9,4	Sanitario ecoclean instalado	und	28.00	$ 485,767.00	$ 13,601,476.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
9,5	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada) con registro o valvula	und	25.00	$ 115,483.00	$ 2,887,075.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,6	Lavaplatos acero inoxidable 100 x 50 de sobreponer con escurridero y grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	19.00	$ 260,685.00	$ 4,953,015.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,7	Lavaplatos acero inoxidable de sobreponer doble grifería mezclador 8". Suministro e instal.	und	10.00	$ 260,678.00	$ 2,606,780.00	0.62%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
9,8	Suministro e instalacion de pasamanos para discapacitados en acero inoxidable L=1.5 mts	und	58.00	$ 273,940.00	$ 15,888,520.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
9,9	pasamanos en acero inoxidable cal.18 2" incluye soportes	und	25.00	$ 204,701.00	$ 5,117,525.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
9,10	Espejo 5 mm. Suministro e instal.	m2	75.60	$ 58,733.00	$ 4,440,214.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 129,256,907.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
10	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
10,1	Tubo presión RDE 21 PVC 1/2"	ml	309.00	$ 15,303.00	$ 4,728,627.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,2	Tubo presión RDE 21 PVC 3/4"	ml	139.00	$ 22,354.00	$ 3,107,206.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,3	Tubo presión RDE 21 PVC 1"	ml	299.00	$ 23,736.00	$ 7,097,064.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
10,4	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/4"	ml	159.00	$ 25,126.00	$ 3,995,034.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
10,5	Tubo presión RDE 21 PVC 1 1/2"	ml	109.20	$ 28,226.00	$ 3,082,279.20			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,6	Tubo presión RDE 21 PVC 2"	ml	42.00	$ 35,103.00	$ 1,474,326.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,7	Tubo presión RDE 21 PVC 2 1/2"	ml	25.00	$ 49,267.00	$ 1,231,675.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,8	Tubo presión RDE 21 PVC 3"	ml	47.00	$ 38,624.00	$ 1,815,328.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,9	Válvula de bola PVC 3/4" roscada	und	29.00	$ 22,081.00	$ 640,349.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,10	Válvula de bola PVC 1" roscada	und	62.00	$ 37,963.00	$ 2,353,706.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,11	Válvula de bola PVC 1 1/4" roscada	und	5.00	$ 42,686.00	$ 213,430.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,12	Válvula de bola PVC 3" roscada	und	3.00	$ 54,332.00	$ 162,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,13	suministro e instalacion de llave terminal (cuartos aseo)	und	45.00	$ 26,773.00	$ 1,204,785.00	0.20%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
10,14	suministro e instalacion de llave de paso	und	26.00	$ 22,737.00	$ 591,162.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,15	Camara de registro para medidor, diametro 1 1/2" (incluye caja en concreto, tapa metalica, registro de bola, filtro, medidor y acoples)	und	1.00	$ 536,449.00	$ 536,449.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
10,16	Punto hidráulico	und	285.00	$ 36,722.00	$ 10,465,770.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 42,700,186.20**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
11	**REDES DE DRENAJE - AGUAS LLUVIAS**													
11,1	aguas lluvias 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	300.50	$ 65,105.00	$ 19,564,052.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
11,2	aguas lluvias 6" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 96,814.00	$ 1,549,024.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
11,3	aguas lluvias 8" (INCLUYE ACCESORIOS)	ml	16.00	$ 120,816.00	$ 1,933,056.00	0.11%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 23,046,132.50**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

12	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**													
AGUAS RESIDUALES CONVENCIONALES														
12,1	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	262.15	$ 30,792.00	$ 8,072,122.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
12,2	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	11.00	$ 50,310.00	$ 553,410.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,3	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	532.50	$ 77,689.00	$ 41,369,392.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
12,4	Tuberia 6" A.N. (Incluye accesorios)	ml	49.50	$ 83,088.00	$ 4,112,856.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,5	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	82.00	$ 28,103.00	$ 2,304,446.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
12,6	sifon Sanitario PVC 3" 180° Suministro e Instal.	und	6.00	$ 32,697.00	$ 196,182.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,7	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,753.00	$ 3,508,518.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,8	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,407.00	$ 2,008,221.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
12,9	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,267.00	$ 809,267.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,10	Rejilla sifon	und	82.00	$ 24,127.00	$ 1,978,414.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS														
12,11	Tuberia 2" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	148.00	$ 30,792.00	$ 4,557,216.00	0.47%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,12	Tuberia 3" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	150.00	$ 50,310.00	$ 7,546,500.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
12,13	Tuberia 4" A.N. (Incluye accesorios y punto sanitario)	ml	56.50	$ 77,689.00	$ 4,389,428.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,14	sifon Sanitario PVC 2" 180° Suministro e Instal.	und	11.00	$ 28,103.00	$ 309,133.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,15	Caja de inspeccion 0,60 x 0,60 sanitaria	und	6.00	$ 584,752.00	$ 3,508,512.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
12,16	Caja de inspeccion 0.80 x 0.80 sanitaria	und	3.00	$ 669,412.00	$ 2,008,236.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
12,17	Caja de inspeccion 1,00 x 1,00 sanitaria	und	1.00	$ 809,272.00	$ 809,272.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,18	Rejilla sifon	und	11.00	$ 24,127.00	$ 265,397.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
12,19	tuberia ventilacion d=2"	ml	177.50	$ 39,790.00	$ 7,062,725.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
12,20	tuberia ventilacion d=3"	ml	42.00	$ 49,360.00	$ 2,073,120.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 97,442,368.80**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**													
RED DE MEDIA TENSION														
13,1	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG.	und	1.00	$ 3,080,269.00	$ 3,080,269.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,2	Estructura de paso NC510	und	1.00	$ 679,537.00	$ 679,537.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,3	Estructura NC 730	und	1.00	$ 2,532,145.00	$ 2,532,145.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,4	Bajante de media Tension en Tubo IMC de 4"	und	1.00	$ 2,538,279.00	$ 2,538,279.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,5	Caja de paso CS 275	und	3.00	$ 1,789,897.00	$ 5,369,691.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,6	Canalizacion Subterranea de 2x4"; incluye excavacion	ml	19.00	$ 237,485.00	$ 4,512,215.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,7	CTS518-2 Celda para transformador tipo seco (Nivel 2) de 225 KVA	und	1.00	$ 7,794,891.00	$ 7,794,891.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,8	Instalacion transformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 8,965,230.00	$ 8,965,230.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,9	ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV 3 x 2 AWG COBRE	ml	45.00	$ 403,588.00	$ 18,161,460.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,10	TERMINALES PREFORMADOS TIPO EXTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-333, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 1,335,101.00	$ 1,335,101.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

13,11	TERMINALES PREFORMADOS TIPO INTERIOR 15 KV 2-3/0 AWG NORMA CODENSA CS-332, JUEGO DE 3 UND.	Jgo	1.00	$ 753,826.00	$ 753,826.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,12	Malla de puesta a tierra de la subestaciòn conformada por 8 varillas de cobre de 2.44m; 50m de cable desnudo 2/0, Soldadura exotermina y caja de inspeccion para SPT	und	1.00	$ 7,553,032.00	$ 7,553,032.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
TABLEROS DE DISTRIBUCION													
13,13	Tablero General de medida semidirecta en Baja Tension según Norma AE 319, con totalizador de 630A, 3 transformadores de corriente tipo barra pasante de 600/5 A, Calibrados y homologados, Bloque de pruebas y Medidor trifasico electronico de 220V; 10A.	und	1.00	$ 12,522,824.00	$ 12,522,824.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,14	Tablero de Distribucion General del Sistema Normal. Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con Barraje 3F+N+T de 800Amp, totallizador de 630Amp. Protecciones según diagrama unifilar. DPS calse I, II Elementos de Medida.	und	1.00	$ 31,239,059.00	$ 31,239,059.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,15	instalacion planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 24,560,229.00	$ 24,560,229.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
13,16	Tablero de Distribucion General del Sistema Emergenca Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 21,476,059.00	$ 21,476,059.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,17	Transferencia automatica motorizada de 600A-220 Vac	und	1.00	$ 23,637,686.00	$ 23,637,686.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,18	Transferencia automatica motorizada de 200A-220 Vac	und	1.00	$ 10,704,140.00	$ 10,704,140.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,19	Transferencia automatica motorizada de 100A-220 Vac	und	2.00	$ 4,967,946.00	$ 9,935,892.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,20	Tablero de Distribucion General Sistema Normal con suplencia Compuesto por cofre de 1200x2100x400 con pintura electroestarica Rall 7032 con barraje 3F+N+ T de 800Amp , totallizador de 600Amp. E interruptores según diagrama unifilar	und	1.00	$ 23,629,289.00	$ 23,629,289.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,21	Tablero de Distribucion del Sistema Vital que contiene Totalizador de 3x100A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	2.00	$ 7,667,146.00	$ 15,334,292.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,22	Tablero de Distribucion del Sistema Critico que contiene Totalizador de 3x80A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar.	und	2.00	$ 7,989,135.00	$ 15,978,270.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,23	Tablero de Distribucion del Sistema Regulado que contiene Totalizador de 3x50A y protecciones de acuerdo con diagrama unifilar	und	1.00	$ 4,668,036.00	$ 4,668,036.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,24	Tablero de Aire Acondicionado Central con totalizador de 500A; 2 protecciones de 260A, 2 de 63A y 4 de 32A	und	1.00	$ 24,046,534.00	$ 24,046,534.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

13,25	Tablero de Aire Acondicionado TAA1 y TAA2 ycompresores TCMP con totalizador de 3x32 y 8 de 1x10A	und	3.00	$ 5,315,900.00	$ 15,947,700.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
13,26	Tablero de Ascensores 1 con Totalizador de 100A, 2 de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 3,276,271.00	$ 3,276,271.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,27	Tablero de Ascensores 2 con 1 taco de 3x63A y 3x10A	und	1.00	$ 1,516,287.00	$ 1,516,287.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,28	Caja de By-Pass para UPS de 12 KVA trifasica de 50A	und	1.00	$ 1,749,894.00	$ 1,749,894.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,29	Instalacion UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 2,772,480.00	$ 5,544,960.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,30	instalacion UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 1,122,481.00	$ 2,244,962.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,31	Instalacion UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 682,481.00	$ 2,047,443.00	7.91%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,32	instalacion UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 554,496.00	$ 1,108,992.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,33	instalacion tablero Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 654,896.00	$ 1,309,792.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	ACOMETIDAS DE BAJA TENSION Y TABLEROS DE CIRCUITOS													
13,34	Caja de paso CS 275	und	1.00	$ 1,789,897.00	$ 1,789,897.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,35	Caja de Inspeccion CS 274	und	4.00	$ 1,633,489.00	$ 6,533,956.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,36	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+20ø2"; incluye excavacion	ml	20.00	$ 906,938.00	$ 18,138,760.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,37	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+12ø2"; incluye excavacion	ml	3.15	$ 635,105.00	$ 2,000,580.75			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,38	Canalizacion Subterranea de 1ø4"+5ø2"; incluye excavacion	ml	5.50	$ 444,519.00	$ 2,444,854.50			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,39	Canalizacion Subterranea de 4x2"; incluye excavacion	ml	10.30	$ 280,256.00	$ 2,886,636.80			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,40	Canalizacion Subterranea de 2x4"8x2"; incluye excavacion	ml	20.53	$ 520,829.00	$ 10,692,619.37			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
13,41	Canalizacion Subterranea de 1x1"; incluye excavacion	ml	89.42	$ 39,719.00	$ 3,551,672.98			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,42	Canalizacion Subterranea de 1x2"; incluye excavacion	ml	44.16	$ 58,669.00	$ 2,590,823.04			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,43	Acometida Parcial en 2(3X250+1X250N)+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para TAAC	ml	167.35	$ 2,026,175.00	$ 339,080,386.25			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.63%	0.00%
13,44	Acometida Parcial en 3X250+1X250N+2/0T AWG-THHN; Libre de Halogenos Para Banco de reactiva	ml	12.00	$ 1,039,597.00	$ 12,475,164.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,45	Acometida Parcial en 3X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	246.04	$ 337,699.00	$ 83,087,461.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
13,46	Acometida Parcial en 2X2+1X1/0N+4T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	111.68	$ 273,916.00	$ 30,590,938.88			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,47	Acometida Parcial en 3X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	110.84	$ 201,526.00	$ 22,337,141.84			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,48	Acometida Parcial en 2X4+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	170.61	$ 132,156.00	$ 22,547,135.16			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,49	Acometida Parcial en 2X6+1X4N+8T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	184.35	$ 121,579.00	$ 22,413,088.65			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,50	Acometida Parcial en 2X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	203.15	$ 64,403.00	$ 13,083,469.45			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,51	Acometida Parcial en 3X8+1X8N+10T AWG-THHN; Libre de Halogenos	ml	232.94	$ 88,000.00	$ 20,498,720.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,52	Tablero de 18 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	4.00	$ 1,085,293.00	$ 4,341,172.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,53	Tablero de 18 Circuitos bifasico	und	2.00	$ 743,874.00	$ 1,487,748.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,54	Tablero de 12 Circuitos trifasico con espacio para totalizador	und	1.00	$ 879,174.00	$ 879,174.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,55	Tablero de 12 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	2.00	$ 571,515.00	$ 1,143,030.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,56	Tablero de 8 Circuitos Bifasico con chapa y puerta	und	11.00	$ 330,878.00	$ 3,639,658.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

13,57	Interruptor Industrial 3x100A	und	5.00	$ 224,196.00	$ 1,120,980.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,58	Interruptor Industrial 3x80A	und	4.00	$ 224,196.00	$ 896,784.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,59	Interruptor enchufable 1x15A	und	90.00	$ 28,982.00	$ 2,608,380.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,60	Interruptor enchufable 1x20A	und	92.00	$ 28,982.00	$ 2,666,344.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	INSTALACIONES INTERNAS												
13,61	Salidas iluminación interior a 110v en tuberia PVC SCH40	und	482.00	$ 257,078.00	$ 123,911,596.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.59%	0.00%
13,62	Salidas iluminación de evacuacion y emergencia a 110v en tuberia PVC SCH40	und	140.00	$ 369,215.00	$ 51,690,100.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.25%	0.00%
13,63	Lámpara 60x60 tipo led de 53 W Mx-120Vac	und	172.00	$ 212,048.00	$ 36,472,256.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
13,64	Lámpara redonda de 8" tipo led de 24 W Mx- 120Vac	und	276.00	$ 110,073.00	$ 30,380,148.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,65	Lámpara aplique en pared tipo tortuga con bombillo LED de 12W- 120Vac	und	6.00	$ 116,673.00	$ 700,038.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,66	Lámpara de Evacuación Rectangular "SALIDA" Verde 120-130V	und	21.00	$ 230,523.00	$ 4,840,983.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,67	Lámpara de Emergencia R1LED 2x1,6W Unv.	und	87.00	$ 209,073.00	$ 18,189,351.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
13,68	Lámpara Rectangular Led 50W hermetica	und	27.00	$ 309,997.00	$ 8,369,919.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
13,69	Salida toma 120 V normal	und	565.00	$ 229,131.00	$ 129,459,015.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.62%	0.00%
13,70	Salida toma 120 V normal grado hospitalario	und	58.00	$ 230,781.00	$ 13,385,298.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,71	Salida toma 120 V normal Naranja grado hospitalario	und	160.00	$ 256,356.00	$ 41,016,960.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
13,72	Salida toma 220 V A.A.	und	36.00	$ 382,438.00	$ 13,767,768.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
13,73	Salida de TV en Tuberia EMT de 3/4" y Cable Coaxial	und	16.00	$ 368,274.00	$ 5,892,384.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
13,74	Lámpara Highby de 100W	und	11.00	$ 426,646.00	$ 4,693,106.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
13,75	lampara wall pack LED de 100W	und	15.00	$ 443,247.00	$ 6,648,705.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRATRAYOS (SIPRA)												
13,76	Cable de cobre desnudo 2/0	und	215.26	$ 94,814.00	$ 20,409,661.64		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
13,77	Caja de inspeccion AP280	und	4.00	$ 244,226.00	$ 976,904.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
13,78	Varilla de cobre 2.44mx5/8"	und	4.00	$ 381,178.00	$ 1,524,712.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,79	Punto de soldadura exotermica	und	8.00	$ 155,428.00	$ 1,243,424.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
13,80	Alambron de aluminio de 8mm con accesorios de unio	ml	352.00	$ 66,690.00	$ 23,474,880.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
13,81	Punta captadora de 1.2m con base	und	42.00	$ 297,860.00	$ 12,510,120.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
13,82	Trancision Alambron- cable de cobre	und	4.00	$ 1,866,119.00	$ 7,464,476.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS												
13,83	Rack de telecomunicaciones, equipado	und	1.00	$ 28,965,499.00	$ 28,965,499.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
13,84	Salida de voz y datos aparateada	und	37.00	$ 1,399,278.00	$ 51,773,286.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.25%	0.00%
13,85	Salida de datos aparateada categoria 6	und	23.00	$ 1,332,768.00	$ 30,653,664.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
13,86	Cable UTP categoria 6	ml	3,127.00	$ 9,711.00	$ 30,366,297.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.15%	0.00%
	TOTAL CAPITULO				**$ 1,650,061,414.27**	**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
14	**INSTALACIONES ESPECIALES**												
	INSTALACIONES DE GAS Y GASES MEDICINALES												
14,1	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1/2" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	350.00	$ 78,890.00	$ 27,611,500.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,2	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 3/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	420.00	$ 90,903.00	$ 38,179,260.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
14,3	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	120.00	$ 176,295.00	$ 21,155,400.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
14,4	Tubería de Cobre tipo L. Díam: 1-1/4" (incluye soportes, uniones, codos, tees, soldadura)	ml	90.00	$ 196,286.00	$ 17,665,740.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
14,5	Toma Tipo Amico, Chemetrón, Gentec ó similar, Quick Connect para Oxígeno	ml	53.00	$ 539,969.00	$ 28,618,357.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

14,6	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 1/2". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	12.00	$ 183,713.00	$ 2,204,556.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
14,7	Válvula de corte en Acero Inoxidable tipo 4 tornillos 1000 WOG. Díam: 3/4". Incluye Adaptadores de Bronce. Todo costo	und	3.00	$ 111,510.00	$ 334,530.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
14,8	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x3/4". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	5.00	$ 2,514,455.00	$ 12,572,275.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
14,9	Caja de Válvulas con válvula en SS tipo 4 tornillos 600 WOG. Díam: 1/2"x1". Fabricación Nacional.(Incluye cajas, marco, válvulas, manometro e instalación)	und	1.00	$ 2,322,489.00	$ 2,322,489.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
14,10	PANEL DE CABECERA TROQUELADO COMPARTIMENTO INDEPENDIENTE, PINTURA CERTIFICADA, TOMA TIPO MEDICO PUNTO ELECTRICO REGULADO, NORMAL Y EMERGENCIA, DE 1,9MTS, CON TOMA DE OXIGENO Y VACIO, ATRIL SE SERVICIOS INTEGRADO DESLIZANTE EN ACERO INOXIDABLE, CANASTA DE ACCESORIOS TROQUELADA CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	27.00	$ 7,899,998.00	$ 213,299,946.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.02%	0.00%
14,11	COLUMNA DE SERVICIOS PISO TECHO, INCLUYE SEIS TOMASDE OXIGENO,2DE VACIO 2 DE AIRE TIPO CHEMETRON, 6 TOMAS ELECTRICAS, DOS DE ELLAS REGULADAS, CUMPLE CON NORMA NFPA 99. CERTIFICACION UL, IEC 60601, ISO9001.	und	2.00	$ 29,899,997.00	$ 59,799,994.00	3.25%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.29%	0.00%
14,12	Alarma de Área para DOS señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	3.00	$ 8,899,998.00	$ 26,699,994.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
14,13	Central para Oxigeno, Control Automatico Amico o similar microcontrolado, Estructura para Manifold 3x3 con soportes,ángulos, colectores, válvulas de corte de alta presión por cilindro y Mangueras importadas.	und	1.00	$ 53,400,000.00	$ 53,400,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.26%	0.00%
14,14	Alarma de Maestra para central de Gases de 10 señales Marca Amico, Chemetron ó similar, para Oxigeno con Sensor Remoto y valvula de bola de 1/4", Incluye instalación de la caja, el panel y el sensor, interconexión de modulos, configuración y pruebas de funcionamiento.	und	1.00	$ 4,565,801.00	$ 4,565,801.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

14,15	Sistema de Vacio Duplex de 3 hp según cumplimiento de Norma NFPA 99, este sistema cuenta con Dos Bombas de Anillo liquido de 3 HP, con un Tanque Acomulador de 100 Galones, Tablero Electrico con selectores de Bomba Luminosos, Tanque Alimentacion Anillo, Acople Flexible a la Unidad de Vacio y Drenaje Tanque Acumulador	und	1.00	$ 116,299,997.00	$ 116,299,997.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.56%	0.00%
LLAMADO DE ENFERMERIA														
14,16	CONSOLA de llamado de enfermeria, incluye display a bajo voltaje, comunicación bidireccional, incluye unidad master de control y receptor de meson	und	2.00	$ 12,999,998.00	$ 25,999,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
14,17	pulsador para llamado de enfermeria con altavoz, senaluminosa y a bajo voltaje	und	24.00	$ 320,000.00	$ 7,680,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
14,18	DISPLAY DOBLE SENTIDOS VISUALIZADOR TIPO LED	und	2.00	$ 4,799,998.00	$ 9,599,996.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
14,19	TABLERO PARA USO EN BAÑOS	und	21.00	$ 179,999.00	$ 3,779,979.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
14,20	Cable UTP categoria 6. Suministro e instalación.	ml	647.00	$ 9,042.00	$ 5,850,174.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 677,639,984.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
15	**RED CONTRAINCENDIOS**													
15,1	TUBERIA AC SCH 40 1" SUMINISTRO	ml	565.04	$ 87,539.00	$ 49,463,036.56			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.24%	0.00%
15,2	TUBERIA AC SCH 40 1 1/2"	ml	212.97	$ 113,768.00	$ 24,229,170.96			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
15,3	TUBERIA AC SCH 40 2" SUMINISTRO	ml	58.28	$ 151,691.00	$ 8,840,551.48			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,4	TUBERIA AC SCH 40 2 1/2"	ml	82.46	$ 189,614.00	$ 15,635,570.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
15,5	TUBERIA AC SCH 40 3" SUMINISTRO	ml	207.17	$ 227,542.00	$ 47,139,876.14			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.23%	0.00%
15,6	TUBERIA AC SCH 40 4" SUMINISTRO	ml	101.52	$ 262,847.00	$ 26,684,227.44			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
15,7	SOPORTE TIPO PERA 1"	und	141.00	$ 36,026.00	$ 5,079,666.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,8	SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	und	46.00	$ 38,540.00	$ 1,772,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,9	SOPORTE TIPO PERA 2"	und	13.00	$ 41,520.00	$ 539,760.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,10	SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	und	18.00	$ 45,650.00	$ 821,700.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
15,11	SOPORTE TIPO PERA 3"	und	45.00	$ 48,752.00	$ 2,193,840.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,12	SOPORTE TIPO PERA 4"	und	22.00	$ 54,560.00	$ 1,200,320.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,13	STRAP 1"x1/2"	und	120.00	$ 92,731.00	$ 11,127,720.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
15,14	STRAP 1 1/2"x1/2"	und	170.00	$ 77,666.00	$ 13,203,220.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,15	ROCIADOR PENDENT - ACCION	und	290.00	$ 289,021.00	$ 83,816,090.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.40%	0.00%
15,16	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	2.00	$ 4,683,605.00	$ 9,367,210.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
15,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	26.00	$ 186,940.00	$ 4,860,440.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
15,18	EXTINTOR CLASE BC SEGÚN NTC	und	12.00	$ 165,840.00	$ 1,990,080.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,19	SIAMESA 4" x 2,1/2" x 2,1/2"	und	1.00	$ 1,425,620.00	$ 1,425,620.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
15,20	CUARTO DE BOMBAS RED INCENDIO	und	1.00	$ 6,545,230.00	$ 6,545,230.00	1.89%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
15,21	ESTACION DE CONTROL Y DRENAJE	und	1.00	$ 5,489,056.00	$ 5,489,056.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
DETECCIÓN DE INCENDIOS														
15,22	Detector o sensor de humo certificado UL/FM. Suministro e Instal. O similar	und	86.00	$ 346,501.00	$ 29,799,086.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
15,23	Estacion o pulsador manual de incendios de doble accion, incluye stopper o cubierta transparente para estación con espaciador y sirena 95 db. Suministro e Instal.	und	11.00	$ 1,186,000.00	$ 13,046,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
15,24	Cableado de incendios (3x22 awg-3x16 awg) para dispositivos de entrada o salida . Incluye tuberia conduit EMT Ø 1" y caja de paso 5800. Suministro e Instal.	ml	845.00	$ 26,109.00	$ 22,062,105.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
15,25	Alarma automatica visual y sonora	und	19.00	$ 430,738.00	$ 8,184,022.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

	TOTAL CAPITULO				$ 394,516,438.02		TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO	$ 0.00	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	$ 0.00	%TOTAL EJECUTADO CAPITULO	0.00%
16	RED DE VENTILACION MECANICA														
	CONDUCTOS PARA TRANSPORTE DE AIRE, DIFUSORES Y REJILLAS														
16,1	Conductos INTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion) 20 mm	m2	754.00	$ 220,000.00	$ 165,880,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%
16,2	Conductos EXTERIORES en Polisocianurato sin pintura (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)30 mm	m2	120.00	$ 280,000.00	$ 33,600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,3	Conductos metalicos en lamina galvanizada calibre 24 (Incluye soportes, cinta, insumos, mano de obra de instalación, transporte, fabricacion)	m2	280.00	$ 150,000.00	$ 42,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%
16,4	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 6"x6"	und	11.00	$ 125,000.00	$ 1,375,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,5	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 9"x9"	und	9.00	$ 186,000.00	$ 1,674,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,6	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 12"x12"	und	22.00	$ 284,000.00	$ 6,248,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,7	Difusor de suministro de aire multiireccional de 4 vias con damper 15"x12"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,8	Difusor de suministro de aire multiireccional de 3 vias con damper 15"x9"	und	2.00	$ 270,000.00	$ 540,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,9	Difusor de suministro de aire multiireccional de 3 vias con damper 12"x9"	und	2.00	$ 230,000.00	$ 460,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,10	Difusor de suministro de aire multiireccional de 3 vias con damper 9"x6"	und	1.00	$ 145,000.00	$ 145,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,11	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 16"x16"	und	3.00	$ 420,000.00	$ 1,260,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,12	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 22"x22"	und	1.00	$ 740,000.00	$ 740,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,13	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 14"x14"	und	5.00	$ 340,000.00	$ 1,700,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,14	Rejilla de retorno tipo persiana con damper de 8"x8"	und	3.00	$ 150,000.00	$ 450,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,15	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 6"x6"	und	48.00	$ 110,000.00	$ 5,280,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,16	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 8"x8"	und	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,17	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 12"x12"	und	7.00	$ 260,000.00	$ 1,820,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,18	Rejilla de extraccion tipo persiana con damper de 14"x12"	und	2.00	$ 300,000.00	$ 600,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,19	Rejilla tipo louver con damper de 16"X12"	und	2.00	$ 380,000.00	$ 760,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,20	Rejilla tipo louver con damper de 12"X12"	und	1.00	$ 320,000.00	$ 320,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,21	Rejilla tipo louver con damper de 26"X18"	und	1.00	$ 890,000.00	$ 890,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,22	Rejilla tipo louver con damper de 20"X10"	und	1.00	$ 420,000.00	$ 420,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,23	Rejilla tipo louver con damper de 20"X16"	und	1.00	$ 480,000.00	$ 480,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

16,24	Rejilla tipo louver con damper de 20"X20"	und	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,25	Rejilla tipo louver con damper de 30"X24"	und	1.00	$ 1,350,000.00	$ 1,350,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TUBERIAS, ACCESORIOS CONDUCCION DE AGUA												
16,26	Tuberias hidronica aislada termicamente de 4" de diametro	ml	14.00	$ 580,000.00	$ 8,120,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,27	Tuberias hidronica aislada termicamente de 3" de diametro	ml	55.00	$ 470,000.00	$ 25,850,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,28	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2,5" de diametro	ml	60.00	$ 432,000.00	$ 25,920,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,29	Tuberias hidronica aislada termicamente de 2" de diametro	ml	95.00	$ 370,000.00	$ 35,150,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.17%	0.00%
16,30	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,5" de diametro	ml	120.00	$ 205,000.00	$ 24,600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,31	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1,25" de diametro	ml	82.00	$ 180,000.00	$ 14,760,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
16,32	Tuberias hidronica aislada termicamente de 1" de diametro	ml	170.00	$ 135,000.00	$ 22,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,33	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,75" de diametro	ml	230.00	$ 118,000.00	$ 27,140,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.13%	0.00%
16,34	Tuberias hidronica aislada termicamente de 0,5" de diametro	ml	40.00	$ 105,000.00	$ 4,200,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,35	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 4"	und	3.00	$ 495,000.00	$ 1,485,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,36	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 3"	und	7.00	$ 250,000.00	$ 1,750,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,37	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2,5"	und	10.00	$ 180,000.00	$ 1,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,38	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 2"	und	6.00	$ 138,000.00	$ 828,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,39	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,5"	und	16.00	$ 95,000.00	$ 1,520,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,40	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1,25"	und	18.00	$ 67,000.00	$ 1,206,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,41	Tuberia hidronica TEE aislada termicamente de 1"	und	18.00	$ 54,000.00	$ 972,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,42	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 420,000.00	$ 840,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,43	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 3"	und	12.00	$ 210,000.00	$ 2,520,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,44	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2,5"	und	8.00	$ 200,000.00	$ 1,600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,45	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 2"	und	18.00	$ 158,000.00	$ 2,844,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,46	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1,5"	und	12.00	$ 83,000.00	$ 996,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,47	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 1"	und	40.00	$ 47,000.00	$ 1,880,000.00	3.90%	$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,48	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,75"	und	94.00	$ 38,000.00	$ 3,572,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,49	Tuberia hidronica CODO aislado termicamente de 0,5"	und	16.00	$ 34,000.00	$ 544,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,50	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 4"	und	2.00	$ 694,000.00	$ 1,388,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,51	Tuberia hidronica BRIDA aislado termicamente de 3"	und	6.00	$ 540,000.00	$ 3,240,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,52	Tuberia hidronica Eliminador de vibracion de 3"	und	6.00	$ 1,250,000.00	$ 7,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,53	Valvula triple servcio de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 4,560,000.00	$ 9,120,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,54	Codo difusor con filtro de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	2.00	$ 2,850,000.00	$ 5,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

16,55	Tanque Separador de aire tangencial de 3" marca Grundfos aislada en espuma elastomerica denominacion R de armaflex	und	1.00	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,56	Vaso de expansion cerrado grundfos tipo diafragma de 48 galones	und	1.00	$ 4,950,000.00	$ 4,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,57	Valvula en bronce tipo bola de 2 " aislada	und	6.00	$ 380,000.00	$ 2,280,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,58	Valvula en bronce tipo bola de 1,5 " aislada	und	2.00	$ 235,000.00	$ 470,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,59	Valvula en bronce tipo bola de 1 " aislada aislada	und	18.00	$ 120,000.00	$ 2,160,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,60	Valvula en bronce tipo bola de 0,75" aislada aislada	und	46.00	$ 72,000.00	$ 3,312,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,61	Valvula en bronce tipo bola de 0,5" aislada aislada	und	8.00	$ 60,000.00	$ 480,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,62	Valvula tipo mariposa metalica de 2,5 "	und	2.00	$ 250,000.00	$ 500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,63	Valvula tipo mariposa metalica de 3 "	und	6.00	$ 290,000.00	$ 1,740,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,64	Valvula tipo mariposa metalica de 4 "	und	2.00	$ 425,000.00	$ 850,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,65	Termometros bimetalico caratula de 3" con accesorios en polipropileno (UMA-01-02-03-04-05)	und	10.00	$ 250,000.00	$ 2,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,66	Termometros de mercurio tipo columna con accesorios en polipropileno para chiller	und	4.00	$ 350,000.00	$ 1,400,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,67	Manometros tipo bourdon en gliserina con accesorios	und	15.00	$ 120,000.00	$ 1,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,68	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,5 de diametro	und	4.00	$ 1,350,000.00	$ 5,400,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,69	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 0,75 de diametro	und	23.00	$ 1,450,000.00	$ 33,350,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.16%	0.00%
16,70	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1" de diametro	und	9.00	$ 1,650,000.00	$ 14,850,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.07%	0.00%
16,71	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 1,5" de diametro	und	1.00	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,72	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2" de diametro	und	3.00	$ 2,680,000.00	$ 8,040,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
16,73	Valvulas de 2 vias con actuador modulante de 2,5" de diametro	und	1.00	$ 3,270,000.00	$ 3,270,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,74	Termostato tipo ambiente digital	und	5.00	$ 420,000.00	$ 2,100,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
	TABLERO ELECTRICO												
16,75	Tablero electrico de potencia y control (Incluye cofre, Breiker totalizadores para chiller y unidades manejadoras y extractoras de aire, arrancadores con bimetalico ajustable y muletillas de aranque y parada.	und	1.00	$ 13,500,000.00	$ 13,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
	MONTAJE DE EQUIPOS												
16,76	Montaje arranque y pruebas de operación de enfriadores de agua	und	2.00	$ 12,500,000.00	$ 25,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.12%	0.00%
16,77	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades manejadoras de aire	und	5.00	$ 4,500,000.00	$ 22,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.11%	0.00%
16,78	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades interiores tipo cassete y fancoil	und	36.00	$ 550,000.00	$ 19,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
16,79	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractoras de aire	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,80	Montaje arranque y pruebas de operación de Unidades extractora de aire tipo plafon	und	47.00	$ 90,000.00	$ 4,230,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
16,81	Balanceo distribucion de aire (130 difusores y rejillas)	und	1.00	$ 6,500,000.00	$ 6,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
16,82	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (compacta)	und	1.00	$ 65,000,000.00	$ 65,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.31%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

16,83	Instalacion ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 16,452,630.00	$ 16,452,630.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
16,84	Instalacion ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 21,546,200.00	$ 21,546,200.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
16,85	INSTALACION BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	1.00	$ 986,520.00	$ 986,520.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.00%	0.00%
16,86	Instalacion de equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 2,145,620.00	$ 2,145,620.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,87	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 1,654,890.00	$ 1,654,890.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
16,88	Instalacion Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 2,054,200.00	$ 2,054,200.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 814,139,060.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**	
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 14,341,455,487.00**	**68.76%**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS ACUMULADOS PERIODO ANTERIOR**	**$ 1,740,865,781.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	**$ 767,788,811.00**	**TOTAL COSTOS DIRECTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	**$ 2,508,654,592.00**	**%TOTAL EJECUTADO COSTOS DIRECTOS**	**12.03%**	
A,I,U,							**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**		**A.I.U.**		
ADMINISTRACION		**23%**			$ 3,298,534,762.00	15.82%	**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 400,399,130.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 176,591,426.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 576,990,556.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	2.77%	
IMPREVISTOS		**2%**			$ 286,829,110.00	1.38%	**IMPREVISTOS ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 34,817,316.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO**	$ 15,355,776.00	**IMPREVISTOS EJECUTADOS ACUMULADOS**	$ 50,173,092.00	**%TOTAL EJECUTADO IMPREVISTOS**	0.24%	
UTILIDAD		**5%**			$ 717,072,774.00	3.44%	**UTILIDAD ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 87,043,289.00	**UTILIDAD EJECUTADA PERIODO**	$ 38,389,441.00	**UTILIDAD EJECUTADA ACUMULADA**	$ 125,432,730.00	**%TOTAL EJECUTADO UTILIDAD**	0.60%	
TOTAL OBRA CIVIL					**$ 18,643,892,133.00**	**89.39%**	**TOTAL OBRA CIVIL ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	**$ 2,263,125,516.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA PERIODO**	**$ 998,125,454.00**	**TOTAL OBRA CIVIL EJECUTADA ACUMULADA**	**$ 3,261,250,970.00**	**%TOTAL EJECUTADO OBRA CIVIL**	**15.64%**	
17	**EQUIPOS ESPECIALES**														
17,1	Ascensor ocho (8) personas 2 paradas	und	1.00	$ 135,000,000.00	$ 135,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.65%	0.00%	
17,2	Ascensor camillero 2 paradas	und	1.00	$ 167,409,500.00	$ 167,409,500.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.80%	0.00%	
17,3	BOMBA BARNES LINEA ALTA PRESION HE 2-75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 o similar	und	2.00	$ 4,356,200.00	$ 8,712,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%	
17,4	Equipo hidroneumático BARNES Modelo APT2-HE 2-75-501 Referencia 1J6008 (Cantidad Tanque 1, Tanque Litros 500) o similar (inc. Accesorios, tablero, sistematizacion).	und	1.00	$ 17,176,471.00	$ 17,176,471.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%	
17,5	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI (jockey). Potencia 7.5 HP, 12 gpm, altura dinamica 74 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 12,373,000.00	$ 12,373,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%	

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

17,6	Bomba vertical tipo "turbina" listada RCI. Potencia 30 HP, 232 a 350 gpm, altura dinamica 67 m.c.a. o Similar.	und	1.00	$ 18,611,000.00	$ 18,611,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
17,7	Tansformador de 225 KVA tipo seco, 13.200/220-120V; incluye 3 DPS polimericos; termostato	und	1.00	$ 44,210,951.00	$ 44,210,951.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%
17,8	Planta electrica de 200 kW Insonora; 220Vac	und	1.00	$ 246,934,782.00	$ 246,934,782.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.18%	0.00%
17,9	UPS de 10 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 10,204,381.00	$ 20,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.10%	0.00%
17,10	UPS de 7.5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 6,204,381.00	$ 12,408,762.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,11	UPS de 5 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	3.00	$ 3,887,946.00	$ 11,663,838.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,12	UPS de 3 KVA, Bifasica, 220Vac, 10 minutos de Autonomia	und	2.00	$ 5,953,600.00	$ 11,907,200.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,13	Transformador de Aislamiento 1:1; 3 KVA, 220 Vac	und	2.00	$ 9,031,200.00	$ 18,062,400.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
17,14	Enfriador de agua tipo chiller de descarga vertical de 60 TR refrigerante R-410a 220 VAC trifasico, 220 vac PH-3 R-410a.	und	2.00	$ 198,000,000.00	$ 396,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	1.90%	0.00%
17,15	Electrobomba tipo dual vertical en linea caudal 175 GPM cabeza 15 Pies.	und	2.00	$ 35,000,000.00	$ 70,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.34%	0.00%
17,16	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 286,000 Btu/h caudal 5330 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 56,000,000.00	$ 56,000,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.27%	0.00%
17,17	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 167,000 Btu/h caudal 2850 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 41,500,000.00	$ 41,500,000.00	7.80%		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.20%	0.00%

Consorcio HDC

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

17,18	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 220,000 Btu/h caudal 3440 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 46,800,000.00	$ 46,800,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.22%	0.00%
17,19	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 149,000 Btu/h caudal 3780 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 44,600,000.00	$ 44,600,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.21%	0.00%
17,20	Unidad manejadora de aire tipo hospitalaria doble pared con kid de filtracion (Merv4/Merv 13) Calor total 92,000 Btu/h caudal 1980 cfm con plenum de mezcla	und	1.00	$ 28,500,000.00	$ 28,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.14%	0.00%
17,21	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 8000 Btu/hr	und	4.00	$ 4,500,000.00	$ 18,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.09%	0.00%
17,22	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 15000 Btu/hr	und	15.00	$ 5,200,000.00	$ 78,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.37%	0.00%
17,23	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 20000 Btu/hr	und	6.00	$ 6,200,000.00	$ 37,200,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,24	Unidad interior tipo cassete de 4 vias hidronica de 26000 Btu/hr	und	2.00	$ 6,500,000.00	$ 13,000,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.06%	0.00%
17,25	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 30000 Btu/hr	und	1.00	$ 5,500,000.00	$ 5,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.03%	0.00%
17,26	Unidad interior tipo fancoil hidronica de 15000 Btu/hr	und	8.00	$ 4,800,000.00	$ 38,400,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.18%	0.00%
17,27	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1260 cfm, SP 0,6 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,28	Unidad de extraccion centrifuga de aire 2120 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,500,000.00	$ 3,500,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,29	Unidad de extraccion centrifuga de aire 1450 cfm, SP 0,5 in.c.a	und	1.00	$ 3,250,000.00	$ 3,250,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.02%	0.00%
17,30	Unidad de extraccion centrifuga de aire 850 cfm, SP 0,4 in.c.a	und	1.00	$ 2,700,000.00	$ 2,700,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,31	Unidad de extraccion centrifuga de aire 400 cfm, SP 0,3 in.c.a	und	1.00	$ 2,300,000.00	$ 2,300,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,32	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 160 cfm	und	5.00	$ 450,000.00	$ 2,250,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%
17,33	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 80 cfm	und	34.00	$ 290,000.00	$ 9,860,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.05%	0.00%
17,34	Unidad de extraccion centrifuga de aire tipo plafon 60 cfm	und	8.00	$ 190,000.00	$ 1,520,000.00		$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.01%	0.00%

FORMATO DE AVANCE MENSUAL DE OBRA

TOTAL CAPITULO					**$ 1,627,009,066.00**		**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
18	**RETIE Y RETILAP**													
18,1	Certificacion RETIE de la Red de Media Tensio; Transformador, Subestacion y Uso Final	und	1.00	$ 15,890,000.00	$ 15,890,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.08%	0.00%
18,2	Certificacion de RETILAP	und	615.00	$ 15,000.00	$ 9,225,000.00			$ 0.00		$ 0.00	0	$ 0.00	0.04%	0.00%
TOTAL CAPITULO					**$ 25,115,000.00**	**0.12%**	**TOTAL ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO EN EL PERIDODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO CAPITULO**	**0.00%**
	ADMINISTRACION		**13%**	$ 211,511,178.58	1.01%		**ADMINISTRACION ACUMULADA PERIODO ANTERIOR**	$ 0.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA EN EL PERIODO**	$ 0.00	**ADMINISTRACION EJECUTADA ACUMULADA**	$ 0.00	**%TOTAL EJECUTADO ADMINISTRACION**	0.00%
	IVA 19% EQUIPOS + ADMON		**19%**	$ 349,318,846.00	1.67%		**IVA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR**	$ 0.00	**IVA EJECUTADO EN EL PERIODO**	$ 0.00	**IVA EJECUTADO ACUMULADO**	$ 0.00	**%TOTAL EJECUTADO TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.**	0.00%
	TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A.			**$ 2,187,839,090.58**	**10.49%**		**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 0.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 0.00**	**TOTAL EQUIPOS + ADMON + I.V.A. EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 0.00**	**%TOTAL EJECUTADO + I.V.A.**	**0.00%**
VALOR DEL CONTRATO + RETIE Y RETILAP					**$ 20,856,846,224.00**	**100.00%**	**VALOR DEL CONTRATO ACUMULADO EN EL PERIODO ANTERIOR**	**$ 2,263,125,516.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EN EL PERIODO**	**$ 998,125,454.00**	**VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO ACUMULADO**	**$ 3,261,250,970.00**	**%TOTAL EJECUTADO VALOR DEL CONTRATO**	**15.64%**

PORCENTAJE ACUMULADO EN PERIODO ANTERIOR	10.85%
PORCENTAJE EJECUTADO EN EL PERIODO	4.79%
PORCENTAJE ACUMULADO PROXIMO PERIODO	15.64%

COMITES DE OBRA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	Calidad para el progreso **Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITE No. 13

FECHA	2	8	2024

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO DE CONTRATO:

"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO"

I. PARTICIPANTES	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO HDC	
ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO HDC	
ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. REYNEL ALDANA CAMACHO	APOYO A LA SUPERVISION ESE	

II. OBJETO DEL COMITÉ

Evaluar el progreso continuo en el armado de acero en sitio, incluyendo acero de vigas de encerramiento, acero de muro de carga y vigas de cimentación, el vaciado de columnas y zapatas, y la gestión de las aguas pluviales que afectan las zanjas de vigas y zapatas.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se revisa el acta del comité del 26 de julio de 2024. No se presentaron obsercaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

El armado de acero en sitio continúa, incluyendo acero de vigas de encerramiento, acero de muro de carga y vigas de cimentación.

Se han mantenido las jornadas adicionales de trabajo para compensar el tiempo perdido por las lluvias.

Se han mantenido las jornadas adicionales de trabajo para compensar el tiempo perdido por las lluvias.

V. TEMAS TRATADOS

Siendo las 10:00 de la mañana del día 2 de agosto de 2024, se reunió el CONSORCIO HDC, SUPERVISIÓN y CONSORCIO SAN RAFAEL con el fin de abordar los siguientes temas:

1.Armado de acero

Interventoría: ¿Cómo está progresando el armado de acero en las vigas de encerramiento, muros de carga y vigas de cimentación?

Obra: Estamos avanzando de acuerdo con las especificaciones y planos estructurales. El trabajo en el acero para las vigas de encerramiento, muros de carga y vigas de cimentación está en curso. Aunque hemos tenido algunos inconvenientes debido a las lluvias relacionada con el fenomeno del niño, estamos trabajando para cumplir con los plazos establecidos

Obra: ¿Han observado algún problema específico con el armado de acero hasta ahora?

Interventoría: Hasta ahora, no hemos encontrado problemas significativos, pero continuaremos con una supervisión estricta.

Supervisión: Es recomendable realizar inspecciones periódicas para garantizar la conformidad con los procedimientos establecidos.

2,Vaciado de Columnas

Interventoría: ¿Cuál es el estado actual del vaciado de columnas?

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITÉ No. 13

Obra: El vaciado de columnas sigue su curso conforme al plan. Estamos asegurando que se cumplan todas las especificaciones técnicas para mantener la calidad y estabilidad.

Obra: ¿Tienen alguna sugerencia para mejorar este proceso?

Interventoría: Por ahora, todo está en orden, pero sigan con las inspecciones constantes durante el vaciado.

Supervisión: Es importante verificar todas las columnas después del vaciado para asegurar que cumplen con los estándares de calidad.

3.Vaciado de Zapatas

Interventoría: ¿Cómo va el vaciado de zapatas?

Obra: El vaciado de zapatas avanza conforme al cronograma. Estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurar que se realice correctamente y cumpla con los estándares de calidad.

Obra: ¿Algún comentario sobre la calidad del vaciado?

Interventoría: La calidad ha sido buena hasta ahora. Continúen asegurando que se cumplan todas las especificaciones técnicas..

Supervisión: Como vamos con las pruebas de resistencia del concreto que se vacio en las zapatas para confirmar su integridad estructural.

Obra: se siguen tomando muestras aleatorias del concreto vaciado con el fin de fallarlos en el laboratorio

4.Manejo de Aguas Lluvias

Interventoría: ¿Qué estrategias están utilizando para manejar las aguas lluvias en las zanjas?

Obra: Hemos implementado sistemas de drenaje mediante bombas, electrobombas y redirección para mantener las zanjas secas. Estas medidas son cruciales para evitar interrupciones.

Obra: ¿Las medidas implementadas han sido adecuadas?

Interventoría: Si, han funcionado bien hasta ahora, pero es importante monitorear continuamente y ajustar según sea necesario.

5.Reposición de Tiempo de Trabajo

Interventoría: ¿Qué acciones están tomando para compensar el tiempo perdido debido a las lluvias?

Obra:Estamos trabajando durante los días festivos y extendiendo las horas de trabajo para recuperar el tiempo perdido. Esto nos ayuda a mantenernos dentro del cronograma.

Supervisión: Mantengan un registro detallado de las horas extra trabajadas y su impacto en el cronograma del proyecto

6.Riesgos Potenciales

Interventoría: ¿Han identificado nuevos riesgos recientemente?

Obra: Las lluvias continúan siendo un riesgo considerable. Seguimos monitoreando las condiciones climáticas y estamos listos para implementar medidas adicionales de mitigación si es necesario.

Supervisión: Es recomendable una revisión continua del plan de riesgos para incorporar cualquier cambio climático o imprevistos.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Completar el armado de acero para vigas de cerramiento, muros de carga y vigas de cimentación dentro del plazo establecido.	**CONSORCIO HDC**
Mantener las jornadas adicionales de trabajo para compensar los retrasos por las lluvias.	**CONSORCIO HDC**
Supervisar rigurosamente el vaciado de columnas y zapatas, así como la gestión de aguas lluvias en las zanjas de vigas y zapatas, para asegurar la calidad y cumplimiento de los estándares técnicos..	**CONSORCIO SAN RAFAEL**

VII. PROXIMA REUNION

FECHA 8 (DIA) 8 (MES) 2024 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Dos (Día en letras) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD






ACTA DE COMITÉ No. 14

FECHA	8	8	2024

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO DE CONTRATO:

"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO"

I. PARTICIPANTES	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO HDC	
ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO HDC	
ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. REYNEL ALDANA CAMACHO	APOYO A LA SUPERVISION ESE	

II. OBJETO DEL COMITÉ

Evaluar el progreso de las actividades recientes en la obra, incluyendo el vaciado de vigas de cimentación de encerramiento, la instalación de tuberías galvanizadas de 2", el vaciado de concreto para el solado de limpieza, el armado de acero en sitio y el vaciado de columnas, además de discutir los efectos del fenómeno de La Niña en el proyecto y las soluciones implementadas.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se revisa el acta del comité del 2 de agosto de 2024. No se presentaron obsercaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Se han mantenido las jornadas adicionales de trabajo, permitiendo compensar el tiempo perdido debido a las condiciones climáticas adversas.

El armado de acero, vaciado de columnas y zapatas han continuado conforme a lo planificado.

Las medidas de drenaje y redirección de aguas pluviales siguen siendo efectivas en la prevención de inundaciones en las zanjas.

V. TEMAS TRATADOS

Siendo las 10:00 de la mañana del día 8 de agosto de 2024, se reunió el CONSORCIO HDC, SUPERVISIÓN y CONSORCIO SAN RAFAEL con el fin de abordar los siguientes temas:

1.Vaciado de Viga de Cimentación de cerramiento

Interventoría: ¿Cómo ha avanzado el vaciado de las vigas de cimentación de cerramiento?

Obra: Esta semana nos enfocamos en el vaciado de las vigas de cimentación de cerramiento, que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Supervisión: Es importante que este proceso se complete sin contratiempos. ¿Han surgido inconvenientes durante la ejecución?

Obra: No hemos encontrado problemas significativos; el trabajo ha avanzado de manera fluida.

2. Instalación de Tubería Galvanizada de 2"

Interventoría: ¿Qué avances se han logrado en la instalación de la tubería galvanizada?

Obra: La instalación de la tubería de 2" galvanizada comenzó esta semana, asegurando su correcta colocación y alineación según los planos.

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITÉ No. 14

Supervisión: La precisión en este tipo de instalaciones es crucial. ¿Se ha verificado que todos los elementos cumplan con las especificaciones técnicas?

Obra: Sí, se han realizado las verificaciones pertinentes y todo cumple con las normas establecidas.

3. Vaciado de Concreto para Solado de Limpieza

Interventoría: ¿Cuál es el estado del vaciado de concreto para el solado de limpieza?

Obra: El vaciado de concreto para el solado de limpieza se completó según lo planificado, preparando una base adecuada para las próximas fases

Supervisión: Un solado uniforme es esencial para la durabilidad de la estructura. ¿Se han seguido las mejores prácticas en el proceso de vaciado?

Obra: Sí, hemos seguido estrictamente las recomendaciones para asegurar un vaciado uniforme y sin defectos

4. Armado de Acero

Interventoría: ¿Cuál es el progreso del armado de acero?

Obra: El armado de acero en en bodega y obra continúa, enfocado en las vigas de cimentación, los muros de carga y las vigas de encerramiento. Hemos mantenido la calidad en la colocación y unión del acero.

Supervisión: El armado correcto es crítico para la resistencia estructural. ¿Se han realizado inspecciones detalladas durante el proceso?

Obra: Sí, hemos llevado a cabo inspecciones diarias para garantizar la correcta colocación y fijación del acero.

5. Vaciado de Columnas

Interventoría: ¿Cómo va el vaciado de columnas?

Obra: El vaciado de columnas sigue progresando conforme al cronograma, con un enfoque en mantener la calidad estructural.

Supervisión: Las columnas son elementos esenciales en la estructura. ¿Se ha seguido el procedimiento adecuado para garantizar la integridad del vaciado?

Obra: Sí, hemos seguido todos los procedimientos necesarios para asegurar la calidad en el vaciado de columnas

6. Impacto del Fenómeno de La Niña

Interventoría: ¿Cómo están manejando los efectos del fenómeno de La Niña en la obra?

Obra: Las lluvias intensas debido a La Niña han impactado el cronograma, especialmente en las excavaciones y vaciados. Estamos trabajando en días festivos y horas extra para mitigar estos efectos, y hemos mejorado las medidas de drenaje para evitar acumulaciones de agua.

Supervisión: Es vital que las medidas de mitigación sean efectivas para evitar mayores retrasos. ¿Se ha considerado algún ajuste adicional en el cronograma?

Obra: Estamos monitoreando la situación de cerca y ajustando las actividades según sea necesario para mantener el cronograma lo más ajustado posible.

7. Riesgos Potenciales

Interventoría: ¿Se han identificado nuevos riesgos?

Obra: Las lluvias intensas continúan siendo un riesgo significativo. Seguimos ajustando el cronograma y tomando medidas adicionales para minimizar su impacto.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Completar el vaciado de vigas de cimentación de encerramiento y continuar con la instalación de la tubería galvanizada.	**CONSORCIO HDC**
Continuar con el armado de acero en sitio y el vaciado de columnas, asegurando la conformidad con las especificaciones técnicas.	**CONSORCIO HDC**
Mantener la supervisión y las medidas preventivas ante las lluvias intensas causadas por el fenómeno de La Niña.	**CONSORCIO SAN RAFAEL**

VII. PROXIMA REUNION

FECHA 16 (DIA) 8 (MES) 2024 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Ocho (Día en letras) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITÉ No. 15

FECHA	16	8	2024

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO DE CONTRATO:

"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO"

I. PARTICIPANTES	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO HDC	
ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO HDC	
ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. REYNEL ALDANA CAMACHO	APOYO A LA SUPERVISION ESE	

II. OBJETO DEL COMITÉ

Revisar los avances recientes en la obra, especialmente en las excavaciones de zapatas, el solado de limpieza y las actividades de armado de acero en sitio

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se revisa el acta del comité del 8 de agosto de 2024. No se presentaron obsercaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

El vaciado de columnas y de vigas de cimentación se ejecutaron según lo programado.

El armado de acero en sitio avanzó sin interrupciones, enfocándose en las vigas de cimentación y zapatas.

Se mantienen las medidas de manejo de aguas lluvias para evitar retrasos adicionales

V. TEMAS TRATADOS

Siendo las 10:00 de la mañana del día 16 de agosto de 2024, se reunió el CONSORCIO HDC, SUPERVISIÓN y CONSORCIO SAN RAFAEL con el fin de abordar los siguientes temas:

1.Solado de Limpieza para Zapatas

Obra: El solado de limpieza para las zapatas se realizó conforme a las especificaciones técnicas y se ha verificado su calidad. Este paso es crucial para asegurar una base sólida para las fases siguientes de la construcción.

Obra: Esta semana nos enfocamos en el vaciado de las vigas de cimentación de encerramiento, que se realizó de acuerdo con las especificaciones técnicas.

Supervisión: Es importante que el solado se haya hecho correctamente. ¿Se ha revisado la calidad del vaciado?

Interventoría: Hemos constatado que el vaciado del solado cumple con los estándares necesarios, lo que nos permite seguir adelante con la próxima fase

2. Armado de Acero

Obra: El armado de acero en bodega y obra sigue avanzando, cubriendo las vigas de cimentación, muros de carga y zapatas. Nos hemos asegurado de que todo el proceso esté alineado con los planos y especificaciones.

Interventoría: Es esencial que este trabajo se realice con precisión, ya que es fundamental para la resistencia estructural

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITE No. 15

Supervisión: He revisado las inspecciones registradas y todo parece estar bien documentado. Es clave que continuemos este nivel de detalle en cada fase.

3.Suministro e Instalación de Tubo 2" Galvanizado L=3m

Supervisión: ¿Cómo va la instalación de los tubos galvanizados?

Obra: El suministro e instalación del tubo galvanizado de 2" L=3m se ha completado según lo previsto, asegurando que todos los puntos de instalación cumplan con las especificaciones de calidad.

Interventoría: Es crucial que este proceso esté bien documentado y cumpla con las normas técnicas vigentes.

4.Excavación de Zapatas

Supervisión: ¿Cuál es el estado actual de las excavaciones de zapatas?

Obra: Las excavaciones de zapatas están avanzando según lo previsto, con un control técnico estricto para asegurar la correcta profundidad y alineación

Interventoría: El seguimiento de estas excavaciones es fundamental para evitar problemas estructurales futuros. Es importante mantener la precisión en cada fase

5.Manejo de Aguas Lluvias

Supervisión: Las lluvias continúan siendo un desafío. ¿Cómo estamos manejando el agua en el sitio?

Interventoría: Hemos implementado medidas adicionales para asegurar el drenaje adecuado y evitar que las zanjas se inunden.

Obra: Seguimos monitoreando de cerca la situación y ajustando nuestras estrategias de drenaje según sea necesario para mantener el cronograma sin interrupciones.

6.Riesgos Potenciales

Obra: El suministro de materiales sigue siendo un punto crítico debido al paro de camioneros en la vía, provocado por el mal estado de la carretera. Esto está retrasando la llegada de materiales de consumo rápido, lo que podría afectar el avance de las actividades programadas.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Continuar con el armado de acero en sitio y el seguimiento diario de la ejecución.	**CONSORCIO HDC**
Mantener las medidas de manejo de aguas lluvias para evitar retrasos adicionales.	**CONSORCIO HDC**
Finalizar las excavaciones de zapatas y garantizar su alineación con las especificaciones técnicas.	**CONSORCIO HDC**
Monitorear el cumplimiento de las medidas de manejo de aguas lluvias y garantizar que se implementen soluciones efectivas para mitigar cualquier impacto de las lluvias en la obra.	**CONSORCIO SAN RAFAEL**

VII. PROXIMA REUNION

FECHA 23 (DIA) 8 (MES) 2024 (ANO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Dieciséis (Día en letras) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD






ACTA DE COMITÉ No. 16

FECHA	23	8	2024

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO DE CONTRATO:

"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO"

I. PARTICIPANTES	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO HDC	
ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO HDC	
ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. REYNEL ALDANA CAMACHO	APOYO A LA SUPERVISION ESE	

II. OBJETO DEL COMITÉ

Evaluar el progreso en las actividades de construcción recientes, incluyendo el solado de limpieza para vigas de cimentación, el armado de acero en sitio, el suministro e instalación de tubo galvanizado, y las actividades de vaciado de zapatas (en proceso), columnas (en proceso), y vigas de cimentación (en proceso), así como el manejo de aguas lluvias.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se revisa el acta del comité del 16 de agosto de 2024. No se presentaron obsercaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

El armado de acero en sitio sigue en ejecucion y se le esta haciendo un seguimiento diario a ejecución de esta.

Se mantienen las medidas de manejo de aguas lluvias para evitar retrasos adicionales.

Se finalizo las excavaciones de zapatas cumpliaendo las especificaciones técnicas.

V. TEMAS TRATADOS

Siendo las 10:00 de la mañana del día 23 de agosto de 2024, se reunió el CONSORCIO HDC, SUPERVISIÓN y CONSORCIO SAN RAFAEL con el fin de abordar los siguientes temas:

1.Solado de Limpieza para Vigas de Cimentación

Obra: El solado de limpieza para las vigas de cimentación se ha completado satisfactoriamente, asegurando una base limpia y nivelada para el vaciado siguiente.

Interventoría: Es fundamental que este solado esté bien realizado, ya que influye directamente en la calidad de las vigas.

2. Armado de Acero

Supervisión: ¿Cómo avanza el armado de acero?

Obra: Estamos trabajando en el armado de acero en bodega y obra. Todo se realiza conforme a los planos estructurales y especificaciones técnicas.

Interventoría: La interventora verificado el amarre de hierro en bode y obra el cual a cumplido con las especificaciones

3.Suministro e Instalación de Tubo 2" Galvanizado L=3m

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITE No. 16

Interventoría: ¿Cuál es el estado de la instalación de los tubos galvanizados?

Obra: La instalación de los tubos galvanizados de 2" L=3m está en proceso. Se han completado algunas áreas, pero aún falta finalizar en otras.

Supervisión: Es crucial que se mantenga el control de calidad durante la instalación para evitar problemas futuros

4.Vaciado de Zapatas

Supervisión: ¿Se realizaron los vaciados de zapatas según el cronograma?

Obra: Sí, el vaciado de zapatas se ha llevado a cabo con éxito, asegurando la correcta distribución y compactación del concreto.

Interventoría: Vamos a seguir monitoreando el curado para asegurar la resistencia adecuada

5,.Vaciado de Columnas

Interventoría: ¿Cuál es el estado del vaciado de columnas?

Obra: El vaciado de columnas aún no se ha completado. Estamos trabajando para finalizar este proceso, asegurando que cada columna cumpla con las especificaciones necesarias.

Supervisión: Es crucial que se mantengan los estándares de verticalidad y resistencia en esta etapa.

6.Vaciado de Vigas de Cimentación

Obra: Se estan vaciadon las vigas de cimentación, asegurando un trabajo uniforme y continuo.

Supervision: Es esencial garantizar que estas vigas cumplan con las especificaciones para evitar problemas estructurales ¿se estan tomando muestras del concreto?.

Interventoría: Si, se están haciendo sus respectivos cilindros para su posterior fallo

7.Actividades de Relleno

Obra: Se ha avanzado en las actividades de relleno en las áreas designadas, y se han tomado muestras para verificar la densidad del relleno.

Supervisión: Es importante seguir monitoreando la compactación para asegurar que se cumplan los requisitos técnicos

Interventoría: Nosotros también hemos tomado nuestras propias muestras de densidad para garantizar que se cumplan con las especificaciones técnicas.

8. Manejo de Aguas Lluvias

Supervisión: ¿Cómo se están manejando las aguas lluvias en la obra

Obra: Hemos implementado canales de desagüe temporales y estamos utilizando bombas para mantener las zanjas secas.

Interventoría: El manejo adecuado de las aguas lluvias es crítico para evitar retrasos y asegurar la calidad del trabajo.

8.Riesgos Potenciales

Obra: El paro de camioneros sigue afectando la entrega de materiales de consumo rápido debido al mal estado de la vía, lo que podría retrasar las actividades planificadas.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Obra: Continuar con el armado de acero en sitio y programar el vaciado de las vigas restantes.	**CONSORCIO HDC**
Revisar y certificar la calidad del vaciado de columnas y vigas.	**CONSORCIO SAN RAFAEL**
garantizar que las medidas de manejo de aguas lluvias sigan siendo efectivas.	**CONSORCIO HDC**

VII. PROXIMA REUNION

FECHA 30 (DIA) 8 (MES) 2024 (AÑO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Veintitrés (Día en letras) días del mes de Agosto (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITÉ No. 17

FECHA	30	8	2024

COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA HDSJDD-CP-2374-2023

OBJETO DE CONTRATO:

"REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO"

I. PARTICIPANTES	CARGO/ENTIDAD	FIRMA
ING. JUAN SEBASTIAN SERNA ARIAS	DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO HDC	
ARQ. WILSON ANDRES LEAL DIAZ	RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO HDC	
ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA CONSORCIO SAN RAFAEL	
ING. REYNEL ALDANA CAMACHO	APOYO A LA SUPERVISION ESE	

II. OBJETO DEL COMITÉ

Revisar el avance continuo en el armado de acero en el sitio, el vaciado de columnas y zapatas, y la gestión de las aguas pluviales que afectan las zanjas de vigas y zapatas.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se revisa el acta del comité del 23 de agosto de 2024. No se presentaron obsercaciones

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

El armado de acero en sitio continúa, aunque aún no ha finalizado.

Se reviso y certificar la calidad del concreto mediante cilindros y su posterior seguimiento al vaciado de columnas y vigas.

El manejo de aguas lluvias ha mejorado con las nuevas medidas implementadas, aunque se sigue monitoreando su eficacia.

V. TEMAS TRATADOS

Siendo las 10:00 de la mañana del día 30 de agosto de 2024, se reunió el CONSORCIO HDC, SUPERVISIÓN y CONSORCIO SAN RAFAEL con el fin de abordar los siguientes temas:

1.Vaciado de Vigas de Amarre de Cimentación

Obra: Hemos avanzado en el vaciado de las vigas de amarre de cimentación, pero aún no se ha completado. Estamos asegurándonos de que cada fase cumpla con los estándares requeridos

Interventoría: Es vital mantener este estándar de calidad en todas las estructuras de cimentación para asegurar la estabilidad del proyecto

2. Armado de Acero en Sitio

Interventoría: ¿Cuál es el avance en el armado de acero en sitio?

Obra: Estamos trabajando en el armado de acero para las columnas y muros de carga. El proceso avanza conforme a los planos estructurales.

Supervisión: El seguimiento continuo es esencial para garantizar la calidad de las uniones y la alineación.

3.Suministro e Instalación de Tubo 2" Galvanizado L=3m

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E Puerto Carreño - Vichada	**HOSPITAL DEPARTAMETAL SAN JUAN DE DIOS - VICHADA** **PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO** **SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA** **FORMATO ACTA DE COMITÉ DE OBRA** **PAGINA ___ de ___**	**Versión: 1 Código: GTH-FT-37 Fecha: 28/09/2018**

TRD

ACTA DE COMITÉ No. 17

Supervisión: ¿Se ha completado la instalación de los tubos galvanizados?

Obra: Aún estamos en proceso de instalación. Se han completado varios tramos, pero aún falta finalizar en algunas áreas.

Interventoría: Es importante finalizar esta tarea pronto para evitar interferencias con otras actividades.Se verificó la calidad de la soldadura, se evaluó el tipo de cordón y se garantizó que el empalme con la platina de 4"x1/4" cumpliera con las especificaciones del tratamiento anticorrosivo y la aplicación de pintura. Los resultados fueron satisfactorios, cumpliendo con los estándares requeridos.

4. Manejo de Aguas Lluvias

Obra: El manejo de aguas lluvias sigue siendo una prioridad. Hemos mejorado el sistema de drenaje y mantenemos las zanjas lo más secas posible

Interventoría: Es fundamental continuar con estas medidas, especialmente durante las lluvias intensas.

5. Actividades de Relleno

Obra: Se han completado las actividades de relleno en las áreas previstas, y hemos tomado muestras de densidad para asegurar el cumplimiento con las especificaciones.

Interventoría: Nosotros también hemos verificado las densidades con nuestras pruebas, y los resultados son satisfactorios.

6. Tanque Subterráneo en Concreto

Supervisión: ¿Cuál es el estatus del tanque subterráneo?

Obra: El tanque subterráneo en concreto ha sido completado según las especificaciones técnicas, y se ha verificado su calidad conforme a las normativas establecidas

Interventoría: Es un hito importante, y asegura que el proyecto avance sin contratiempos en esta área.

B. COMPROMISOS PACTADOS Y FECHA	RESPONSABLES
Obra: Finalizar la instalación de tubos galvanizados	**CONSORCIO HDC**
avanzar en el armado de acero en sitio, con especial énfasis en muros de carga.	**CONSORCIO HDC**
Continuar con la supervisión de las actividades de vaciado, relleno, y la finalización de otros elementos estructurales críticos, asegurando que se mantengan los estándares de calidad y las especificaciones técnicas.	**CONSORCIO SAN RAFAEL**

VII. PROXIMA REUNION

FECHA 6 (DIA) 9 (MES) 2024 (ANO)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Treinta (Día en letras) días del mes de agosto (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año de firma del acta)

BITACORA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**1**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		RANA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza fundida de solado de limpieza para vigas de cimentacion.

Se continua amarrado de hierro para viga T invertida de cerramiento

Fundida de zapata de ascensor camillero.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674

RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**2**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		RANA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza fundida de inicio muros de ascensor eje C

Se realiza fundida de cuellos para columnas de rampa

Se continua amarrado de hierro para viga T invertida de cerramiento

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se realiza fundida de solado de limpieza para vigas de cimentacion.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**3**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		RANA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza fundida de inicio muros de ascensor camillero

Se realiza fundida de cuellos para columnas de rampa

Se realiza relleno y compactacion de material en las zapatas de la rampa

Se realiza formaleta para viga T invertida de cerramiento.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**5**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	PALUSTRE		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PALA		
1	PROFESIONAL SISO	RANA		
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza formaleta para viga T invertida de cerramiento.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se realiza relleno y compactacion de material en las zapatas de la rampa

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**6**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza fundida de viga T invertida para cerramiento, hasta la mitad para porsteriormente colocar las platinas y despues soldar la tuberia galvanizada.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se realizan excavaciones para vigas de cimentacion en la zona de rampa.

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**7**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		RANA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se realiza fundida de viga T invertida para cerramiento, hasta la mitad para porsteriormente colocar las platinas y despues soldar la tuberia galvanizada.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se realizan excavaciones para vigas de cimentacion en la zona de rampa.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**8**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		EQUIPO SOLDADURA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se colocan platinas en viga T invertida de cerramiento, posteriormente se soldan tubos galvanizados

Se realiza fundida de solado de limpieza para vigas de cimentacion de la rampa.

Se realiza fundida de solados de limpieza restantes para viga de cimentacion.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**9**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		EQUIPO SOLDADURA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se colocan platinas en viga T invertida de cerramiento, posteriormente se soldan tubos galvanizados

Se realiza fundida de solado de limpieza para vigas de cimentacion de la rampa.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**10**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NIVEL DE MANO		
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se realiza colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga

Se detienen actividades por 2 horas por motivo de lluvia en horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**12**	**8**	**2024**
		X			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NIVEL DE MANO		
1	PROFESIONAL SISO	RETROEXCABADORA		
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga

Se realizan excavaciones con retroexcabadora para zapatas del eje 1.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**13**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NIVEL DE MANO		
1	PROFESIONAL SISO	RETROEXCABADORA		
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga

Se realizan excavaciones con retroexcabadora para zapatas del eje 1.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**14**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NIVEL DE MANO		
1	PROFESIONAL SISO	PALA		
1	MAESTRO GENERAL	PALIN		
37	AYUDANTE DE OBRA	RETROEXCABADORA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga

Se realizan excavaciones para zapatas del eje 1.

Se realizan excavaciones con retroexcabadora del tanque de agua subterraneo y planta de tratamiento de aguas hospitalarias.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**15**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		EQUIPO SOLDADURA		
		RETROEXCABADORA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga

Se realizan solados de limpieza en la zapatas del eje 1

Se realizan excavaciones con retroexcabadora del tanque de agua subterraneo y planta de tratamiento de aguas hospitalarias.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**16**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NIVEL DE MANO		
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se colocan parrillas para zapatas del eje 1.

Se realizan izada de columnas del eje 1.

Se inicia proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ	JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674	C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674	T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**17**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		RANA		
		EQUIPO SOLDADURA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se funden zapatas del eje 1.

Se continua proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**19**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MARTILLOS		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	PUNTILLAS		
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales.

Se formaletean cuellos de columnas del eje 1.

Se trabaja dia festivo, para reponer tiempo.

Se continua proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**20**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	**PERSONAL EN OBRA**	**MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO**	**TIEMPO - HORAS**	**CANTIDAD**
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		NIVEL DE MANO		
		EQUIPO SOLDADURA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se funden cuellos de columna del eje 1.

Se continua proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**21**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	NIVEL DE MANO		
1	PROFESIONAL SISO	PALA		
1	MAESTRO GENERAL	PALIN		
37	AYUDANTE DE OBRA	RANA		
		PIZON		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se realizan rellenos de zapatas del eje 1.

Se continua proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**22**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		RANA		
		EQUIPO SOLDADURA		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se realizan excavaciones para vigas de cimentacion del eje 1.

Se funden solados de limpieza para vigas del eje 1.

Se continua proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

Se inicia fundida de viga de cimentacion.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**23**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		EQUIPO SOLDADURA		
		NIVEL		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se termina la colocacion del hierro de vigas de cimentacion en los lugares que corresponde de acuerdo a los planos estructurales

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se continua proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

Se continua fundida de viga de cimentacion.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ	JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,062,674	C.C. 86,070,121
M.P. A25112004-86062674	T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE OBRA	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA**

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**24**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	VALDES		
1	PROFESIONAL SISO	CARRETILLAS		
1	MAESTRO GENERAL	PALUSTRE		
37	AYUDANTE DE OBRA	PALA		
		EQUIPO SOLDADURA		
		NIVEL		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se continua y se termina proceso de colocar formaleta en vigas de cimentacion para posteriormente fundir.

Se continua fundida de viga de cimentacion.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**26**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	MEZCLADORA		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	VALDES		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CARRETILLAS		
1	PROFESIONAL SISO	PALUSTRE		
1	MAESTRO GENERAL	PALA		
37	AYUDANTE DE OBRA	EQUIPO SOLDADURA		
		NIVEL DE MANO		

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se continua y se termina fundida de viga de cimentacion.

Se detienen actividades por 1 hora por motivo de lluvia en horas de la tarde.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**27**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	PALIN		
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua armado de acero para columnas

Se inicia el desencofrado de las vigas de cimentacion

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**28**	**8**	**2024**
X	**X**				

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	PALIN		
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua armado de acero para columnas

Se continua el desencofrado de las vigas de cimentacion

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674

RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**29**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	PALIN		
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua armado de acero para columnas

Se continua el desencofrado de las vigas de cimentacion

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.


OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.



WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674

RESIDENTE DE OBRA



JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**30**	**8**	**2024**
X					

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO	PALIN		
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua armado de acero para columnas

Se termina el desencofrado de las vigas de cimentacion

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITACORA DE OBRA

CONTRATISTA DE OBRA:	CONSORCIO HDC	**INTERVENTORIA:**	CONSORICIO SAN RAFAEL
CONTRATO DE OBRA:	HDSJDD-CP-2374-2023	**CONTRATODE INTERVENTORIA DE OBRA:**	HDSJDD-CP-2375-2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS, E.S.E. SEDE CUMARIBO

SITIO DE EJECUCION DE TRABAJOS:

INFORMACION METOREOLOGICA			**FECHA**		
SOLEADO	**NUBLADO**	**LLUVIA**	**31**	**8**	**2024**
X		**X**			

PERSONAL Y EQUIPO

CANTIDAD	PERSONAL EN OBRA	MAQUINARIA O EQUIPO UTILIZADO	TIEMPO - HORAS	CANTIDAD
1	RESIDENTE DE OBRA	BICHIROQUES		
1	RESIDENTE DE OBRA 2	EQUIPO SOLDADURA		
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	MARTILLOS		
1	PROFESIONAL SISO			
1	MAESTRO GENERAL			
37	AYUDANTE DE OBRA			

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LA OBRA

Se continua con la ejecucion de actividades contractuales en el Hospital Departamental San Juan de Dios E.S.E. Sede Cumaribo.

Se continua armado de acero para columnas

Se continua colocacion de tubo galvanizado 2" soldado a platina previamente colocada y soldada a los flejes de la viga.

Se detienen actividades por 3 hora por motivo de lluvia en horas de la mañana.

OBSERVACIONES

Las actividades ejecutadas por el contratista han sido revisadas y supervisadas por parte de la interventoria.

WILSON ANDRES LEAL DIAZ
C.C. 86,062,674
M.P. A25112004-86062674
RESIDENTE DE OBRA

JAVIER FRANCISCO SABOGAL CAMPOS
C.C. 86,070,121
T.P. 25202122817CND
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CORRESPONDECIA ENVIADA

Consorcio HDC

Consorcio HDC

016-24

Puerto Carreño, 2 de agosto de 2024

Señores
CONSORCIO SAN RAFAEL
Atn.: Javier Francisco Sabogal
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: Entrega informe de obra N°7 - Contrato HDSJDD-CP-2374-2023

Objeto:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente me dirijo a ustedes con el fin de hacer entrega del informe de obra N°7 para su respectiva aprobación con el fin de dar cumpliendo con la cláusula segunda, obligación octava del contrato.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS
CC.: 86.072.395 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO HDC

Recibido consorcio san Rafael
02 de agosto de 2024

consorciohdc23@gmail.com
Calle 23 No. 6 – 35 – Cel.: 313 420 66 05
Puerto Carreño - Vichada

Consorcio HDC

Consorcio HDC

017-24

Puerto Carreño, 28 de agosto de 2024

Señores
CONSORCIO SAN RAFAEL
Atn.: Javier Francisco Sabogal
Interventor
Ciudad

REFERENCIA: Entrega informe parcial de obra No. 3 - Contrato HDSJDD-CP-2374-2023

Objeto:
REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS – SEDE CUMARIBO.

Cordial Saludo

Por medio de la presente, el Consorcio HDC desea hacer entrega del acta parcial n°3 correspondiente al contrato de obra HDSJDD-CP-2374-2023.

Quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN SERNA ARIAS
CC.: 86.072.395 de Villavicencio
Representante Legal
CONSORCIO HDC

Recibido consorcio san Rafael
28 de agosto de 2024

consorciohdc23@gmail.com
Calle 23 No. 6 – 35 – Cel.: 313 420 66 05
Puerto Carreño - Vichada
