INFORME MENSUAL 3
TECNICO, SST Y AMBIENTAL DE INTERVENTORIA DEL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2024

CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ
NIT: 901.746.695-9

OBJETO: "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 7.

ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Elaboró:	Ing. Jhon Edison Reyes Rojas	Ingeniero Residente Técnico de Interventoría	
Revisó:	Ing. Marcos Ahumada	Ingeniero Residente Técnico de Interventoría	
Aprobó:	Arq. Martin R. Córdoba G.	Arquitecto Director de Interventoría	

BOGOTA D.C AGOSTO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1.1. ANTECEDENTES: 6

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 8

1.3. RELACIÓN DE COLEGIOS CONTEMPLADOS CONTRACTUALMENTE PARA INTERVENIR Y PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTADO. 9

2. INFORME TÉCNICO. 10

2.1. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 10 10

2.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 11 14

2.3. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 12 16

2.4. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 13 20

2.5. RELACIÓN DE COMITÉS SEMANALES. 22

3. INFORME MENSUAL AMBIENTAL. 22

3.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 22

3.2. PERMISOS AMBIENTALES 26

3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. 27

3.3.1. COLEGIO INEM - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A: 27

3.3.2. COLEGIO LA AMISTAD. SEDE A 27

3.3.3. COLEGIO INEM. SEDE A 27

3.3.4. COLEGIO EL JAPON. SEDE A 27

3.3.5. COLEGIO TOM ADAMS. SEDE A 27

3.3.6. COLEGIO SAN PEDRO CLAVER. SEDE A 28

3.3.7. COLEGIO KENNEDY. SEDE A 28

3.3.8. COLEGIO SAN RAFAEL. SEDE A 28

3.3.9. COLEGIO VERSALLES INTEGRADO FONTIBÓN SEDE E: 28

3.3.10. COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN: 28

3.3.11. COLEGIO PABLO VI 28

3.3.12. COLEGIO PINAR DEL RIO SEDE C 28

3.3.13. COLEGIO GABRIEL BETANCOURT 28

3.4. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA. 29

OBSERVACIONES /CUMPLIMIENTO 29

3.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA. 37

3.6. REGISTRO DE AVAL DE REPORTES MENSUALES RCD CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES. 39

3.6.1. Meta de aprovechamiento de RCD 40

3.6.2. Meta de circularidad 41

3.6.3. Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo de la SDA 41

3.7. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA QUE CONSTE QUE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES. 42

3.8. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DONDE CONSTE QUE NO SE REALIZÓ INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO O QUE, SI HUBO INTERVENCIÓN ALGUNA, ÉSTAS SE DEJARON EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES. 42

3.9. LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS REQUERIDOS POR EL CONTRATO. 42

4. INFORME MENSUAL SST. 43

4.1. INTRODUCCIÓN. 43

4.2. RELACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO 44

4.2.1 PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO DE OBRA 44

4.2.2 Seguimiento cumplimiento de dedicaciones personal mínimo requerido 45

4.2.3 Personal requerido en el contrato de Interventoría 46

4.3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA 47

4.3.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y SST REALIZADAS 47

4.3.2 PERSONAL REPORTADO POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO 52

4.3.3 CERTIFICADOS DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 53

4.3.4 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL 53

4.3.5 PAGO DE SALARIOS HONORARIOS Y LIQUIDACIONES 53

4.3.6 COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 53

4.3.7 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 53

4.3.8 Actividades y campañas de promoción y prevención 54

4.3.9 Ausentismo Laboral 54

4.3.10 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 55

4.3.11 Unidades sanitarias 55

4.3.12 Suministro de hidratación 56

4.3.1 Entrega y reposición de elementos de protección personal 58

4.3.2 ACCIDENTALIDAD 58

4.3.4 PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACIÓN 59

4.3.5 PLAN DE EMERGENCIAS 60

4.4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST DE INTERVENTORÍA 61

- **SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL** 64

Sustancias Químicas 65

Matriz de peligros 65

Inspecciones planeadas 65

Entrega y reposición de elementos de protección personal 65

Indicadores de accidentalidad 65

Capacitaciones 67

5. CONCLUSIONES 68

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Implementación de plan de manejo ambiental 23
Tabla 2 Relación RCD generado periodo 40
Tabla 3 Porcentaje de aprovechamiento 41
Tabla 4 Meta de circularidad 41
Tabla 5. Personal requerido del Contratista para obra 44
Tabla 6. Balance acumulado personal mínimo requerido 45
Tabla 7.Personal requerido por Interventoría 46
Tabla 8.Actividades constructivas y SST realizadas durante el periodo 47
Tabla 9. Personal reportado por el Contratista para el periodo 52
Tabla 10. Actividades de promoción y prevención realizadas por el Contratista 54
Tabla 11. Seguimiento ausentismo Contratista 54
Tabla 12. Inspecciones realizadas durante el periodo por el Contratista 56
Tabla 13. Frentes de obra en donde se realizaron actividades de alto riesgo 57
Tabla 14. Control Vehículos transitorios utilizados en obra 57
Tabla 15. Listado de equipos y herramienta utilizada en obra 58
Tabla 16. Seguimiento a indicadores de accidentalidad del Contratista 58
Tabla 17. Capacitaciones y charlas realizada por el Contratista durante el periodo 60
Tabla 18. Relación de personal activo para el periodo Interventoría 61
Tabla 19. Actividades de promoción y prevención realizadas por Interventoría 63
Tabla 20. Seguimiento ausentismo Interventoría 63
Tabla 21. Seguimiento a indicadores de accidentalidad de la Interventoría 66
Tabla 22. Inducciones realizadas durante el periodo Interventoría 67
Tabla 23. Capacitaciones realizadas por la Interventoría durante el periodo 67

LISTADO DE GRAFICOS

Gráfico 1. Seguimiento a tasas de ausentismo Contratista 55
Gráfico 2. Seguimiento a indicadores de accidentalidad del Contratista 59
Gráfico 3. Seguimiento a tasas de ausentismo Interventoría 64
Gráfico 4. Seguimientos indicadores de accidentalidad de Interventoría 66

1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.

1.1. ANTECEDENTES:

La Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá D.C. goza de autonomía administrativa y financiera, con el mandato de liderar políticas, planes y programas para garantizar el derecho a la educación y facilitar el acceso a la formación integral. Según el Decreto 310 de 2022 y otras normativas, se encarga de desarrollar estrategias para la inclusión y permanencia en el sistema educativo, así como para mejorar su calidad y equidad.

El Plan de Desarrollo Distrital y el proyecto 7638 se enfocan en fortalecer la infraestructura educativa, interviniendo en 730 sedes educativas existentes para ampliar la cobertura y garantizar espacios de aprendizaje adecuados. La estructura organizativa comprende subsecretarías y direcciones, como la de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos, encargada de formular y ejecutar planes para mejorar la infraestructura, así como de coordinar trámites relacionados con la adquisición y mantenimiento de los bienes inmuebles.

La política educativa de Bogotá se basa en principios constitucionales que reconocen la educación como un derecho fundamental. Se destaca la importancia de contar con infraestructuras escolares adecuadas, seguras y agradables, que no solo son estructuras arquitectónicas, sino también espacios destinados a la socialización, el conocimiento y la recreación, influyendo directamente en la calidad del sistema educativo y en el ambiente pedagógico.

La Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos ha llevado a cabo una evaluación y priorización de obras menores y de mejora con características de "Reparaciones Locativas", diseñadas para mejorar la infraestructura educativa y garantizar la continuidad en la asistencia escolar, fomentar la excelencia educativa y mantener el funcionamiento eficiente de las instalaciones educativas y administrativas.

Por medio de la resolución No. 0080 del 23 de mayo de 2023 “Por medio de la cual se ordena la apertura y trámite del Proceso de Selección por Licitación Pública de Obra No. SED-LP-OP-DCCEE-018-2023”. La Secretaría de Educación del Distrito (SED) a través de la Dirección de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos -DCCEE, con

fundamento en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y con observancia del principio de planeación, elaboró los documentos y estudios previos con el fin de soportar las condiciones y exigencias para adelantar el proceso de selección del contratista encaminado a contratar la "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS".

Por medio de la resolución N°. 0198 del 11 de agosto de 2023 se adjudica el proceso de licitación pública No. SED-LP-OP-DCCEE-018-2023, en donde el Comité Asesor y Evaluador dentro de la misma audiencia pública de adjudicación recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación de los grupos que conforman el Proceso de Selección a los proponentes que ocupan el primer lugar en el orden de elegibilidad por cumplir las exigencias previstas en el pliego de condiciones y obtener el mayor puntaje, así que para el "CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES" se le adjudico las obras para el grupo 07 con un presupuesto oficial de $ 6.322.397.994,00 y un tiempo de ejecución de 8 meses.

En el caso de la interventoría por medio de la Resolución No. 0218 del 18 de agosto de 2023 se adjudica el proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SEDCM-A-DCCEE-022-2023, el Comité Asesor y Evaluador del proceso de contratación mediante Memorando Interno y bajo las competencias que a cada uno corresponde, recomendó al Ordenador del Gasto la adjudicación del proceso en los siguientes términos:


"(…) ADJUDICAR el Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No. SED-CM-ADCCEE-022-2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS", así: Para el LOTE 7: Al Proponente No. 8, CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ, integrada por las sociedades SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA con NIT 900.380.666 -9 (50% de participación) y SEG GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD S.A.S con NIT.900.834.413-2, (50% de participación), y representada legalmente por GERSSY NIVER PEÑALOZA QUIÑONES,

identificado con cédula de ciudadanía 52.553.958 de Engativá, con 91,3427046 puntos, por un valor de QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($504.777.262,00), INCLUIDO IVA, y por un plazo de ejecución de NUEVE (9) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/o suscripción del acta de inicio.

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

El proyecto incluye la ejecución de obras menores correspondientes al saneamiento básico como reposición de cubiertas, reposición de sistema eléctrico, reposición de sistema hidrosanitario, mejoramiento zonas exteriores y recreativas, reposición de cerramientos y mejoramiento en general de los ambientes educativos, en los colegios y las sedes administrativas.

Los contratos derivados del presente proceso de selección se ejecutarán mediante la modalidad de monto agotable, de tal forma que se dará prioridad a la ejecución de las actividades de obra señaladas con las cantidades contenidas en el Formulario – formulario de presupuesto oficial.

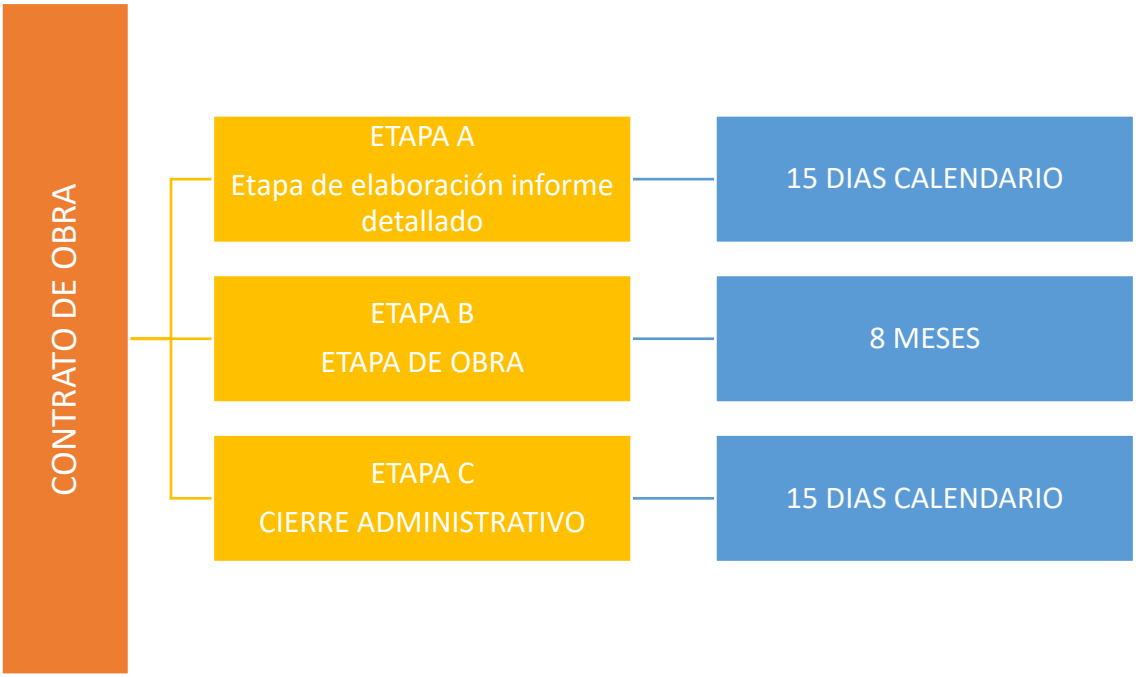

1.3. RELACIÓN DE COLEGIOS CONTEMPLADOS CONTRACTUALMENTE PARA INTERVENIR Y PRESUPUESTO PRELIMINAR PROYECTADO.

	INSTITUCÍON	VALOR PROYECTADO
1	DILE KENNEDY	$ 394,884,590.00
2	JAPÓN	$ 341,508,416.36
3	INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE B	$ 257,631,233.00
4	INEM FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE A	$ 932,915,494.00
5	PAULO VI SEDE A	$ 1,070,438,856.10
6	SAN RAFAEL SEDE A	$ 419,806,996.00
7	TOM ADAMS SEDE A	$ 323,933,646.00
8	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	$ 608,667,636.00
9	ANTONIA SANTOS SEDE B	$ 412,697,198.60
10	KENNEDY SEDE A	$ 282,844,409.94
11	LA AMISTAD SEDE A	$ 291,400,787.00
12	LA AMISTAD SEDE CPINAR DEL RIO	$ 237,789,266.00
13	GABRIEL BETANCOURT MEJÍA	$ 137,470,783.00
14	DILE FONTIBÓN	$ 83,662,772.00
15	FABRICA DE TIZAS-OTIC DATACENTER	$ 12,621,176.00
16	VILLEMAR EL CARMEN	$ 130,265,276.00
17	INTEGRADO FONTIBÓN SEDE E	$ 109,963,240.00
	VALOR EMERGENCIAS U OBRAS NUEVAS	$ 273.896.217,99
	TOTAL	**$ 6,322,397,997.00**

2. INFORME TÉCNICO.

2.1. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 10

	INFORME SEMANAL	10

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	10	DEL	17 de junio de 2024	AL	23 de junio de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	Contrato No .	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	Fecha de Iniciación	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	Fecha de Terminación	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	Plazo Inicial	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	Valor inicial	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	%TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
8	GRUPO 7	2,22%	2,51%	4,73%	4,05%	0,68%
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	54,24%	17,79%	-36,45%	54,24%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento	Desmonde de cubierta exterior	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- 1r piso: quitar cielo raso, rehabilitación de forjado para mejora de aspecto, pintura e iluminación 2.- 2° piso: quitar cielo raso, instalación de placas de cielo raso de 60x60 3.- Cambio de las hojas de las puertas con puertas de madera (como actual). Mantenimiento de los marcos para correcto funcionamiento puertas. 4.- Losa y tanque de agua de 500 lts de polietileno y conexiones 5.- Cambio de todos los INTERRUPTORES 6.- Cambio de dos reflectores exteriores (¿son detector de movimiento y encendido automático por oscuridad?, cuál de los dos)	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.

4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- 3 tomacorrientes dobles en la sala de seguridad 2.- Mantenimiento y limpieza de los canales de desagüe de cubiertas 3.- Limpieza de las CAJAS de INSPECCIÓN x5 4.- Rehabilitación "poste" reja al lado de la entrada y poner mortero de culminación de murete.	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (queden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

7	KENNEDY SEDE A	21,12%	15,23%	-5,89%	21,12%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Instalación de poliurea en el sector de la cancha. Trasiego de materiales a la cubierta, para inicio de actividades.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo dia.
8	LA AMISTAD SEDE A	48,28%	4,89%	-43,39%	48,28%	1-Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135Ml. 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Excavaciones	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como tambien adelanto actividades de excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	3,30%	5,98%	2,68%	3,30%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Se realiza la actividad del cambio del policarbonato de la cubierta.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas activiades, estas no sufrieron ningun tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola en policarbonato.
10	Paulo VI	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
11	La Amistad	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	No se han iniciado actividades	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	3,46%	1,10%	-2,36%	3,46%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de	Sin ejecución de actividades durante esta semana	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto.

						ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.		Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
13	El Japón	58,10%	41,50%	-16,60%	58,10%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
14	Tom Adams	17,29%	7,41%	-9,88%	17,29%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
15	Kennedy	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	23,33%	19,95%	-3,38%	23,33%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Instalación de acero para cimentación e instalación de concreto de la placa del sector de la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.2. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 11

	INFORME SEMANAL	11

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	11	DEL	23 de junio de 2024	AL	29 de junio de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	Contrato No .	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	Fecha de Iniciación	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	Fecha de Terminación	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	Plazo Inicial	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	Valor inicial	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	%TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: — ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	61,07%	25,42%	-35,65%	61,07%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Desmonde de cubierta exterior	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquin e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- 1r piso: quitar cielo raso, rehabilitación de forjado para mejora de aspecto, pintura e iluminación 2.- 2° piso: quitar cielo raso, instalación de placas de cielo raso de 60x60 3.- Cambio de las hojas de las puertas con puertas de madera (como actual). Mantenimiento de los marcos para correcto funcionamiento puertas. 4.- Losa y tanque de agua de 500 lts de polietileno y conexiones 5.- Cambio de todos los INTERRUPTORES 6.- Cambio de dos reflectores exteriores (¿son detector de movimiento y encendido automático por oscuridad?, cuál de los dos)	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- 3 tomacorrientes dobles en la sala de seguridad 2.- Mantenimiento y limpieza de los canales de desagüe de cubiertas 3.- Limpieza de las CAJAS de INSPECCIÓN x5 4.- Rehabilitación "poste" reja al lado de la entrada y poner mortero de culminación de murete.	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (queden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detallandamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detallandamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

7	KENNEDY SEDE A	25,52%	16,54%	-8,98%	25,52%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Instalación de poliurea en el sector de la cancha. Trasiego de materiales a la cubierta, para inicio de actividades.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo dia.
8	LA AMISTAD SEDE A	54,66%	8,86%	-45,80%	54,66%	1-Construcción de auala modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Excavaciones	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como tambien adelanto actividades de excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de la zona de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	11,66%	7,46%	-4,20%	11,66%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Se realiza la actividad del cambio del policarbonato de la cubierta.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervenciòn de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de enduremiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definiciòn e implantaciòn para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas activiades, estas no sufrieron ningun tipo de modificaciòn, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola en policarbonato.
10	Paulo VI	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
11	La Amistad	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	No se han iniciado actividades	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	5,67%	2,26%	-3,41%	5,67%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de	Sin ejecución de actividades durante esta semana	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto

						ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.		Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
13	El Japón	64,70%	43,60%	-21,10%	64,70%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavaciòn. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
14	Tom Adams	20,32%	9,19%	-11,13%	20,32%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
15	Kennedy	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	24,04%	20,52%	-3,52%	24,04%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Instalación de acero para cimentación e instalación de concreto de la placa del sector de la zona de alimentación.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.								

2.3. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 12

	INFORME SEMANAL	12

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓ DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	12	DEL	30 de junio de 2024	AL	6 de julio de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	Contrato No .	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	Fecha de Iniciación	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	Fecha de Terminación	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	Plazo Inicial	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	Valor inicial	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	Adiciones	0
Prorroga	N.A.	Prorroga	N.A.
Suspensión	N.A.	Suspensión	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | ACTIVIDADES

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	78,75%	31,15%	-47,60%	78,75%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salonesdel segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Retiro de materiales de desmonte de cubierta y cieloraso	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	8,67%	2,70%	-5,97%	8,67%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Demoloción de piso existente.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- 1r piso: quitar cielo raso, rehabilitación de forjado para mejora de aspecto, pintura e iluminación 2.- 2º piso: quitar cielo raso, instalación de placas de cielo raso de 60x60 3.- Cambio de las hojas de las puertas con puertas de madera (como actual). Mantenimiento de los marcos para correcto funcionamiento puertas. 4.- Losa y tanque de agua de 500 lts de polietileno y conexiones 5.- Cambio de todos los INTERRUPTORES 6.- Cambio de dos reflectores exteriores (¿son detector de movimiento y encendido automático por oscuridad?, cuál de los dos)	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- 3 tomacorrientes dobles en la sala de seguridad 2.- Mantenimiento y limpieza de los canales de desagüe de cubiertas 3.- Limpieza de las CAJAS de INSPECCIÓN x5 4.- Rehabilitación "poste" reja al lado de la entrada y poner mortero de culminación de murete.	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socializacion, para aterrizar mas detallandamente el alcacne del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0.00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (queden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladamente el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista de priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
6	Gabriel Betancourt Mejía	1,15%	0,00%	-1,15%	1,15%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.

7	KENNEDY SEDE A	28,85%	19,99%	-8,86%	28,85%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Pendientado de terraza Contrución de cañuelas	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegi pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este misn día.
8	LA AMISTAD SEDE A	59,90%	14,73%	-45,17%	59,90%	1-Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como tambien adelanto actividades d excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizad el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervención terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	13,02%	15,67%	2,65%	13,02%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Demolición de pisos y excavaciones parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizad el 15 de mayo, en la SED, con participación de l SED, Contratista de Obra e Interventoria, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera d la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas actiivades, estas no sufrieron ningun tip de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola policarbonato.
10	Paulo VI	0,55%	0,25%	-0,30%	0,55%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Picado de paredes existentes y demolición de pisos existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrid entre las partes, SED, Contratista e Interventori en el cual se definieron los alcances y se firmo acta de socialización con el representante del colegio.
11	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	25,00%	0,00%	-25,00%	25,00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrid entre las partes, SED, Contratista e Interventori en el cual se definieron los alcances y se firmo acta de socialización con el representante del colegio.
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	7,49%	5,54%	-1,95%	7,49%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

13	El Japón	70,13%	47,45%	-22,68%	70,13%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizac el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervención terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
14	Tom Adams	25,21%	14,67%	-10,54%	25,21%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Retiro de materiales de excavación Instalación de Subbase y Base.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizac el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervención terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
15	ANTONIA SANTOS SEDE B	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladament el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratist de obra del presupuesto ajustado y el cronograr de actividades
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	24,58%	23,32%	-1,26%	24,58%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizac el 15 de mayo, en la SED, con participación de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervención terminado final de las zonas de alimentación y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	Esta pendiente la elaboración del acta de socialización, para aterrizar mas detalladament el alcance del proyecto. Este colegio no se encuentra dentro de la lista priorizados por parte de la SED. Esta pendiente el envío por parte del contratist de obra del presupuesto ajustado y el cronogran de actividades

NOTA. Es importante tener en cuenta que la informaciónrespecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

2.4. INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA NO. 13

	INFORME SEMANAL	**13**

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓ DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

SEMANA N°	13	**DEL**	8 de julio de 2024	**AL**	13 de julio de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	**Contrato No .**	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	**Fecha de Iniciación**	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	**Fecha de Terminación**	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	**Plazo Inicial**	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	**Valor inicial**	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMAN	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | **ACTIVIDADES**

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	85,33%	31,15%	-54,18%	85,33%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salonesdel segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Retiro de materiales de desmonte de cubierta y cieloraso	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024 Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoria realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	16,05%	5,83%	-10,22%	16,05%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía)	Demoloción de piso existente.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoria, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejía	3,41%	0,00%	-3,41%	3,41%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoria, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
7	KENNEDY SEDE A	33,38%	26,64%	-6,74%	33,38%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Pendientado de terraza Contrución de cañuelas	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024 Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo dia.
	LA AMISTAD SEDE	66 76	18 76	-48 00	66 76	1-Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el	Sin ejecución de	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024 Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como tambien adelanto actividades de

						comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	semana.	excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de la zona de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	15,14%	16,14%	1,00%	15,14%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Demolición de pisos y excavaciones parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal del contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervención de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas activiades, estas no sufrieron ningun tipo de modificación, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola en policarbonato.
10	Paulo VI	95,00%	1,34%	-93,66%	95,00%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Picado de paredes existentes y demolición de pisos existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,54%	0,00%	-0,54%	0,54%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	7,83%	5,59%	-2,24%	7,83%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
13	El Japón	77,37%	53,65%	-23,72%	77,37%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reunión realizada el 15 de mayo, en la SED, con participación de la SED, Contratista de Obra e Interventoría, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de las zonas de alimentación. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
1	Tom Adam	43 08	20 84	-22 24	43 08	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance.	Retiro de materiales de excavación	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades

						3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Instalación de Subbase y Base.	En recorrido realizado por la Interventoìa el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizad el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervenciòn terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	32,52%	24,52%	-8,00%	32,52%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debia iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 202 Este Colegio se encuentra dentro de la lista d priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratist del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoìa el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal d contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizad el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de SED, Contratista de Obra e Interventoria, fuer definidos los esquemas basicos de intervenciòn terminado final de las zonas de alimentaciòn y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
NOTA. Es importante tener en cuenta que la información respecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.								

En el anexo 1, del presente informe se encuentran los informes semanales 10,11,12 y 13.

2.5. RELACIÓN DE COMITÉS SEMANALES.

Durante este periodo se llevaron a cabo cuatro comités integrales, el 26-06-24, 31-06-24,03-07-24 y 09-07-24.

3. INFORME MENSUAL AMBIENTAL.

A continuación se presenta la descripción de las actividades ambientales desarrolladas en el marco del desarrollo de las actividades de INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 7, durante el periodo del 15 junio al 14 julio de 2024.

3.1. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se presentan las actividades ejecutadas en cumplimiento del plan de manejo ambiental aprobado por la Interventoría a las cuales se ha realizado control y seguimiento, durante el periodo en reporte:

Tabla 1 Implementación de plan de manejo ambiental

FICHA: SILVICULTURA, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO		
Actividad	**Seguimiento**	
Manejo paisajístico	Durante este periodo, no se llevaron a cabo trámites relacionados debido a que no se consideraron necesarios.	
Protección y conservación de individuos arbóreos	Durante este periodo, se han recibido dos conceptos técnicos relacionados con la emergencia de silvicultura en el Colegio Nicolás Esguerra. Estos conceptos contemplan la realización de 34 talas, 4 tratamientos y 2 podas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha iniciado ninguna de estas actividades	Se presentan los conceptos técnicos en el anexo 1 del informe
Cerramientos provisionales	Durante este período, se realizaron cerramientos y mantenimientos a los cerramientos ya instalados en algunos de los colegios recibidos, especialmente en aquellos que fueron objeto de visitas. Estas acciones aseguraron las áreas de intervención, garantizando senderos peatonales internos, señalización y conservación de las zonas verdes en el área de influencia directa de los colegios con áreas verdes. .	
FICHA: MANEJO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA		
Actividad	**Seguimiento**	
Implementación Sistemas Ahorradores de Agua.	Durante el presente período, no se implementaron este tipo de tecnologías. Sin embargo, se están planificando las compras de estos sistemas de ahorro para su instalación en los colegios donde se contemplan estas actividades.	

Implementación Sistemas para disminuir el consumo energético	Al igual que la anterior actividad, para esta etapa constructiva inicial no se han realizado instalación de este tipo se sistemas ahorradores de energía.	
Reducir el consumo de materiales e insumos de obra y administrativos.	Durante las inducciones al personal nuevo, se le realizan pequeñas charlas informativas para disminuir el uso de energía y agua	
PROGRAMA MANEJO DE CAMPAMENTOS Y ACOPIOS.		
Implementación de puntos ecológicos	De acuerdo con la Resolución 2184 de 2019, se implementaron el código de colores, durante este periodo se hizo el uso de los puntos ecológicos de los colegios activos, previa autorización de cada institución educativa.	Todas las instituciones activas cuentan con puntos ecológicos instalados. Se estableció un campamento principal en el colegio INEM, equipado con implementos de emergencia y mantenimiento de higiene completo, incluyendo baños y lavamanos. Además, en cada colegio, los trabajadores operativos cuentan con un área de almacenamiento y vestuario, y se asignó un baño exclusivo para el personal.
PROGRAMA DE MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		
Suministro de materiales con empresas autorizadas	Los materiales de construcción utilizados en la obra fueron adquiridos de proveedores autorizados, como RANGEL, que posee RUCOM vigente y que además también está autorizado como proveedor de materiales valorizados provenientes de plantas de aprovechamiento como Greco y Cemex.	Durante este período, se adquirieron 78 m3 de base granular reciclada, 109.5 m3 de subbase granular reciclada, 15 m3 de grava de río fina y 2.75m3 de concreto. Los soportes de adquisición de material se presentan en el anexo 2 del informe.
PROGRAMA CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS.		
Control de técnico mecánica	Durante este periodo para la mitigación de emisiones atmosféricas, se llevó a cabo la revisión del cumplimiento de la técnico-mecánica de los vehículos utilizados para el transporte del material y RCD, y los vehículos utilizados para el transporte del personal contratista. Esto con el fin de mitigar el deterioro de la calidad del aire durante la ejecución de estas actividades, teniendo en cuenta la NTC 5375, que Establece	En el anexo 3 se presenta la documentación legal de vehículos y equipos utilizados en el periodo reportado.

<table>
<tr><td></td><td>los requisitos para la Revisión Técnico Mecánica en los CDA para los vehículos automotores, entre otros, en cuanto a emisiones contaminantes</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">CAPACITACIONES AMBIENTALES</td></tr>
<tr><td>Realizar capacitaciones en temas ambientales al personal de obra</td><td>Como parte del fortalecimiento de la gestión ambiental en el proyecto, se realizaron capacitaciones ambientales para el personal de obra. Estas capacitaciones buscan cumplir con lo establecido en el plan de manejo ambiental y prevenir incidentes ambientales durante el desarrollo de las actividades constructivas.</td><td>Durante este período, el tema de la capacitación fue sobre los lineamientos ambientales de la SED, enfatizado en el uso eficiente y ahorro de agua y energía, uso de aguas lluvias y manejo adecuado de RCD en obra.
En el anexo 4 se presentan los soportes de las capacitaciones realizadas en el periodo.</td></tr>
<tr><td colspan="3">PROGRAMA DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS</td></tr>
<tr><td>Equipos y vehículos necesarios para el desarrollo de las obras</td><td>Durante este período, se utilizaron dos vehículos de maquinaria pesada: una retroexcavadora y un vibro compactador. Además, se emplearon 2 volquetas sencillas para el transporte de RCD y 12 volquetas dobles para el transporte de materiales y RCD.</td><td>Vehículos
<table>
<tr><th>PLACA</th><th>PIN</th><th>VIGENCIA SOAT</th><th>VIGENCIA TECNO</th></tr>
<tr><td>EQR395</td><td>30841</td><td>4/06/2025</td><td>23/03/2025</td></tr>
<tr><td>SZZ588</td><td>33310</td><td>30/05/2025</td><td>3/08/2024</td></tr>
<tr><td>SZZ589</td><td>33588</td><td>30/05/2024</td><td>4/07/2025</td></tr>
<tr><td>TUK202</td><td>24865</td><td>6/05/2025</td><td>28/06/2025</td></tr>
<tr><td>TUK061</td><td>24863</td><td>24/04/2025</td><td>16/06/2025</td></tr>
<tr><td>WLR091</td><td>33687</td><td>18/05/2025</td><td>8/03/2025</td></tr>
<tr><td>WNL840</td><td>34171</td><td>10/07/2025</td><td>13/07/2025</td></tr>
<tr><td>WLQ649</td><td>34088</td><td>8/07/2025</td><td>2/07/2025</td></tr>
<tr><td>NOW526</td><td>25184</td><td>21/03/2025</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>SOR863</td><td>24853</td><td>6/05/2025</td><td>4/10/2024</td></tr>
<tr><td>TAM972</td><td>24859</td><td>9/11/2024</td><td>15/01/2025</td></tr>
<tr><td>WCK433</td><td>13239</td><td>3/10/2024</td><td>12/10/2024</td></tr>
<tr><td>XKJ127</td><td>19848</td><td>8/07/2024</td><td>1/08/2024</td></tr>
<tr><td>TSN892</td><td>N/A</td><td>21/09/2024</td><td>26/01/2025</td></tr>
</table>
Maquinaria
<table>
<tr><th>EQUIPO</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>AÑO FABRICACIÓN</th><th>PESO (KG)</th></tr>
<tr><td>Vibro Compactador</td><td>INGRESOLL</td><td>DD4</td><td>2005</td><td>2623</td></tr>
<tr><td>Retro Excavadora</td><td>JCB</td><td>214E</td><td>2004</td><td>6200</td></tr>
<tr><td>Mini Cargador</td><td>CATERPILA</td><td>232B</td><td>2012</td><td>7.93</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS</td></tr>
<tr><td>Realizar la protección de sumideros e implementación de medidas de manejo para protección del recurso hídrico</td><td>Durante el presente periodo se realizó la protección de nuevos sumideros y así mismo se realizó el mantenimiento a los que se consideraron necesarios.

Durante este periodo, se habló con los rectores de cada colegio, los cuales cedieron un espacio específico en sus baterías sanitarias para que fueran utilizados por parte del personal a cargo del consorcio edificaciones distritales, en ese sentido durante este periodo se evitaron ocupaciones adicionales</td><td>
<table>
<tr><th>Colegio</th><th>Fecha</th><th>Coordenadas</th><th></th></tr>
<tr><td>Colegio la Amistad</td><td>03/05/2024</td><td>4°37´22.2694"N-74°8´49.68406´W</td><td>Altitud:2579.3</td></tr>
<tr><td>Colegio la Amistad</td><td>03/05/2024</td><td>4°37´22.21723"N-74°8´49.65574´W</td><td>Altitud:25879.6</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>03/05/2024</td><td>4°37´1.22048"N-74°9´42.86552´W</td><td>Altitud:2586.9</td></tr>
<tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>03/05/2024</td><td>4°37´21.42253"N-74°9´38.68726´W</td><td>Altitud:2584.4m</td></tr>
<tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>03/05/2024</td><td>4°37´21.27734"N-74°9´38.7252´W</td><td>Altitud:2584.9m</td></tr>
<tr><td>Colegio San Pedro Claver</td><td>03/05/2024</td><td>4°37´19041366-74°9´38.63243´W</td><td>Altitud:2580.1m</td></tr>
<tr><td>Colegio El Japón</td><td>03/05/2024</td><td>4°37´19.4822"N-74°9´14.32375´W</td><td>Altitud:2580.9m</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td><td>4°37´2.9552"N-74°9´41.5268´W</td><td>Altitud:2600.0m</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td><td>4°37´2.82781"N-74°9´41.32418S´W</td><td>Altitud:2597.1m</td></tr>
<tr><td>Colegio San Rafael</td><td>25/06/2024</td><td>4°37´1.63938"N-74°9´43.524´W</td><td>Altitud:2584.1m</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	dentro de los establecimientos educativos, así como mantenimientos y colección de residuos líquidos generados por parte de unidades sanitarias portátiles.	
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS		
Realizar la adecuada disposición de residuos peligrosos	Durante este periodo se realizó desmonte y disposición de tejas de asbesto provenientes del desmonte realizado en el Colegio Integrado Fontibón de 0.2318Ton	Se realizó la correcta disposición con el gestor autorizado MAAT. A la fecha el gestor no ha generado el certificado de dicha disposición.

3.2. PERMISOS AMBIENTALES

PERMISO AMBIENTAL	TRAMITA FDLRUU	TRAMITA CONTRATISTA
Registro del proyecto ante la SDA PIN	SI	PIN:25504
Permisos Ambientales o mineros y/o certificación de la autoridad ambiental competente para proveedores y escombreras y/o Registro vigente en el directorio de proveedores y escombreras del IDU	N.A.	RUCOM Proveedores
Aprobación del diseño paisajístico por la entidad competente	N.A	No aplicó para este periodo
*Permiso de Aprovechamiento Silvicultural. Permiso o autorización de tala, trasplante o reubicación del arbolado urbano	N.A	No aplicó para este periodo
Permiso de ocupación de cauce, depósito de agua o zona de ronda, lineamiento para el manejo de ZMPA y corredores ecológicos	N.A.	N.A.
Permiso de endurecimiento de zonas verdes	N.A	No aplicó para este periodo
Permiso de vertimientos (del proveedor seleccionados para mantenimiento y suministro de unidades sanitarias)	N.A	Durante este periodo se usaron los baños de las instalaciones educativas.

PERMISO AMBIENTAL	TRAMITA FDLRUU	TRAMITA CONTRATISTA
Permiso de trabajos nocturnos, permiso para la operación de equipos de construcción generadores de ruido ambiental en horarios restringidos ante la alcaldía local de los frentes específicos	N.A	No aplicó para este periodo

3.3. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

A continuación, se describen las actividades de obra desarrolladas desde el componente ambiental en cada una de las instalaciones

3.3.1. COLEGIO INEM - FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A:

- Se realiza desmonte de cubierta existente en asbesto cemento en la primera sección del edificio denominado bloque de ciencias
- Se realiza trasiego desde el punto de acopio del material hasta la zona de obra el cual pertenece al edificio de ciencias

3.3.2. COLEGIO LA AMISTAD. SEDE A

- Mantenimiento al cerramiento zona de intervención
- Mantenimiento a la protección de sumideros.

3.3.3. COLEGIO INEM. SEDE A

- Durante este periodo, se estableció un campamento principal en el colegio INEM, equipado con implementos de emergencia y mantenimiento de higiene completo, incluyendo baños y lavamanos.
- Sensibilización ambiental.

3.3.4. COLEGIO EL JAPON. SEDE A

- Mantenimiento al cerramiento zona de intervención
- Mantenimiento a la protección de sumideros

3.3.5. COLEGIO TOM ADAMS. SEDE A

- Cerramiento zona de intervención

3.3.6. COLEGIO SAN PEDRO CLAVER. SEDE A

- Mantenimiento al cerramiento zona de intervención

3.3.7. COLEGIO KENNEDY. SEDE A

- Cerramiento zona de intervención

3.3.8. COLEGIO SAN RAFAEL. SEDE A

- Debido a la complejidad del colegio para su intervención, se realiza trasiego de todo el material granular tanto de rellenos como los procedentes de la misma excavación.
- Se realiza mantenimiento e instalación de cerramiento en poli sombra verde.
- Se realiza instalación de polisombra verde para protección de individuos arbóreos presentes en el área de intervención

3.3.9. COLEGIO VERSALLES INTEGRADO FONTIBÓN SEDE E:

- Se realiza retiro y disposición final de asbesto cemento con ayuda de la empresa aprobada como gestor

3.3.10. COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN:

- Se inicia la intervención en el colegio.
- Se realiza el cerramiento perimetral en poli sombra verde delimitando el área de intervención.

3.3.11. COLEGIO PABLO VI

- Se inicia la intervención en el colegio.
- Se realiza el cerramiento perimetral en poli sombra verde delimitando el área de intervención.

3.3.12. COLEGIO PINAR DEL RIO SEDE C

- Se inicia la intervención en el colegio.
- Se realiza el cerramiento perimetral en poli sombra verde delimitando el área de intervención.

3.3.13. COLEGIO GABRIEL BETANCOURT

- Se inicia la intervención en el colegio

3.4. CUADRO DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA.

OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTEMPLADAS EN EL ANEXO 4 MINUTA DEL CONTRATO	OBSERVACIONES /CUMPLIMIENTO
• OBLIGACIONES GENERALES	
• Plan de manejo ambiental.	• El contratista cuenta con PMA aprobado por la Interventoría
• Plan de manejo ambiental con enfoque en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la Entidad.	
• Realizar la adopción del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA de la SED mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos sólidos y desechos que se manipulen en ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato con la SED. Como soporte de cumplimiento de esta obligación se debe presentar un acta y listado de asistencia de la socialización de los lineamientos ambientales de la SED	• Durante este periodo se realizó la socialización de los lineamientos ambientales de la SED a la parte operativa del proyecto, se realizó al personal en los colegios que estuvieron activos durante este periodo.
• Realizar, en caso de requerirse, el trámite de manejo silvicultural para el arbolado presente en el predio, hasta la obtención del permiso requerido (poda, tala, traslado y/o demás) y la compensación requerida por la Secretaría Distrital de Ambiente.	• Durante este periodo, por requerimiento de la SED, se realizará la emergencia del Colegio Nicolás Esguerra, donde se realizará 34 talas, 4 tratamientos y 2 podas, sin embargo, dicha actividad a la fecha no se ha iniciado.
• Implementar jardines verticales u horizontales y/o huertas urbanas en las sedes señaladas por la SED sobre las cuales se realice la intervención por grupo, conforme a los factores de ponderación/sostenible.	• Durante este período, los diseños enviados por la parte técnica constructiva de la SED incluyen la implementación de jardines horizontales en Colegio San Rafael. Sin embargo, para este periodo no se han implementado.
• Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación del PIGA de la SED en la ejecución del contrato.	• Se lleva a cabo una gestión activa para garantizar el cumplimiento tanto de la normativa ambiental vigente relacionada con el objeto del contrato como de los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Ambiental (PIGA) de la Secretaría de Educación Distrital (SED).
• OBLIGACIONES ESPECIFICAS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	
• Aplicar (en caso de requerirse) sobre el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos de tal forma, el cumplimiento a los	• Durante este periodo se acopló un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos en el colegio INEM. Hasta la fecha se

requisitos establecidos para los sistemas de recolección de conformidad a lo establecido en los Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013 descritos a continuación: • Los acabados deberán permitir su fácil limpieza e impedir la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. • Tendrá sistemas que permitan la ventilación, tales como rejillas o ventanas, y de prevención y control de incendios, como extintores y suministro cercano de agua y drenaje. • Serán construidas de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impida el ingreso de animales domésticos. • Las unidades de almacenamiento deberán disponer de espacio suficiente para realizar el almacenamiento de los materiales, evitando su deterioro. • Debe ser de accesibilidad y facilidad para el manejo y la recolección de los residuos sólidos por parte del prestador. • El cuarto de almacenamiento debe ser acorde con la proyección de generación de residuos, siendo este un espacio de uso independiente para la Entidad en el cual se pueda controlar la entrada y salida del personal de aseo y/o recuperador de oficio de la SDIS. • Verificar la ruta de movilización de los residuos sólidos al interior de la infraestructura garantizando su fácil movilización. • Fijar los espacios para el uso de las canecas en cumplimiento del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS)	almacenan residuos de desmonte de las redes eléctricas del Colegio INEM sede A. • Se cuenta con un con espacio de almacenamiento de materiales donde se tiene en cuenta todo lo establecido en el Artículo 20 del Decreto 2981 de 2013
• OBLIGACIONES ESPECIFICAS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN RCD	
• Garantizar la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 1115 de 2012, Resolución 932 de 2015 de la SDA y Resolución 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a las demás que modifique o adicione y a los lineamientos internos de la SED. Deberá hacer entrega y actualización,	• Durante este período, se llevó a cabo el aprovechamiento de RCD, transportándolos a plantas especializadas para su tratamiento. Además, se adquirieron materiales valorizados, lo cual nos permite continuar con la gestión necesaria para cumplir con el porcentaje de reutilización exigido por la normativa.

según se requiera y conforme avance la obra, del PGRCD, formatos RCD y cargue mensual en aplicativo web de la SDA e informe de No cumplimiento de aprovechamiento RCD, desde la apertura hasta el cierre del PIN de obra que sea asignado. Los reportes mensuales deberán ser revisados y avalados por la Interventoría previo envío a la Supervisión de la SED. • El Contratista debe elaborar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición PGRCD, conforme los lineamientos establecidos en la "Guía para la Elaboración del Plan de Gestión Integral de RCD en la Obra" vigente que se encuentra publicada en la página web de la Secretaría Distrital de Ambiente y remitirlo a Interventoría para su revisión y aprobación. La SED realizará la apertura del PIN, una vez el contratista y la interventoría presenten la información requerida para la apertura del PIN. • En caso de prever que no se alcanzará el % de reutilización exigido en la norma, deberá presentar un informe técnico que sustente ampliamente por qué no se va a alcanzar, el cual deberá ser concertado y avalado por el especialista ambiental del contratista, la interventoría y el apoyo a la supervisión de la SED. Del contrato e incluir la siguiente información:	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS USO EFICIENTE DEL AGUA	
• Implementar al 100% sistemas ahorradores de agua de alta eficiencia en cada uno de los puntos hidráulicos (excepto en pocetas, lavaderos y lava traperos), dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos. • Implementar un sistema de recolección, almacenamiento y/o aprovechamiento de aguas lluvias, con el fin de reutilizarlas en	• Durante este período no se llevó a cabo esta actividad debido a que aún no se han iniciado este tipo de acciones. No obstante, se contempla la implementación de sistemas ahorradores cuando corresponda. • Durante este periodo se realizó el aprovechamiento de aguas lluvias y de aguas grises para las cisternas de los

cisternas, riego de jardines, zonas verdes y/o limpieza de exteriores. • Implementar al 100% sistemas sanitarios ahorradores de agua de alta eficiencia dando cumplimiento al Decreto Nacional 3102 de 1997 y al Acuerdo Distrital 407 de 2009.	baños del campamento principal, el cual queda ubicado en el colegio INEM • Durante este período no se llevó a cabo esta actividad debido a que aún no se han iniciado este tipo de acciones. No obstante, se contempla la implementación de sistemas ahorradores cuando corresponda
OBLIGACIONES ESPECIFICAS USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	
• Garantizar que los muros internos y techos sean de colores claros preferiblemente blancos, con el fin de generar un mejor aprovechamiento de la luz natural. Así mismo, se debe verificar que la infraestructura permita el máximo aprovechamiento de la luz natural. • Implementar al 100% bombillos ahorradores y luminarias con tecnología LED, dando cumplimiento al Decreto 2331 de y a la Resolución 180606 de 2008. Deberá reportar a la entidad mensualmente la instalación/implementación y/o reposición de dispositivos. • Garantizar la implementación de circuitos de iluminación independientes y sectorizados. • Implementar un sistema de energía solar fotovoltaico (o similar), como método alterno de suministro de energía que sea eficiente y amigable con el medio ambiente; el cual deberá incorporarse a ciertas áreas de la infraestructura eléctrica proyectada en la edificación en donde se pueda evidenciar el uso de energías alternas sostenible.	• Para las actividades constructivas previstas, se dará prioridad a la instalación de tejas traslúcidas y se garantizará que tanto los muros como los techos sean de colores claros, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de la luz natural. • Dentro de los alcances, se considera exclusivamente el uso de bombillas ahorradoras y luminarias LED. Sin embargo, durante este período no se llevaron a cabo actividades relacionadas con esta implementación. • Durante este período, los diseños enviados por la parte técnica constructiva de la SED no incluyen la implementación de estos sistemas.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE	
• El Contratista de obra deberá evaluar, establecer y aplicar (si es viable) los lineamientos requeridos en El Programa de reconocimiento ambiental BOGOTÁ CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE de la Secretaría Distrital de Ambiente teniendo en cuenta los indicadores que miden el nivel de implementación de las estrategias de Ecourbanismo y/o Construcción Sostenible asociados a las categorías URBANISMO y	• Durante la ejecución del contrato no se ha evaluado la implementación del programa

ARQUITECTURA para lograr la postulación de la obra al programa en mención. Como soporte de esta obligación, deberá suministrar la información requerida en los términos de referencia (memorias de cálculos, planos, fichas técnicas, etc) y el respectivo radicado en la SDA. Nota: Todos los soportes de cumplimiento de las obligaciones ambientales suministrados por el contratista deben ser debidamente verificados y avalados por la Interventoría del contrato y éstos a su vez por la Supervisión de la SED.	
• OBLIGACIONES ESPECIFICAS COMPONENTE FORESTAL	
• En caso de requerir intervención de vegetación y/o tratamientos silviculturales, previa obtención del permiso por parte de la Autoridad Competente: • Presentar el inventario forestal actualizado de acuerdo con los requisitos establecidos en la lista de chequeo de la SDA, incluyendo: Formato 1, Formato 2, plano de localización georreferenciada indicando los tratamientos propuestos por color según el tratamiento (debe incluir coordenadas, grilla, norte, convenciones, debe permitir ver la superposición de la vegetación existente con el proyecto, original recibo de pago cancelado por el servicio de evaluación • Elaborar el Plan de Manejo de Avifauna. • El inventario forestal y plan de manejo de avifauna serán entregados a la interventoría, quien deberá revisar dichos documentos y emitir las observaciones pertinentes. Así mismo, se obliga a presentar en la SED la información requerida para solicitar los permisos necesarios ante la Secretaría Distrital de Ambiente, de forma oportuna, con el fin de que no se presenten retrasos en las obras por efecto de la expedición del concepto respectivo. Una vez obtenido el permiso correspondiente el contratista deberá ejecutar los tratamientos silviculturales aprobados, de acuerdo con las	Durante este periodo, se han recibido dos conceptos técnicos relacionados con la emergencia de silvicultura en el Colegio Nicolás Esguerra. Estos conceptos contemplan la realización de 34 talas, 4 tratamientos y 2 podas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha iniciado ninguna de estas actividades

normas ambientales vigentes al momento de la ejecución. • Si se realiza el traslado o siembra de árboles en espacio público, el contratista debe solicitar al JBB la aprobación de los sitios de traslado o siembra. Estará a cargo del mantenimiento de los mismos hasta la terminación del contrato. Finalizada la siembra y/o traslado, deberá presentar el plano de localización georreferenciada de los árboles, a la Interventoría para revisión y aprobación y posterior entrega a la SED. (Decreto 383 de 2018) • Si se plantea la siembra de árboles del diseño paisajístico en zonas de espacio público, el contratista deberá presentar el acta de aprobación del JBB y posteriormente el acta de recibo de los árboles. • Si se requiere la prórroga del permiso otorgado por la AAC, el contratista deberá informar a la SED como mínimo con cuatro (4) meses de anticipación, para poder hacer el trámite en tiempos. • El contratista deberá cancelar el valor por seguimiento y el valor IVP (Individuo Vegetal Plantado) como medida de compensación por la tala del arbolado urbano, que defina la Autoridad Ambiental Competente en la Resolución aprobatoria de los tratamientos a la vegetación y presentar los recibos de pago a la SED. • El contratista debe realizar el mantenimiento de los individuos vegetales arbóreos y de jardinería plantados y los árboles bloqueados y trasladados desde el momento de su plantación y durante la ejecución de las obras. • El contratista debe implementar las medidas de manejo ambiental para las actividades que se adelanten en zonas sensibles • El contratista no podrá adelantar obras de ningún tipo en sectores de áreas protegidas del Distrito Capital. • Debe presentar un capítulo forestal en el informe mensual que contenga: i) Relación tratamientos silviculturales autorizados y ejecutados. Indicar destino final de productos y residuos resultantes de los tratamientos	

ejecutados. Presentar las certificaciones o actas de recibo del material, ii) Reporte de funciones realizadas por el profesional forestal cuando aplique, iii) Reporte de actividades realizadas en cuanto a manejo de vegetación, zonas verdes, avifauna y diseño paisajístico cuando aplique, iv) Reporte de pagos de actos administrativos cuando aplique, v) Reporte de ejecución del plan de manejo de avifauna cuando aplique. Vi) Reporte de uso final de la madera comercial obtenida de los tratamientos silviculturales (cuando aplique) y presentación de salvoconducto de movilización de la misma en caso de retirarla del sitio de aprovechamiento • Una vez ejecutados todos los tratamientos silviculturales autorizados, el contratista debe remitir a la interventoría el informe final de seguimiento a la Resolución de Autorización, donde se presente el estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas por la Autoridad Ambiental Competente – AAC-, con registro fotográfico donde aplique, el listado de tratamientos ejecutados versus autorizados, certificaciones de disposición final de los residuos vegetales, certificación de destino final de madera comercial cuando aplique y salvoconducto de movilización si éste fue requerido. Registro de actividades de mantenimiento de árboles trasladados y/o plantados (con registro fotográfico). Planos récord, en medio impreso y magnético (dos copias), los cuales deberán estar georreferenciados a una escala acorde, donde se evidencien claramente los detalles y los siguientes aspectos: ubicación de los árboles plantados como parte del diseño paisajístico, ubicación de los árboles trasladados, ubicación de los árboles conceptuados para permanencia, memoria técnica ejecutiva del manejo de la vegetación y de la implementación del diseño paisajístico y el informe de actividades realizadas, para evaluación y aprobación y posteriormente remitir a la SED para el trámite ante la AAC del cierre del expediente., en este informe se debe consolidar la información reportada mensualmente durante el contrato. Se debe	

	presentar el formato de ejecución de actividades silviculturales disponible en la página web de la SDA (adjunto).	

3.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CON LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES MÁS RELEVANTES DE OBRA.

	
Disposición RCD Integrado Fontibón sede E	Acopio tejas de asbesto Integrado Fontibón sede E
	
Reutilización adoquín Colegio Kennedy sede A	Punto ecológico Colegio Kennedy sede A

	
Acopio de materiales Colegio El Japón sede A	Mantenimiento Sumideros Colegio la Amistad sede A
	
Recolección aguas lluvias Colegio INEM Sede A	Evacuación RCD Colegio San Rafael sede A

	
Acopio material Colegio San Rafael sede A	Protección de sumideros Colegio San Rafael
	
Protección de especies arbóreas Colegio San Rafael	Señalización ambiental Colegio Tom Adams

3.6. REGISTRO DE AVAL DE REPORTES MENSUALES RCD CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES.

Durante este período, se generaron 215 m3 de RCD (Residuos de Construcción y Demolición), de las cuales 28 m3 fueron residuos de demolición, (14 m3 fueron dispuestos en la planta de tratamiento y aprovechamiento GRECO y 14 m3 fueron llevados a disposición final a gestor autorizado CEMEX. Además, se generaron 187 m3 de residuos de excavación, los cuales fueron enviados a gestores autorizados de disposición final como CEMEX y SAN JOSÉ GREEN GROUP. Se generaron además 5.213 toneladas de RCD provenientes de desmontes, y dispusieron con el gestor autorizado MAAT Soluciones, RCD

como (tejas de asbesto, manto asfaltico, madera, material ferroso, PVC, entre otros). Consulte el Anexo para los soportes de disposición, y para evidenciar el control de transporte de RCD. A continuación, se relacionan los RCD generados hasta la fecha del presente corte

Tabla 2 Relación RCD generado periodo

DISPOSICIÓN A GESTORES					
MES	GESTOR	TIPO DE RCD	KG	M3	PESO (Ton)
MAYO	CEMEX	EXCAVACIÓN	-	77	112,86
	GRECO	DEMOLICIÓN	-	88	112,64
	SAN JOSÉ GREEN GROUP	DEMOLICIÓN	-	135	198,0
JUNIO	CEMEX	EXCAVACIÓN	-	14	20,52
	GRECO	DEMOLICIÓN	-	7	8,96
	MAQUINAS AMARILLAS	EXCAVACIÓN	-	60	0,00
	SAN JOSÉ GREEN GROUP	EXCAVACIÓN	-	285	0,0
	MAAT	MADERA	307	-	0,307
	MAAT	METAL FERROSO	41	-	0,041
	MAAT	PVC	70	-	0,07
	MAAT	DRY WALL HÚMEDO	114	-	0,114
	MAAT	RESIDUOS ESPECIALES MEZCLADOS	109	-	0,109
	MAAT	ICOPOR LIMPIO	30	1	0,03
JULIO	MAAT	MANTO ASFALTICO	2224	-	2,224
	MAAT	TEJAS DE ASBESTO	2318	-	2,318

En el anexo 5 se presentan los soportes del control de trasporte de RDC en el periodo reportado

3.6.1. Meta de aprovechamiento de RCD

Durante este periodo, la mayoría de las actividades realizadas fueron excavaciones, lo que llevó a que la mayor parte de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) fueran de excavación. Se generaron 8.96 toneladas de residuos de demolición y 0.671 toneladas de residuos derivados de desmontes, como madera, PVC, manto de aluminio, drywall, material ferroso, icopor y residuos especiales mezclados. De acuerdo con la normativa aplicable, que solo considera los RCD distintos a los residuos de excavación, y dado que se logró la disposición adecuada de los residuos de demolición, se alcanzó una tasa de aprovechamiento del 93% para los RCD generados en este periodo

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de aprovechamiento en el periodo reportado

Tabla 3 Porcentaje de aprovechamiento

Aprovechamiento en TON		
Periodo	**Total RCD-Excavación**	**Cantidad de RCD aprovechado CTA**
Mayo	113,92	113,92
	100%	
Junio	**9,631**	**8,96**
	93%	
Total, Acumulado	**123,551**	**122,88**
	99%	

3.6.2. Meta de circularidad

Durante este periodo se ha suministrado todo el material reciclable posible, por medio del proveedor RANGEL, el cual nos suministra material reciclable de la planta de tratamiento y aprovechamiento GRECO. Es importante mencionar que en el presente informe tiene una fecha de corte del 15 de junio al 14 de julio, por lo que solo se reportará el porcentaje de circularidad del mes de junio, como se evidencia en la siguiente tabla

Tabla 4 Meta de circularidad

META RECIRULARIDAD		
Periodo	**Material reciclado (ton)**	**Material total (ton)**
Mayo	366	444,27
	82%	
Junio	**458,1**	**627,32**
	73%	
Total Acumulado	**824,1**	**1071,59**
	77%	

En cumplimiento de la meta de circularidad establecida en la resolución 507 del año 2023, se incorporaron 824,1 toneladas de material valorizado en la obra durante el mes de junio.

3.6.3. Registro de cargue de reportes mensuales RCD generado en el aplicativo de la SDA

Hasta la fecha, no hemos podido reportar en el aplicativo web de la SDA el mes de mayo, ya que aún no hemos recibido los certificados de disposición del gestor San José Green

Group ni los certificados de los proveedores del material valorizado necesarios.

3.7. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA QUE CONSTE QUE SE REALIZÓ LA PROTECCIÓN A LOS SUMIDEROS ALEDAÑOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.

Durante el presente periodo se realizaron nuevas protecciones de sumidero, se realizan mantenimientos a los ya protegidos en caso de presentarse algún deterioro.

En la siguiente tabla se muestra la ubicación de los sumideros protegidos.

Colegio	Fecha	Coordenadas	
Colegio la Amistad	03/05/2024	4°37´22.2694"N-74°8´49.68406¨W	Altitud:2579.3
Colegio la Amistad	03/05/2024	4°37´22.21723"N-74°8´49.65574¨W	Altitud:25879.6
Colegio San Rafael	03/05/2024	4°37´1.22048"N-74°9´42.86552¨W	Altitud:2586.9
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37´21.42253"N-74°9´38.68726¨W	Altitud:2584.4m
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37´21.27734"N-74°9´38.7252¨W	Altitud:2584.9m
Colegio San Pedro Claver	03/05/2024	4°37´19041366-74°9´38.63243¨W	Altitud:2580.1m
Colegio El Japón	03/05/2024	4°37´19.4822"N-74°9´14.32375¨W	Altitud:2580.9m
Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37´2.9552"N-74°9´41.5268¨W	Altitud:2600.0m
Colegio San Rafael Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37´2.82781"N-74°9´41.32418S¨W	Altitud:2597.1m
Colegio San Rafael	25/06/2024	4°37´1.63938"N-74°9´43.524¨W	Altitud:2584.1m

3.8. CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORÍA DONDE CONSTE QUE NO SE REALIZÓ INTERVENCIÓN DE LAS ZONAS VERDES ALEDAÑAS AL PROYECTO O QUE, SI HUBO INTERVENCIÓN ALGUNA, ÉSTAS SE DEJARON EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS INICIALES.

Durante el presente periodo no se realiza intervención a las zonas verdes aledañas al proyecto.

3.9. LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES Y DEMÁS

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE PERMISOS REQUERIDOS POR EL CONTRATO.

Para el desarrollo de las actividades no se ha hecho necesario gestionar permisos para el uso y/o aprovechamiento de los recursos naturales

4. INFORME MENSUAL SST.

4.1. INTRODUCCIÓN.

En el presente documento se describen las actividades realizadas por el Contratista y la Interventoría para la prevención, control y mitigación de los riesgos de salud y seguridad en el trabajo generados en el proyecto adjudicado por la secretaria de Educación Distrital el contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.5313249 Consorcio Colegios por Bogotá , cuyo objeto es la objeto es "INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS" – GRUPO 7., con un alcance del objeto donde la firma interventora, debe realizar el seguimiento y control técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y SST al contrato de Obra No. SED CO1.PCCNTR.5305650, cuyo objeto es ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO, ASI COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUEPERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FISICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACION DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS COLEGIOSDISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. – GRUPO 7.

El INFORME MENSUAL SST No. 3 DE CONSTRUCCIÓN que corresponde al periodo del 15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2024 se elabora de acuerdo a lo estipulado en el documento complemento al pliego de condiciones definitivo, con los cuales el CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA realiza la supervisión del contrato de obra para la secretaria de Educación Distrital-SED.

En el presente informe se contempla la gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo - SST desarrollada por el Contratista e Interventoría en los siguientes capítulos:

Capítulo 1: Relación de personal requerido tanto por el contrato de obra como por

Interventoría.

Capítulo 2: Actividades realizadas por el Contratista. Aquí se describe la gestión SST realizada por el Contratista en este periodo, requerida en el contrato de obra.

Capítulo 3: Actividades de Gestión SST de la Interventoría. Aquí se describe la gestión SST realizada por la Interventoría en este periodo, requerida en el contrato de Interventoría.

Capítulo 4: Conclusiones. En este capítulo se presentan los resultados más relevantes de la gestión SST desarrollados por el Contratista y la Interventoría durante este periodo.

Anexos. Se adjuntan todos los soportes y demás registros que evidencian lo descrito en este informe y que permiten verificar el desarrollo de la gestión SST requeridos en los contratos de obra y de Interventoría.

4.2. RELACIÓN DE PERSONAL REQUERIDO

En las siguientes tablas se presenta el personal mínimo requerido por la Entidad para la ETAPA DE CONSTRUCCIÓN de los contratos de obra e Interventoría con sus respectivas dedicaciones.

4.2.1 PERSONAL REQUERIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

Tabla 5. Personal requerido del Contratista para obra

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	**CARGO**	**NOMBRE**	**DEDICACION**	**NOVEDAD**
1	Director de obra	Viviana Andrea Rodríguez	30%	Activo
2	Residente de obra 1	Jean Carlo Torres Calderón	100%	Activo
3	Residente de obra 2	José Leonardo Feriz Guzmán	100%	Activo
4	Asesor estructural	Martín Augusto López Jaime	10%	Activo
5	Asesor Ambiental	Carlos Alberto Arámbula	20%	Activo
6	Asesor en Seguridad y salud en el trabajo	Jhon Alexander Peña	20%	Activo
7	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	Diego Armando Pinto Arguello	10%	Activo
8	Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y	----------	10%	No se reporta profesional para el cargo dentro de la

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	**CARGO**	**NOMBRE**	**DEDICACION**	**NOVEDAD**
	red contra incendio			base de datos del personal para el periodo
9	Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	Byron Camilo Falla	20%	Activo
10	Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 1	Ana Lucia Camelo Hernández	100%	Activo
11	Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 2	Anderson Orlando Ortiz Sierra	100%	Activo
12	Inspector de obra 1	Edinson Fabian Hernández Aldana	100%	Activo
13	Inspector de obra 2	Natalia Vallejo Largo	100%	Activo
14	Maestro de obra 1	Alcides Juez Vargas	100%	Activo
15	Maestro de obra 2	----------	100%	No se reporta profesional para el cargo dentro de la base de datos del personal

4.2.2 Seguimiento cumplimiento de dedicaciones personal mínimo requerido

Durante el periodo y de acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista no se evidencian los soportes de vinculación para los siguientes cargos:

Tabla 6. Balance acumulado personal mínimo requerido

CARGO	DEDICACIÓN CONTRACTUAL NO REPORTADA POR PERIODO- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN												TOTAL
	2024												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	10%												10%
Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	10%	10%	10%										30%
Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	20%	20%											40%
Asesor Jurídico	5%	5%	5%										15%

CARGO	DEDICACIÓN CONTRACTUAL NO REPORTADA POR PERIODO- ETAPA DE CONSTRUCCIÓN												TOTAL
	2024												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 2	100%												100%
Maestro de obra 1	100%												100%
Maestro de obra 2	100%	100%	100%										300%

4.2.3 Personal requerido en el contrato de Interventoría

Tabla 7.Personal requerido por Interventoría

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	CARGO	NOMBRE	DEDICACION	NOVEDAD
1	Inspector 2 de Interventoría	Jean Pierre Pérez	100%	Ingreso
2	Director de obra	Martín Rafael Córdoba González	30%	Activo
3	Residente de obra 1	Marcos Ahumada Riaño	100%	Activo
4	Residente de obra 2	Jhon Edison Reyes Rojas	100%	Activo
5	Asesor estructural	Paola Andrea Fernández Córdoba	10%	Activo
6	Asesor Ambiental	Martha Isabel Conrado López	20%	Activo
7	Asesor en Seguridad y salud en el trabajo	Jennifer Monguí Bernal	20%	Activo
8	Asesor en Redes Eléctricas, Telefónicas, Voz y Datos	Eisenhower Miguel Martínez Roa	10%	Activo
9	Asesor en Redes Hidrosanitarias, de gas y red contra incendio	Ricardo Montenegro Soto	10%	Activo
10	Profesional de costos, presupuestos y programación de obra	Sandra Milena Ramírez Pérez	20%	Activo
11	Técnico en Seguridad y Salud en el trabajo 1	Viviana Beltrán Sánchez	100%	Activo
12	Asesor Jurídico	Natalia Mayorga Ulloa	5%	Activo
13	Inspector 1 de	Cesar Maldonado	100%	Activo

PERSONAL MINIMO PARA ETAPA DE OBRA				
No	**CARGO**	**NOMBRE**	**DEDICACION**	**NOVEDAD**
	Interventoría	Pedraza		

4.3. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST DEL CONTRATISTA

4.3.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS Y SST REALIZADAS

Durante el presente periodo el área SST del CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES realizo el seguimiento al SG-SST diseñado para el contrato No CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.5305650 DE 2023, en la tabla siguiente se presentan los frentes de obra priorizados con sus respectivos avances e implementación de medidas preventivas en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 8.Actividades constructivas y SST realizadas durante el periodo

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES SST EJECUTADAS
Colegio la amistad sede A	▪ Firma de permisos de trabajo. ▪ Inspección de máquinas y herramientas ▪ Mantenimiento de señalización y cerramientos. ▪ Pausas activas y charlas. ▪ Instalación de políticas, MEDEVAC, camilla, y extintor. ▪ Inspección general de obra.
Colegio Inem sede A	▪ Instalación de MEDEVAC, camilla y extintor. ▪ Inducciones a personal ingresado durante el periodo. ▪ Permiso de trabajo en alturas. ▪ Mantenimiento de cerramientos y señalización.

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES SST EJECUTADAS
	▪ Entrega de elementos de protección personal. ▪ Pausas activas y capacitaciones. ▪ Inspección de equipos y herramientas y firma de permisos de trabajo.
Colegio Japón Sede A	▪ Mantenimiento de cerramientos y señalización. ▪ Charlas y capacitaciones en seguridad. ▪ Entrega de epp´s y dotación al personal. ▪ Inspección de quipos
Colegio Tom Adams	▪ Mantenimiento de señalización y cerramientos. ▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo. ▪ Pausas activas, charlas y capacitaciones. ▪ Instalación de políticas MEDEVAC camilla y extintor
Colegio San pedro Claver	▪ Mantenimiento de señalización y cerramientos. ▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo. ▪ Pausas activas y charlas. ▪ Instalación de políticas MEDEVAC camilla y extintor

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDADES SST EJECUTADAS
Colegio Kennedy sede A	▪ Mantenimiento de señalización y cerramiento. ▪ Instalación de elementos de emergencias. ▪ Charlas, capacitaciones, pausas activas e inducciones. ▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo
Colegio San Rafael	▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo. ▪ Mantenimiento de cerramiento. ▪ Charla capacitaciones y pausas activas
Colegio Integrado Fontibón	▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo. ▪ Instalación de señalización. ▪ Charlas y capacitaciones. ▪ Inducciones
Colegio Villamar del Carmen	▪ Inspección de equipos y herramientas, firma de permisos de trabajo. ▪ Instalación de señalización. ▪ Charlas y capacitación. ▪ Suministro de equipos de emergencia.

Fuente: informe SST Contratista

Actividades constructivas realizadas durante el periodo:

Colegio Inem sede A

Semana del 25 al 29 de junio de 2024

- Desmonte de teja asbesto cemento, bloque de ciencias.
- pintura con compresor de perfilería en hierro.
- Corte de hierro, soldadura de parte para elaboración de cercha.

Semana del 02 al 06 de julio de 2024

- pintura con compresor de perfilería en hierro.
- Corte de hierro, soldadura de partes para elaboración de cercha.
- Demolición y excavación para cambio de tubería.

Semana del 08 al 13 de julio de 2024

- Desmonte de teja asbesto cemento, bloque de ciencias.
- Pintura con compresor de perfilería en hierro.
- Corte de hierro, soldadura de parte para elaboración de cercha.

Colegio Integrado Fontibón

Semana del 17 al 22 de junio de 2024

- Instalación de cubierta.
- Resane de muros.
- Pintura de cercha.

Colegio Japón

Semana del 25 al 25 de junio de 2024

- Pintura con compresor de perfilería en hierro.
- Corte de hierro, soldadura de partes para elaboración de estructura.

Semana del 02 al 06 de julio de 2024

- Pintura con compresor de perfilería en hierro.
- Corte de hierro, soldadura de partes para elaboración de estructura**.**

Semana del 08 al 13 de julio de 2024

- Pintura con compresor de perfilería en hierro.
- Corte de hierro, soldadura de partes para elaboración de cercha.
- Demolición y excavación para cambio de tubería.

Colegio Kennedy Sede A

Semana del 17 al 22 de junio de 2024

- Trasiego de material via pluma grúa.
- Trasiego en carretilla de material.

Semana del 02 al 06 de julio de 2024

- Trasiego de material via pluma grúa.
- Trasiego en carretilla de material.
- Mezcla de material cemento arena con trompo mezclador
- Fundida de sobrepisos.

Colegio la amistad sede A

Semana del 17 al 22 de junio de 2024

- Demolición con rotomartillo de loza en concreto.
- Excavación manual.
- Conformación y compactación de terreno con maquinaria pesada.
- Fundida en concreto de lozas con sistema de bombeo.

Semana del 10 al 13 de julio de 2024

- Corte de tubería de hierro, soldadura de partes para elaboración de estructura metálica.

Colegio Pablo VI

Semana del 02 al 06 de julio de 2024

- Instalación de cerramientos
- Traslado de casetas
- Picada de muros

Semana del 07 al 12 de julio de 2024

- Instalación de drywall
- Demolición manual

Colegio San pedro Claver

Semana del 17 al 22 de junio de 2024

- Fundida en concreto de vigas y placa

Semana del 24 al 29 de junio de 2024

- Fundición de placa de cocina
- Figurado y armado de hierro

Semana del 08 al 13 de julio de 2024

- Levantamiento de columnas
- Armado de tubería sanitaria y agua potable

Colegio San Rafael

Semana del 20 al 22 de junio de 2024

- Excavación mecánica y manual

Semana del 24 al 29 de junio de 2024

- Excavación mecánica

Colegio Tom Adams

Semana del 24 al 09 de junio de 2024

- Conformación de sub- base
- Corte y figurado de hierro para conformación de vigas

Semana del 02 al 04 de julio de 2024

- Fundida de vigas y zapata
- Instalación de malla y conformado de sub- base.

Semana del 08 al 12 de julio de 2024

- Compactación de subbase.
- Instalación de malla
- Fundida de placa y tallado de placa

Colegio Villemar del Carmen

Semana del 08 al 13 de julio de 2024

- Instalación de cerramiento
- Instalación de señalización en el área a intervenir
- Demolición de lozas en concreto
- Trasiego y acopio de material demolido

4.3.2 PERSONAL REPORTADO POR EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO

Dentro del formato base de datos de personal el Contratista reporta la vinculación de (12) trabajadores (1) con novedad de ingreso-retiro del personal requerido para la etapa de Obra, de acuerdo con la minuta del contrato y el documento complemento al pliego de condiciones definitivo.

En la carpeta anexos Contratista **Anexo N.1** se incluye la base de datos del personal revisada y no aprobada por la Interventoría teniendo en cuenta que se presentan observaciones frente al diligenciamiento y el personal reportado en el periodo anterior Vs el actual.

Tabla 9. Personal reportado por el Contratista para el periodo

TIPO DE PERSONAL	No. TRABAJADORES		
	PLANTILLA MÍNIMA (PERSONAL CONTRACTUAL)	PERSONAL OPERATIVO (NO CONTRACTUAL)	TOTAL TRABAJADORES
NUEVO	0	11	11
TOTAL PERSONAL NUEVO	0	11	11
INGRESO – RETIRO	0	1	1
TOTAL PERSONAL INGRESO-RETIRO	0	1	1
ANTIGUO	12	16	28
ANTIGUO ROTATIVO	0	5	5
TOTAL PERSONAL ANTIGUO	12	21	33
RETIRADO	0	4	4

TIPO DE PERSONAL	No. TRABAJADORES		
	PLANTILLA MÍNIMA (PERSONAL CONTRACTUAL)	PERSONAL OPERATIVO (NO CONTRACTUAL)	TOTAL TRABAJADORES
RETIRADO ROTATIVO	0	0	0
INGRESO – RETIRO ROTATIVO	0	0	0
TOTAL, PERSONAL RETIRADO	0	4	4
TOTAL	12	36	48
PERSONAL ACTIVO DURANTE EL PERIODO	48 TRABAJADORES (36 PERSONAL OPERATIVO NO CONTRACTUAL ,12 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO)		

Dentro de la carpeta de anexos del Contratista -anexo 1 se incluye la documentación de los (12) trabajadores ingresados durante el periodo.

4.3.3 CERTIFICADOS DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

El Contratista hace entrega de manera parcial de los certificados de pago de aportes parafiscales, al efectuar la revisión se evidencian inconsistencias con el reporte de personal incluido dentro de los informes precedentes, por lo tanto, se emite observación al Contratista para que sea atendida.

4.3.4 PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Se efectúa revisión de los soportes remitidos por el Contratista en donde se evidencia cumplimiento referente a los aportes efectuados al SGSS, sin embargo, se solicita adjuntar las planillas de algunos trabajadores ya que las adjuntas no corresponden al periodo, las planillas se remiten dentro de la carpeta Anexos componente SST Contratista **anexo No.3**

4.3.5 PAGO DE SALARIOS HONORARIOS Y LIQUIDACIONES

Una vez efectuada la revisión de los soportes se evidencia la remisión parcial ya que se debe incluir el personal que precede de los informes anteriores Por lo que se emitió observación al respecto.

4.3.6 COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

- COPASST

De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista se evidencia que el día 29 de junio de 2024, se llevó a cabo reunión mensual la cual contó tanto con representantes del empleador como de los trabajadores, la reunión se desarrolla sin novedad.

- CCL

Para el periodo y de acuerdo al cronograma no se tenía programada reunión para el periodo.

4.3.7 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

Exámenes de ingreso: Él Contratista hace entrega de los soportes de realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, de los (11) trabajadores reportados en

calidad de nuevos, y (1) reportado en calidad de ingreso-retiro los cuales fueron verificados por la Interventoría y se evidencia cumplimiento del profesiograma ofertado por el Contratista, dicho soportes son remitidos por el Contratista mediante correo electrónico a medida que va ingresando el personal.

Exámenes periódicos: De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista para el periodo no se llevaron a cabo exámenes periódicos.

Exámenes de retiro: De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista para el periodo no se llevaron a cabo exámenes de retiro de (4) trabajadores en calidad de antiguos retirados

y (1) en calidad de ingreso-retiro, no obstante, se entregó la respectiva notificación de derecho a examen de retiro.

4.3.8 Actividades y campañas de promoción y prevención

De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Tabla 10. Actividades de promoción y prevención realizadas por el Contratista

TEMA	FECHA DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE ASISTENTES
Importancia de la buena salud oral	12/07/2024	19
Campaña alcoholismo, drogadicción y tabaquismo (socialización por medio de plegable)	15/06/2024 al 14/07/2024	14

4.3.9 Ausentismo Laboral

Tabla 11. Seguimiento ausentismo Contratista

2024			
PERIODO	**INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL I.E.L.**	**PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL P.E.L.**	**AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA A.C.M**
1 (Del 15 de abril al 14 de mayo de 204)	0,00	0,00	0%
2(Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	0,00	0,00	0%
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024	0,00	0,00	0%

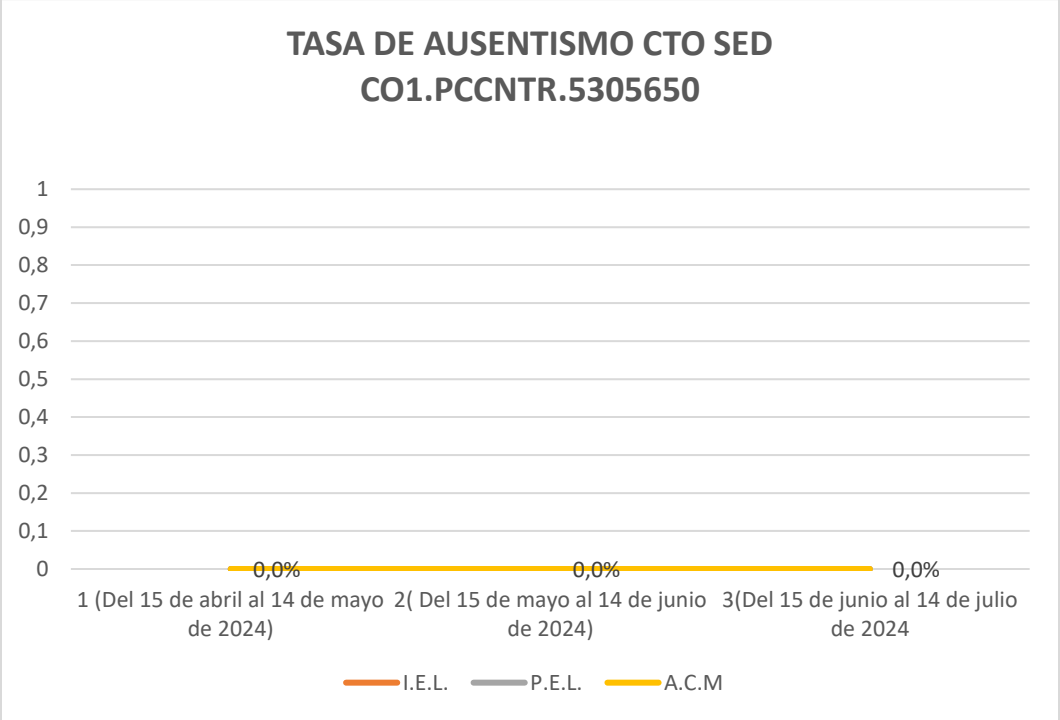


Gráfico 1. Seguimiento a tasas de ausentismo Contratista

I.E.L: Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo del 15 de junio al 14 de julio del de 2024.

P.E.L: Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos de enfermedad laboral en el periodo del 15 de junio al 14 de julio del de 2024

Ausentismo por causa medica: En el mes se perdió 0%de días programados de trabajo por incapacidad médica.

4.3.10 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Dentro del subprograma de higiene industrial, el Contratista CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES busca identificar, evaluar y controlar los factores ambientales del sitio de trabajo que ocasionan perjuicio a la salud de los trabajadores vinculados al proyecto, buscando prevenir la generación de enfermedades laborales durante el desarrollo del contrato.

4.3.11 Unidades sanitarias

Teniendo en cuenta que las actividades de mantenimiento son llevadas a cabo dentro de instituciones educativas el personal tiene a disposición unidades sanitarias separadas por género, las cueles se encuentran en buenas condiciones de aseo y limpieza.

4.3.12 Suministro de hidratación

Los trabajadores cuentan con hidratación permanente dichos puntos se cumplen con las condiciones de higiene y salubridad necesarias para su funcionamiento.

4.3.13 Campamentos

Durante el periodo del presente informe los campamentos implementados para el cambio de vestuario de los trabajadores fueron un espacio asignado por cada uno de los colegios.

4.3.14 SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

- **Sustancias Químicas**

De acuerdo a los soportes remitidos por el Contratista no se reporta uso de sustancias químicas, no obstante, una vez se evidencie el uso de estás se solicitará al contratista dar cumplimiento a la normativa legal vigente del sistema global armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.

- **Matriz de peligros**

La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos del contrato de obra No. SED CO1.PCCNTR.5305650 y que fue entregada por el Contratista dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SGSST del CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES se encuentra aprobada por la Interventoría y está matriz será actualizada cuando las condiciones de trabajo se modifiquen o así lo requieran. Para el periodo no se requirió la actualización de la misma.

- **Inspecciones planeadas**

Durante el periodo se llevan a cabo las siguientes inspecciones por el Contratista:

Tabla 12. Inspecciones realizadas durante el periodo por el Contratista

TIPO DE INSPECCION	FECHA DE EJECUCIÓN	FRENTE DE TRABAJO
Inspección general de obra	15/06/2024	Colegio San pedro Claver
Inspección general de obra	15/06/2024	Colegio San Rafael
Inspección general de obra	15/06/2024	Colegio Paulo VI
Inspección general de obra	15/06/2024	Colegio Tom Adams
Inspección general de obra	24/06/2024	Colegio Inem Sede A
Inspección general de obra	27/06/2024	Colegio Kennedy Sede A
Inspección general de obra	02/07/2024	Colegio Japón
Inspección general de obra	04/07/2024	Colegio Integrado Fontibón
Inspección general de obra	06/07/2024	Colegio la Amistad
Inspección general de obra	10/07/2024	Colegio Villemar el Carmen

Fuente: Soportes remitidos por el Contratista

Dichos soportes son remitidos dentro del **Anexo No.6**

- **Actividades criticas**

Durante el periodo se realizaron actividades de alto riesgo por Trabajos seguros en alturas y uso de Maquinaria.

- **Trabajos en alturas**

Tabla 13. Frentes de obra en donde se realizaron actividades de alto riesgo

FRENTE DE OBRA	ACTIVIDAD REALIZADA
Colegio Inem sede A	Desmonte de tejas, pintura de perfilería, corte de hierro y armado de cercha.
Colegio Integrado Fontibón	Desmonte de tejas, cambio de cubierta
Colegio Japón	Instalación de estructura en hierro
Colegio Kennedy Sede A	Trasiego de material por pluma grúa
Colegio San pedro Claver	Fundida en concreto de vigas y placa
Colegio Tom Adams	Conformación de viga, corte y figurado

2.9.5 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

De acuerdo a lo informado por el Contratista durante el periodo se utilizaron los servicios de (1) Volquetas Sencillas (13) Volquetas doble troque para el transporte de RCD (1) una ruta para el transporte del personal contractual de CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES Es importante mencionar que no todos los vehículos poseen PIN (Aplica solo para volquetas), SOAT y tecnicomecanica vigente.

A continuación, en la tabla siguiente se presentan los vehículos utilizados durante el periodo:

Tabla 14. Control Vehículos transitorios utilizados en obra

MAQUINARIA/EQUIPO/VEHÍCULO	PLACA	PIN	VIGENCIA SOAT	VIGENCIA TECNICO MECANICA
VOLQUETA DOBLE	EQR395	30841	15/03/2025	23/03/2025
VOLQUETA DOBLE	SZZ588	33310	30/05/2025	3/08/2024
VOLQUETA DOBLE	SZZ589	33588	30/05/2024	4/07/2024
VOLQUETA DOBLE	TUK202	TUK202	6/05/2025	28/06/2024
VOLQUETA DOBLE	TUK061	TUK061	24/04/2025	16/06/2025
VOLQUETA DOBLE	WLR091	33687	18/05/2025	8/03/2025
VOLQUETA DOBLE	WNL840	34171	10/07/2024	13/07/2024
VOLQUETA DOBLE	WLQ649	34088	8/07/2024	29/06/2024
VOLQUETA DOBLE	NOW526	25184	21/03/2025	N/A
VOLQUETA DOBLE	SOR863	24853	06/05/2025	04/10/2024
VOLQUETA DOBLE	TAM972	24859	09/11/2024	15/01/2025
VOLQUETA DOBLE	TTY452	TTY452	19/09/2024	21/11/2024
VOLQUETA DOBLE	WCK433	13239	03/10/2024	12/10/2024
VOLQUETA SENCILLA	XKJ127	19848	8/07/2024	1/08/2024
VAN TRANSPORTE	TSN892	N/A	21/09/2024	26/01/2025
MAQUINARIA				
EQUIPO	MARCA	MODELO	AÑO DE FABIRCACIÓN	CAPACIDAD DE CARGA
VIBROCOMPACTADOR	INGRESOLL	DD4	2005	2.623
RETROEXCAVADORA	JCB	214E	2004	6.200
MINICARGADOR	CATERPILLA	232B	2012	7.93

Tabla 15. Listado de equipos y herramienta utilizada en obra

ELEMENTO	CANTIDAD
Pulidora	1
Demoledor Eléctrico	1
Equipo de Soldadura	1

4.3.1 Entrega y reposición de elementos de protección personal

El Contratista anexa los soportes de entrega de Dotación y EPP que realizó durante el periodo de acuerdo con la Matriz de Elementos de Protección Personal aprobada por la Interventoría únicamente para el personal nuevo dichos soportes se remiten dentro de los anexos Contratista- **anexo 5- entrega de dotación**.

4.3.2 ACCIDENTALIDAD

De acuerdo al seguimiento de la Interventoría y lo reportado por el Contratista para el periodo no se presentaron accidentes e incidentes de trabajo del personal que se encuentra vinculado al contrato de obra. No obstante, se realizan observaciones al ítem teniendo en cuenta que se reportan los indicadores de otro contrato.

- **Indicadores de accidentalidad**

De acuerdo a la información remitida por parte del Contratista y teniendo en cuenta que para el periodo no se presentaron accidentes de trabajo se obtienen los siguientes resultados:

Tabla 16. Seguimiento a indicadores de accidentalidad del Contratista

2024			
PERIODO	**FRECUENCIA DE ACCIDENTALIAD F. A**	**SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD S. A**	**PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES P.A.T.M**
1 (Del 15 de abril al 14 de mayo de 2024)	0,00	0,00	0,00%
2(Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	0,00	0,00	0,00%
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024)	0,00	0,00	0,00%

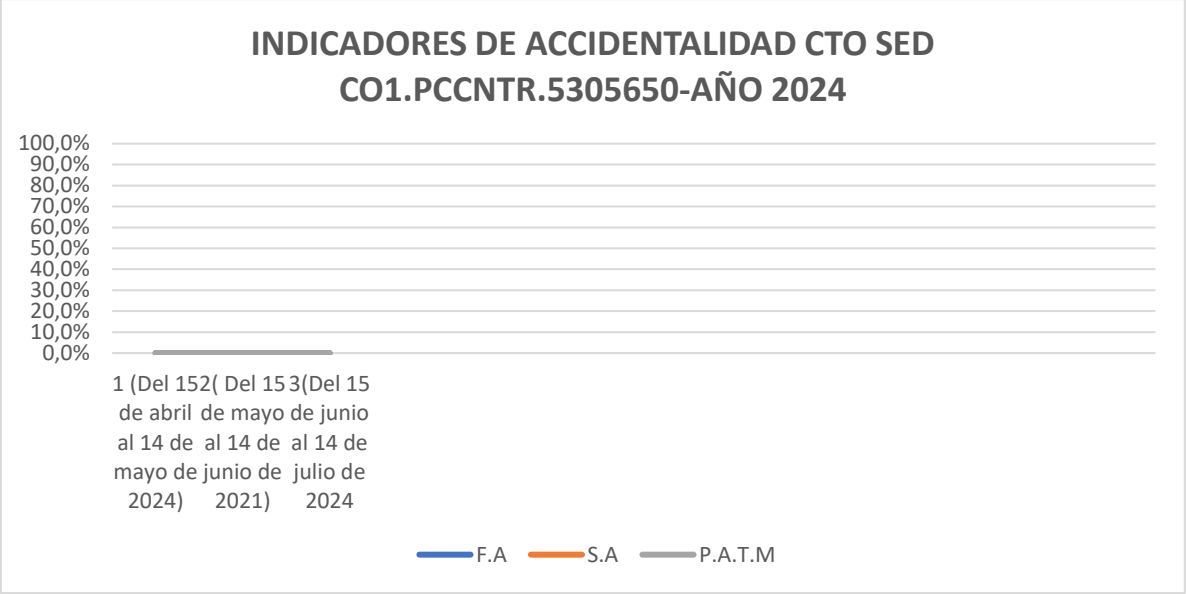


Gráfico 2. Seguimiento a indicadores de accidentalidad del Contratista

Frecuencia de accidentalidad: Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se presentaron 0 accidente de trabajo.

Severidad de accidentalidad: Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se perdieron 0 días por Accidente de Trabajo.

P.A.T.M: Este indicador no aplica para el periodo teniendo en cuenta que su medición se realiza anual.

4.3.4 PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACIÓN

- Inducciones

El Contratista realizó en este periodo la inducción general SST a los (12) trabajadores que ingresaron al proyecto de los cuales (1) presenta novedad de ingreso-retiro, dichos soportes son remitidos a la Interventoría para su respectiva revisión y adicionalmente se adjuntan dentro de la carpeta de anexos Contratista -Anexo 2- Documentación del personal.

- Capacitaciones

Respecto a las capacitaciones programadas para el periodo, el Contratista hace entrega de los soportes de ejecución de actividades de formación, de acuerdo con el Plan de Trabajo aprobado por esta Interventoría presentado dentro del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

En la tabla siguiente se relacionan las capacitaciones efectuadas por el Contratista durante el periodo:

Tabla 17. Capacitaciones y charlas realizada por el Contratista durante el periodo

CHARLAS		
TEMA	FECHA DE EJECUCION	CANTIDAD DE ASISTENTES
Trabajo en alturas de acuerdo a la normatividad vigente	17/06/2024	12
Rutas de evacuación y puntos de encuentro	25/06/2024	10
Importancia de mantener los cerramientos en buen estado	28/06/2024	13
Conformación brigadas de emergencia	29/06/2024	11
Importancia de estar siempre anclados a la hora de hacer trabajos en alturas	05/07/2024	17
Reporte de actos y condiciones inseguras	08/07/2024	23
Importancia de una buena salud oral	12/07/2024	19
CAPACITACIONES		
Brigada primeros auxilios básicos y conato de incendios	22/06/2024	11
Investigación de accidentes (Copasst)	03/07/2024	5
Integrantes CCL funciones y responsabilidades	10/07/2024	4

Los soportes se remiten dentro de la carpeta anexos Contratista- **Anexo 6 charlas y capacitaciones.**

4.3.5 PLAN DE EMERGENCIAS

El Contratista realiza durante el proceso de inducción la socialización del Plan de Emergencias a los trabajadores que ingresaron nuevos al proyecto (11) y (1) con novedad de ingreso-retiro, Así mismo tiene a disposición, el kit de emergencias, consistente en un botiquín dotado con los elementos necesarios para la prestación de los primeros auxilios, un extintor multipropósito y una camilla. También se encuentran publicados en las carteleras los teléfonos de emergencias y MEDEVAC del proyecto.

- **REGISTRO FOTOGRAFICO**

El Contratista hace entrega del registro fotográfico como evidencia de la gestión realizada por el durante el periodo en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo de las actividades derivadas de la ejecución del contrato de obra los soportes se remiten dentro de la **carpeta anexo Contratista- Anexo 8.**

4.4. ACTIVIDADES DE GESTIÓN SST DE INTERVENTORÍA

En este capítulo se describen todas las actividades relacionadas con el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo realizadas por la Interventoría durante el periodo del **15 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2024**, dando cumplimiento a las obligaciones contractuales adquiridas en el contrato de Interventoría No CO1.PCCNTR.5313249 y los lineamientos establecidos en los anexos del contrato.

- **PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA**

La Interventoría cuenta con el personal requerido en el anexo de personal del contrato, los cuales se encuentran aprobados por la Entidad y reportados en el Formato control de personal de este periodo, el cual se adjunta en el Anexo 1- de este informe.

Tabla 18. Relación de personal activo para el periodo Interventoría

TIPO DE PERSONAL	No. TRABAJADORES
NUEVO	1
ANTIGUO	12
RETIRADO	0
INGRESO – RETIRO	0
TOTAL:	**13**

- **AFILIACIONES Y PAGOS AL SGSSI DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA**

El Consorcio Colegios por Bogotá y sus empresas subcontratistas realizaron los pagos de aportes a Seguridad Social del personal de Interventoría reportado en el Formato control de personal de este periodo, así como los pagos de cotización a la ARL del personal de prestación de servicios. Estos pagos cumplen con los porcentajes de cotización establecidos en la ley y corresponden al periodo de cotización: (Pensión: junio 2024- Salud julio 2024).

- **CERTIFICADOS DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL**

La Interventoría entrega los certificados de pago de aportes parafiscales y de seguridad social firmados por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de las empresas vinculadas al contrato de Interventoría en el periodo y reportadas en el Formato control de personal de este periodo, así como el certificado de pago de aportes de cotización a la ARL del personal

que se encuentra vinculado por prestación de servicios de este mismo periodo. Los cuales se remiten dentro del **Anexo 3.**

- **PAGO DE SALARIOS/HONORARIOS/LIQUIDACIONES**

El CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA cumple con la obligación de pagar a los trabajadores vinculados por nómina en las fechas establecidas, el salario correspondiente al mes de ABRIL de 2024, no se incluye mayo teniendo en cuenta que los pagos son efectuados de manera mensual .Así mismo garantiza el pago de este salario al personal de los subcontratistas y cumple con los pagos de las facturas y cuentas de cobro del personal de prestación de servicios en los tiempos de pago acordados y de acuerdo a las condiciones pactadas en sus contratos. Dichos soportes se remiten dentro del **Anexo No.5.**

- **COPASST Y COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL**

El CONSORCIO CICLORUTAS SS se alinea al COPASST y al Comité de Convivencia Laboral de las empresas que hacen parte del Consorcio (SEG COLOMBIA, PEYCO y SERINCO), cumpliendo así con lo estipulado en los Decretos 1295 de 1994 y 1072 de 2015 y las Resoluciones 2013 de 1986, 1016 de 1989 y 652 de 2012. Los miembros de estos comités se encuentran capacitados en aspectos relacionados con: Funcionamiento y responsabilidades de acuerdo a la Resolución 2013 de 1986, Investigación de AT con base en la resolución 1401 de 2007, Marco legal de la Ley 1010 de 2006 y medidas de prevención de conductas de hostigamiento y/o acoso laboral.

COPASST: El día 25/06/2024 se llevó a cabo la reunión mensual del COPASST correspondiente al mes de abril de 2024, en dicha reunión se contó con representantes del empleador como de los trabajadores y se reportó sin novedad.

CCL: No aplica para el periodo teniendo en cuenta que se lleva a cabo de manera trimestral y la última reunión se reportó para el mes de abril de 2024. Teniendo en cuenta el corte del periodo del informe el soporte se adjuntará para el informe siguiente.

- **SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA**

En este subprograma se integran todas las acciones de Medicina Preventiva y del Trabajo como un conjunto de actividades dirigidas a la promoción y control de la salud de todos los trabajadores vinculados al proyecto. Teniendo como fin primordial garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de las personas, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psicofísicas y manteniéndolos en aptitud de producción laboral.

Exámenes ocupacionales

Exámenes de ingreso: Para este periodo se realizaron (1) examen médico ocupacionales de ingreso.

Exámenes periódicos: No se presentan evaluaciones médicas periódicas durante el periodo, teniendo en cuenta que a la fecha todo el personal cuenta con examen médico vigente.

Examen de retiro: Durante el periodo de reporte del informe no se presenta retiro de personal.

Actividades y campañas de promoción y prevención

Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Tabla 19. Actividades de promoción y prevención realizadas por Interventoría

TEMA	FECHA DE EJECUCIÓN	CANTIDAD DE ASISTENTES
Pausas activas	21/06/2024	1

Ausentismo Laboral

Tabla 20. Seguimiento ausentismo Interventoría

2024			
PERIODO	**INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL I.E.L.**	**PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL P.E.L.**	**AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA A.C.M**
1 (Del 15 de abril al 14 de mayo de 204)	0,00	0,00	0%
2(Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	0,00	0,00	0%
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024	0,00	0,00	0%

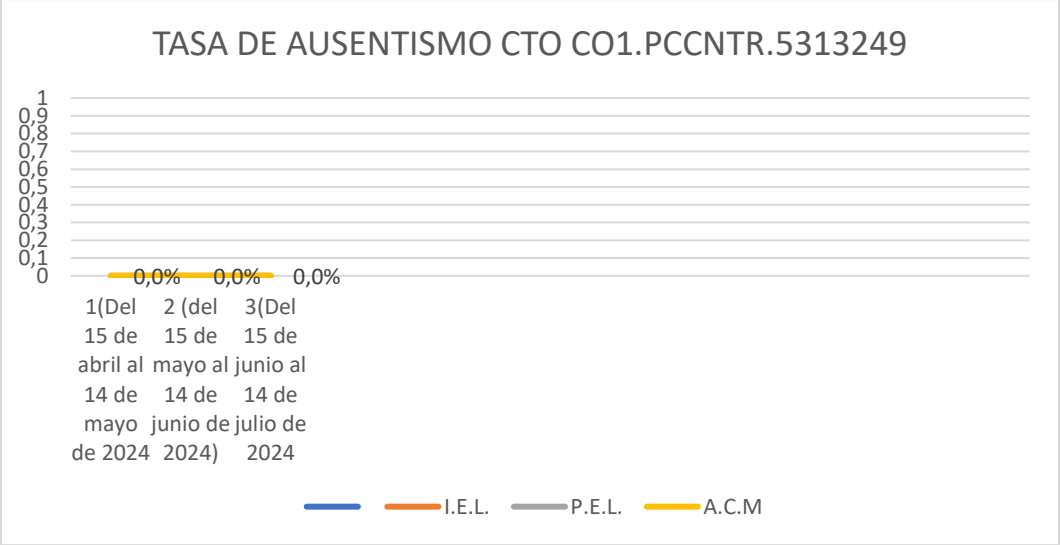


Gráfico 3. Seguimiento a tasas de ausentismo Interventoría

I.E.L: Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo del 15 de junio al 14 de julio del de 2024.

P.E.L: Por cada 100.000 trabajadores existen cero (0) casos de enfermedad laboral en el periodo del 15 de junio al 14 de julio del de 2024

Ausentismo por causa medica: En el mes se perdió 0%de días programados de trabajo por incapacidad médica.

- **SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL**

Dentro del subprograma de higiene industrial, el Consorcio Colegios por Bogotá busca identificar, evaluar y controlar los factores ambientales del sitio de trabajo que ocasionan perjuicio a la salud de los trabajadores vinculados al proyecto, buscando prevenir la generación de enfermedades laborales durante el desarrollo del contrato.

Unidades sanitarias

En las instalaciones de la oficina de la Interventoría ubicada en la Calle 24c #80B-19, se cuenta con (2) baños fijos, a los cuales se les realiza limpieza diariamente y se mantienen con los implementos de aseo necesarios para su utilización de acuerdo al número de trabajadores y su género.

Adicionalmente, en el campamento ubicado en el área de influencia del contrato de obra, , se cuenta con (2) baños fijos, (1) para uso de hombres y (1) para mujeres.

Suministro de hidratación

En las instalaciones de la oficina de la Interventoría se cuenta con (1) puntos de hidratación para el personal que permanece en ella, adicionalmente, se cuenta con (1) punto de hidratación para el personal operativo, dotados permanentemente de agua potable y de los elementos básicos para su consumo y disposición de los recipientes.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

El Subprograma de Seguridad Industrial contempla un conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, con el fin de evitar posibles lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte del trabajador.

Sustancias Químicas

Durante el periodo la Interventoría no empleó sustancias químicas utilizadas para el desarrollo de actividades.

Matriz de peligros

El CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA tiene establecida en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos para el contrato de Interventoría, la cual puede ser modificada cuando las condiciones del contrato así lo requieran.

Inspecciones planeadas

Durante el periodo no se llevaron a cabo inspecciones.

Entrega y reposición de elementos de protección personal

Durante el periodo se realiza la entrega de dotación y epp´s a (1) trabajador que ingreso durante el periodo, en cuanto a los demás trabajadores cuando se requiere se realiza la reposición de acuerdo con la Matriz de Elementos de Protección Personal establecida en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST del CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA, teniendo en cuenta el tipo de vinculación de la profesional que ingresa al contrato de Interventoría.

ACCIDENTALIDAD

En este periodo NO se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo con el personal que se encuentra vinculado al contrato de Interventoría, por lo que se mantiene el indicador de cero accidentes para el mes.

Indicadores de accidentalidad

A continuación, se presentan los principales indicadores de accidentalidad de la Interventoría de este periodo.

Tabla 21. Seguimiento a indicadores de accidentalidad de la Interventoría

2024			
PERIODO	**FRECUENCIA DE ACCIDENTALIAD F. A**	**SEVERIDAD DE LA ACCIDENTALIDAD S. A**	**PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES P.A.T.M**
1 (Del 15 de abril al 14 de mayo de 2024)	0,00	0,00	0,00%
2 (Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024	0,00	0,00	0,00%
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024)	0,00	0,00	0,00%

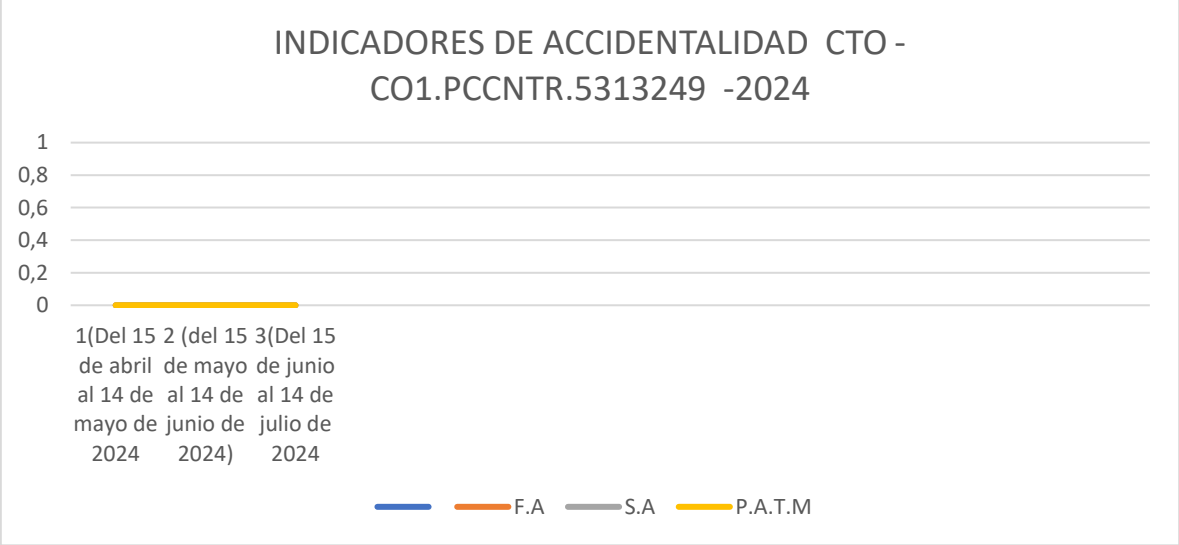


Gráfico 4. Seguimientos indicadores de accidentalidad de Interventoría

Frecuencia de accidentalidad: Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se presentaron 0 accidente de trabajo.

Severidad de accidentalidad: Por cada 100 trabajadores que laboraron en el periodo, se perdieron 0 días por Accidente de Trabajo.

P.A.T.M: Este indicador no aplica para el periodo teniendo en cuenta que su medición se realiza anual.

PROGRAMA DE INDUCCION Y CAPACITACIÓN Inducciones Interventoría

En este periodo se realizó el proceso de inducción al personal que ingresó durante el periodo, con base en el Programa de Inducción y Capacitación establecido por el

CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

Tabla 22. Inducciones realizadas durante el periodo Interventoría

PERIDO	N°INDUCCIONES REALIZADAS	CANT. PERSONAL INGRESADO
1(Del 15 de abril al 14 de mayo de 2024	12	12
2 (Del 15 de mayo al 14 de junio de 2024)	1	1
3(Del 15 de junio al 14 de julio de 2024)	1	1

Capacitaciones

Referente a las capacitaciones en la tabla siguiente se relacionan las actividades realizadas durante el periodo:

Tabla 23. Capacitaciones realizadas por la Interventoría durante el periodo

CAPACITACIONES/CAMPAÑAS		
TEMA	FECHA DE EJECUCION	CANTIDAD DE ASISTENTES
Brigadas de emergencia “camillaje”	20/06/2024	5
Promoción de higiene del sueño y/o descanso	24/06/2024	13

Los soportes se remiten dentro del **Anexo No. 6-PTA -**soportes.

PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo se llevó a cabo la actividad de la socialización del plan de emergencias, dentro de la inducción.

Teniendo en cuenta el plan de emergencias establecido por el CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST para el contrato de Interventoría, se mantiene en las instalaciones del Consorcio, un kit de emergencias, consistente en un botiquín de primeros auxilios, un extintor multipropósito de 15 Lb, una camilla y las carteleras con los teléfonos de emergencias publicados.

En Frentes de Obra, el personal de la Interventoría se adhiere al Plan de Emergencias establecido por el Contratista; mientras haya permanencia de personal de la Interventoría en los frentes de obra abiertos, se acatarán las instrucciones del personal de la Brigada de Emergencias del Contratista y las disposiciones del Plan de Emergencias propio del Contrato de Obra.

5. CONCLUSIONES

- El contratista de obra ha presentado atrasos en la ejecución del proyecto, para lo cual se tiene lo siguiente en los informes semanales:

Informe Semanal	Inicio	Fin	Atraso
10	17-06-24	23-06-24	-3,88%
11	23-06-24	29-06-24	-4.41%
12	30-06-24	07-07-24	-5.85%
13	08-07-24	13-07-24	-7.04%

Así las cosas, se puede ver que con corte al 13-07-24, se habían incrementado los atrasos en el proyecto.

- Con base, en los descrito anteriormente se tiene la siguiente trazabilidad que da cuenta de la oportuna gestión alertando al contratista de obra y la entidad por la baja ejecución de actividades.

✓ CCB-SED-2406-021 del 28-06-24, dirigido al contratista de obra mediante el cual se remitió el apremio 2 por la baja presencia de personal y atraso.
✓ CCB-SED-2407-002 del 04-07-24, dirigido al contratista de obra mediante el se remite el apremio 3, por el atraso en las obras superiores al 4,55% y se solicita reforzar el personal, adicionalmente se solicita presenta un plan de contingencia para recuperar los atrasos.
✓ CCB-SED-2407-006 del 10-07-24, dirigido a la entidad y mediante el cual se presento el informe y solicitud de inicio del proceso sancionatorio por presunto incumplimiento en el contrato de obra.
✓ CCB-SED2407-010 del 16-07-24, dirigido a la entidad y mediante el cual se informa del estado del contrato en cada uno de sus frentes de obra.

- Durante el periodo no se presentaron incidentes y/o accidentes de trabajo para el contrato de obra.

- En este periodo no se presentaron incidentes ni accidentes de trabajo para el contrato de Interventoría.
