	INFORME SEMANAL	**16**

OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.
INTERVENTOR	CONSORCIO COLEGIOS PORBOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO EDIFICACIONES DISTRITALES
CONTRATANTE	SECRETARIA DE EDUCACION

SEMANA N°	16	**DEL**	28 de julio de 2024	**AL**	3 de agosto de 2024

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato No .	No.5313249-23 del 8 de septiembre del 2023	**Contrato No .**	No. 5305650-23 del 18 de septiembre del 2023
Fecha de Iniciación	5/12/2023	**Fecha de Iniciación**	15/04/2024
Fecha de Terminación	4/09/2024	**Fecha de Terminación**	14/12/2024
Plazo Inicial	36 SEMANAS	**Plazo Inicial**	32 SEMANAS
Valor inicial	$ 504.777.262	**Valor inicial**	$ 6.322.397.994
Adiciones	0	**Adiciones**	0
Prorroga	N.A.	**Prorroga**	N.A.
Suspensión	N.A.	**Suspensión**	N.A.

2 CONTROL DE PROGRAMACIÓN GENERAL

EJECUCION ACUMULADA :

No.	FRENTE	SEMANA (ANTERIOR) *	PORCENTAJE EJECUTADO SEMANA	% TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (TÉCNICO)	% TOTAL PROYECTADO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO
9	GRUPO 7	4,73%	0,96%	5,69%	9,23%	-3,54%
10	GRUPO 7	5,69%	0,95%	6,64%	10,52%	-3,88%
11	GRUPO 7	6,64%	1,54%	8,18%	12,59%	-4,41%
12	GRUPO 7	8,18%	0,53%	8,71%	14,56%	-5,85%
13	GRUPO 7	8,71%	1,19%	9,90%	16,94%	-7,04%
14	GRUPO 7	9,90%	3,25%	13,15%	17,20%	-4,05%
15	GRUPO 7	13,15%	3,55%	16,70%	20,58%	-3,88%
16	GRUPO 7	16,70%	6,56%	23,26%	31,55%	-8,29%

2. 1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN SEMANAL

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES: | **ACTIVIDADES**

No.	FRENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE EJECUTADO EN LA SEMANA	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	% TOTAL ACUMULADO	ALCANCE PROPUESTO	ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1	Integrado de Fontibón - Sede E Versalles	53,43%	35,49%	-17,94%	53,43%	1. Cambio PISO PATIO tipo chip por el mismo o el que designe la SED. 2. Enchape de paredes perimetrales al patio de entrada. 3. Instalación de cubierta cumpliendo con la misma área de la cubierta existente (Teja Traslucida). 4. Cambio de cubierta de asbesto cemento sobre los baños de niños y niñas. 5. Cambio de cubierta de salones del segundo piso. 6. Instalación de un tanque de 500 litros y estructura (Revisar Capacidad Estructural).	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. La SED, Contratista e Interventoría realizarón el 6 de junio del 2024 una visita a este colegio con el fin de verificar la propuesta estructural entregada por el Contratista de Obra, en lo que corresponde a la estructura de la cubierta y la placa base para la instalación de los tanques.
2	Villemar el Carmen - Sede A	6,21%	8,02%	1,81%	6,21%	1.- Reparar las FILTARCIONES en patio acceso colegio (levantar adoquín e impermeabilizar) 2.- Manejo de AGUAS LLUVIAS con nuevo CÁRCAMO con reja transversal, ver desagüe a tuberías sótano de 6" o al cárcamo patio de abajo. 3.- Manejo de AGUAS LLUVIAS lateral patio y escaleras hacia abajo 4.- Limpieza de GRAFFITIS primer piso en todo alrededor de la fachada del colegio. 5.-NO CAMBIAR PIEZAS (están en garantía	Durante esta semana no se desarrollaron actividades en este colegio	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
3	DILE Fontibón	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. Cambio de Cielo Raso y puertas. 2. Suministro e instalaciòn de tanque de agua. 3. Se revisara por parte de la SED, una plataforma o ascensor para personal en condiciòn de discapacidad.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Construcciòn de cerramiento en malla, de los equipos de aire acondicionado externos.	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Mantenimiento de CUBIERTAS 2.- Mantenimiento de JUNTAS edificios (queden como las del fondo) 3.- Impermeabilización de Terrazas 4.- Cambio de piezas de GRES rotas 5.- Refuerzo ventanas aulas 304 y 305	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
6	Gabriel Betancourt Mejía	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Proteger las aberturas de LLUVIAS LATERALES, VENTANAL (ver las ubicaciones de los ventanales y puertas en las fotos) 2.- Nueva PÉRGOLA en la zona de acceso mercancía 3.- Tapar con policarbonato el "agujero" rotonda 4.- Poner techo/cubierta en la abertura al lado del "agujero" rotonda 5.- Pérgola en la escalera exterior subida a azotea	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.

7	KENNEDY SEDE A	91,61%	78,20%	-13,41%	91,61%	1-Impermeabilización de terraza en el coliseo (Ovalo) y la L del corredor de Ingreso a la institución costado oriental 2-Impermeabilización de patio Central. 3-Pintura en cuarto de maquinas	Pendientado de terraza Contrución de cañuelas subre la cubierta e instalación de adoquin existente en la cancha.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, el rector del colegio manifesto que ya estaban los planos del colegio, pero que el contratista no habia pasado a recogerlos. Por otra parte no se evidencio personal del contratista trabajando en este mismo dia.
8	LA AMISTAD SEDE A	59,56%	68,62%	9,06%	59,56%	1-Construcción de auala modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2-Instalación de acometida trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ML 3-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Construcción e instalación de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades Durante la semana el contratista adelanto actividades de demolición de las placas existentes, viga perimetral y dados en concreto ciclopeo. Como tambien adelanto actividades de excavación para construcción de zapatas perimetrales. En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavación. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervención y terminado final de la zona de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
9	SAN RAFAEL SEDE A	20,84%	22,85%	2,01%	20,84%	1-Mejoramiento de pisos exteriores en patio central, parque y zona aledaña a gradas de canchas, tienda escolar y espacio contenedores de basura 2-Mejoramiento de pergola en policarbonato en el area de piscina y/o agora 3-Mejoramiento de piso con gramilla sintetica en primera infancia	Instalación de rajon y subbase en parque y zonas aledañas a las gradas.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fue modificado, por la SED, parte del alcance de intervenciòn de este colegio, lo anterior debido a que, ya no se van a realizar actividades de endurecimiento de zonas verdes. Por lo que el Contratista de Obra se encuentra a la espera de la definición e implantación para poder realizar actividades sobre estas zonas. En cuanto a las demas activiades, estas no sufrieron ningun tipo de modificaciòn, como por ejemplo el mantenimiento y campio de parte de la pergola en policarbonato.
10	La Amistad - PINAR DEL RIO SEDE C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.-Construcción de aula modular metalica para comedro escolar, incluye iluminación, toma corrientes para hornos microondas. 2.-Instalación de acometidas trifasica hasta el comedor escolar aproximadamente 135ml 3.-Demolición de piso en tableta gres, instalación de antepisos y piso tipo alfa trafico pesado	Sin ejecución de actividades durante esta semana.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoria en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
11	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	28,76%	33,19%	4,43%	28,76%	1. - Mejoramiento de cubierta en bloque de ciencias, incluye iluminación. 2. - Mantenimiento de muros en el mismo bloque de ciencias. 3.- El inicio de obra sera el día 06-05-2024.	Desmonte de cubierta y construcción e instalación de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades
12	El Japón	89,09%	72,99%	-16,10%	89,09%	1.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y	Construcción y montaje	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia e

12	El Japón	89,09%	72,89%	-16,19%	89,09%	toma corrientes para microondas. 2.- Se requiere reubicacion del bicicletero	de estructura metalica.	En recorrido realizado por la Interventoría e pasado 14 de mayo, se evidencio la presencia de cuatro trabajadores realizando actividades de excavaciòn. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
13	Tom Adams	50,60%	31,20%	-19,40%	50,60%	1.- Terminación de cerramiento metalico faltante. 2.-Losa de contrapiso exclusivamente en las franjas faltantes (Terreno natural) para aula modular. La Placa existente permance. 3.- Construcción de aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas. 4.- Construcción de muro en mamposteria en cerramiento perimetral.	Contrucción de muro perimetral en manposteria.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
14	KENNEDY ANTONIA SANTOS SEDE B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1. - Mejoramiento integralde 2 baterias de baños 2 - Cambio de cubiertas en los baños 3 - Cambio de Piso patio frente baños con manejo de aguas lluvias, 4-Cambio de pisos en 7 aulas 5-Cambio de carpinteria metalica (Puertas y ventanas) Proteger ventanas si existe riesgo de balonzos	No se han iniciado actividades	El 19 de julio del 2024 se definio el inicio de las actividades en este colegio de acuerdo al recorrido realizado el 14 de mayo, entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
15	Paulo VI SEDE A	3,19%	3,09%	-0,10%	3,19%	Bloque tipo ALIANZA 1.- Escarificar muros y repintar 2.- Cambio y reubicación de las PUERTAS (alineadas pizarras) y apertura hacia adentro. 3.- Cambio de CUBIERTA 4.- Cambio de PISOS 5.- Cambio de VENTANAS 6.- Canaletas de red electica 7.- Iluminación e Interruptores 8.- Tomacorrientes (3 por aula o 4 si hay video beam) 9.- Gestión de aguas de la cubierta 10.- Viga de concreto perimetral + transversales 11.- Crear ventilación cruzada abriendo los huecos entre pasillo y aulas	Demolición y pañeta de muros existentes.	El 5 de julio del 2024, fue realizado el recorrido entre las partes, SED, Contratista e Interventoría, en el cual se definieron los alcances y se firmo el acta de socialización con el representante del colegio.
16	SAN PEDRO CLAVER SEDE A	85,76%	38,63%	-47,13%	85,76%	1. - Mejoramiento de losa de contrapiso para cocina movil, incluye cajas de inspección, puntos hidrosanitarios, puntos electricos, acometida trifasica desde el tablero principal. 2-Mejoramiento de pisos exteriores para aula modular metalica para comedor escolar, incluye iluminación y toma corrientes para hornos microondas	Construcción y montaje de estructura metalica.	Según el acta de socialización suscrita con el rector, el contratista y la Interventoria, se debian iniciar actividades el pasado 6 de mayo de 2024. Este Colegio se encuentra dentro de la lista de priorizados en la primera fase del proyecto. Esta pendiente el envio por parte del contratista del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades En recorrido realizado por la Interventoia el pasado 14 de mayo, no se evidencio personal de contratista trabajando. Por otra parte de acuerdo a la reuniòn realizada el 15 de mayo, en la SED, con participaciòn de la SED, Contratista de Obra e Interventoria, fueron definidos los esquemas basicos de intervenciòn y terminado final de las zonas de alimentaciòn y cocinas. Lo anterior remitido al grupo de Whatsapp en formato PDF y DWG.
17	DILE Kennedy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.- Cambio de CUBIERTA asbesto-cemento sin falso techo clases y oficinas. 1r piso 2.- Estudio desagüe aguas 3.- Iluminación 4.- Interruptores y Toma Corrientes en redes segregadas	No se han iniciado actividades	El 24 de julio del 2024 fue realizada la visita y el acta de socializacion, para definir detallandamente el alcacne del proyecto. Esta pendiente el evnio por parte del contratista de obra del presupuesto ajustado y el cronograma de actividades.


NOTA. Es importante tener en cuenta que la informaciónrespecto a lo programado y ejecutado, es variable y sera actualizada, periodicamente, con los ajustes al presupuesto y cronograma entregados por el contratista de obra, lo anterior debido a las modificaciones y ajustes a los alcances de intervención de cada colegio.

BALANCE DE OBRA EJECUTADA	VR.TOTAL DEL CONTRATO INCIAL INCLUIDO AIU	VR. TOTAL EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	PORCENTAJE POR EJECUTAR
	$ 6.322.397.994	$ 996.979.974,00	$ 5.325.418.020	81,28%
MODIFICATORIO.	$ -	$ -	$ -	$ -

3.1. VALOR DE LAS ACTAS			
Descricion de las actas		Valor acta	Saldo del contrato
Acta de corte N°1.	Comprende el periodo del 15 de abril al 14 de mayo del 2024	$ 61.303.102,00	$ 6.261.094.892
Acta de corte N°2.	Comprende el periodo del 15 de mayo al 14 de junio del 2024	$ 358.335.384,00	$ 5.902.759.508
Acta de corte N°3.	Comprende el periodo del 15 de junio al 14 de julio del 2024	577.341.488,00	$ 5.325.418.020
Acta de corte N°4.			
Acta de corte N°5.			
Acta de corte N°6.			
Acta de corte N°7.			
Acta de corte N°8.			
	TOTAL FACTURADO A LA FECHA Y PORCENTAJE EJECUCION MAS MODIFICATORIO	$ 996.979.974	15,77%

4. PERSONAL EN LA OBRA			
PERSONAL INTERVENTORIA	CANTIDAD	PERSONAL CONTRATISTA	CANTIDAD
OFICIALES	0	OFICIALES	9
AYUDANTES	0	AYUDANTES	19
ALMACENISTA	0	ALMACENISTA	1
MUJERES NO CALIFICADAS	0	MUJERES NO CALIFICADAS	0
INSPECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA	2	INSPECTOR DE OBRA	3
INGENIERO RESIDENTE OBRA E INTERVENTORIA	2	INGENIERO RESIDENTE	2
DIRECTOR DE OBRA O INTERVENTORIA	1	DIRECTOR DE OBRA	1
ASESOR SST	1	ASESOR SST	1
AUXILIAR SST	1	AUXILIAR SST	1
ASESOR AMBIENTAL	1	ASESOR AMBIENTAL	1

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)

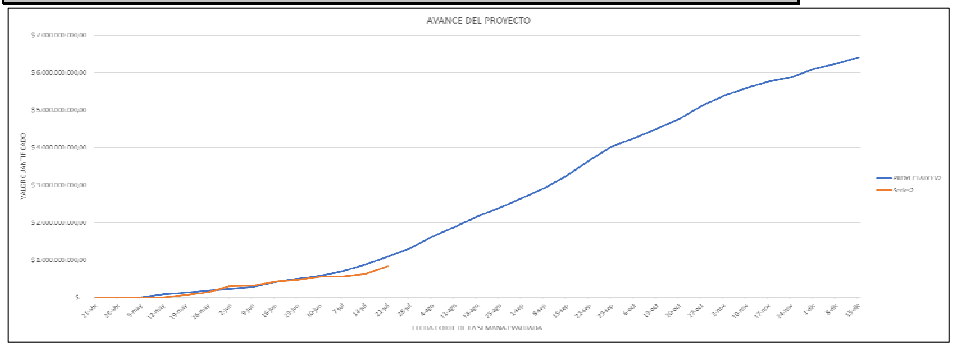

BALANCE DEL CONTRATO				
No.	COLEGIO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO V2	DIFERENCIA
1	Integrado de Fontibón	$ 109.963.240,00	$ 199.272.460,89	$ -89.309.220,89
2	Villemar el Carmen	$ 130.265.276,00	$ 140.705.181,13	$ -10.439.905,13
3	DILE Fontibón	$ 83.662.772,00	$ 112.598.025,34	$ -28.935.253,34
4	Fábrica de Tizas - OTIC Data Center	$ 12.621.176,00	$ 12.705.194,82	$ -84.018,82
5	INEM Francisco de Paula Santander Sede B	$ 257.631.233,00	$ 20.931.326,70	$ 236.699.906,30
6	Gabriel Betancourt Mejía	$ 137.470.832,00	$ 138.973.186,13	$ -1.502.354,13
7	Kennedy Sede A	$ 282.844.409,94	$ 168.966.452,81	$ 113.877.957,13
8	La Amistad Sede A	$ 291.400.787,00	$ 132.860.767,71	$ 158.540.019,29
9	San Rafael - Sede A	$ 419.806.996,00	$ 568.362.073,60	$ -148.555.077,60
10	Paulo VI	$ 1.070.438.856,10	$ 860.241.316,16	$ 210.197.539,94
11	La Amistad Pinar del Rio	$ 237.789.266,00	$ 124.683.607,70	$ 113.105.658,30
12	INEM Francisco de Paula Santander Sede A	$ 932.915.494,00	$ 1.287.054.496,80	$ -354.139.002,80
13	El Japón	$ 341.508.416,36	$ 201.222.498,75	$ 140.285.917,61
14	Tom Adams	$ 323.933.646,00	$ 141.147.610,90	$ 182.786.035,10
15	Kennedy ANTONIA SANTOS SEDE B	$ 412.697.198,60	$ 375.814.029,97	$ 36.883.168,63
16	San Pedro Claver	$ 608.667.636,00	$ 775.815.363,32	$ -167.147.727,32
17	DILE Kennedy	$ 394.884.590,00	$ 349.194.251,16	$ 45.690.338,84
	Emergencias	$ 373.896.169,00	$ 373.896.169,00	$ -
	TOTAL	**$ 6.422.397.994,00**	**$ 5.984.444.012,89**	**$ 437.953.981,11**

PROGRAMACION SEMANAL

PRESUPUESTO ASIGNADO													
No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
1	**Integrado de Fontibón**	E	Versalles			$ 199.272.461	KR 108 #22-34						En intervención
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	190,4			$ 5.697,00	$ 844.986,21	$ 1.084.708,80	0,54%	190,40	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	198,42			$ 33.321,00	$ 5.150.387,80	$ 6.611.552,82	3,32%	198,42	
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	107,49			$ 25.899,00	$ 2.168.640,27	$ 2.783.883,51	1,40%	107,49	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE ANTICORROSIVO Y ESMALTE (APLICA PARA TODO TIPO DE ESTRUCTURA)			KG	328,38			$ 19.300,00	$ 4.937.083,43	$ 6.337.734,00	3,18%	328,38	
	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE EN LA TOTALIDAD DEL ELEMENTO ESTRUCTURAL (CERCHAS, VIGAS, COLUMNAS Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA, ENTRE OTROS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	240,6			$ 12.004,00	$ 2.249.873,33	$ 2.888.162,40	1,45%	240,60	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE EN POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm. y 40 mm. PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. SE PAGARA SEGÚN LOS METROS CUADRADOS REALMENTE INSTALADOS).			M2	172,87			$ 231.879,00	$ 31.226.082,99	$ 40.084.922,73	20,12%	172,87	
2	**Villemar el Carmen**	A	Villemar El Carmen			$ 140.705.181	CL 20D #96G-51						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
3	**DILE Fontibón**	N/A				$ 112.598.025	CL 25B #88-55						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
4	**Fábrica de Tizas - OTIC Data Center**	N/A				$ 12.705.195	CL 17 # 68-83						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
5	**INEM Francisco de Paula Santander**	B	Casablanca			$ 20.931.327	KR 79N #35A-09 sur						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
6	**Gabriel Betancourt Mejía**	C	Villa Mejia Tagaste			$ 138.973.186	CL 11a # 88a-27						Sin intervención
								0	0	0	0	0	
7	**Kennedy**	B	Antonia Santos II			$ 375.814.030	CL 25 sur #69c-34						En intervención
								0	0	0	0	0	
8	**La Amistad**	C	Pinar Del Rio			$ 124.683.608	KR 83 #40bis-36 sur						En intervención
								0	0	0	0	0	
9	**San Rafael**	A	San Rafael			$ 568.362.074	TV 78I #42B-81 sur						En intervención
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	583,37			$ 5.697,00	$ 2.588.968,52	$ 3.323.458,89	0,46%	583,37	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	40,80			$ 31.660,00	$ 1.006.253,80	$ 1.291.728,00	0,18%	40,80	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	97,13			$ 33.321,00	$ 2.521.203,34	$ 3.236.468,73	0,44%	97,13	
	MANTENIMIENTOS												
	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO METÁLICO EXISTENTE. (INCLUYE SOLDADURAS Y REPOSICIÓN DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO; NO INCLUYE PINTURA)			M2	8,80			$ 34.827,00	$ 238.745,50	$ 306.477,60	0,04%	8,80	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)			M2	97,13			$ 193.088,00	$ 14.609.828,96	$ 18.754.637,44	2,57%	97,13	
	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA			M2	97,13			$ 4.613,00	$ 349.038,47	$ 448.060,69	0,06%	97,13	
10	**Paulo VI**	**A**	**Paulo VI**			**$ 860.241.316**	**KR 78N #41-17/21 sur**						**En intervención**
										0			
11	**La Amistad**	**A**	**La Amistad**			**$ 132.860.768**	**KR 78 #35-30 sur**						**En intervención**
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	0,00			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	100,05			$ 5.697,00	$ 444.017,18	$ 569.984,85	0,33%	100,05	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	30,06			$ 31.660,00	$ 741.372,28	$ 951.699,60	0,56%	30,06	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M3	3,55			$ 306.480,00	$ 847.553,17	$ 1.088.004,00	0,64%	3,55	
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	100,05			$ 33.499,00	$ 2.610.870,88	$ 3.351.574,95	1,97%	100,05	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	7,06			$ 28.198,00	$ 155.081,31	$ 199.077,88	0,12%	7,06	
	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	6,00			$ 138.026,00	$ 645.132,04	$ 828.156,00	0,49%	6,00	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	48,29			$ 68.329,00	$ 2.570.388,26	$ 3.299.607,41	1,93%	48,29	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	15,01			$ 193.254,00	$ 2.259.673,24	$ 2.900.742,54	1,70%	15,01	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	23,28			$ 212.676,00	$ 3.856.895,91	$ 4.951.097,28	2,90%	23,28	
	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CAL. 10, HUECO DE 2"X 2"			M2	7,06			$ 118.295,00	$ 650.590,25	$ 835.162,70	0,49%	7,06	
12	**INEM Francisco de Paula Santander**	**A**	**Inem Francisco De Paula**			**$ 20.931.327**	**CL 38C sur # 79-08**						**En intervención**
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	2.150,00			$ 5.697,00	$ 9.541.598,50	$ 12.248.550,00	45,59%	2.150,00	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	211,90			$ 31.660,00	$ 5.226.107,35	$ 6.708.754,00	24,97%	211,90	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES HASTA 4 M DE CABLEADO (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO Y APARATOS)			UN	181,00			$ 10.034,00	$ 1.414.780,71	$ 1.816.154,00	6,76%	181,00	
	DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO			UN	12,00			$ 81.832,00	$ 764.963,78	$ 981.984,00	3,65%	12,00	
	DESMONTE DE RED ELECTRICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS AUTORIZADOS)			M	168,00			$ 6.053,00	$ 792.166,39	$ 1.016.904,00	3,78%	168,00	
13	**El Japón**	**A**	**El Japon**			**$ 201.222.499**	**KR 78G #38C-11 sur**						**En intervención**
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	218,92			$ 5.697,00	$ 971.556,63	$ 1.247.187,24	0,48%	218,92	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	57,70			$ 31.660,00	$ 1.423.059,90	$ 1.826.782,00	0,71%	57,70	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS										0,00%		
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	240,44			$ 66.647,00	$ 12.483.138,33	$ 16.024.604,68	6,20%	240,44	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 CM a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	240,44			$ 33.499,00	$ 6.274.440,73	$ 8.054.499,56	3,12%	240,44	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	71,16			$ 80.080,00	$ 4.439.115,68	$ 5.698.492,80	2,21%	71,16	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	32,84			$ 193.254,00	$ 4.943.882,03	$ 6.346.461,36	2,46%	32,84	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	32,84			$ 212.676,00	$ 5.440.741,48	$ 6.984.279,84	2,70%	32,84	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	218,92			$ 102.814,00	$ 17.533.723,52	$ 22.508.040,88	8,71%	218,92	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2.96 kg/m2)			M2	256,14			$ 22.800,00	$ 4.549.343,30	$ 5.839.992,00	2,26%	256,14	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	21,89			$ 59.753,00	$ 1.018.924,34	$ 1.307.993,17	0,51%	21,89	
14	**Tom Adams**	**A**	**Tom Adams**			**$ 141.147.611**	**CL 40J sur #78-08**						**En intervención**
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	153,53			$ 5.697,00	$ 681.358,89	$ 874.660,41	0,48%	153,53	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	28,40			$ 31.660,00	$ 700.431,57	$ 899.144,00	0,50%	28,40	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M3	1,51			$ 306.480,00	$ 360.508,53	$ 462.784,80	0,26%	1,51	
	DEMOLICIÓN COLUMNA EXISTENTE EN CONCRETO DE DIMENSIONES DE 30 X 30 X 3 M HASTA 3.40 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS Y ANDAMIOS CERTIFICADOS)			M	7,27			$ 98.488,00	$ 557.768,76	$ 716.007,76	0,40%	7,27	
	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	13,62			$ 28.198,00	$ 299.179,53	$ 384.056,76	0,21%	13,62	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	0,90			$ 13.736,00	$ 9.630,29	$ 12.362,40	0,01%	0,90	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	41,33			$ 80.080,00	$ 2.578.255,36	$ 3.309.706,40	1,83%	41,33	
	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CAL. 10, HUECO DE 2"X 2"			M2	7,89			$ 118.295,00	$ 727.076,07	$ 933.347,55	0,52%	7,89	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	CORTE DE RAICES ARBOL A NIVEL DE EMPRADIZACION			UN	1,00			$ 429.805,00	$ 334.817,32	$ 429.805,00	0,24%	1,00	
15	**Kennedy**	**A**	**Kennedy**			**$ 168.966.453**	**CL 5 sur #72a-69**						**Sin intervención**
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	491,00			$ 5.697,00	$ 2.179.034,82	$ 2.797.227,00	1,29%	491,00	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	104,00			$ 31.660,00	$ 2.564.960,66	$ 3.292.640,00	1,52%	104,00	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICION DE ALISTADO DE PISO E = 0.04 A 0.06 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	116,02			$ 24.468,00	$ 2.211.402,48	$ 2.838.777,36	1,31%	116,02	

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	608,87			$ 14.193,00	$ 6.731.862,51	$ 8.641.691,91	3,98%	608,87	
	DESMONTE DE ADOQUIN EN CONCRETO MACIZO 10 ANCHO X20 LARGO X 4.5 ALTO CM COLOR OCRE INCLUYE DEMOLICION DE CINTAS Y TRASIEGO DE MATERIAL			M2	58,01			$ 25.811,00	$ 1.166.390,99	$ 1.497.296,11	0,69%	58,01	
	VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	LIMPIEZA DE PLACA BASE MEJORAMIENTO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	58,01			$ 7.470,00	$ 337.566,95	$ 433.334,70	0,20%	58,01	
	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM			M2	58,01			$ 294.039,00	$ 13.287.530,10	$ 17.057.202,39	7,86%	58,01	
16	**San Pedro Claver**	**A**	**San Pedro Claver**			**$ 775.815.363**	**KR 79C #41B-51 sur**						**En intervención**
	PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	OBRAS PRELIMINARES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	REPLANTEO			M2	-			$ 3.603,00	$ -	$ -	0,00%	-	
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO TOPOGRÁFICO			M2	545,80			$ 5.697,00	$ 2.422.234,63	$ 3.109.422,60	0,31%	545,80	
	CERRAMIENTO EN LONA CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO (AMARRE EN ALAMBRE H = 2.0 M)			M	90,20			$ 31.660,00	$ 2.224.610,11	$ 2.855.732,00	0,29%	90,20	
	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
	DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	61,22			$ 66.647,00	$ 3.178.413,45	$ 4.080.129,34	0,41%	61,22	
	DEMOLICION Y/O DESMONTE DE CERRAMIENTO EXISTENTE COMPUESTO POR MALLA ESLABONADA, ANTEPECHO EN LADRILLO, VIGA DE CIMENTACION Y COLUMNETA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO, PARAL GALVANIZADO Y CONCERTINA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M2	11,09			$ 89.974,00	$ 777.293,50	$ 997.811,66	0,10%	11,09	
	ESTRUCTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIONES Y RELLENOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	12,10			$ 80.080,00	$ 754.824,34	$ 968.968,00	0,10%	12,10	
	EXCAVACIÓN MECÁNICA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M3	273,80			$ 68.329,00	$ 14.573.872,56	$ 18.708.480,20	1,88%	273,80	
	EXCAVACIONES EN ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ANCHO<= 1.00 M PROFUNDIDAD <= 1.20 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)			M	33,10			$ 51.806,00	$ 1.335.809,46	$ 1.714.778,60	0,17%	33,10	
	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	78,75			$ 193.254,00	$ 11.855.380,93	$ 15.218.752,50	1,53%	78,75	
	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) CON RECICLADO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)			M3	78,75			$ 212.676,00	$ 13.046.845,06	$ 16.748.235,00	1,68%	78,75	
	CONCRETOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	ZAPATA EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO. NO INCLUYE ACERO)			M3	3,46			$ 908.627,00	$ 2.449.053,07	$ 3.143.849,42	0,32%	3,46	
	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)			M	105,60			$ 141.097,00	$ 11.606.951,16	$ 14.899.843,20	1,50%	105,60	
	PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION			M2	545,80			$ 102.814,00	$ 43.714.170,91	$ 56.115.881,20	5,63%	545,80	
	REFUERZOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI			KG	1.499,37			$ 6.691,00	$ 7.815.131,78	$ 10.032.284,67	1,01%	1.499,37	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6MM (2.96 kg/m2)			M2	638,59			$ 22.800,00	$ 11.342.098,62	$ 14.559.852,00	1,46%	638,59	
	ESTRUCTURA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA MAQUINADA DE 400 X 250 X 5 mm, (INCLUYEN CORTES, PERFORACIONES Y 4 ANCLAJES MECANICOS DE 5/8"x3-1/2") - INCLUYEN CARTELAS DE SOPORTE			UN	18,00			$ 207.295,00	$ 2.906.683,80	$ 3.731.310,00	0,37%	18,00	
	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M			M2	11,52			$ 36.233,00	$ 325.157,09	$ 417.404,16	0,04%	11,52	
	EQUIPOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
	SERVICIO DE AUTOBOMBA PARA CONCRETO			M3	50,51			$ 59.753,00	$ 2.351.113,21	$ 3.018.124,03	0,30%	50,51	
17	**DILE Kennedy**	**N/A**				**$ 349.194.251**	**KR 78j #39 sur (esquina)**						**Sin intervención**

No	COLEGIO	SEDE	NOMBRE DE SEDE	UND	CANTIDAD	VR Estimado SED	Dirección	V/PARCIAL	V/TOTAL	V/TOTAL CON AIU	%	SUMATORIA CANTIDADES	ESTADO GENERAL DE LA OBRA
										0			
Total						$ 4.344.424.674			$ 326.897.628,32	$ 419.638.485,48			

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

En las actividades de ejecuciòn comprendido entre el periodo del 28 de julio al 3 de agosto del 2024, se presenta un retraso acumulado del -8,29%, entre ejecutado vs programado, aumentando en un -3,91%, respecto a lo reportado en la semana anterior. Se acalara que la fecha del contrato termina el 14 de diciembre.

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.

a). El dia 15 de abril se suscribio el acta de inicio del contrato de obra

b). I.E.D. KENNEDY. Respecto a la zona de la cubierta se continuan con las actividades de construcción de cañuelas y pendientado de la placa. Es importante resaltar que los trabajos han sido intermitentes, lo anterior debido a que algunos dias no se conto con personal sobre este frente.

c). EN JARDIN INFANTILINTEGRADO DE FONTIBÓN SEDE E. El Contratista durante esta semana no ejecuto actividades sobre este colegio.

d). I.E.D. INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SEDE A. El Contratista de obra continua con el desmonte de cubierta, contrución e instalación de la estructura metalica e instalación de cubierta.
Por otra parte se continua con las actividades de la demolición de piso, excavaciones e instalación de tuberia para la artención de la emergencia.

e). I E.D SAN RAFAEL. El Contratista de obra continua con las actividades de instalación de material de rajon, subbase y base sobre algunas zonas.

f). I E.D EL JAPON. El Contratista continua con las actividades de instalación de estrutura metalica e instalación de cubierta de la zona de alimentación.

g). I E.D LA AMISTAD. Continua con la construcción e instalación de estra estructura e inicio con la actividad de instalación de cubierta.

h). I E.D TOM ADAMS. El Contratista continua con las actividades de construcción del muro perimetral y fundida de columnas para confinamiento del muro.

j). I E.D SAN PEDRO CLAVER. El Contratista continua con las actividades de construcción e instalación de la estructura metalica, para la cocina movil y la zona de alimentación. Tambien se encuentra realizando actividades de intalación de tuberia potable y desagues, adicionalmente se fundio la sobreplaca de la zona de la cocina.

k). PABLO VI. El Contratista de obra continua con actividades de demolición y picado de muros existentes, tambien con la actividad de demolición de pisos, adicionalmente esta realizando actividades de pañete de muros y excavaciones para instalación de tuberia.

l). VILLEMAR EL CARMEN SEDE A. El Contratista durante esta semana no ejecuto actividades sobre este colegio.

m). COLEGIO PINAR DEL RIO SEDE C. El Contratista durante esta semana no ejecuto actividades sobre este colegio.

n). COLEGIO GABRIE BETANCOURTH. El Contratista durante esta semana no ejecuto actividades sobre este colegio.

o). El día miercoles 24 de julio del 2024, se realizo la visia, con participación de la SED, Contratista e Interventoría, a los colegios que se encontraban pendientes por priorización del alcance, lo anterior de acuerdo a la siguiente relación:

1. Colegio DILE de Kennedy.
2. Colegio Antonio Santos Sede B.
3. Colegio DILE de Fontibon.
4. OTIC.

p). COLEGIO ANTONIO SANTOS SEDE B. Se informa que este colegio, de acuerdo a lo acordado ente la SED, Contratista e Interventoría, inicia actividades el proximo 12 de agosto del 2024.

2. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO.

a). **PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN DE OBRA.** El Contratista de Obra entrego el Presupuesto y Programación el 10 y 11 de julio del 2024, respectivamente, lo anterior de acuerdo a la mesa de trabajo realizada el 5 de julio del 2024. Los anteriores documentos fueron revisados por parte de la Interventoría y se remitiron las observaciones al Contratista. Respecto a lo acordado se realizara mesa de trabajo para el proximo miercoles 31 de julio con el fin de corregir las observaciones y dar aprobación de estos documentos.


b). Respecto a el avance de obra, se evidencia que el Contratista tiene un atraso del -8.29%, entre lo programado y ejecutado.

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA


Durante la semana fueron desarrolladas actividades de excavaciones, rellenos, demoliciones de muros, pañeta de muros, contrución e instalación de estructura metalica, instalación de cubierta, entre otras.

DIAGRAMAS CIRCULARES


COLEGIO INTEGRADO DE FONTIBON - SEDE E VERSALLES				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	6,98%	0%	-6,98%	31,15%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	28,36%	2%	-26,61%	31,15%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	46,53%	0%	-46,53%	31,15%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	52,26%	20,21%	-32,05%	31,15%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	54,24%	40,68%	-13,56%	31,15%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	61,07%	40,68%	-20,39%	31,15%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	78,75%	31,15%	-47,60%	31,15%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	85,33%	31,15%	-54,18%	31,15%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	45,56%	34,25%	-11,31%	31,15%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	50,27%	35,76%	-14,51%	35,76%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	53,43%	35,76%	-17,67%	35,76%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

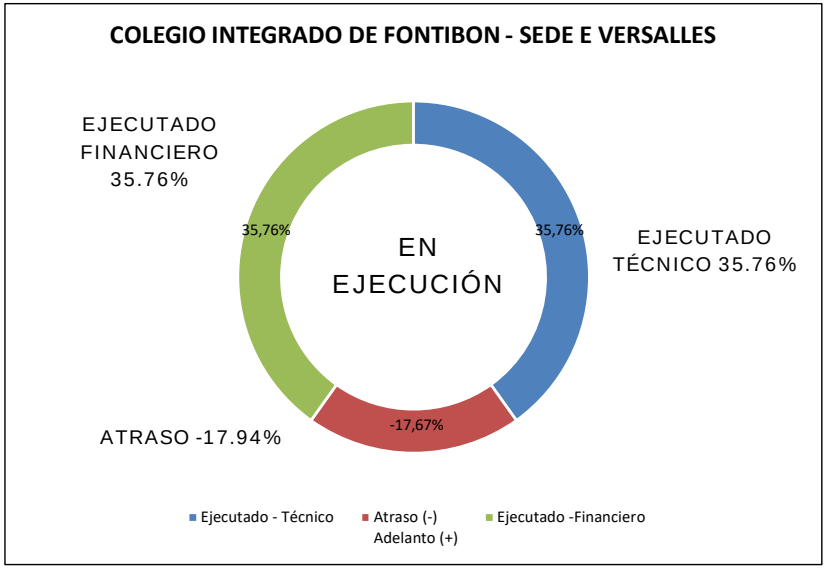


VILLEMAR DEL CARMEN SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	8,67%	2,70%	-5,97%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	16,05%	5,83%	-10,22%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	11,80%	11,35%	-0,45%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	16,68%	11,35%	-5,33%	8,02%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	6,21%	8,37%	2,16%	8,37%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

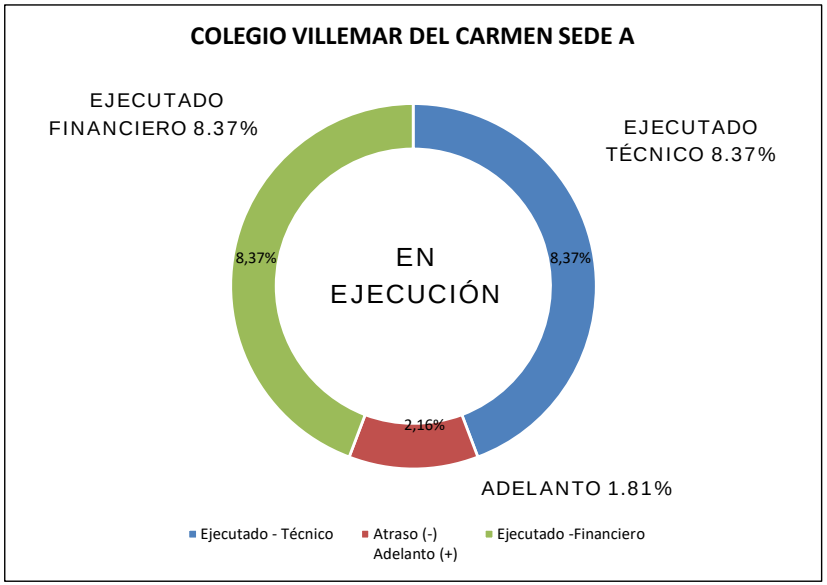


GABRIEL BETANCOURTH MEJIA SEDE C VILLA MEJIA TAGASTE				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	1,15%	0%	-1,06%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	3,41%	0%	-3,32%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	3,05%	0%	-3,05%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

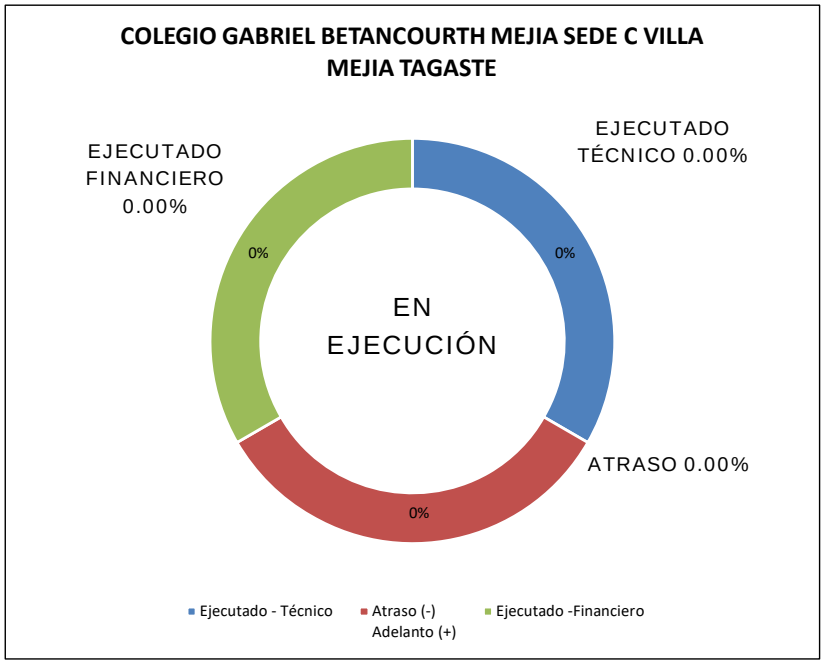


KENNEDY - SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	10,16%	0%	-10,15%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	12,65%	0%	-12,65%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	12,98%	0%	-12,98%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	19,71%	13,97%	-5,74%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	21,12%	8,97%	-12,15%	16,71%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	25,52%	8,97%	-16,55%	16,71%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	28,85%	19,99%	-8,86%	16,71%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	33,88%	26,64%	-7,24%	16,71%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	70,15%	47,70%	-22,45%	16,71%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	80,89%	47,70%	-33,19%	46,10%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	91,61%	78,20%	-13,41%	46,10%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

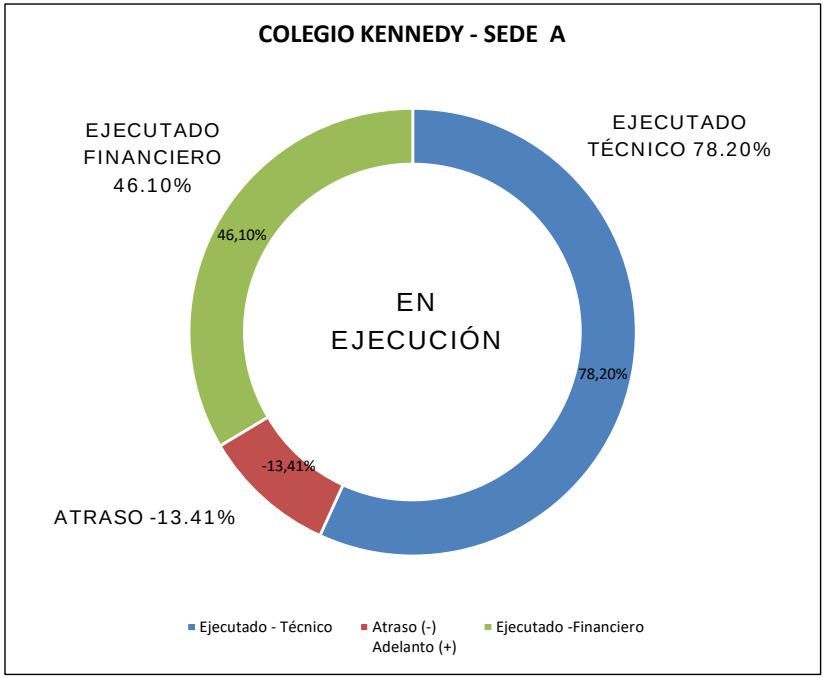


LA AMISTAD - SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	7,95%	5,23%	-2,71%	4,89%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	31,42%	5,23%	-26,19%	4,89%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	36,66%	5,23%	-31,43%	4,89%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	41,91%	11,85%	-30,06%	4,89%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	48,28%	11,85%	-36,43%	9,20%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	54,66%	11,85%	-42,81%	9,20%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	59,90%	14,73%	-45,17%	9,20%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	66,76%	18,17%	-48,59%	9,20%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	48,96%	22,71%	-26,25%	9,20%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	53,65%	47,54%	-6,11%	47,54%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	59,56%	68,62%	9,06%	47,54%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

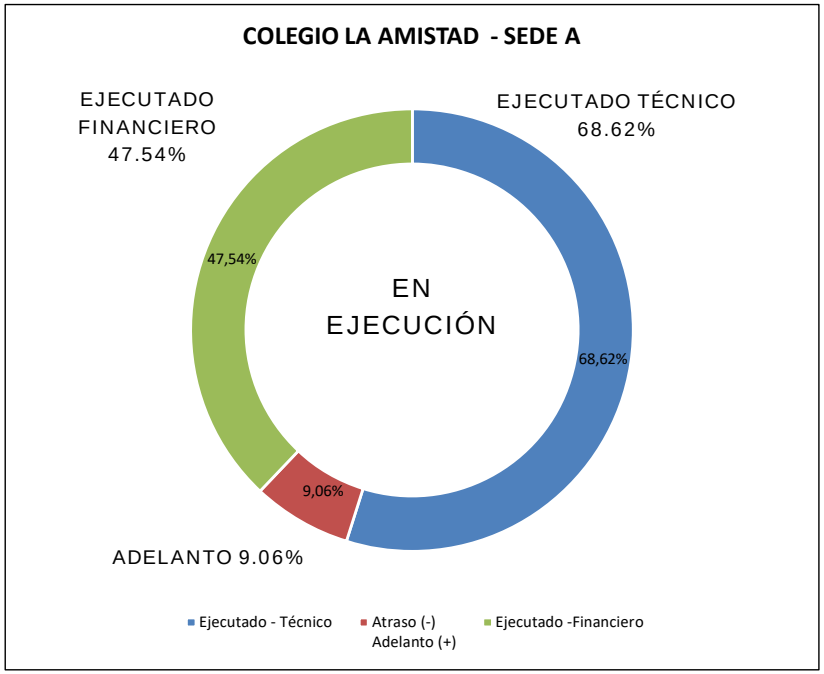


SAN RAFAEL - SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0,00%	0,70%	0,70%	0,69%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0,00%	3,88%	3,88%	0,69%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	3,30%	6,35%	3,05%	5,61%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	11,66%	6,35%	-5,31%	5,61%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	13,02%	15,67%	2,65%	5,61%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	15,14%	16,16%	1,02%	5,61%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	21,96%	26,68%	4,72%	5,61%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	30,78%	26,68%	-4,10%	21,14%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	20,84%	22,85%	2,01%	21,14%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

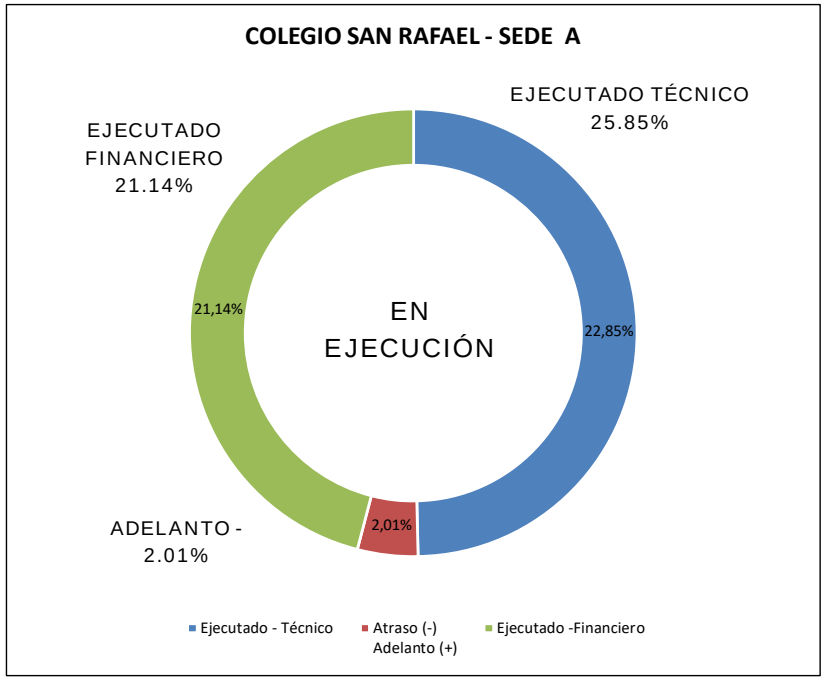


PAULO VI				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0,55%	0,25%	-0,30%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0,95%	1,34%	0,39%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	2,12%	2,37%	0,25%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	3,32%	2,37%	-0,95%	1,62%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	3,19%	3,09%	-0,10%	1,62%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

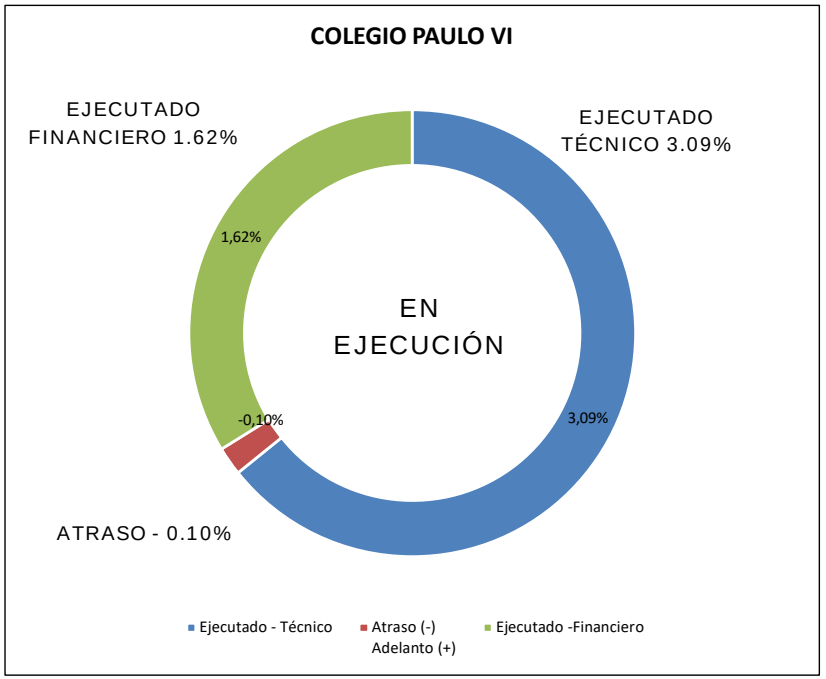


INEM SEDE A FRANCISCO DE PAULA SANTANDER				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	1,92%	1,11%	-0,81%	1,10%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	1,94%	1,11%	-0,83%	1,10%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	2,03%	1,11%	-0,92%	1,10%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	3,46%	1,31%	-2,15%	1,10%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	5,67%	2,38%	-3,29%	1,74%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	7,83%	2,38%	-5,45%	1,74%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	7,49%	4,54%	-2,95%	1,74%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	7,83%	5,59%	-2,24%	1,74%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	10,15%	6,35%	-3,80%	1,74%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	13,48%	15,41%	1,93%	15,41%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	28,76%	33,19%	4,43%	15,41%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

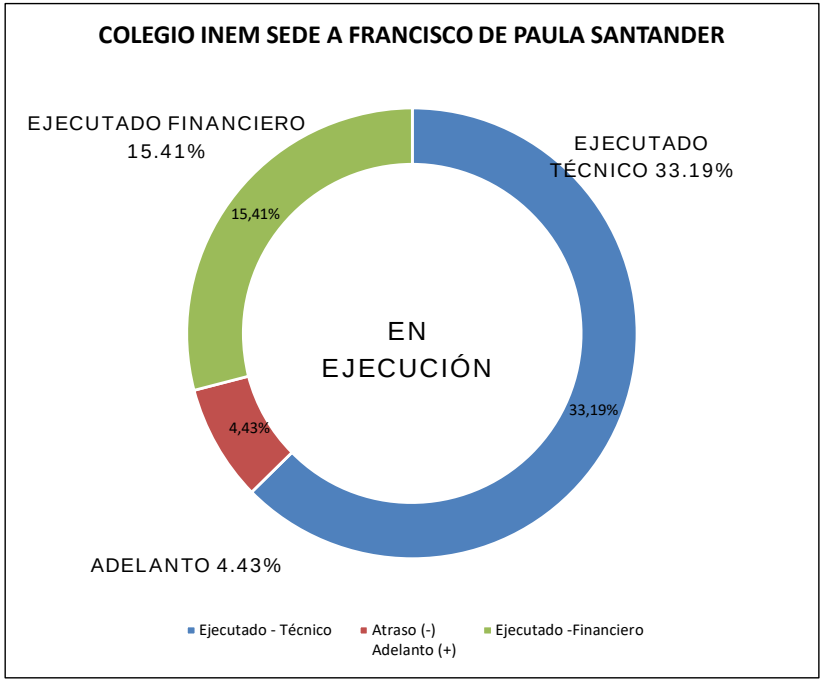


EL JAPON - SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	16,69%	42,36%	25,67%	14,70%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	30,17%	42,36%	12,19%	14,70%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	43,05%	42,36%	-0,69%	14,70%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	51,50%	42,36%	-9,14%	14,70%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	58,10%	42,36%	-15,74%	41,64%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	64,70%	42,36%	-22,34%	41,64%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	70,13%	47,45%	-22,68%	41,64%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	77,37%	53,65%	-23,72%	41,64%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	68,45%	55,21%	-13,24%	41,64%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	72,93%	64,88%	-8,05%	64,88%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	89,09%	72,99%	-16,10%	64,88%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

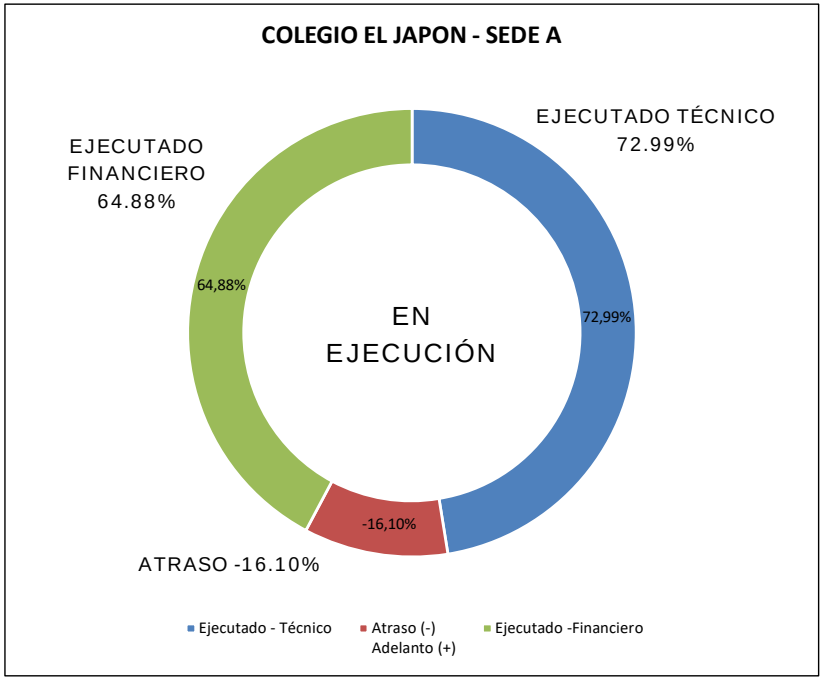

TOM ADAMS - SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	5,13%	5,38%	0,25%	1,02%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	9,25%	5,38%	-3,87%	1,02%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	13,83%	5,38%	-8,45%	1,02%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	15,01%	5,38%	-9,63%	1,02%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	17,29%	5,38%	-11,91%	5,62%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	20,32%	5,38%	-14,94%	5,62%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	25,21%	14,67%	-10,54%	5,62%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	43,08%	20,84%	-22,24%	5,62%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	36,55%	32,24%	-4,31%	5,62%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	43,93%	32,24%	-11,69%	24,14%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	50,60%	31,20%	-19,40%	24,14%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

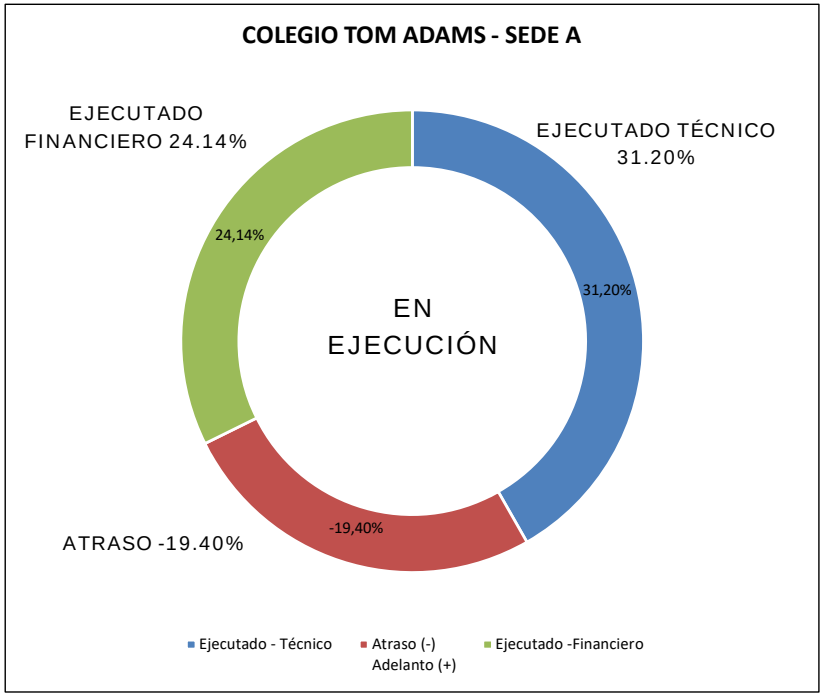


SAN PEDRO CLAVER - SEDE A				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
1. DEL 15 AL 21 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
2. DEL 22 AL 28 DE ABRIL	0%	0%	0%	0%
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	2,19%	7,15%	4,96%	1,14%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	20,11%	7,15%	-12,96%	1,14%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	22,07%	7,15%	-14,92%	1,14%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	22,88%	21,01%	-1,87%	1,14%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	23,33%	27,31%	3,98%	22,27%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	24,04%	27,31%	3,27%	22,27%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	24,58%	23,32%	-1,26%	22,27%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	32,52%	24,52%	-8,00%	22,27%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	27,82%	25,41%	-2,41%	22,27%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	31,57%	30,92%	-0,65%	30,92%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	85,76%	38,63%	-47,13%	30,92%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

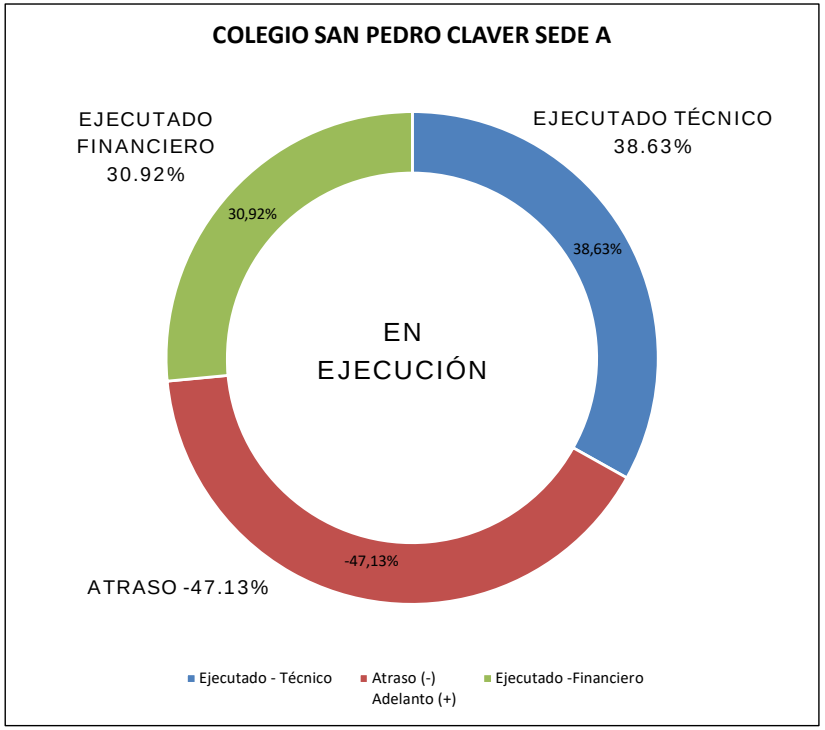

RESIDENTE INTERVENTORÍA
JHON EDISON REYES ROJAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MARTIN RAFAEL CORDOBA

PINAR DEL RIO - SEDE C				
Semana	**Programado**	**Ejecutado - Técnico**	**Atraso (-) Adelanto (+)**	**Ejecutado - Financiero**
3. DEL 29 ABRIL AL 5 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
4. DEL 6 AL 12 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
5. DEL 13 AL 19 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
6. DEL 20 AL 26 DE MAYO	0%	0%	0%	0%
7. DEL 26 MAYO AL 1 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
8. DEL 2 AL 8 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
9, DEL 10 AL 15 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
10. DEL 17 AL 22 DE JUNIO	0%	0%	0%	0%
11. DEL 24 AL 29 DE JUNUIO	0%	0%	0%	0%
12. DEL 30 DE JUNIO AL 6 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
13. DEL 8 AL 13 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
14. DEL 15 AL 20 DE JULIO	0%	0%	0%	0%
15. DEL 22 AL 27 DE JULIO	7,09%	0%	-7,09%	0%
16. DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO	0%	0%	0%	0%
17	0%	0%	0%	0%
18	0%	0%	0%	0%

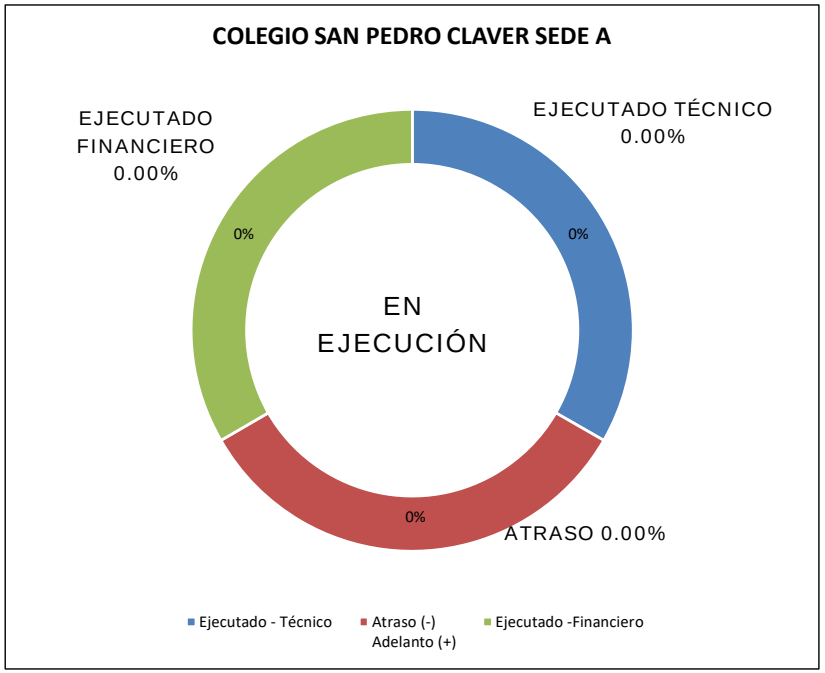

RESIDENTE INTERVENTORÍA
JHON EDISON REYES ROJAS

Vo. Bo. DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
MARTIN RAFAEL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 16 DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	16
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 8 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO LA AMISTAD - CONTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA.





COLEGIO VILLEMAR EL CARMEN SEDE A - SIN ACTIVIDADES DURANTE ESTA SEMANA.



ATENCIÓN DE EMERGENCIA COLEGIO NICOLAS ESGUERRA




ATENCIÓN DE EMERGENCIA COLEGIO HERNANDO DURAN DUSSAN



REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 16 DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024

CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	16
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 8 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO TOM ADAMS - CONSTRUCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN MANPOSTERIA Y FUNDIDA DE COLUMNAS DE CONFINAMIENTO.





COLEGIO SAN PEDRO CLAVER - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA Y FUNDIDA DE PLACA DE CONTRAPISO.





COLEGIO INTEGRADO FONTIBON



COLEGIO PABLO VI - DEMOLICIÓN Y PAÑETE DE MUROS EXISTENTES, EXCAVACIONES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA.





REGISTRO FOTOGRAFICO

SEMANAL No. 16 DEL 28 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024		
CONTRATISTA CONSORCIO COLEGIOS POR BOGOTA	INFORME FOTOGRÁFICO	16
INTERVENTORIA CONSORCIO COLEGIOS DEL DISTRITO	OBRA 8 FRENTES INTERVENIDOS	

COLEGIO INEM SEDE A - ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA.





COLEGIO EL JAPON - CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA, INSTALACIÓN DE CUBIERTA





COLEGIO KENNEDY SEDE A - PENDIENTADO DE PLACA EN CUBIERTA, INSTALACIÓN DE MEDIACAÑA E INSTALACIÓN DE MANTO DE ALUMINIO





COLEGIO SAN RAFAEL - SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN DE RAJON Y BASE



