

INFORME INTERVENTORIA
semana del 21 de enero 2024 al 27 de enero 2024

CONSORCIO INTERCOLSED 022

Informe 13 de Interventoría

Versión N°	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
0	29/01/2024	 KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR Inspectora Interventoría	 GUILLERMO DIAZ REINOSO Ingeniero Residente Interventoría	 CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA directora Interventoría	Versión Inicial

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONTENIDO

1. Introducción 3
2. Plan de manejo ambiental. 3
3. Gestión SST. 3
4. Avances de obra y balance semanal. 4
4.1 Nicolas Buenaventura 4
4.4 Colegio Gerardo Paredes 15
4.5 Colegio Heladia Mejía 17
4.6 Colegio Nueva Zelandia sede B. 20
4.7 Colegio Álvaro Gómez sede B. 23
4.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio 26
4.9 Colegio Domingo Faustino C 29
4.10 Colegio Domingo Faustino D 33
4.11 Colegio Gonzalo Arango 36
4.13 Colegio la Gaitana (obra por emergencia) 40
4.14 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia) 41
4.15 colegio Prado Veraniego - sede b (emergencia) 43
5. Balance General 45
6. Comunicados remitidos a la SED y contratista. 46
7. Registro fotográfico de los frentes de obra. 47
8. Comité de obra. 47

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME DE INTERVENTORÍA No.13

1. Introducción

El equipo de interventoría del contrato para "OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO a la fecha ha realizado las siguientes actividades durante la semana del 21 de enero de 2024 al 27 de enero de 2024.

2. Plan de manejo ambiental.

Por parte de gestión ambiental se efectuó visita el miércoles 24 de enero a los colegios Zelandia sede b, Vista bella c, Faustino sede c y d y Francisco Berbeo. Se hace informe de seguimiento. Adicional se revisa informe mensual ambiental del contratista de obra número 2 y se emite observaciones; la interventoría se encuentra a la espera de la subsanación correspondiente.

En el siguiente enlace puede acceder a la información relacionada con esta área. https://drive.google.com/drive/folders/1tdVnDf4bRXz8Kj07NyJ-K_oL55BdUJCL?usp=drive_link

3. Gestión SST.

Durante la semana, por parte del área SST de interventoría se realizaron las siguientes actividades:

- Solicitud y verificación de documentos para ingreso del personal contratista; ingresaron 9 personas a obra, con el fin de realizar actividades de cubiertas en el colegio Heladia Mejía, instalación de ventanería y aseo en el colegio Vista Bella C.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Se efectuaron recorridos, en donde se generaron observaciones y recomendaciones SST, de las actividades en el colegio Faustinos C y D, Juan Francisco Berbeo sede A, Nueva Zelandia sede b, Vista Bella sede C, Gonzalo Arango, Heladia Mejía, Gerardo Paredes y Álvaro Gómez Sede B.

- Seguimiento al contratista en la realización de ATS y permisos de trabajo, durante la semana se realizó la gestión correspondiente por parte del contratista.

- Total, a la fecha se encuentran 81 trabajadores entre personal antiguo y rotativo, autorizados para ingreso a obra, por parte del contratista e interventoría, incluyendo personal operativo y administrativo.

- Se realiza revisión del informe SST No 2 del mes de DICIEMBRE 2023, en el cual se generan observaciones por parte de la interventoría.

- Con relación al informe SST No 1 NOVIEMBRE 2023, aun no se subsanan las observaciones y/o no se entrega el producto por parte de contratista, se insta al contratista para que sean atendidas los ajustes correspondientes.

Se informa que a la fecha no se han reportado casos de accidentes de trabajo por parte del contratista e interventoría.

4. Avances de obra y balance semanal.

4.1 Nicolas Buenaventura



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



En este frente el contratista inicia con las actividades de demolición de enchape de pisos en la cocina. Tiene pendiente ejecutar la construcción de un cuarto provisional para guardar refrigerios y para el traslado de marmita.


La interventoría se encuentra a la espera del esquema con la nueva distribución de red sanitaria de la cocina con concepto del asesor hidráulico del contratista y del presupuesto de mantenimiento para las bombas incluyendo las actividades para el mejoramiento de este espacio.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO	21/11/2023		FECHA FIN OBRA	14/04/2024

Col. Nicolas Buenaventura				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	0,00%	1,50%	7,34%	44,34%
31 dic 23 - 6 ene 24	0,00%	1,50%	16,71%	61,05%
7-13 ene 24	0,00%	1,50%	5,94%	66,99%
14 - 20 ene 24	0,00%	1,50%	3,86%	70,85%
21- 27ene 24	5,00%	6,50%	4,29%	75,14%

RESUMEN Col. Nicolas Buenaventura			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
1,50%	6,50%	75,14%	ATRASO

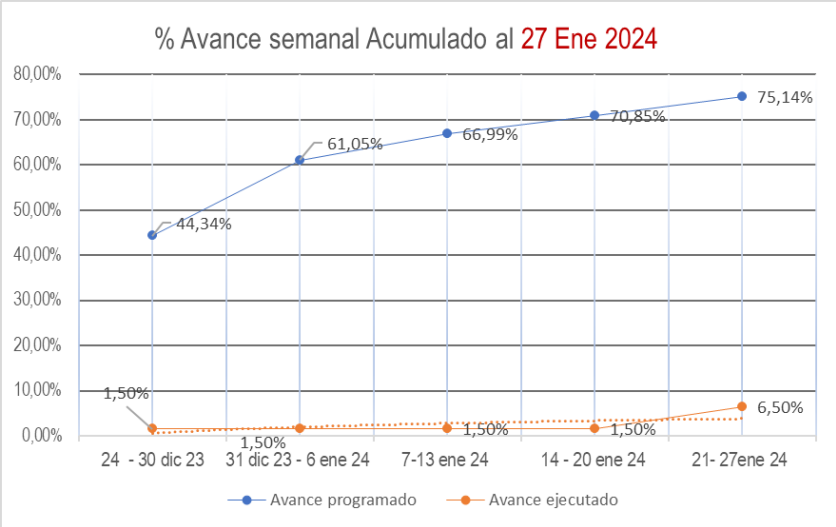

De acuerdo a lo anterior podemos decir que el atraso presentado en este frente se debe a que el contratista no ha entregado el esquema y el plan de intervención para la nueva

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

red sanitaria del área de la cocina. Se ha instado al contratista para los planes de contingencia de este frente toda vez que se debía entregar al 30 de enero de 2024.

En el siguiente enlace puede acceder al balance semanal del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.2 DILE





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Este frente de obra ya se entregó a la Dile, con funcionamiento de los puestos de trabajo que era la ruta crítica contemplada, se realizó la instalación del soporte del tv para digiturno aún faltan pequeños detalles como pasar la cartelera de las oficinas al auditorio, reparar la baldosa que hace falta en el auditorio y retoque de pintura en las ventanas.

En reunión con la SED y personal de la DILE surgieron algunas actividades adicionales como: cambiar unos vidrios de la ventanería que se encuentran en mal estado, adicionar dos puntos al tablero eléctrico para balancear cargas con su respectiva señalización, se debe hacer una caja de paso donde están los tubos a la vista y esta debe ir empotrada al muro.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	10/11/2023		FECHA FIN OBRA	10/04/2024

DILE				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
26 nov - 02 dic 23	0,98%	37,79%	8,16%	23,16%
3 - 9 dic 23	30,00%	67,79%	10,70%	33,86%
10 -16 dic 23	1,00%	68,79%	6,67%	40,53%
17 - 23 dic 23	25,00%	93,79%	59,47%	100,00%
24 - 30 dic 23	6,21%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN- DILE			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
93,79%	100,00%	100,00%	FINALIZO

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que se finalizaron obras en este frente, ya entraron en operación los puestos de trabajo, para ello, se hizo entrega de auditorio totalmente funcional con 14 puestos instalados, un punto de televisor y un cuarto para rack y acomedida. Las actividades pendientes se irán ejecutando paulatinamente en el transcurso de las siguientes semanas.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 62.659.999,55, no es el valor final toda vez que existen 4 actividades pendientes que no se han conciliado con el contratista como son: instalación de puestos de trabajo, suministro e instalación de ups de 1w suministro e instalación de switch para tablero regulado, punto de luz de la saeta de celaduría.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.3 Juan Francisco Berbeo



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



En este frente durante la semana el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Pañete los dos muros que se construyeron nuevamente por problema estructural.
- Retiro de un ducto que esta ubicado al final del comedor y demolición de la mocheta que lo tapaba

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- se agregó una hilada de ladrillo al lado del muro que se hizo nuevo para cerramiento como se indica en la fotografía y el pañete del mismo.

- Se terminó la instalación del piso en tablón granito.

- Se instaló cerramiento metálico aislando la zona de intervención.

En este frente se tiene pendientes la presentación de esquemas de estructura para cubierta, el esquema arquitectónico del cerramiento interno para el comedor; la instalación de la cubierta y su estructura metálica y el suministro e instalación de viga canal.


Por tanto, para el avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA	18/11/2023		FECHA FIN OBRA	31/03/2024

Col. Juan Francisco Berbeo sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 al 30 dic 23	0,00%	2,24%	3,59%	49,67%
31 dic 23 - 6 ene 24	0,80%	3,04%	7,56%	57,23%
7-13 ene 24	32,00%	35,04%	8,39%	65,62%
14 - 20 ene 24	10,00%	45,04%	9,47%	75,09%
21- 27ene 24	7,00%	52,04%	3,56%	78,65%

RESUMEN Col. Juan Francisco Berbeo sede B			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
45,04%	52,04%	78,65%	ATRASO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

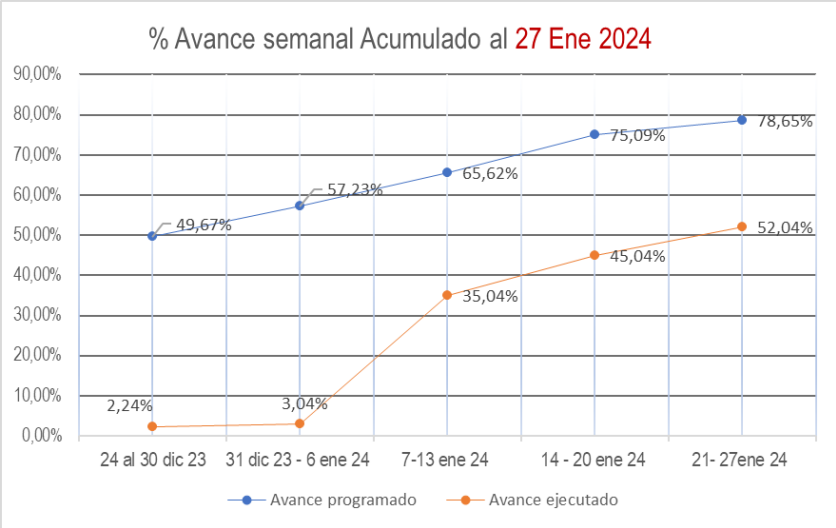

El avance de obra de esta semana se calcula de la siguiente manera:

- 1% pañetes.
- 2% por terminar la instalación del tablón granito.
- 0,5% hilada de ladrillo
- 1,5% construcción muros (fachada y cerramiento tienda escolar).

Este frente presenta atraso debido a:

- En semanas anteriores este frente no presentó avance de obra debido a que no tenían material para dar inicio a las actividades de demolición de los muros que se encontraron que no tenían soporte estructural.

- Se han encontrado varios imprevistos durante el desarrollo de la obra, inicialmente no se tenía contemplado el cambio de la cubierta, pero al intentar hacerle mantenimiento, todas las tejas existentes se dañaron por el avanzado estado de cristalización y daño por lo que se hace necesario cambiar completamente las tejas, adicional a esto la pendiente que tiene la estructura metálica existente está muy por debajo de lo mínimo exigido por el fabricante de la cubierta ecoorof y por lo tanto se hace necesario que se haga el desmonte completo de la estructura metálica y se realice un reforzamiento a la estructura existente y se hacen necesarios nuevos perfiles.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Además de lo anterior se encontraron dos muros, uno de fachada y otro contra un salón con serio daño ya que no tenían refuerzo estructural y estaban a riesgo de caer. Fue necesario demoler estos muros y volverlos a construir.

- El nivel del piso fue necesario elevarlo en gran manera para poder mejorar las pendientes y lograr la nivelación total del piso del área y con ello obtener la optimización del espacio allí dispuesto para comedor.

- No se han presentado los esquemas de cubierta y fachadas para aprobación de la interventoría.

En comité se definió el compromiso de entrega de esta área 5 de febrero de 2024, así mismo el contratista presentó presupuesto actual del colegio incluyendo las actividades adicionales.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 128.066.544,79*. El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 126.012.927,00), debido a que se adicionaron actividades relacionadas con la construcción de los dos muros de fachada que no tiene refuerzo estructural, se adiciona pintura epóxica para los muros y se retira el enchape, se adicionan cantidades relacionadas con el suministro e instalación de nueva cubierta para el área, toda vez que la existente se encontraba en policarbonato y estaba cristalizada, es importante mencionar que estas actividades no se han finalizado por tanto este valor puede variar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.4 Colegio Gerardo Paredes





En este frente se culminó la construcción del cárcamo, se retiró una parte del material sobrante que estaba en la zona del parqueadero.


En comité se defino que la instalación del piso en caucho solo se ejecutara una vez se haya instalado el parque, para evitar el riesgo de filtraciones de agua.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	11/11/2023		FECHA FIN OBRA	11/04/2024

Col. Gerardo Paredes				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	12,32%	38,30%	5,87%	59,97%
31 dic 23 - 6 ene 24	15,00%	53,30%	0,00%	59,97%
7-13 ene 24	0,00%	53,30%	0,00%	59,97%
14 - 20 ene 24	0,00%	53,30%	0,00%	59,97%
21- 27ene 24	3,00%	56,30%	0,00%	59,97%

RESUMEN Col. Gerardo Paredes			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
53,30%	56,30%	59,97%	ATRASO

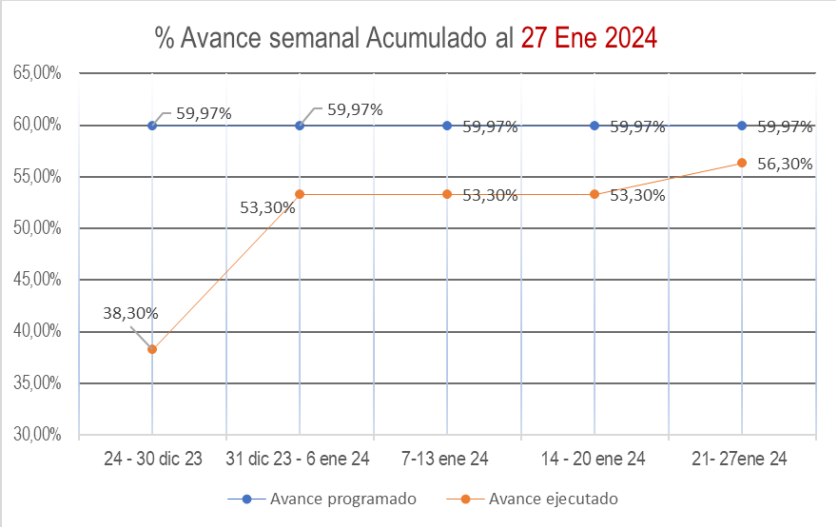

De acuerdo a lo anterior podemos observar que en cronograma no se tienen programadas actividades para ejecución durante esta semana, sin embargo, el atraso

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

que este frente de obra presenta se debe a que está pendiente la instalación del piso caucho, que solo se ejecutará una vez se haya instalado el parque.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 224.980.802,00*. El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 193.023.675,00), debido a que inicialmente se tenía previsto una demolición de alistado de piso, pero por condiciones de obra se requirió una demolición de placa y la construcción de filtro francés. Por temas de balances de presupuesto se recortó la actividad para la fachada.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.5 Colegio Heladia Mejía



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













En este frente al inicio de la semana el contratista realiza aseo de las zonas intervenidas para entregar el colegio limpio para que los estudiantes regresen a clases, se toma como contingencia trabajar lis fines de semana. Se hace imprimación de emulsión en cubiertas, y se inicia con la Instalación de manto.


Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se tiene pendiente por ejecutar las actividades de anclajes y de creación de acceso para la cubierta.

FECHA INICIO OBRA 13/11/2023		FECHA FIN OBRA 31/03/2024

Col. Heladia Mejía				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	4,00%	34,14%	7,05%	59,04%
31 dic 23 - 6 ene 24	3,06%	37,19%	2,20%	61,24%
7-13 ene 24	0,00%	37,19%	1,53%	62,77%
14 - 20 ene 24	5,00%	42,19%	0,43%	63,20%
21- 27ene 24	15,00%	57,19%	4,80%	68,00%

RESUMEN - Col. Heladia Mejía			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
42,19%	57,19%	68,00%	ATRASO

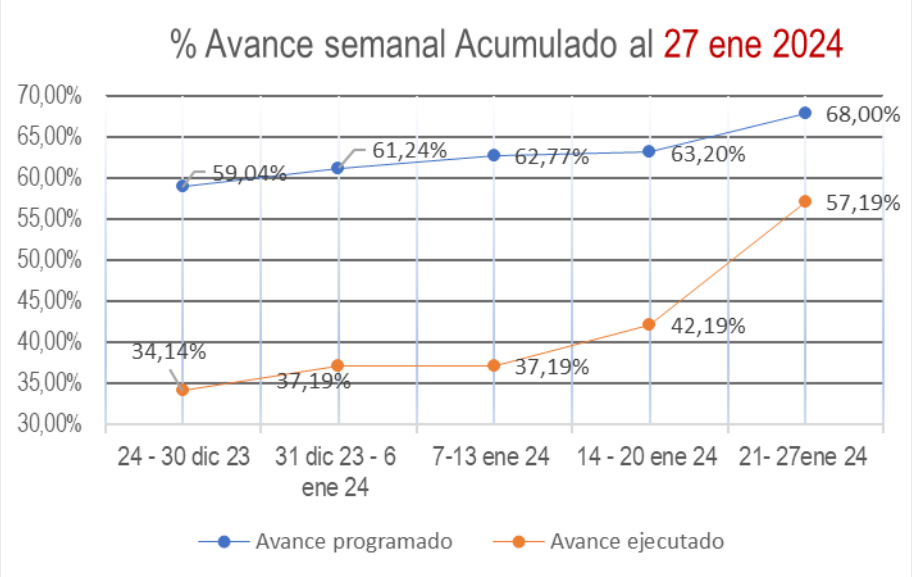

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

De lo anterior podemos decir que el atraso del frente se debe a la falta de material y de que por directrices del colegio solo se podrá trabajar el fin de semana.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 322.607.766,00*. El valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 324.266.586,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente disminuyeron; así mismo se eliminaron actividades relacionadas a la ampliación de la tienda escolar de acuerdo a la directriz del ingeniero de apoyo a la supervisión de la SED debido a actividades no contempladas necesarias en la ejecución de los frentes de trabajo que se originaron por las demoliciones y muros en mal estado, cubiertas en malas condiciones, entre otros.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.6 Colegio Nueva Zelandia sede B.








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









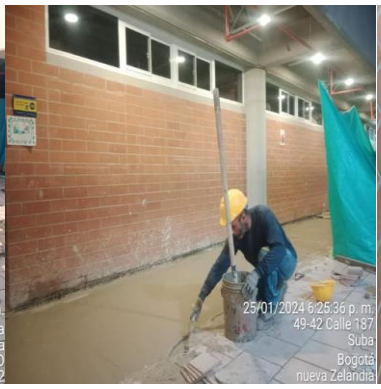



Durante esta semana el contratista de obra culmina la instalación de manto asfaltico de ludoteca e inicia con la instalación de tableta gres en terraza ludoteca y auditorio. Como contingencia por la entrada de los estudiantes, se decide dar prioridad al área de la terraza ludoteca y la ludoteca, para ello, en la terraza de la ludoteca se realizó la instalación del tablón de los pasillos y el cerramiento de la parte central con el fin de habilitar pasillos y no afectar las clases de los salones que están allí.

Además de lo anterior, se realiza la instalación de manto foil de aluminio en las terrazas adicionales en la terraza auditorio, así mismo se realiza pendientado para las placas centrales de esta terraza; Se inicia con el cambio de codos y la limpieza de la tubería del auditorio.


De acuerdo a comité se decide trabajar un formato de tableta más pequeño que la existente en colegio toda vez que el formato ya no está en producción, su instalación.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	17/11/2023		FECHA FIN OBRA	30/04/2024

Col. Nueva Zelandia sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	3,00%	25,45%	3,00%	33,50%
31 dic 23 - 6 ene 24	1,50%	26,95%	4,90%	38,40%
7-13 ene 24	2,00%	28,95%	4,81%	43,21%
14 - 20 ene 24	10,00%	38,95%	4,21%	47,42%
21- 27ene 24	11,00%	49,95%	5,19%	52,61%

RESUMEN - Col. Nueva Zelandia sede B			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
38,95%	49,95%	52,61%	ATRASO

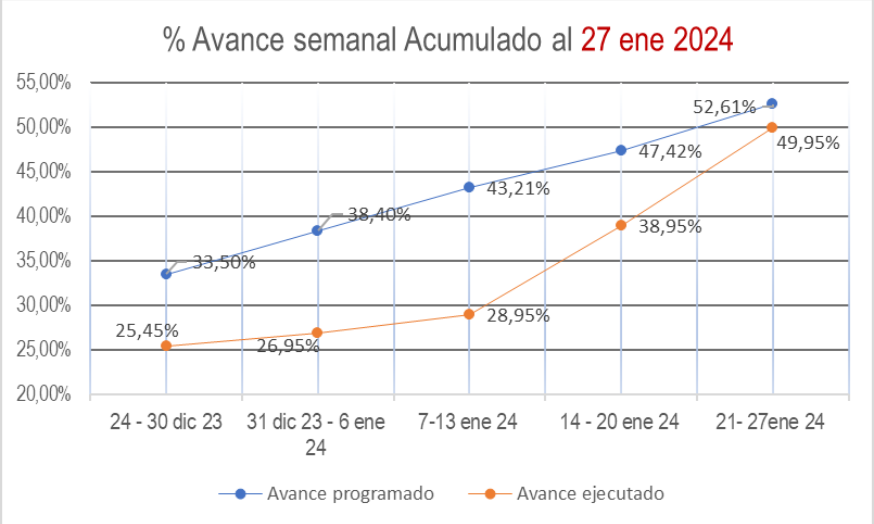

En cuanto avance de obra podemos decir que se presenta un atraso toda vez que dentro de cronograma estaba contemplada la actividad “Revisión y sondeo de desagües” y la instalación de tablón gres en las terrazas, adicional el contratista no ha

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

culminado la instalación del manto de la terraza ludoteca ni se ha culminado la actividad de instalación de acabado de las terrazas. Se le insta al contratista para implementar planes de contingencia con los cuales se ponga al día en la ejecución y así se pueda avanzar y cumplir con la entrega de los trabajos desarrollados.

Por el momento, el valor de este frente está en *198.693.990,67*aumentando el valor del presupuesto inicial ($ 185.072.687,00) debido a que no se había contemplado en el presupuesto inicial la actividad de *picado de membrana, la demolición de mayor cantidad de alistado* ya que en las placas de a terraza al hacer el picado de membrana este se ha ido levantando, por lo que se ha requerido demoler más alistado.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.7 Colegio Álvaro Gómez sede B.



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Durante esta semana el contratista de obra realizo las siguientes actividades:

- Aseo con hidro lavadora a las aulas 13, 14 y 15; placa de patio central y baño de primer piso.
- Inició con la instalación del guarda escoba de las aulas13, 14 y 15del primer piso.
- Se ha realizado montaje de total de estructura metálica;
- Se instalo teja en dos salones para la cubierta.

Se tiene pendiente el aseo del salón que se debe instalar el flanche por la grieta y la instalación del flanche; pintura del techo del baño del primer piso y la pintura del techo

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

del salón del flanche; pintura de puertas; arreglo de acabado de viga en baño de segundo piso.

FECHA INICIO OBRA	27/11/2023		FECHA FIN OBRA	18/02/2024

Col. Alvaro Gomez sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	15,29%	55,02%	8,71%	63,38%
31 dic 23 - 6 ene 24	2,00%	57,02%	5,38%	68,76%
7-13 ene 24	3,00%	60,02%	6,70%	75,46%
14 - 20 ene 24	5,00%	65,02%	5,69%	81,15%
21- 27ene 24	6,00%	71,02%	8,06%	89,21%

RESUMEN - Col. Alvaro Gomez sede B			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
65,02%	71,02%	89,21%	ATRASO

Pese a que se han culminado algunas actividades, se evidencia un atraso debido a que de acuerdo al cronograma el contratista debería haber culminado el montaje total de la cubierta y haber realizo el acceso a la cubierta; La interventoría ha instado al contratista para que diseñe planes de contingencias y pueda cumplir con lo programado en el cronograma de actividades.

Por ahora, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 318.825.043,99; valor que ha disminuido con respecto al valor presupuestado ($ 419.274.985,00); su reducción se debe a que han bajado las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo, es importante

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

aclarar que para este frente no se tiene contemplada la actividad de la cubierta solo hasta que se culmine la actividad.

Es importante aclarar que el ítem *suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye guarda escoba biselado,* en el pasillo del primer piso y el baño, no se realiza guarda escoba, pero se hace franja en granito pulido al costado de la tableta granito pulido para guardar la armonía de los acabados existentes.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Durante la semana no se adelantaron actividades en el frente, toda vez que se consideró como ruta crítica la adecuación de los cuartos fríos, intervención que ya fue finiquitada por el contratista. Es importante aclarar que se realizó la limpieza del área intervenida y la adecuación del cárcamo de ingreso al cuarto frío.


En la siguiente imagen se observa el avance de este frente:

FECHA INICIO OBRA 27/11/2023		FECHA FIN OBRA 6/03/2024

Col. Jorge Mario Bergoglio				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	0,00%	75,00%	0,00%	45,19%
31 dic 23 - 6 ene 24	0,00%	75,00%	0,00%	45,19%
7-13 ene 24	0,00%	75,00%	10,00%	55,19%
14 - 20 ene 24	0,00%	75,00%	0,00%	55,19%
21- 27ene 24	0,00%	75,00%	0,00%	55,19%

RESUMEN - Col. Jorge Mario Bergoglio			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
75,00%	75,00%	55,19%	AVANCE OPTIMO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

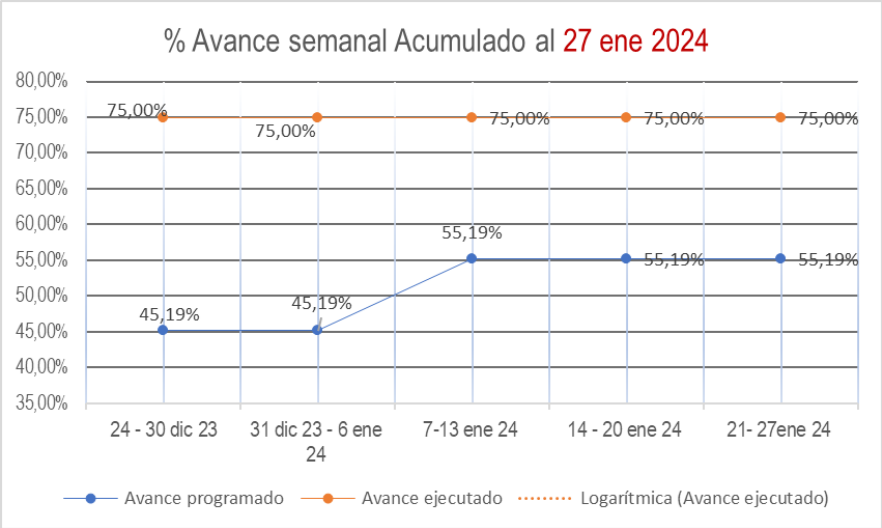

Para este colegio está pendiente por ejecutar la actividad de cerramiento metálico de las canchas; la interventoría se encuentra a la espera de una propuesta para mitigar el impacto de los balones contra el cerramiento metálico perimetral.

Por ahora, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 131.866.418,54; valor que ha disminuido con respecto al valor presupuestado y su reducción se debe a que han bajado las cantidades contempladas inicialmente. También en este balance se retiró la limpieza del cárcamo por directriz del ingeniero de apoyo a la supervisión de la SED para balance del contrato, debido a los imprevistos que han salido en otros frentes.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.9 Colegio Domingo Faustino C



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



En este frente se realizaron las siguientes actividades:

- Enchapado de muros y piso de los baños
- Nivelación piso del parque con recebo.
- Fundida de placa para el parque
- Instalación de muro en donde existía la puerta hacia el salón.
- Construcción de caja de inspección externa.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

A la fecha se tiene pendientes las siguientes actividades:

- Instalación de mesones para lavamanos en ambos baños
- Instalación de aparatos sanitarios en ambos baños
- Instalación de divisiones
- Falta parte eléctrica de los baños
- Falta rejillas en baño de niños y niñas
- Instalación de cielo raso
- Instalar la puerta para el ingreso del salón de sistemas
- Baños portátiles tanto para trabajadores como para niños
- Aseo general
- Solucionar tema de la ventanería con bajante ya que les pusieron rejillas.


Para este frente no se tendrá en cuenta balance semanal toda vez que no se han culminado las actividades.

FECHA INICIO OBRA	28/11/2023		FECHA FIN OBRA	5/04/2024

Col. Domingo Faustino sede C				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	2,00%	16,94%	8,30%	34,50%
31 dic 23 - 6 ene 24	7,63%	24,57%	12,17%	46,67%
7-13 ene 24	10,00%	34,57%	8,81%	55,48%
14 - 20 ene 24	5,00%	39,57%	2,21%	57,69%
21- 27ene 24	9,00%	48,57%	2,19%	59,88%

RESUMEN - Col. Domingo Faustino sede C			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
39,57%	48,57%	59,88%	ATRASO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

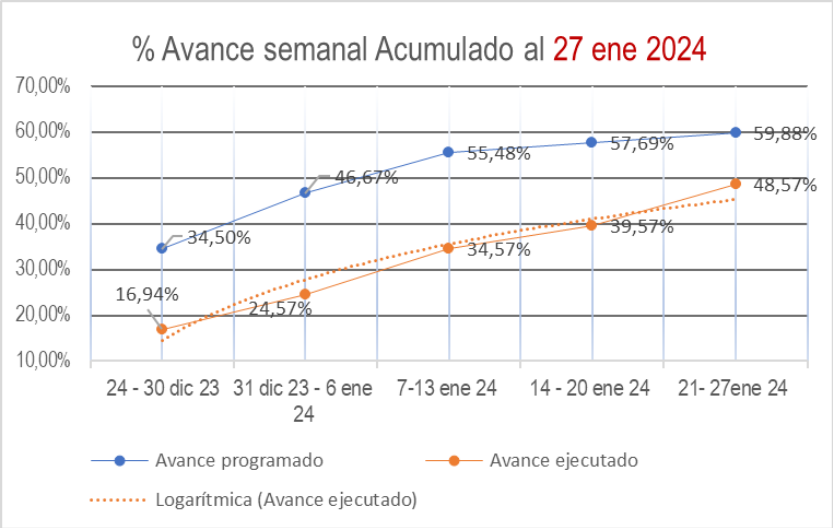

De lo anterior podemos decir que los imprevistos encontrados han llevado a retrasos en el desarrollo de la obra toda vez que ha implicado excavaciones más profundas para investigar el estado de la construcción existente y rellenos no previstos y son actividades que no se tenían contempladas en las ejecuciones iniciales ni en los cronogramas.

Dado el atraso que se evidencia, se le ha instado al contratista para reforzar el personal en el frente de obra, abastecer el frente con los materiales requeridos y así evitar más atrasos.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 235.581.848,94 este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial ($ 223.201.384,00), teniendo en cuenta algunas cantidades han aumentado y han aparecido actividades adicionales como la demolición de placa de 15 cm.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.10 Colegio Domingo Faustino D



Se continua con enchape de muros. Para este frente no se tendrá en cuenta balance semanal, pero si avance de obra.

En este frente a la fecha tenemos pendiente las siguientes actividades:

- Instalación de piso en baños
- Pintura de estructura de la cubierta
- Instalación de sanitarios
- Instalación de orinales
- Instalación de mesones para lavamanos en ambos baños
- Instalación de divisiones en los baños
- Pintura para las paredes
- Desarrollo de rampa para acceso de los baños
- Parte eléctrica de los baños

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Aseo general


Para el regreso de los estudiantes como medida de contingencia se instalaron baños portátiles mientras esta en marcha la obra.

FECHA INICIO OBRA	1/12/2023		FECHA FIN OBRA	31/01/2024

Col. Domingo Faustino sede D				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	2,00%	27,00%	8,90%	42,40%
31 dic 23 - 6 ene 24	1,00%	28,00%	24,47%	66,87%
7-13 ene 24	2,00%	30,00%	13,12%	79,99%
14 - 20 ene 24	2,00%	32,00%	4,54%	84,53%
21- 27ene 24	1,00%	33,00%	3,27%	87,80%

RESUMEN - Col. Domingo Faustino sede D			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
32,00%	33,00%	87,80%	ATRASO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

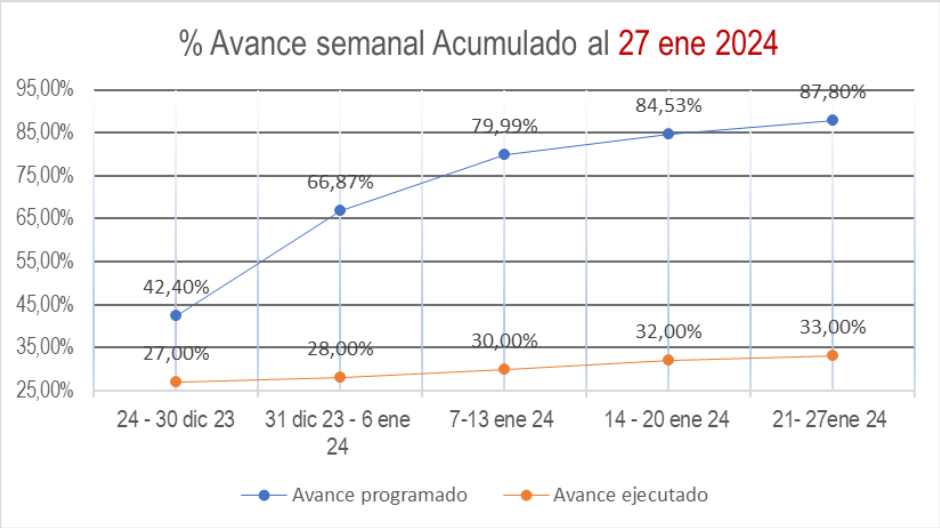

De lo anterior podemos decir que se evidencia un avance de obra al culminar una de las actividades, sin embargo, el atraso se debe a la falta de material y poco personal en el frente de trabajo.

Dado el atraso que se evidencia, se le insta al contratista para reforzar el personal en el frente de obra, para cumplir con lo programado en cronograma y evitar más retrasos en las ejecuciones.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 226.600.667,73.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.11 Colegio Gonzalo Arango




Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se terminó actividad de lavado de fachadas, se instalaron las rejas quedando pendiente la instalación de una reja a solicitud de la rectora para poder cambiar los vidrios que se encuentran rotos, antes de instalarla.

FECHA INICIO OBRA	30/11/2023		FECHA FIN OBRA	4/03/2024

Col. Gonzalo Arango				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	0,00%	10,00%	8,52%	38,40%
31 dic 23 - 6 ene 24	0,00%	10,00%	9,10%	47,50%
7-13 ene 24	20,00%	30,00%	0,00%	47,50%
14 - 20 ene 24	0,00%	30,00%	17,79%	65,29%
21- 27ene 24	0,00%	30,00%	9,30%	74,59%

RESUMEN - Col. Gonzalo Arango			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
30,00%	30,00%	74,59%	ATRASO

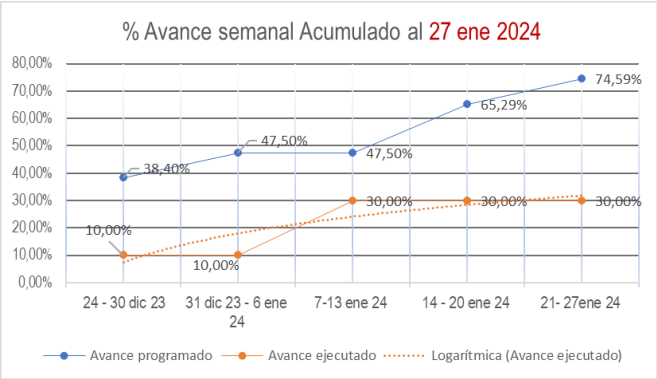

Este atraso se debe a que el contratista no ha cumplido con lo programado en el cronograma, pues hasta la fecha debería estar con actividades del domo y se ha considerado que no es una ruta crítica por ende el contratista está en presentación de esquema estructural.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Dado el atraso en el frente, la interventoría ha solicitado al contratista subsanar el tema y así poder dar avance en la ejecución de las obras en este colegio.

La actividad de anclajes no se tendrá en cuenta para balance en esta semana ahora el presupuesto de este frente tiene un valor de $ 313.025.316,00.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.12 Colegio Vista bella C



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Durante esta semana el contratista estuvo trabajando en las siguientes actividades:


- Suministro e instalación de ventaneria en fachada y dentro del edificio.
- Suministro e instalación de estructura de cubierta.
- Instalación de cubierta de los salones.
- Raspado y resane en los salones del primer y según piso.
- Pintura en primer piso.
- Pañete de muros.
- Filos de ventaneria
- Desmonte de drywall del muro de los profesores

FECHA INICIO OBRA	5/12/2023		FECHA FIN OBRA	4/03/2024

Col. Vista Bella sede C				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 dic 23	8,00%	17,81%	8,13%	24,13%
31 dic 23 - 6 ene 24	0,79%	18,60%	4,93%	29,06%
7 - 13 ene 24	1,40%	20,00%	5,94%	35,00%
14 - 20 ene 24	10,00%	30,00%	4,79%	39,79%
21 - 27 ene 24	17,00%	47,00%	12,71%	52,50%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

RESUMEN - Col. Vista Bella sede C			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
30,00%	47,00%	52,50%	ATRASO

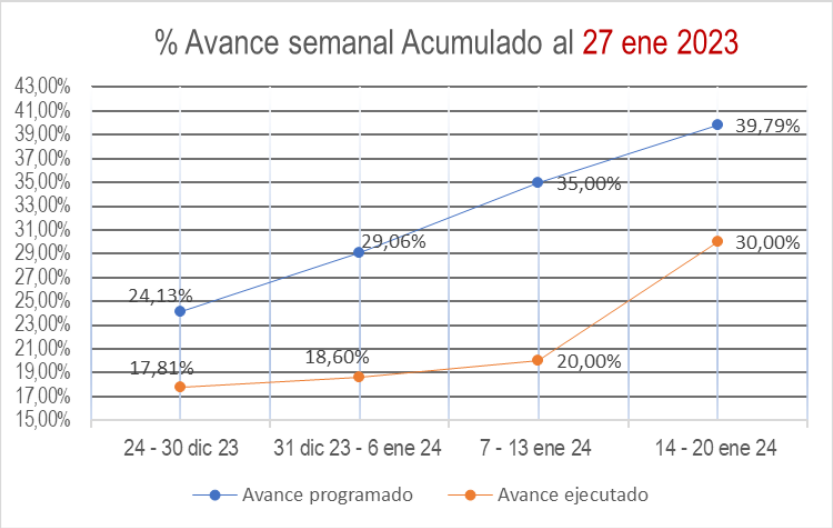

De acuerdo a lo anterior podemos decir que se evidencio un avance, pero aún se sigue presentados atrasos por la falta de materiales y de personal, por ello se mueve fecha de entrega del bloque norte para el 29 de enero de 2024.

Dadas las circunstancias, la interventoría ha instado al contratista para presentar un plan de contingencia donde se tenga como fecha final de la ruta crítica (actividades bloque norte) y evitar futuros atrasos en la ejecución de actividades en este frente.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 609.335.980,21.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 606.929.867,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron por condiciones de la obra como fue la demolición de mampostería.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link


4.13 Colegio la Gaitana (obra por emergencia)

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


La interventoría recibe presupuesto por parte del contratista y da aprobación; en comité de obra número 3, el ingeniero Hernán López define que para esta obra la intervención se hará el otro año una vez salga de la ruta crítica de los colegios que en el momento se están interviniendo.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1_ZK5GuNODwdHyjj42O5RGP53fPdbPjRC?usp=drive_link

4.14 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia)

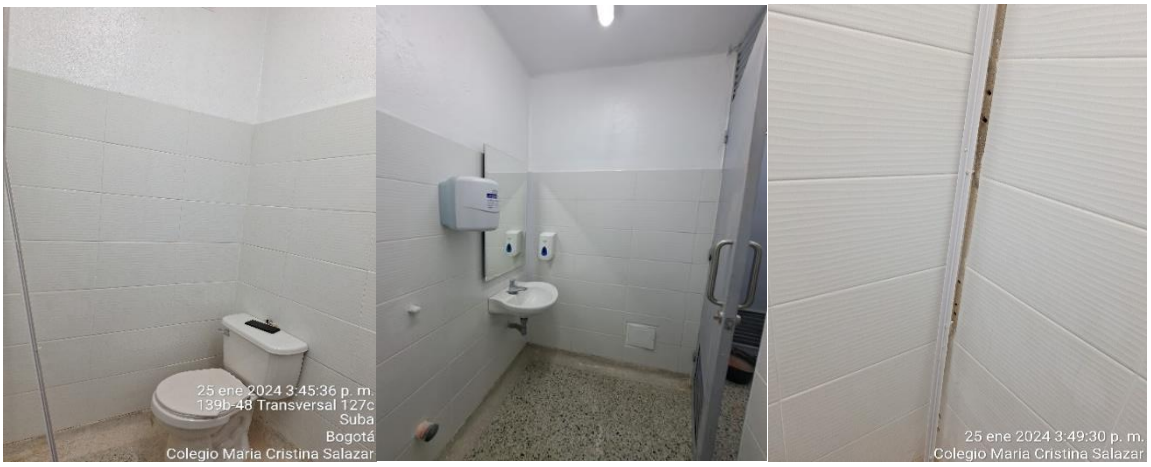

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

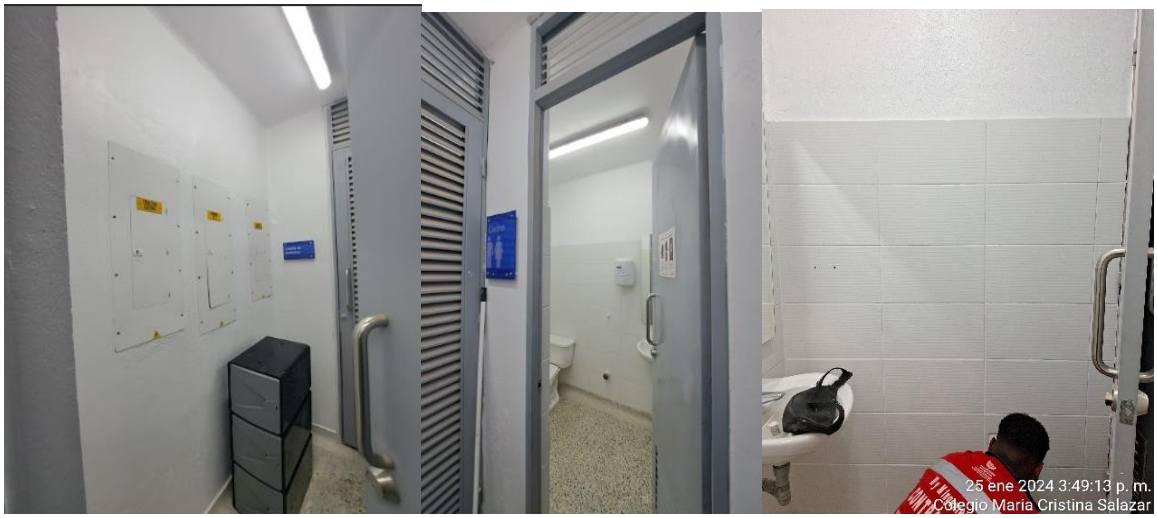

Se realiza intervención en el colegio en el área de los tableros eléctrico y baños ubicados en la cocina. Realizando las siguientes actividades:

Baño: para los muros se realizó enchape a 1,76 m de altura desde donde inicia la media caña del piso, y pintura epóxica en la parte restante del muro.

Cuarto de tableros eléctricos: Se realizo la pintura epóxica total del área.


Esta intervención se da por finalizada el día sábado. La semana siguiente se hará entrega al colegio.

FECHA INICIO OBRA	20/01/2024		FECHA FIN OBRA	26/01/2024

Col. Vista Bella sede C				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
14 - 20 ene 24	75,00%	75,00%	50,00%	50,00%
21 - 27 ene 24	25,00%	100,00%	50,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

RESUMEN - Col. Vista Bella sede C			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
75,00%	100,00%	100,00%	AVANCE OPTIMO

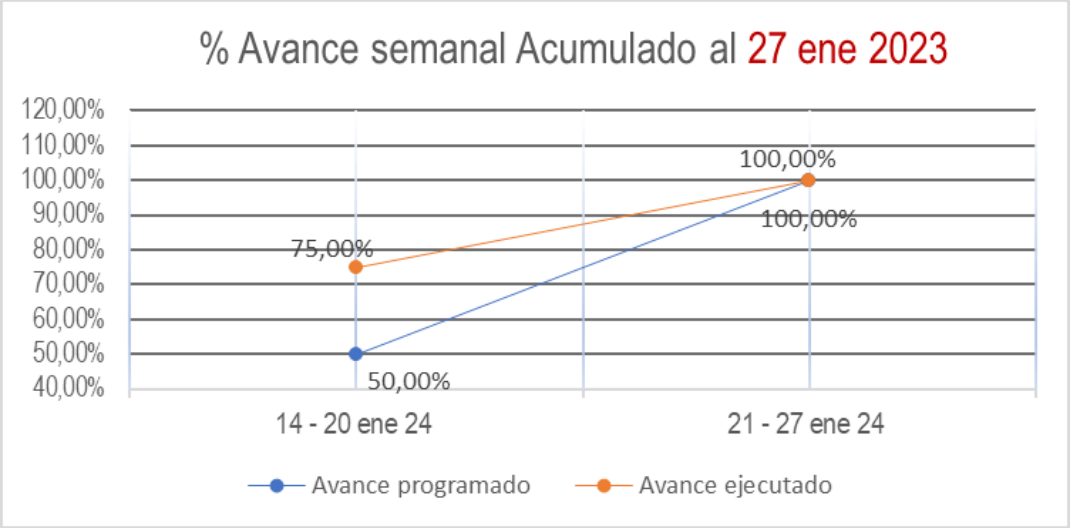

Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de *$ 2.216.067,85.* El valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ $ 2.418.600,00), debido a que algunas actividades contemplaron inicialmente no se ejecutaron.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. A la visita inicial realizada al visita realizada y presupuesto del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1nke9ZqxVIX-sPVVW0Qr25M10ZgV_02wR?usp=drive_link

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente del balance presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1_ZK5GuNODwdHyjj42O5RGP53fPdbPjRC?usp=drive_link

4.15 colegio Prado Veraniego - sede b (emergencia)

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195












En esta semana el contratista no ejecuto actividades en este frente. aun quedan pendientes las actividades de Grafada de tejas y la instalación de flanches.

FECHA INICIO OBRA	2/01/2024		FECHA FIN OBRA	29/01/2024

Col. Prado Veraniego				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
31 dic 23 - 6 ene 24	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
7-13 ene 24	0,00%	10,00%	30,00%	50,00%
14 - 20 ene 24	40,00%	50,00%	25,00%	75,00%
21- 27ene 24	0,00%	50,00%	25,00%	100,00%

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

RESUMEN - Col. Prado Veraniego			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
50,00%	50,00%	100,00%	ATRASO

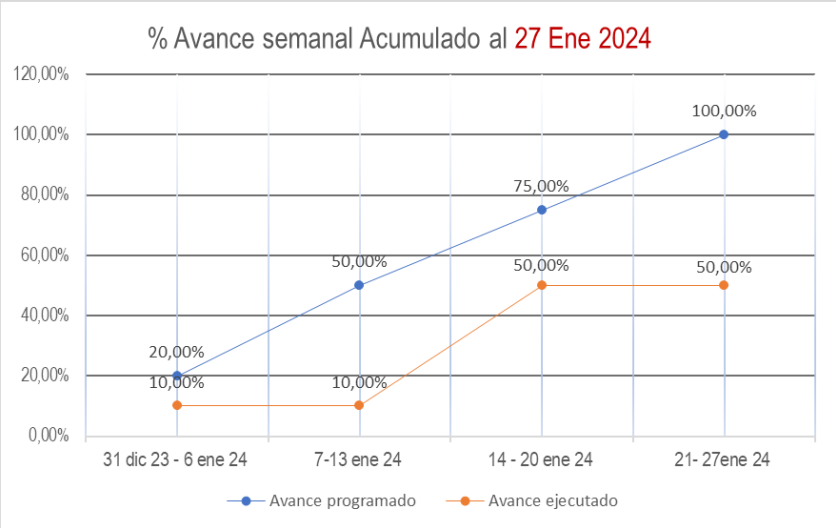

De lo anterior podemos decir que se evidencia un avance de obra al culminar algunas de las actividades, sin embargo, el atraso se debe a la falta de material.

Dado el atraso que se evidencia, se le insta al contratista para reforzar el personal en el frente de obra y adquirir los materiales, para cumplir con lo programado y evitar más retrasos en las ejecuciones.

Por ahora para esta emergencia se tiene un presupuesto de *$8.684.282,00*

En el siguiente enlace podrá acceder a la información del presupuesto
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iyd79BxuFeK5AuSs7gFSMFLSAN0bpf2H/edit?usp=drive_link&ouid=117435936827953543212&rtpof=true&sd=true

5. Balance General

A la fecha tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

BALANCE FINANCIERO TOTAL					
BALANCE AL	VALOR EJECUTADO COLEGIOS	VALOR ACTUAL DE PPTO COLEGIOS	VALOR EJECUTADO EMERGENCIAS	VALOR ACTUAL PPTO EMERGENCIAS	VALOR ACTUAL DE PPTO CON EMERGENCIAS
27 de enero 2024	$ 433.775.073,16	$ 3.683.963.080,76	$ 2.181.362,40	$ 10.865.644,40	$ 3.694.828.725,16

RESUMEN BALANCE TOTAL		
PPTO INICIAL	PPTO ACTUAL	PPTO INICIAL Vs. PPTO ACTUAL
$ 3.835.728.596	$ 3.694.828.725	DISMINUYE VALOR DE PPTO

De lo anterior podemos decir que:

- el valor del presupuesto para los colegios ha disminuido debido a que han bajado cantidades contempladas inicialmente; se eliminan actividades de limpieza de cárcamo en el colegio Bergoglio, construcción de cárcamo en el Álvaro Gómez, las actividades relacionadas a la ampliación de la tienda escolar en el Heladia Mejía y se incluyen las actividades eléctricas ejecutadas en el DILE y la construcción de muro del Berbeo por falla estructural; es importante aclarar que puede subir un poco el presupuesto por las actividades imprevistas del Faustino C (que no se tienen una totalidad del mismo).

- Por ahora el balance para las emergencias de los colegios María cristina Salazar y Prado veraniego se tiene es de $ 10.865.644,40, valor que ha disminuido con respecto al que se tenía inicialmente ($ 11.102.882), lo que indica que aún se tiene $ 89.134.355,60 para usar en otras emergencias.

- El valor actual total del presupuesto se encuentra dentro del valor presupuestado inicialmente para la totalidad del contrato.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

6. Comunicados remitidos a la SED y contratista.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por parte de la interventoría, se han emitido comunicaciones al contratista y a la secretaria de Educación y Contratista con el fin de informar y recordar las actividades pendientes del contrato en curso este periodo trabajado.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1ervzclBkT3vW-vS2BzFRKYxQl7EJd71i?usp=drive_link

7. Registro fotográfico de los frentes de obra.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1MPbrbnRGOjKCF0-xHyamkT5UX9aT3uGc?usp=share_link

8. Comité de obra.

En la semana se realizaron dos comités de obra para hacer seguimiento detallado al avance y ejecución de las obras con el fin de intentar garantizar la terminación de las obras críticas al 29 de enero de 2024 y/o plantear las contingencias que se consideren necesarias.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente a las actas de comité.
https://drive.google.com/drive/folders/1LBTJzArAwBBcQ2iEomEMOX4yXHvoFkIG?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
