INFORME INTERVENTORIA

semana del 28 de abril al 4 de mayo 2024

CONSORCIO INTERCOLSED 022

Informe 27 de Interventoría

Versión N°	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
0	06/05/2024	 KAREN SLENDY RUIZ LABRADOR Inspectora Interventoría	 GUILLERMO DIAZ REINOSO Ingeniero Residente Interventoría	 CLAUDIA MARCELA CASTILLO OSPINA directora Interventoría	Versión Inicial

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

CONTENIDO

1. Introducción 4

2. Plan de manejo ambiental. 4

3. Gestión SST. 4

4. Avances de obra y balance semanal. 5

4.1 Nicolas Buenaventura 5

4.2 DILE 9

4.3 Juan Francisco Berbeo 13

4.4 Colegio Gerardo Paredes 19

4.5 Colegio Heladia Mejía Sede A 22

4.6 Colegio Nueva Zelandia sede B. 25

4.7 Colegio Álvaro Gómez sede B. 29

4.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio 34

4.9 Colegio Domingo Faustino C 36

4.10 Colegio Domingo Faustino D 40

4.11 Colegio Gonzalo Arango 42

4.12 Colegio Vista bella C 45

4.13 Colegio Vista bella A 48

4.14 Colegio la Gaitana (obra por emergencia) 50

4.15 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia) 50

4.16 colegio Prado Veraniego - sede B (emergencia) 53

4.17 Colegio Heladia Mejía Sede B (emergencia) 56

4.18 Colegio Elisa Mujica Sede A – Celestin (obra prioritaria) 59

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.19 Colegio Elisa Mujica Sede B – Arkadia (obra prioritaria). 62

4.20 Gustavo Morales (emergencia) 65

4.21 Rafael Bernal (emergencia) 67

4.22 Aníbal Fernández (emergencia) 68

4.23 Vista bella B (emergencia) 70

5. Balance General 71

7. Registro fotográfico de los frentes de obra. 73

8. Comité de obra. 73

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

INFORME DE INTERVENTORÍA No.27

1. Introducción

El equipo de interventoría del contrato para "OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO a la fecha ha realizado las siguientes actividades durante la semana del 28 de abril al 4 de mayo de 2024.

2. Plan de manejo ambiental.

La interventoría realizó visitas a los frentes de trabajo para realizar un seguimiento y control para verificación del cumplimiento de la gestión ambiental de obra.

En el siguiente enlace puede acceder a la información relacionada con esta área. https://drive.google.com/drive/folders/1tdVnDf4bRXz8Kj07NyJ-K_oL55BdUJCL?usp=drive_link

3. Gestión SST.

Durante el transcurso de la semana por porte de interventoría se realizaron las siguientes actividades:

- Durante el transcurso de la semana, se presentaron 3 novedades de ingreso de personal por parte del contratista.

- Se efectuaron recorridos, en donde se solicitó al contratista la documentación y/o soportes correspondientes para trabajo en alturas. Por otro lado, se solicitan los permisos de trabajo y ATS de las actividades en los colegios Vista Bella C y A.

- Total, a la fecha se reportan 38 trabajadores entre personal antiguo y rotativo, autorizados para ingreso a obra, por parte del contratista e interventoría, incluyendo personal operativo y administrativo.

- Se informa que a la fecha no se han presentado casos de accidentes de trabajo por parte del contratista e interventoría.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4. Avances de obra y balance semanal.

4.1 Nicolas Buenaventura









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













6

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el curso de la semana se evidencia llegada de material para la instalación de tubería y se da inicio al trazado de niveles para la construcción de la trampa de grasas y la caja para la bomba eyectora.

La nueva fecha de entrega de la intervención total de ese colegio será el 30 de mayo de 2024.

Además de lo anterior, el contratista de obra ya entregó el presupuesto actualizado del frente incluyendo el alcance de la nueva red sanitaria y del mantenimiento para las bombas incluyendo las actividades para el mejoramiento de este espacio y del presupuesto de la intervención de la red sanitaria de la cocina; también, entrega nuevo cronograma de actividades para intervención de este espacio, sin embargo, la interventoría realiza observaciones y se encuentra a la espera de la subsanación.


Para este frente de obra tenemos el siguiente avance:

FECHA INICIO	21/11/2023		FECHA FIN OBRA	30/05/2024

Col. Nicolas Buenaventura				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	13,92%	13,92%	13,92%
28 abr - 4 may 24	1,00%	14,92%	1,00%	14,92%

RESUMEN Col. Nicolas Buenaventura			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
13,92%	14,92%	14,92%	AVANCE OPTIMO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

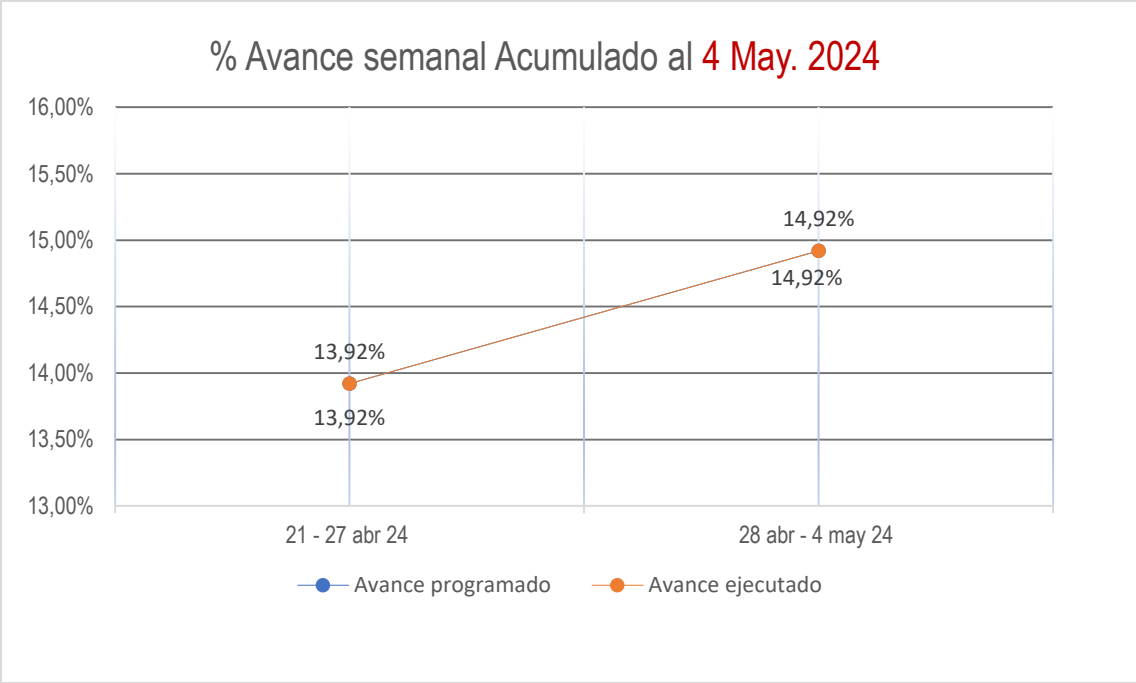

De acuerdo a lo anterior, podemos decir que este frente da un avance de obra optimo desarrollando las actividades de acuerdo a lo programado por el contratista con la nueva fecha de entrega y así poder realizar la entrega dentro del tiempo establecido.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 170.012.137,33 el valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 294.055.886,00) debido a que las cantidades ejecutadas han descendido respecto a lo contemplado inicialmente y algunas de las actividades proyectadas inicialmente no se han requerido ejecutar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance semanal del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.2 DILE














Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



Este frente de obra ya se entregó a la Dile, con funcionamiento de los puestos de trabajo que era la ruta crítica contemplada, se realizó la instalación del soporte del tv para digiturno aún faltan pequeños detalles como pasar la cartelera de las oficinas al auditorio, algunas modificaciones mínimas de la parte eléctrica, la fundida de la gravilla en el acceso a oficinas y algunos retoques de pintura en las ventanas.


En reunión con la SED y personal de la DILE surgieron algunas actividades adicionales como: cambiar unos vidrios de la ventanería que se encuentran en mal estado, adicionar dos puntos al tablero eléctrico para balancear cargas con su respectiva señalización, se debe hacer una caja de paso donde están los tubos a la vista y esta debe ir empotrada al muro.

El contratista de obra avanzo con las actividades adicionales y con los detalles de acabados pendientes que quedaron del alcance inicial, de acuerdo a ello podemos decir que para el avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

DILE				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
26 nov - 02 dic 23	0,98%	37,79%	8,16%	23,16%
3 - 9 dic 23	30,00%	67,79%	10,70%	33,86%
10 -16 dic 23	1,00%	68,79%	6,67%	40,53%
17 - 23 dic 23	25,00%	93,79%	59,47%	100,00%
24 - 30 dic 23	6,21%	100,00%	0,00%	100,00%
31 dic - 3 ene 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN- DILE			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZO

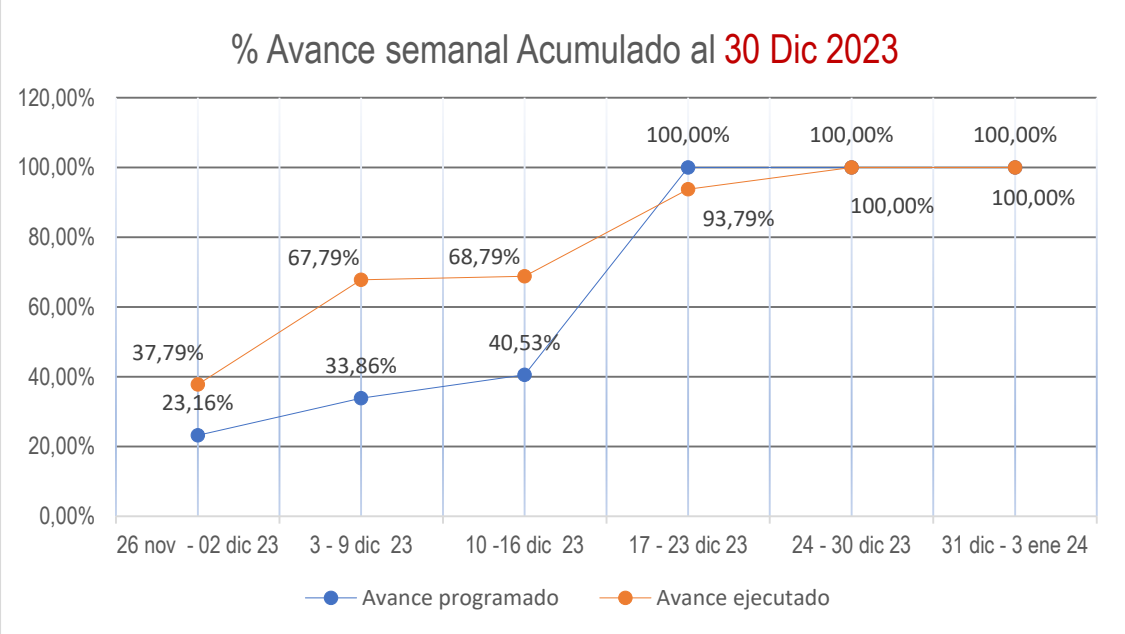

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 79.179.531,67 el valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 61.614.826,0000) debido a que se ejecutaron actividades adicionales al alcance inicial.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.3 Juan Francisco Berbeo









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



En este frente se realizó recorrido en conjunto contratista, interventoría y apoyo a la supervisión de la SED en el que se evidenció un colapso del canal de agua instalado en el área del comedor, causado por las fuertes lluvias presentadas durante la semana, por tanto, se solicitó al contratista la subsanación del mismo y ya fue corregido.

Como alcance adicional en este frente se tiene pendiente la construcción del shut, en el que la interventoría insta al contratista para que inicie con las actividades relacionadas sin mas dilaciones y se pueda realizar la entrega a tiempo el día 20 de mayo de 2024.

El 6 de marzo de 2024 se realizó la entrega del área de comedor para su uso. En el siguiente enlace se podrá acceder al documento correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link


Para el avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	18/11/2023		FECHA FIN OBRA	20/05/2024

Col. Juan Francisco Berbeo sede B				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	83,85%	0,00%	83,85%
28 abr - 4 may 24	0,00%	83,85%	0,00%	83,85%

RESUMEN Col. Juan Francisco Berbeo sede B			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
83,85%	83,85%	83,85%	AVANCE OPTIMO

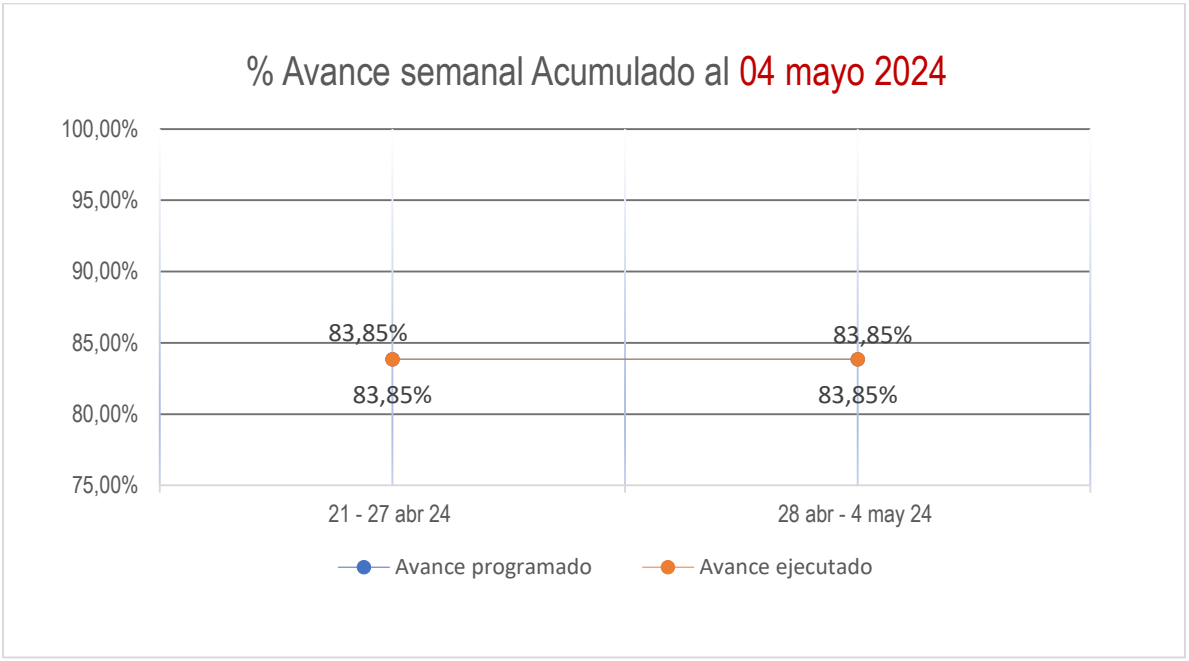

Es importante aclarar que en la medida que se han surgido imprevistos se ha hablado con el señor Rector para informarle sobre los atrasos que se han tenido durante la ejecución. Consecuentemente, la interventoría ha instado al contratista para que refuerce este frente con personal y así poder dar cumplimiento a los compromisos de

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

entrega de la nueva actividad relacionada con la construcción del shut de basura y ultimar detalles de acabados pendientes en el área del comedor.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 169.224.096,00* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 126.012.927,00), debido a que se adicionaron actividades relacionadas con la construcción de los dos muros de fachada que no tenían refuerzo estructural, se adiciona pintura epóxica para los muros y se retira el enchape, se adicionan cantidades relacionadas con el suministro e instalación de nueva cubierta para el área, toda vez que la existente se encontraba en policarbonato y estaba cristalizada, es importante mencionar que aunque las obras del comedor ya están terminadas, quedan pendiente la construcción del shut para basuras y por lo tanto el valor final de intervención del frente puede variar.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.4 Colegio Gerardo Paredes



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195












En este frente ya se ejecutó la instalación de piso en caucho en la zona infantil del colegio y el día sábado 4 de mayo de 2024, se efectuó la instalación de flanches de cubierta en el acceso al colegio y la instalación de tope llantas del parqueadero.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


Se solicitó cita a la señora rectora para realizar la entrega definitiva de las intervenciones el día lunes 6 de mayo de 2024.

A continuación, se observa el avance de obra en este frente:

FECHA INICIO OBRA	11/11/2023		FECHA FIN OBRA	6/05/2024

Col. Gerardo Paredes				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%
28 abr - 4 may 24	10,00%	100,00%	10,00%	100,00%

RESUMEN Col. Gerardo Paredes			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
90,00%	100,00%	100,00%	FINALIZO

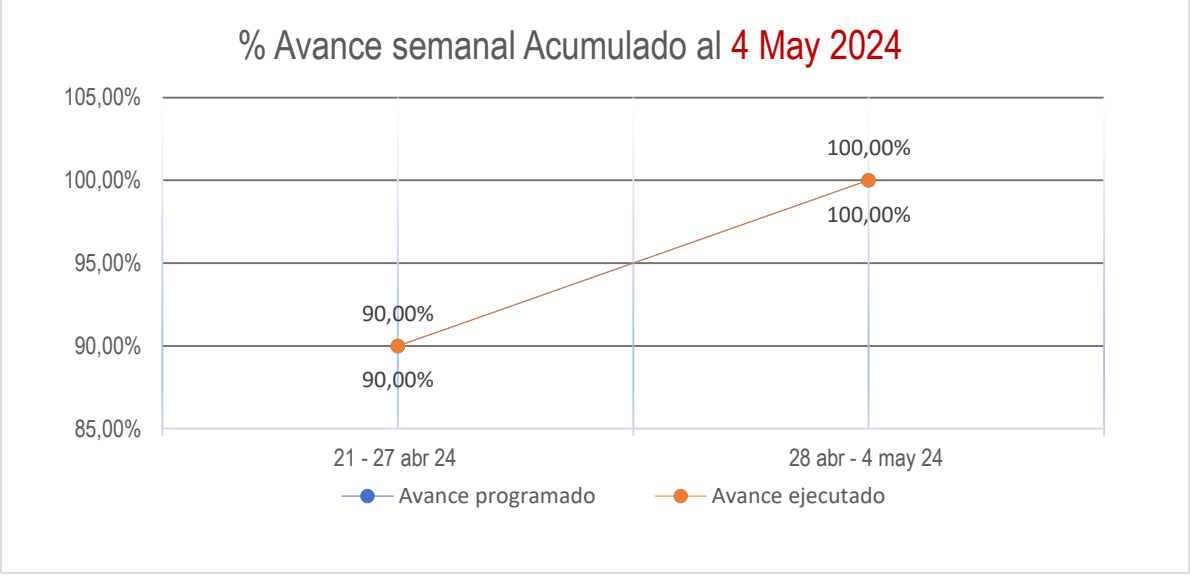

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 228.322.615,93*. El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 193.023.675,00), debido a que inicialmente se tenía previsto sólo la demolición de

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

acabado y alistado de piso, pero por condiciones de obra se requirió la demolición de placa y la construcción de filtro francés lo que conllevo adicionalmente a realizar cambio de la tubería de aguas lluvias en cajas existentes.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.5 Colegio Heladia Mejía Sede A









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


En este frente ya se ejecutó la impermeabilización de la cubierta, y en el curso de la semana se hizo reunión con la señora rectora para contarle sobre la terminación de la obra y coordinar entrega para la semana del siguiente del 5 al 11 de mayo de 2024.

En cuanto avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA	13/11/2023		FECHA FIN OBRA	4/05/2024

Col. Heladia Mejía				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	85,43%	85,43%	85,43%
28 abr - 4 may 24	14,57%	100,00%	14,57%	100,00%

RESUMEN - Col. Heladia Mejía			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
85,43%	100,00%	100,00%	FINALIZO

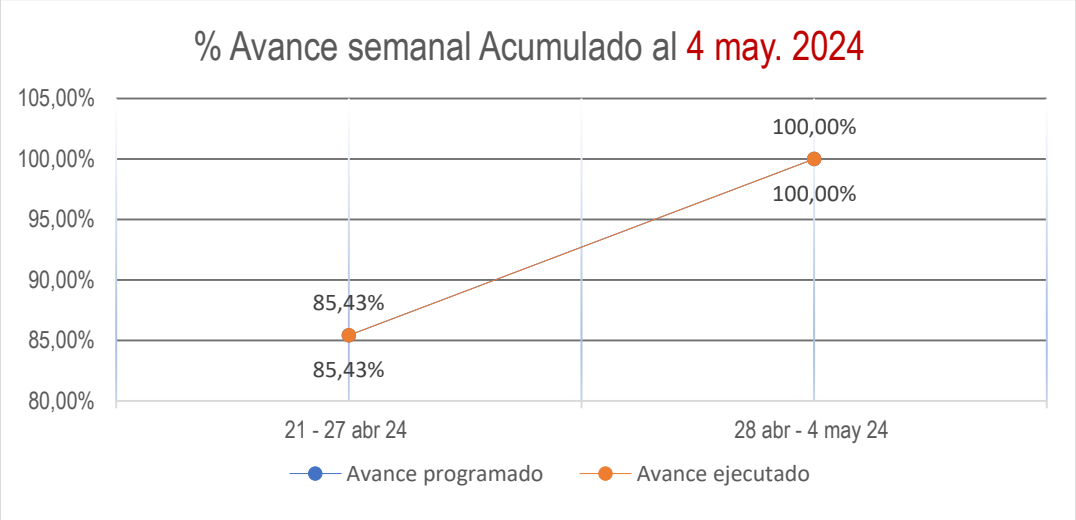

En este frente se evidencia un avance óptimo de obra, pues ya finalizó la impermeabilización de la cubierta y se definió qué por el momento, no se ejecutará la

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

instalación de la baranda de acceso a cubierta, actividad que será evaluada presupuestalmente; una vez se tenga el balance definitivo se tomará la decisión.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 137.517.682,11. El valor de presupuesto disminuyó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 324.266.586,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente disminuyeron; así mismo se eliminaron actividades relacionadas a la ampliación de la tienda escolar de acuerdo a la directriz del ingeniero de apoyo a la supervisión de la SED para balance de presupuesto, toda vez que en el desarrollo de las obras surgieron actividades no contempladas necesarias en la ejecución que se originaron por las demoliciones y muros en mal estado, cubiertas en malas condiciones, entre otros.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.6 Colegio Nueva Zelandia sede B.









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


Durante el curso de esta semana el contratista finiquito los pendientes de acabados; de esta manera se logró realizar en la misma semana, el día 2 de mayo de 2024 la entrega total de las intervenciones en este frente a la almacenista del colegio y al señor rector; queda pendiente por parte del contratista la entrega del manual de mantenimiento. Para acceder al documento puede ingresar al siguiente enlace. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

En cuanto avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA	17/11/2023		FECHA FIN OBRA	1/05/2024

Col. Nueva Zelandia sede B				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	94,66%	94,66%	94,66%
30 abr - 4 may. 24	5,34%	100,00%	5,34%	100,00%

RESUMEN - Col. Nueva Zelandia sede B			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
94,66%	100,00%	100,00%	FINALIZO

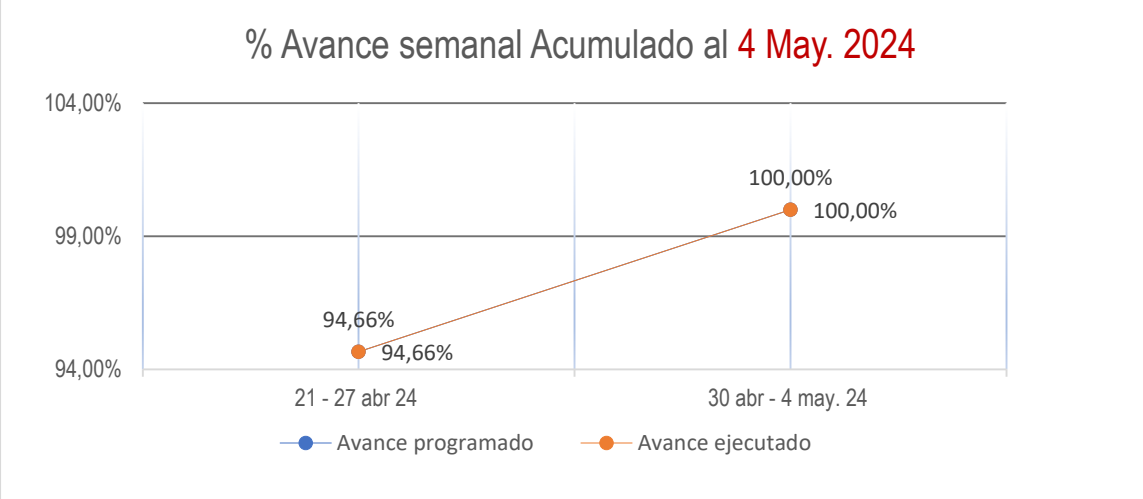

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por el momento, el valor de este frente está en $ 206.447.501,32 aumentando respecto al presupuesto inicial ($ 185.072.687,00) debido a que no se había contemplado en el presupuesto inicial la actividad de picado de membrana, la demolición de mayor cantidad de alistado ya que en las placas de a terraza al hacer el picado de membrana este se ha ido levantando, por lo que se hizo necesario demoler más alistado y reconstruir el relleno y la placa de concreto.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.7 Colegio Álvaro Gómez sede B.





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

















Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente se realizó recorrido con el contratista para identificar los detalles pendientes a la fecha encontrando: la corrección de la filtración en la canal antigua en el bloque donde se ejecutó cambio de cubierta; reparación de la teja que se encontraba en mal estado en un reborde; instalación de lámpara en el punto fijo de las escaleras.


Para el avance de obra tenemos:

FECHA INICIO OBRA	18/11/2023		FECHA FIN OBRA	17/05/2024

Col. Alvaro Gomez sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
21 - 27 abr 24	0,00%	97,53%	97,53%	97,53%
28 abr - 04 may 24	0,00%	97,53%	0,00%	97,53%

RESUMEN - Col. Alvaro Gomez sede B			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
97,53%	97,53%	97,53%	AVANCE OPTIMO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

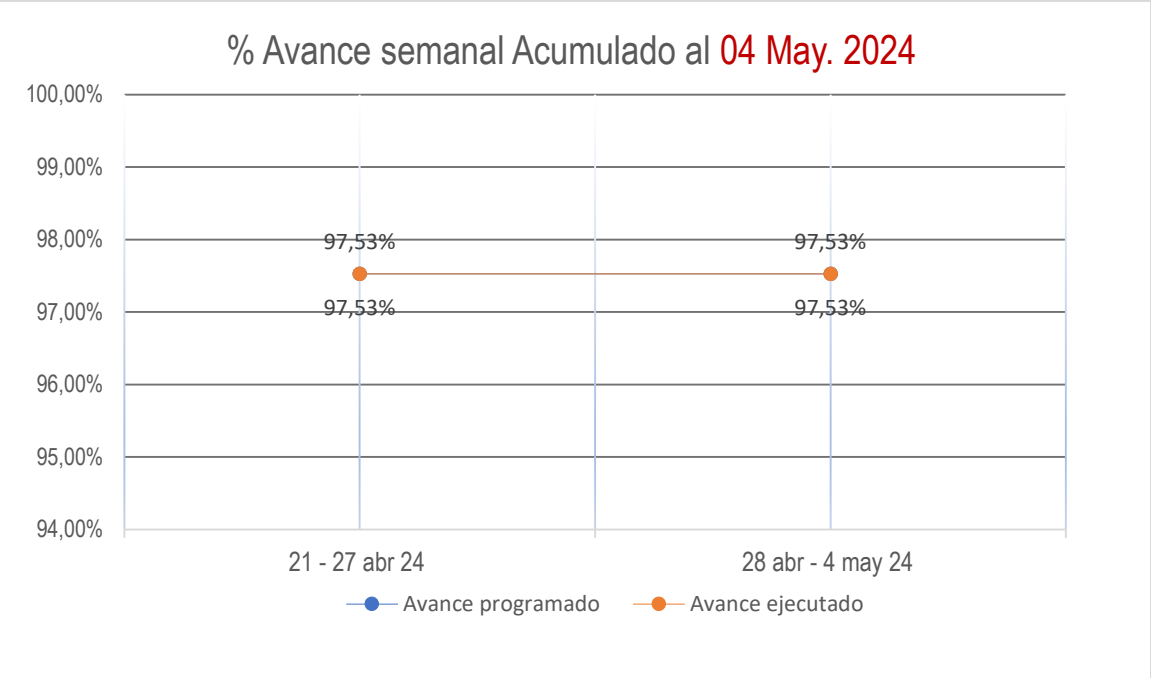

De acuerdo a lo anterior podemos evidenciar que este frente el alcance inicial ya culminó, sin embargo, se encuentran pendientes algunos detalles de acabados y una actividad adicional como la filtración de la canal antigua y por ello se define fecha de entrega total del frente el día 17 de mayo de 2024.

Es importante mencionar que en este colegio se han realizado dos entregas parciales para el uso de las áreas. En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondientes.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.

Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 249.150.185,00; valor que disminuyó con respecto al valor presupuestado ($ 419.274.985,00); su reducción se debe a que bajaron las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y pintura de vigas y columnas en el patio.

Es importante aclarar que el ítem *suministro e instalación baldosa granito 33 x 33 pulido, incluye guarda escoba biselado,* en el pasillo del primer piso y el baño, no se realiza guarda escoba, pero se hace franja en granito pulido al costado de la tableta granito

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

pulido para guardar la armonía de los acabados existentes y por ende se establece que ese granito pulido “reemplazaría” el guarda escoba considerado en el ítem.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.8 Colegio Jorge Mario Bergoglio









En el transcurso de la semana el contratista culmino con la pintura y los detalles de acabados pendientes del cerramiento del costado sur del colegio.

Además de lo anterior, en comité se definió que se instalaría una malla de altura 1,20 m aproximadamente dando solución al problema presentando en el colegio debido a

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195


que los niños están sacando la cabeza por las rejas, actividad que a la fecha está pendiente por ejecutar.

En la siguiente imagen se observa el avance de este frente:

FECHA INICIO OBRA	27/11/2023		FECHA FIN OBRA	20/05/2024

Col. Jorge Mario Bergoglio				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	84,73%	84,73%	84,73%
28 abr - 4 may 24	10,00%	94,73%	10,00%	94,73%

RESUMEN - Col. Jorge Mario Bergoglio			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
84,73%	94,73%	94,73%	AVANCE OPTIMO

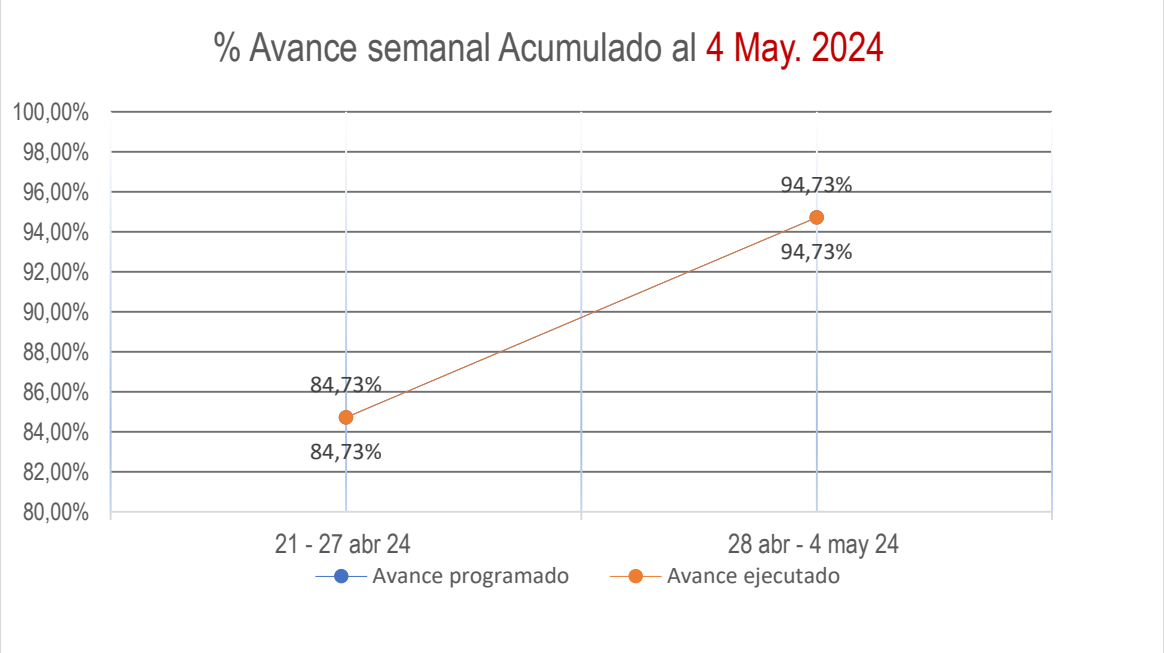

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Pese a que se instaló el cerramiento aún esta la actividad adicional de la instalación de la malla ondulada en la parte inferior del cerramiento, para ello se estableció entrega total del frente el día 20 de mayo de 2024.

En el siguiente enlace podrá acceder a los documentos de entrega correspondiente a los cuartos fríos.
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link.

Por el momento, el presupuesto de este colegio tiene un valor total de $ 64.125.146,40; valor que ha disminuido con respecto al valor presupuestado ($145.967.475); su reducción se debe a que han bajado las cantidades contempladas inicialmente y algunas actividades no se ejecutaron como la construcción del cárcamo y el cambio del piso de caucho del parque infantil.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.9 Colegio Domingo Faustino C





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195








Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el curso de la semana el contratista no adelanto obra, no obstante, se realizó recorrido y manifiesta que realizará la parte eléctrica de la zona de servicios la siguiente semana (5 mayo al 11 de mayo de 2024). También se definió que en la parte de atrás de la zona de servicios se deberá prolongar la cubierta evitando estancamientos de agua por lluvia.


Para este frente se hizo entrega del colegio para operación el día de 4 marzo de 2024 al colegio, quedando algunos detalles pendientes que se irán atendiendo en el transcurso de las semanas. En el siguiente link podrá acceder al documento de entrega. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

En la imagen se observa el avance de este frente a la fecha:

FECHA INICIO OBRA	28/11/2023		FECHA FIN OBRA	20/05/2024
Col. Domingo Faustino sede C				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	81,11%	81,11%	81,11%
28 abr - 4 may 24	0,00%	81,11%	0,00%	81,11%

RESUMEN - Col. Domingo Faustino sede C			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
81,11%	81,11%	81,11%	AVANCE OPTIMO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

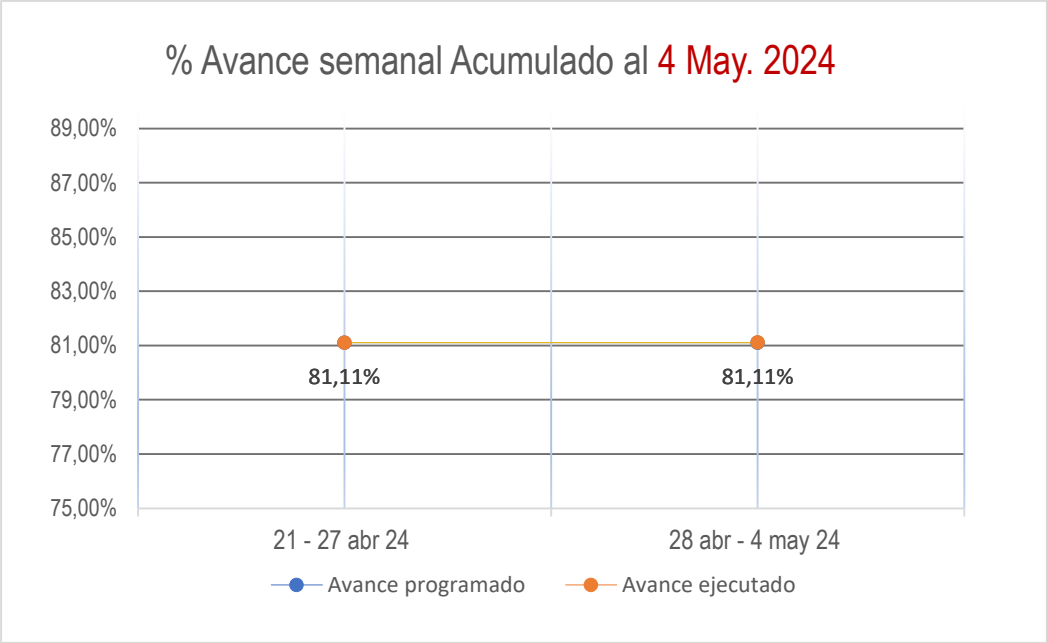

De lo anterior podemos decir, que los imprevistos encontrados, han llevado a una obra de ejecución más lenta obra toda vez que implicó en los baños excavaciones más profundas para investigar el estado de la construcción existente y rellenos no previstos; el desmonte de teja española en área del baño por mal estado y son actividades que no se tenían contempladas en las ejecuciones iniciales ni en los cronogramas.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 318.562.642,05, este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial ($ 223.201.384,00), debido a las actividades adicionales encontradas durante el desarrollo de las obras del baño; se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que actualmente se está ejecutando la construcción de la zona de servicios y hasta que no se termine no se podrá tener el valor real de ejecución.

En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.10 Colegio Domingo Faustino D








En el curso de la semana el contratista no avanzo en actividades; no obstante, se realizó recorrido y el contratista manifiesta que realizará la parte eléctrica de la zona de servicios la siguiente semana (5 mayo al 11 de mayo de 2024). También se definió que en la parte de atrás de la zona de servicios se deberá prolongar la cubierta evitando estancamientos de agua por lluvia.


Para este frente se hizo entrega del colegio para operación el día de 4 marzo de 2024 al colegio, quedando algunos detalles pendientes que se irán atendiendo en el transcurso de las semanas. En el siguiente link podrá acceder al documento de entrega. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En la imagen se observa el avance de este frente a la fecha:

FECHA INICIO OBRA	1/12/2023		FECHA FIN OBRA	20/05/2024
Col. Domingo Faustino sede D				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	74,26%	74,26%	74,26%
28 abr - 4 may 24	0,00%	74,26%	0,00%	74,26%

RESUMEN - Col. Domingo Faustino sede D			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
74,26%	74,26%	74,26%	AVANCE OPTIMO

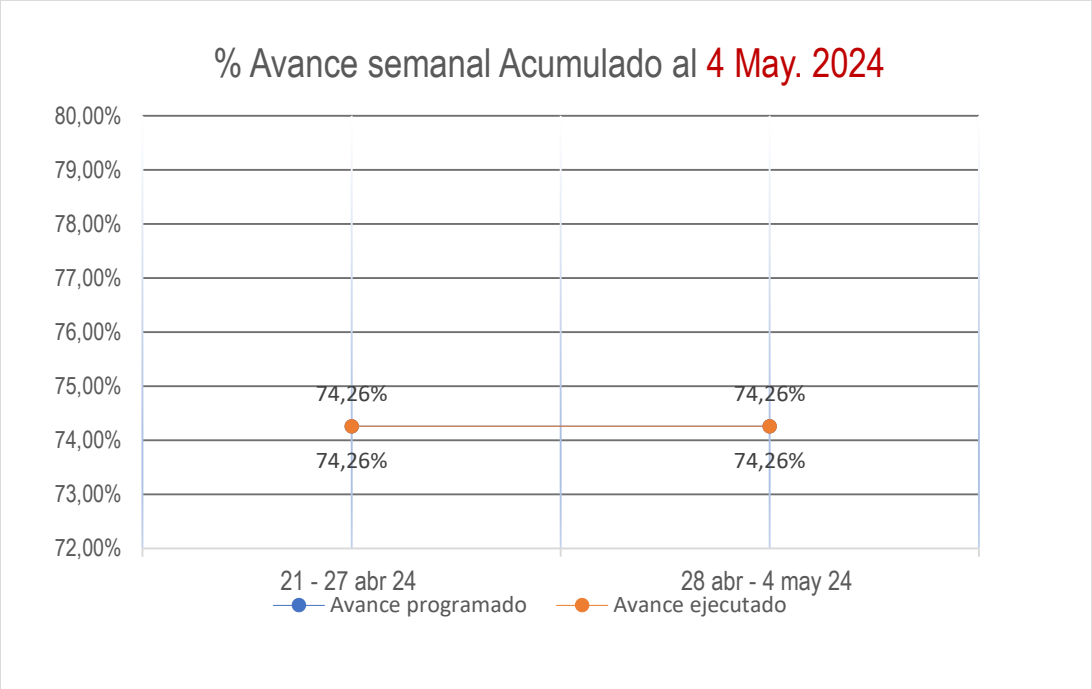

En este frente se evidencia un avance de obra optimo, aun se tiene pendiente las siguientes actividades:

- Instalación de parte eléctrica.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Diseño de fachada
- Pintura tipo tráfico cancha en piso exterior a la zona de servicios.

Dado los pendientes en el frente, se define entrega total de la obra el día 20 de mayo de 2024.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 299.741.515,47 este valor aumentó con respecto al presupuesto inicial $ 225.620.167,00), debido a que han incrementado las cantidades contempladas inicialmente. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de cambios toda vez que la zona de servicios está en construcción y hasta que no se termine, no se podrá establecer el valor definitivo del frente. En el siguiente enlace puede acceder al balance del presupuesto: https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link .

4.11 Colegio Gonzalo Arango



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









Esta semana no se realizaron actividades en el frente, se tiene pendiente las actividades relacionadas con el domo, el contratista ha informado que se encuentra en conversaciones con la empresa encargada del domo y están detallando los planos de taller para la construcción del mismo.

Además, entrega nuevo cronograma de actividades para intervención de este espacio, sin embargo, la interventoría realiza observaciones y se encuentra a la espera de la subsanación. También entrega un presupuesto actualizado con la intervención total del frente.


En cuanto a avance de obra tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	30/11/2023		FECHA FIN OBRA	4/03/2024

Col. Gonzalo Arango				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%
28 abr - 4 may 24	0,00%	30,00%	0,00%	30,00%

RESUMEN - Col. Gonzalo Arango			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
30,00%	30,00%	30,00%	AVANCE OPTIMO

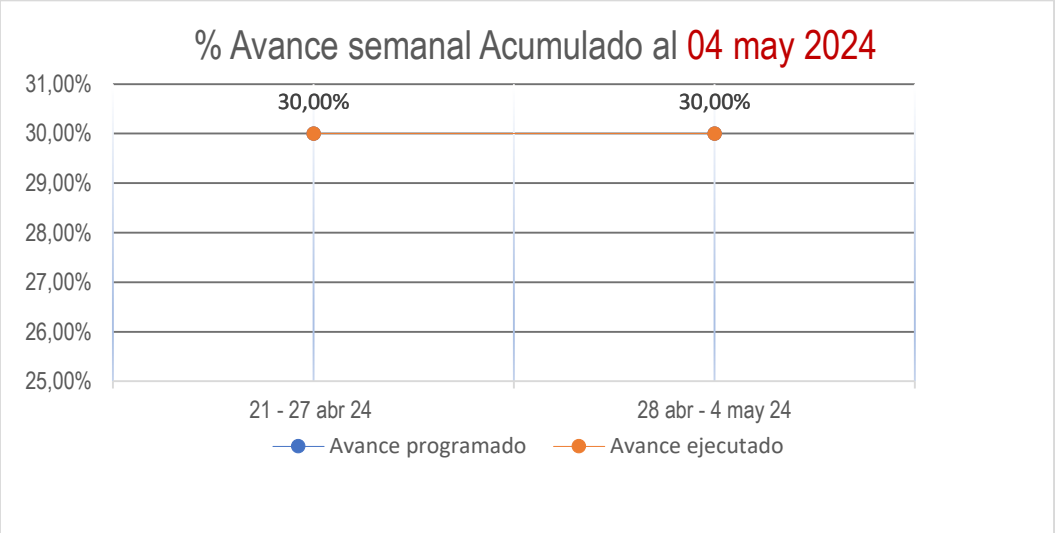

De acuerdo a lo anterior, la interventoría ha instado al contratista para iniciar con las actividades pendientes faltantes y entregar la obra dentro de los tiempos establecidos que tienen como fecha el día 29 de junio.

Por ahora, el presupuesto de este frente tiene un valor de $ 246.574.604,91 este valor disminuyó con respecto al presupuesto inicial concebido ($ 313.025.315,00), debido a que han bajado las cantidades y alcances contemplados inicialmente se redujeron. Se debe tener en cuenta que este valor es susceptible de grandes cambios toda vez que están pendientes las actividades que se ejecutaran en el domo.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.12 Colegio Vista bella C









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





En este frente se avanzo el contratista de obra fundio columnas para el auditorio, adicionalmente se ejecuto un pañete en la parte inferiror de la fachada y se pintó.


Ademas de lo anterior, el dia 2 de mayo de 2024 se realizo un comité con la rectora para hacer seguimineto del proyecto.

En cuanto avance de obra tenemos respecto al cronograma inicial tenemos:

FECHA INICIO OBRA	5/12/2023		FECHA FIN OBRA	15/06/2024
Col. Vista Bella sede C				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	4,00%	70,53%	70,53%	70,53%
28 abr - 4 may 24	5,00%	75,53%	5,00%	75,53%

RESUMEN - Col. Vista Bella sede C			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
70,53%	75,53%	75,53%	AVANCE OPTIMO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

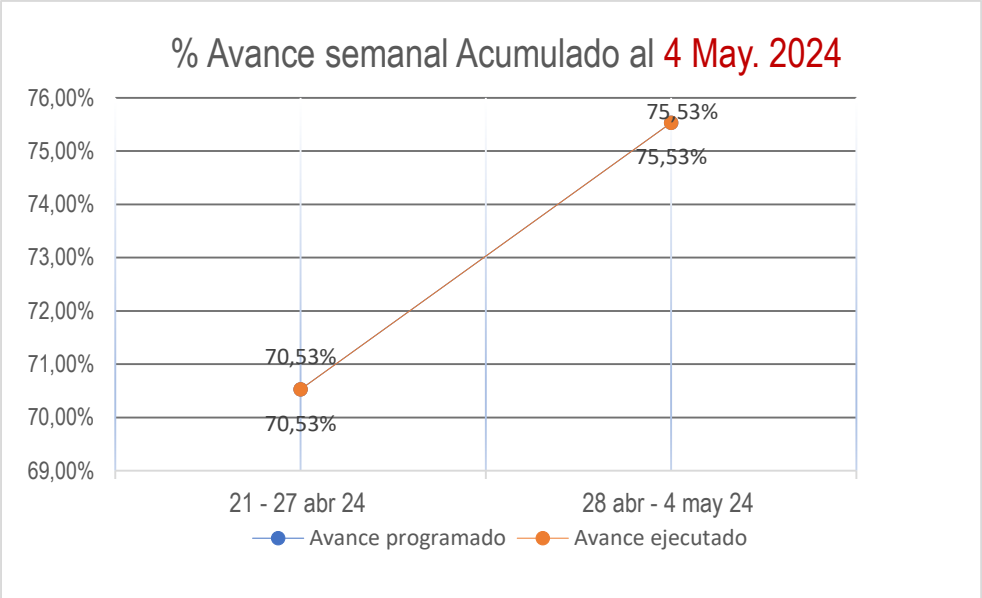

Se establecieron dos fechas de entrega para este frente:

- 20 de mayo: se realizará entrega del bloque norte con la culminación de detalles de acabados que se encuentran pendientes.

- 15 de junio de 2024: se realizará entrega del auditorio; pintura y ventanería de los nuevos vanos del patio central.

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor $ 673.607.349,37. El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($606.929.867,00), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron por condiciones de la obra como fue la demolición de mampostería, en la zona donde se adecuará un auditorio.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.13 Colegio Vista bella A












Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Durante esta semana el contratista da inicio a la excavación para el tendido de tubería hidrosanitario e inició la demolición de los enchapes de piso de los salones.

Para avance de obra en este frente tenemos:

Col. Vista Bella sede A				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	1,00%	2,00%	1,00%	2,00%
28 abr - 4 may 24	5,00%	7,00%	5,00%	7,00%

RESUMEN - Col. Vista Bella sede A			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
7,00%	7,00%	7,00%	AVANCE OPTIMO

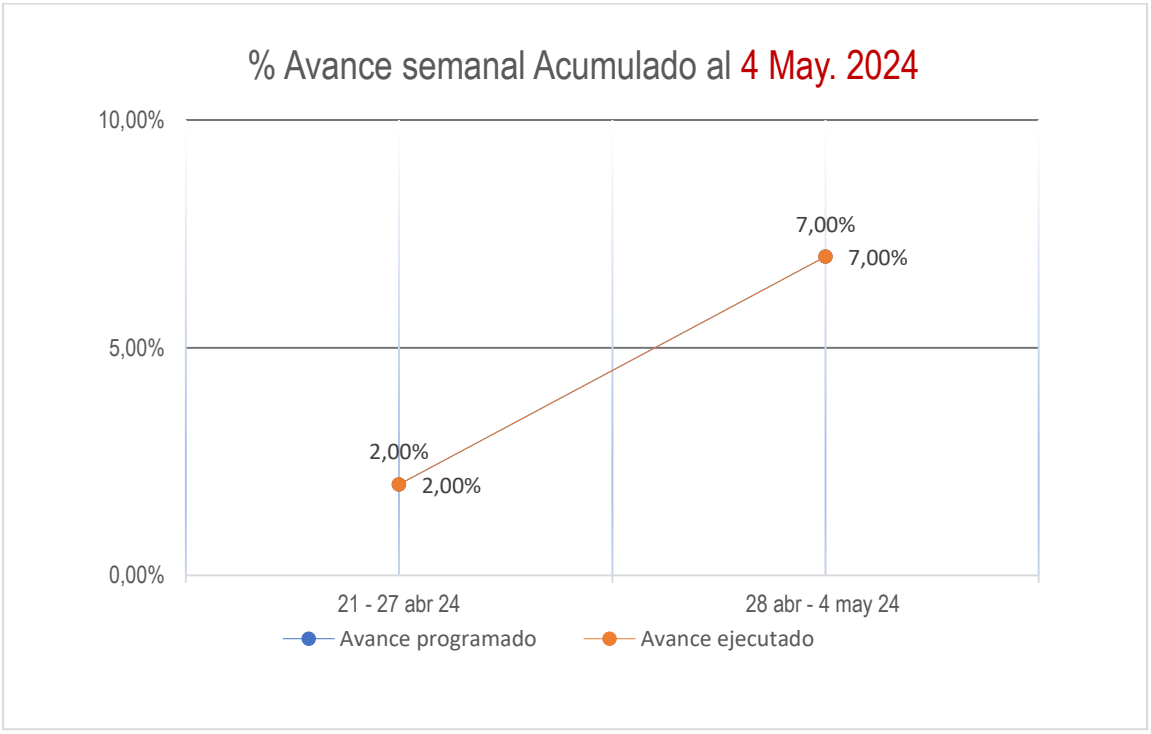

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de *$ 690.104.833,93.* El valor de presupuesto aumento con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 617.662.816), debido a que algunas cantidades contempladas inicialmente aumentaron por condiciones de la obra como fue la demolición de mampostería, en la zona donde se adecuará un auditorio.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

4.14 Colegio la Gaitana (obra por emergencia)

La Sed en comité informa que ya se puede dar inicio a la intervención en este frente, a solicitud del contratista se hará nuevamente visita para retroalimentar alcance, verificar nuevamente presupuesto y así enviar esquemas a interventoría de la solución definitiva para su aprobación.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente del presupuesto https://drive.google.com/drive/folders/1_ZK5GuNODwdHyjj42O5RGP53fPdbPjRC?usp=drive_link

4.15 Colegio la toscana Jardín infantil María Cristina Salazar (emergencia)



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195






Se realiza intervención en el colegio en el área de los tableros eléctrico y baños ubicados en la cocina. Realizando las siguientes actividades:

Baño: para los muros se realizó enchape a 1,76 m de altura desde donde inicia la media caña del piso, y pintura epóxica en la parte restante del muro.
Cuarto de tableros eléctricos: Se realizo la pintura epóxica total del área.
En cuanto a avance de obra tenemos:

FECHA INICIO OBRA	20/01/2024		FECHA FIN OBRA	26/01/2024
Jardin Maria Cristina Salazar (emergencia)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
14 - 20 ene 24	75,00%	75,00%	50,00%	50,00%
21 - 27 ene 24	25,00%	100,00%	50,00%	100,00%
28 ene - 3 feb 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN -Jardin Maria Cristina Salazar (emergencia)			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZADO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

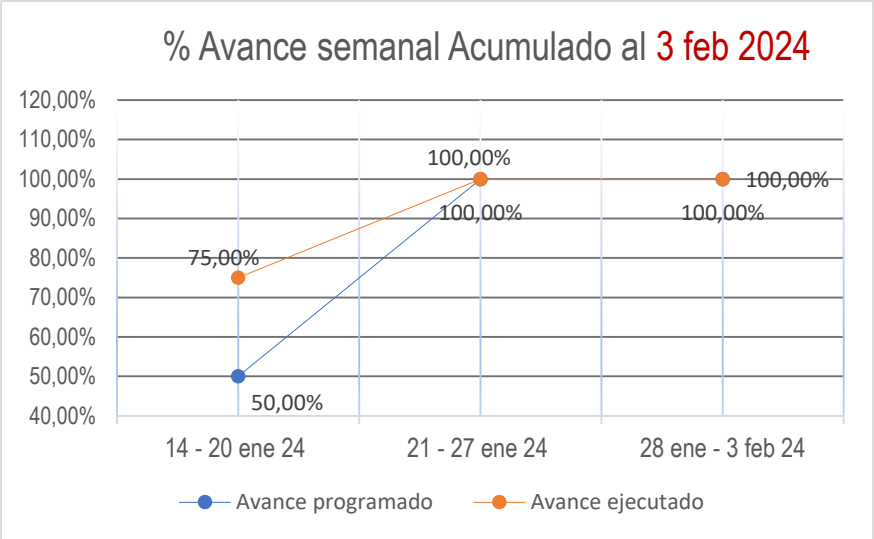

De acuerdo a lo anterior podemos decir que esta intervención se da por finalizada el día sábado 27 de enero 2024 y se realizó entrega al colegio. En el siguiente enlace podrá acceder al acta de entrega realizada. https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de *$ 3.043.798,00.* El valor de presupuesto aumentó con respecto al presupuesto diagnóstico inicial ($ 2.418.600,00), debido a que algunas actividades contemplaron inicialmente aumentaron sus cantidades. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente al balance.
https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. A la visita inicial realizada al visita realizada y presupuesto del colegio https://drive.google.com/drive/folders/1nke9ZqxVIX-sPVVW0Qr25M10ZgV_02wR?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.16 colegio Prado Veraniego - sede B (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195









En este frente ya se finalizaron las actividades del alcance inicial, se evidencian algunos detalles en la instalación de algunos flanches y la interventoría se encuentra a la espera de esta corrección.


En cuanto al avance de obra en este frente tenemos:

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

FECHA INICIO OBRA	2/01/2024		FECHA FIN OBRA	20/05/2024

Col. Prado Veraniego (emergencia)				
Semana balance	Avance ejecutado Semanal	Avance semanal ejecutado Acum	Avance Semanal programado	Avance semanal programado Acum
21 - 27 abr 24	0,00%	96,00%	96,00%	96,00%
28 abr - 4 may 24	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%

RESUMEN - Col. Prado Veraniego (emergencia)			
Avance anterior	Avance actual	Avance programado	Ejecutado Vs. Programado
96,00%	96,00%	96,00%	AVANCE OPTIMO

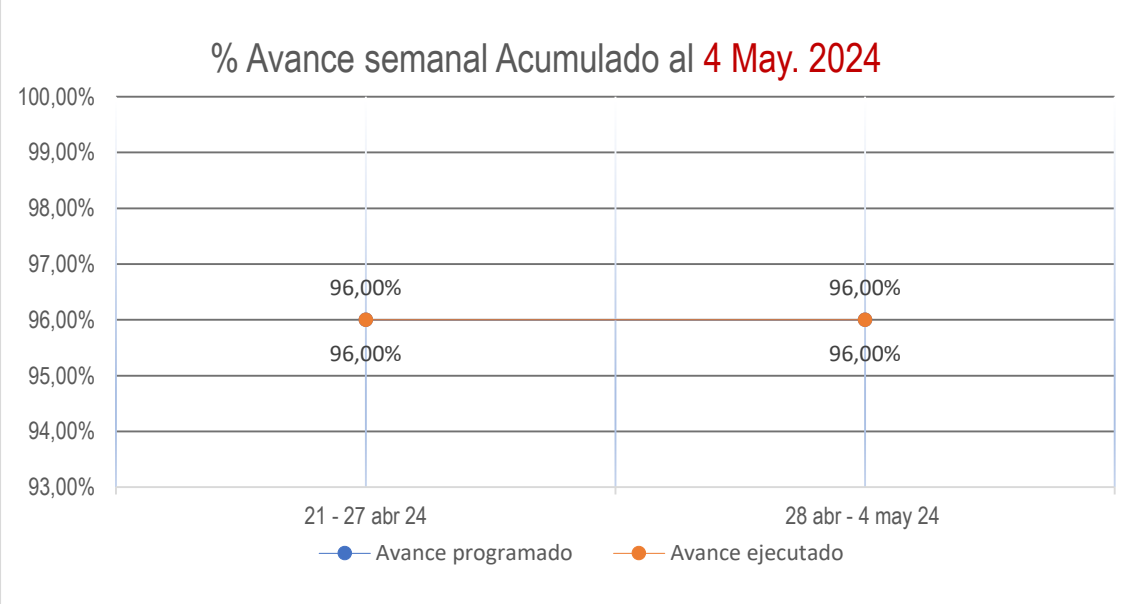

De lo anterior podemos decir, que pese a la culminación del alcance de la obra aun no se designa todo el porcentaje debido a que los algunos flanches que se instalaron les hace falta mejorar su ajuste y anclaje, por tanto, la interventoría no ha dado aval para recibir este frente y una vez sean subsanadas las observaciones, el frente se recibirá a satisfacción.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Por ahora para esta emergencia se tiene un presupuesto de *$ 6.696.587,76.* En el siguiente enlace podrá acceder a la información del presupuesto https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iyd79BxuFeK5AuSs7gFSMFLSAN0bpf2H/edit?usp=drive_link&ouid=117435936827953543212&rtpof=true&sd=true

4.17 Colegio Heladia Mejía Sede B (emergencia)










Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

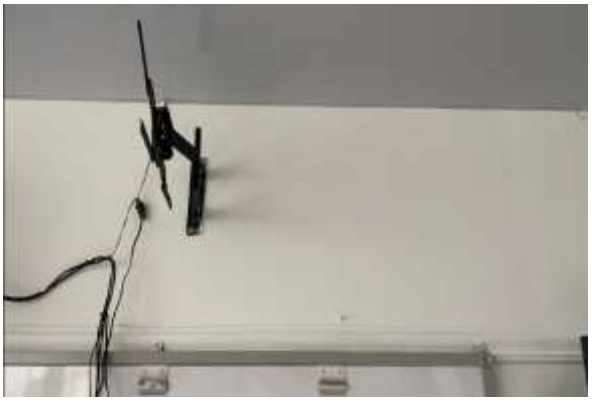



Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195




Durante el curso de esta semana el contratista remató los pendientes de acabados, además, en el curso de la semana se hizo reunión con la señora rectora para contarle sobre la terminación de la obra y coordinar entrega para la semana del siguiente del 5 al 11 de mayo de 2024.

En cuanto avance de obra en este frente tenemos:

FECHA INICIO OBRA	20/02/2024		FECHA FIN OBRA	5/05/2024
Col. Heladia Mejia sede B				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24 - 30 mar 24	49,30%	80,30%	12,00%	81,00%
31 mar - 6 abr 24	7,00%	87,30%	10,00%	91,00%
7 - 13 abr 24	5,00%	92,30%	9,00%	100,00%
14 - 20 abr 24	7,70%	100,00%	0,00%	100,00%
21 - 27 abr 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN - Col. Heladia Mejia sede B			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZADO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

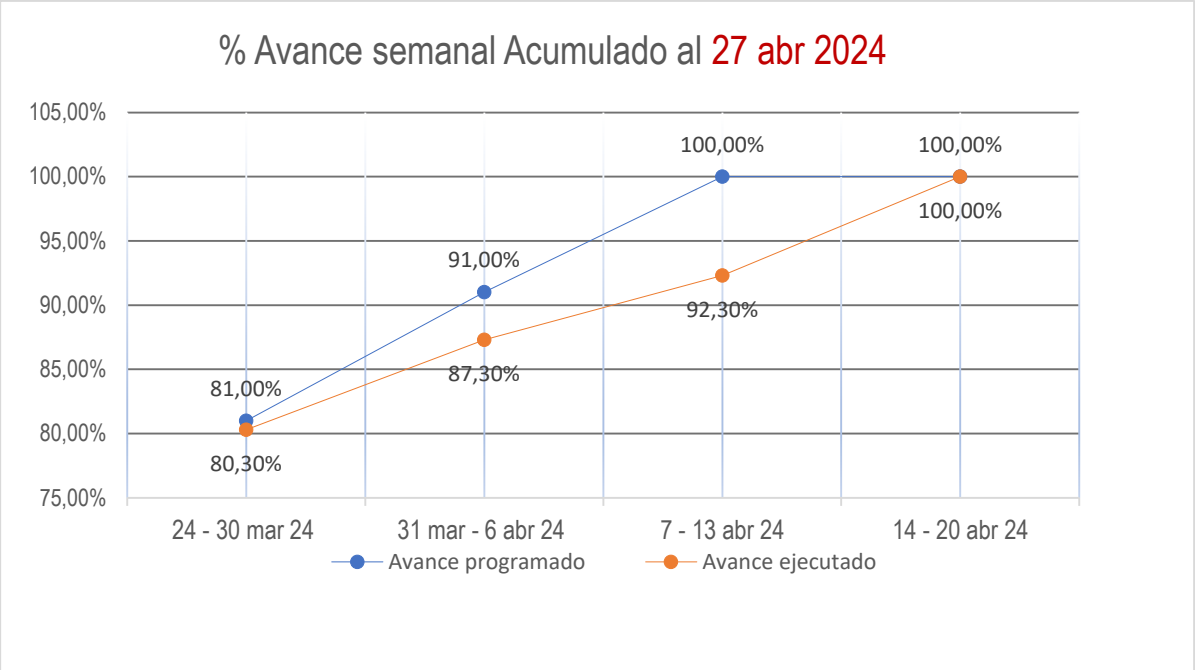

Para este frente se tiene un presupuesto estimado de intervención de $ 26.986.970,00, el cual puede variar luego de que se defina la intervención específica y definitiva a realizar y se concilie con el contratista, dentro del balance general se incluye este valor inicial previsto.

4.18 Colegio Elisa Mujica Sede A – (obra prioritaria)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

En este colegio ya se ejecutó el alcance del proyecto tanto el inicial como las actividades adicionales que en el desarrollo del mismo se iban solicitando, a la fecha el contratista tiene algunos detalles de acabados pendientes como:


- En el cuarto de refrigerios: Detalles de pintura y desmanchado del piso.
- En los baños segundo piso (construcción liviana): corrección de la instalación de la malla para control de palomas e instalación de luminarias.
- En las escaleras la malla perforada presenta oxidación en algunas partes, arreglar donde soporta un paral.
- Primer piso corrección de piso donde se encontraban los puntos sanitarios del baño antiguo de vigilantes y La instalación de una puerta para el nuevo baño de los vigilantes.
- En la cancha retirar los perfiles que se encuentran anclados.
- Aseo de las áreas que se usaron para acopio de materiales y escombros.

Para avance de obra tenemos:

FECHA INICIO OBRA	11/02/2024		FECHA FIN OBRA	20/04/2024
Elisa Mujica sede A (obra prioritaria)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
24-30 marz 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
31 mar - 6 abr 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
7 - 13 abr 24	0,00%	98,00%	0,00%	100,00%
14 - 20 abr 24	2,00%	100,00%	0,00%	100,00%
21 - 27 abr 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN -Elisa Mujica sede A (obra prioritaria)			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

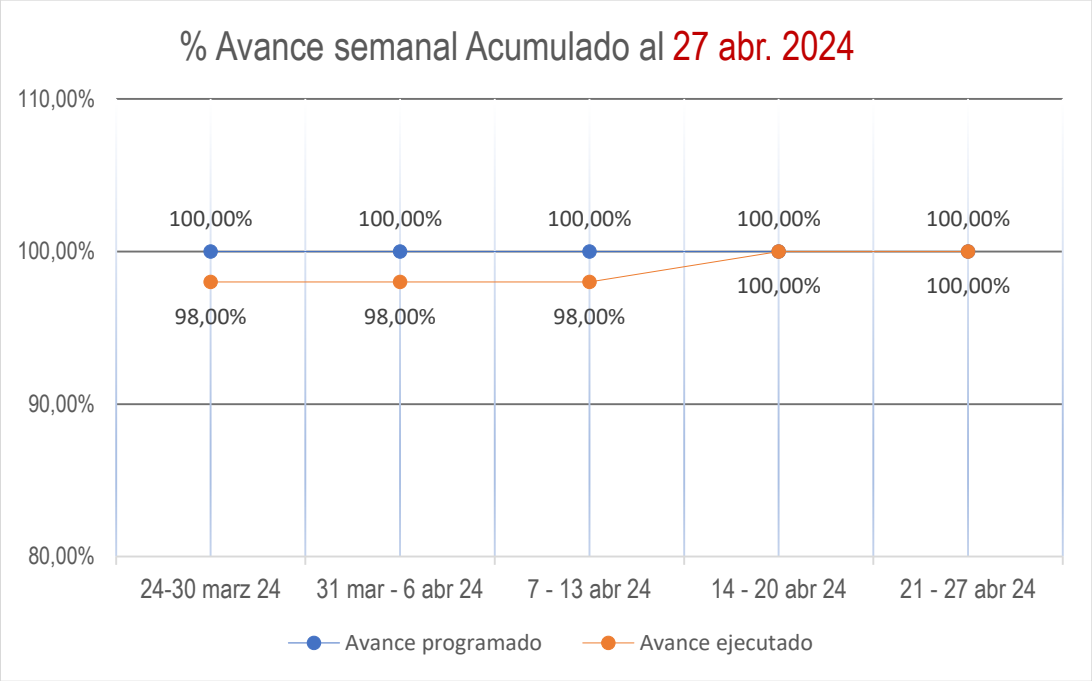

Este frente al ser obra prioritaria y atención inmediata y para ejecución en una semana, Por ahora, el balance del presupuesto de esta emergencia nos queda con un valor de $ 154.015.712,85. Este valor aún está pendiente por conciliación con el contratista, debido a que no se ha liquidado en su totalidad.

4.19 Colegio Elisa Mujica Sede B – (obra prioritaria).





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195











Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

Se realizo entrega al colegio el día lunes 11 de marzo de 2024; durante la entrega salieron algunas actividades adicionales en el aula de sistemas como el retiro de una canaleta, el retoque de la pintura roja y el retiro de cables UTP y como pendientes estaba el cambio de la ventana del cuarto de refrigerios, no obstante, estas actividades ya se atendieron y el frente quedó terminado totalmente.


En el avance de obra tenemos:

FECHA INICIO OBRA	18/11/2023		FECHA FIN OBRA	31/03/2024

Elisa Mujica sede B (emergencia)				
SEMANA BALANCE	AVANCE EJECUTADO SEMANAL	AVANCE SEMANAL EJECUTADO ACUM	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO	AVANCE SEMANAL PROGRAMADO ACUM
25 feb - 2 mar 24	35,00%	95,00%	15,00%	95,00%
3 -9 mar 24	3,00%	98,00%	3,00%	98,00%
10 - 16 mar 24	2,00%	100,00%	2,00%	100,00%
17 - 23 mar 24	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

RESUMEN - Elisa Mujica sede B (emergencia)			
AVANCE ANTERIOR	AVANCE ACTUAL	AVANCE PROGRAMADO	EJECUTADO VS. PROGRAMADO
100,00%	100,00%	100,00%	FINALIZO

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

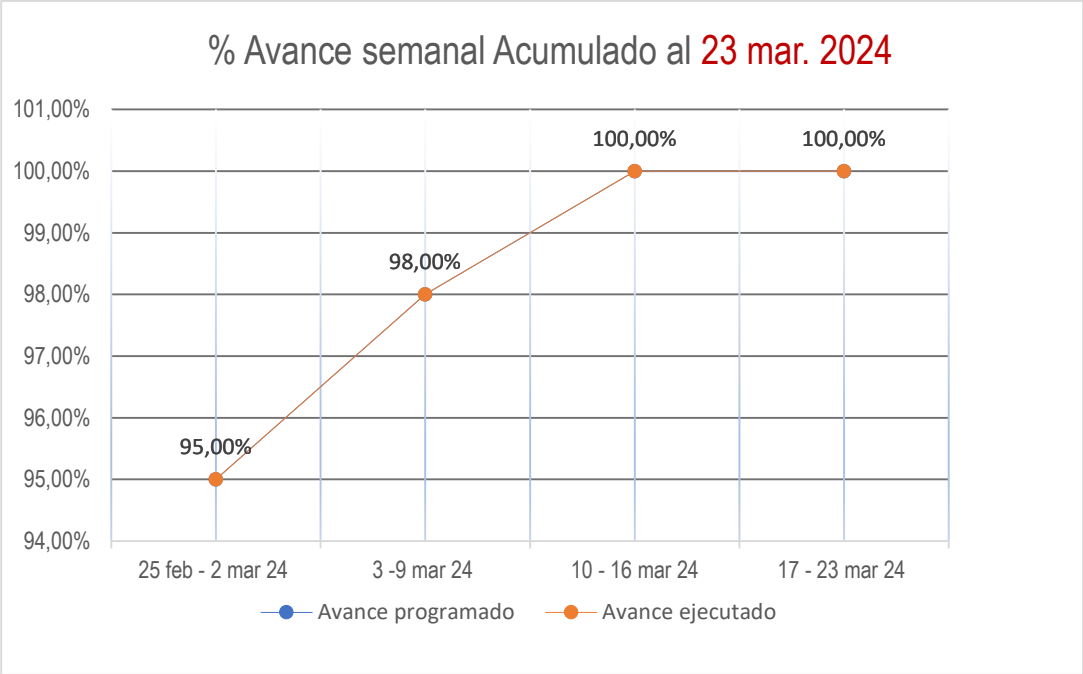

En el siguiente link podrá tener acceso al documento realizó para la entrega
https://drive.google.com/drive/folders/1ipOgD2l8AyIC6X2rH2q3aw8r1nyRJ2Jm?usp=drive_link

4.20 Gustavo Morales (emergencia)





Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195













Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

La SED informo que el colegio requiere cambo de pisos y adecuación de la instalación eléctrica, por ello el contratista de obra entregó presupuesto de las intervenciones allí establecidas por valor de $35.615.906. Se define que en el marco de este contrato no se atenderán estas actividades.

4.21 Rafael Bernal (emergencia)









El día 12 de marzo se realizó visita en conjunto interventoría y Contratista de obra para tomar medidas de la caja para el macro medidor que se debe adecuar; medir el tanque de almacenamiento de agua que se debe impermeabilizar y unos cambios de tubería. Por lo anterior, el contratista entregó presupuesto para esta intervención por valor de $10.703.010. Se define que en el marco de este contrato no se atenderá esta actividad.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.22 Aníbal Fernández (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195



El día 11 de marzo interventoría y Empresa contratista de obra realizan visitas al colegio para realizar toma de medias y cotizar toda la parte eléctrica (que se necesita para funcionamiento del colegio) y corrección de filtraciones de agua por cubierta (requiere cambio de cubierta). El contratista presentó cotización para estas intervenciones por valor de $113.036.530. Se define que estas actividades no se ejecutarán en el marco de este contrato.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

4.23 Vista bella B (emergencia)









Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195





Este frente ya se atendió en su totalidad el alcance de la emergencia Por ahora, el balance de este contrato nos queda con un valor de $ 6.562.527,80

5. Balance General

A la fecha tenemos:

RESUMEN BALANCE TOTAL	
VALOR CONTRATO	PPTO ACTUAL
$ 3.815.202.876	$ 3.815.202.876

Colegio	tipo de obra	ppto diagnostico inicial	ppto entregado por contratista	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 294.055.886,00	$ 169.766.293,76	$ 170.012.137,33
Dile	Contractual	$ 61.614.826,00	$ 79.464.582,00	$ 79.179.531,67
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 126.012.927,00	$ 169.224.096,00	$ 169.224.096,00
Gerardo Paredes	Contractual	$ 193.023.675,00	$ 244.361.863,00	$ 246.574.604,91
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 324.266.586,00	$ 135.567.829,00	$ 137.517.682,11
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 185.072.687,00	$ 202.877.848,00	$ 206.447.501,32
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	Contractual	$ 419.274.985,00	$ 249.150.185,00	$ 249.150.185,00
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 145.967.475,00	$ 60.895.758,00	$ 64.125.146,40
Gonzalo Arango	Contractual	$ 313.025.315,00	$ 229.211.325,00	$ 230.840.174,82
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 223.201.237,00	$ 318.448.214,00	$ 318.562.642,05
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 225.620.167,00	$ 278.623.293,00	$ 299.741.515,47
Vista Bella sede C	Contractual	$ 606.929.867,00	$ 666.024.513,00	$ 673.607.349,37
Vista bella sede A	Contractual	$ 617.662.816,35	$ 758.754.172,81	$ 690.104.833,93
Maria Cristina Salazar	emergencia	$ 100.000.000	$ 3.872.908,00	$ 3.043.798,00
Prado Veraniego sede B	emergencia		$ 9.216.307,00	$ 6.696.587,76
Heladia Mejia Sede B	emergencia		$ 26.986.970,00	$ 26.340.900,56
Vista Bella sede B	emergencia		$ 6.732.347,18	$ 6.562.527,80
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria		$ 152.668.289,95	$ 154.015.712,85
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria		$ 79.292.601,42	$ 83.455.948,64
TOTALES		**$ 3.835.728.449,35**	**$ 3.841.139.396,12**	**$ 3.815.202.876,00**

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

El balance del contrato está dentro del valor presupuestado inicialmente para las obras, se tienen contempladas un estimado de las cantidades por actividades adicionales dadas por la condición de la obra como la construcción nueva del Vista Bella sede C, la construcción del Domo en el Gonzalo Arango, etc. Para llegar al valor exacto del contrato fue necesario hacer algunos ajustes al alcance y presupuesto previstos para el Vista Bella Sede A. Sin embargo, dada la realidad y los imprevistos que se presenten en los frentes, este balance está sujeto a modificaciones.

A continuación, se presenta el desglose del balance anterior por cada uno de los frentes intervenidos:

Colegio	tipo de obra	Valor actual ppto revisado y ajustado por interventoria	Porcentaje de incidencia del valor del contrato	valor ejecutado y pagado a la fecha	Porcentaje ejecutado y pagado a la fecha
Nicolas Buenaventura	Contractual	$ 170.012.137,33	4,46%	$ 33.913.487,98	0,89%
Dile	Contractual	$ 79.179.531,67	2,08%	$ 71.484.953,53	1,87%
Juan Francisco Berbeo	Contractual	$ 169.224.096,00	4,44%	$ 115.527.839,04	3,03%
Gerardo Paredes	Contractual	$ 246.574.604,91	6,46%	$ 240.904.348,13	6,31%
Heladia Mejia Sede A	Contractual	$ 137.517.682,11	3,60%	$ 120.480.660,69	3,16%
Nueva Zelandia sede B	Contractual	$ 206.447.501,32	5,41%	$ 200.993.556,62	5,27%
Alvaro Gomez Hurtado Sede B	Contractual	$ 249.150.185,00	6,53%	$ 237.571.817,84	6,23%
Filarmonico Jorge Mario Bergoglio	Contractual	$ 64.125.146,40	1,68%	$ 38.540.482,90	1,01%
Gonzalo Arango	Contractual	$ 230.840.174,82	6,05%	$ 76.879.860,70	2,02%
Domingo Faustino Sede C	Contractual	$ 318.562.642,05	8,35%	$ 244.659.003,91	6,41%
Domingo Faustino Sede D	Contractual	$ 299.741.515,47	7,86%	$ 213.751.980,05	5,60%
Vista Bella sede C	Contractual	$ 673.607.349,37	17,66%	$ 336.665.025,19	8,82%
Vista bella sede A	Contractual	$ 690.104.833,93	18,09%	$ -	0,00%
Maria Cristina Salazar	emergencia	$ 3.043.798,00	0,08%	$ 3.043.798,00	0,08%
Prado Veraniego sede B	emergencia	$ 6.696.587,76	0,18%	$ 6.696.587,76	0,18%
Heladia Mejia Sede B	emergencia	$ 26.340.900,56	0,69%	$ 19.961.007,02	0,52%
Vista Bella sede B	emergencia	$ 6.562.527,80	0,17%	$ 6.001.018,62	0,16%
Elisa Mujica Sede A	obra prioritaria	$ 154.015.712,85	4,04%	$ 108.144.245,35	2,83%
Elisa Mujica Sede B	obra prioritaria	$ 83.455.948,64	2,19%	$ 65.377.871,43	1,71%
TOTALES		**$ 3.815.202.876,00**	**100%**	**$ 2.140.597.544,76**	**56,11%**

De lo anterior podemos decir que:

- Aunque se han tenido que ejecutar obras y actividades que no se tuvieron contempladas al inicio del contrato, el valor del presupuesto para los colegios se ha logrado balancear porque definitivamente hay frentes donde en algunos casos se ha reducido el alcance de ejecución y en otros casos se ha logrado hacer menores cantidades de las inicialmente previstas. Es así como para el siguiente informe presentaremos de forma detallada un paralelo entre los alcances previstos inicialmente vs los realmente ejecutados y las actividades no previstas que fue necesario realizar para ir dejando trazabilidad y registro de todo lo acontecido durante la ejecución del contrato.

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195

- Por ahora el balance para las emergencias de los colegios María cristina Salazar, Prado veraniego, Heladia Mejía sede B y vista bella C se tiene presupuestado un valor de $ 42.643.814,12. También es importante hacer el balance de las obras prioritarias ejecutadas, Elisa Mujica Sede A y Sede B, las cuales implicaron un valor importante en ejecución y las cuales no se tenían contempladas dentro del alcance inicial del contrato. El Valor presupuestado a la fecha para estos dos frentes asciende a la suma de $ 237.471.661,50, aún falta por terminar de cerrar financieramente estos frentes y más aún que siguen solicitando actividades adicionales para ejecutar. Entre obras prioritarias y emergencias se están invirtiendo $ 280.115.475,61 que corresponde a un 7.34% del valor total del contrato. Frente a esto, no resultaría viable atender más emergencias en el marco de este contrato.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1qVeB6nnb5DRswbdEh3uKxtAhjub6LjFU?usp=drive_link

6. Comunicados remitidos a la SED y contratista.

Por parte de la interventoría, se han emitido comunicaciones al contratista y a la secretaria de Educación y Contratista con el fin de informar y recordar las actividades pendientes del contrato en curso este periodo trabajado.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1ervzclBkT3vW-vS2BzFRKYxQl7EJd71i?usp=drive_link

7. Registro fotográfico de los frentes de obra.

En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente. https://drive.google.com/drive/folders/1MPbrbnRGOjKCF0-xHyamkT5UX9aT3uGc?usp=share_link

8. Comité de obra.

En la semana no se realizaron comité de obra. En el siguiente enlace puede acceder a la información correspondiente a las actas de comité. https://drive.google.com/drive/folders/1LBTJzArAwBBcQ2iEomEMOX4yXHvoFkIG?usp=drive_link

Carrera 20B No. 75-20 OFC 405, BOGOTA D.C.
Correo: intercolsed022@gmail.com
Teléfono: 3134286195
