Popayán, 08 de julio de 2024 **CE 028 08-07-2024**

Señor
Ing. ALVARO ENRIQUE RODRIGUEZ PEREZ
CONSORCIO INTERV VIAS RURALES 2022
interrurales2022@gmail.com

C.C.
FRANCISCO ANTONIO CALVACHE PAZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO DE DAGUA
gerenciadeplaneacion@dagua-valle.gov.co


DANIEL ARCE
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL MUNICIPIO DE DAGUA
ingcivildanielarce@gmail.com


REFERENCIA:	CONTRATO No. 2023716 CUYO OBJETO ES EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DE VALLE DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL – NACIONAL.
OBJETO:	SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

Cordial Saludo.


Mediante el presente **EL CONSORCIO VICOL** solicita sea prorrogado el contrato de obra en mención, lo anterior, teniendo en cuenta de que el compromiso adquirido con la comunidad y la administración municipal de llevar a la culminación del proyecto, para lo cual, el consorcio dispondrá del siguiente plan de contingencia:

1. **PROGRAMACIÓN:**

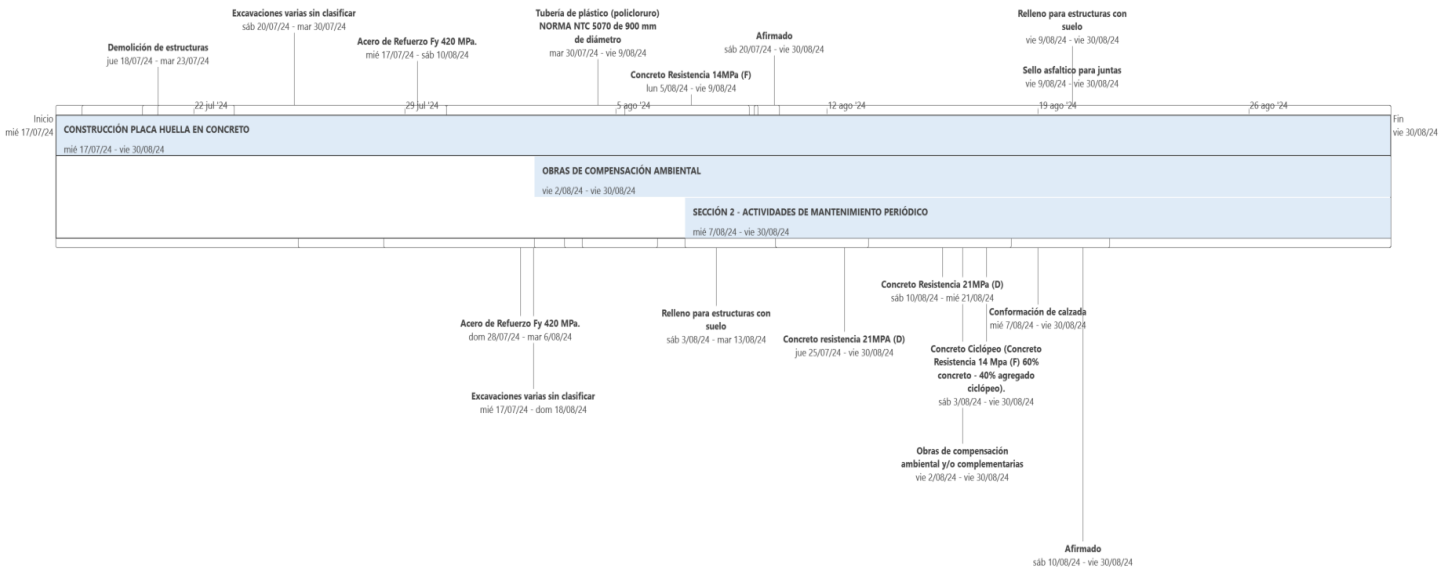

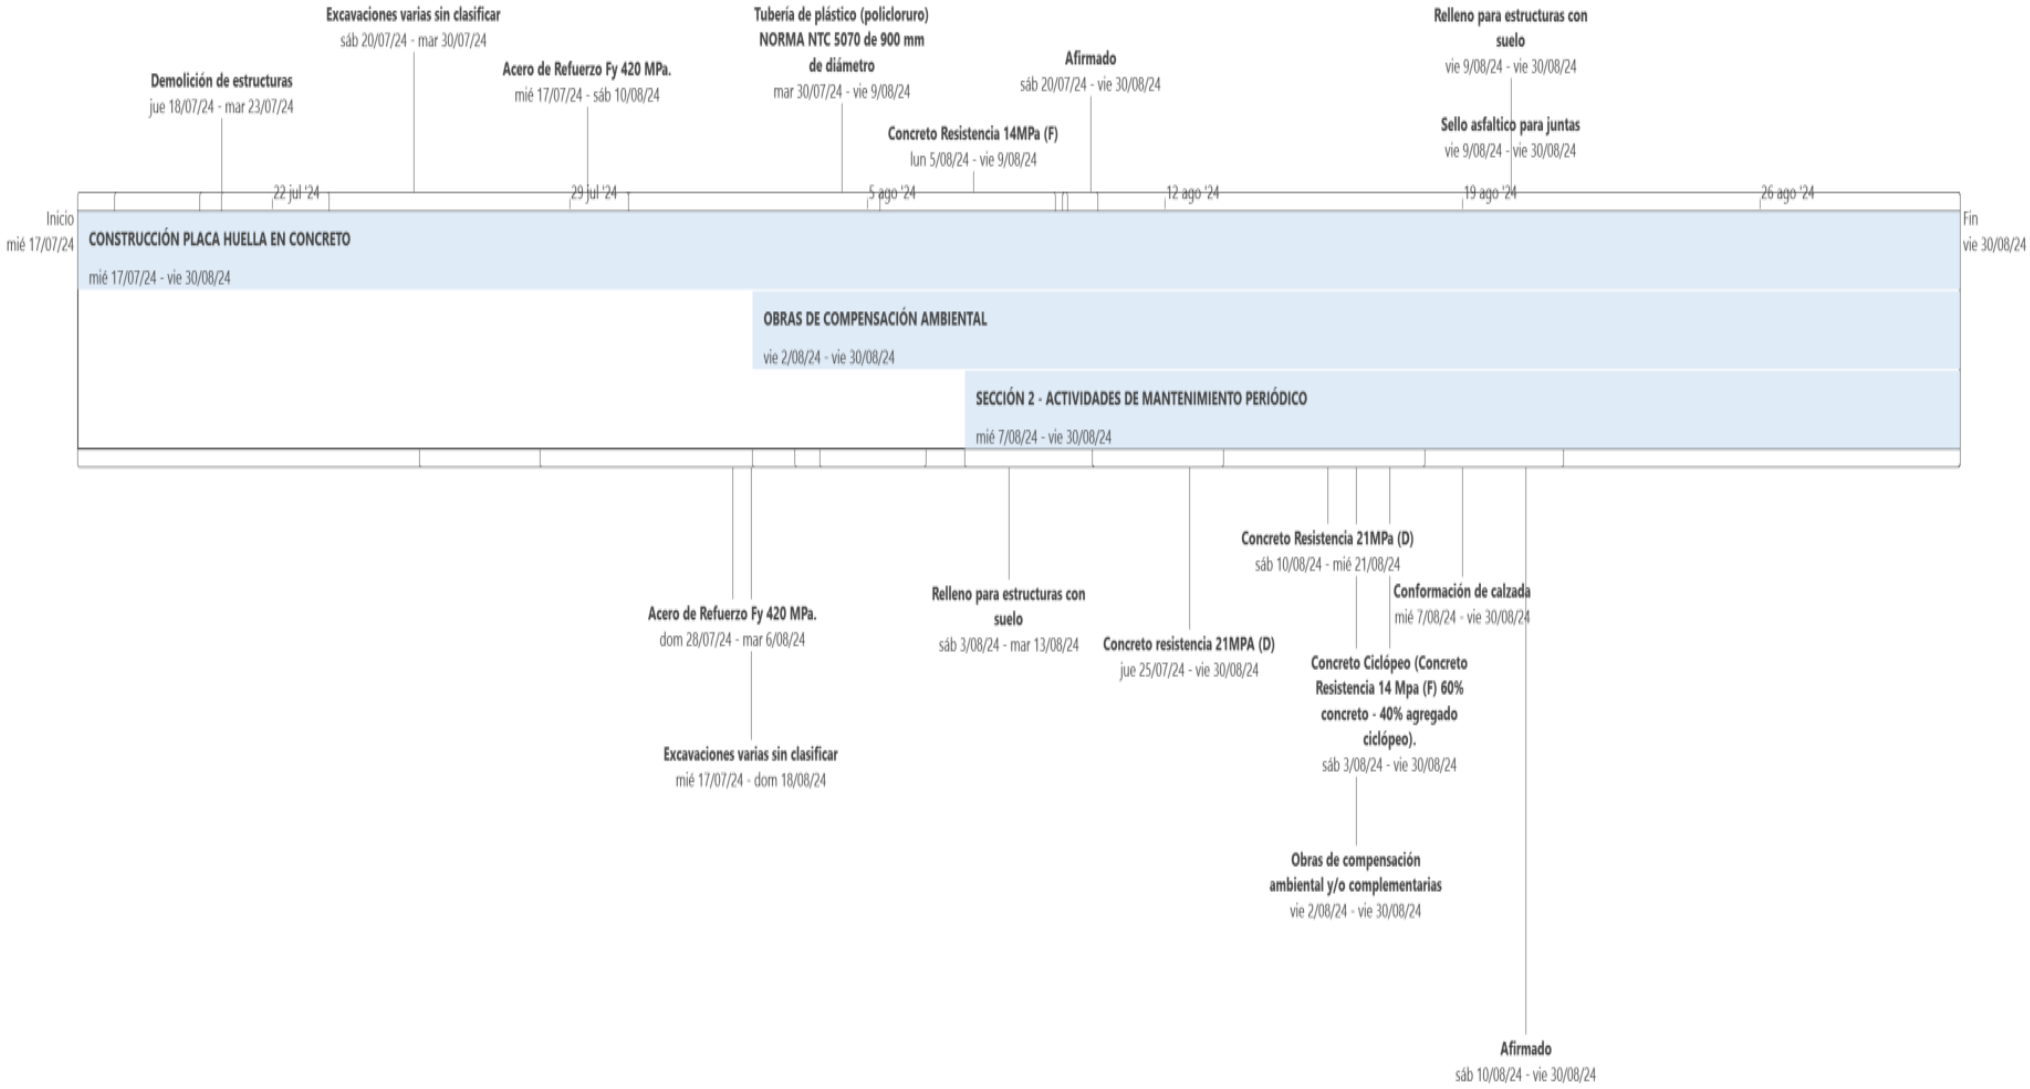
Excavaciones varias sin clasificar
sáb 20/07/24 - mar 30/07/24
Demolición de estructuras
jue 18/07/24 - mar 23/07/24
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.
mié 17/07/24 - sáb 10/08/24
Tubería de plástico (policloruro) NORMA NTC 5070 de 900 mm de diámetro
mar 30/07/24 - vie 9/08/24
Afirmado
sáb 20/07/24 - vie 30/08/24
Concreto Resistencia 14MPa (F)
lun 5/08/24 - vie 9/08/24
Relleno para estructuras con suelo
vie 9/08/24 - vie 30/08/24
Sello asfaltico para juntas
vie 9/08/24 - vie 30/08/24
22 jul '24
29 jul '24
5 ago '24
12 ago '24
19 ago '24
26 ago '24
Inicio
mié 17/07/24
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO
mié 17/07/24 - vie 30/08/24
Fin
vie 30/08/24
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL
vie 2/08/24 - vie 30/08/24
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO
mié 7/08/24 - vie 30/08/24
Concreto Resistencia 21MPa (D)
sáb 10/08/24 - mié 21/08/24
Conformación de calzada
mié 7/08/24 - vie 30/08/24
Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.
dom 28/07/24 - mar 6/08/24
Relleno para estructuras con suelo
sáb 3/08/24 - mar 13/08/24
Concreto resistencia 21MPA (D)
jue 25/07/24 - vie 30/08/24
Concreto Ciclópeo (Concreto Resistencia 14 Mpa (F) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).
sáb 3/08/24 - vie 30/08/24
Excavaciones varias sin clasificar
mié 17/07/24 - dom 18/08/24
Obras de compensación ambiental y/o complementarias
vie 2/08/24 - vie 30/08/24
Afirmado
sáb 10/08/24 - vie 30/08/24

Id	Modo de tarea	ITEM	ESP GENERAL	Descripción	UND.	CANTIDAD
1				**SECCIÓN 1 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLASTICAS**		**0**
2		201.7		Demolición de estructuras	m3	38
3		600.1.1	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	233
4		610.1P		Relleno para estructuras con suelo	m3	112
5		630.4.1P	600-13	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	38
6		630.6	600-13	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.8
7		640.1	640-13	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	2315
8		663.1P	663-13	Tubería de plástico (policloruro) NORMA NTC 5070 de 900 mm de diámetro	m	28
9				**CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO**		**0**
10		311.1	311-13	Afirmado	m3	702
11		466.1P	466.2P	Sello asfaltico para juntas	m	8120
12		600.1.1	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	275
13		610.1P	610-13	Relleno para estructuras con suelo	m3	139.4
14		630.4.1P	630-13	Concreto resistencia 21MPA (D)	m3	545
15		630.7	630-13	Concreto Ciclópeo (Concreto Resistencia 14 Mpa (F) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	235
16		640.1	640-13	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	35481
17				**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL**		**0**
18		1P		Obras de compensación ambiental y/o complementarias	GL	1
19				**SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO**		**0**
20		310.1	310-13	Conformación de calzada	m2	10000
21		311.1	311-13	Afirmado	m3	225

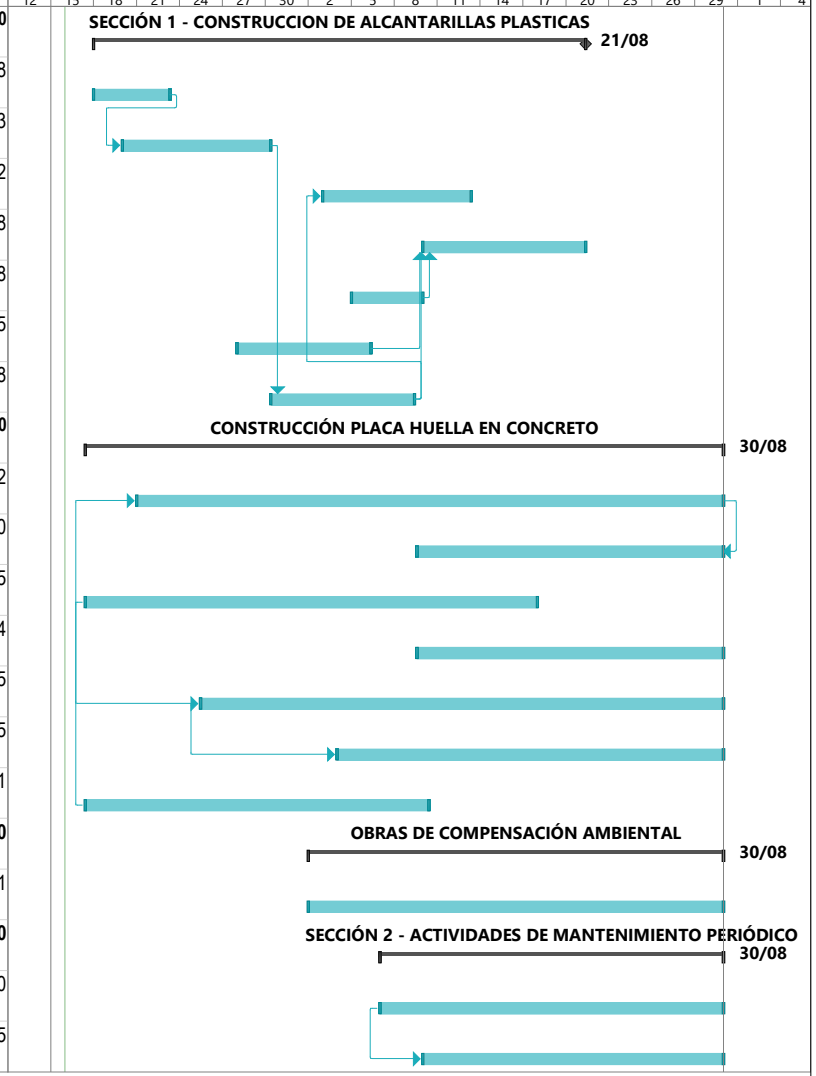

Proyecto: MUNICIPIO DAGUA
Fecha: 08 - 07 - 2024

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

2. PLAN DE CONTINGENCIA:

ITEM	ESP GENERAL	Descripción	UND.	CANT.	Duración	Comienzo	Fin	CONTINGENCIA
SECCIÓN 1 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PLASTICAS					**32.67 días**	**jue 18/07/24**	**mié 21/08/24**	
201.7		Demolición de estructuras	m3	38.00	5 días	jue 18/07/24	mar 23/07/24	**Mano de Obra:** (1) Cuadrilla dedicada **(FRENTE ALCANTARILLAS)** a la demolición y construcción de alcantarillas a reemplazar, excavación para tubería, rellenos. Cuadrilla conformada por: (1) Oficial de construcción. (3) Ayudantes de construcción. **Equipo:** (1) Martillo Demoledor (1) Planta Eléctrica (1) Herramienta Menor (1) Retro excavadora de llantas (1) Volqueta (1) Mezcladora de 1 ½ sacos (1) Juego de formaletas en madera para caja de entrada y descole
600.1.1	600-13	Excavaciones varias sin clasificar	m3	233.00	10 días	sáb 20/07/24	mar 30/07/24	
610.1P		Relleno para estructuras con suelo	m3	112.00	10 días	sáb 3/08/24	mar 13/08/24	
630.4.1P	600-13	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	38.00	10 días	sáb 10/08/24	mié 21/08/24	
630.6	600-13	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	1.80	5 días	lun 5/08/24	vie 9/08/24	
640.1	640-13	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	2,315.0	10 días	dom 28/07/24	mar 6/08/24	**Mano de Obra:** (1) Cuadrilla dedicada **(FRENTE CONFECCIONES)** a la confección de estribos y organización de aceros tanto de alcantarillas como de placa huella y bordillos: (1) Oficial de construcción. (2) Ayudantes de construcción. **Equipo:** (1) Cortadora de acero (1) Herramienta Menor
663.1P	663-13	Tubería de plástico (policloruro) NORMA NTC 5070 de 900 mm de diámetro	m	28.00	10 días	mar 30/07/24	vie 9/08/24	(1) Actividad dedicada única y exclusivamente al **FRENTE ALCANTARILLAS**
CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN CONCRETO					**43 días**	**mié 17/07/24**	**vie 30/08/24**	

311.1	311-13	Afirmado	m3	702.00	39 días	sáb 20/07/24	vie 30/08/24	**Maquinaria:** (1) Retro excavadora de llantas (1) Vibro compactador de 7 ton (6) Volquetas capacidad 8m3
466.1P	466.2P	Sello asfaltico para juntas	m	8,120.00	20 días	vie 9/08/24	vie 30/08/24	**Mano de Obra:** (1) Cuadrilla encargada del sello de juntas una vez se termine completamente cada tramo: (1) Oficial de construcción. (1) Ayudante de construcción. **Equipo:** (1) Herramienta Menor
600.1.1	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3	275.00	32.4 días	mié 17/07/24	dom 18/08/24	**Maquinaria:** (1) Retro excavadora de llantas (1) Vibro compactador de 7 ton (6) Volquetas capacidad 8m3
610.1P	610-13	Relleno para estructuras con suelo	m3	139.40	20 días	vie 9/08/24	vie 30/08/24	**Maquinaria:** (2) Retro excavadora de llantas (2) Vibro compactador de 7 ton (6) Volquetas capacidad 8m3
630.4.1P	630-13	Concreto Resistencia 21MPA (D)	m3	545.00	35 días	jue 25/07/24	vie 30/08/24	**Mano de Obra:**
630.7	630-13	Concreto Ciclópeo (Concreto Resistencia 14 Mpa (F) 60% concreto - 40% agregado ciclópeo).	m3	235.00	25 días	sáb 3/08/24	vie 30/08/24	(2) Cuadrilla dedicada **(FRENTE PLACA HUELLA)** a la colocación de formaleta, fundición de concreto reforzado para huellas, cunetas y bordillos y, al concreto ciclópeo. Cuadrilla conformada por: (1) Maestro de construcción. (2) Oficial de construcción. (4) Ayudantes de construcción. **Equipo:** (1) Herramienta Menor (1) Mezcladora de 1 ½ sacos

								(1) Juego de formaletas en perlin metálico 15 cm para una longitud de fundición de 50 ml.
640.1	640-13	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa.	kg	35,481.00	23.67 días	mié 17/07/24	sáb 10/08/24	(1) Actividad dedicada única y exclusivamente al **FRENTE CONFECCIONES.**
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL					**27.56 días**	**vie 2/08/24**	**vie 30/08/24**	
1P		Obras de compensación ambiental y/o complementarias	GL	1.00	27.56 días	vie 2/08/24	vie 30/08/24	Esperando autorización de la entidad para la ejecución del ítem, con respecto a la siembra de árboles (Especies nativas).
SECCIÓN 2 - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO					**22.67 días**	**mié 7/08/24**	**vie 30/08/24**	
310.1	310-13	Conformación de calzada	m2	10,000.00	22.67 días	mié 7/08/24	vie 30/08/24	**Maquinaria:**
311.1	311-13	Afirmado	m3	225.00	19.67 días	sáb 10/08/24	vie 30/08/24	(3) Retro excavadora de llantas (3) Vibro compactador de 7 ton (6) Volquetas capacidad 8m3

Así las cosas, se tendrán en obra los siguientes frentes:

FRENTE DE OBRA	CANT.	CUADRILLAS CONFORMADAS POR		
		MAESTRO DE CONSTRUCCIÓN	OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN	AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN
ALCANTARILLAS	1		1	3
CONFECCIONES	1		1	2
PLACA HUELLA	1	1	2	4
TOTAL TRABAJADORES		**1**	**4**	**9**

Con base en lo anterior EL CONSORCIO VICOL solicita sea prorrogado el contrato de la referencia hasta el día 30 de Agosto de 2024, término en el cual se programa la terminación de la ejecución del proyecto.

Gracias por su atención.

Atentamente,

Contratista:	CONSORCIO VICOL
Representante Legal:	FERNANDO ANDRÉS LEMOS CERÓN
C.C. No.:	16.731 814 de Cali (Valle)
Dirección de Correo:	Cr 2 No. 16N – 18 Casa 65 Altos de Tulcán
Dirección Electrónica:	consorciovicol@hotmail.com
Teléfono:	3233245817
Ciudad:	Popayán – Cauca



FERNANDO ANDRÉS LEMOS CERÓN
RL. CONSORCIO VICOL
