LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN

NIT. 10545813
Carrera 5 No. 9-16 Oficina 203 **Telefono: (098) 2485762**
Email: egibaron01@gmail.com Espinal - Tolima.

Factura Electrónica De Venta **LEBV No. 104**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764067883481 que habilita desde LEBV 101 hasta LEBV 200. Vence 2026-03-25

Responsable de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA CONST 5.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE MELGAR
NIT	890701933 4
DIRECCIÓN	CR 25 5 56 ED PALACIO MUNICIPAL
TELÉFONO	2451156 **CIUDAD** Melgar
EMAIL	sechacienda@melgar-tolima.gov.co

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/09/2024	02/09/2024
FORMA DE PAGO	Credito
VENDEDOR	
MARTIN EMILIO OVIEDO GONGORA	

POR CONCEPTO DE VALOR ACTA No. 03 AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 500-2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO DE OBRA	1	660.169.608,40	0%	0	660.169.608,40
2	ADMINISTRACION 23%	1	151.839.009,93	0%	0	151.839.009,93
3	IMPREVISTOS 1%	1	6.601.696,08	0%	0	6.601.696,08
4	UTILIDAD 4%	1	26.406.784,34	0%	0	26.406.784,34

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DIECISIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, ART. 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.

SUBTOTAL	**845.017.098,75**
IVA	**0,00**
TOTAL	**845.017.098,75**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/09/2024 08:15:03

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0b26d75b1589e5428d4d417aeb7fc2bcf62ef7bb5fa388fd8114a644d21ce4cce86256145bcf5f946554657872fd2947 --Fecha y Hora de Expedición : 02/09/2024 8:35:28 a. m.

CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO DE OBRA N.º 500 - 2023

CERTIFICACIÓN BANCARIA

ACTA PARCIAL Nº3
MAYO DE 2024

BANCO PICHINCHA

CERTIFICA

Que el Cliente **BARON VARGAS LUIS EGIMIO** , con número de identificación **10545813** , mantiene vínculos comerciales con nuestra Entidad, a través de la(s) cuenta(s) de depósito cuyas condiciones se detallan a continuación:

Nro. CUENTA	TIPO DE CUENTA	FECHA APERTURA	ESTADO
411288088	Cuenta de Ahorros	2024/04/12	Cuenta Activa

Este documento es dirigido a AL INTERESADO por solicitud del cliente.
La cuenta mencionada se encuentra activa y ha sido manejada de acuerdo con las normas y políticas vigentes.

La presente se expide a solicitud del cliente, el 2024/04/25

BANCO PICHINCHA
OFICINA IBAGUE

ANGELICA LILIANA GARCIA ROJAS
Firma Autorizada

* Está Operación genero una comisión por valor de $0.00

ALCALDÍA DE MELGAR

ALCALDÍA DE MELGAR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FÍSICO

05197

Melgar- Tolima, Mayo 15 de 2024

ALCALDÍA MUNICIPAL
MELGAR Sonia
15 MAY 23
9:27 - AM
PCIÓN

Señores
TESORERIA GENERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Melgar Tolima

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE CUENTA BANCARIA PARA PAGO

De manera atenta, y en calidad de supervisor(a) del contrato N° 500 del 25/04/2023, cuyo contratista es LUIS EGIMIO BARON VARGAS identificado con CC 10545813, me permito solicitar a ustedes la inscripción de la cuenta bancaria para pagos conforme a la siguiente información:

Información contractual:

N° de Registro Presupuestal: 2023001559
Rubros completos: 2320323.R2.02.02.02.006.007.04 2.2.9.1.0 2022734490011 24 4002 2402093 91199 001

Información de la cuenta bancaria:

Tipo de cuenta bancaria: AHORROS
N° de cuenta bancaria: 411288088
Entidad financiera: BANCO PICHINCHA
Nombre del beneficiario de la cuenta bancaria: LUIS EGIMIO BARON VARGAS
No de documento del beneficiario CC 10545813

Para constancia de lo anterior, se anexa certificación bancaria actualizada y copia del registro presupuestal.

Cordial Saludo,

WILDER ANDREY AGUIRRE ESPITIA
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Físico

CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO DE OBRA N.º 500 - 2023

INFORME ACTA Nº3

ACTA PARCIAL Nº3
MAYO DE 2024


LUIS
EGIMIO BARÓN VARGAS
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN

INFORME TECNICO ACTA PARCIAL Nº3

CONTRATISTA: LUIS EGIMIO BARON VARGAS

CONTRATO: No. 500-2023

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA"

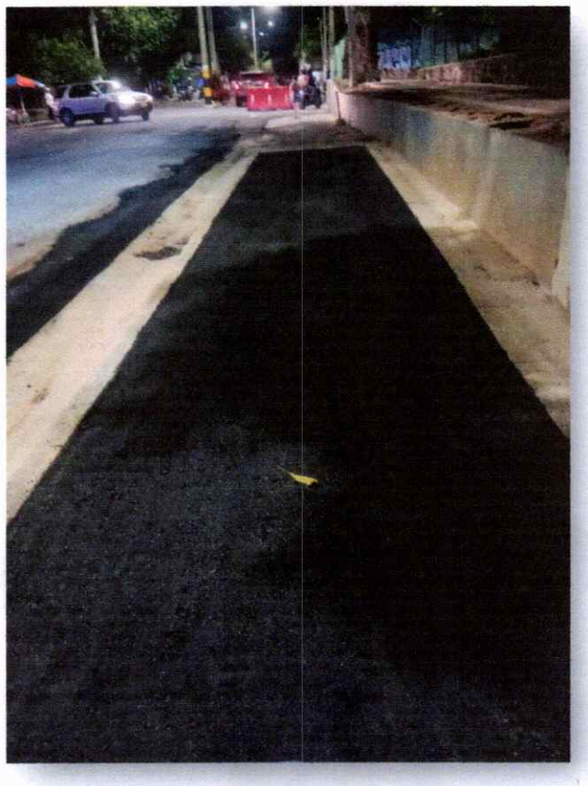

INTERVENTORÍA: PAOLA RODRIGUEZ ALCALÁ
CONTRATO: No. 494 - 2023
22 DE ABRIL – 31 DE MAYO DE 2024
MELGAR – TOLIMA

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 4
1 ASPECTOS CONTRACTUALES 4
1.1 PROCESO DE SELECCIÓN 5
1.2 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 5
2 GENERALIDADES DEL PROYECTO 5
2.1 ANTECEDENTES 6
2.2 FINALIDAD DEL PROYECTO 6
2.3 OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO 7
2.4 IMPACTO SOCIAL 8
2.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
2.5.1 SECTORES DE INTERVENCION: 11
3 ANALISIS DE PARTICIPANTES 11
4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 12
4.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA 12
4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO 13
4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS 14
4.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO 14
4.5 VINCULACIÓN DE PERSONAL 14
4.6 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP´s 15
4.7 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA 15
5 ASPECTOS TÉCNICOS 15
5.1 ALCANCE DEL PROYECTO 15
5.2 CUADRO DE INFORMACIÓN BÁSICA 17
EQUIPOS Y MAQUINARIA 18
5.3 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ 18
6 ACTIVIDADES REALIZADAS 19
6.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 19
6.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL PERIODO 20
6.2.1 Campamento y Oficinas 21
6.2.2 Topografía 21

6.3 Área social 22
7 CANTIDADES DE OBRA 22
7.1 CANTIDADES ACTUALIZADAS 22
7.2 ACTIVIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA Nº3 25
7.3 ACTIVIDADES DE OBRA ACUMULADAS EJECUTADAS 26
8 ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA 30
9 ACTIVIDADES DE OBRA ACUMULADAS 30
10 REGISTRO FOTOGRAFICO 31
11 CONCLUSIONES 50

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico corresponde al periodo comprendido entre el 22 de abril al 31 de mayo de 2024 del contrato de obra No. 500 / 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA"

Durante el desarrollo de las actividades de obra, el proyecto ha contado de acuerdo al periodo del informe entre dos (2) y tres (3) frentes de trabajo que se han organizado de acuerdo a la necesidad propia de las actividades y teniendo en cuenta la programación general del proyecto.

Durante el periodo mencionado para este informe, se ejecutaron actividades de prevención en el área de intervención principalmente cerramiento en lona verde, señalización vertical, maletines plásticos para la implementación del Plan de Manejo de Transito PMT, así como el seguimiento a cada uno de los procesos que permitan la seguridad de cada uno de los colaboradores en el proyecto.

Al avance de este periodo comprende actividades de los ítems contractuales como, Localización y replanteo con aparatos topográficos y manual, cerramiento perimetral, demolición de andén existente en concreto en los que se incluye la demolición de cunetas en concreto que se encuentra ubicadas principalmente en el sector del SENA, Sardineles, bordillos, losetas, los cuales permiten un avance significativo en el inicio de la etapa constructiva de la alameda y de la estructura del pavimento.

De igual manera se han desarrollado actividades que a la fecha son autorizadas y aprobadas por la interventoría y la supervisión del contrato como Ítem no previstos en los que se incluyen y se ejecutan como Excavación de material común, Demolición de pavimento, concreto de 3000 Psi como elemento muro borde en el sector de la policía tramo 1 y 2, Suministro figurado y armado de Acero, transporte de material de Excavación, demoliciones generales de bordillos o similar, corte de pavimento, Suministro e instalación de base granular, cunetas en concreto de 0.60mts y 0.90 de ancho, excavación de material conglomerado, y rellenos de material procedente de la excavación. De igual manera la instalación de tubería de aguas lluvias necesarias para la construcción de elementos en el manejo de aguas.

Debido al avance en actividades, se generan otras que no se encuentran previstas en el contrato inicial y que son expuestas para estudio y aprobación por parte de la entidad correspondiente.

1 ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

Por medio de la resolución 079 de 2023 del 29 de junio de 2023 se suscribe documento de Cesión del contrato de obra No 500 de 2023 celebrado entre el consorcio Locomboo OGG-RO y el municipio de Melgar – Tolima, cuya descripción de antecedentes del mismo es "*Que el CONSORCIO LOCOMBOO OGG-RO Representado legalmente por* ***RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ*** *Identificado con la C. C. No 14.225.605, por medio de oficio con radicado interno No. 06050 de fecha 15 de junio de 2023 en la ventanilla de correspondencia, allega el documento de solicitud de cesión en el que requieren que se realice las gestiones internas para realizar la aprobación de la cesión del 100% a la persona natural* ***LUIS EGIMIO BARON VARGAS*** *Identificado con la CC.: 10545813 y en virtud de ello, acompaña la totalidad de la información solicitada en el proceso de licitación LP 002 2023*"

1.2 CELEBRACIÓN DEL CONTRATO

Que la audiencia de adjudicación inicio el 28 de marzo de 2023 y culmino el día 11 de abril de 2023, según Resolución N. 045 del 25 de abril de 2023 se adjudica la LICITACION PUBLICA LP 002- 2023, que tiene por objeto: "CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA" a la propuesta presentada por el oferente No 7. denominado CONSORCIO LOCOMBOO OGG-RO, Representante Legal: RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ Identificado con la C. C. No 14.225.605 de Ibagué; por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.690.583.827.68) al cual se le asignó un puntaje de 99.96 Puntos y que se encontraba en primer orden de elegibilidad.

El día 25 de abril de 2023 se suscribe finalmente el contrato de obra pública N° 500 de 2023 con el CONSORCIO LOCOMBOO OGG-RO Representado legalmente por RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ Identificado con la C. C. No 14.225.605, por un valor de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.690.583.827.68).

Que el MUNICIPIO DE MELGAR recibió comunicación de fecha 15 de junio de 2023 bajo radicación interna 06050, la cual, donde el contratista informa que suscribió documento de Cesión de Derechos Económicos, documento que se anexa en fotocopia debidamente firmado y autenticado, por una de las partes el señor LUIS RICARDO ORTEGOZA Representante legal del CONSORCIO LOCOMBOO OGG-RO de fecha 15 de junio de 2023, en beneficio del Señor LUIS EGIMIO BARON VARGAS.

Que acepta la cesión de los derechos, beneficios y privilegios de orden económico derivados del contrato de suministro No. 500 de fecha 24 de abril de 2023, enunciado en el asunto, materializados puntualmente en el derecho a recibir el CIEN por ciento (100%) del del valor del contrato y en favor de señor: LUIS EGIMIO BARON VARGAS, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.545.813 del espinal, refiriendo que el valor del mismo es la suma de TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($3.690.583.827.68)

2 GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 ANTECEDENTES

Este proyecto se formula acorde al cumplimiento de metas del plan de desarrollo Municipal POR AMOR A MELGAR 2020-2023, en la línea estratégica SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS y el programa ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.

El Municipio de Melgar o el Mar de piscinas como lo llaman por la gran magnitud de piscinas existentes, debido a que la fuente económica del municipio de Melgar es el Turismo, por la cercanía a la ciudad Musical de Colombia (Ibagué) y el Capital del país (Bogotá), esta localización geográfica le permite a Melgar ser el destino turístico de miles de viajeros que quieren disfrutar de su gastronomía, cultura, patrimonio cultural y natural, momentos de esparcimiento, descanso, entre otros atractivos que posee Melgar-Tolima, el área total del municipio es de 201 km2, de los cuales 16 km2 pertenecen a la zona urbana, la zona rural es una porción de territorio que corresponde alrededor de 185 km2, el Municipio de Melgar tiene una población local aproximada de 37.880 habitantes según Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023, en épocas de festividades, decembrinas, san pedro y fines de semana el municipio acoge aproximadamente a 60.000 turistas.

El sector de intervención del proyecto comunica a uno de los corredores viales más importantes para el municipio ya que este comunica a Melgar con municipios como el Carmen de Apicalá y Cunday, además a lo largo de los 13,4 km de vía se encuentra el mega colegio del Municipio de Melgar; la Institución Educativa Técnica Sumapaz-Sede Campestre, el Centro Gastronómico del SENA, además de diferentes condominios como lo son la Estancia, Heliópolis, el Rubi, Altos del Palmar, etc.

Para la administración municipal de Melgar es de gran importancia brindarle a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que estudian en la Institución Educativa Técnica Sumapaz-Sede Campestre y el Centro Gastronómico del SENA, seguridad al momento de trasladarse caminando desde el sector del barrio Sicomoro, Resacas y Alfonso Uribe a su colegio para recibir las clases. Además, se quiere brindar a los turistas una alameda que les permita realizar alguna actividad deportiva como trote o montar bicicleta y también realizar caminatas para compartir en familia u amigos.

2.2 FINALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de "CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA", tiene como finalidad mejorar la calidad y movilidad terrestre de los estudiantes y comunidad en general del municipio de Melgar en el departamento del Tolima.

Este proyecto se lleva a cabo teniendo en cuenta las condiciones actuales del sector comprendido entre el Club de Suboficiales de la policía Nacional y el Servicio Nacional de Aprendizaje ubicado en el municipio de Melgar en la vía que conduce hacia el municipio de Carmen de Apicalá en el que en época de lluvias se generan malas condiciones de movilidad, lo cual ocasiona numerosos problemas con los vehículos, accidentes y una problemática con la comunidad debido a los múltiples factores producidos por malas condiciones en las vías y pocas zonas peatonales para el cómodo y seguro traslado de la comunidad peatonal estudiantil y general.

2.3 OBJETIVOS Y PROPÓSITOS DEL PROYECTO

Luego de revisar el análisis del árbol de problemas del proyecto y evidenciar las cusas y efectos del mismo, se definieron los medios y los fines que tendrá el proyecto a fin de buscar la alternativa solución:

GENERAL:

"Mejorar la movilidad (peatonal-ciclorruta) de los estudiantes de la institución educativa Sumapaz sede campestre y centro de formación gastronómico del Sena en el Municipio de Melgar Tolima"

ESPECÍFICO DIRECTO:

- Mejorar la infraestructura vial existente para la movilidad (peatonal-ciclorruta).

ESPECÍFICOS INDIRECTOS:

- Adecuar el espacio público para el tránsito de peatones.
- Adecuar vías para el transporte seguro en bicicleta y peatones.

ARBOL DE OBJETIVOS

OBJETIVOS INDIRECTOS	Adecuar el espacio público para el tránsito de peatones.	Adecuar vías para el transporte seguro en bicicleta y peatones.
OBJETIVO DIRECTO	Mejorar la infraestructura vial existente para la movilidad (peatonal-cicloruta).	
OBJETIVO GENERAL	Mejorar la movilidad (peatonal-cicloruta) de los estudiantes de la institución educativa Sumapaz sede campestre y centro de formación gastronómico del Sena en el Municipio de Melgar Tolima.	
FIN DIRECTO	Mejorar la circulación peatonal y la calidad de vida para la población.	
FINES INDIRECTOS	Brindar seguridad vial a los peatones y ciclistas que utilizan esta ruta para su diario desplazamiento.	Aumentar el deporte y la buena salud física de la población Melgarense.

2.4 IMPACTO SOCIAL

BENEFICIADOS:

Tipo: Personas
Numero: 37.880
Fuente de la información: base de datos proyección Dane 2018-2023
Localización: Municipio de Melgar
Región: Centro - Oriente
Departamento: Tolima

POBLACIÓN OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN:

Tipo: Personas
Número: 37.880
Fuente de la información: Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023
Localización: Municipio de Melgar
Región: Centro - Oriente
Departamento: Tolima

PERSONAS INTERVENCIÓN (CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LA POBLACIÓN OBJETIVO)

CLASIFICACIÓN	DETALLE	NUMERO DE PERSONAS	FUENTE DE INFORMACIÓN
POBLACIÓN VULNERABLE	VÍCTIMAS	627	Reporte base de Datos de unidad de victimas 2022
POBLACIÓN VULNERABLE	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1.653	Base de Datos del Sisbén IV 2022
GENERO	MASCULINO	19.097	Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023
	FEMENINO	18.783	Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023
ETAREA (EDAD)	0 a 14 AÑOS	8.172	Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023
	15 a 19 AÑOS	2.864	Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023
	20 a 59 AÑOS	21.772	Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023
	MAYOR DE 60 AÑOS	5.072	Base de datos proyección poblacional DANE 2018-2023

2.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Respecto al Departamento del Tolima, Melgar está ubicado al extremo oriental, en los límites con el departamento de Cundinamarca, limitando con los municipios del Carmen de Apicalá, Cunday e Icononzo, al norte con el municipio de Nilo en el departamento de Cundinamarca. El contexto regional ejerce una gran influencia en los fenómenos presentados finalmente en el municipio de Melgar. La micro-región conformada por los municipios de Melgar, Carmen de Apicalá, Icononzo, Cunday, ha orientado la mayor parte de sus actividades al sector servicios abandonando paulatinamente las actividades primarias como minería, agricultura y ganadería.









Tramo de proyecto en ejecución

2.5.1 SECTORES DE INTERVENCION:

En relación al Municipio de Melgar, el proyecto se encuentra localizado partiendo del barrio sicomoro carrera 37 con calle 7 con coordenadas X =936698.1213 Y= 956134.77, hasta el centro gastronómico Sena con coordenadas X=934745.89 Y=956468.93.

3 ANALISIS DE PARTICIPANTES

ACTOR	ENTIDAD	POSICION	INTERESES O EXPECTATIVAS	CONTRIBUCION O GESTION
Municipal	Melgar-Tolima	Cooperante	Que los estudiantes se beneficien respecto a la movilidad hacia las instituciones.	Recursos técnicos.
Departamental	Tolima	Cooperante	Adelantar convenios de Cooperación para la gestión municipal y regional.	Aportes técnicos, financieros del proyecto.
Otro	Población con movilidad reducida	Beneficiario	Infraestructura y mobiliario acorde a normatividad vigente	Facilitar el desplazamiento de esta población del municipio especialmente en el casco urbano
Otro	Comunidad	Beneficiario	Mejorar calidad de vida de la población Melgarense respecto la movilidad.	Seguimiento a los proyectos a través de veedurías ciudadanas con el propósito de buscar una adecuada ejecución física y financiera.

Los participantes tienen una función indispensable en el desarrollo de las actividades que se desarrollarán para el servicio de los ciudadanos del área urbana Municipio y rural del municipio de Melgar, así como para los turistas que aprovechan los festivos o las temporadas de vacacionales para visitar y recorrer el área urbana y rural, son actores importantes en el desarrollo y fortalecimiento de las actividades que se pretende desarrollar, sin su apoyo no es posible llevar a cabalidad este proyecto.

La Alcaldía Municipal ha realizado socializaciones con los diferentes participantes del proyecto, de esta manera se ha informado a la comunidad Melgarense sobre los objetivos que se pretenden lograr y el bienestar que esta Alameda traerían al Municipio y en especial al estudiantado del sector.

En la socialización del proyecto se le informo a la comunidad los sectores a intervenir, el valor del proyecto, las metas del proyecto junto con sus indicadores y magnitudes. Al finalizar la reunión la comunidad expreso su satisfacción ante la gestión del proyecto y su ejecución teniendo en cuenta lo Priorizado en el Plan de desarrollo.

El Municipio de Melgar tiene como finalidad satisfacer una de las necesidades más apremiante y es la de organizar la movilidad con seguridad sobre un área que conecta con una vía de orden secundario en el departamento del Tolima; el

rol de la entidad en el proyecto es velar por el adecuado funcionamiento y operación de la inversión realizada y brindar bienestar a la comunidad residente y a los turistas que nos visitan.

DIAGNÓSTICO DE LA ALAMEDA ESTUDIANTIL REGISTRO

TRAMOS	METROS LINEALES
TRAMO 1	197,18
TRAMO 2	350,12
TRAMO 3	161,82
TRAMO 4	129,79
TRAMO5	97,38
TRAMO 6	122,96
TRAMO 7	125,55
TRAMO 8	78,81
TRAMO 9	268,92
TRAMO 10	22,18
TRAMO 11	508,14
TRAMO 12	278,04
TRAMO 13	918,08
TOTAL	**3258.97 ML**

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se muestra la ficha técnica del contrato:

Tabla 1. Ficha técnica del contrato.

INFORMACIÓN GENERAL:	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MELGAR
PROYECTO/CARRETERA:	ALAMEDA ESTUDIANTIL – MELGAR TOLIMA
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE JULIO DE 2023
SUPERVISOR:	ANDRES ALBERTO AYALA BAYONA – SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO FISICO.

CONTRATO DE OBRA:	
CONTRATISTA:	LUIS EGIMIO BARON VARGAS

CONTRATO No.	**500 – 2023**	
PLAZO INICIAL:	**11 meses**	
VALOR INICIAL:	**$**	**3,690,583,827.68**
ADICIONES:	**$**	**-**
VALOR ACUMULADO:	**$**	**3,690,583,827.68**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
INTERVENTOR:	**PAOLA RODRIGUEZ ALCALÁ**	
CONTRATO No.	**494 – 2023**	
PLAZO INICIAL:	**11 MESES**	
PLAZO ACUMULADO:	**-**	
VALOR INICIAL:	**$**	**228,174,033.00**
ADICIONES:	**$**	**-**
VALOR ACUMULADO:	**$**	**228,174,033.00**

4.2 GARANTÍAS DEL CONTRATO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad.

Tabla 2. Pólizas iniciales del contrato.

AMPARO	POLIZA No.	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	COMPAÑÍA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
	I-100024221	26-JUN-2023	29-JUN-2029	$ 3.506.054.636,30	SEGUROS MUNDIAL
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	I-100024221	26-JUN-2023	29-JUN-2029	$ 1.845.291.913,84	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	I-100024221	26-JUN-2023	29-JUN-2029	$ 738.116.765,54	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	I-100024221	26-JUN-2023	29-JUN-2029	$ 738.116.765,54	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	I-100024221	26-JUN-2023	29-JUN-2029	$ 184.529.191,38	
BÁSICO RESPONSABILIDAD CIVIL	I-100005484	29-JUN-2023	29-MAY-2029	$ 464.000.000,00	

4.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 3. Actos administrativos.

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	DESCRIPCIÓN	SUSCRITA POR
19-JUL-2023	ACTA DE INICIO	ACTA DE INICIO	LUIS EGIMIO BARON VARGAS – PAOLA RODRIGUEZ ALCALÁ

4.4 MODIFICACIONES AL CONTRATO

Durante el desarrollo del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se generó el acta modificatoria de cantidades de obra No 2 al contrato de obra No. 500 - 2023

4.5 VINCULACIÓN DE PERSONAL

El contratista ha venido realizando la vinculación de personal mínimo requerido para el proyecto por la entidad contratante y para la ejecución de los trabajos de obra de acuerdo con el alcance del contrato y el plan de contingencia, realizando previamente las afiliaciones respectivas al sistema de seguridad social integral y riesgos profesionales. La interventoría he venido realizando la verificación de las respectivas hojas de vida, afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

Se utilizó profesionales, mano de obra calificada y no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto la cual se incorporará a medida que este avance y las actividades a desarrollar den inicio. De igual manera, se vinculó el personal mínimo repara dirigir las actividades de acuerdo con el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista LUIS EGIMIO BARON VARGAS en el desarrollo de la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo – SG-SST en el proyecto, busca mejorar, proteger y mantener la integridad física, condiciones laborales, la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social del personal de obra en cada una de sus actividades.

Dentro de las actividades de este programa, se está cumplimento de acuerdo a lo requerido en cada uno de los ítems correspondientes al Plan de Manejo de Transito PMT presentado para aprobación a la Alcaldía municipal y a la interventoría del proyecto.

Información se complementa en el informe mensual SST.

4.6 USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP´s

El contratista realiza entrega de dotación al personal que trabaja en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo con las necesidades de cada trabajador.

4.7 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

Como requisitos previos al contrato de obra, se presentó a la interventoría la documentación necesaria para la autorización y aprobación de la maquinaria y equipos mínimos. A la fecha se encuentra maquinaria dentro del desarrollo de actividades de obra.

- Minicargador
- Volquetas
- Vibro compactador
- Excavadora de llantas

5 ASPECTOS TÉCNICOS

5.1 ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto de "CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA" tiene programada la ejecución de las siguientes actividades:

Tabla 5. Actividades iniciales del contrato de obra No. 500 de 2023

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1- PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo con aparatos topográficos y manual	M2	17480,10

2	1,2	Cerramiento perimetral	ML	4523,97
		2 – DEMOLICIONES		
3	2,02	Demolición paradero existente.	M2	12,10
4	2,04	Demolición de andén existente en concreto (espesor 0,12 m)	M2	1.330,27
5	2,06	Retiro capa vegetal (espesor 0,1 m)	M2	4.680,87
		3 - COMPACTACIONES Y RELLENOS		
6	3,01	Compactación base apoyo sub rasante	M2	4198,90
7	3,02	Suministro e instalación geotextil nt2000 no tejido de genfort o similar tela de alta resistencia.	M2	16589,20
8	3,03	Suministro e instalación geocelda antifisura desyntex o similar de 0,15 a 20c estructuras tridimensionales.	M2	870,79
9	3,04	Suministro compactación recebo relleno compactado.	M3	377,05
10	3,05	Suministro, instalación y compactación de subbase granular	M3	2077,30
		4 - PREFABRICADOS		
11	4,01	Suministro e instalación de cañuela	M	2970,84
12	4,02	Suministro e instalación de bordillo rampa a 85	M	2924,90
13	4,04	Suministro e instalación de sardinel a 40	M	2156,22
14	4,05	Suministro e instalación de borde a 170	M	1252,01
15	4,06	Suministro e instalación de sardinel a 80	M	2930,06
		5 - PINTURAS Y SEÑALIZACIÓN		
16	5,1	Pintura tráfico y demarcación azul	M2	455,50
17	5,2	Pintura tráfico y demarcación blanca	M	2970,84
18	5,3	Pintura tráfico y demarcación blanca	M2	157,09
19	5,4	Pintura tráfico y demarcación amarilla	ML	5398,87
		6 - ZONAS VERDES		
20	6,1	Empradización zonas verdes	M2	3090,14
		7 - PISOS Y PAVIMENTOS		
21	7,1	Suministro e instalación de carpeta asfáltica	M3	227,52
22	7,2	Loseta táctil guía a 56	ML	2944,90
23	7,3	Loseta táctil alerta a 56	ML	3010,27
24	7,4	Loseta plana a 50.	M2	4245,14
25	7,5	Adoquín neutro o de color	M2	474,43
26	7,6	Losas en concreto reforzado.	M2	879,36
27	7,7	Rampa peatonal.	M2	238,01
		8 - MOBILIARIO URBANO		
28	8,1	Contenedor de raíz en concreto reforzado	M3	51,98
29	8,2	Bolardo m - 63 tipo idu 1,00	UND	48,00
30	8,3	Bolardo flexible color naranja 0,20 m x 0,20 m x 0,75 m	UND	4
31	8,4	Caneca metálica doble m – 121	UND	23,00
32	8,5	Paradero metálico sae 304	UND	6,00

9 - OBRAS HIDRÁULICAS				
33	9,1	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UND	8,00
10 – SEÑALÉTICA				
34	10,1	Señal vertical informativa	UND	39,0
11 - OBRAS ELÉCTRICAS				
35	11,1	Desmonte y reubicación postes	UND	81,00

5.2 CUADRO DE INFORMACIÓN BÁSICA

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE OBRA N.º:	No. 500
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de abril de 2023
OBJETO CONTRATO:	"CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA"
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MELGAR
CONTRATISTA:	LUIS EGIMIO BARON VARGAS
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 3,690,583,827.68
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 3,690,583,827.68
FORMA DE PAGO:	• 50% Anticipo del valor del contrato • 90% en actas parciales con cantidades revisadas y aprobadas por interventoría. • 10% para acta de liquidación.
PLAZO INICIAL:	PLAZO DE EJCUCION OBRA: 11 MESES
PRORROGA:	N/A
PLAZO ACTUALIZADO:	N/A
FECHA DE INICIO:	19 de julio de 2023

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	19 de junio 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO:	Diez (10) meses y doce (10) días
ESTADO:	En ejecución
DIRECCION:	Cra 5 N.º 9 – 16 Espinal.
TELEFONO:	3188031953
CORREO ELECTRÓNICO:	alamedamelgarlb@gmail.com – Egibaron01@gmail.com

EQUIPOS Y MAQUINARIA

EQUIPOS EN OBRA	*ACTIVIDAD*	*ESTADO DEL EQUIPO*
Estación Total	Replanteo de vías	Calibrado y en buen estado
Nivel	Replanteo de vías	Calibrado y en buen estado

5.3 RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ

El proyecto ha requerido de reuniones comité que se han desarrollado tanto en campo como en oficina con el fin de definir puntos importantes para el avance de la obra y que requieren de atención especial y prioritaria. A continuación, se relacionan los comités de obra desarrollado y sus participantes:

ACTA	*FECHA*	*PARTICIPANTES*
Acta Nº1.	10 agosto de 2023	Interventoría, Contratista Obra y supervisión
Acta Nº2	11 septiembre de 2023	Interventoría, Contratista Obra y supervisión
Acta Nº3.	7 noviembre de 2023	Interventoría, Contratista Obra y supervisión
Acta Nº4	04 de enero de 2024	Interventoría, Contratista Obra y supervisión

	21 de marzo de 2024	Interventoría, Contratista Obra y supervisión

6 ACTIVIDADES REALIZADAS

6.1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Las siguientes actividades administrativas corresponden principalmente a lo elaborado en el periodo del presente informe:

1. Dentro de las actividades técnico administrativas, se genera visita con el personal directivo del Club de Suboficiales de la policía, con el fin de establecer cada uno de los mecanismos posibles para tratamiento de muro existente perimetral en propiedad de estos que se encuentra ubicado entre el K0+600 Hasta el K0+700 aproximadamente, ya que dicho elemento se encuentra con problemas estructurales que generan un peligro constante en la zona incluso para la estabilización de la vía en el sector mencionado. Por lo que se sugiere la construcción de un nuevo murro de cerramiento que cumpla con la necesidad de la zona incluyendo el relleno necesario y la instalación de la estructura del pavimento para la continuación del proyecto.

2. Por parte de la supervisión e interventoría del proyecto se aprueba la instalación de tubería de aguas lluvias que presentó daño ubicado en el K0+030 Aproximadamente que requirió la necesidad del cambio total de la longitud afectada en el sector. Dicho cambio se hizo con tubería PVC tipo Novafort de 12".

3. De igual manera se presenta la propuesta para instalación de dos (2) sumideros y la inclusión en la instalación de tubería sanitaria para manejo de aguas lluvias en las que se requería la instalación de 12" entre sumideros y 16" conexión al Box Culver existente sobre la vía, por lo que la instalación se hizo paralelo a la cuneta en concreto.

4. Se ha desarrollado la verificación conjunta de cantidades contractuales y proyección de las mismas de acuerdo a las condiciones actuales del proyecto, en los que se incluyen actividades no previstas. Estas actividades han sido cuantificadas lo que permiten la realización de un nuevo balance de cantidades próximo a presentar donde se expone la necesidad de adición presupuestal al contrato de acuerdo a lo presentado verbalmente.

5. Se solicita a la interventoría el seguimiento de cada uno de los procesos constructivos que se encuentran ejecutando y como medio de viabilización de estos, se autoriza por medio de la bitácora diaria. Esto con el fin de que cada proceso constructivo se lleva a cabalidad con la necesidad del mismo o con el aval respectivo de control.

6. Se desarrolló reunión técnico administrativa con el fin de definir puntos importantes dentro de las actividades que a la fecha se encuentran en ejecución, así como la definición de posibles Ítems no previstos revisados.

7. Se presenta propuesta para la construcción de encole como reemplazo de cabezote tipo aleta en alcantarillas para aprobación por parte de la interventoría e iniciar la construcción de los mismos. A la fecha el contratista se encuentra a la espera de la autorización para iniciar la construcción de los elementos mencionados.

8. Se hace la provisión de prefabricados en el proyecto de acuerdo a la necesidad del mismo referente a la instalación de bordillos, sardineles y losetas.

9. Como requerimientos, se ha presenta y solicita la aprobación para el aprovechamiento forestal e inclusión de este en el presupuesto del Plan de Manejo Ambiental PMA.

6.2 ACTIVIDADES TÉCNICAS DEL PERIODO

1. Dentro de las actividades contractuales se inician los replanteos generales de obra con el fin de definir los espacios de intervención del proyecto, lo que permite desarrollar a su vez actividades de retiro de capa vegetal y limpieza en zonas incluso boscosas.

2. Se hace igualmente la instalación de Geotextil NT 2000 en el PR3+252 en el ancho total de sendero peatonal y ciclorruta, teniendo en cuenta lo propuesto inicialmente por el consultor y que es concordante con las memorias de cantidades.

3. Instalación de base granular para estructura del pavimento que se requiere en la zona de la ciclorruta y en la alameda a lo largo del proyecto, dicha instalación se hace inicialmente en los K2+850 hasta el K3+248 Sector Sena y en K0+050 Hasta K0+250 en el sector del club de la Policía.

4. Se inicia la instalación de losetas prefabricadas en el ancho útil autorizado de 1.60 para la alameda como incluyendo la instalación de igual manera del bordillo A80 con su dilatación en Adoquín.

5. Se procede a la instalación de Sardineles en concreto prefabricado A40 en el sector de la policía para la construcción de cunetas.

6. Se hace la construcción de cunetas en concreto con ancho de 0.90 mts en el sector del SENA con el fin de dar continuidad a las existentes y en el sector de la policía una cuneta con ancho de 0.60Mts fundidas en sitio.

7. Previa autorización por parte de la interventoría y la supervisión del contrato, la instalación de bordillo A80 paralelo al sardinel A40 y muro borde construido desde el K0+005 hasta el K0+062 sector Policía. Dicha actividad se inicia de acuerdo a lo establecido en campo por las entidades controladoras del contrato. Se resalta a dichas entidades que al hacer la reducción del ancho total diseñado inicialmente y que se hizo demolición del pavimento, quedará sin intervenir un ancho aproximado de 60 centímetros sin capa asfáltica lo que crea la necesidad de adicionar un nuevo ítem no previsto y que generará una variación en el presupuesto inicial.

8. Se procede a hacer la demolición de muro borde sectores de "curvas", debidamente solicitado en sitio por la supervisión del contrato para medidas futuras correspondientes a los árboles del sector previa autorización por parte de la entidad supervisora e interventora.

9. Se hace la instalación de Capa de asfalto para la ciclorruta con un ancho máximo de 1.80 como se encuentra previsto en los diseños arquitectónicos presentados por la consultoría del proyecto.

10. Se continua con la instalación de loseta en el sector Alameda Club de Suboficiales de la Policía entre el tramo K0+000 hasta el K0+530. Se cancela la construcción de "Islas" representadas en el diseño inicial ubicadas en el K0+230 y K0+420 Aproximadamente.

6.2.1 Campamento y Oficinas

- La oficina por parte del contratista, se encuentra adaptada para recibir todas las solicitudes por parte de la comunidad, así como por parte de todos los entes correspondientes que directa e indirectamente se encuentren relacionados con el proyecto.
  La ubicación de la oficina de atención se encuentra ubicada en la dirección Cll 7 # 50-105 VIVERO LOCAL 3 Barrio Resacas en el municipio de Melgar.

6.2.2 Topografía

- Los levantamientos topográficos realizados inicialmente por parte del consultor se tuvieron en cuenta para la verificación y posterior implantación, por lo que se proceden a realiza replanteo y trasado de los ejes de vía, donde se estaca y señaliza cada 5 y 10 mts, de esta forma se implanta de acuerdo a los diseños.

- Se continua con el replanteo de las zonas de andenes en el sector del Club de Suboficiales con el fin de adelantar trabajos para posterior adecuación e instalación de sardineles y bordillos en las zonas que estás lo requieran.
- La comisión a la fecha se encuentra en la verificación de los niveles correspondientes a la subrasante del terreno para la posterior instalación de base de acuerdo a lo establecido en el diseño del pavimento

6.3 Área social

Se hizo el levantamiento de actas de vecindad, durante este proceso se brindó información clara, veraz y oportuna a la población del área de influencia del proyecto sobre el procedimiento que se va a adelantar y las actividades a realizar.

7 CANTIDADES DE OBRA

7.1 CANTIDADES ACTUALIZADAS

Para el presente informe se genera el acta modificatoria de cantidades de obra descrita a continuación:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CANTIDADES ACTUALIZADAS
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
1- PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo con aparatos topográficos y manual	M2	9.278,65
2	1,2	Cerramiento perimetral	ML	1.738,00
Subtotal				
2 - DEMOLICIONES				
3	2,02	Demolición paradero existente.	M2	14,70
4	2,04	Demolición de andén existente en concreto (espesor 0,12 m)	M2	955,64
5	2,06	Retiro capa vegetal (espesor 0,1 m)	M2	946,00
Subtotal				
3 - COMPACTACIONES Y RELLENOS				
6	3,01	Compactación base apoyo sub rasante	M2	7.358,50

7	3,02	Suministro e instalación geotextil nt2000 no tejido de genfort o similar tela de alta resistencia.	M2	5.567,60
8	3,03	Suministro e instalación geocelda antifisura desyntex o similar de 0,15 a 20c estructuras tridimensionales.	M2	-
9	3,04	Suministro compactación recebo relleno compactado.	M3	183,78
10	3,05	Suministro, instalación y compactación de subbase granular	M3	
Subtotal				
4 - PREFABRICADOS				
11	4,01	Suministro e instalación de cañuela	M	
12	4,02	Suministro e instalación de bordillo rampa a 85	M	270,00
13	4,04	Suministro e instalación de sardinel a 40	M	689,00
14	4,05	Suministro e instalación de borde a 170	M	
15	4,06	Suministro e instalación de sardinel a 80	M	3.491,00
Subtotal				
5 - PINTURAS Y SEÑALIZACIÓN				
16	5,1	Pintura tráfico y demarcación azul	M2	392,71
17	5,2	Pintura tráfico y demarcación blanca	M	2.768,10
18	5,3	Pintura tráfico y demarcación blanca	M2	109,98
19	5,4	Pintura tráfico y demarcación amarilla	ML	3.104,00
Subtotal				
6 - ZONAS VERDES				
20	6,1	Empradización zonas verdes	M2	1.704,33
Subtotal				
7 - PISOS Y PAVIMENTOS				
21	7,1	Suministro e instalación de carpeta asfáltica	M3	147,87
22	7,2	Loseta táctil guía a 56	ML	1.428,00
23	7,3	Loseta táctil alerta a 56	ML	1.532,00
24	7,4	Loseta plana a 50.	M2	1.428,00
25	7,5	Adoquín neutro o de color	M2	271,05
26	7,6	Losas en concreto reforzado.	M2	
27	7,7	Rampa peatonal.	M2	132,47

Subtotal				
8 - MOBILIARIO URBANO				
28	8,1	Contenedor de raíz en concreto reforzado	M3	60,75
29	8,2	Bolardo m - 63 tipo idu 1,00	UND	-
30	8,3	Bolardo flexible color naranja 0,20 m x 0,20 m x 0,75 m	UND	-
31	8,4	Caneca metálica doble m - 121	UND	19,00
32	8,5	Paradero metálico sae 304	UND	4,00
Subtotal				
9 - OBRAS HIDRÁULICAS				
33	9,1	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UND	12,00
Subtotal				
10 - SEÑALÉTICA				
34	10,1	Señal vertical informativa	UND	33,00
Subtotal				
11 - OBRAS ELÉCTRICAS				
35	11,1	Desmonte y reubicación postes	UND	46,00
Subtotal				
	ITEM NO PREVISTOS			
	INP. 1	Excavación de material sin clasificar. No Inc. Retiro de sobrantes	M3	5.569,62
	INP. 2	Demolición de pavimento de espesor entre 0,15 - 0.20m.	M2	871,00
	INP. 3	Nivelación de Pozos de Inspección existentes. di=1.20m, e=0.25m, h=0,21m. (Inc. Pañete interno y demolición)	UND	10,00
	INP. 4	Concreto de 3000 PSI para estructuras (Muros bajos, Encoles, descoles)	M3	146,82
	INP. 5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	Kg	9.420,23
	INP. 6	Transporte de material de Excavación y demolición	M3/Km	334.072,86
	INP. 7	Demolición de Sardineles h=0,30 - 0,40	ML	3.946,00
	INP. 8	Desmonte y limpieza Inc. Zona boscosa	M2	2.630,00
	INP. 9	Corte de pavimento	ml	1.580,51
	INP. 10	Suministro, instalación y compactación de Base granular	M3	1.667,69

	INP. 11	Losa de pavimento en Concreto MR: 4,0MPa e=0,17m (No incluye refuerzo)	M3	57,03
	INP. 12	Cuneta en concreto 3000 psi fundida en sitio 0,60mts	ML	663,39
	INP. 13	Cuneta en concreto 3000 psi fundida en sitio 0,70mts y 0,20Mts de borde	ML	1.316,50
	INP. 14	Suministro y aplicación de Emulsión asfáltica CRL 1	m2	3.328,20
	INP. 15	Excavación manual en conglomerado (No inc. Retiro de sobrantes)	M3	379,54
	INP. 16	Sello de junta para pavimento	ML	28,51
	INP. 17	Relleno de material proveniente de la excavación	M3	726,38

7.2 ACTIVIDADES DE OBRA SEGÚN ACTA N°3

ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD
	3 - COMPACTACIONES Y RELLENOS		
3,01	Compactación base apoyo sub rasante	M2	1.361,31
3,02	Suministro e instalación geotextil nt2000 no tejido de genfort o similar tela de alta resistencia.	M2	585,00
3,04	Suministro compactación recebo relleno compactado.	M3	17,10
	4 -PREFABRICADOS		
4,02	Suministro e instalación de bordillo rampa a 85	M	17,40
4,04	Suministro e instalación de sardinel a 40	M	38,00
4,06	Suministro e instalación de sardinel a 80	M	1.387,00
	7 - PISOS Y PAVIMENTOS		
7,1	Suministro e instalación de carpeta asfáltica	M3	66,51
7,2	Loseta táctil guía a 56	ML	574,00
7,3	Loseta táctil alerta a 56	ML	574,00

7,4	Loseta plana a 50.	M2	449,60
7,6	Losas en concreto reforzado.	M2	62,75
7,7	Rampa peatonal.	M2	42,90
	9 - OBRAS HIDRÁULICAS		
9,1	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UND	2,00
	11 - OBRAS ELÉCTRICAS		
11,1	Desmonte y reubicación postes	UND	3,00
	ITEM NO PREVISTOS		
INP. 1	Excavación de material sin clasificar. No Inc. Retiro de sobrantes	M3	220,05
INP. 3	Nivelación de Pozos de Inspección existentes. di=1.20m, e=0.25m, h=0,21m . (Inc. Pañete interno y demolición)	UND	3,00
INP. 6	Transporte de material de Excavación y demolición	M3/Km	113.616,34
INP. 8	Desmonte y limpieza Inc. Zona boscosa	M2	1.480,00
INP. 9	Corte de pavimento	ml	505,00
INP. 10	Suministro, instalacion y compactacion de Base granular	M3	514,93
INP. 11	Losa de pavimento en Concreto MR: 4,0MPa e=0,17m (No incluye refuerzo)	M3	25,18
INP. 12	Cuneta en concreto 3000 psi fundida en sitio 0,60mts	ML	80,00
INP. 13	Cuneta en concreto 3000 psi fundida en sitio 0,70mts y 0,20Mts de borde	ML	50,00
INP. 14	Suministro y aplicación de Emulsión asfáltica CRL 1	m2	1.330,20
INP. 15	Excavación manual en conglomerado (No inc. Retiro de sobrantes)	M3	545,55

Estas actividades relacionadas en la anterior tabla, corresponde a cada una de las cantidades consignadas en el acta N°3 y que de igual manera se encuentran incluidas en las memorias de cantidades presentadas.

7.3 ACTIVIDADES DE OBRA ACUMULADAS EJECUTADAS

Desde la firma del acta de inicio el día 19 de julio de 2023 hasta el 31 de mayo del año 2024 proyecto de acuerdo con la siguiente tabla, ha desarrollado las siguientes actividades acumuladas en cada uno de los ítems:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACUMULADO ACTAS
Nº	**ÍTEM DE PAGO**	**DESCRIPCIÓN**	**UND.**	**CANTIDAD**
1- PRELIMINARES				
1	1,1	Localización y replanteo con aparatos topográficos y manual	M2	9.738,00
2	1,2	Cerramiento perimetral	ML	1.485,25
Subtotal				
2 - DEMOLICIONES				
3	2,02	Demolición paradero existente.	M2	14,70
4	2,04	Demolición de andén existente en concreto (espesor 0,12 m)	M2	1.329,78
5	2,06	Retiro capa vegetal (espesor 0,1 m)	M2	871,00
Subtotal				
3 - COMPACTACIONES Y RELLENOS				
6	3,01	Compactación base apoyo sub rasante	M2	6.777,31
7	3,02	Suministro e instalación geotextil nt2000 no tejido de genfort o similar tela de alta resistencia.	M2	4.572,40
8	3,03	Suministro e instalación geocelda antifisura desyntex o similar de 0,15 a 20c estructuras tridimensionales.	M2	-
9	3,04	Suministro compactación recebo relleno compactado.	M3	169,47
10	3,05	Suministro, instalacion y compactacion de sub-base granular	M3	-
Subtotal				
4 -PREFABRICADOS				
11	4,01	Suministro e instalación de cañuela	M	-
12	4,02	Suministro e instalación de bordillo rampa a 85	M	17,40

13	4,04	Suministro e instalación de sardinel a 40	M	508,00
14	4,05	Suministro e instalación de borde a 170	M	-
15	4,06	Suministro e instalación de sardinel a 80	M	3.123,00
Subtotal				
5 - PINTURAS Y SEÑALIZACIÓN				
16	5,1	Pintura tráfico y demarcación azul	M2	
17	5,2	Pintura tráfico y demarcación blanca	M	
18	5,3	Pintura tráfico y demarcación blanca	M2	
19	5,4	Pintura tráfico y demarcación amarilla	ML	
Subtotal				
6 - ZONAS VERDES				
20	6,1	Empradización zonas verdes	M2	
Subtotal				
7 - PISOS Y PAVIMENTOS				
21	7,1	Suministro e instalación de carpeta asfáltica	M3	66,51
22	7,2	Loseta táctil guía a 56	ML	1.062,00
23	7,3	Loseta táctil alerta a 56	ML	1.062,00
24	7,4	Loseta plana a 50.	M2	849,60
25	7,5	Adoquín neutro o de color	M2	-
26	7,6	Losas en concreto reforzado.	M2	62,75
27	7,7	Rampa peatonal.	M2	42,90
Subtotal				
8 - MOBILIARIO URBANO				
28	8,1	Contenedor de raíz en concreto reforzado	M3	51,80
29	8,2	Bolardo m - 63 tipo idu 1,00	UND	

30	8,3	Bolardo flexible color naranja 0,20 m x 0,20 m x 0,75 m	UND	
31	8,4	Caneca metálica doble m - 121	UND	
32	8,5	Paradero metálico sae 304	UND	
Subtotal				
9 - OBRAS HIDRÁULICAS				
33	9,1	CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN 60x60	UND	2,00
Subtotal				
10 - SEÑALÉTICA				
34	10,1	Señal vertical informativa	UND	
Subtotal				
11 - OBRAS ELÉCTRICAS				
35	11,1	Desmonte y reubicación postes	UND	3,00
Subtotal				
ITEM NO PREVISTOS				
	INP. 1	Excavación de material sin clasificar. No Inc. Retiro de sobrantes	M3	2.525,42
	INP. 2	Demolición de pavimento de espsor entre 0,15 - 0.20m.	M2	693,00
	INP. 3	Nivelación de Pozos de Inspección existentes. di=1.20m, e=0.25m, h=0,21m . (Inc. Pañete interno y demolición)	UND	3,00
	INP. 4	Concreto de 3000 PSI para estructuras (Muros bajos, Encoles, descoles)	M3	98,16
	INP. 5	Suministro figurado y armado de acero de refuerzo 60000 PSI	Kg	2.810,50
	INP. 6	Transporte de material de Excavación y demolición	M3/Km	269.702,53
	INP. 7	Demolición de Sardineles h=0,30 - 0,40	ML	2.198,00
	INP. 8	Desmonte y limpieza Inc. Zona boscosa	M2	2.809,54
	INP. 9	Corte de pavimento	ml	1.313,00
	INP. 10	Suministro, instalacion y compactacion de Base granular	M3	1.206,36

	INP. 11	Losa de pavimento en Concreto MR: 4,0MPa e=0,17m (No incluye refuerzo)	M3	25,18
	INP. 12	Cuneta en concreto 3000 psi fundida en sitio 0,60mts	ML	498,00
	INP. 13	Cuneta en concreto 3000 psi fundida en sitio 0,70mts y 0,20Mts de borde	ML	898,00
	INP. 14	Suministro y aplicación de Emulsión asfáltica CRL 1	m2	1.330,20
	INP. 15	Excavación manual en conglomerado (No inc. Retiro de sobrantes)	M3	767,16
	INP. 16	Sello de junta para pavimento	ML	-
	INP. 17	Relleno de material proveniente de la excavación	M3	124,85
Subtotal				

Las cantidades relacionadas en la anterior tabla, corresponden al acumulado de cada uno de los ítems desarrollados en los periodos entre el 19 de Julio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024 y que están incluidas en el acta N°3 y que de igual manera se están incluidas en las memorias de cantidades.

8 ACTIVIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA

A la fecha de la presentación del presente informe correspondiente al acta parcial de obra No. 3, se presenta la cuantificación de actividades correspondientes a los Capítulos de compactaciones y rellenos, prefabricados, pisos y pavimento, Mobiliario urbano, obras hidráulicas, obras eléctricas e ítems no previstos incluidos en el contrato de obra No 500 de 2023 con un porcentaje de ejecución en la presente acta del 22.90%

9 ACTIVIDADES DE OBRA ACUMULADAS

Las actividades ejecutadas acumuladas a la fecha de la presentación del acta parcial No.3 se encuentran relacionadas con los ítems contractuales vigente en el presupuesto con un porcentaje de ejecución total del 64.92% y un saldo por ejecutar del 35.08%

10 REGISTRO FOTOGRAFICO

El siguiente registro fotográfico corresponde a las actividades desarrolladas entre el 22 de abril de 2024 al 31 de mayo de 2024, las cuales fueron verificadas, controladas y autorizadas por parte de la interventoría y supervisión del contrato de obra.

LOSA EN CONCRETO REFORZADA






BELLOTA









BORDILLO PREFABRICADO













18





LOSETA ALAMEDA PREFABRICADA



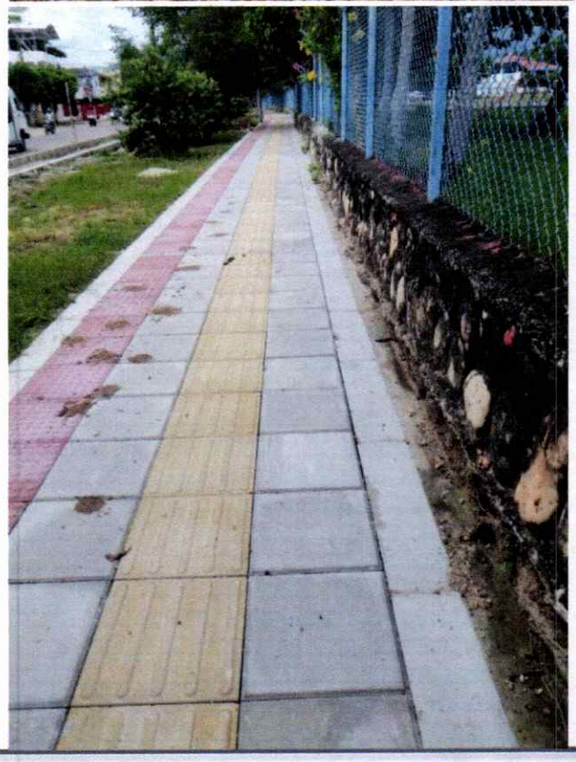


CUNETA EN CONCRETO 0.60 Y 0.90









SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y BASE GRANULAR

Esta actividad se desarrolló para la instalación de la base Granular la cual se encuentra comprendida en el diseño estructural del pavimento con un espesor de 0.26Mts





















APOYO PARA BASE COMPACTACIÓN SUBRASANTE Y LIMPIEZA

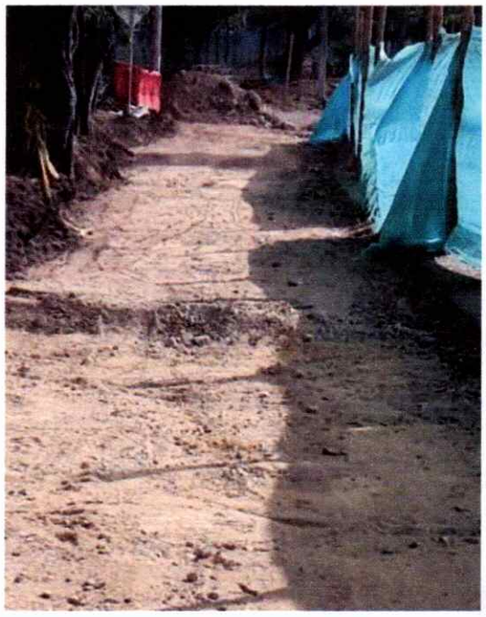







El proyecto requiere de igual manera actividades complementarias y/o antecesoras, la cuales de acuerdo a la necesidad son de importante ejecución, como excavación, desmonte y limpieza, compactación de base subrasante existente entre otras. Dichas actividades se han desarrollado en los dos tramos que a la fecha se encuentran en intervención (Club de Policía y SENA).


CARPETA ASFÁLTICA PARA CICLORRUTA

La carpeta asfáltica se instalada de acuerdo a los requerimientos exigidos en el diseño estructural del pavimento en el que se establece un espesor de 0.05 metros de espesor compactado.







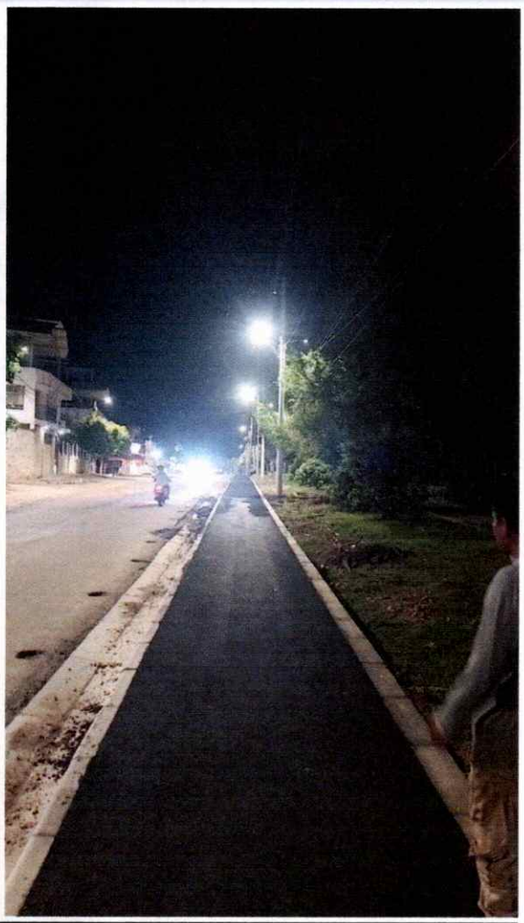









IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

En esta actividad permanentemente se cuenta con la vinculación de un (1) Auxiliar de tránsito, quien está en constante acompañamiento de la maquinaria requerida en las áreas de trabajo y/o en la verificación correspondiente a la utilización de las señales de tránsito verticales o elementos como maletines barreros plásticas, cintas de señalización, elementos tubulares u otros.









11 CONCLUSIONES

- Se han desarrollado actividades de andenes en concreto como esta especificado en el Ítem 2.04 *"Demolición de andén existente en concreto (espesor 0,12 m)"* el cual se involucra incluyendo también la demolición de cunetas en concreto dentro del mismo ítem contractual, teniendo en cuenta la similitud en los espesores y por que los anchos demolidos superan los anchos mínimos.

- Se ha presentado y solicitado a la interventoría y supervisión del contrato la verificación de posibles item no previstos que se generan de acuerdo a la necesidad en las actividades de obra y que son de importante vinculación por lo que dichos ítems solicitados son necesarios ya que son actividades predecesoras.

- Se procedió y avanzó con la aplicación de carpeta asfáltica para el sector de la ciclorruta, remate en los muros construidos, construcción de cunetas faltantes, losas en concreto reforzado entre otras actividades que han permitido un avance considerable en las actividades de obra.

- El proyecto cuenta con personal idóneo vinculado entre oficiales y ayudantes, así como el personal de administración que incluye, Un (1) Ingeniero Civil, supervisor de obra, Almacenista, Un (1) auxiliares de tránsito, Topógrafo y cadenero.

- A partir del 19 de julio de 2023 a la fecha se ha hecho la aplicación e implementación del Plan de Manejo Transito "PMT" en los que se incluye el seguimiento con auxiliares de tránsito y complementarios, barreras plásticas tipo maletín, Señalización vial tipo tubulares, Señales verticales móviles de aproximación de acuerdo a la aprobación por parte de la secretaria de tránsito municipal, así como el seguimiento del plan de Manejo Ambiental PMA.

- Se ha indicado la necesidad de recursos adicionales en el contrato, ya que una vez revisadas cada una de las actividades medidas en sitio y de acuerdo a la necesidad, estas requieren de mayores cantidades, lo que a la vez genera mayor implementación de los recursos, concluyendo de esta manera la importancia de estos para el cumplimiento del objeto total del contrato.

- Las cantidades consignadas en la parcial acta N°3 corresponde al 22.90% y el acumulado de las actividades de obra desde el 19 de julio de 2023 hasta el 31 de mayo de 2024 corresponde al 64.92%.

Elaboró:

ING. CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ
RESIDENTE ADMINISTRATIVO

Aprobó:

ING. LUIS EGIMIO BARÓN VARGAS
CONTRATISTA DE OBRA


CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO DE OBRA N.º 500 - 2023

PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ACTA PARCIAL Nº3
MAYO DE 2024



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
10728-T
AIDA INES
BARON VARGAS
C.C. 28717261
RESOLUCION INSCRIPCION 892 FECHA 17/07/1984
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
DIRECTOR GENERAL
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 18223



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 28.717.261
BARON VARGAS
APELLIDOS
AIDA INES
NOMBRES
FIRMA



217489
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.
www.ideas.com



FECHA DE NACIMIENTO 01-JUL-1960
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
23-NOV-1978 ESPINAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1534000-00190282-F-0028717261-20091024 0017444927A 1 1820102654

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B 4 4 3 D A 4 F 7 F B 1 3 4 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AIDA INES BARON VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 28717261 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 10728-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Los suscritos LUIS EGIMIO BARON VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía número 10.545.813 expedida en Popayán, en mi calidad de representante legal y AIDA INES BARON VARGAS, identificada con cedula de ciudadanía No. 28.717.261 expedida en Espinal y Tarjeta Profesional como Contadora No. T.P. 10728-T, certificamos bajo la gravedad de juramento, que se ha efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensión y Aportes a la Caja de Compensación Familiar, cuando a ello haya lugar (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), en los últimos seis (6) meses.

Lo anterior en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los dos (02) días del mes de septiembre del 2024.

LUIS EGIMIO BARON VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 10.545.813 DE POPAYAN

AIDA INES BARON VARGAS
Contadora – T.P. No. 10728-T
C.C. No. 28.717.261 DE ESPINAL

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA
AIDA I. BARON VARGAS

Que la persona natural LUIS EGIMIO BARON VARGAS, identificado con cedula de ciudadanía número 10.545.813 expedida en Popayán, ha cancelado los aportes parafiscales hasta el mes de diciembre de 2023 a abril de 2024 y se encuentra a paz y salvo con el sistema general de SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSION Y RIESGOS PROFESIONALES), la base de cotización los meses de diciembre de 2023 a abril de 2024 para el CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 500 DE 2023 se calculó de acuerdo a lo establecido en el decreto 1601 de 2022 emitida por el ministerio de salud y protección social. Lo cual se estipula en el siguiente anexo:

INGRESOS	820.017.098,75
GASTOS (FACTURAS, NOMINAS, DOCUMENTOS SOPORTES)	795.017.098,75
UTILIDAD	25.000.000,00
BASE DE COTIZACION	10.000.000,00

El valor correspondiente al pago de seguridad social fue la suma de TRES MILLONES DOS MIL DOCIENTOS PESOS ($3.002.200) MONEDA CORRIENTE.

Dada en espinal, a los dos (02) días del mes de septiembre de 2024, con destino al Municipio de Melgar – Tolima, para dar trámite al acta número tres (03) del contrato de obra civil 500 de 2023.

AIDA INES BARON VARGAS
Contadora – T.P. No. 10728-T
C.C. No. 28.717.261 DE ESPINAL

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14598774	0	MORENO VALLEJO JOHN JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA MELGAR	MZ 9 CA 1 BRR EL DIAMANTE	ALVARADO-TOLIMA	1111111	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	759348244	9469572176	E	2024/05/20	2024/07/03	BANCOLOMBIA	44	$3,042,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 8.700		CAFASUR	5	$ 216.667	4%	$ 8.700	ARL SURA	25	$ 916.667	6,96%	5	$ 15.100	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 4.200		CAFASUR	1	$ 110.000	4%	$ 4.200	ARL SURA	1	$ 110.000	6,96%	5	$ 8.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 16.000		CAFASUR	15	$ 400.000	4%	$ 16.000	ARL SURA	155	$ 860.000	6,96%	5	$ 45.300	15	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$ 379.900						$ 379.900						$ 661.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Apartante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1419677+	8	MORENO VALLEJO JOHN JAIRO	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA BELGAR	MZ 9 CS 1 BRR EL DIAMANTE	ALVARADO-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	75324624+4	94695721776	E	2024/05/20	2024/07/03	BANCOLOMBIA	44	$3,049,608

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,518,700	$53,000	$0	$1,571,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$13,900	$500	$0	$14,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$221,900	$7,800	$0	$229,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,047,100	$36,500	$0	$1,083,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$235,800	$8,200	$0	$244,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$661,300	$23,000	$0	$684,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$661,300	$23,000	$0	$684,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$379,900	$13,300	$0	$393,200
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	17	$379,900	$13,300	$0	$393,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$379,900	$13,500	$0	$393,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$12,200	$500	$0	$12,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$81,500	$2,900	$0	$84,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$159,500	$5,600	$0	$165,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$126,700	$4,500	$0	$131,200
TOTAL				17	$2,939,800	$102,800	$0	$3,042,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10545813		BARON VARGAS LUIS EGIMIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA MELGAR	cr 5 9-16	MELGAR-TOLIMA	2485762	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5807705480	9465671458	E	2024/04/03	2024/04/17	BANCO AV VILLAS	14	$5,679,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	irp	cet	vt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63395406	BURGUILLOZ GUSTAVO																		25-14	30	$1,300,000	$468,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$659,500
2	CC	9815749	CASTELLANOS MAURICIO																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS017	30	$3,500,000	$140,000	CCF46	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$343,600	30	$0	$0	SI	$1,183,600
3	CC	1193240426	DUARTE DIDIER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$659,500
4	CC	1106678502	HERNANDEZ CRISTIAN																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS002	30	$3,000,000	$120,000	CCF46	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$308,800	30	$0	$0	SI	$1,028,800
5	CC	93477648	OYUELA IVAN																		0	0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
6	CC	65705697	PALOMINO MIRIAM																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$659,500
7	PT	5697668	PUCHE KELLYS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
8	CC	1106695614	RUEDO JEFFERSON																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF46	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	SI	$619,200
9	CC	1106690105	RODRIGUEZ ANDRES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC	26886679	YARA ADRIANA																		231001	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF46	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
Total	Afiliados(10)																						$17,500,000	$2,800,000			$16,800,000	$752,000			$16,800,000	$752,000			$16,800,000	$1,308,400			$0		$5,612,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10545813		BARON VARGAS LUIS EGIMIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA MELGAR	cr 5 9-16	MELGAR-TOLIMA	2485762	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	5807705480	9465671458	E	2024/04/03	2024/04/17	BANCO AV VILLAS	14	$5,679,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	- SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,800,000	$33,500	$0	$2,833,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$400,000	$4,800	$0	$404,800
COLPENSIONES	79-14	900,336,004	7	7	$768,000	$9,700	$0	$777,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,632,000	$19,500	$0	$1,651,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,308,600	$15,600	$0	$1,324,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,308,600	$15,600	$0	$1,324,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$752,000	$9,000	$0	$761,000
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	10	$752,000	$9,000	$0	$761,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$752,000	$9,200	$0	$761,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$324,000	$3,900	$0	$327,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$52,000	$700	$0	$52,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$1,300	$0	$105,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$272,000	$3,300	$0	$275,300
TOTAL				10	$5,612,600	$67,300	$0	$5,679,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14398774	0	MORENO VALLEJO JOHN JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA MELGAR	MZ 9 CS 1 BRR EL DIAMANTE	ALVARADO-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	72644783	94637156311	E	2024/04/16	2024/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	2	$4,531,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vsp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	95413986	ALARCON GUEFFLEY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS081	30	$1,300,000	$187,000	CCF46	30	$1,300,000	$53,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
2	CC	1 [illegible]4-Y	BAQUERO CARLOS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS081	30	$1,300,000	$187,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
3	CC	1 [illegible]263	BENITEZ CRISTIAN	X																	230301	13	$563,334	$90,200	EPS017	13	$563,334	$22,600	CCF46	13	$563,334	$22,600	14-11	13	$563,334	$39,308	13	$0	$0	SI	$174,700
4	CC	1 [illegible]7504	CANO OSCAR	X																	25-14	10	$433,334	$68,400	EPS037	10	$433,334	$17,400	CCF46	10	$433,334	$17,400	14-11	10	$433,334	$30,200	10	$0	$0	SI	$134,400
5	CC	1 [illegible]5762	CUDDY ANDRES	X																	230301	11	$476,667	$76,300	EPS037	11	$476,667	$19,100	CCF46	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$33,208	11	$0	$0	SI	$147,700
6	CC	79938798	CRIOLLO EDGARD																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
7	CC	9274775	LAGARES LUIS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS081	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
8	CC	1045 [illegible]4	MORENO JUAN	X																	230301	8	$346,667	$55,500	EPS081	8	$346,667	$13,900	CCF46	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,208	8	$0	$0	SI	$107,500
9	CC	5 [illegible]3	NUÑEZ LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS082	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
10	CC	1016 [illegible]58	ORJUELA JOHN	X																	230301	17	$736,667	$117,900	EPS037	17	$736,667	$29,500	CCF46	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,308	17	$0	$0	SI	$228,700
11	CC	1 [illegible]72b	PALOMINO HYDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS082	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
12	CC	79979367	PEREZ HECTOR	X																	25-14	8	$346,667	$55,500	EPS037	8	$346,667	$13,900	CCF46	8	$346,667	$13,900	14-11	8	$346,667	$24,208	8	$0	$0	SI	$107,500
13	CC	1 [illegible]262	POLOCHE JOSE	X																	230301	17	$736,667	$117,900	EPS082	17	$736,667	$29,500	CCF46	17	$736,667	$29,500	14-11	17	$736,667	$51,308	17	$0	$0	SI	$228,700
14	CC	1 [illegible]594	RUIZ FABIAN	X																	230301	14	$586,334	$93,800	EPS037	14	$586,334	$23,600	CCF46	14	$586,334	$23,600	14-11	14	$586,334	$39,308	14	$0	$0	SI	$174,700
15	CC	79394457	SOTO DENIS		X																230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
16	CC	91399943	VALLEJO LUIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF46	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$96,500	30	$0	$0	SI	$403,500
Total	Afiliados(16)																						$14,603,337	$2,336,900			$14,603,337	$584,500			$14,603,337	$1,017,000			$0		$4,522,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14398774	0	MORENO VALLEJO JOHN JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA MELGAR	MZ 9 CS 1 BRR EL DIAMANTE	ALVARADO-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Paga	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	72644783	94637156311	E	2024/04/16	2024/04/18	BANCO DE OCCIDENTE	2	$4,531,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,336,900	$4,200	$0	$2,341,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$400	$0	$208,400
COLPENSIONES	75-14	900,336,004	7	7	$174,900	$300	$0	$175,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,587,900	$2,700	$0	$1,590,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$416,100	$800	$0	$416,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$1,017,000	$1,800	$0	$1,018,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$1,017,000	$1,800	$0	$1,018,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$584,500	$1,000	$0	$585,500
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	16	$584,500	$1,000	$0	$585,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$584,500	$1,200	$0	$585,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$74,800	$200	$0	$74,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$102,500	$200	$0	$102,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$200	$0	$104,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$303,400	$600	$0	$304,000
TOTAL				16	$4,522,900	$8,200	$0	$4,531,100

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 14198774	8	MORENO VALLEJO JOHN JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA MELGAR	MZ 9 CS 1 BRR EL DIAMANTE	ALVARADO-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	7503486344	9469572176	E	2024/05/20	2024/07/03	BANCOLOMBIA	44	$3,042,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | |

		CCF					RIESGOS						PARAFISCALES									
Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	0,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 52.800		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 52.800		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 8.700		CAFASUR	5	$ 216.667	4%	$ 8.700	ARL SURA	5	$ 216.667	6,96%	5	$ 15.100	5	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 52.000		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 9.200		CAFASUR	1	$ 230.000	4%	$ 9.200	ARL SURA	1	$ 230.000	6,96%	4	$ 16.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 52.800		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 16.000		CAFASUR	10	$ 400.000	4%	$ 16.000	ARL SURA	10	$ 400.000	6,96%	5	$ 28.000	10	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 3.500		CAFASUR	1	$ 86.667	4%	$ 3.500	ARL SURA	1	$ 86.667	6,96%	5	$ 6.100	1	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 52.800		CAFASUR	30	$ 1.300.000	4%	$ 52.000	ARL SURA	30	$ 1.300.000	6,96%	5	$ 90.500	30	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$ 379.900						$ 379.900						$ 661.300				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1439877*	0	MORENO VALLEJO JOHN JAIRO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA MELGAR	MZ 9 CS 1 BRR EL DIAMANTE	ALVARADO-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-05	75024463+4	9469572176	E	2024-05-20	2024/07/03	BANCOLOMBIA	44	$3,043,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,518,700	$53,000	$0	$1,571,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$13,900	$500	$0	$14,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$221,900	$7,800	$0	$229,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$1,047,100	$36,500	$0	$1,083,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$235,800	$8,200	$0	$244,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$661,300	$23,000	$0	$684,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	$661,300	$23,000	$0	$684,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$379,900	$13,300	$0	$393,200
CAFASUR	CCF46	890,704,737	0	17	$379,900	$13,300	$0	$393,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$379,900	$13,500	$0	$393,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$12,200	$500	$0	$12,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$81,500	$2,900	$0	$84,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	$159,500	$5,600	$0	$165,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$126,700	$4,500	$0	$131,200
TOTAL				17	$2,939,800	$102,800	$0	$3,042,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias M	a	Valor
2024-03	2024-03	1000001096	9469729558	I	2024/04/10	2024/07/11	BANCO DE BOGOTA		92	$405,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD					CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	as	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1106891143	VILLABON ALFREDO		X																	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total Afiliados(1)																								$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	1000001096	9469729558	I	2024/04/10	2024/07/11	BANCO DE BOGOTA	92	$405,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$15,400	$0	$223,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$15,400	$0	$223,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$600	$0	$7,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$600	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$12,100	$0	$174,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$12,100	$0	$174,600
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$28,100**	**$0**	**$405,400**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000001082	9464587833	I	2024/03/12	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	14	$381,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1106891343	VILLABON ALFREDO		X																230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	1000001082	9464587833	I	2024/03/12	2024/03/26	BANCO DE BOGOTA	14	$381,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$2,500	$0	$210,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$2,000	$0	$164,500
TOTAL				1	$377,300	$4,600	$0	$381,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000000096	9463463410	I	2024/02/12	2024/02/26	BANCO DE BOGOTA	14	$382,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1106891343	VILLABON ALFREDO		X																230201	30	$1,300,000	$208,000	CP503/	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total	**Afiliados(1)**																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0		$377,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-01	1000000096	9463463410	I	2024/02/12	2024/02/26	BANCO DE BOGOTA	14	$382,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$2,700	$0	$210,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$2,700	$0	$210,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$2,100	$0	$164,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$2,100	$0	$164,600
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$4,900**	**$0**	**$382,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 S6 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000000364	9461312035	I	2024/01/12	2024/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vsp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1106891343	VILLABON ALFREDO		X															230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total	Afiliados(1)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	1000000364	9461312035	I	2024/01/12	2024/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	48013676	9460671220	I	2023/12/13	2023/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	13	$341,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1106891343	VILLABON ALFREDO		X																230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$336,700
Total			**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-11	48033676	9460671220	I	2023/12/13	2023/12/26	BANCO DE OCCIDENTE	13	$341,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,400	$0	$188,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$2,400	$0	$188,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$100	$0	$6,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$100	$0	$6,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$1,900	$0	$146,900
TOTAL				1	$336,700	$4,400	$0	$341,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	63158316	9458128768	I	2023/11/14	2023/10/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$136,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1106891343	VILLABON ALFREDO																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0	No	$136,700
Total	**Afiliados(1)**																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$6,100		$0	$0		$136,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-10	63158316	9458128768	I	2023/11/14	2023/10/26	BANCO DE OCCIDENTE	0	$336,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				1	$336,700	$0	$0	$336,700

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106891343		VILLABON VANEGAS ALFREDO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 2 56 44	MELGAR-TOLIMA	2485762	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-04	2024-04	1000001094	9469729642	I	2024/05/14	2024/07/11	BANCO DE BOGOTA	58	$394,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$9,500	$0	$217,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$9,500	$0	$217,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$400	$0	$7,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$400	$0	$7,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$7,500	$0	$170,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$7,500	$0	$170,000
TOTAL				1	$377,300	$17,400	$0	$394,700

CONSTRUCCIÓN ALAMEDA ESTUDIANTIL CAHUMA LOCOMBOO EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
CONTRATO DE OBRA N.º 500 - 2023

DOCUMENTACIÓN CONTRATISTA

ACTA PARCIAL Nº3
MAYO DE 2024

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10545813**

BARON VARGAS
APELLIDOS

LUIS EGIMIO
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ENE-1963**
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-OCT-1982 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-2904600-63104642-M-0010545813-20020821 **05218**02228A 01 105427685
