INFORME SEMANAL DE OBRA No 83

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Sábado 03 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Excavación mecánica para tanque de abastecimiento y RCI.
- Armado de acero de refuerzo para columnetas en piso 2.
- Finalizan las reparaciones en sótano, acorde a las recomendaciones del patólogo.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Encofrado para escalera E-3 en piso 4.
- Fundición de losa piso 7, tramo B (1-4/A-C) en concreto de 4.000 psi.
- Encofrado de muros M-7, M-8 y M-9 en piso 7.
- Armado de acero de refuerzo para columnas D-1 y D-3 en piso 7.

Domingo 04 de agosto de 2024

- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).

Lunes 05 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Armado de acero de refuerzo para columnetas en piso 2.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Trazado de muros en piso 3.
- Instalación de protección perimetral contra caídas en piso 4.
- Encofrado de muros M-7, M-8 y M-9 en piso 7
- Armado de acero de refuerzo para columna C-3 y muros M-4 y M-6 en piso 7.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Encofrado para escalera E-3 en piso 4.

Martes 06 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Descargue de acero de refuerzo para losa piso 8 y tanques de abastecimiento y RCI.
- Anclajes con epóxico para acero de refuerzo para columnetas en piso 2.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Fundición de escalera E-1 en piso 2 y E-3 en piso 4, en concreto de 3.000 psi.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).
- Armado de acero de refuerzo de muros M-1, M-2, M-3 M-4, M-5 y M-6 en piso 7.
- Fundición de muros M-7, M-8 y M-9; columnas E-3, D-1 y D-3 en piso 7, en concreto de 5.000 psi.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Replanteo de ejes en losa piso 7 con comisión topográfica.

Miércoles 07 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo
- Instalación de protección perimetral contra caídas en piso 4.
- Descargue de acero de refuerzo para losa piso 8 y tanques de abastecimiento y RCI.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Armado de acero de refuerzo para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).

Jueves 08 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Encofrado de escalera E-3 en piso 5.
- Encofrado de muros M-4, M-5 y M-6 en piso 7.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).

Viernes 09 de agosto de 2024

- Trasiego vertical de acero de refuerzo.
- Armado de encofrado horizontal para losa piso 8, tramo A (1-4/C-F).
- Encofrado de muros M-4, M-5 y M-6 en piso 7.
- Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 7 tramo A (1-4/C-F).
- Ajuste de casetón para losa piso 8.
- Mampostería en bloque #5 en piso 3.
- Fundición de columnetas para confinamientos de muros en piso 2, en concreto de 3.000 psi.
- Instalación de protección perimetral contra caídas en piso 4.
- Encofrado de escalera E-1 en piso 3.
- Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 81 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ virtual

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Director de obra – Iván Carpentier.
Arq. Residente de obra. – Juan Velazco.
Ing. Residente de obra. – Emel Larios.
Residente Ambiental – Mabely Toncel Gómez
Residente SST – Milson Castilla.
Maestro – Eduardo Oliveros - Rafael Moreno
Tecnólogo en dibujo – Daniel Ciprian
Aux Administrativa – Wendy Quiroz.
Operativos: 10 Personas

Alquir: 32 Personas
Icoporces: 5 Personas.
Obras civiles LQ: 12 personas

Vigilancia: Security Force SAS

Celador día - 1
Celador noche – 1

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

Director interventoría – Ing. Alba Consuelo Ávila Heredia
Arq. Residente de Interventoría – Alejandro Gómez Rodríguez
Ing. Residente de Interventoría – Jorge Sierra
Inspector de Interventoría - Miguel Ángel Algarín - Carlos Sierra
Residente de Interventoría SST - Emiro Avendaño - Laura Figueroa
Residente ambiental – Ing. Karol Castañeda

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**
CIMENTACION	100.00%	100.00%
SOTANO	100.00%	97.45%
SEMISOTANO	100.00%	97.45%
ESTRUCTURA PISO 1	100,00%	99.00%
ESTRUCTURA PISO 2	100.00%	99.00%
ESTRUCTURA PISO 3	100.00%	100.00%
ESTRUCTURA PISO 4	99.12%	98.00%
ESTRUCTURA PISO 5	99.12%	98.00%
ESTRUCTURA PISO 6	99.12%	95.00%
ESTRUCTURA PISO 7	99.12%	95.00%
ESTRUCTURA PISO 8	19.38%	12.26%

CLIMA


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SOLEADO			x	x	x	x	x	x	x																					
NORMAL																														
NUBLADO																														
LLOVIZNA																														
LLUVIOSO																														

Nota:

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se continúan con el plan de contingencia para nivelarse con la programación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

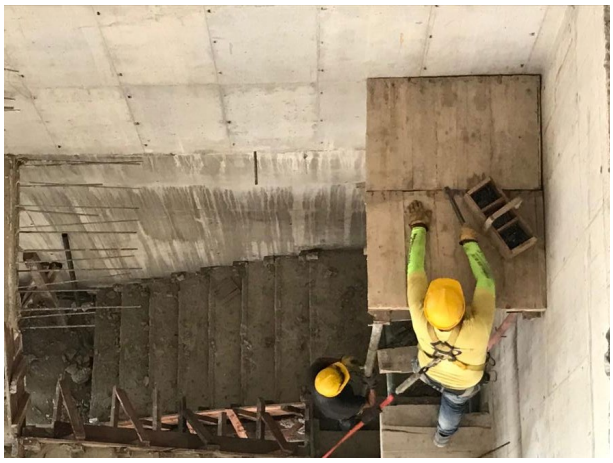



Encofrado de escaleras / Amarre de acero para columnetas





Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 7




Fundición de elementos verticales piso 7 / Armado de acero para muros piso 7




Armado de acero para muros piso 7 / Armado de acero para muros piso 7




Armado de mamposteria en piso 3





Encofrado y fundida de columnetas en piso 2
