INFORME MENSUAL DE OBRA No. 19

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024



Proyecto

REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 19

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR)."

1. GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No	: CO1.PCCNTR.4332011 No 323 del 29 de diciembre de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACIÓN PÚBICA No. 10 de 2022
CONTRATISTA	: CONSORCIO JUDICIALES (Integrante 1- JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 5% Integrante 2- SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN 29%, Integrante 3 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 33%- Integrante 4 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS 33%)
OBJETO	: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)
VALOR DEL CONTRATO	: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.420.492.192) Incluido impuestos y contribuciones de Ley.
PLAZO INICIAL	: TREINTA Y CINCO (35) MESES
FECHA DE INICIO	: 11 DE ENERO DE 2023
FECHA FINAL	: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción de las obras en general

Obras

1. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Descripción**

En este decimoctavo informe se describe de manera detallada del control técnico administrativo de las actividades ejecutadas a la fecha por parte del Consorcio Obras Judiciales para *REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)*

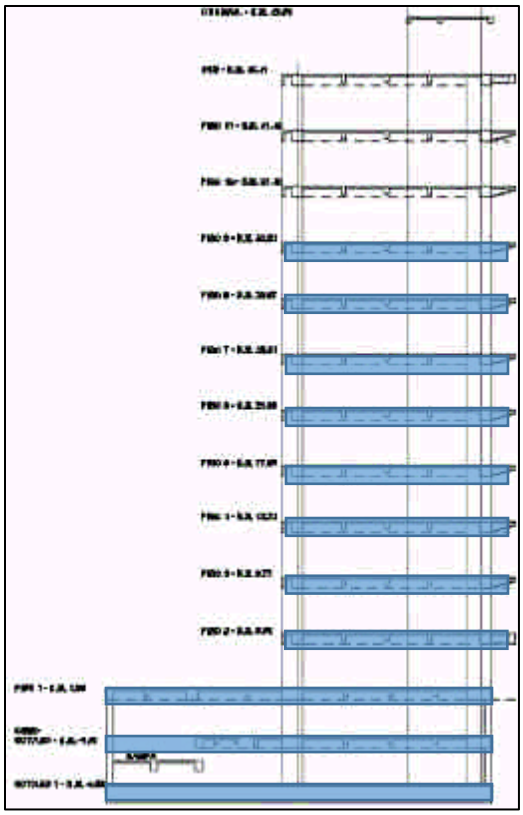


Figura. 1: Avance de estructura en vertical.

2. ANTECEDENTES

En las antiguas instalaciones del parqueadero del Palacio de Justicia, se está ejecutando la ampliación de la misma, se avanza con los pisos tipo.

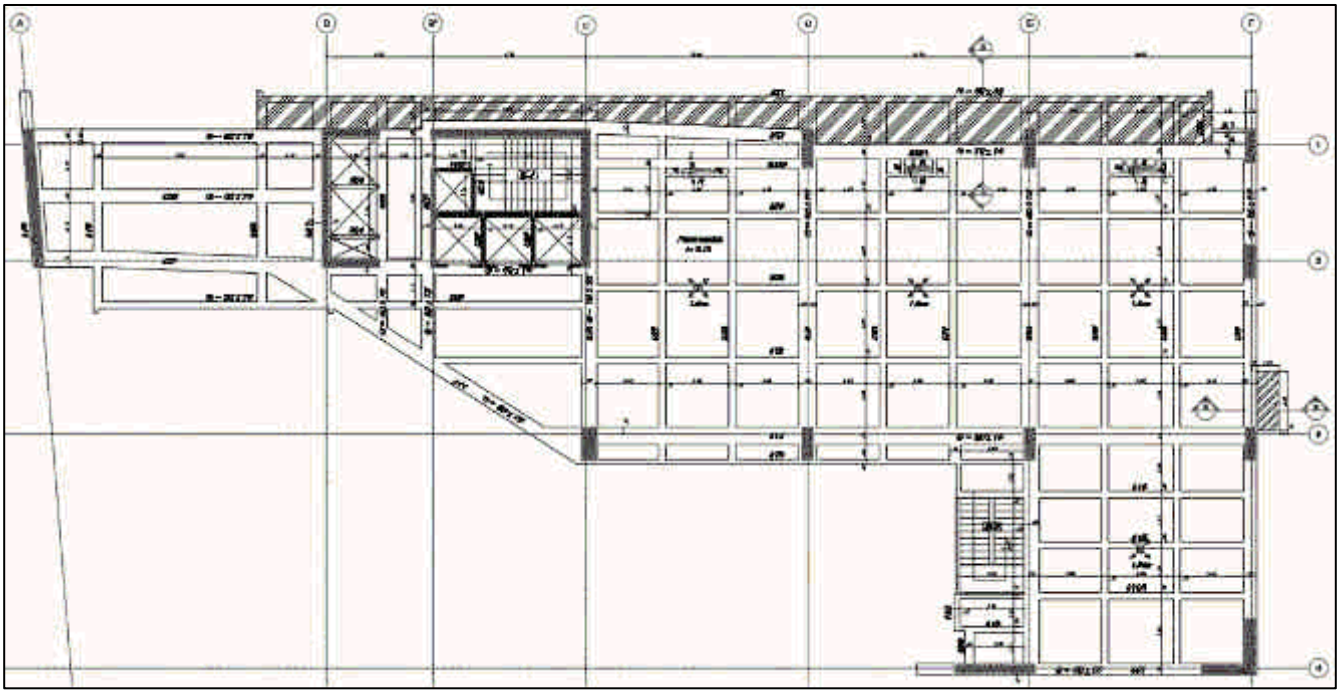


Figura. 2: Planta estructural piso 10.

3. INFORMACION GENERAL:

En este informe se encontrará información sobre el proceso y estado actual del Contrato de CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR). Ejecutado por el Consorcio Obras Judiciales

Con fecha 11 de enero de 2022 se firma el acta de inicio de Obras con Consorcio obras judiciales en calidad de contratista con su representante legal Julio Roberto Balbuena Alarcón, el señor Néstor Camilo Artunduaga Ávila como representante legal del consorcio Intervalledupar 2022 en calidad de interventoría externa y el arquitecto Jorge Enrique Hernández Becerra profesional universitario grado 20 del grupo de proyectos especiales de infraestructura de la dirección ejecutiva de administración judicial en calidad de coordinador de proyecto y la señora Ángela Aránzazu Montoya coordinadora grupo de proyectos especiales de infraestructura.

Se posesiona de parte del Consorcio Obras Judiciales al Ingeniero Julián Andrés Cogollo como Representante legal.

Que mediante Otro Si #1 con fecha 22 de febrero de 2023, el Consorcio Obras Judiciales delega al Señor Víctor Anderson Valbuena Quiroga como nuevo Representante Legal del Consorcio, y al Señor Julián Andrés Cogollo y al Señor Sergio Sereda Martínez como Representantes Suplentes del Consorcio.

Dificultades Presenciadas Durante el Desarrollo del Contrato


En el transcurso del mes de agosto de 2024 el desarrollo del proyecto ha tenido retrasos frente a cronograma presentado debido a diversas variables, descritas a continuación:

- Factores climáticos: Las fuertes lluvias en la tarde/noche del 20 generaron desprendimientos de la excavación del tanque, ocasionando retrasos en el avance de dicha actividad.

3.1 SITUACIÓN DE LA OBRA.

Al finalizar el 31 de agosto de 2024, las actividades del Proyecto han progresado como a continuación se describe:

REPLANTEO DE ESTRUCTURA
EXCAVACION MECANICA EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
ESCALERA EN CONCRETO TIPO_1 DE 3000 PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICADOS EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO A LA VISTA TIPO_1 DE 5000PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
MUROS EN CONCRETO A LA VISTA TIPO_1 DE 5000PSI - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR A LA VISTA TIPO_1 4000PSI TORTA E=12CM INCLUYE VIGAS DESCOLGADAS H=0.75M Y H=0.5M - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
FOSO ASCENSOR EN CONCRETO TIPO_1 4000 PSI. PUBLICOS Y PRIVADOS - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES
ANCLAJE TIPO_1 1/2" POR PROCESO CONSTRUCTIVO - INCLUYE REFUERZO Y EPOXICO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL
SUMINISTRO Y MANEJO DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO Y MANEJO DE MALLA ELECTROSOLDADA STANDAR INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE
MURO BLOQUE ARCILLA TIPO_1 X M2 N° 5 INCLUYE PEGA EN MORTERO 1:3, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECION Y FUNCIONAMIENTO.
COLUMNETAS EN CONCRETO TIPO_1 3000 PSI
DINTELES EN CONCRETO TIPO_1 3000 PSI
ANCLAJES EPOXICO 1/2" - (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA, NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO CON LAMINA DE ICOPOR
ASEO GENERAL

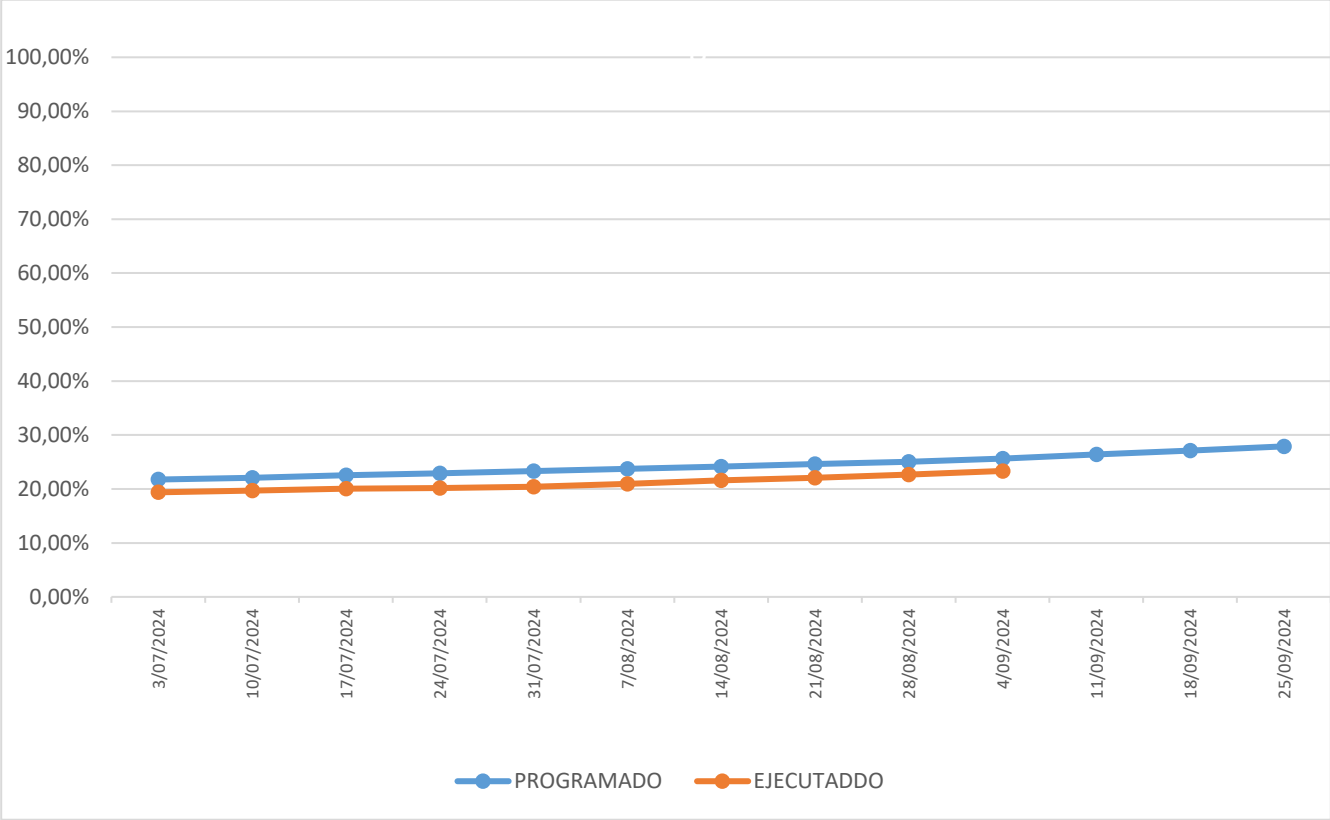

PORCENTAJE PROGRAMADO: 25,64%
PORCENTAJE EJECUTADO: 23,34%

3.2 CONTROLES DE OBRA

Controles Generales de procesos

De acuerdo a los rendimientos de las actividades presentados durante el mes de agosto, se identifican los procesos a mejorar, haciendo revisión de los equipos de trabajo y la inversión de los recursos para asegurar que los objetivos contractuales sean alcanzados.

3.3 CONTROLES TÉCNICOS

Se cumple con las especificaciones técnicas en las ejecuciones de actividades realizadas a la fecha cumpliendo con todos los estándares de calidad y especificaciones.

- Se realizan actas de liberación de armado de aceros de refuerzo y fundición de concretos para los elementos estructurales tales como columnas, muros y losas de entrepiso. (Ver anexo “Formatos de Liberación”)
- Se realizan ensayos a los concretos vaciados de acuerdo con el título C.5.1.3 de la NSR-10 y el cuadro de especificaciones del proyecto. (ver anexo “Ensayos de Concretos”)

		
REVISION DE PLOMOS EN MUROS DE MAMPOSTERIA	**REPLANTEO DE EJES CON COMISION TOPOGRAFICA**	**REVISION DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO DE MUROS**
		
TRAZADO Y REVISION DE MUROS DIVISORIOS	**TRAZADO DE EJES CON COMISION TOPOGRAFICA**	**PRUEBAS SOBRE REPARACIONES EN SOTANO**
		
REVISION DE REFUERZO EN CONFINAMIENTOS DE MUROS	**TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO Y MORTERO**	**REVISION DE TRAZADO DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**

3.4 CONTROLES GENERALES

Se realiza el seguimiento según la programación aprobada, se está monitoreando semanalmente el avance de los trabajos, sin embargo, este ha teniendo diferencias dados los hallazgos presentados en campo, condiciones climáticas y limitaciones del sector. Actualmente se hace seguimiento del plan de contingencia para recuperar los retrasos presentados.

3.5. CONTROLES GENERALES DE SUBCONTRATISTAS

Actualmente se cuenta con dos (4) contratistas: estructura en concreto y el manejo del acero; manejo de aligerantes para las losas de entrepiso; demoliciones y excavaciones; y mampostería en bloque. Los trabajos son realizados por personal de mano de obra calificada, verificando que cumplan con lo consignado en planos y especificaciones del proyecto, además de cumplir con las fechas estipuladas para las actividades pertinentes.

3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

LOCALIZACION Y REPLANTEO.

- Se realiza levantamiento topográfico para la ubicación, verificación de ejes estructurales y niveles de los diferentes elementos del proyecto.

ARMADO DE ACERO

- Armado de acero para Muros M-1, M-2, M3, M-4, M-5, M-6, M7, M8 y M9 en piso 6 y piso 7; las columnas C3, D1, D3, E1, E3, F1, F2 y F3 en piso 6 y piso 7; vigas de piso 6 y 7, 301 a la 337, placa de sexto piso y séptimo piso; escalera E-3 de piso 3.

ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

- Columnas rectangulares en concreto a la vista de 5000psi - piso 6 - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y lo contenido en los planos estructurales E-1, E-2 y E-27.

- Muros en concreto a la vista de 5000psi -piso 5 y piso 6 - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y lo contenido en los planos estructurales E-28 al E-34.

ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO

- Losa aligerada sin torta inferior a la vista 4000 psi torta e=12cm incluye vigas descolgadas h=0.75m y h=0.50m - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en los planos estructurales, revisando las demás especialidades para dejar los pasantes verticales y horizontales requeridos. (Piso 6 y piso 7)

ESCALERAS EN CONCRETO

- Escalera en concreto de 3000 psi - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en los planos estructurales E-35 y E-36.

MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES

- Muro en bloque de arcilla N° 5, incluye pega de 1 cm en mortero 1:3, construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en los planos de elementos no estructurales E-42.

- Columnetas en concreto de 3000 psi, construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en los planos de elementos no estructurales E-42.

- Dinteles en concreto de 3000 psi, construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en los planos de elementos no estructurales E-42.

CONDICIONES CLIMATICAS

- Durante la ejecución de las obras correspondientes al mes de agosto de 2024, las lluvias presentes en la tarde/noche del 20 generaron desprendimientos de la excavación del tanque, ocasionando reprocesos.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																				X											

PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, Consorcio Obras Judiciales utilizó el siguiente personal:

PERSONAL	CANT.	ACTIVIDADES REALIZADAS
Director	1	Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, dirección de obras, administración de materiales.
Arq. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Ing. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.

Residente Ambiental	1	Supervisión / manejo ambiental por la ejecución de Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Residente SST	2	Actividades de seguridad y salud en el trabajo.
Auxiliar Administrativo	1	Actividades administrativas, compras, recepción de Documentos, etc.
Delineante arquitectónico y de ingeniería	1	Realizar los ajustes, modificaciones y generación de planos récord que se requieran.
Maestro de obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas.

COMISIÓN TOPOGRAFICA

Topógrafo	1	Trazado y levante de ejes estructurales
Auxiliar de topografía	1	Ayudante trazado y levante de ejes estructurales

CONTRATISTAS:

ESTRUCTURA: Inversiones Alquir

Personal operativo	31	Armado de encofrados, acero y fundición en concreto de elementos estructurales verticales y horizontales.

CASETON: Icoporces

Personal operativo	8	Instalación, desencofrado y readecuación de casetón recuperable

DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES: Aldemar Navarro

Personal operativo	1	Manejo de maquinaria amarilla.

MAMPOSTERIA: Obras Civiles LQ

Personal operativo	19	Ejecución de muros en bloques de arcilla.

MATERIALES UTILIZADOS.

- Concreto 5.000 psi bombeable
- Concreto 4.000 psi bombeable
- Concreto 3.000 psi bombeable
- Malla electrosoldada 7mm 15x15
- Barras corrugadas 420 MPa
- Bloque de arcilla No 5.
- Alambre negro
- Arena
- Gravilla ¾”
- Cemento UG
- Brocas
- Puntillas
- Sika Anchorfix
- Vinipel industrial
- Tubería sanitaria de 2” 3” 4” 6” 8”
- Tubería Conduit ¾” 1” 1 ¼”

EQUIPOS UTILIZADOS.

Los equipos usados para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fueron las siguientes:

- Tronzadora.
- Vibrador de concreto.
- Herramientas menores.
- Formaleta metálica.
- Parales telescópicos.
- Tableros tricapa en madera.
- Sistemas de encofrado horizontal y vertical “Sten”.
- Andamio certificado multidireccional.
- Trompo mezclador.
- Mixer.
- Bomba estacionaria para concreto.
- Pluma grúa.
- Torre grúa.

4. CONTROL DE ACTIVIDADES

4.1 Actividades Realizadas

- Se realizó revisión completa de los contratos en el mes, tiempo de entrega, revisión de actividades, ajuste de programación de instalación de actividades a realizar.
- Se ha supervisado que se inicie cada actividad con los respectivos implementos de seguridad.
- Se lleva un control del proceso constructivo de cada actividad en todas las obras supervisadas.
- Elaboración de registros fotográficos de todas las actividades desde su inicio en el transcurso de las mismas.

- Revisión de entrega y revisión física de cantidades de obra ejecutada.
- Revisión y supervisión de los materiales utilizados en la obra.
- Se supervisa que se trabaje con las herramientas adecuadas en los procesos constructivos de las obras.
- Se controla que se mantenga despejado y limpio el área de trabajo para no crear congestión o traumas en el tiempo y espacio del desarrollo del contrato.
- De cada actividad en la construcción de las obras, el control de actividades está basado en la revisión de cada ítem y de las medidas de cada ítem en el desarrollo de las obras.
- Todo se está llevando de acuerdo con las normas de la construcción y las especificaciones técnicas.

A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se hace la relación de las actividades administrativas realizadas por el Consorcio Obras Judiciales en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2024:

Comités de obra: Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités de seguimiento de obra:

- 02 de agosto de 2024, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 80 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ.
- 09 de agosto de 2024, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 81 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 16 de agosto de 2024, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 82 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 23 de agosto de 2024, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 83 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
- 30 de agosto de 2024, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 84 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

- Bitácora: Se ha diligenciado normalmente la bitácora de obra del proyecto.

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se han implementado planes de contingencia para que el atraso presentado en la segunda mitad de febrero no se aumente.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO (50% amortización de anticipo)
Acta No. 01	01/06/2023	25/07/2023	$ 199.565.740,00	$ 99.782.870,00
Acta No. 02	01/08/2023	06/09/2023	$ 284.342.010,00	$ 142.171.005,00
Acta No. 03	11/10/2023	27/11/2023	$ 588.114.402,00	$ 294.057.201,00
Acta No. 04	14/11/2023	27/11/2023	$ 2.149.521.094,00	$ 1.074.760.547,00
Acta No. 05	01/12/2023	18/12/2023	$ 2.320.335.326,00	$ 1.160.167.663,00
Acta No. 06	07/03/2024	22/04/2024	$ 304.143.328,00	$ 152.071.664,00
Acta No. 07	12/03/2024	14/05/2024	$ 258.041.294,00	$ 129.020.647,00
Acta No. 08	05/04/2024	21/05/2024	$ 523.261.318,00	$ 261.630.659,00
Acta No. 09	08/05/2024	19/07/2024	$ 964.365.728,00	$ 482.182.864,00
Acta No. 10	06/06/2024	23/07/2024	$ 413.363.148,00	$ 413.363.148,00
Acta No. 11	09/07/2024	22/07/2024	$ 1.087.899.253,00	$ 543.949.627,00
Acta No. 12	14/08/2024		$ 957.311.784,00	$ 478.655.892,00
TOTAL			**$10.463.627.573,00**	**$ 5.231.813.787,00**

Al momento de la entrega de este informe el acta 12 no se encuentra desembolsada.

Nota: Ver en anexo reporte de rendimientos financieros.

7. CORREPONDECIA ENVIADA

CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 856	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO 5000 psi LASS COMERCIALIZADORA S.A.S.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 857	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLAN DE CONTINGENCIA ACTUALIZADO
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 858	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO CERTIFICADO DE ALTURA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ S.A.S
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 859	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO INFORME SST CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 860	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO INFORME AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 861	CYS SEGUROS	Respuesta de SEGUROS MUNDIAL a la solicitud de reconsideracion de afectacion de poliza por incendio a kelly Vargas
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 862	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DEL ACTA DE CORTE DE OBRA No.12.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 863	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 864	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q

CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 865	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA ICOPORCES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 866	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A OBRA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ S.A.S
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 867	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA SEGURITY FORCE
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 868	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA INVERSIONES ALQUIR
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 869	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	APU, NP DISEÑO ELECTRICOS
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 870	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR SUBCONTRATISTA SANTA LUCIA DEL VALLE S.A.S
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 871	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME MENSUAL JULIO DE 2024
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 872	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR SUBCONTRATISTA ICOPORCES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 874	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA MAQUINARIA MINICARGADOR
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 875	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME SEMANAL 77 AL 83
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 876	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR SUBCONTRATISTA ICOPORCES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 877	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2023	RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 878	INVERSIONES ALQUIR SAS	NO CONFPORMIDAD POR FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA SUBCONTRATISTA ALQUIR
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 879	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	MEDIDAS Y CAMBIO NECESARIOS PARA LOGRAR MANEOBRA SEGURA EN EL IZAJE DE CARGA
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 880	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 881	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 882	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	MEDIDAS PREVENTIVAS PLACA PISO 6
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 883	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 884	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESPUESTA A: OFICIO No. CSJ-394-2024 Fisuras en elementos


CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 885	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES DEL SUBCONTRATISTA KELLY VARGAS FABRICA DE CASETON S.A.S.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 886	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO REPUESTA COMUNICADO CSJ-391-2024
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 887	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INFORME SEMANAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA V/PAR 84
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 888	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 889	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES DEL SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ S.A.S.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 890	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA GEOTERRA TOPOGRAFIA Y OBRAS CIVILES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 891	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	CERTIFICADO DE ESTACION GEOMAX
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 892	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 893	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO FICHA TECNICA DE LA MAQUINA CORDAORA DE LADRILLO
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 894	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PUNTALES PARA RIGIDIZAR EL CUERPO DE LA TORRE GRÚA NUEVA
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 895	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REPUESTAS Y GENERALIDADES SOBRE INQUIETUDES MANIFESTADAS EN COMITÉ 23082024
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 896	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	SOLICITUD DE LA REPROGRAMACIÓN No.3 DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 897	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	Resultados de pruebas de absorción a unidades de mampostería
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 898	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO HOJA DE VIDA RESIDENTE SST DEL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 899	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PROCESO CONSTRUCTIVO TANQUE DE RESERVA
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 900	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL SUBCONTRATISTA ALDEMAR NAVARRO Y EQUIPO MINICARGADOR.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 901	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIÓN.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 902	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES DEL SUBCONTRATISTA INVERSIONES ALQUIR.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 903	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 904	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO

CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 905	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PROFESIOGRAMA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 906	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REPOSICIÓN DE LOS INDIVIDUOS HURTADOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA.
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 907	BERNARDO ARDILA FERNANDEZ	Respuesta requerimiento Auto No. 628 del 12-08-2024
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 908	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 909	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REPUESTA AL OFICIO No CSJ-397-2024 APREMIO No 1 ASPECTO AMBIENTAL
CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 910	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	NO CONFORMIDAD SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q..

Nota: Ver en anexo el contenido de cada correspondencia.

8. ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Encofrado de escaleras	Instalación de protección contra caídas
	
Armado de acero para escalera piso 4	Ajuste de casetón para piso 7
	
Armado de acero losa piso 7	Mampostería en piso 2

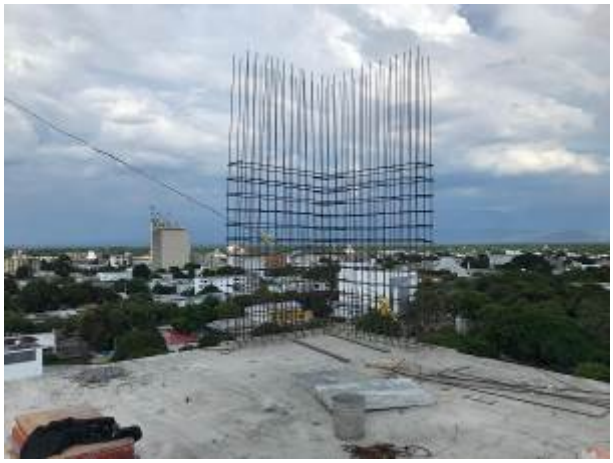	
Mampostería en piso 2	Mampostería en piso 2
	
Fundición columnas piso 7	Armado de acero muros piso 7
	
Encofrado de escaleras	Amarre de acero para columnetas

	
Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 7	Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 7
	
Fundición de elementos verticales piso 7	Armado de acero para muros piso 7
	
Armado de acero para muros piso 7	Armado de acero para muros piso 7

	
Armado de mampostería en piso 3	Armado de mampostería en piso 3
	
Encofrado y fundida de columnetas en piso 2	Encofrado y fundida de columnetas en piso 2
	
Encofrado de escaleras	Amarre de acero para columnetas

	
Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 7	Fundición muros en piso 7
	
Fundición de elementos verticales piso 7	Encofrado para losa piso 8
	
Armado de acero para losa piso 8	Armado de acero para losa piso 8

	
Fundición losa piso 8	Excavación para tanque abastecimiento y RCI
	
Encofrado de escaleras	Encofrado y fundida de columnetas en piso 2
	
Armado de mampostería en piso 3	Fundida de escaleras en piso 3

	
Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 8	Descargue de bloque #5 para piso 2 y 3
	
Ajuste de casetón para piso 8	Armado de acero para columnas piso 8
	
Armado de acero losa piso 8	Armado de acero antepechos piso 2

	
Fundición de columnetas en piso 2	Armado de acero antepechos piso 2
	
Armado de mamposteria en piso 3	Armado de acero para escaleras
	
Armado de mamposteria en piso 3	Armado de acero elementos verticales piso 8

	
Encofrado antepechos en piso 2	Encofrado de escaleras
	
Fundición de solado de limpieza en tanque	Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 8
	
Descimbrado y re apuntalamiento losa piso 8	Adecuación de casetón para losa piso 9

	
Encofrado para losa piso 9	Armado de acero para losa piso 9
	
Armado de acero para losa piso 9	Armado de acero para columnas en piso 9
	
Fundicion antepechos en piso 2	Muros en mamposteria piso 3

	
Muros en mamposteria piso 2	Fundición de elementos verticales piso 8
	
Fundición de losa piso 9	Fundición de losa piso 9

ACTAS DE LIBERACIÓN

		Versión:2.0 Fecha: 17/02/2024 Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 2-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Armado y Fundida de Columnas F1, F2, F3, E1 Piso 7

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
				* Pendiente acabados a la vista
Distanciamiento del Acero				
Calibre del Acero				
Recubrimiento de Acero				
Panelas de distanciamiento				
Armado de formaletas				
Tipo y resistencia del Concreto				5000 PSF
Prueba de asentamiento				
Equipo de Vibracion				
Colocacion del Concreto				
Muestra de concreto				
Dimension del elemento				
Tipo de elemento				

NOMBRE Y APELLIDO: John Alarcón	NOMBRE Y APELLIDO: Emel Larios	NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

		Versión:2.0 Fecha: 17/02/2024 Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 3-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO: F1 A F4 - M A D3

ACTIVIDAD:

Armado y Fundida losa Piso 7, Tramo 1

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero				
Calibre del Acero				
Recubrimiento de Acero				
Pernetes de Distanciamiento				
Armado de Formaletas				
Tipo y resistencia del Concreto				4000 PSI y 3000 PSI
Prueba de asentamiento				
Equipo de Vibracion				
Colocacion del Concreto				
Muestra de concreto				
Dimension del elemento				
Tipo de elemento				

NOMBRE Y APELLIDO: John Alarcón.	NOMBRE Y APELLIDO: Emel Lario	NOMBRE Y APELLIDO: Jorge Sum
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

		Versión:2.0 Fecha: 17/02/2024 Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 6-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:	E1 Piso 2 A/3 E3 Piso 4 A/5

ACTIVIDAD:

Armado y Fundida de Escaleras E1 y E3

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero				
Calibre del Acero				
Recubrimiento de Acero				
Pernos de Distanciamiento				
Armado de Formaletas				
Tipo y resistencia del Concreto				3000 PSI
Prueba de asentamiento				
Equipo de Vibracion				
Colocacion del Concreto				
Muestra de concreto				
Dimension del elemento				
Tipo de elemento				

NOMBRE Y APELLIDO: John Alarcón	NOMBRE Y APELLIDO: Emel Larios	NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

		Versión:2.0 Fecha: 17/02/2024 Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 6-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Armado y Fundida de Muros M7, M8-M9, Columnas E3, D1, D3 Piso 7

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero				
Calibre del Acero				
Recubrimiento de Acero				
Pernos de Distanciamiento				
Armado de formaletas				
Tipo y resistencia del Concreto				3000 PSI
Prueba de asentamiento				
Equipo de Vibracion				* Pendiente acabado a la vista
Colocacion del Concreto				
Muestra de concreto				
Dimension del elemento				
Tipo de elemento				

NOMBRE Y APELLIDO: John Alarcón.	NOMBRE Y APELLIDO: Emel larios	NOMBRE Y APELLIDO: Jorge Jaramillo
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 10-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

FUNDIDA MUROS M4, M5, M6 Y COL C3 PISO 7

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero	✓			* Pendiente acabado a la vista
CALIBRE del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Panelas de Distanciamiento	✓			
Armado de Formaletas	✓			
Tipo, y resistencia del concreto	✓			5000 PSI
Prueba de Asentamiento	✓			6"
Equipo de Vibración	✓			Vibrador eléctrico
Colocacion del Concreto	✓			Bomba estacionaria
Muestras de concreto	✓			
Dimension del elemento	✓			
TIPO de elementos	✓			Estructurales

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
Jair Alarcon	Yoel Luna	Jorge Siem
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 13-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO: (F1-F4) (D1-D3)

ACTIVIDAD:
Losa Piso 8 Tramo 1

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero	✓			
Cubre del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Ganchos de Distanciamiento	✓			
Armado de formaletas	✓			
Tipo y resistencia del concreto	✓			4000 losa y 5000 Muros
Pruebas de asentamientos	✓			6"
Equipo de Vibracion	✓			Vibrador electrico
Colocacion del concreto	✓			Bomba estacionaria
Muestras de concreto	✓			3 de 4000 y de 5000
Dimension elemento	✓			
Tipo de elemento	✓			Estructura

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
John Alarcón	Ismel Ipuana	Jorge Sierra
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 14-05-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Muros M1, M2 y M3 Piso 7

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
				* Pendiente acabado a la vista
Distanciamiento del Acero	✓			
Calibre del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Puntales de Distanciamiento	✓			
Armado de formaletas	✓			
Tipo y resistencia del Concreto	✓			5000 PSI
Prueba de Asentamiento	✓			6"
Equipo de Vibracion	✓			Vibrador electrico
Colocacion del concreto	✓			Bomba estacionaria
Muestra del Concreto	✓			1
Dimension del elemento	✓			
Tipo de elemento	✓			Estructural

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
Jhon Alarcón	Israel Arias	Jorge Sierra
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión: 2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 17-04-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Escaleras E1 Piso 3 A Piso 4 y E3 Piso 5 A Piso 6

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero	✓			
Calibre del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Panelas de Distanciamiento	✓			
Armado de Formaletas	✓			
Tipo y Resistencia del Concreto	✓			3000 PSF
Prueba de Asentamiento	✓			6"
Equipo de Vibracion	✓			Vibrador eléctrico
Colocacion del Concreto	✓			Bomba estacionaria
Muestras de concreto	✓			1
Dimension del elemento	✓			
Tipo de elemento	✓			Estructura

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
Jon Alarcon	Jose Luis	Jorge Siem
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión 2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 20-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO: (M-D3) (A1-A2)

ACTIVIDAD:

Losa Piso 8 tramo 2

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero	-			
Calibre del Acero	-			
Recubrimiento del Acero	-			
Puntales de Distanciamiento	-			
Armado de Formaletas	-			
Tipo y resistencia del Concreto	-			4000 PSI y 3000 PSI EN NODOS
Prueba de Asentamiento	-			6"
Equipo de Vibración	-			Vibrador eléctrico
Colocación del Concreto	-			Bomba estacionaria
Muestras de Concreto	-			2 de 4000 y 1 de 3000
Dimensión del elemento	-			
Tipo de elemento	-			Estructura.

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión: 2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 21-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Columnas F1, F2, F3 y E1 – Muros M8, M9 Piso 8

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
				** Pendiente acabado a la vista
Distanciamiento del Acero	-			
Calibre del Acero	-			
Recubrimiento al Acero	-			
Planos de Distanciamiento	-			
Armado de Formaletas	-			
Tipo y Resistencia del concreto	-			5000 PSI
Prueba de Asentamiento	-			6"
Equipo de Vibración	-			Vibrador eléctrico
Colocacion del concreto	-			Bomba estacionaria
Muestras de concreto	-			1
Dimensión del elemento	-			
Tipo de elemento	-			Estructura

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
Juan Alarcón	Yamel Lugo	Jorge Sierra
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión: 2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 22-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

MURO 7 y columnas E3 Y D1 Piso 8

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del acero	-			
Cubrir del acero	-			
Recubrimiento del acero	-			
Formaleta de distanciamiento	-			
Armado de Formaletas	/			
Tipo y resistencia del concreto	/			5000 PSI
Prueba de asentamiento	-			6"
Equipo de Vibración	-			Vibrador eléctrico
Colocación del concreto	-			Bomba estacionaria
Muestras de concreto	-			1
Dimensión del elemento	-			
Tipo de elemento	/			Estructura

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
John Alarcón	Yamel Lanao	Jorge Sierra
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 23-09-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Columnas D1 y D3 Piso 8

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
				* Pendiente aprobado a la vista
Distanciamiento del Acero	/			
Cubrimiento del Acero	/			
Empalmamiento del Acero	/			
Pruebas de distanciamiento	/			
Limpieza de formaletas	/			
Tipo y resistencia del concreto	/			5000 PSI
Prueba de asentamiento	/			6"
Equipo de vibración	/			Vibrador eléctrico
Colocación del concreto	/			Torre grúa
Muestras de concreto	/			1
Dimensiones del elemento	/			
Tipo de elemento	/			Estructura

NOMBRE Y APELLIDO: Juan Alarcón	NOMBRE Y APELLIDO: Ismael Lora	NOMBRE Y APELLIDO: Jorge Jaen
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 23-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

Escalera E1 Piso 4 a Piso 5 y E2 Piso 6 a Piso 7

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero	✓			
Cubrimiento del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Paneles de Distanciamiento	✓			
Armado de Formaletas	✓			
Tipo y Resistencia del Concreto	✓			3000 PSI
Prueba de Asentamiento	✓			6"
Equipo de Vibración	✓			Vibrador electrico
Colocación del Concreto	✓			Bomba estacionaria
Muestras de Concreto	✓			1
Dimensión del elemento	✓			
Tipo de elemento	✓			Estructural

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
Juan Alarcón	Ismael Luna	Jorge Sierra
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 24-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:
MURO M6 Y M4 PISO 8

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
	)			* Pendiente aceptado a la vista
Distanciamiento del acero	-			
Cubierta del acero	-			
Recubrimiento del acero	-			
Pruebas de asentamiento	-			
Armado de formaletas	-			
Tipo y resistencia del concreto	-			3000 PSI
Prueba de Asentamiento	-			6"
Equipo de Vibración	-			Vibrador eléctrico
Colocación del Concreto	-			Bomba estacionaria
Muestra de Concreto	-			1
Dimensión del elemento	-			
Tipo de elemento	-			Estructural

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 24-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:	B3-C3 Piso 2

ACTIVIDAD:
Antepechos Piso 2

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
				# Pendiente acabado
Distanciamiento del Acero	✓			a la vista
Cubrimiento del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Dovelas de Distanciamiento	✓			
Traslapos de Formaletas	✓			
Tipo y resistencia del concreto	✓			3000 Psi
Prueba de Asentamiento	✓			6"
Equipo de Vibrado	✓			Vibrador eléctrico
Colocación del concreto	✓			Torre grua
Muestras de Concreto	✓			1
Dimensión del elemento	✓			
Tipo de elemento	✓			NO Estructural

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
John Alarcon		Jorge Juan
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión: 2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 27-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:

ACTIVIDAD:

MUROS M2, M3 y M5 Piso 8

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
				* Pendiente acotado a la vista
Distanciamiento del Acero	✓			
Calibre del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Pruebas de Distanciamiento	✓			
Armados de Formaletas	✓			
Tipo y resistencia del Concreto	✓			5000 PSI
Prueba de Asentamiento	✓			6"
Equipo de Vibración	✓			Vibrador eléctrico
Colocación del Concreto	✓			Bomba estacionaria
Muestras de Concreto	✓			1
Dimensión del elemento	✓			
Tipo de elemento	✓			Estructura.

NOMBRE Y APELLIDO: Juan Alarcón	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO: Jorge Sierra
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 28-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO:	A2 - B3 Piso 2

ACTIVIDAD:
ANTEPECHO Piso 2

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
				# Rendrite acetado a la vista
Distanciamiento del Acero	✓			
Calibre del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Panel de Distanciamiento	✓			
Armado de Formaletas	✓			
Tipo y Resistencia del Concreto	✓			3000 PSF
Prueba de Asentamiento	✓			6"
Equipo de Vibrados	✓			Vibrador eléctrico
Colocación del Concreto	✓			Torre Grúa
Muestra de concreto	✓			1
Dimensión del Elemento	✓			
Tipo de Elemento	✓			Alv estructural

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
Jhon Alarcón	Ismael Luna	Jorge Jaramillo
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO LIBERACION DE ACTIVIDADES	Versión: 2.0 Fecha: 17/02/2024 Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	FECHA: 30-08-2024	HORA:

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	IDENTIFICAR EL EJE DEL PROYECTO: (F1-F4) (D1-D3)

ACTIVIDAD:
Losa Piso 9 Tramo 1

DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.	OBSERVACIONES
Distanciamiento del Acero	✓			
Cubrimiento del Acero	✓			
Recubrimiento del Acero	✓			
Paneles de distanciamiento	✓			
Amarres de formaletas	✓			
Tipo y resistencia del concreto	✓			4000 PSI y 5000 PSI en nodos
Prueba de asentamiento	✓			6"
equipo de vibraciones	✓			Vibrador eléctrico
Colocación del concreto	✓			Bomba estacionaria
Muestras de concreto	✓			3 de 4000 y 1 de 5000
Dimensión del elemento	✓			
Tipo de elemento	✓			Estructura.

NOMBRE Y APELLIDO: Juan Alvarez	NOMBRE Y APELLIDO: Yamel Luna	NOMBRE Y APELLIDO: Jorge Sierra
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO SUBCONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión: 2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	No CONSECUTIVO: 03

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)	
ACTIVIDAD:	MAMPOSTERIA	FECHA 21-8-24
ELEMENTO: Muro	LOCALIZACION: P/50 4	PLANO N°: A-009

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
LOCALIZACION Y REPLANTEO	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
	Fecha		Fecha	21-08-24

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
TIPO DE BLOQUE	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
Perforacion Horizontal				
Perforacion Vertical				
	Fecha		Fecha	21-08-24

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
MODULACION DEL MURO	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
Modulacion				
Aparejo				
Distribucion hiladas				
Espesor dilatacion				
	Fecha		Fecha	21-08-24

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
ANCLAJES	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
Perforacion				
Limpieza perforacion				
~~Distribucion hiladas~~				
Epóxico	Fecha		Fecha	

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
COLUMNETAS	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
Instalacion acero				
Formaleta				
Plomo				
Fundida concreto				
Acabado				
	Fecha		Fecha	

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
DOVELAS	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
Ratonera				
Limpieza				
Instalacion acero				
Fundida grouting				
Acabado				
	Fecha		Fecha	

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
VERIFICACION FINAL	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
Plomo				
Planitud				
	Fecha		Fecha	

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO CONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión:2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	No CONSECUTIVO: 02

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)		
ACTIVIDAD:	MAMPOSTERIA	FECHA	2-08-24
ELEMENTO: Muros	LOCALIZACION: Tercer piso	PLANO N°	A-008

	CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
	Firma	Observaciones	Firma	Observaciones
LOCALIZACION Y REPLANTEO		2-8-24 juzgados 5-8-24 baños		05/08/2024
	Fecha		Fecha	
TIPO DE BLOQUE Perforacion Horizontal Perforacion Vertical		2-8-24 juzgados 5-8-24 baños		05/08/2024
	Fecha		Fecha	
MODULACION DEL MURO Modulacion Aparejo Distribucion hiladas Espesor dilatacion		2-8-24 juzgados 5-8-24 baños		05/08/2024
	Fecha		Fecha	
ANCLAJES Perforacion Limpieza perforacion ~~Distribucion hiladas~~ Epóxico.				23-8-24
	Fecha		Fecha	
COLUMNETAS Instalacion acero Formaleta Plomo Fundida concreto Acabado				
	Fecha		Fecha	
DOVELAS Ratonera Limpieza Instalacion acero Fundida grouting Acabado				
	Fecha		Fecha	
VERIFICACION FINAL Plomo Planitud				
	Fecha		Fecha	

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO CONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

	FORMATO	Versión: 2.0
	LIBERACION DE ACTIVIDADES	Fecha: 17/02/2024
		Clasificación: Interno

CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INTERVENTORIA CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	No CONSECUTIVO: 01

PROYECTO:	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar)
ACTIVIDAD: MAMPOSTERIA	29-07-2024

ELEMENTO	Muros	LOCALIZACION	Piso 2	PLANO N°	A-007

		CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
LOCALIZACION Y REPLANTEO	Firma	Observaciones		Firma	Observaciones
		29-07-24			
	Fecha			Fecha	

		CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
TIPO DE BLOQUE	Firma	Observaciones		Firma	Observaciones
Perforacion Horizontal ✓		29-07-24			
Perforacion Vertical	Fecha			Fecha	

		CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
MODULACION DEL MURO	Firma	Observaciones		Firma	Observaciones
Modulacion ✓		29-07-24			
Aparejo ✓					
Distribucion hiladas ✓					
Espesor dilatacion	Fecha			Fecha	

		CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
ANCLAJES	Firma	Observaciones		Firma	Observaciones
Perforacion ✓				-	CARLOS S. 23-8-24
Limpieza perforacion ✓					
~~Distribucion hiladas~~ ✓					
Epóxico	Fecha			Fecha	

		CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
COLUMNETAS	Firma	Observaciones		Firma	Observaciones
Instalacion acero					
Formaleta					
Plomo					
Fundida concreto					
Acabado	Fecha			Fecha	

		CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
DOVELAS	Firma	Observaciones		Firma	Observaciones
Ratonera					
Limpieza					
Instalacion acero					
Fundida grouting					
Acabado	Fecha			Fecha	

		CONSTRUCTOR		INTERVENTORIA	
VERIFICACION FINAL	Firma	Observaciones		Firma	Observaciones
Plomo					
Planitud	Fecha			Fecha	

NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:	NOMBRE Y APELLIDO:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
CARGO CONTRATISTA:	CARGO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES:	CARGO CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022:

ENSAYOS DE CONCRETOS

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR — HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES — 5/08/2024

COD.CLIENTE: G024 — RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000, 4000 Y 5000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESIST. PSI	RESIST. (KG/CM^2)	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
22-jul	1-ago	10	2015	141	6+/-1	ESCALERA E3 PISO 3 A PISO 4 M155	Cono	F'C=3000 PSI
22-jul	1-ago	10	2116	148			Cono	
22-jul	5-ago	14	2287	160			Cono	
22-jul	5-ago	14	2310	162			Cono	
31-jul	5-ago	5	4220	295		LOSA PISO 7 TRAMO 1 M157	Cono	F'C=4000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
31-jul	5-ago	5	4257	298			Cono	
31-jul	5-ago	5	4238	297		LOSA PISO 7 TRAMO 1 M159	Cono	
31-jul	5-ago	5	4235	296			Cono	
31-jul	5-ago	5	4301	301		LOSA PISO 7 TRAMO 1 M160	Cono	
31-jul	5-ago	5	4243	297			Cono	
13-jul	27-jul	14	4649	325		LOSA TRAMO 2 PISO 6 M151	Cono	F'C=4000 PSI
13-jul	27-jul	14	4561	319			Cono	
31-jul	5-ago	5	4700	329		LLAVES LOSA PISO 7 TRAMO 1 M158	Cono	F'C=5000 PSI
31-jul	5-ago	5	4635	324			Cono	
25-jun	23-jul	28	6179	433		M7, M8-M9, CD1, CD3 Y C3 PISO 5 M143	Cono	
25-jun	23-jul	28	6068	425			Cono	
2-jul	30-jul	28	5557	389		MUROS M2 Y M3 M145	Cono	
2-jul	30-jul	28	5726	401			Cono	
13-jul	27-jul	14	3943	276		LLAVES PISO 6 Y COLUMNAS F1, F2, F3 Y E1 M152	Cono	
13-jul	27-jul	14	3873	271			Cono	
17-jul	31-jul	14	3674	257		COLUMNA E3, D1, DE, M8-M9, M7 M153	Cono	
17-jul	31-jul	14	3613	253			Cono	
19-jul	26-jul	7	4463	312		M4-M5-M6 Y COL C3 PISO 6 M154	Lado	
19-jul	26-jul	7	4347	304			Lado	
19-jul	2-ago	14	4857	340			Cono	
19-jul	2-ago	14	4948	346			Cono	
25-jul	1-ago	7	3906	273		M2-M3-M1- PISO 6 M156	Cono	
25-jul	1-ago	7	3940	276			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR — HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES — 8/08/2024

COD.CLIENTE: G024 — RESISTENCIA ESPECIFICADA: 4000 Y 5000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESIST. PSI	RESIST. (KG/CM^2)	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
10-jul	7-ago	28	2981	209	6+/-1	LOSA PISO 6 TRAMO 1 M149	Cono	F'C=4000 PSI
10-jul	7-ago	28	3122	219			Cono	
10-jul	7-ago	28	3362	235		LOSA PISO 6 TRAMO 1 M148	Lado	
10-jul	7-ago	28	3467	243			Lado	
31-jul	7-ago	7	4700	329		LOSA PISO 7 TRAMO 1 M157	Cono	F'C=4000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
31-jul	7-ago	7	4735	331			Cono	
31-jul	7-ago	7	4694	329		LOSA PISO 7 TRAMO 1 M159	Cono	
31-jul	7-ago	7	4665	327			Lado	
31-jul	7-ago	7	4660	326		LOSA PISO 7 TRAMO 1 M160	Cono	
31-jul	7-ago	7	4635	324			Cono	
3-ago	6-ago	3	3914	274		LOSA PISO 7 TRAMO 2 M163	Cono	
3-ago	6-ago	3	3980	279			Cono	
3-ago	6-ago	3	3927	275		LOSA PISO 7 TRAMO 2 M164	Cono	
3-ago	6-ago	3	3912	274			Cono	
10-jul	7-ago	28	3388	237		LLAVES LOSA PISO 6 TRAMO 1 M147	Lado	F'C=5000 PSI
10-jul	7-ago	28	3461	242			Lado	
31-jul	7-ago	7	5344	374		LLAVES LOSA PISO 7 TRAMO 1 M158	Cono	
31-jul	7-ago	7	5499	385			Cono	
3-ago	6-ago	3	4242	297		LLAVES LOSA PISO 7 TRAMO 1 M162	Cono	
3-ago	6-ago	3	4379	307			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR — HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES — FECHA: 20/08/2024

COD.CLIENTE: G024 — RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000, 4000 Y 5000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD	RESIST.	RESIST.	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
		DIAS	PSI	(KG/CM^2)				
22-jul	19-ago	28	3019	211	6+/-1	ESCALERA E3 PISO 3 A PISO 4 M155	Cono	F'C=3000 PSI
22-jul	19-ago	28	2948	206			Cono	
6-ago	13-ago	7	2302	161		ESCALERAS: E1 PISO 2 A 3, E2 PISO 4 A 5 M166	Cono	
6-ago	13-ago	7	2221	156			Cono	
6-ago	20-ago	14	2737	192			Cono	
6-ago	20-ago	14	2669	187			Lado	
13-jul	10-ago	28	5010	351		LOSA TRAMO 2 PISO 6 M151	Cono	F'C=4000 PSI
13-jul	10-ago	28	5045	353			Cono	
3-ago	10-ago	7	4639	325		LOSA PISO 7 TRAMO 2 M163	Cono	F'C=4000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
3-ago	10-ago	7	4647	325			Cono	
3-ago	10-ago	7	4547	318		LOSA PISO 7 TRAMO 2 M164	Cono	
3-ago	10-ago	7	4490	314			Cono	
13-jul	10-ago	28	5010	351		LLAVES PISO 6 Y COLUMNAS F1, F2, F3 Y E1 M152	Cono	F'C=5000 PSI
13-jul	10-ago	28	5033	352			Cono	
17-jul	14-ago	28	4954	347		COLUMNA E3, D1, DE, M8-M9, M7 M153	Cono	
17-jul	14-ago	28	5038	353			Cono	
19-jul	16-ago	28	5478	383		M4-M5-M6 Y COL C3 PISO 6 M154	Cono	
19-jul	16-ago	28	5496	385			Lado	
25-jul	8-ago	14	4458	312		M2-M3-M1- PISO 6 M156	Cono	
25-jul	8-ago	14	4514	316			Cono	
2-ago	9-ago	7	4254	298		COLUMNAS F1, F2, F3 Y E1 PISO 7 M161	Cono	
2-ago	9-ago	7	4161	291			Cono	
2-ago	16-ago	14	4697	329			Cono	
2-ago	16-ago	14	4731	331			Lado	
3-ago	10-ago	7	5054	354		LLAVES LOSA PISO 7 TRAMO 1 M162	Cono	
3-ago	10-ago	7	4953	347			Cono	
6-ago	13-ago	7	3924	275		M7, M8, M9 COLUMNA E3, D1, D3 PISO 7 M165	Cono	
6-ago	13-ago	7	3983	279			Lado	
6-ago	20-ago	14	4338	304			Cono	
6-ago	20-ago	14	4432	310			Cono	
10-ago	17-ago	7	3980	279		M4, M5, M6 Y COLUMNA C3 PISO 7 M167	Cono	
10-ago	17-ago	7	4002	280			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR — HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES — FECHA: 21/08/2024

COD.CLIENTE: G024 — RESISTENCIA ESPECIFICADA: 4000 Y 5000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESIST. PSI	RESIST. (KG/CM^2)	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
13-ago	16-ago	3	4084	286	6+/-1	LOSA PISO 8 TRAMO 1 M168	Lado	F'C=4000 PSI ACELERADO A 7 DIAS
13-ago	16-ago	3	3980	279			Lado	
13-ago	16-ago	3	3968	278			Cono	
13-ago	20-ago	7	4333	303			Lado	
13-ago	20-ago	7	4268	299			Cono	
13-ago	20-ago	7	4403	308			Lado	
13-ago	16-ago	3	4014	281		LOSA PISO 8 TRAMO 1 M169	Lado	
13-ago	16-ago	3	3993	280			Cono	
13-ago	16-ago	3	4107	288			Cono	
13-ago	20-ago	7	4389	307			Lado	
13-ago	20-ago	7	4306	301			Cono	
13-ago	20-ago	7	4358	305			Lado	
13-ago	16-ago	3	3962	277		LOSA PISO 8 TRAMO 1 M171	Cono	
13-ago	16-ago	3	4010	281			Cono	
13-ago	16-ago	3	3994	280			Lado	
13-ago	20-ago	7	4373	306			Cono	
13-ago	20-ago	7	4431	310			Lado	
13-ago	20-ago	7	4405	308			Lado	
13-ago	20-ago	7	4273	299		LLAVES LOSA PISO 8 TRAMO 1 M170	Lado	F'C=5000 PSI
13-ago	20-ago	7	4139	290			Lado	
14-ago	21-ago	7	4381	307		M1, M2 Y M3 PISO 8 M172	Cono	
14-ago	21-ago	7	4407	308			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

RESULTADOS CILINDROS COMPRESIÓN SIMPLE

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR — HOJA No. 1 De 1

SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES — FECHA: 28/08/2024

COD.CLIENTE: G024 — RESISTENCIA ESPECIFICADA: 3000, 4000 Y 5000 PSI

FECHA DE TOMA	FECHA DE ENSAYO	EDAD DIAS	RESIST. PSI	RESIST. (KG/CM^2)	ASENTAMIENTO	LOCALIZACION	TIPO DE FALLA	OBSERVACION
15-ago	22-ago	7	2571	180	6+/-1	ESCALERAS E1 PISO 4 AL 5 Y E2 PISO 5 AL 6 M173	Lado	F'C=3000 PSI
15-ago	22-ago	7	2523	177			Cono	
20-ago	27-ago	7	3463	242		LOSA PISO 8 TRAMO 2 M174	Cono	F'C=4000 PSI
20-ago	27-ago	7	3434	240			Lado	
20-ago	27-ago	7	3628	254		LOSA PISO 8 TRAMO 2 M176	Cono	
20-ago	27-ago	7	3552	249			Lado	
25-jul	22-ago	28	5372	376		M2-M3-M1- PISO 6 M156	Cono	F'C=5000 PSI
25-jul	22-ago	28	5353	375			Cono	
10-ago	24-ago	14	4524	317		M4, M5, M6 Y COLUMNA C3 PISO 7 M167	Cono	
10-ago	24-ago	14	4455	312			Lado	
13-ago	27-ago	14	4588	321		LLAVES LOSA PISO 8 TRAMO 1 M170	Cono	
13-ago	27-ago	14	4646	325			Lado	
14-ago	28-ago	14	4664	326		M1, M2 Y M3 PISO 8 M172	Cono	
14-ago	28-ago	14	4772	334			Lado	
20-ago	27-ago	7	4115	288		LLAVES LOSA PISO 8 TRAMO 2 M175	Cono	
20-ago	27-ago	7	4219	295			Cono	
21-ago	28-ago	7	3746	262		COLUMNAS F1, F2, F3, E1 Y M8-M9 M177	Lado	
21-ago	28-ago	7	3599	252			Cono	

NOTA: LAS MUESTRAS FUERON TOMADAS, ROTULADAS Y TRANSPORTADAS POR EL SOLICITANTE.
NOTA 2: De acuerdo con el artículo C.5.1.3 de la NSR-10 los resultados normativos son a 28 días a menos que se indique lo contrario en los planos.

ING. JEFE LABORATORIO

ABSORCION EN BLOQUES

OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVA SEDE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR
HOJA No. 1 DE 1
SOLICITANTE: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
FECHA 20/08/2024

CARACTERISTICAS (30,0 x 12,5 x 20,0)	BLOQUE 1	BLOQUE 2	BLOQUE 3	BLOQUE 4	BLOQUE 5	
PESO DE LA MUESTRA HUMEDA (gr)	5183,0	5104,0	4996,0	5096,0	5078,0	
PESO DE LA MUESTRA SECA (gr)	4662,0	4683,0	4687,0	4629,0	4555,0	
PORCENTAJE DE ABSORCION MUESTRA	11,2%	9,0%	6,6%	10,1%	11,5%	

OBSERVACIONES:

ING. JEFE LABORATORIO

CERTIFICADOS DE ACEROS

ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-150
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO	FECHA: 2023-12-08


RECEPCIÓN MUESTRA	FECHA ENSAYO	FECHA DE IMPRESIÓN	REFERENCIA DEL PRODUCTO	ÍTEM	No. ENSAYO
2024-07-19	2024-07-22	2024-07-23	MALLA ELECTRO XX-257 (7.0 x 7.0mm)15X15	263	MTF-0662

INFORMACIÓN GENERAL	
CLIENTE	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CIUDAD	Valledupar
No. FACTURA	86608
ORDEN DE PRODUCCIÓN	122547
COLADA	2400717
GRADO DE CALIDAD	9-1012
DIÁMETRO (mm)	7.00

Características de la malla (NTC 5806)	Mín.	Máx.	Resultado	¿Cumple?
Dimensión longitudinal (m)	5,94	6,06	5,96	Cumple
Dimensión transversal (m)	2,33	2,37	2,33	Cumple
Separación longitudinal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Separación transversal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Pelos longitudinales (mm)	62,0	88,0	75,0	Cumple
Pelos transversales (mm)	37,0	63,0	50,0	Cumple
Cuantía principal (cm²/ml)	2,57	No aplica	2,69	Cumple
Número de Varillas Longitudinales	16	17	16	Cumple
Número de Varillas Transversales	40	41	40	Cumple
Características del grafil (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Masa unitaria (gr/m)	283,88	320,12	284,90	Cumple
Espaciamiento de resaltes (mm)	4,62	7,24	5,08	Cumple
Altura promedio resaltes (mm)	0,31	No aplica	0,51	Cumple
Ángulo del resalte (°)	45	70	50	Cumple
Propiedades Mecánicas de la Malla (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Límite de fluencia (kgf/mm²)	49,46	No aplica	60,88	Cumple
Resistencia a tracción (kgf/mm²)	56,08	No aplica	63,10	Cumple
Esfuerzo cortante (N)	9 277	No aplica	103 038	Cumple

COMPORTAMIENTO
Esfuerzo vs Deformación





¡Importante! Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 5806:2019 y con el reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas resolución 0277 de Febrero de 2015, La información de las propiedades mecánicas y dimensionales contenida en el presente reporte son valores promedio obtenidos de una muestra del lote especificado en este documento, los muestreos son realizados de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad interno de Alambres y Mallas S.A. - ALMASA, cumpliendo con la norma antes mencionada y siguiendo los lineamientos descritos en la NTC 3353:2008

Pedro Rodríguez C.	
Pedro de Jesús Rodríguez Chalarca	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3	

Powered by CamScanner

ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 76787 - 10549
CARTILLA: 4802

FECHA INFORME: 2024-07-23
CONSECUTIVO: VTF-3683

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	BTY0740445	-	-	BTY0028464	-	-	-	-	-	E26306-23	-	-	A011339606	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	PAZ DEL RIO	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8 "	52,51	74,50	74 687	515	16,0	0,30	1,11	0,15	0,008	0,006	-	-	-	-	-	0,49	0,526	0,572	0,38	0,61	6,7	6,1	3,6	2,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2 "	51,91	66,08	73 833	509	17,0	0,29	1,08	0,18	0,006	0,006	-	-	-	-	-	0,47	0,934	0,978	0,51	0,77	9,9	8,2	4,9	2,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4 "	46,18	62,94	65 683	453	16,3	0,27	1,33	0,22	0,019	0,015	-	-	-	-	-	0,51	2,101	2,190	0,97	1,15	13,3	12,7	7,3	7,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8 "	50,26	64,96	71 487	493	16,0	0,28	0,88	0,16	0,021	0,008	-	-	-	-	-	0,45	2,859	2 942,000	1,12	1,71	15,5	14,6	8,5	5,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 10561
CARTILLA: 4803

FECHA INFORME: 2024-07-29
CONSECUTIVO: VTF-3694

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"	
COLADA	-	-	-	BTY002282Q	-	-	-	-	-	BHP0130404	-	-	A011332801	-	-	A011239313	-	-	BBC326312A	-	-	A011335706	-
FABRICANTE	-	-	-	TERNIUM ATLANTICO	-	-	-	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8 "	49,65	64,80	70 619	487	18,0	0,27	1,06	0,18	0,007	0,003	-	-	-	-	-	0,45	0,526	0,552	0,38	0,61	6,7	5,9	3,6	2,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8 "	49,06	63,79	69 780	481	19,0	0,26	1,08	0,21	0,012	0,009	-	-	-	-	-	0,45	1,459	1,526	0,71	0,87	11,1	10,4	6,1	3,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4 "	49,77	64,14	70 790	488	18,0	0,27	0,86	0,18	0,015	0,021	-	-	-	-	-	0,44	2,101	2,200	0,97	1,33	13,3	12,5	7,3	3,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8 "	47,35	61,29	67 348	464	18,0	0,27	0,90	0,18	0,015	0,036	-	-	-	-	-	0,04	2,859	2,928	1,12	1,73	15,5	14,6	8,5	6,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 "	48,74	64,67	69 325	478	18,0	0,27	1,07	0,21	0,019	0,018	-	-	-	-	-	0,45	3,735	3,940	1,27	1,89	17,8	16,9	9,7	6,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4 "	45,93	65,60	65 328	450	18,0	0,27	1,16	0,20	0,014	0,019	-	-	-	-	-	0,02	6,020	6,171	1,63	1,96	22,6	22,3	12,4	8,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 10572
CARTILLA: 4818

FECHA INFORME: 2024-08-05
CONSECUTIVO: VTF-3705

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	BTY0740445	-	-	BTY002001G	-	-	BHP0129228	-	-	A011373216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8 "	52,51	74,50	74 687	515	16,0	0,30	1,11	0,15	0,008	0,006	-	-	-	-	-	0,49	-	0,572	-	0,61	-	6,1	-	2,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,526	-	0,38	-	6,7	-	3,6	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2 "	51,98	66,21	73 933	510	18,0	0,29	1,07	0,17	0,005	0,005	-	-	-	-	-	0,47	-	0,987	-	0,78	-	8,1	-	2,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,934	-	0,51	-	9,9	-	4,9	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8 "	47,43	63,79	67 461	465	18,0	0,26	1,12	0,21	0,016	0,017	-	-	-	-	-	0,45	-	1,547	-	0,94	-	10,4	-	3,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,459	-	0,71	-	11,1	-	6,1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4 "	47,28	62,66	67 248	464	17,0	0,27	0,87	0,17	0,012	0,020	-	-	-	-	-	0,03	-	2,170	-	1,42	-	12,6	-	4,1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,101	-	0,97	-	13,3	-	7,3	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 1/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

LMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 76863 - 10608
CARTILLA: 4861

FECHA INFORME: 2024-08-23
CONSECUTIVO: VTF-3738

ETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
ADA	-	-	-	BTY008711Q	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTE	-	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MA APLICADA: NTC 2289

lo. nación Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extr resaltes (mn	
IN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Va
AX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	48,14	68,40	68 471	472	17,0	0,30	1,11	0,19	0,007	0,005	-	-	-	-	-	0,49		0,558		0,57		6,3		1
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,526	-	0,38	-	6,7	-	3,6	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
2 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
6 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		

NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

ERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

ALMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-150
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO	FECHA: 2023-12-08


RECEPCIÓN MUESTRA	FECHA ENSAYO	FECHA DE IMPRESIÓN	REFERENCIA DEL PRODUCTO	ÍTEM	No. ENSAYO
2024-07-19	2024-07-22	2024-08-12	MALLA ELECTRO XX-257 (7.0 x 7.0mm)15X15	263	MTF-0662

INFORMACIÓN GENERAL	
CLIENTE	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CIUDAD	Valledupar
No. FACTURA	86698
ORDEN DE PRODUCCIÓN	122547
COLADA	2400717
GRADO DE CALIDAD	9-1012
DIÁMETRO (mm)	7.00

Características de la malla (NTC 5806)	Mín.	Máx.	Resultado	¿Cumple?
Dimensión longitudinal (m)	5,94	6,06	5,96	Cumple
Dimensión transversal (m)	2,33	2,37	2,33	Cumple
Separación longitudinal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Separación transversal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Pelos longitudinales (mm)	62,0	88,0	75,0	Cumple
Pelos transversales (mm)	37,0	63,0	50,0	Cumple
Cuantía principal (cm²/ml)	2,57	No aplica	2,69	Cumple
Número de Varillas Longitudinales	16	17	16	Cumple
Número de Varillas Transversales	40	41	40	Cumple
Características del grafil (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Masa unitaria (gr/m)	283,88	320,12	284,90	Cumple
Espaciamiento de resaltes (mm)	4,62	7,24	5,08	Cumple
Altura promedio resaltes (mm)	0,31	No aplica	0,51	Cumple
Ángulo del resalte (°)	45	70	50	Cumple
Propiedades Mecánicas de la Malla (NTC 5806)	**Mín.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Límite de fluencia (kgf/mm²)	49,46	No aplica	60,88	Cumple
Resistencia a tracción (kgf/mm²)	56,08	No aplica	63,10	Cumple
Esfuerzo cortante (N)	9 277	No aplica	103 038	Cumple

COMPORTAMIENTO
Esfuerzo vs Deformación





¡Importante! **Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 5806:2019 y con el reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas resolución 0277 de Febrero de 2015, La información de las propiedades mecánicas y dimensionales contenida en el presente reporte son valores promedio obtenidos de una muestra del lote especificado en este documento, los muestreos son realizados de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad interno de Alambres y Mallas S.A. - ALMASA, cumpliendo con la norma antes mencionada y siguiendo los lineamientos descritos en la NTC 3353:2008**

Pedro Rodríguez C.	
Pedro de Jesús Rodríguez Chalarca	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3	

Powered by CamScanner

LMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 76844 - 10588
CARTILLA: 4826

FECHA INFORME: 2024-08-15
CONSECUTIVO: VTF-3720

ETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/
ADA	-	-	-	BID0169593	-	-	-	-	-	BTY0082274	-	-	AD11373301	-	-	AD11246316	-	-	BRC326311H	-	-	BTY0082463	
CANTE	-	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM	

MA APLICADA: NTC 2289

o. nación Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES						
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación entre resaltes (mm
IN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES
AX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	50,15	71,20	71 330	492	17,0	0,28	1,08	0,22	0,015	0,014	-	-	-	-	-	0,46		0,567		0,43		6,2	
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,526	-	0,38	-	6,7	-	3,6
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
2 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	50,24	65,01	71 458	493	18,0	0,27	1,08	0,19	0,008	0,007	-	-	-	-	-	0,45		1,523		0,84		10,6	
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,459	-	0,71	-	11,1	-	6,1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	48,89	63,71	69 538	479	17,0	0,28	0,88	0,17	0,014	0,023	-	-	-	-	-	0,02		2,201		1,49		12,6	
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,101	-	0,97	-	13,3	-	7,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	51,92	67,12	73 848	509	18,0	0,29	1,04	0,17	0,011	0,024	-	-	-	-	-	0,06		3,021		1,74		14,6	
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,859	-	1,12	-	15,5	-	8,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	48,74	64,67	69 325	478	18,0	0,27	1,07	0,21	0,019	0,018	-	-	-	-	-	0,45		3,940		1,89		16,9	
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,735	-	1,27	-	17,8	-	9,7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	
	51,07	69,46	72 639	501	18,0	0,29	1,09	0,18	0,005	0,005	-	-	-	-	-	0,47		6,417		1,89		21,5	
/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,020	-	1,63	-	22,6	-	12,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-	

NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

ERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

LMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 76842 - 10589
CARTILLA: 4827

FECHA INFORME: 2024-08-15
CONSECUTIVO: VTF-3718

ETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
ADA	-	-	-	BHP0226580	-	-	BTY0039231	-	-	-	-	-	A011391909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTE	-	-	-	TERNIUM	-	-	TERNIUM ATLANTICO	-	-	-	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

o. ación Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extr resaltes (mm	
N	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Va
X	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
"	52,38	66,90	74 502	514	18,0	0,27	1,07	0,21	0,009	0,020	-	-	-	-	-	0,45	0,526	0,559	0,38	0,51	6,7	6,3	3,6	1
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	50,24	65,30	71 458	493	18,0	0,30	1,06	0,17	0,006	0,007	-	-	-	-	-	0,48	0,934	1,001	0,51	0,71	9,9	8,2	4,9	2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	46,66	61,72	66 366	458	16,0	0,29	0,89	0,19	0,009	0,024	-	-	-	-	-	0,03	2,101	2,224	0,97	1,45	13,3	12,6	7,3	7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		

NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

RVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

LMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 76843 - 10590
CARTILLA: 4828

FECHA INFORME: 2024-08-15
CONSECUTIVO: VTF-3719

IETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
ADA	C57487-24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTE	PAZ DEL RIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MA APLICADA: NTC 2289

o. nación Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extr resaltes (m	
IIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Va
AX	55,00	N.E.	78000	540		0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
	44,79	63,19	63 709	439	15,4	0,28	1,04	0,17	0,027	0,022	-	-	-	-	-	0,46		0,242		0,37		4,32		2
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,234	-	0,25	-	4,45	-	2,49	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
2 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		

NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

ERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

LMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 10606
CARTILLA: 4848

FECHA INFORME: 2024-08-23
CONSECUTIVO: VTF-3740

ETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
LADA	-	-	-	BTY0495272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTE	-	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MA APLICADA: NTC 2289

o. nación Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extr resaltes (mn	
IN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Va
AX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	50,07	67,33	71 216	491	17,0	0,27	1,12	0,21	0,009	0,005	-	-	-	-	-	0,46		0,561		0,56		6,3		2
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,526	-	0,38	-	6,7	-	3,6	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
2 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		

NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

ERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

LMASA	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 05
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2023-12-08

FACTURA(S): 76862 - 10606 - 10607
CARTILLA: 4849

FECHA INFORME: 2024-08-23
CONSECUTIVO: VTF-3737

ETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
ADA	-	-	-	BTY002282S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANTE	-	-	-	TERNIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

MA APLICADA: NTC 2289

o. nación Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO										PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Co	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extr resaltes (mm	
IN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Va
AX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
	49,65	64,80	70 619	487	18,0	0,27	1,06	0,18	0,007	0,003	-	-	-	-	-	0,45		0,552		0,61		5,9		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,526	-	0,38	-	6,7	-	3,6	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
2 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		

NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

ERVACIONES:

Dalmiro Jose Bocanegra Benites	Pablo Cesar Tibocha Murcia
Elaboró	Aprobó

Powered by CamScanner

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

t: (**601**) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE JULIO DEL 2024

FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CODIGO SIFI 121205

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 25-Jan-23, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006315

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSTRUCCI˙N NUEVA TORRE P

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,669,384,994.76	*SALDO PROMEDIO*	$	1,495,355,938
TOTAL ABONOS	$	1,746,750.36	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	301,866,689.61	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	506,750.36
SALDO ACTUAL	$	1,369,265,055.51	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			54,747.27	1,669,439,742.03
4/07	PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS			840,000.00	1,670,279,742.03
8/07	ABONO INTERESES AHORROS			91,295.35	1,670,371,037.38
9/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	1,670,369,990.97
9/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	1,670,368,944.56
9/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-800,015.36	1,669,568,929.20
9/07	PAGO A PROVE LASS COMERCIALI			-100,000,000.00	1,569,568,929.20
9/07	PAGO A PROVE SANCHEZ BAYONA			-100,001,350.00	1,469,567,579.20
9/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	1,469,567,380.38
9/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	1,469,567,181.56
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			96,390.11	1,469,663,571.67
15/07	PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS			400,000.00	1,470,063,571.67
15/07	ABONO INTERESES AHORROS			16,070.01	1,470,079,641.68
16/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,635.79	1,470,077,005.89
16/07	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-658,947.79	1,469,418,058.10
23/07	ABONO INTERESES AHORROS			128,508.51	1,469,546,566.61
24/07	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-1,046.41	1,469,545,520.20
24/07	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-400,004.98	1,469,145,515.22
24/07	PAGO A PROVE CONCRETOS EL DO			-100,000,000.00	1,369,145,515.22
24/07	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-198.82	1,369,145,316.40
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			119,739.11	1,369,265,055.51
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME SST

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN..... 2

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO..... 2

2.1 Descripción del proyecto..... 2

2.1.1 Localización general del proyecto..... 2

2.1.2 Contrato de Obra..... 3

3. PERSONAL DEL PROYECTO..... 4

3.1 Personal Administrativo del proyecto..... 4

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra..... 4

4. INDICADORES..... 7

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo..... 7

4.2 Ausentismo en el proyecto..... 9

4.3 Accidentalidad del Proyecto..... **Error! Bookmark not defined.**

4.4 Funcionamiento del COPASST..... 10

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL..... 16

6. ACTIVIDADES EN OBRA..... 17

Durante el periodo comprendido entre el del presente año se realizaron las siguientes actividades:..... 17

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo..... 18

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo..... 18

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL..... 19

8. ANEXOS..... 29

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR** de acuerdo con las actividades definidas en el CONTRATODE OBRA No. 323 DEL 2022.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra situado en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, zona urbana, en la calle 14 carrera 14 # 189 (Palacio de justicia) sitio de ejecución.

2.1.1 Localización general del proyecto

El proyecto se desarrollará en el bloque de parqueaderos y áreas complementarias del Palacio de Justicia.

Ubicación Palacio de Justicia



Figura 1. Localización del palacio de justicia (Valledupar)

Fuente: Google Earth

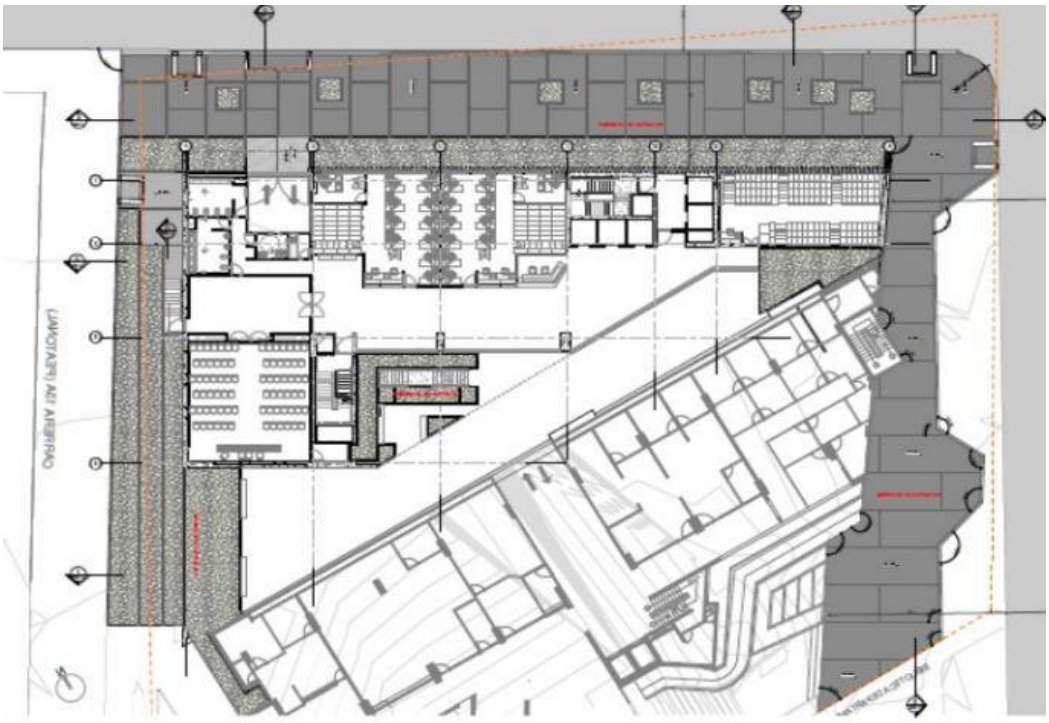


Figura 2. Localización de edificio Palacio de Justicia (Valledupar)

2.1.2 Contrato de Obra

CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE JUDICATURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
OBJETO:	"REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)"
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	TREINTA Y CINCO MESES (35) contados a partir de la respectiva acta de inicio, previa legalización del contrato.
VALOR PRESUPUESTO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (49.420.492.192) incluidos impuestos y contribuciones de ley

Tabla No. 1

3. PERSONAL DEL PROYECTO

El proyecto se ha integrado en el periodo de la presentación del siguiente informe desde el 01 al 31 de agosto del 2024 respectivamente.

3.1 Personal Administrativo del proyecto

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de agosto del presente año, se mantiene el personal operativo en el proyecto el cual desarrolla las actividades de obra civil.

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra

Desde el 01 al 31 de agosto de 2024 se contó con la participación permanente del siguiente personal en obra.

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
80058608	FERNEY PEÑA ROJAS	DIRECTOR	ADMINISTRATIVA	NO	6/2/2023	4/04/2024
5283438	MABELY TONCEL GOMEZ	DIRECTORA HSEQ	ADMINISTRATIVA	SI	6/2/2023	NA
72339619	EMEL DARIO LARIOS MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	6/3/2023	NA
40960020	LUZDAMARYS SALCEDO VALDEBLANQUEZ	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	NO	15/4/2023	11/07/2024
1065809341	WENNDY JULIETH QUIROZ AYOLA	RESIDENTE ADMON	ADMINISTRATIVA	SI	25/4/2023	NA
1065842379	JESÚS DAVID QUIROZ LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/5/2023	NA
77028189	WILMAN IGNACIO CORONADO SILVA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/5/2023	NA
1032449361	JUAN CAMILO VELAZCO VALDERRAMA	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	21/6/2023	NA
80375693	RAFAEL ERNESTO MORENO MORENO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	09/10/2023	NA
7573337	MILSON NAIN CASTILLA SALAS	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	4/12/2023	NA
1065842271	SAMUEL SAMIR ARAUJO DAZA	CONTADOR PUBLICO	ADMINISTRATIVA	SI	1/02/2024	NA
79652423	GUSTAVO HUMBERTO DURAN ALDANA	APOYO TECNICO	ADMINSITRATIVA	SI	7/03/2024	NA
1062404366	DANIEL AUGUSTO CIPRIAN RAMIREZ	ING. RESIDENTE DE REDES	ADMINISTRATIVA	SI	18/04/2024	NA
1065818686	ANDRES ALCENDRA RAMIREZ	ALMACENISTA	ADMINISTRATIVO	SI	14/03/2024	NA
12435526	LUIS ALFONSO MAESTRE RANGEL	OPERADOR BOMBA	OPERATIVO	SI	20/03/2024	NA
77028127	IVAN SANDOVAL CARPENTIER OSPINO	DIRECTOR DE OBRA	ADMINSITRATIVA	SI	10/04/2024	NA
1006888283	JULIO CESAR YEPEZ RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/05/2024	NA
1065860873	JUAN RAMON GAMARRA ELLES	OPERADOR PLUMA GRUA	OPERATIVO	SI	27/05/2024	NA
1193540601	ALBERTO FRANSISCO MAESTRE HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	10/06/2024	NA
1003376653	CESAR LUIS NUÑEZ ARRIETA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	10/06/2024	NA
1065649934	EDUARDO ANGEL OLIVEROS SOLANO	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	10/06/2024	NA
77093430	GENER DAVID MARTINEZ QUINTERO	OPER. DE TORRE GRUA	OPERATIVO	NO	14/06/2024	26/07/2024
12524205	WILSON ENRIQUE DIAZ NIETO	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	13/06/2024	NA
1018344605	IVAN ALEXI RODRIGUEZ CASTILLO	APAREJADOR DE TORRE G.	OPERATIVO	SI	9/07/2024	NA
11154633	OROSMAN ARGUMEDO OVIEDO	OPER. DE TORRE GRUA	OPERATIVO	SI	23/07/2024	NA
1119816511	NESTOR JOSE GUERRA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	21/08/2024	NA
1065622470	LINA MARCELA CARABALI ROMO	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	28/08/2024	NA

Tabla No. 2

ICOPORCER

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando
1065830373	JAVIER ANDRES RIBON JIMENEZ	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	6/4/2024	NA
1235338906	LUIS EDUARDO MORALES CONTRERAS	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	6/4/2024	NA
1003381018	WILMER JOSE AÑEZ PALOMINO	AYUDANTE	OPERATIVO	NO	6/4/2024	11/07/2024
1065619092	RAFAEL ANTONIO CASTILLA IBAÑEZ	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	20/4/2024	NA
1099370506	JOSE DAVID BOHORQUEZ MARIN	LIDER OPERATIVO	OPERATIVO	SI	20/4/2024	NA
1003381018	LUIS ALBERTO OJEDA CARDENAS	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	29/4/2024	NA
1003233928	CARLOS AUGUSTO GARCIA	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	30/4/2024	NA
1065820324	JUAN PABLO ACOSTA DIAZ	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	30/4/2024	NA
1193598529	ANGEL JAVIER ORTIZ	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	24/7/2024	NA
1066873978	RAFAEL ARTURO MEYER RUIZ	AUXILIAR	OPERATIVO	SI	9/8/2024	NA

Tabla No. 3

SECURITY FORCE

CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	21/9/2023	N/A
1065646526	JEISON ANDRES CHAMORRO SARIA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	21/9/2023	N/A
1122396146	JOSE ALBERTO GUTIERREZ SANTIAGO	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	21/9/2023	N/A

Tabla No. 4

OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA
LQ S.A.S

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77032563	JORGE CANTILLO MARINO	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
105642474	MARIETH MARTINEZ ROJAS	INSPECTOR SST	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
1065609968	GEINER AYALA BRITO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
7718056	MARIO PEREZ MERCADO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
1085293679	OLIVER BOTINA ALVAREZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
1192896348	ALDAIR MANTIEL DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
1121042687	YEFRI RODRIGUEZ SANTANA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
1065815714	MARINO MENDEZ MIRANDA	OBRERO	OPERATIVO	NO	30/7/2024	N/A
1127603425	LUIS GERARDO WARDNES BARRIOS	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	26/7/2024	N/A
1065589739	FRAN ALVER BUELVAS CORREA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	30/7/2024	N/A
1028019960	JHON MOYA GAMBOA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	30/7/2024	N/A
1065806637	ALVARO JAVIER JIMENEZ ORTIZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	30/7/2024	N/A
3532561	RICHAR PALACIO AYALA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	1/8/2024	N/A
5022817	HIDELFONSO BAENA DIAZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	15/8/2024	N/A
12686410	OSCAR RODRIGUEZ ESCOBAR	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	15/8/2024	N/A
1007457012	RONALD TOBIA CANTILLO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	15/8/2024	N/A
80357968	LUIZ ALFREDO CRUZ VALERO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	15/8/2024	N/A
1067034794	WILLIAM JAVIER ROBLES ROMERO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/08/2024	N/A
1063965063	ANDERSON BOZON DIAZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/08/2024	N/A
1065664301	YEILDER RAFAEL CELIN AREVALO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/08/2024	N/A
9116362	CARLOS ANTONIO ARDILA RUIZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/08/2024	N/A
1064707336	EMIL OCHOA BOLAÑO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/08/2024	N/A

Tabla No. 5

INVERSIONES ALQUIR S.A.S

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1019026590	JHON ALEXANDER ALARCON MUÑOZ	INGENIERIO APOYO	OPERATIVO	SI	20/10/2023	N/A
1010163945	NIEVALO JOSE LEON GARCIA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	2/2/2024	N/A
1051889500	LEWUIS ANAYA MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	2/2/2024	N/A
79894456	CARLOS ARIZA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	2/2/2024	N/A
1051889654	DEIVER RICO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	NO	2/2/2024	15/07/2024
77154925	ANIBAL JOSE JIMENEZ ESCORCIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/2/2024	N/A
1042445918	ANTHONY BARRIOS RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/2/2024	N/A
1052080418	CARLOS ANDRES OLIVERA FRANCO	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	8/2/2024	N/A
1193097283	DAMINSON MEJIA MEJIA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/2/2024	N/A
19752661	DAINER PERALES MORENO	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	6/2/2024	N/A
73507707	DEINOR MANUEL PATERNINA CRUZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/2/2024	N/A
1063291097	MANUEL DAVID MURILLO BORJA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	6/02/2024	N/A
85436637	NILSON ALBER TORREGROSA MORA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/02/2024	N/A
8605081	PEDRO MIGUEL JIMENEZ ALMANZA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	9/02/2024	N/A
3532561	RICHARD PALACIO AYALA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	NO	9/02/2024	19/07/2024
12646284	WALTER ENRIQUE GARCIA ACUÑA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/02/2024	N/A
5165243	YESMAN ENRIQUE MENDOZA MENDOZA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/02/2024	N/A
73507228	YONIS ALBERTO SARMIENTO GUARDO	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	6/02/2024	N/A
1007593722	RUBER DARIO ALFARO LEON	RESIDENTE DE OBRA	OPERATIVO	NO	8/02/2024	20/07/2024
1193311219	LEONARDO HERNANDEZ TAPIA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	13/02/2024	N/A

1065657761	OSCAR EDUARDO BUSTILLO ECHAVEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	13/03/2024
1085096262	WILLINGTON ORTIZ LOPEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	21/02/2024
1048938311	OMAR JOSE CASTILLA FIGUEROA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	1/03/2024
1065642601	JHON JAIDER GAMEZ ZULETA	INSPECTOR SST	OPERATIVO	NO	26/02/2024
1046427230	SERGIO LUIS CARRASCAL CRISTO	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	1/03/2024
72200899	WILFRIDO MANUEL OLMOS RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	18/03/2024
1052053921	RAFAEL MANUEL FLOREZ CAMARGO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/04/2024
12646881	JAIME LUIS BUELVAS IGUARAN	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/04/2024
77172461	WILLIAM SEGUNDO MARTINEZ	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/04/2024
8865653	JORGE NAVARRO GULLOSO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	8/04/2024
1065637615	LUIS FERNANDO OSPINO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	8/04/2024
1129578097	LUIS FERNANDO MERCADO SIERRA	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO		No se presento
77166261	MANUEL ANTONIO MERIÑO MOLINA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	9/04/2024
1081916502	JANER ENRIQUE OCHOA CANTILLO	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	25/04/2024
77090349	LUIS CARLOS GAMEZ CHAVEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	25/04/2024
1.065.607.965	JADER ALFONSO TORRE MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	15/05/2024
1.003.086.688	YOEL ALFONSO LOPEZ VANEGAS	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	15/05/2024
1143129980	HANS KEIVER SANMIGUEL BARROZO.	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	1/06/2024
1065620396	CESAR ALFONSO SERRANO BOLANO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	1/06/2024
1065573529	DANIEL FELIPE TELLEZ CHARRIS	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	2/07/2024
1007365296	ELKIIN JOSE BARRIOS BLANCO	OFICIAL DE OBRA	OPERATIVO	SI	19/07/2024
1131072953	OLGA MENDOZA MENDOZA	INSPECTORA SST	OPERATIVO	SI	29/08/2024
7121392	EDWARD JOSE GARCIA LOPEZ	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	29/08/2024
5104246	ROBERT AGUILERA ACOSTA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO	SI	30/08/2024
1067590433	MANUEL ANTONIO VEGA SEGOVIA	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO		No se presento
1065830351	FABRICIO BALLESTERO RIVERO	AYUDANTE DE OBRAS	OPERATIVO		No se presento

Tabla No. 6

Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos)

4. INDICADORES

Para este contrato se contemplan indicadores de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución del proyecto a continuación, se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024.

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo

Para las labores ejecutadas en este proyecto, los resultados obtenidos durante el periodo objeto de este informe se determinó que se trabajaron horarios extendidos teniendo en cuenta la actividad a realizar y que requería de su terminación. Así mismo se evidencia el reporte del ausentismo que tuvo incidencia en el proyecto durante el mes de mayo como se relaciona en la siguiente tabla.

Versión:1 Fecha: 31/05/2023 Clasificación: Interna	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR						
PERSONAL ACTIVO EN OBRA CONSORCIO JUDICIALES.							
2024	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	Ausentismo laboral		Ausencia Justificada	OBSERVACIÓN
				Por Accidente Laboral	Por Enfermedad comun		
Enero	25	35	7000	0	19	0	Para este periodo se presento incapacidad Por enfermedad comun emitida por la EPS a los trabajadores: Richard Palacio ayala 3 dias, William Ignacio Coronado Silva 1 dia, Yeomas Mendoza Mendoza 1 dia, Segundo Antonio Martinez Caldera 2 dias, Jhon Jairo Pumajeo Cuela 1 dia, Damian Mejia Mejia 18 dias, Nilson Gonzalo Quiñonez Quiñonez 1 dia.
Febrero	25	41	8200	0	10	0	Para este periodo se presento incapacidad Jhon Jairo Pumajeo Cuela 2 dias Yeomas Mendoza Mendoza 8 dias
Marzo	24	46	8832	0	8	0	Para este periodo se presento incapacidad Walter Enrique Gara a Guerra 8 dias
Abril	26	48	9948	6	1	0	Para este periodo se presento incapacidad laboral por accidente Jhon Jairo Pumajeo Cuela 1 dia. Wilmer cáre 5 dias. Enfermedad comun Wilmer coronado 1 dia
Mayo	28	47	10528	60	2	0	Para este periodo se presento incapacidad Por enfermedad comun emitida por la EPS a los trabajadores : Jhon Jairo Pumajeo Cuela 2 dias, Richard Palacio Ayala 1 dia. Accidente laboral : Rafael Herrera Herrera 30 dias, Wilmer Coronado 30 dias.
Junio	25	45	9000	67	9	0	Para este periodo se presento incapacidad por enfermedad comun emitida por la EPS a los trabajadores :Wilfrido Olmos 14 dias, Juan Gamarra 3 dias, Cesar Serrano 4 dias, Richar palacio 1 dia. Accidente laboral : Rafael Herrera Herrera 30 dias, Wilmer Coronado 30 dias.,Wilfrido Olmos 7 dias.
Julio	27	61	13176	75	18	0	Para este periodo se presento incapacidad por enfermedad comun emitida por la EPS a los trabajadores : Cesar martinez 7 dias, luis morales 2 dias, jhon ramos 5 dias, daniel leiva 3 dias, daniel perales 3 dias, cesar serrano 3 dias. Accidente laboral (preexpo) :Wilmer coronado 30 dias, rafael herrera 30 dia, wilfrido olmos 15 dias.
Agosto	28	69	15456	30	2	0	Para este periodo se presento incapacidad por enfermedad común emitida por la EPS a los trabajadores: Luis Fernando
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTAL	208	N.A	82140	238	69	0	

Tabla No. 7

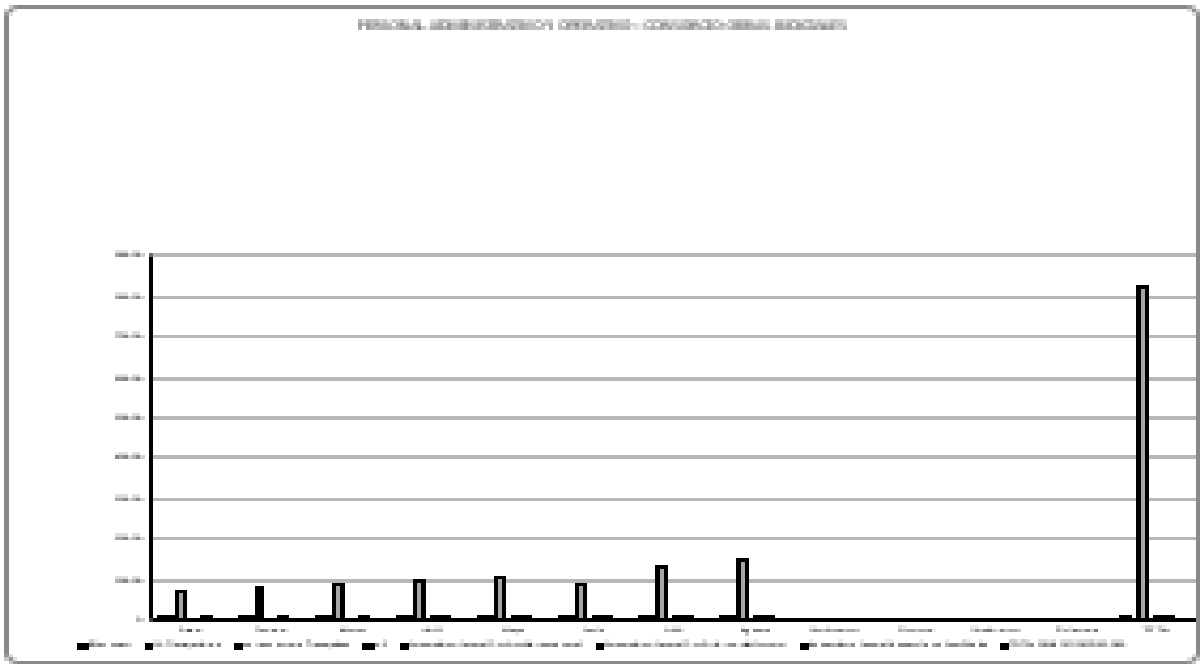


Gráfico No. 1

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR											
Fecha: 31/05/2023												
Clsificación: Interno												
INDICADOR	MES - AÑO 2024											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD	0	0	0	0.4	0,4	2.2	1.6	0				
SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD	0	0	0	0.1	83	148.8	122.9	7				
PROPORCIÒN DE ACCIDENTES MORTALES	0	0	0	0	0	0	0	0				
PREVALENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0				
INCIDENCIA DE ENFERMEDAD LABORAL	0	0	0	0	0	0	0	0				
AUSENTISMO POR CAUSA MEDICA	0,5	0.2	0.3	2.0	2.1	2.5	3.1	1.0				

Tabla No. 8

Nota: Para el mes de agosto el ausentismo por causa medica corresponde a accidente laboral y enfermedad común.

4.2 Ausentismo en el proyecto.

En el periodo de presentación de este informe se presentan ausentismo en el proyecto, los cuales son relacionados a continuación.

INCAPACIDADES AGOSTO 2024								
NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	CONTRATISTA	CARGO	FECHA INICIO DE INCAPACIDAD	FECHA FIN DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD LABORAL
LUIS FERNANDO OSPINO METTINEZ	106563761	INVERSIONES ALQUIR	AYUDANTE	26/08/2024	27/08/2024		2	
RAFAEL MORENO MORENO	80375693	CONSORCIO OBRAS JUDICIAL	MAESTRO	7/08/2024 Prorrogra	5/09/2024	30		
TOTAL						30	2	0
OBSERVACIONES:								

Tabla No. 9

4.3 Accidentalidad del Proyecto

Para el periodo de este informe comprendido desde el día 01 al 31 de agosto del 2024 se presentó un accidente laboral en el proyecto.

El día 06 de agosto siendo las 8:40 de la mañana ocurrió un incidente con el trabajador Carlos Olivera donde se encontraba realizando el armado de las corbatas para instalar a los muros en ese preciso momento le gancho de la torre grúa levante una correa de la estructura de armado de placa la cual se sale un paral golpeando al trabajador

en la cabeza la cual tenía su casco de protección; y así tuvo una herida superficial en la cabeza que no se requirió atención médica.

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
ago-24	0	7	0
CONSOLIDADO 2024			

Tabla No. 10

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
ene-24	0	0	0
feb-24	0	0	0
mar-24	0	0	0
abr-24	4.2	12.5	0
may-24	4.3	127.6	0
jun-24	2.2	148.8	0.3
jul-24	1.6	122.9	0.2
ago-24	0	7	0
sep-24			
oct-24			
nov-24			
dic-24			
CONSOLIDADO 2024	12.3	7	0

Tabla No. 11

4.4 Funcionamiento del COPASST

Para este periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024 se evalúa el funcionamiento del Comité Paritario de seguridad y Salud en el Trabajo.

Versión:1 Fecha: 31/05/2023 Clasificación: Interno	INDICADORES DE GESTION ESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR			CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8
REUNIONES COPASST				
MES	No. Programadas	No. Ejecutadas	Cumplimiento %	Observaciones
ene-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
feb-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
mar-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
abr-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
may-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
jun-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
jul-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
ago-24	1	1	100%	Se evidencia acta de asistencia
sep-24				
oct-24				
nov-24				
dic-24				
TOTAL	8	8	100%	

Tabla No.12

4.5 Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)

Para este periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024 se realizó entrega y reposición de los elementos de protección personal.

Versión:1 Fecha: 31/02/2023 Clasificación: Interno	INDICADORES DE GESTION RESULTADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR			
ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.				
MES	N° DE EPP ENTREGADOS.	N° DE EPP REQUERIDO	Meta de Cumplimiento % 90	INTERPRETACIÓN
ene-24	25	25	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
feb-24	25	25	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
mar-24	29	29	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
abr-24	35	35	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
may-24	37	37	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
jun-24	37	37	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
jul-24	42	42	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
ago-24	51	51	90%	90% de los EPP requeridos fueron entregados a los trabajadores
sep-24				
oct-24				
nov-24				
dic-24				
TOTAL	281	281		

Tabla No.13

4.6 Uso y reposición de Elementos de Protección Personal (EPP)

Para este periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024 se realizó entrega (EPP)

Versión:1 Fecha: 31/02/2023 Clarificación: Interna	INDICADORES DE GESTION RESULTADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR			
USO Y REPOSICIÓN DE EPP				
MES	TRABAJADORES QUE USAN EPP	N° DE EPP ENTREGADO	Meta de Cumplimiento % 90	INTERPRETACIÒN
ene-24	25	25	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
feb-24	27	27	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
mar-24	29	29	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
abr-24	35	35	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
may-24	37	37	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
jun-24	37	37	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
jul-24	42	42	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
ago-24	51	51	90%	El 90 % de los trabajadores usas el EPP
sep-24				
oct-24				
nov-24				
dic-24				
TOTAL	283	283		

Tabla No.14

4.7 Inspecciones de Equipos y Herramientas a Utilizar

Para este periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024 se realizó inspecciones a los equipos y herramientas antes de su uso.

Versión:1 Fecha: 31/02/2023 Clasificación: Interno	INDICADORES DE GESTION RESULTADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS			
INSPECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA				
MES	N° DE INSPECCIONES	N° DE INSPECCIONES PLANEADAS	Meta de Cumplimiento % 90	INTERPRETACIÒN
ene-24	28	30	93%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
feb-24	27	29	93%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
mar-24	28	30	93%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
abr-24	29	30	97%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
may-24	28	30	93%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
jun-24	70	70	100%	Para esté mes se supera la meta de cumplimiento ya que las inspecciones planeadas todas se llevaron a su cabalidad
jul-24	60	60	100%	Para esté mes se supera la meta de cumplimiento ya que las inspecciones planeadas todas se llevaron a su cabalidad
ago-24	85	85	100%	Para esté mes se supera la meta de cumplimiento ya que las inspecciones planeadas todas se llevaron a su cabalidad
sep-24				
oct-24				
nov-24				
dic-24				
TOTAL	355	364		

Tabla No.15

4.8 Inspecciones de trabajo en alturas.

Para este periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024 se realizó inspecciones de equipos contra caídas.

Versión:1	INDICADORES DE GESTION RESULTADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - TALLERMPAR	
Fecha: 31/02/2023		
Clarificación: Interna		

INSPECCIONES DE TRABAJO EN ALTURAS				
MES	N° DE INSPECCIONES REALIZADAS	N° DE INSPECCIONES PLANEADAS	Meta de Cumplimiento X SS	INTERPRETACIÒN
ene-24	28	31	90%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
feb-24	27	29	90%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
mar-24	25	27	90%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
abr-24	28	30	90%	El 90% de las inspecciones planeadas se realizaron
may-24	38	38	100%	Para esté mes se supera la meta de cumplimiento ya que las inspecciones planeadas todas se llevaron a su cabalidad
jun-24	45	45	100%	Para esté mes se supera la meta de cumplimiento ya que las inspecciones planeadas todas se llevaron a su cabalidad
jul-24	47	47	100%	Para esté mes se supera la meta de cumplimiento ya que las inspecciones planeadas todas se llevaron a su cabalidad
ago-24	47	47	100%	Para esté mes se supera la meta de cumplimiento ya que las inspecciones planeadas todas se llevaron a su cabalidad
sep-24				
oct-24				
nov-24				
dic-24				
TOTAL	285	294		

Tabla No.16

4.9 Cobertura de inducción SST.

Para este periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2024 se realizó inducción en seguridad y salud en el trabajo. Políticas de alcohol y drogas, reglamento interno, reglamento de higiene, plan de emergencia, notificación de riesgo, evaluación de inducción.

Versión:1 Fecha: 31/02/2023 Clasificación: Interno	INDICADORES DE GESTION RESULTADO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES NIT. 901.665.448-8

COBERTURA DE INDUCCIÓN				
MES	N° DE PERSONA QUE INGRESAN	N° TOTAL DE INGRESO	Meta de Cumplimiento x 100	INTERPRETACIÓN
ene-24	1	1	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
feb-24	31	31	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
mar-24	8	8	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
abr-24	24	24	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
may-24	6	6	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
jun-24	11	11	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
jul-24	18	18	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
ago-24	20	20	100%	Se garantiza el 100% de la divulgación de la política
sep-24				
oct-24				
nov-24				
dic-24				
TOTAL	119	119		

Tabla No.17

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

Durante el mes de agosto del 2024 se presentó nuevo ingreso de personal a obra, los cuales se valida todo lo reglamentario con Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF) y posteriormente se procede a realizar la inducción SST, evaluación, Notificación de Riesgos.

Anexo 3 Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos.

	
Fotografía 1: Inducción personal Subcontratista 29/08/2024 – 31/12/2024	**Fotografía 2: Notificación de Riesgo personal visitante. 28/08/2024**

Tabla No. 18

Anexo 4 Notificación de riesgo visitante

6. ACTIVIDADES EN OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del presente año se realizaron las siguientes actividades:

- **Topografía**

Replanteo de eje y localización de elementos estructurales, nivelación de losa entre piso

- **Obra civil**

Descargue de acero

Descargue de bloque

Instalación de casetón y desencofrado

Instalación de la torre grúa

Operación de torre grúa, Izaje y movimiento de carga

Operación de pluma grúa, Izaje y movimiento de carga

Armado de escalera y fundida

Traslado y Corte de acero

Armado y fundida de rampa

Armado de acero muros estructuras, contención fundida de la misma.

Armado de camilla placa contra piso y fundida de la misma.

Armado de acero columnas, muros estructurales

Colocación y aplomado de formaletas para, vigas, columnas, muros.

Fundida de muros de contención y estructural, columnas.

Desencofra muros estructurales, columnas

Descimbre de placa.

Cimbrado.

Excavación tanque de agua potable

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo.

En el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones.

Anexo 5 Inspecciones de emergencia

Anexo 6 Preoperacionales

Anexo 7 ATS, permisos para trabajo en Alturas, permiso para trabajo en caliente, permiso para excavación

GESTIÓN DOCUMENTAL SST	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD
Inspección de pulidora, taladro, trazadora, Sierra circular, mezclador para concreto, vibro para concreto, martillo demoledor, herramientas manuales, Bomba estacionaria, Bomba de agua, Inspección de botiquín, extintores, camilla de emergencia, kit de derrame sustancias químicas, pluma grúa, extensiones eléctricas, escaleras portátiles, andamios multifuncionales, cortadora de ladrillo.	Agosto	90
Inspección de EPCC	Agosto	47
Análisis de Trabajo Seguro obra civil	Agosto	70
Permiso para trabajo en Alturas.	Agosto	118
Permiso para trabajo en caliente.	Agosto	71
Plan de Izaje torre grúa	Agosto	3
Permiso de Excavación	Agosto	0

Tabla No. 19

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo

Charla SST – Capacitación.

Fecha	Tipo de actividad	Tema	Duración
01/08/2024	Charla SST	Señales de seguridad: Tipo de señales, obligatorias, prohibición, advertencia	5 minutos
03/08/2024	Socialización	Beneficios de realizar pausas activas y calistenia	5 minutos
04/08/2024	Socialización	Socialización de actividades ATS	5 minutos
05/08/2024	Charla Social	Comunicación asertiva	5 minutos
06/08/2024	Charla SST	Lecciones con objetos cortopunzante	5 minutos
08/08/2024	Socialización	Incidente Carlos Andrés Olivera Franco	5 minutos

10/08/2024	Charla SST	Estilo de vida saludable sueño y descanso	5 minutos
13/08/2024	Socialización	Lección aprendida: Izaje de carga, impacto varilla contra ventanal edificio antiguo palacio de justicia	5 minutos
15/08/2024	Charla Social	Trabajo en equipo	5 minutos
16/08/2024	Capacitación	Prevención de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas	1 hora
17/08/2024	Charla SST	Clasificación de los riesgos	5 minutos
19/08/2024	Charla SST	Riesgo mecánico: Definición, tipo y como prevenirlos	5 minutos
21/08/2024	Charla SST	Uso correcto de los EPCC	5 minutos
22/08/2024	Charla SST	Riesgo físico: Vibración	5 minutos
24/08/2024	Charla SST	Orden y aseo	5 minutos
27/08/2024	Charla SST	Importancia de protegernos la cabeza	5 minutos
29/08/2024	Charla SST	Respectar las señalizaciones de seguridad	5 minutos
30/08/2024	Capacitación	Como prevenir accidente durante el Izaje con torre grúa	1 hora
31/08/2024	Charla SST	Riesgo mecánico: Definición, tipo y como prevenirlos	10 minutos


Tabla No. 20

Nota: Los siguientes días son temas ambientales: 2,7,9,12,14,20,23,26,28

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La prevención de accidentes como factor primordial en el proyecto se ha efectuado gracias a la colaboración obtenida por parte del personal y el área SST. Quienes mutuamente por medio de actividades de inspección, control, aprendizaje y mejora continua. Ayudan a prevenir la ocurrencia de factores que sean potenciales en la influencia para la generación de actos y condiciones inseguras.

En la siguiente tabla se exponen a manera de resumen algunas de las actividades potencialmente relevantes encaminadas a contribuir con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes de agosto de 2024.

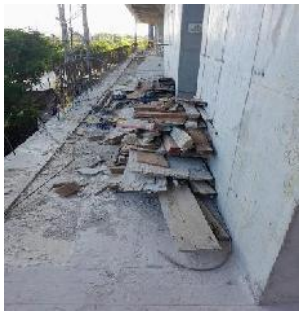DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Charlas de seguridad: las charlas de seguridad se realizan todos los días antes de iniciar la jornada laboral con el objetivo de informar y concienciar a los trabajadores sobre su propia seguridad y salud en el trabajo.	   
Orden y aseo parte interna y externa del proyecto: El orden y el aseo en obra son factores importantes para la prevención de incidentes y accidentes, ayudan a mejorar las condiciones de seguridad en general.	 

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Pausas activas: Promover la actividad física, como hábitos de vida saludable. Contribuir con la liberación, descanso y esparcimiento del sistema locomotor de cada individuo.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Inspección preoperacional de herramientas, equipos y maquinaria a utilizar: Se realiza con el fin de revisar y examinar el estado de cada uno de estos y determinar si están aptos para ser utilizados.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		
Entrega de elementos de protección personal (EPP): Se realiza la entrega del elemento de protección personal por desgaste (Guantes, tapaboca, gafas) y se les recuerda la importancia del su uso. (protegerse minimizando los riesgos de accidente).		
		
Señalización áreas intervenidas - senderos peatonal parte interna de obra: Se realiza con el fin mitigar el riesgo o peligro existente.		

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Inspección de EPCC: Se realiza la inspección cada vez que se va a utilizar con el fin de verificar que no tenga ningún desgaste, daños o corrosivos.</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Reunión de COPASST se realizan reuniones mensuales con el comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así dando cumplimiento a la normatividad establecida.</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Mantenimiento de señalizaciones de seguridad adquisición de nuevos equipos.

Se ejecuta una jornada de mantenimiento señalizaciones de seguridad (Rutas de evacuación, botiquines, malla de seguridad, extintores, cinta de seguridad) en distintas áreas de la obra.









Inspecciones a los elementos de emergencia:

Se realiza inspecciones a los elementos de emergencia (Extintores, botiquín, camilla, kit de derrame) con la finalidad de mirar su estado.









Instalación de sendero peatonal provisional: Se instala sendero peatonal provisional con el fin de garantizar el paso del peatonal durante el traslado de material de relleno con el minicargador.









Limpieza de los puntos ecológicos canecas: Los puntos ecológicos son indispensables en la tarea de cuidado del medio ambiente al contribuir con la separación de residuos.





Jornada de fumigación contra insectos.

Sábado 10 de agosto de 2024 se ejecuta una jornada de fumigación contra insectos en toda la obra, con el fin de garantizar la salubridad de los trabajadores, visitantes y prestadores de servicios.





Reporte de Tarjetas Seguridad en el trabajo por la observación preventiva y comportamientos inseguros: Son tarjetas que se manejan en diferentes labores, dentro de un proceso de mejoramiento de seguridad, el cual consiste en reportar actos inseguros, condiciones peligrosas, *y* buenas labores con el fin de implementar las acciones necesarias y así evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales.





Cálculo de hidratación:
La hidratación es el proceso de proporcionar al cuerpo la cantidad adecuada de agua para mantener su correcto funcionamiento.
Se cuenta con varios puntos de hidratación, se consumen un aprox. De 10 metros Cm3 de agua mensual.





Lección Aprendida: El 06 de agosto del 2024 se presentó un incidente el trabajador Carlos Olivero del subcontratista Alquir.





Tabla No. 21

Observación para la Prevención de Incidente y Accidente Se evidencian actos y condiciones inseguras.	
Condición insegura: El 26 de agosto se evidencia que los bordes de la escalera del piso 5 están descubierto sin ninguna protección para evitar caída de nivel 	Se corrige la condición instalando malla electrosoldada, malla anaranjada, señalización de advertencia. 
Condición insegura: El 22 de agosto del 2024 se evidencia que la excavación del tanque de agua no cuenta con protección en los bordes. 	Se corrige la condición instalando cinta de seguridad delimitando el área, señalización de advertencia riesgo de caída, excavación profunda. 

Condición de seguridad: El 19 de agosto del 2024 en la borde área de ascensores se encuentran sin protección contra caída.	Se corrije la condición instalando malla elecrosoldada, malla anaranjada con el proposito de proteger los borde y evitar caídas al vacío.
	
Actos inseguros: El 20 de agosto del 2024 se evidencia que el trabajador del subcontratista obras civiles y estructura manipula cemento y no usa tapaboca.	Se corrige el acto inseguro retroalimentando al trabajador sobre la importancia del uso utilizar adecuadamente los EPP.
	

Tabla No. 22

8. ANEXOS

- Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos.
- Anexo 2 Certificado de competencia.
- Anexo 3 Inducción, evaluación de inducción, notificación de riesgo.
- Anexo 4 Notificación de Riesgos visitantes.
- Anexo 5 Inspecciones de emergencias.
- Anexo 6 Preoperacionales.
- Anexo 7 ATS –Permisos.
- Anexo 8 Asistencia Charla SST.
- Anexo 9 Acta reunión COPASST
- Anexo 10 Planilla de seguridad Social
- Anexo 11 Entrega de EPP.
- Anexo 12 Inspección de pre-uso equipos de alturas
- Anexo 13 Observación para la Prevención de Incidente y Accidente
- Anexo 14 Indicadores HHT
- Anexo 15 Base de dato del personal
- Anexo 16 Investigació de accidente laboral
- Anexo 17 Certificado de Fumigación
- Anexo 18 Ficha tecnica cortadora de ladrillo
- Anexo 19 Certificado de fumigación

Milson Castilla S
Nombre y Apellido: Milson Nain Castilla Salas
Residente SST
C.C 7.573.773
Licencia 010255 del 29 de noviembre de 2021

INFORME AMBIENTAL

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2

1.1 LOCALIZACIÓN 2

1.2 Características Técnicas del proyecto……..…5

2. OBJETIVO GENERAL…… 5

3. METODOLOGIA 6

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO 6

5 OBLIGACIONES DE PERMISOS 7

5.1. GENERALIDADES 7

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMA DEL PGAS 7

6.1. Programa y Proyecto de PGAS 7

61.1. Gestión Ambiental del proyecto 7

1.1. Grupo de Gestión Ambiental y social……...8

1.2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales……...8

1.3 Capacitación Ambiental y Social……..……..**8**

2 Componente Abiótico……...8

2.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos……..…8

2.2 Manejo del Recurso Hídrico……8

2.3. Control de las Excavaciones y Demoliciones……8

2.4. Residuos Sólidos Generados……..8

2.5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas…..……8

2.6. Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento……..**8**

2.7. Manejo de la Maquinaria y Equipos……..……**8**

2.8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones……**8**

3. Componente Biótico……..…**8**

3.1. 1. Manejo de la Fauna Silvestre……..……**8**

63.2. Manejo de la Vegetación en Obra……..……..……**8**

3.3. Protección vegetal del suelo**……..……8**

4 Gestión Social……..……..……..……8

4.1 Atención a la Comunidad y Autoridades…….……**.8**

4.2. Información y Participación de la Comunidad……...……..**8**

4.3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos……..…..……**8**

4.4. Gestión de la Mano de Obra……...…**8**

7. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL…. Error! Bookmark not defined.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS..... 9

9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ..... Error! Bookmark not defined.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... Error! Bookmark not defined.

1. INTRODUCCIÓN

Para el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas, el Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, en el continuo ejercicio de sus funciones, robusteciendo las edificaciones propias, con calidad en la construcción, garantizando la vida útil de los inmuebles y asegurando los niveles de bienestar, calidad de vida, eficiencia, productividad y ante todo la seguridad física de sus ocupantes.

De esta manera, cumpliendo con la anterior directriz, para la ciudad de Valledupar (Cesar) se creará una nueva torre para el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que se tiene un área libre para la implantación de un nuevo edificio que proporcione todas las garantías de seguridad, permanencia y bienestar tanto para funcionarios, empleados y usuarios.

Este nuevo bloque albergará las diferentes corporaciones, tales como: El Tribunal Superior de Valledupar, El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, El Consejo de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, los cuales se encuentran dispersos en diferentes inmuebles de la ciudad, lo cual permitirá reunir estas Corporaciones ofreciéndoles a los usuarios un correcto acceso a la justicia y una óptima prestación del servicio, digno para funcionarios, empleados y habitantes de la ciudad de Valledupar.

1.1. LOCALIZACIÓN

La construcción se desarrollará dentro de un predio de propiedad de la Rama Judicial de un área de 4.525,00 m², predio donde actualmente funciona el Palacio de Justicia de la ciudad de Valledupar y que está destinado como área de parqueadero descubierto.

El Palacio de Justicia existente consta de un bloque de 8 pisos y cuenta con las siguientes áreas generales:

- Área bruta total predio: 4.525.00 m²
- Área total edificio ocho pisos: 7.758.21 M²
- Área total neta del uso edificio ocho pisos: 5.386.83 M²
- Ocupación edificio ocho pisos: 1.063,61 m²

El predio se encuentra ubicado geográficamente, dentro de la COMUNA 1, barrio catastral 01-01-0468- denominado “ALFONSO LOPEZ”, cuya ubicación geográfica responde a las siguientes coordenadas:

- 10°28'27.4"N ,73°15'07.6"W.

Los datos del inmueble son los siguientes:

- Nomenclatura: Calle 14 No. 12-189
- Matrícula Inmobiliaria No: 190-33450 predio total
- Código Único Catastral: 01-01-0468-0002-000

- Escritura Pública: No. 2105 del 10 de agosto de 1984



Figura No. 1 Localización del proyecto.

Fuente: *Estudios previos del proyecto*

Linderos:

- Norte: 67.50 m
- Este: 84.65m
- Sur: 77 m
- Oeste: 49.45 m



Edificio actual del Palacio de Justicia



Zona en donde se ejecutará el proyecto, parqueadero actual del Palacio de Justicia.

Las principales vías de acceso a los frentes de obra son; Carrera 14 y la calle 14.

Tabla 1. Información del proyecto.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Razón social:	Consorcio Obras Judiciales.
Nit:	901665448-8
Objeto del proyecto	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).
Ciudad: Dirección:	Bogotá Carrera 61 # 100-68
Celular:	3004708 / Cel: 3014683375
Representante legal	Víctor Anderson Valbuena Quiroga
Duración del Proyecto:	35 meses

1.2. Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla un recorrido vertical en 11 niveles y 2 sótanos. Un acceso de funcionarios y zona de archivo se ubican en el primer piso, en los tres siguientes niveles se localizan servicios netamente públicos con acceso diferenciado. El acceso de usuarios se encuentra en el piso 1 el cual distribuye a los pisos superiores rematando en el piso 10. Es importante resaltar que por funcionamiento de la entidad y su nivel de seguridad se plantean dos puntos fijos diferenciados para la atención del público y otro para el transporte de los funcionarios con circulaciones que no contemplan contacto son los usuarios.



Plano TOP Valledupar

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la ejecución del proyecto "Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar", en el departamento del Cesar, con el fin de ofrecerle a los usuarios y a los equipos de trabajo un espacio con mejor infraestructura el área de estudio y la zona de influencia, reconocer los posibles impactos ambientales, las medidas y acciones de manejo ambiental que se deben implementar durante la intervención en los frentes de obra.

Objetivos específicos

Recolectar información para establecer la demanda de recursos naturales, al igual que los permisos por su uso y aprovechamiento, que se requieran tramitar ante las autoridades ambientales y que son parte integral de PGAS, es decir, los requerimientos y obligaciones que de ellos se emanen.

Respetar el entorno donde se desarrollarán las obras; la eliminación, el control, la prevención y la compensación ante posibles impactos ambientales y sociales negativos, a través de la implementación del PGAS y cada uno de sus programas y proyectos, que se determinen de acuerdo con el proyecto a ejecutar y el estudio previo según el alcance de la obra proyectada.

Conocer y establecer comunicación con las autoridades ambientales y en general, instituciones, operadores de servicios públicos, comunidad y todas las entidades que puedan estar involucradas en el proceso constructivo, el establecimiento de buenas relaciones, así como también la atención y solución de quejas, peticiones o reclamos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto.

- Determinar los indicadores de gestión, según los programas y proyectos identificados, que pueden desarrollarse en cada Contrato para conformar el seguimiento y el nivel de cumplimiento ambiental.

El principal responsable del diseño e implementación y seguimiento del PGAS es el director de proyecto, quien provee los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo del PGAS de acuerdo con el análisis de las diferentes actividades de obra y no solo interviene el Residente ambiental.

En pago del PGAS está inmerso en el presupuesto de obra y el pago no se realiza por separado de las actividades ambientales y sociales.

3. METODOLOGIA

La metodología para implementar para la realización del Plan de Gestión Ambiental y Social es en primera instancia la Guía PGAS DEAJ, la recolección y análisis de información, los estudios previos, pliego de condiciones, información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, CORPOCESAR, entre otras.

De acuerdo con la información recolectada se elaborará un diagnóstico de la situación actual para el área de influencia directa e indirecta.

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Localización, trazado y replanteo para ubicación y marcado en el terreno de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.
Trazado y replanteo en el terreno para mampostería piso 3 y 4
Armado de acero y fundida de antepecho
Fundida escalera en concreto tipo_1 3000 psi construido de acuerdo con las especificaciones técnicas indicados en los planos estructurales
Columnas rectangulares en concreto a la vista tipo_ 1 de 5000 psi
Muros en concreto a la vista tipo 1_ 5000 psi
Losa aligerada sin torta inferior a la vista tipo_1 4000psi torta E=12cm incluye vigas descolgadas h=0.75m y h=0.5m
Anclaje tipo_1 1/2" por proceso constructivo incluye refuerzos y epoxico según diseño estructural.
Suministro y manejo de acero 60.000 psi/420 mpa incluye alambre negro de amarre
Suministro e instalación de mallas electrosoldadas estándar incluye alambre negro de amarre
Operación de torre grúa y movimiento de carga
Operación de pluma grúa y movimiento de carga
Orden y aseo general.

5. OBLIGACIONES DE PERMISOS DE TALA

5.1. GENEREALIDADES

De acuerdo con las obligaciones dadas por CORPOCESAR se están atendiendo las obligaciones impuestas en la Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023 y Resolución No. 003 del 12 de febrero del 2024.

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL PGAS

A continuación, se describirán todas las actividades, con las respectivas metas de los programas establecidos para la ejecución del proyecto y describir las medidas desarrolladas durante el periodo de este informe.

1. Programa y proyecto del PGAS

De acuerdo con lo establecido en el plan de manejo ambiental, el proyecto se desarrollará desde el proceso ambiental de acuerdo con los programas establecidos durante la ejecución del proyecto:

ítem	Programas	Proyectos	Código
1	Gestión Ambiental del Proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social	1.1-GAP
		2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales	1.2-GAP
		3. Capacitación Ambiental y Social	1.3-GAP
2	Componente Abiótico	1.Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos	2.1-MCA
		2. Manejo del Recurso Hídrico	2.2-MCA
		3. Control de las Excavaciones y Demoliciones	2.3-MCA
		4. Residuos Sólidos Generados	2.4-MCA
		5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas	2.5-MCA
		6.Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento	2.6-MCA
		7. Manejo de la Maquinaria y Equipos	2.7-MCA
		8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones	2.8 MCA
3	Componente Biótico	1. Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB
		2. Manejo de la Vegetación en Obra	3.2-MCB
		2. Protección vegetal del suelo	No aplica
4	Gestión Social	1. Atención a la Comunidad y Autoridades	4.1-GSP
		2. Información y Participación de la Comunidad	4.2-GSP
		3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos	4.3-GSP
		4. Gestión de la Mano de Obra	4.4-GSP
		5. Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural	No aplica

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social	1.1-GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Cumplir, monitorear y vigilar los planes PGAS, SG-SST, socio ambiental, en la fase de construcción.	Garantizar la estructura de profesionales idóneos, con la preparación y experiencia para cumplir con la gestión legal
El grupo de gestión ambiental y social debe elaborar todos los estudios previos para la elaboración del PGAS e implementarlo y cumplir con la gestión tanto preventiva, como la de control, mitigación y compensación en los casos que se requiera.	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras.

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA

Control	**x**	**Prevención**	**x**	**Mitigación**	**x**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director de obra las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

En el mes de agosto de 2024 continua el grupo ambiental y como evidencia se presenta en el anexo 2.
Dando cumplimiento a la ficha ambiental a continuación se relaciona el personal miembro del grupo ambiental

Cargo	Nombre y Apellido	Dedicación	# de contacto
Director de obra	Iván Carpentier Ospino	100%	3005142520
Ing. Residente de Obra	Emel Larios	100%	3014683375
Residente Ambiental	Mabely Toncel	50%	3014683375
Administrativa	Wendy Quiroz	100%	3118884207
Residente SST	Milson Nain Castilla	100%	3184812765

- **Reuniones y comités de seguimiento**


En este periodo se continua con los comités internos del proyecto para seguir implementando y monitoreando las diferentes actividades ambientales.

Durante el mes de agosto se realizaron charlas, socialización de temas ambiental con el fin de recordar al personal en obra, las medidas de manejo y protección del medio ambiente. Las actividades mencionadas se evidencian en el siguiente informe.

De igual forma se evidencia reunión realizada con el equipo ambiental donde se trataron temas como:

- Continuar con la instalación ducto SHUT de basura piso 5 y 6.
- Mejoramiento área almacenamiento residuos peligrosos
- Reposición de los árboles hurtados y georreferencie Institución Educativa Oswaldo Quintana Quintana.
-

El 16 de agosto se realizo la reposición simbra de los arboles hurtados (Compensación forestal) 12 individuos, y adicionalmente se genere la georreferencia de cada una de las especies que representan el cumplimiento de la compensación. Se solicita adelantar las gestiones con la Corporación que se generen los actos administrativos para que la autoridad reciba la compensación y haga la entrega al colegio de manera formal de esa responsabilidad.



Fotografía No. 1 Acta reunión Ambiental



Fotografía No. 2 evidencia asistencia reunión ambiental mes de agosto 2024.

FECHA	TEMA	OBJETIVO
02/08/2024	Permisos, concesiones, autorizaciones y licencias obtenidas para la ejecución del proyecto, obligaciones con las autoridades y sanciones por incumplimiento	**Charla ambiental:** El objetivo de está charla es que conozcan las autorizaciones y licencia que se debe de ternar para realizar el proyecto.
7/08/2024	Protección del recurso hídrico, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto.	**Socialización ambiental:** El objetivo de esta es crear conciencia y promover la participación activa del personal en obra para la a preservación y gestión sostenible del agua.
12/08/2024	Manejo de los materiales de construcción y compras verdes o sostenibles.	**Charla ambiental:** El objetivo de esta es socializar el manejo correcto de los materiales de construcción
14/08/2024	Manejo de los residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto	**Charla ambiental:** El Objetivo es crear conciencia conservación de los recursos hídricos
19/07/2024	Protección de la flora y la fauna	**Socialización ambiental:** El objetivo es tomar conciencia que debemos de proteger la flora y la fauna
20/08/2024	Relaciones con la comunidad.	**Charla ambiental:** Sensibilizar al personal sobre la buena relación que debemos de tener con la comunidad
23/08/2024		**Charla ambiental:** El objetivo conocer los elementos que contine un kit

	Plan de contingencia ambiental. Simulacro, manejo de kit control de derrame	control de derrame y como usarlo cuando se presente un evento derramamiento de sustancias químicas peligrosas
26/08/2024	Manejo de los residuos sólidos contaminantes, RESPEL, RAEE y RCD.	**Charla ambiental:** El objetivo de esta charla es socializar las medidas a tomar para el manejo de los recursos sólidos, convencionales, RESPEL, RAEC, y RCD
28/08/2024	Manejo de los materiales de construcción y compras verdes o sostenibles	**Charla ambiental:** El objetivo de esta es socializar el manejo correcto de los materiales de construcción



Fotografía No. 3 Charla ambiental



Fotografía No.4 Charla ambiental

	
Fotografía No.5 Charla Ambiental	Fotografía No.6 Charla ambiental (Simulacro)

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Número de profesionales que componen el grupo de gestión ambiental	No. de profesionales contratados / No. profesionales propuestos	Mensual	5 / 5	Positivo

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

Anexo 1.

- Soporte Asistencia a charlas, socialización ambiental realizadas al personal durante el mes de agosto 2024.

	
Fotografía No. 7 Asistencia Charla Ambiental	Fotografía No. 8 Asistencia Charla Ambiental
	
Fotografía No.9 Asistencia Charla Ambiental	Fotografía No.10 Asistencia Charla Ambiental




Fotografía No.11 Asistencia Socialización Ambiental



Fotografía No.12 Asistencia Socialización Ambiental




Fotografía No.13 Asistencia Charla Ambiental



Fotografía No.14 Asistencia Charla Ambiental



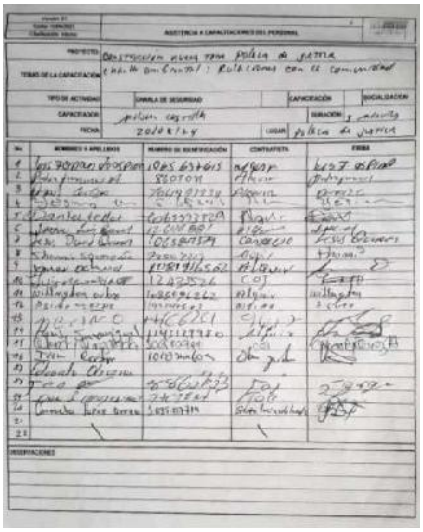


Fotografía No.15 Asistencia Socialización Ambiental	Fotografía No.16 Asistencia Socialización Ambiental
	
Fotografía No.17 Asistencia Charla Ambiental	Fotografía No.18 Asistencia Charla Ambiental

Estas reuniones se desarrollarán mensualmente hasta terminar el contrato.

- **Reuniones y comités de seguimiento**

Se informa en el periodo del 01 al 31 de agosto del 2024 la realización de la reunión del grupo ambiental (anexo acta) del proyecto en donde se reitera al equipo el PGAS, al igual que los comités internos del proyecto para implementar y monitorear las diferentes actividades ambientales.

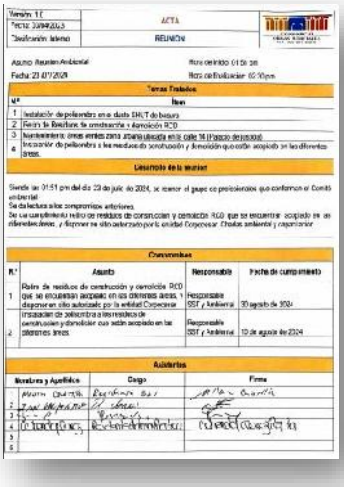	
Fotografía No. 19 Acta reunión Ambiental	Fotografía No. 20 evidencia asistencia reunión ambiental mes de agosto 2024

Por otra parte, se tiene comité con interventoría donde se trataron los siguientes temas ambientales en el periodo comprendido en el informe:

Se instala ducto (shut) losa a losa con el fin de facilitar el retiro de RCD que se encuentra acopiado en diferentes áreas y protegido con polisombra y/o lona verde en, y disponer en sitio autorizado por la entidad de Corpocesar.

Se recibe oficio No. CSJ-397-2024 APREMIO No. 1 ASPECTOS AMBIENTALES del 19 de agosto 2024 para conocimientos y fines pertinentes.

Repuesta al oficio ambiental Oficio de repuesta CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 909

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA/RECIBIDA	DESTINATARIO
19/08/2024	397	APREMIO No. 1 ASPECTOS AMBIENTALES	Recibido	Consorcio Intervalledupar 2022

- **Anexo:**

Oficios enviados sobre temas ambiental:



CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

Bogotá D.C. 16 de agosto de 2024

OFICIO No. CSJ-087-2024

Señores
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
ANT- Ing. Victor Anderson Valbuena
Representante Legal Contratista
valbuenavictor.admin@consultoriainc.com

Señores:
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDIACTURA
A/c. Jorge Hernández
Supervisión del contrato - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura.

Referencia: Contrato de Obra Derivado de proceso: P-15-2022 Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar). CO1.PCONTR.4332011 No. 023 de 29 de diciembre de 2022

Asunto: APREMIO No. 1 ASPECTOS AMBIENTALES

Reciban un cordial saludo.

Por medio del presente nos permitimos notificar apremio No.1 por diferentes aspectos ambientales, teniendo en cuenta que se maneja reiterada mediante comités de obra y recorridas se han solicitado de manera puntual el ajuste de procedimientos y el mantenimiento de temas ambientales, a lo cual el contratista de obra a hecho caso omiso como lo siguientes aspectos:

1. Manejo y disposición de residuos

Desde el mes de Mayo 2024 se realizó una visita al proyecto por la entidad contratante, donde se generaron varias recomendaciones y solicitudes en el aspecto ambiental como:

a. Se solicita que se genere la contratación de un sitio que se adecúe de almacenamiento de sustancias peligrosas. Implementar una fillera adicional en la altura como contención.
b. Se solicita que se coloque el tema del entorno ya que se evidencia gran cantidad de escombros, donde el contratista determine que se requieren varias solicitudes sobre el riesgo de derrame al suelo, ya que no se han realizado las reparaciones a la estructura en el área afectada por el incendio, pues que puede ingresar un vehículo y así acopiar el material que será utilizado para retiro de las zonas mencionadas del proyecto. El contratista manifiesta que entre el 10 y el 14 de Junio 2024 se podría empezar a retirar el material del acopio y se calculan más de 15 días para culminar la actividad, es decir que al final del mes de junio 2024 se recibiría la recolección del material acumulado.

Dirección: Carrera 13 # 70 – 33 Oficina 401 – Teléfonos: 4909403 – 4909424
E-mail: consorciointervalledupar2022@gmail.com
Bogotá D.C.

Fotografía No 21. Oficio recibido por Consorcio Intervalledupar 2022



Valledupar, 19 de agosto de 2024

Señores
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Cesar

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 909

REF: CONTRATO DE OBRA No. 023 de 2022 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO No CSJ-087-2024 APREMIO No. 1 ASPECTO AMBIENTAL.

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos dar respuesta al apremio No 1 Aspectos Ambientales.

1. Manejo y disposición de residuos.

a. El consorcio obras judicial cuenta con el almacenamiento de sustancias peligrosas, el sitio está señalizado, tiene de contención con una altura de 30 cm, tiene ficha de seguridad (FDS), matriz de compatibilidad, kit mixto de derrame, etiquetas sobre recipientes.

Se realizaron mejoras a las recomendaciones dadas por la interventoría en comité del 23/08/2024

Fotografía No 21. Oficio de repuesta CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 909

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLED UPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del proyecto	2. Tramite y cumplimiento de requisitos legales	1.2.-GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Garantizar el cumplimento de las obligaciones del Consorcio de identificar, tramitar y/u obtener todos los permisos de acuerdo con la legislación colombiana y el cumplimiento de las normas locales de la ciudad de Valledupar	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación
Cumplir con los requisitos adquiridos derivados de los permisos que se deban generar para la ejecución del proyecto	Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias que debe tener el proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Del proyecto del Consorcio Obras Judiciales seguimos identificando todos los requisitos legales y permisos a tramitar, cambios y novedades normativas.

Los permisos identificados son los siguientes:

- **Seguimiento de la licencia o permisos**

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO
Tala de arboles	Corpocesar	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses
Radicación del PG-RCD	Corpocesar	Fecha de radicado 02/03/2023	Duración del proyecto

Solicitud vertimientos de Aguas Residuales	Corpocesar	Abril 27 del 2023	Duración del proyecto
Poda de 11 árboles y tala de 1 Árbol.	Corpocesar	Resolución No. 003 del 12 de febrero del 2024	Seis (6) meses

- **Permisos ambientales de proveedores**

Agregados

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m³	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CESIÓN DE DERECHOS	RUCOM
Arena	26 m³	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230
Gravilla	8 m³	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230
Relleno	0 m³	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 1235 del 12 nov 2019	Nº 0167-3-20	RUCOM-201402142848

Para el mes de agosto 2024 No ingresa relleno a obra.

RELACIÓN INGRESO MATERIALES PETREOS A OBRA.				
AÑO	MES	GRAVILLA 3/4	ARENA	RELLENO
2023	ENERO	0	0	0
2023	FEBRERO	0	0	0
2023	MARZO	0	0	0
2023	ABRIL	16	16	0
2023	MAYO	32	32	0
2023	AGOSTO	56	40	0
2023	AGOSTO	48	40	0
2023	AGOSTO	48	40	0
2023	SEPTIEMBRE	24	24	0
2023	OCTUBRE	8	8	0

2023	NOVIEMBRE	0	0	0
2023	DICIEMBRE	0	0	0
2024	ENERO	0	0	0
2024	FEBRERO	0	0	0
2024	MARZO	0	0	0
2024	ABRIL	0	0	180 m³
2024	MAYO	0	0	27 m³
2024	AGOSTO	8	26	0
TOTAL		**249**	**234**	**207 m³**

Concretos

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m3	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO
Concretos plástico asent.6"+/-1" 3000 psi 3/4"	27.5 m3	El dorado	Para este mes de agosto se utilizó concretos premezclados 3000 psi fundida de escalera piso 4 al piso 5, fundida de losa concreta 4000 y 5000 psi losa tramo 1 piso 9. Tramo 1 y 2 – Columna y muros piso 8 concreto 5000 psi rectangulares, muros concretos a la vista, antepecho.	
Concretos plástico asent.6"+/-1" 4000 psi 3/4"	83.5 m3	El dorado		
concretos plástico asent.6"+/-1" 5000 psi 3/4	243.25 m3	El dorado		
concretos plástico asent.6"+/-1" 6000 psi 3/4"	0 m3	El dorado		

Disposición de RCD pétreos y no pétreos

TIPO DE RDC	VOLUMEN PROYECTADO m³	SITIO DE DISPOSICIÓN	PERMISO AMBIENTAL
RCD	814 m3	AGREGADOS DEL CESAR	Auto 432-09-10-2019 RCD
ESCOMBRO	0		
RESPEL	7 kl	A la fecha se tienen acopiados en obra en espera aprobación de la empresa gestora de residuos peligrosos	

Para el mes de agosto 2024 se retiró material RCD excavación del tanque y acumulado en los diferentes pisos del proyecto.



Fotografía No. 22 Retiro RCD de obra



Fotografía No. 23 Retiro RCD de obra



Fotografía No. 24 Retiro RCD de obra



Fotografía No. 25 Retiro RCD de obra

AÑO	MES	CANTIDAD
2023	ENERO	0
2023	FEBRERO	0
2023	MARZO	0
2023	ABRIL	0
2023	MAYO	0
2023	AGOSTO	3005,76 m³
2023	AGOSTO	2755,3 m³
2023	AGOSTO	108,28 m³
2023	SEPTIEMBRE	1312 m³

2023	OCTUBRE	312 m³
2023	NOVIEMBRE	1.327 m³
2023	DICIEMBRE	440 m³
2024	ENERO	400 m³
2024	FEBRERO	0
2024	MARZO	0
2024	ABRIL	7 m3
2024	MAYO	0
2024	JUNIO	0
2024	JULIO	0
2024	AGOSTO	814 m3
TOTAL		**9675,48** m³

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Obligaciones y requerimientos de las autoridades ambientales	No. de requerimientos de autoridades	Anual	1	100 % (Se realiza Compra y Siembra de árboles en cumplimiento a requerimientos ambientales.)
Permisos, autorizaciones o concesiones	No. Permisos otorgados por la autoridad / No. Permisos identificados en el proyecto	Mensual	2/2	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Licencias ambientales de las canteras y demás proveedores - resolución de tala.

Se realiza la siembra de 12 individuos de especies nativas del bosque seco tropical y aptas para zonas urbanas que fueron hurtados, a su vez se realizó mantenimiento de los individuos existente. Esta siembra se realiza en sitio autorizado por la entidad de Corpocesar.

 Fotografía No. 26 Siembra de individuos	 Fotografía No. 27 Siembra de individuos
 Fotografía No. 28 Siembra de individuos	 Fotografía No. 29 Siembra de individuos
 Fotografía No. 30 Mantenimiento de los individuos existente	 Fotografía No. 31 Mantenimiento de los individuos existente

	
Fotografía No. 32 Mantenimiento de los individuos existente	Fotografía No. 32 Mantenimiento de los individuos existente

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del Proyecto	Capacitación Ambiental y Social	1.3 - GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto, en lo relacionado con los temas de carácter ambiental, social y técnico de la obra	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras.
Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación	

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de las actividades cotidianas	Quejas y reclamos de la comunidad
Vandalismo	

TIPO DE MEDIDA							
Control	**x**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales estable en el anexo 2, el cronograma de charlas, Socialización y capacitación ambiental y social.

Tema de charlas, socialización y capacitación	Fecha
Permisos, concesiones, autorizaciones y licencias obtenidas para la ejecución del proyecto, obligaciones con las autoridades y sanciones por incumplimiento	02/08/2024
Protección del recurso hídrico, prohibiciones, permisos y obligaciones al respecto	07/08/2024
Manejo de los materiales de construcción y compras verdes o sostenibles.	12/08/2024
Protección de la flora y la fauna	14/08/2024
Relaciones con la comunidad	20/08/2024
Plan de contingencia ambiental. Simulacro, manejo de kit control de derrame	23/08/2024
Manejo de los residuos sólidos, convencionales, RESPEL, RAEE y RCD.	26/06/2024
Manejo de los materiales de construcción y compras verdes o sostenibles.	28/08/2024

Para el cumplimiento de esta ficha ambiental todas las charlas y capacitaciones son de carácter obligatorio para los colaboradores del proyecto y el director de obra garantiza y autoriza la ejecución de estas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Capacitaciones cumplidas	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas	Mensual	8 / 8	100%
Personal Capacitado	No. Personal Capacitado / No. de personal laborando	Mensual	60/60	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Durante el mes de agosto se realizaron 6 charlas Ambientales, 2 socialización al personal en obra, con el fin de retroalimentar temas ambientales y social.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo Integral de materiales de construcción, Mobiliario y Equipos	2.1 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Establecer las medidas de control, prevención y mitigación de impactos que puedan generar el manejo integral de los materiales de construcción en obra.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente	

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)
Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Riesgo de Accidentalidad	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra):

- el Consorcio Obras Judiciales, está realizando la compra de materiales pétreos solo en canteras que cuentan con permisos ambientales, licencias ambientales y mineros, teniendo especial cuidado en que estén vigentes los permisos y que no se encuentren vencidos, cancelados o suspendidos.

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO

Arena	26 **m³**	Cantera	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI
Gravilla	8 **m³**	Cantera	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI
Recebo	0 **m³**	Cantera	Resolución Licencia Ambiental 0167-3-20 (nov. 2019)	SI

RELACIÓN INGRESO MATERIALES PETREOS A OBRA.

AÑO	MES	GRAVILLA 3/4	ARENA	RELLENO
2023	ENERO	0	0	0
2023	FEBRERO	0	0	0
2023	MARZO	0	0	0
2023	ABRIL	16	16	0
2023	MAYO	32	32	0
2023	AGOSTO	56	40	0
2023	AGOSTO	48	40	0
2023	AGOSTO	48	40	0
2023	SEPTIEMBRE	24	24	0
2023	OCTUBRE	8	8	0
2023	NOVIEMBRE	0	0	0
2023	DICIEMBRE	0	0	0
2024	ENERO	0	0	0
2024	FEBRERO	0	0	0
2024	MARZO	0	0	0
2024	ABRIL	0	0	180 m³
2024	MAYO	0	0	27 m³
2024	JUNIO	0	0	0
2024	AGOSTO	8	26	0
TOTAL		**240**	**226**	**207 m³**

Anexo No. 01. Resolución Licencia Ambiental

- En caso de lluvias, disturbios o por exigencias legales, el material de construcción que se encuentre en la obra que no se utilice, se acordonará (como mínimo con señalizadores tubulares y cinta de señalización) y protegerá de la acción de las precipitaciones o el viento cubriéndolos con lonas o plástico, delimitándolos con barreras de contención como ladrillos y alejados de los drenajes superficiales de agua, o sumideros.

- En cada frente de obra y según el programa de inspecciones planeadas, se realizarán inspecciones a los acopios temporales de materiales de construcción, identificando condiciones de señalización y cubrimiento del material.

TIPO DE MATERIAL	FECHA
Arena	A la fecha no se tiene material acopiado en obra.
Gravilla	Ala fecha no se tiene material acopiado en obra.
Recebo	No se tiene material acopiado. Al ingresar el relleno a obra se va regando y compactando las áreas que se requieren.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Fuentes de materiales con permisos vigentes	No. Fuentes con permisos vigentes / No. Fuentes de materiales presentadas	Mensual	1/1	Cumplido 100 %
Volumen de material en obra (por cada tipo de materiales)	Volumen certificado por fuentes autorizadas / Volumen de materiales ingresado a la obra	Mensual	0 **m³** /0 **m³**	Cumplido 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra)

- Arena
- Gravilla ¾”
- Relleno

Para el mes de Agosto No ingresa material de recebo a obra.

Concretos

Para este mes de agosto se utilizó concretos premezclados 3000 psi fundida de escalera piso 4 al piso 5, fundida de losa concreto 4000 y 5000 psi losa tramo 1 piso 9, Columna y muros piso 8 concreto 5000 psi rectangulares, muros en concretos a la vista.

Para el mes ingresan a obra 200 bultos de cemento.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Manejo del Recurso Hídrico	2.2 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Establecer la demanda del recurso hídrico en el proyecto REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR), y determinar las medidas de manejo de acuerdo con la normatividad vigente, estableciendo controles de protección y prevención de impactos.
Prevenir, minimizar y controlar los impactos en el recurso hídrico con el fin de llevar a cabo acciones de seguimiento y control para prevenir posibles modificaciones a las características fisicoquímicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua en la zona de influencia del proyecto, por actividades derivadas de la ejecución del contrato.
Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sólidos para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación por escorrentía superficial	Contaminación del suelo
Incremento en la demanda de bienes o servicios	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control		**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS
El Consorcio ha identificado que el agua que se utiliza en el proyecto se hará a través de un contador independiente del Palacio de Justicia de Valledupar para el desarrollo del proyecto, que el agua será con acometida la cual se ha solicitado directamente por el proyecto a EMDUPAR con solicitud número: CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-006 y se hará el pago de servicio de manera independiente del Palacio de Justicia. Para el mes de Agosto Emdupar hace entrega de la factura del agua consumo en obra.

	
Fotografía No. 21 Consumo de agua a la fecha 31/08/2024	Fotografía No 22 Pago Factura Consumo de agua a la fecha 31/0/2024

Uso eficiente del recurso agua

- No se tienen cuerpos de agua cerca al proyecto, los sumideros aledaños al proyecto serán protegido con poli sombra con el fin de evitar el arrastre de material o sedimentos que puedan llegar a obstruir o contaminar los cuerpos de agua.
- No se presenta ni desviación ni canalización de cauces de ríos o cuerpos de agua cercanos al proyecto.
- Se puede reutilizar las aguas lluvias para su reutilización como aguas grises (uso y arrastre en aparatos sanitarios y para riego).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Control de la calidad del agua	No. parámetros que cumplen norma de referencia / No. parámetros medidos de calidad del agua	No aplica para el proyecto	0 / 0	100%
Obras para el control de sedimentos	No. obras de control de sedimentos construidas / No. obras de control de sedimentos planeadas	Mensual	0 / 0	No hay fracturado para controlar 100%
Consumo de agua en obra	Vol. Agua certificada para consumo en obra / Vol. Agua consumida durante el en obra	Mensual	21 m3	Se evidencia en la factura emitida por Emdupar consumo del mes agosto 2024. 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

El soporte de seguimiento de esta ficha se realizará a través de:

- Cumplimiento de indicadores formato de la entidad.
- Registro fotográfico.
- F-EVSG-19 Control Consumo Agua formato de la entidad.





Fotografía No.23 Consumo de agua en obra a la fecha 31/08/2024.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Control de la excavación y demoliciones	2.3 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Realizar el control de las demoliciones y excavaciones, cumpliendo con la normatividad legal vigente ambiental, Implementando las medidas de control y mitigación en la ejecución de las actividades de obra, transporte y disposición o su reutilización	Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se utilizarán en la conformación de rellenos, bases con el objetivo de prevenir los impactos.
Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas. Cumplir con la normatividad legal vigente.	Utilización de todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, en la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de otras zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto
Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y vehículos.	Disponer todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio autorizado para tal fin
IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Generación y aporte de sólidos por escorrentía en redes de alcantarillado
Alteración de la calidad visual	Afectación de la cotidianidad
Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.).	Riesgo de Accidentalidad
TIPO DE MEDIDA	

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Según las especificaciones y la interventoría del proyecto se indicará la cantidad de material a utilizar con los equipos apropiados, en donde se pueda prevenir daños a las estructuras aledañas.

El área para excavar no presenta potencial arqueológico, pero en el momento que se presente se tomaran las medidas establecidas en la ficha Protección del patrimonio arqueológico y cultural, la cual será incluida en el presente documento.

Excavaciones

Durante el mes de agosto no se realiza actividad de excavación manual.

Actividad	Cantidad m³
Excavación	814 m³
Demolición	0 m³

- Una vez se tengan identificadas las estructuras que deben ser demolidas, los residuos resultantes y que no puedan ser reutilizados serán dispuestos en los siguientes sitios de disposición:

EXPEDIENTE	SITIO DE DISPOSICIÓN	ACTIVIDAD QUE REALIZA	LOCALIZACIÓN
Auto No. 432	Agregados del Cesar E. U	Gestor de RCD de puntos limpios y plantas de aprovechamiento y sitios de disposición final	Sede Operaria: Km 3 Vía a La Mesa – Valledupar – Cesar

El auto No. 432 del 10 de octubre del 2019 Corpocesar emitió el respectivo permiso de este gestor.

Transporte

En este periodo ingresan los siguientes vehículos al proyecto:

Anexo: 13 Soporte Soat, Licencia de conducir, Tecno mecánica.

PLACA VOLQUETA	SOAT	LICENCIA DE CONDUCIR	TECNOMECANICA VIGENTE
PKB 173	040800443697600	10032144348	09-OIN-137-001
FDJ 465	4308005367270000	3154238	21-CDA-093

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Sitios de disposición de escombros y excavaciones	No. Sitios de disposición autorizados / No. Sitios de disposición de escombros necesarios	Mensual	1/1	Agregados del Cesar E. U 100%
Material dispuesto en sitio de disposición autorizado	Volumen de materiales dispuestos en sitio autorizados / Volumen de material para disposición final	Mensual	814 m³/ 814 m³	Agregados del Cesar E. U 100%
Material reutilizable	Volumen reutilizado en obra o por terceros / Volumen de material reutilizable.	Mensual	766 m³	Para este mes, no se reutiliza material en obra.
Reutilización de descapote	Volumen descapote reutilizado en el proyecto/ Volumen descapote obtenido y almacenado	Mensual	0	N/A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO



Excavación





Fotografía No.24 Excavación tanque de agua potable





Fotografía No 25. Material Reutilizable en obra relleno para nivelación (766 m³)

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Residuos sólidos generados	2.4 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Aplicar por parte del Consorcio Obras Judiciales las políticas ambientales en cuanto a la disminución en la generación de residuos sólidos.

El Consorcio Obras Judiciales cumple para la ejecución del proyecto las condiciones legales desde la clasificación, almacenamiento, presentación y disposición final de los residuos sólidos con el gestor autorizado.

Implementar medidas para el manejo de los residuos sólidos, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de este tipo de residuos.

Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales este encargado de gestionar los residuos en la obra, de acuerdo con las normas ambientales en Colombia.

En el proyecto se establece un sitio, el cual tenga sea de fácil acceso, el cual tiene como objeto al destinado al almacenamiento de RCD's, esta zona debe tener la señalización de acuerdo al tipo de residuo que se dispone, y debe estar el residuo confinado y el suelo debe contar con recubrimiento en polietileno de alta densidad, La estructura no debe encontrarse cerca de cuerpos de agua artificiales o naturales, los sumideros del área de influencia del proyecto deben estar cubiertos y realizarse manteniendo frecuente.

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	SITIO DE DISPOSICIÓN
Material vegetal y suelo orgánico	0	N/A
Chatarra y llantas.	0	N/A
Empaques, envases y embalajes.	0	N/A
Papel blanco oficinas.	50 hojas	Se están reutilizando en oficina.
Residuos especiales y/o peligrosos	100 bolsas	Bolsas de cemento - Punto de acopio.

Residuos Orgánicos.	28 bolsas	Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto.
Basura	28 bolsas	Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto.

Ubicación de recipientes de recolección de residuos sólidos / Residuos no aprovechables

Ubicar de manera estratégica y visible, recipientes adecuados para la separación en la fuente de los residuos.
Residuos orgánicos: serán entregados a las empresas dedicadas al aprovechamiento de este tipo de residuos que se encuentran en el área de influencia del proyecto o a personas que puedan hacer aprovechamiento de estos residuos en actividades agropecuarias.
Residuos no aprovechables – basuras: estos residuos serán almacenados hasta su recolección por las empresas prestadoras de este servicio para su disposición en el relleno sanitario que se encuentre debidamente autorizados para realzar este manejo.

Caneca color verde: Se deposita residuos orgánicos aprovechables
Caneca color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel, cartón.
Caneca color negro: Para depositar residuos no aprovechables.

Lo anteriormente mencionado es tomado de la resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

Separación de residuos solidos

En los campamentos, instalaciones temporales y áreas de trabajo se realizará la separación de residuos en contendores debidamente marcados según tipo de residuo.





Fotografía No 24. Punto ecológico ubicación ingreso a obra.	Fotografía No 25. Caneca ecológico área de producción.

Vertimiento de aguas producto de la excavación en obra

Debido a que el proceso constructivo del proyecto presenta un nivel freático alto, es necesario instalar sedimentadores para reducir la turbulencia, velocidad y decantar las aguas productos de las excavaciones por la cimentación del proyecto, la baja velocidad del flujo de agua permite que las partículas sedimentables se hundan, mientras los componentes que pesan menos que agua floten hacia la superficie, lo que permite el vertimiento de estos residuos líquidos que no son contaminados ya que no tendrán ningún tipo de sustancia química serán reutilizada para humectación, lavado de baños y lavado de llantas (en caso de requerirse) reincorporando en el proceso constructivo este tipo de residuo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Residuos sólidos convencionales dispuestos en relleno sanitario	RSI dispuesto en relleno sanitario / RSI generados en la obra	Mensual	28/28	se generó residuos sólidos en obra. 100%
Residuos sólidos reutilizados por gestores construidos	RSR +RSO reutilizados por gestores autorizados / RSR + RSO generados en obra	Mensual	0/0	No se generan residuos sólidos para ser reutilizados por gestores. 100%
Residuos peligrosos manejados por operador autorizado	RSP entregados a gestor autorizado /RSP generados en obra	Mensual	0/0	No se generan residuos peligrosos y / o especiales 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Construcción centro de recolección residuos solidos

- Centro de acopio debidamente señalizado.

	
Fotografía No. 26. Acopio de Residuos	Fotografía No. 27. Acopio de Residuos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Residuos líquidos y sustancias peligrosas	2.5 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
El objetivo de esta ficha ambiental es definir las soluciones y herramientas técnicas para el adecuado manejo, control y aplicación de las contingencias, para el manejo de los residuos líquidos y sustancias peligrosas del proyecto.	Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sustancias peligrosas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto	

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del agua	Contaminación del suelo
Contaminación del aire	Alteración calidad visual
Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA								
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**		

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Manejo de Aguas residuales domesticas

- La obra tiene cobertura del sistema de alcantarillado, se dispondrá en la obra de baños fijos para los trabajadores los cuales se establece uno para mujeres y tres para hombres, en caso de contingencias, se dispondrán baños portátiles, los cuales contarán con el certificado de manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos y líquidos.

- Los baños cuentan con sanitario y lavamanos, en relación de una unidad sanitaria por cada quince trabajadores, separados por sexo y dotados con jabón desinfectante, papel higiénico, toallas y recipientes para basura.

	
Fotografía No. 28. Lavado de baños	Fotografía No 29. Lavado de lavamanos

Residuos Líquidos Industriales

- En el proyecto no se tiene permitido lavar vehículos o maquinaria de obra.
- En el proyecto no se establece la necesidad de tener un contenedor de residuos para este tipo de residuos líquidos industriales, en el caso que por las actividades generadas se requiera y este, se colmate se realiza su limpieza y mantenimiento respectivo.
- No se hará, por ningún motivo, disposición de residuos en los cuerpos de agua superficiales ni en la vía pública, con lo cual se asegura que no se verán afectados como consecuencia de las actividades constructivas.

Residuos de aceite y/o combustibles

En el proyecto se cuenta con combustible (ACPM), gasolina, grasa, para uso de la bomba estacionaria para concreto, se adecua el área para almacenamiento de estas sustancias peligrosas, (cada embace se rotula y se anexa la hoja de seguridad, el area cuenta con piso en concreto y una capa de aserrín)
Se adecua el area de almacenamiento con una barrera de contención, de acuerdo con las observaciones realizadas por el cliente.



Fotografía No 30. Almacenamiento de sustancias químicas

Manejo de Sustancias Peligrosas

- Si se presentan derrames accidentales de aceites, aditivos de concreto, solventes, pinturas no acrílicas, agua-cemento, lubricantes u otras sustancias peligrosas, se debe realizar el procedimiento estipulado en el plan de contingencias y emergencias ambientales y utilizar el kit de derrames del proyecto.

- El almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, debe ser conforme a las indicaciones de la hoja de seguridad del producto y tener a todo el personal entrenado en su manejo en caso de algún incidente.

- En el lugar de almacenamiento se tiene en cuenta la señalización del sitio.

- Para un apropiado almacenamiento, el Consorcio tiene en cuenta:

a. El volumen máximo de almacenamiento.
b. Volumen máximo de almacenamiento por clase.
c. Secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de sustancias.
d. Cantidad almacenada según sustancias y clases de sustancias.
e. Se tendrá un registro de recepción, despacho e inspección.
f. No se deben mezclar sustancias peligrosas que sean incompatibles para esto se publica la matriz de sustancias químicas.
g. El acopio de recipientes de sustancias combustibles, tóxicas u oxidantes no podrá ser superior a la recomendada según el tipo de recipientes.
h. En el proyecto se implementa un Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales por derrame de sustancias peligrosas, socializado a todo el personal que haga parte del proyecto. Este plan se entregará junto con el PGAS
i. En el periodo de realización de este informe no se presentaron derrames o emergencias ambientales En el proyecto se dispondrá un cuarto de sustancias químicas el cual estará en zona dura y cuenta con un

dique de confinamiento en caso de derrames y tendrá una capacidad calculada en 100% del volumen almacenado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Permiso de vertimientos	No. permisos de vertimientos obtenidos / No. permisos de vertimientos identificados	Mensual	0 / 0	No se tienen baños portátiles en obra 100%
Disposición de residuos líquidos	Volumen de residuos líquidos entregados a un gestor autorizado / Volumen de residuos líquidos generados	Mensual	0 / 0	No se generan residuos líquidos. 100%
Manejo de sustancias peligrosas	Volumen sustancias químicas almacenadas correctamente / Volumen sustancias químicas almacenadas.	Mensual	5 gal/ 5 gal	ACPM acopiado en el almacén. 100%
Atenciones incidentes y accidentes ambientales	No. de emergencias atendidas correctamente / No. de emergencias con sustancias peligrosas	Mensual	0/0	No se presentan emergencia con sustancias peligrosas 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Residuos líquidos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Instalación, Funcionamiento y retiro de campamentos	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento en caso de ser necesario construirlo.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Restaurar ambientalmente las áreas donde se han llevado a cabo desmantelamientos de instalaciones útiles en el momento de la construcción de obras.	

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de la calidad paisajística	Alteración de la estabilidad del terreno
Alteración de las características del suelo	Alteración de la calidad de agua por arrastre de sedimentos.


TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación



Fotografía No 31 oficina de la obra



Fotografía No 32 oficina de la obra



Fotografía No 33. Orden y aseo oficina de obra



Fotografía No 34. Orden y aseo oficina de obra

- Al proyecto fueron asignadas en calidad de préstamo, oficinas del palacio de justicia actualmente construido, las cuales fueron dotadas para los profesionales que laboran en obra.

Funcionamiento del Campamento

- En el campamento (oficina) están ubicados los profesionales del pliego de condiciones, el cual están dotado de equipos de cómputo, escritorios y demás insumos necesarios para la ejecución administrativa del proyecto.

- Se tiene asignado un trabajador para orden y aseo de las instalaciones temporales el cual debe cumplir con la establecido en la ficha ambiental 2.5 MCA Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas.
- Se tiene instalado un punto de emergencia que está dotado de extintor, camilla y botiquín.

- La señalización es indispensable, por ende, se cuenta con esta, instalada en todos los sitios de almacenamiento y acopio de material incluyendo las señales informativas y de advertencia de acuerdo con el producto que se tenga.

- Con el propósito de implementar el uso eficiente al agua, se podrán implementar sistemas de recolección de aguas lluvias y recirculación, que pueda emplearse para usos específicos.

- No se instalarán plantas de producción de concreto en obra, el concreto será suministrado por una planta de concretos.

Desmantelamiento de instalaciones

- El desmantelamiento de instalaciones se realiza inmediatamente después de terminadas las obras, y así se dará por terminada la obra.
- Este desmantelamiento será de toda la infraestructura que se utilizó para la construcción del proyecto, así como los equipos, la acometida temporal que suministra el agua potable, luz y demás servicios públicos que se utilizaron el a etapa constructivo del proyecto.
- Del área de construcción se retiran todos los escombros y chatarras sobrantes hacia los sitios de disposición final.
- Como parte del cierre ambiental del PGAS, el Consorcio Obras Judiciales entregará una paz y salvo de propietario del predio de las instalaciones temporales, de lo contrario no podrá ser liquidado su contrato.

Esta parte de la ficha se implementa al finalizar el proyecto.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Medidas de Manejo ambiental en campamentos (se realiza inspección	Medidas de manejo ambiental aplicadas en el campamento e instalaciones / Medidas de manejo ambiental necesarias	Mensual	N/A	N/A

donde se evidencia que se encuentra limpio y ordenado.				
Calidad del aire	No. Quejas atendidas y cerradas de aire o ruido / No. quejas por mala calidad del aire o ruido	Mensual	100%	No se presentan quejas de la comunidad durante el mes de abril. 100 %
Calidad del agua	No. Quejas resueltas calidad del agua / No. Quejas por la mala calidad del agua	Mensual	100 %	No se presentan quejas por la calidad del agua 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de seguimiento de esta ficha ambiental se establecen:

- Lista de chequeo de medidas de manejo ambiental en campamentos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la maquinaria y equipo	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como objetivo de esta ficha es la prevención de los potenciales impactos negativos que se pueden producir por el uso de maquinaria y equipos en el proyecto.

Establecer los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo para que todos los equipos, vehículos y maquinaria para la ejecución del proyecto, el cual debe permanecer en óptimas condiciones, cumpliendo las normas ambientales y su operación se realice en seguridad y protección del medio ambiente.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros	Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites
Contaminación del suelo	Emisiones de gases de combustión
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA							
Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Maquinaria y Equipos

- Para este periodo se continua en obra con bomba estacionaria para concreto.

	
Fotografía No 35. Inspección visual Bomba de concreto	Fotografía No. 36 formato inspección Bomba para concreto.

- Anexo en los informes se entrega a la Interventoría los documentos de la maquinaria, equipos y vehículos que estarán al servicio de la obra, en donde se adjuntan:

  a. Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
  b. Revisión técnico-mecánica (N.A)
  c. Seguridad Social del operador.
  d. Preoperacional.

- En el momento que se requiera programas y ejecutar actividades de obra en horario nocturno, se solicitará el respectivo permiso ante la alcandía si así se requiere.

- Este apartado se entrega en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

- El mantenimiento y lavado se realiza en centros especializados y autorizados ambientalmente para tal fin. Y están prohibido este tipo de prácticas en el proyecto.

- En la actualidad se encuentra en el proyecto mezcladoras portátiles, el lavado del trompo de mezcladora de concreto se realiza en un lugar con las medidas de manejo ambiental, que garantizando la protección de los recursos naturales

- El Consorcio no ejecutara mantenimientos preventivos ni correctivos en el proyecto de ninguno de la maquinaria o equipos del proyecto, solo en casos de extrema urgencia y con previa autorización de la interventoría y siguiendo los lineamientos de este documento.
- Para la permanente entrada y salida de vehículos se debe realizar mantenimiento periódico de los sedimentadores presentes en el área de intervención, para evitar su colmatación. El material seco será manejado como material de excavaciones, previo proceso de secado, realizado en lechos de secado por evaporación, tal como se explicó en la ficha ambiental 2.3 MCA CONTROL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, de este documento.

- Se restringe la velocidad de acuerdo con el PMT de circulación de los vehículos y maquinaria, dentro y alrededor de la obra. Vale la pena resaltar que este fue aprobado para el mes de mayo.

- El proyecto cuenta con un cerramiento en zinc para evitar cualquier tipo de incidente con la comunidad.
- Los trabajos del proyecto no ocuparán el espacio público, para los cortes de acero o ladrillo se dispondrán de barreras acústicas en icopor. En lo posible se utilizarán martillos de goma y cortadoras con reductores de ruido incorporados; para disminuir la emisión de ruido.

	
Fotografía No 37 Cerramiento de la zona de obra	Fotografía No 38 Cerramiento de la zona de obra

MANEJO DEL MATERIAL PARTICULADO

- El material agregado que se tenga en el proyecto deberá permanecer cubiertos en todo momento con el fin de evitar la fuga de partículas al proyecto.
- Se instala poli sombra para aislar la zona de construcción de la zona del Palacio de Justicia.
- Durante los días más calurosos se hará dispersión o humedecimiento de la zona de trabajo, pero sin formar charcos de agua o humectación excesiva.
- Minimizar el flujo de vehículos dentro y sobre los lugares de acopio del material pétreo.
- Se garantiza el aislamiento del equipo y de los operarios para el uso de cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado.
- En el momento de barrer zonas de obra se hará humectación del sitio de limpieza para garantizar que el material particulado no este suspendido en el aire.

- Para la cortadora de ladrillo se dispondrá un lugar aislado dentro del proyecto en donde se realiza un cerramiento perimetral, aislado por poli sombra e icopor, para minimizar el ruido que genera la operación del equipo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica	No. Vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica / No. Vehículos y maquinaria en el proyecto	Mensual	2//2	Para este periodo no ingresa vehículo a obra 100 %
Accidentes registrados	No. eventos atendidos correctamente / No. Accidentes ocurridos por manejo de vehículos y maquinaria	Mensual	0 /0	No se ha presentado accidente y/o incidentes en obra 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de esta ficha ambiental son:

- Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
- Seguridad Social del operador
- Revisión Tecno mecánica de vehículos (No aplica)
- Preoperacionales de maquinaria y equipos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Control de la calidad del aire y las emisiones	2.7 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Identificar y plantear las medidas que debe realizar el Consorcio Obras Judiciales, con el fin de no alterar la calidad del aire y el ruido ambiental en el entorno donde se desarrolla la obra civil

Mitigar los posibles efectos negativos que se presentan, principalmente sobre el componente atmosférico durante la etapa de construcción y operación del proyecto

IMPACTOS POTENCIALES

Deterioro de la calidad del aire, por el aumento en las concentraciones de material particulado y gases contaminantes	Deterioro de las zonas verdes y en general del paisaje por acumulación de polvo.

Molestias a la comunidad y los trabajadores, por la presencia de polvo, gases y ruido.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO

Calidad del Aire

- El proyecto tendrá un cerramiento en teja de zinc y si se requiere se protegerá con malla ecológica o polisombra para el control del material particulado.
- El control en la fuente se realiza cubriendo los materiales con plástico negro de construcción para evitar el efecto del viento que dispersa el material fino en el aire.
- Se hace control estricto del PMT del proyecto para evitar posibles accidentes con la comunidad.
- En el proyecto no hay perdida de cobertura en el área de intervención, pero se aplicarán medidas de disminución del material particulado que produce la circulación de maquinaria, vehículos, el personal de obra y la acción del viento.
- Se prohíbe el riego de aceite quemado como medida para este aspecto ambiental y cualquier mantenimiento en la zona del proyecto.
- Se debe cumplir con las medidas de manejo establecidas en la ficha 2.7 MCA MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS, especialmente en lo relacionado con las emisiones de los vehículos, equipos y maquinaria; además de las establecidas en la legislación colombiana sobre emisiones de ruido, ruido ambiental, emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas, así como de la calidad del aire.

MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO

Las actividades de esta ficha se están implementando este mes, y así mismo dando cumplimiento al proceso constructivo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad
N. A	N. A	N. A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Revisión tecno mecánica
- Documentos volquetas

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Biótico	Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Proteger la fauna presente en el área de influencia directa del proyecto.	Capacitar al personal sobre el componente ambiental.

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración al paisaje.	Minimizar el impacto en la avifauna que pueda estar en el proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Esta ficha ambiental será aplicada en el proyecto en el caso que se detecte fauna en el proyecto o los permisos emitidos por CORPOCESAR lo requieran y se hará de la siguiente manera:
- En el caso de tener fauna en el proyecto se escogerán los lugares de relocalización, contando con el apoyo de las autoridades y entidades ambientales especializadas según las especies, para garantizar su conservación.
- El personal de la obra será capacitado según el cronograma de capacitaciones anexo al PGAS.
- Se informa al personal que está prohibida la caza de cualquier especie de fauna silvestre.
- Cuando se requiera de rescate de fauna, se debe concertar los sitios de captura y de liberación, así como gestionar los permisos para esta actividad.
- Todas las actividades de estudio, rescate y relocalización de la fauna hallada, se cumplirán antes de la intervención a la vegetación del área de influencia directa del proyecto.
- Cuando se encuentren animales heridos o enfermos, deben ser entregados a la autoridad ambiental, elaborar un acta de la entrega, especificando el sitio, la especia, su estado, funcionario y entidad que recibe.
- Se debe llevar un registro fotográfico, georreferenciar todos los procedimientos que se realicen, nombre científico y común de la especie rescatada y liberada.
- En caso de necesitarlo, el Consorcio Obras Judiciales debe llevar un formato de registro de fauna, donde se debe reportar todos los procedimientos realizados. Como mínimo debe contener el nombre científico y común de la especie, sexo, cantidad, ubicación, si está dentro de alguna clasificación de conservación o protección, su estado de salud, el sitio de la liberación y registro fotográfico.

Rescate de Avifauna

- En el caso de rescate de nidos con huevos o neonatos se hará a través de un biólogo quien está capacitado para ejercer esta labor.

- Se tendrá especial cuidado en la etapa de tala, con el fin de garantizar que en el momento de la ejecución de esta actividad los individuos no cuenten con nidos activos, para esperar que los huevos o neonatos se desarrollen hasta la formación de plumas.

Para el mes de agosto 2023 se realizó la tala de un árbol, el cual se verificó con anterioridad que no se viera afectada la avifauna. Para este periodo de abril no se realiza tala de árboles.

Rescate de Mamíferos

- En el caso de tener que realizar el procedimiento para el rescate de mamíferos se hará con un biólogo, quien tendrá en cuenta las características de las jaulas y tener un espacio mínimo dos veces el tamaño del animal, tener ventilación y recubierta con material poroso como la tela.
- Cuando se empleen anestésicos o sedantes, solo se podrá hacer cuando se haga bajo la supervisión de un veterinario experto.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate de Reptiles

- Cuando se identifique una de especies en el proyecto se procederá al ahuyenta miento de la misma y su rescate se hará con ayuda de personal especializado para este fin. En el proyecto no se tendrá disponible suero antiofídico.
- El procedimiento de captura se debe realizar preferiblemente en días soleados entre 10:00 y 13:00 horas del día o entre las 17:00 hasta máximo 18:00 horas del día.
- Se deben transportar en bolsas de tela gruesa y cuando sean serpientes venenosas, se tienen que utilizar recipientes rígidos, que la tapa se pueda cerrar de manera segura y que reciba ventilación suficiente.

No se pueden poner especies distintas en un mismo contenedor.
Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate, Traslado y Reubicación de Enjambre Silvestre

- En caso de identificarse este tipo de rescate se tendrá el apoyo de personal especializado ya que en obra no se cuenta con este tipo de expertos y se seguirán los siguientes pasos:

a. Hacer reconocimiento del sitio específico donde está el enjambre, verificar las condiciones del tiempo, para no actuar en condiciones de lluvia ni de extremo calor.
b. Con el equipo de trabajo se planificar esta intervención.
c. La intervención se hará mínimo tres (3) personas.
d. Usar siempre el traje de protección enterizo, guantes y botas.
e. En el área sólo debe permanecer el equipo que hará el procedimiento, instalar señales y personal que controle el paso por el sitio, habrá un responsable de la seguridad.
f. Es importante contar con personal médico dentro del equipo de trabajo.
g. Tener permanente comunicación y contacto visual con sus compañeros.

h. El procedimiento termina cuando la colmena se haya trasladado

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Preparación: Capacitación en manejo de abejas y primeros auxilios; identificación y compra de equipos de protección, equipos y accesorios; identificar e informar a organismos de respuesta como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Acercamiento al Sitio: Establecer las condiciones, rutas que se van a manejar, duración del procedimiento y verificar si existen algunas condiciones especiales de las abejas o avispas, agresividad de la colonia, o si hay personas heridas.

Operación: Asegurar la zona, colocar una unidad generadora de humo a fin de neutralizar la capacidad de ataque de las abejas y transcurrido un tiempo prudente, retirar las abejas.

Reporte de la Actividad: En el mismo formato de rescate de fauna, se hará un reporte de la actividad con todas las características de la especie y el registro fotográfico. Informar a la autoridad ambiental, cuando así lo requiera.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Protección de la fauna existente	No. Fauna silvestre rescatada y reubicada / No. No. Fauna silvestre encontrada en el AID	Mensual	0 / 0	No se ha presentado rescate de avifauna en el periodo. 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Para el mes de agosto 2024, No se realiza tala de árbol.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la vegetación en obra	3.2 – MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Definir los requisitos para la intervención de la vegetación y las actividades apropiadas en el manejo de la flora, para disminuir y compensar el impacto negativo que genera su afectación, en el proyecto.

Identificar la vegetación que se intervendrá, por la ejecución de las obras dentro del área de influencia directa; los trámites que sean necesarios ante CORPOCESAR y llevar a cabo las actividades como tala, poda radicular, poda aérea, bloqueo y traslado, mantenimiento, establecimiento, fertilización y control sanitario.

IMPACTOS POTENCIALES

Afectación a la capa vegetal	Alteración al paisaje.
Migración de la fauna silvestre	Generación de ruido y material particulado

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	X

MEDIDAS DE MANEJO/ACTIVIDADES EJECUTADAS

Inventario Forestal y Plan de Manejo Forestal

- Para este mes de agosto se continua con la limpieza y mejoramiento del encerramiento (Reinstalación de lona verde).





	
Fotografía No 39. Limpieza de árbol	Fotografía No 40. Limpieza de Árbol

En pro de mantener los procesos de mejora continua, para la ejecución de dicha poda, se realiza el riego de los árboles intervenidos con el fin de evitar la deshidratación de estos.
Vale la pena mencionar que dicho proceso se evidencia en el informe forestal enviado al área de interventoría el día 18 de mayo de 2023 con radicado No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 210

Permisos para la Ejecución de la Intervención

- Para el mes de mayo de 2023 se dio cumplimiento con el inventario forestal.
- En la actualidad se cuenta con el permiso ambiental de tala el cual se relaciona a continuación

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO
Tala de arboles	Corpocesar	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses
Tala de 1 árbol y poda de 11 arboles	Corpocesar	Resolución No. 003 del 12 de febrero del 2024	Seis (6) meses

Manejo de la Vegetación: Podas, Talas y Traslados

Teniendo en cuenta que el árbol a talar ya no genera riesgo para el proyecto ni para la población trabajadora, se notifica a Corpocesar mediante comunicado No.675 con fecha 27 de marzo del presente año, se desistió de esta resolución que no hubo la necesidad de talarlo, a la fecha de la presentación del siguiente informe, no se cuenta con una respuesta de Corpocesar.

La Interventoría aprobó el documento PGAS, a la fecha se ha venido realizando seguimiento a todos los compromisos y a lo que la ley refiere. el Consorcio entrego a la Interventoría, el acto administrativo mediante el cual

se le otorga el permiso para el manejo de la vegetación y deberá cumplir con los requerimientos que establezca la autoridad ambiental.

Manejo de la Vegetación Para Permanecer:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Vegetación con veda nacional o regional	No. individuos con permisos de levantamiento de veda otorgado por autoridad ambiental competente / No. individuos inventariados identificados con veda	N/A	0/0	Ya no se presenta vedas en el proyecto

SOPORTES DE SEGUIMIENTO
• Certificados de disposición vegetal
• Permisos ambientales /forestales

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Atención a la Comunidad y Autoridades	4.1 GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Este proyecto asume el manejo de las obligaciones ante la comunidad directa de influencia del proyecto la cual son los funcionarios y visitantes al Palacio de Justicia de Valledupar, autoridades municipales, Juntas de Acción Comunal – JAC, líderes, directivas de instituciones, empresas de servicios públicos de la ciudad de Valledupar, los cuales presenten inquietudes, quejas, reclamos y consultas relacionadas con el proyecto.
El proyecto debe implementar mecanismos para recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las PQRS que las partes interesadas presenten al proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES	
Minimizar impactos ambientales que puedan generarse desde el personal del proyecto.	Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Instalación y Funcionamiento del CAC

- El Consorcio Obras Judiciales en el ingreso del proyecto instala un espacio de atención a la ciudadanía, la cual tendrá atención a las partes interesadas en la etapa de inicio de las actividades constructivas, y se desarrollan las siguientes actividades:

a. Actas de vecindad: Se realizaron al inicio del proyecto y fueron radicadas a interventoría.

b. Gestión de mano de obra local: Se está contratando personal de la localidad

Este espacio estará abierto y disponible durante todo el proyecto, en los horarios 10:00 a.m. a 12:00, los lunes, miércoles y viernes, en dónde se tendrán los documentos técnicos del contrato, estos horarios serán divulgados a la comunicada comunidad en la reunión de inicio, adicional se publicarán los horarios de atención.

- Debe registrarse en el formato, el estado en el que queda la visita del ciudadano:

Cerrada: Cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y las partes interesadas o quien presento la queja este satisfecha con la respuesta o acción desarrollada por parte del Consorcio Obras Judiciales.

Abierta: cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o en proceso de trámite.

En los informes mensuales del Consorcio Obras Judiciales se presentará al Interventor un consolidado de todas las solicitudes de los ciudadanos, entregando los siguientes valores y porcentajes:

a. Total, de manifestaciones en el periodo y acumuladas.
b. Total, de manifestaciones por tipo en el periodo y acumuladas.
c. Total, de casos cerrados en el periodo y acumulados.
d. Total, de casos abiertos en el periodo y acumulados.
e. Para el cierre ambiental y social del proyecto, el Contratista debe tener paz y salvo de todos los eventos registrados de manifestaciones ciudadanas y actas de vecindad.
   En esta oficina deben permanecer las Actas de Vecindad que se realizaron en el periodo previo a las actividades constructivas y documentos en general que sean de consulta por la comunidad y las autoridades.

En Este periodo no se han presentado quejas y se ha presentado público.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Quejas y reclamos durante el proyecto	No. manifestaciones cerradas / No. manifestaciones de la comunidad	Mensual	0 / 0	A la fecha No se presentan quejas por la comunidad 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Formato de PQRS
- Reunión de inicio
- Actas de vecindad (del cliente)
- Gestión de mano de obra local

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Información y Participación de la Comunidad	4.2 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Que el consorcio Obras Judiciales proporcione información que oportuna, suficiente, clara y necesaria para todas las partes interesadas del proyecto.

El Consorcio Obras Judiciales debe darle un buen manejo a la información relativa al proyecto, con las autoridades locales, la comunidad del área de influencia directa

IMPACTOS POTENCIALES

Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

La comunidad aledaña al proyecto puede tener dudas sobre el proyecto las cuales pueden influir en el desarrollo del proyecto

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades de Comunicaciones y Publicidad

Son las actividades para distribuir elementos de comunicación para citar reuniones y divulgar información relevante relacionada con el proyecto.

Comunicaciones Personalizadas: Cuando es necesaria la elaboración de una comunicación formal dirigía a una persona, funcionario o entidad en particular, donde se entregue información o invitación a alguna reunión. Deberán estar revisadas por la Interventoría antes de su envío.

Volantes de Información: Cuando se distribuya información a través de volantes informativos en el área de influencia del proyecto, se tomará el recibido de los ciudadanos que lo recibieron dentro de un formato con la fecha, identificación completa de la persona que recibió la información y firma o huella.
En caso de que se requiera intervención de redes de servicios públicos que genere su suspensión temporal, la restricción de tráfico y cierre de vías, entre otras, se deberá dar aviso oportuno a la población afectada, mediante volantes y reuniones con la Junta de Acción Comunal, entre otras formas organizativas, con mínimo 5 días de anticipación; también deberá contar con los permisos respectivos para realizar este tipo de cierres y suspensiones.

Información por Medios Locales: A través de medios como la televisión local, radio comunitaria o perifoneo autorizado, se podrá hacer divulgación de reuniones programadas para la invitación a la comunidad en general.

Manejo del Flujo Peatonal

	
Fotografía No.45 señales de tránsito.	Fotografía No. 46 Sendero peatonal

- El Plan de Manejo de Tráfico – PMT Con fecha de aprobación 17 de mayo del 2023 y radicado a interventoría el día 18 de mayo de 2023 con oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-212, debe cumplir el objetivo de mantener o mejorar la velocidad de la circulación vehicular, con el fin de evitar la densificación y/o concentración de las emisiones, como también el malestar a terceros dentro del área de influencia.

- De igual forma se implementa la señalización de seguridad adecuada. Todos los elementos de señalización permanecerán limpios y debidamente instalados para que cumplan su función.

- Cuando el PMT aprobado por la oficina de tránsito o Alcaldía correspondiente, contemple los controladores viales, se deberá disponer del personal necesario, sin que esto implique costos adicionales a la DEAJ.
- En el caso de requerir senderos externos para uso peatonal con un ancho suficiente, para que el tráfico peatonal normal no sufra congestiones.
- Los senderos peatonales no podrán ser ocupados por la obra, como por equipos, vehículos, ni por el cargue y descargue, ni por el acopio temporal de materiales.
- Las obras en espacio público deben realizar cerramientos, buscando el bienestar y la seguridad de los transeúntes.
- Los accesos y el perímetro de la obra deberán mantenerse bien señalizados, de tal forma que sean claramente visibles, identificables y que permitan una fácil orientación a los peatones.
- Se deben ubicar los factores generadores de ruido alejados del perímetro que limita la obra con el espacio público; aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la construcción de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Reuniones de apertura, seguimiento y cierre	o. de reuniones desarrolladas / No. Reuniones programadas	Mensuales	N/A	N/A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Cronograma de reuniones de avance
- Informe general del avance del proyecto.
- Resultados de la gestión social y ambiental del Contratista.
- Reunión de finalización
- Comunicaciones personalizadas
- Volantes de información
- Plan de Manejo de Tráfico

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Manejo de Infraestructura Privada, Publica, de Servicios Públicos, Redes y Activos.	4.3 – GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta ficha es la elaboración del estado físico de la infraestructura pública y privada, así como de las redes de servicios públicos cercanos al área de influencia directa del proyecto, generar espacios y relaciones con propietarios y empresas administradoras u operadores; con el propósito de prevenir conflictos con las comunidades y las entidades correspondientes.

IMPACTOS POTENCIALES

Impactos derivados de la construcción del proyecto que puede generar daños a la infraestructura pública al igual que las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para la atención a los ciudadanos o partes interesadas del proyecto se tiene designado el siguiente horario de atención de la comunidad:

Martes, jueves y sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. lugar donde se decepcionará y aclararán todas las inquietudes presentadas por las partes interesadas o a través del correo electrónico: atencionpqrscoj@hotmail.com



Fotografía No. 47. Sitio de atención a las partes interesadas

Actas de Vecindad de Predios

Corresponde al registro del estado de la construcción y de toda la infraestructura vecina a las actividades de obra y en los sitios que el contratista requiere de manera temporal para el desarrollo de la obra, empleando el Formato del Acta de Vecindad del Anexo 8.3 de la guía para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social.

Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles, vallas, redes de acueductos, de distribución de energía, redes de tecnología de la información y las comunicaciones o de la industria del petróleo y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas.

- Esta será una actividad que debe liderar el profesional social del contratista, con el acompañamiento del Residente de Obra, quien será la persona entendida en los aspectos técnicos del acta de vecindad en el momento de realizarla.

- La Interventoría también debe acompañar las actas de vecindad, con el fin de verificar que se cumpla con el procedimiento y apoyar técnicamente las observaciones.

- Cuando existan posibles interferencias de la obra con redes u infraestructura existente, que no está contemplado en el diseño, el Contratista debe informar formalmente a la Interventoría para que se realicen las gestiones y ajustes oportunos para la buena ejecución de la obra.

- Se debe informar a la comunidad sobre esta actividad en la reunión de inicio, señalando la importancia de la participación del responsable o del propietario del predio.

- Antes de iniciar, el equipo social del Contratista establecerá contacto con el propietario, administrador o directiva de las construcciones. En el caso de infraestructura social (parques, paraderos, bienes de interés religioso o cultural) se debe realizar contacto con el director del Palacio de Justicia de Valledupar para informarle sobre el levantamiento del Acta de Vecindad en esa área.

- Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- El Consorcio Obras Judiciales recibe y resolver las quejas y reclamos que la comunidad o entidades puedan presentar por afectación a la infraestructura vecina a la obra.
- El Formato del Acta de Vecindad será el que se encuentra en el Anexo 8.3 de la guía para el Plan de Gestión Ambiental y Social.
- En el proyecto no se tiene proximidad con actividades agrícolas, por eso no se hará registro del estado de cultivos, pasto, cercas, fuentes de agua.
- El Consorcio Obras Judiciales entregara al propietario o responsable del predio, la copia física del Acta de Vecindad, dentro de los 15 días calendario, posterior a la fecha de la diligencia.
- El archivo magnético deberá estar almacenado en la oficina de Centro de Atención Ciudadana CAC, para ser consultado en el momento que sea necesario.

El Profesional Social al finalizar la obra, se llevarán a cabo las Actas de Vecindad de Cierre en las mismas construcciones y predios donde se levantó el Acta de Vecindad de Inicio; dicha acta consiste en la verificación final del estado físico en que quedaron, una vez terminadas las actividades constructivas y con la aceptación del dueño o responsable.

Manejo de las Quejas de Actas de Vecindad

Cuando en el CAC se reciba alguna queja por daños a la infraestructura, donde se adjudique dicho daño a las actividades constructivas, el Consorcio Obras Judiciales deberá tomar las siguientes acciones para atención a este evento:

- El Profesional Social del Consorcio Obras Judiciales deberá tomar nota en el formato de Atención al Ciudadano, diligenciando toda la información, en este caso de la queja por la posible afectación del predio.

- Se recomienda mantener una relación amable y diligente con el ciudadano que manifiesta una afectación.

- Se debe programar en el formato de Atención al Ciudadano una fecha y hora de visita, en un plazo no mayor a 24 horas, para determinar y cotejar la situación que expone el quejoso, frente a las condiciones en las cuales estaba el bien, previo al inicio de obra.

- Se deberá tener el acompañamiento de un garante como la Personería, lo cual se solicitará con el fin de ofrecer garantías al ciudadano.

- Habrá que establecer la responsabilidad de los daños provocados y el origen de los mismos, a fin de que no continúen tal secuela o en su defecto, aclarar que no corresponden a la ejecución del proyecto.

- Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada.

- En todos los casos de un proceso de restauración de las condiciones del predio deben quedar explícitas en el formato de Atención al Ciudadano, sobre el acuerdo en el cual firmen las partes y como mínimo indicando la siguiente información:

    - Fecha en que se instauró la queja en el CAC
    - Fecha en la que se hizo la diligencia de la visita para verificar el daño y sus causas
    - Registro fotográfico del espacio afectado
    - Concepto técnico del equipo profesional del Contratista
    - Registro fotográfico del archivo del acta de vecindad
    - Descripción del estado inicial, es decir, el que se encuentra en el acta de vecindad
    - Se debe señalar el tipo de arreglo que debe producirse: reparación, reposición o compensación. En cada caso debe explicarse la forma en que se cumplirá la acción.

Tendrá el seguimiento de las actividades programadas para la restauración, incluyendo:

- Registro fotográfico finalizado o cumplido el acuerdo

- Un recibido a satisfacción del ciudadano que formalizó la queja, firmada por el ciudadano

Fecha del cierre de la manifestación ciudadana

- Todo el proceso deberá ser informado a la Interventoría, quien podrá aportar su concepto y recomendaciones en la medida que lo considere pertinente.
- Cuando se presenten discrepancias entre la Interventoría y el Contratista sobre la responsabilidad en los daños presentados, se acudirá al Coordinador asignado por la DEAJUIF del Contrato de Obra o al funcionario que esta designe para dar solución a las diferencias presentadas.
- Si la DEAJ establece que la responsabilidad del daño es del Contratista, este deberá proceder a reparar los daños ocasionados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Las reparaciones por razones imputables al Contratista no serán objeto de pago por el Contrato. En el caso que el contratista no repare los daños dentro del plazo previsto, será considerado como un incumplimiento del contrato

Medidas de Manejo de Infraestructura de Servicios Públicos

Se deberán tener en cuenta las siguientes actividades previas y durante las actividades de obra, para evitar la afectación de los servicios públicos:

- Antes de las actividades de descapote y excavaciones se debe comprobar la existencia de redes de servicios públicos en el área a intervenir.
- Se debe establecer comunicación formal con las entidades dueñas de redes y activos, operadores o administradores.
- Las redes deben ser localizadas junto con el operador con un plano de catastro de red actualizado, para determinar su posición y especificaciones.
- Para cuando se deban intervenir redes de servicios públicos. se debe informar oportunamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio, de manera que no se presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda desarrollar por falta de alguna autorización.
- No se puede iniciar excavaciones para el retiro de redes hasta tanto no se cuente con los permisos respectivos.
- Cuando se esté interviniendo una red subterránea, se recomienda que se efectúe por tramos y sin que permanezca abierta la excavación por un tiempo mayor de 12 horas, por lo que para este tipo de trabajos debe programarse iniciar temprano en la mañana, para tener instalado y cubierto al finalizar la jornada.
- En caso de ser necesario cortes de los servicios públicos, se debe informar anticipadamente a la comunidad cuya cobertura será afectada y adicionalmente tener preparado el Plan de Contingencia, que hará parte del PGAS, en el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer el servicio interrumpido.
- En el CAC y en otros puntos del campamento, deberá permanecer publicados todos los números telefónicos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, en caso de cualquier emergencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultados	Análisis
Levantamiento actas de vecindad (predios, redes y activos de servicios públicos, infraestructura	No. de actas de vecindad diligenciadas / No. de actas de vecindad identificadas	Mensual	6 / 6	100%

Cierre actas de vecindad	No. de actas de vecindad cerradas / de actas de vecindad diligenciadas	Mensual	6 / 6	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Actas de vecindad

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).**	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Gestión de la Mano de Obra	4.4 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar el manejo de contratación de mano de obra donde se considera que es trascendental priorizar la mano de obra local e impedir la migración de trabajadores al Área de Influencia Directa – AID del proyecto; toda vez que el incremento de población foránea puede generar escenarios negativos

Generar ingresos en los habitantes y comunidad del AID del proyecto, mejoramiento de su calidad de vida, previniendo la migración de trabajadores foráneos y la gestación de conflictos con la comunidad establecida.

IMPACTOS POTENCIALES

Desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes o conflictos de aspecto socioeconómico y cultural.	Causar un impacto positivo general en la comunidad de influencia

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO / ACTIVIDADES EJECUTADAS

Medidas de manejo

El Contratista tendrá que contratar un porcentaje de personal no profesional para la obra y dentro de ese total se establece que mínimo el 50% deben pertenecer al AID del proyecto. La Interventoría tendrá la obligación de hacer el seguimiento sobre el cumplimiento de este requisito o el que se establezca en los documentos técnicos del Contrato, cuando así ocurra.

- El equipo mínimo de profesionales del Consorcio Obras Judiciales será personal de su confianza, por lo tanto, este personal podrá ser foráneo en la medida y autonomía administrativa que tiene el Consorcio, sin embargo, preferiblemente podrá optar por personal de la zona donde se realizar la obra.
- Todo el personal deberá ser aprobado por la Interventoría de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto.
- Se debe conformar una línea base del componente socioeconómico y cultural, la cual debe indicar la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales presentes en el área y a fin de conocer la disponibilidad

de mano de obra calificada y no calificada. Con esta información, el Contratista establecerá la mano de obra a contratar para el desarrollo de su obra.

- El Contratista podrá solicitar apoyo de entidades públicas de gestión de empleo como del SENA u otras como, las Cajas de Compensación Familiar de la región y la Unidad de Servicio Público de Empleo: http://serviciodeempleo.gov.co/
- A través de las Alcaldías apoyadas en las Juntas de Acción Comunal – JAC, podrá certificar la residencia en el AID, en algunos lugares conocido como "Certificado de Territorialidad".
- En los informes mensuales del Contratista a la Interventoría, presentará toda la información correspondiente, soportes y los indicadores de la mano de obra contratada.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Generación de empleado en el área de influencia directa AID	No. personal contratado y vinculado al proyecto No. profesional del AID / No. Personal contratado y vinculado no profesional	Mensual	5	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Contratación de personal
- Cumplimiento del indicador
- Informe Mensual

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

El periodo objeto de este informe no se presentaron incidentes que deban ser reportados.

NOMBRE Y APELLIDO: Mabely Toncel
ING. AMBIENTAL

LIBRO DE OBRA

Clima: mañana soleada, Tarde: Soleado.

Actividades Realizadas:

* Fundición losa piso 7, tramo A (14/C-F) en concreto de 4.000 psi.
* Armado de acero de refuerzo para losa piso 7, tramo B (14/A-C+)
* Descimbrado y re apuntalamiento de losa piso 6 tramo B (14/A-C+).
* Armado de encofrado para escalera E-3 en piso 4.
* Intalación de protección anticaídas en piso 4.
* Armado de acero de refuerzo para escalera E-1 en piso 2.
* Instalación de mampostería en bloque #5 en piso 2.
* Descargue de acero de refuerzo.
* Excavación mecánica para tanque potable y RCI.
* Reparaciones en sótano según indicaciones de informe patológico.

Jueves 01-08-2024

Personal administrativo en obra: 1 director de obra, 1 apoyo técnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo 1 vigilante, 1 operador de camión estacionario, 1 operador pluma grúa, 0 operador de torre grúa, 1 aparejador, 1 maestro de obra 5 ayudante - Inversiones alcavir: 1 arquitecto, 1 ingeniero 1 inspector SST, 15 oficiales, 13 ayudante - obras civiles LQ S.A.S: 1 maestro, 6 oficiales, 1 inspector SST, 4 ayudante Icopreces: 1 oficial, 3 ayudante - Sanchez Cross 2 oficiales, - ASISS S.A.S: 1 operador de maquina

Personal administrativo interventoría: El clima: mañana soleada

(El dia de ayer 31-07-2024 se observo que no se realizaron actividades de instalación de protección contra caidas de objetos, teniendo en cuenta que es necesario dicha instalación para no continuar incurriendo en mayores riesgos a los trabajadores y la comunidad en general

LAURA MILENA TORRES INTER SST

En las inspecciones que se han realizado durante la semana en las actividades de mampostería se han notado varias observaciones como: las juntas de 3/4", sin llenar al ninel, plomo, las cortes las están realizando con pulidora los cuales no permite realizar un buen corte en los mismos.

Observaciones:

* Los muros que han presentado fallas en los niveles han sido desarmados para ser corregidos, así mismo se mejoraron los procesos de corte para sacar las piezas adecuadas.

Actividades Realizadas:

* Retiro de encofrado proveniente de la desviación de las columnas para ubicación de acero tanque de abastecimiento y R.C.I.
* Reparaciones en sótano según el informe de patología.
* Encofrado de escalera E-1 en piso 2.
* Instalación de protección contra caídas en piso 4.
* Armado de acero para escalera E-3 en piso 4.
* Vaciado de concreto para losa piso 7.
* Tratado de niveles en losa piso 7 con cuadrilla topográfica.
* Armado de acero para columnas E-1, E-1, E-2 y E-3 en losa piso 7.
* Armado de acero para losa piso 7, tramo B (1-4 / A-C') y (1-4 / A-C').
* Replanteo de muros en piso 3.
* Instalación de contrahuella en losa piso 4.

Viernes 02-08-2024

Personal administrativo en obra: 1 Directora de obra, 1 apoyo técnico, 2 residente de obra, 1 residente de mes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante

1 Operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grúa, 1 operador de mini grúa, 1 albañil, 1 maestro de obra, 5 ayudante

Inversiones Albur: 1 arquitecta, 1 residente, 1 inspector SST, 15 oficiales, 13 ayudante - obras civiles LO: 1 maestro, 1 inspector SST, 6 oficiales, 4 ayudante - Ilcuper Cas: 1 oficial, 3 ayudante - Sánchez Grosel: 2 oficiales - Asies S.A.S: 1 operador de maquina - personal administrativo intervenitoría (2) clima: mañana soleada, Tarde: Lluviosa

Actividades Realizadas:

* Tensión columnas E-1, E-1, E-2 y E-3 en piso 7, en concreto de 5,000 psi.
* Inicia mampostería en bloque #5 en piso 3.
* Armado de acero de refuerzo de columnetas en piso 2.
* Instalación de malla electrosoldada para tramo B (1-4/A-C') en losa piso 7.
* Armado de pared de losa para piso 7 tramo B (1-4/A-C').
* Mampostería en piso 2 entre fachada y eje 1.
* Reparaciones en sótano según indicaciones de patología.
* Excavación mecánica para tanque RCI en abastecimiento.
* Armado de acero para columnas E-3, E-1 y muros M-7, M-8 y M-9 en placa de piso 7.
* Encofrado de escaleras E-1 en piso 2 y escalera E-3 en piso 4.
* Replanteo de muros en piso 3.

Continúa en libro de Obra II

06.08.2024 Visita técnica de verificación a procesos constructivos, recomendaciones de ejecución en obra para elementos estructurales y no estructurales.

- Se arma losa nivel de piso 7 ejes A, B, C x ejes 1, 2, 3. Se verifica muro con presencia en la base de hormipuco, el cual se viene reparando con sika top 122, monocomponente. Se solicita el apuntalamiento de la losa de nivel 5, a 6 con cerchas y parales, ya que se verifica en algunas zonas con solo parales.
- Se encuentra actividad de reparación de losa de sótano, donde ocurrió el evento de incendio, se recomienda dar acabado uniforme en las vigas y losa reparada.
- Actividad de mampostería confinada en bloque de perforación horizontal, con columnetas cada 1.5m. Se solicita que se verifique por el asesor estructural de obra la necesidad de complementar viga cinta en la parte superior del muro.
- Se recomienda anclar las dos varillas #3 del acero longitudinal de las columnetas.
- Se recomienda se coloque el 100% de la protección perimetral para control de caída de material. en zonas de ejecución de actividades de obra.
- Se recomienda aumentar fidyatación de las losas, al aumento de altura el viento sobre las placas causa un sonido rapido
- Se adelanta actividad de excavación del tanque de suministro

Ing. Yesid Muñoz C.
Supervisor técnico Independiente



Sabado 03-08-24

Personal operativo en obra: 1 Director de obra, 1 apoyo Tecnico 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 01 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grua 1 operador de torre grua, 1 aparejador, 1 maestro de obra 5 ayudante - Inversiones alquil: 1 arquitecto, 1 residente 1 inspector SST, 11 oficiales, 13 ayudante - Obras civiles C.Q: 1 maestro, 1 inspector SST, 6 oficiales, 4 ayudante Sanchez Cerezal: 2 oficiales - ASES S.A.S: 1 operador de maquina - Personal administrativo Interventoria (8)

Clima: mañana Soleado; tarde: Soleado.

-Actividades Realizadas:

* Excavacion mecanica de para tanque de abastecimiento y RCI.
* Armado de acero de refuerzo de columnetas en piso 2.
* Reparaciones en sótano, acorde a recomendaciones del patólogo.
* Mamposteria en bloque #5 en piso 3.
* Encofrado para escolera E-3 en piso 4.
* Fundición de losa piso 7 - tramo D (14/A-C).
* Encofrado de muros M-7, M-8 y M-9 en piso 7.
* Armado de acero de refuerzo para columnas D1 y D3 en piso 7.
* Desencofrado y curado de elementos verticales fundidos el 02-08-24.

Domingo 04-08-24

Personal operativo en obra: Inversiones ALQUIL, 1 Inspector SST 4 oficiales, 2 Ayudante - Clima: mañana soleado

Actividades Realizadas:

* Armado de encofrado horizontal para losa del piso 8, tramo A (1-4 / C-F).

Lunes 05/08/24

Personal operativo en obra: 1 Director de obra, 1 apoyo Técnico 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 Cortador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grúa, 1 operador de torre grúa, 1 oficial, 1 maestro de obra, 5 ayudante - Inversiones alqui: 1 ingeniero, 1 inspector SST 14 ayudante, 15 oficiales - Obras civiles L.Q: 1 maestro 1 inspector SST, 4 oficiales, 4 ayudante, clima: mañana Soleada; Tarde: Soleado.

Actividades Realizadas:

* Armado de acero de refuerzo para columnetas de confinamiento de la mampostería del piso 2. ——— " ——— " ———
* Mampostería en bloque de arcilla #5 en piso 3. ——— " ——— " ———
* Trazado de muros en piso 3. ———
* Instalación de protección perimetral contra caídas en piso 4 ——— " ———
* Encofrado de muros M-7, M-8 y M-9 en piso 7. ——— " ——— " ———
* Armado de acero de refuerzo para columna C-3 y muros M-4 y M-6 en piso 7.
* Armado de encofrado horizontal en para losa piso 8, tramo A (1-4 / C-F)
* Encofrado de escalera E-3 en piso 4.

Martes 06/08/24

Personal Operativo en obra: 1 Director de obra, 1 apoyo Técnico 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 Cortador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grúa, 1 operador torre grúa, 1 aparejador, 1 maestro de obra, 4 ayudante Inversiones alqui: 1 ingeniero, 1 inspector SST, 15 oficiales 14 ayudante - Civil topografía: 2 Topografo - Obras civiles L.Q: 1 maestro de obra, 1 inspector SST, 6 oficiales, 4 ayudante - personal administrativo intervenciones (3)

Clima: mañana Nublado; Tarde: Lluvias.

Actividades Realizadas:

* Descargue de acero de refuerzo para tanque abastecimiento y losa piso 8.
* Mampostería en piso 3 ———
* Armado de acero de refuerzo de columnetas en piso 2 ——— " ———
* Fundición de escalera E-1 en piso 2. y E-3 en piso 4, en concreto de 3000 psi, bombeable. ——— " ———
* Descimbrado y reapuntalamiento de tramo A losa piso 4. ——— " ———
* Armado de acero de refuerzo en muro M-4, M-5, M-6, M-1, M-2 y M-3 en losa piso 7. ——— " ——— " ———
* Fundición de muros M-7, M-8 y M-9; columnas E-3, D-1 y D-3 en concreto 5000 psi ——— " ——— " ———
* Encofrado horizontal para losa piso 8.
* Replanteo ejes en losa piso 7 con comisión topográfica. ——— "
* Anclaje de acero de refuerzo para columnetas en piso 2, anclado piso 1. ———

Miércoles 07/08/24

Personal Operativo en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente SST, 4 ayudante, 1 operador de torre grúa, 1 aparejador ——— inversiones alqui: 1 ingeniero, 1 inspector SST, 1 ayudante → oficiales - Clima: mañana soleada ———

Actividades Realizadas:

* Aseo general en sótano y semisótano.
* Instalación de protección horizontal contra caídas en piso 4. ——— "
* Descargue de acero de refuerzo para tanque RCI y de almacenamiento. ——— "
* Encofrado horizontal para losa piso 8 ———

* Desencofrado y curado de elementos verticales fundidos el 06-08-24.
* Armado de acero para losa de piso 8, tramo A (14/C-F).
* Desencofrado de escalera E-1 en piso 1 y escalera E-3 en piso 3.
* Descimbrado de losa piso 7, tramo A(14/C-F).

algún ingeniero RT.

Jueves 8/08/24

Personal administrativo y operativo: 1 Director de obra, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 Residente de redes, 1 residente SST 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grua, 1 operador torre grua, 1 operador, 1 maestro de obra, 5 ayudante Inversiones alaver: 1 ingeniero, 1 inspector SST, 14 ayudante, 15 oficiales – Obras civiles L.Q: 1 maestro de obra, 6 oficiales 4 ayudante, 1 inspector SST. – icapreces: 1 oficial, 4 ayudante Personal administrativo intervenitria (2) clima: mañana soleada Tarde: Soleada.

Actividades Realizadas:

* Encofrado de escalera E-3 en piso 5.
* Encofrado de muros M-4, M-5 y M-6 en piso 7.
* Apuntalamiento losa piso 7, tramo A(14/C-F).
* Ajuste de caseton para losa piso 8.
* Fundición de elementos para confinamiento de parapeto en piso 7.
* Mampostería en bloque #5 en piso 3.
* Fundido para losa piso 8, tramo A.
* En recorrido de obra se encontró acopio importante de acero en losa alrededor de pisa 1, se solicito reportar carga, evitar accidente con localizada, para evitar sobre cargas.

algún ingeniero RT.

Viernes 9/08/24

Personal administrativo y operativo: 1 Director de obra, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST

1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador pluma grua, 1 operador torre grua, 1 operador, 1 maestro de obra 5 ayudante – Inversiones alaver: 1 inspector SST, 13 ayudante, 15 oficiales – Obras civiles L.Q: 1 maestro de obra, 6 oficiales, 1 ayudante, 1 inspector SST – icapreces: 1 oficial, 5 ayudante – personal administrativo intervenitria (2) clima: mañana semi soleada, tarde: Soleada.

Actividades Realizadas:

* Armado de encofrado para losa Piso 8.
* Encofrado de muros M-4, M-5 y M-6 en piso 7.
* Descimbrado y reapuntalamiento de losa piso 7, tramo A(14/C-F).
* Ajuste de caseton para losa piso 8.
* Mampostería en bloque #5 para piso 3.
* Andajes con grapón y armado de acero de cañuelos para desplazamiento de muros en piso 2.
* Fundición de cilindros de confinamiento para muros de piso 2 en concreto de 13.000 psi.
* Instalación de protección contra caídas en piso 4.
* Encofrado de escalera E-1 en piso 3.

algún ingeniero RT.

Sabado 10/08/24

Personal administrativo y operativo: 1 Director de obra, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grua, 1 operador de torre grua, 1 operador, 1 maestro de obra, 5 ayudante – Inversiones alaver: 1 inspector SST 14 ayudante, 15 oficiales – icapreces: 1 oficial, 5 ayudante Obras civiles L.Q: 1 maestro de obra, 1 inspector SST

5 oficiales, 5 ayudante — personal administrativo
Intervenciones (1) clima: mañana soleado
Actividades Realizadas:
* Fundición de muros H-4, I-5 y H-6; columna C-3 en concreto de 5000psi.
* Armado de acero de refuerzo para losa piso 8, tramo A (1-4/D-F).
* Armado de encofrado horizontal para losa piso 8.
* Descimbrado y reapuntalamiento de losa piso 7, tramo A (1-4/D-F).
* Ajuste de casetón para losa piso 8.
* Tratado de muros en piso 4.
* Mamposteria en piso 3 y 4.
* Fundición de columnetas en piso 2 en concreto de 3000 psi.
* Andajes con epóxico y armado de acero de refuerzo de columnetas para muros en piso 2.
* Fundición de conexión a tapa eje 5-E en concreto de 5000psi.
* Encofrado de escalera E-3 en piso 5.

Domingo 11/08/2024
NO se laboro

Lunes 12/08/24
Personal administrativo y operativo: 1 Director de obra, 1 apoyo tecnico, 1 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante 1 operador de bomba, 1 operador torre grua, 1 operador pluma grua, 1 operador 1 maestro de obra, 5 ayudante
Inversiones Alcuri: 1 inspector SST, 13 oficiales, 14 ayudante
Obras civiles L.Q.: 1 maestro, 1 inspector SST, 2 oficiales 5 ayudante — Recursos: 1 operario, 7 ayudante
Personal administrativo intervenciones (1) clima: mañana

soleado; Tarde: Soleado
* Se realiza recorrido de obra en piso 2 encontrandose algunos columnetas con medio inferior a 15cm, probablemente durante vaciada se coreó formaleta, se solicita garantizar dimensiones minimas de columnetas. En piso 3 se encontró algunos trabes entre muros mal realizados, se solicitó a Ing. residente, desmontar bloques y construir trabes bloque a bloque, respetar juntas verticales. En piso 8 se parte 1 se revisó aceros de vigas principales, se solicitó a maestro de obra (quien hizo reapuntalamiento) instalar paneles laterales e informes para garantizar recubrimiento minimo. Para actividades de ingeniería se solicitó tomar muestras de concreto en columnetas, resultado de ensayos en bloque y caracterización de agregados, se solicita diseño de mezclas con un concreto que se fundan columnetas. 12 Ago 2024

Respuesta a Observaciones:
* Se rectifican columnetas aún sin fundir dimensiones para asegurar dimensiones mínimas, se corrigen aquellas que no cumplen.
* Se van a desmontar unidades para que el tabe coincida y dea funcional, en piso 3.
* Se instalan paneles para garantizar el recubrimiento en vigas.

Actividades Realizadas:
* Fundición de columnetas en concreto de 3000 psi en piso 2.
* Armado de acero de refuerzo para columnetas en piso 3.
* Descimbrado de losa piso 7, tramo A.
* Ajuste de casetón para losa piso 8
* Instalación de casetón en losa piso 8.
* Armado de acero para losa piso 8
* Armado de encofrado para losa piso 8.
* Retiro de material de excavación
* Armado de acero de refuerzo para escalera E-1 en piso 3.

*Armado de acero de refuerzo para escalera E-3 en piso 5. PI

MARTES 13/08/2024

Personal administrativo y operativo: 1 director de obra, 1 apoyo técnico, 2 Residente de obra, 1 Residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba, 1 operador de torre grúa, 1 operador de pluma grúa, 1 winchero, 1 maestro de obra, 5 ayudante — Inversiones olguin: 1 Inspector SST, 16 oficiales, 14 ayudante obras civiles L-6: 1 maestro, 1 Inspector SST, 6 oficiales, 5 — ayudante — ICM perú: 1 oficial, 7 ayudante — Santa Rosa del valle: 1 operador de maquina — Personal administrativo intervenciones (8) clima: mañana niebla baja

Tarde: Nublado.

Actividades Realizadas:

*Excavación mecánica para tanque de abastecimiento y RCI. "

*Fundición de columnetas de confinamiento en concreto de 3000 psi. "

*Manpostería en piso 2, segunda mitad.

*Anclajes con epóxico en piso 3 para columnetas de confinamiento. "

*Armado acero de refuerzo para columnetas en piso 3. "

*Descimbrado de losa piso 7, tramo A.

*Ajuste de cangilón para losa piso 8.

*Encofrado horizontal para losa piso 8.

*Fundición de losa piso 8 tramo A. (1-4 / D-F) en concreto de 4000 psi. "

*Armado de acero de refuerzo escaleras E-1 piso 2 y E-3 en piso 5. "

Rodrigo Alejandro Ospina PI

MIERCOLES 14/08/24

Personal administrativo y operativo: 1 Director de obra, 1 apoyo técnico, 2 residente de obra, 1 residente de obra, 1 Residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de torre grúa, 1 operador de pluma grúa, 1 operador 1 maestro de obra, 4 ayudante — Inversiones olguin: 1 Inspector SST, 14 ayudante, 16 oficiales — Obras civiles L-6 1 maestro, 1 Inspector SST, 6 oficiales, 5 ayudante — ICM perú 1 oficial, 3 ayudante — Santa Rosa: 1 operador de maquina Cootam: 1 topógrafo, 1 auxiliar — personal administrativo intervenciones (8) clima mañana: Soleado

*Se realiza recorrido en zona de eje F y cerca tanque RCI en compañía de residente de obra, se observa actividades de excavación con retroexcavadora y retiro de material con volquetas, el retiro de material se lleva a cabo entre eje F y cerca perimetral, se observa afectaciones en tapas de 3 registros electricos, en 2 de los cuales se conoce que va acometida de edificio existente, se solicitó la protección de la excavación, se cubrió tapas de los registros afectados para evitar fallos en el servicio del palacio de justicia, en zona de excavación se solicitó replanteo de cota de excavación, proteger taludes con geotextil para evitar erosión y protección con polistico para reducir el riesgo ante lluvia. 14 Ago 2024 10:50 am

Rodrigo Alejandro Ospina PI

Respuesta a Observaciones:

Se tomarán las respectivas medidas para no interferir o afectar la red eléctrica que alimenta el edificio existente. Además, luego de verificado en nivel del fondo de la excavación se inician las protecciones de las excavaciones con geotextil y plastico.

Rodrigo Alejandro Ospina

Actividades Realizadas:

*Replanteo de ejes con comisión topográfica sobre placa de piso 8, tramo A (1-4 / D-F)

*Encofrado horizontal de para losa de pozo P tramo B (1-4 / A-D)

*Encontrada y fundida de muros M-1, M-2 y M-3 en placa piso 7, en concreto de 5000psi

* Encofrado de losa y reapuntalamiento, piso 4.
* Ajuste de cabezales para piso 8.
* Armado de acero de refuerzo para escaleras E-3 en piso 5 y E-1 en piso 3.
* Fundición de columnetas en concreto de 8000 psi en piso 3.
* Mampostería en piso 2.
* Replanteo de muros en piso 4.
* Excavación mecánica en área para tanque abastecimiento y RCI.

13/08/24 Jueves

Personal administrativo y operativo: 1 Director de obra, 1 apoyo técnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de torre grúa, 1 operador pluma grúa, 1 aparejador, 1 maestro de obra, 5 ayudante — Inversiones Alquiler: 1 inspector SST 16 oficiales, 14 ayudante — Obras civiles L.Q: 1 maestro 1 inspector SST 7 oficiales, 5 ayudante — Deportes: 1 oficial, 3 ayudante — Santa Lucía: 1 operador de retroexcavadora Personal administrativo intervenitoría (x) clima: mañana Soleado, Tarde: Soleado.

Actividades Realizadas:

* Mampostería en piso 2.
* Fundición de columnetas en piso 3.
* Armado acero de refuerzo para columnetas en piso 3.
* Fundición de escalera E-1 en piso 3 y E-3 en piso 5,21 Mpa
* Armado de acero horizontal para piso 8.

* Armado de acero para columnas en piso 8.

Ing. Alejandro Gómez PT

Viernes 16/08/24

Personal administrativo y operativo: 1 Director de obra, 1 apoyo técnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de torre grúa, 1 operador pluma grúa, 1 aparejador, 1 maestro de obra, 5 ayudante — Inversiones alquiler: 1 inspector SST, 16 oficiales, 14 ayudante — Obras civiles L.Q: 1 maestro, 1 inspector SST, 8 oficiales 7 ayudante — personal administrativo intervenitoría & Clima: mañana Soleado, Tarde: Soleado.

Actividades Realizadas:

* Prueba de falso en tanque de abastecimiento para protección.
* Mampostería en bloque H5 en piso 4.
* Descargue de acero para elementos verticales en piso 8.
* Fundición de columnetas en concreto de 8.000 psi en muros de piso 3.
* Descimbrado losa piso 4 Tramo A y reapuntalamiento.
* Armado de acero para escalera E-1 piso 4 y E-3 piso 6.
* Armado de acero de refuerzo para losa piso 8, tramo B (1-4/A-B)
* Armado de acero de refuerzo para columnas E-1, E-3, F-1, F-2 y F-3; muros M-7, M-8 y M-9 en piso 8.
* Ajuste de cabezales para losa piso 8.

Ing. Alejandro Gómez PT

Sabado 17/08/24

Personal administrativo y operativo: 1 director de obra 1 apoyo técnico, 2 residente de obra, 1 residente redes

1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba, 1 operador pluma grúa, 1 operador torre grúa, 1 oficial, 1 ayudante — Inversiones Olfer: 1 inspector SST, 15 oficiales, 14 ayudante, OBRAS civiles L.Q: 1 maestro 1 inspectora SST, 8 oficiales, 7 ayudante — Ingenieros: 1 oficial, 3 ayudante — ASISS S.P.S: 1 operador de montacarga — Personal administrativo intervenciones & clima: mañana Soleado

Actividades Realizadas:

* Excavación mecánica para tanque.
* Fundición de columnetas en concreto de 3.000 psi en piso 3.
* Desencofrado y resanado de muro en losa piso 7.
* Ajuste de cafetón para losa piso 8
* Armado de acero para losa piso 8 tramo B (4-4/A-D).
* Armado acero de refuerzo para elementos verticales en piso 8.
* Descargue de acero para elementos verticales piso 8.

Domingo 18/08/24

No se laboró

Lunes 19/08/24

Personal administrativo y operativo: 1 residente SST, 1 almacenista, 4 ayudante, 1 operador torre grúa — Kelly Vargas: 1 oficial, 1 ayudante — Alquiler: 1 inspectora SST, 13 oficiales, 3 ayudante — clima: mañana soleado.

Actividades Realizadas:

* Armado de acero para losa piso 8 tramo B (1-4/A-D)
* Localización y protección de vanos

Martes 20/08/24

Reporte personal administrativo y operativo C.O.1

1 director, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador torre grúa, 1 operador pluma grúa, 1 aparejador, 1 maestro, 5 ayudante — Alquiler: 1 inspector SST, 15 oficiales, 14 ayudante — Obras civiles L.Q: 1 maestro, 1 inspectora SST, 8 oficiales, 5 ayudante — Personal administrativo intervenciones & clima: mañana, soleado; Tarde: Nublado.

Actividades Realizadas:

* Anclajes para columnetas en piso 2.
* Fundición columnetas en piso 3, concreto de 3.000 psi.
* Fundición de placa piso 8, tramo B (1-4/A-D) en concreto de 4.000 psi.
* Encofrado para escalera E-1 en piso 4 y E-3 en piso 6.
* Armado de acero para columnas E-1, E-3, F-1, F-2, F-3 y Muros M-7, M-8 y M-9 en piso 8
* Encofrado de columnas E-1, E-3, F-1, F-2 y F-3 en losa piso 8.

Miercoles 21/08/24

Reporte personal administrativo y operativo C.O.1: 1 Director 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de torre grúa, 1 operador pluma grúa, 1 aparejador 6 ayudante, 1 maestro — Alquiler: 1 inspector SST, 15 oficiales, 14 ayudante — Obras civiles L.Q: 1 maestro 1 inspectora SST, 11 oficiales, 6 ayudante — Geotecnia 1 topografo, 1 cadenero — Personal administrativo intervenciones & clima: mañana soleado; Tarde: Lluvia

Actividades Realizadas:

* Descargue de bloque arcilla #5 para piso 2-3. ——— " ———
* Descargue de concreto UG ———
* Anclajes con epóxico para varillas en columnetas en piso (2) (bajo losa) ———
* Fundición de columnetas en piso 3, en concreto de 3000 psi. ———
* Encofrado para escalera E-1 en piso 4 y escalera E-3 en piso 6.
* Trazado de ejes con comisión topográfica en losa piso 8. ———
* Encofrado de columnas E-1, E-3, F-1, F-2 y F-3 en piso 8. ——— "
* Armado de acero muro M-7, M-8 y M-9 en piso 8. ——— "
* Descimbrado y reapuntalamiento de losa piso 4 tramo B(1-4/A-D).

Jueves 22/08/24


Reporte personal administrativo y operativo C.O.: 1 Director, 1 apoyo Tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador Grúa estacionaria, 1 operador mini grúa, 1 operador pluma grúa, 1 operador, 1 maestro y ayudante — Alquiler: 1 inspector SST, 15 oficiales, 14 ayudante — Obras civiles L.Q: 1 maestro, 1 inspector SST, 10 oficiales, 1 ayudante — Ico perfiles: 1 oficial, 3 ayudante. Personal administrativo intervenciones: 8. Clima: mañana despejado; Tarde: Nublado.


Actividades Realizadas:

* Fundición de columnas D-1, E-3 y muro M-7, en concreto de 3.000 psi en piso 8. ——— "
* Encofrado horizontal para losa piso 9 -tramo A (1-4 / D-F)

* Descimbrado y reapuntalamiento de losa piso 4 tramo A(1-4/D-F).
* Adecuación de cadenas para losa piso 9. ——— "
* Mampostería bloque #5 en piso 2 y 4.
* Fundición de columnetas en concreto de 3.000 psi en piso 2 y 3.
* Armado de antepechos en piso 2. (fachada interna) ———
* Armado de acero de escalera E-1 en piso 4 y E-3 en piso 6. ———
* Armado de acero para muros M-1, M-2, M-3, M-4, M-5 y M6; columna C-3, en piso 8. ——— "

Vie 23/24 Detalle Muros Patio

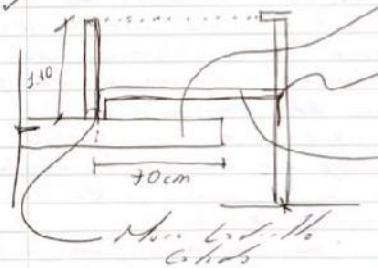

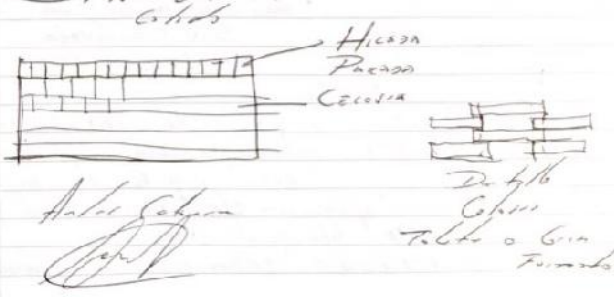

Viernes 23 de agosto/2024

Realizando recorrido de obra se evidencian sectores donde el tendido continúa interrumpido, y retiros en donde ahora se ven afectados por el incendio presentados en el sótano 2 hace algunos meses. Se requiere realizar la limpieza y retiro del material sobrante en sótano 2 para culminar las labores de instalación de los sistemas filtrantes. Con respecto a la continuidad del tendido a lo largo del eje V, se debe retirar el encamado y concreto que cayó a lo largo de este eje para buscar el tendido existente y empalmar el nuevo hasta la altura o cota especificada en los detalles del diseño. Se debe dar la indicación de que a esta altura no va a recoger agua del nivel freático, una que esté personas para recoger y dicen que que se infiltre en el relleno producto de la excavación superficial. Por otra parte se estuvo revisando el avance en la elaboración del balance de los tanques y equipos y se encontró que el equipo de bombeo que cotizó el contratista viene para un voltaje de 230V; el voltaje que fijado el proyecto es de 208V, por lo que deberá ajustar la cotización el proveedor de equipos.

Asesor Hidrosanitario
Interventoría

Instalaciones Eléctricas

Se adelanta recorrido de obra, en conjunto con el contratista de obra, el consultor de diseño y la interventoría. En el componente de instalaciones eléctricas, se inspeccionan las actividades de excavación en área asociada a los tanques de almacenamiento de agua potable y de agua de presión del sistema RCI, donde, se evidencian afectaciones sobre la canalización en tubería pvc, que aloja el alimentador eléctrico de la bomba RCI. Se le solicita al contratista de obra, verificar el estado de la infraestructura eléctrica, para que se adelante el respectivo reporte y que de todas maneras se garanticen las condiciones existentes antes de las intervenciones en obras civiles de excavación. También se contó con el acompañamiento del Dr. Carlos Echeverri, en su condición de Representante Legal del CSJ-Valledupar, con quien, se adelantó inspección del espacio asignado a la Subestación Eléctrica con transformador de 750KVA, ubicado en el sótano adjunto a S/E de 500KVA, en edificio del Palacio de Justicia de Valledupar. Se le explica al Dr. Echeverri, las precariedades técnicas de la actual S/E que no cumplen con normatividad eléctrica vigente.

Asesor Eléctrico
Interventoría
Ing. Nadia Vega

23 Agosto 2024

Visita técnica de obra.

Se verifica en obra actividades de armado de losa piso 1, mampostería piso 2 y 3, escaleras de nivel 6 a 7, antepechos en concreto fachada interior.

En mampostería se solicita verificar vigas de mampostería ya que presentan deficiencias y se precisan en la colocación en la configuración del muro.

En visita del consultor Arquitecto Andrés Cuesta

se deja muro de antepecho de protección sin acondicionado en muro de mampostería calado para permitir paso de aire de ventiladores, se solicita botalle de arriestramiento de torre grua, en la separación de sotano se finaliza, aunque se presenta zona con acabo estetico inadecuado.
Para antepechar en fachadas según sugerencia del Arquitecto Andres, el antepecho exterior se realizara en mamperlerin y el interior en concreto. se presenta deflexiones mayores a las de diseño en vigas piso 6, 7, 8, sin superar limites permitidos se solicita resultado de ensayos de ultrasonido de elementos de losa 6, que, no cumplieron con resistencia de concreto a 28 dias.

Ing. Yesid Ronar
Supervisor técnico independiente.

22/3/24 Teniendo en cuenta que ya no hay concreto a la vista los muros exteriores se pueden hacer en bloque de concreto hueco de 9 cm para dejar el acabado ingenieril

22/3/24 Igual. Las vigas de entrepiso serán pañetadas en concreto de 21 MPa

27/03/24 La maestra encargada para el recibimiento de pisos de el viernes como la mayoría sobre la general ya están listos

27/08/24 Las unidades ha quedado así: el xes primer piso 2 veces de ventana y para el cuarto de vigas el xes gabinetes ducha e inodoro con Hudes Douglas

Se recibió armado de escaleras E1 y E3; durante vaciado de escalera E1 concreto se endurece por demoras en el descargue del mismo dentro elemento escalera E1; se solicitó retiro de la mixer con concreto endurecido (placa mixer TSP 538) de recursion 119940 y celeridad en la actividad de vaciado, NO se debe agregar agua a la mezcla para darle manejabilidad, se pidió terminar y garantizar la fundida de las 2 escaleras, no se debe dejar juntas de construcción en este elemento. 4:40 pm 23 ag. 2024

Respuesta Observación:
Se retiró la mixer y se solicitó nuevo material a la concretera para terminar la actividad de la escalera E-1.

23/08/24 viernes
Reporte del personal administrativo y operativo: 1 director de obra, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contratista, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador bomba estacionaria, 1 operador torre grua, 1 operador pluma grua, 1 manejador

maestro de obra, 6 ayudante – BLOQUE: 1 inspector SST 16 oficiales, 14 ayudante, L.Q: 1 maestro, 1 inspector SST 9 oficiales, 8 ayudante – Hormigones: 1 oficial, 5 ayudante personal administrativo intervenciones: (8) clima: mañana soleado, tarde Nublada.

Actividades Realizadas:

* Fundición columnas C-3 y D-3 encofrado de 5000 psi en piso 8.
* Fundición de escaleras E-1 en piso 6 y E-3 en piso 6.
* Encofrado de losa para piso 9, tramo A (1-4/D-F).
* Desencofrado y reapuntalamiento losa piso 8.
* Mampostería en piso 2 y piso 4 en bloque #5.
* Fundición columnetas en piso 2 y piso dinteles.
* Encofrado antepecho en piso 2.
* Encofrado de vigas M-4, M-5 y M-6 en losa piso 8.
* Replanteo de ejes para losa piso 9.
* Se realiza recorrido en obra en compañía del consultor Andres Cabrera, director interventoría Oscar Caamaño, director obra Iván Corredor para socialización de dudas y aclaración de detalles.

Sábado 24/02/24

Reporte del personal administrativo y operativo: 1 director de obra, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grúa, 1 operador torre grúa, 1 oficinistas, 1 maestro de obra, 6 ayudante – BLOQUE: 1 inspector SST 16 oficiales, 14 ayudante, L.Q: 1 maestro, 1 inspector SST, 10 oficiales, 8 ayudante – Hormigones: 1 oficial, 3 ayudante – personal administrativo intervenciones (8) clima: mañana nublado.

Actividades Realizadas:

* Fundición de columnetas en concreto de 3000 psi en piso 2 (B-C).
* Fundición de muros M-4 y M-6 en concreto de 5000 psi en piso 8.
* Desencofrado y reapuntalamiento de losa piso 8 tramo A (1-4/D-F).
* Ajuste de acero para losa piso 9.
* Encofrado para escaleras E-2 en piso 7 y E-4 en piso 5.
* Mampostería en piso 2 y piso 4 en bloque #5.
* Fundición columnetas y dinteles en piso 2.

Domingo 25/02/24

No se labora

Lunes 26/02/24

Reporte del personal administrativo y operativo: 1 director de obras, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 contador, 1 almacenista, 1 residente administrativo 1 vigilante, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador de pluma grúa, 1 operador torre grúa, 1 operadores, 1 maestro de obra, 6 ayudante – BLOQUE: 1 ingeniero en 15 oficiales, 14 ayudante – Hormigones: 1 oficial, 1 ayudante obras civiles L.Q: 1 maestro, 1 inspector SST, 10 oficiales 8 ayudante – personal administrativo intervenciones 8 clima: mañana Nublado, Tarde: Nublado

Actividades Realizadas:

* Armado de encofrado, horizontal para losa piso 9. tramo B (1-4/A-D)
* Armado de acero para losa piso 9 tramo A (1-4/D-F)
* Encofrado de vigas M-2, M-3 y M-5 en piso 8

* Ajuste de cabezón para losa piso 9.
* Descimbrado y reapuntalamiento losa piso 8. "
* Armado de acero escalera E-1 piso 5 y E-3 piso 7. "
* Fundición de columnetas en concreto de 3.000 psi en piso 4.
* Mampostería en piso 2 y 4, bloque #5 "
* Encofrado para antepecho en piso 2. "
* Empalado de terreno en zona de tanque de abastecimiento.

Martes 27/8/24

Reporte personal administrativo y operativo C.U.J: 1 director, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 1 residente SST, 1 controller, 1 almacenista, 1 residente administrativo, 1 vigilante, 1 operador de bomba, 1 operador de planta grúa, 1 operador torre grúa, 1 aparejador, 1 maestro, 6 ayudante — ALQUI: 1 ingeniero, 16 oficiales 14 ayudante — obras civils L.A: 1 maestro, 1 SST, 10 oficiales, 8 ayudante — ICOPACOS: 1 oficial, 3 ayudante personal administrativo interventoría 01 clima: mañana soleado; Tarde:

* En regreso de obra entrada tanque se observa personal (4) retirando material de fondo, replanteando, pasando niveles; aún persiste sobreexcavación en profundidad, se solicitó a contratista entregar procedimiento para relleno y garantizar niveles de diseño; en obra Ing Gustavo Daza y Director de obra confirman que harán ajuste a las dimensiones del tanque por restricciones por muros de contención existentes, razón por la cual se solicita al contratista entregar a Interventoría planos con ajustes y nuevo diseño estructural diversión por parte del diseñador debido a que al aumentar la altura del tanque el ref vertical probablemente

cambiará al aumentar el momento de diseño; se solicita celeridad en la entrega de estos ajustes a la Interventoría para su aprobación. 10:30 am 27 Ago 2024

R/a/ Luego de limpiar el área total a donde se realizará el tanque se procederá a replantear y producto de esto se le informará al diseñador estructural para su redimensionamiento del tanque.

Actividades Realizadas:

Tanque

* Perfilación de fondo para replanteo de la estructura

Torre

* Armado de acero para losa piso 7 tramo A (1-4 / D-F) "
* Encofrado horizontal para losa piso 9 tramo B (1-4 / A-D) "
* Encofrado para muros M-1, M-2, M-3 y M-5 en piso 8. "
* Fundición de muros M-2 y M-3 y M-5 en concreto de 5000 psi en piso 8. " "
* Descimbrado y reapuntalamiento de losa piso 8 tramo A "
* Ajuste cabezón para losa piso 9.
* Fundición de columnetas en concreto de 3.000 psi en piso 4 "
* Armado de muros con bloque #5 en pisos 2 y 3. "
* Encofrado para antepecho en piso 2.

Miercoles 28/8/24

Reporte del personal administrativo y operativo C.U.1 : 1 Director, 2 residente de obra, 1 residente de redes. 1 residente SST, 1 almacenista, 1 controller, 1 vigilante, 1 residente administrativo, 1 operador de bomba estacionaria 1 operador de pluma grúa, 1 operador de torre grúa 1 aparejador. 1 maestro de obra, 6 ayudante — Alquiler 1 ingeniero, 16 oficiales, 13 ayudante — Obras civiles L.Q 1 maestro, 1 inspector SST, 11 oficiales, 8 ayudante — Ice porcas : 1 oficial, 3 ayudante — personal administrativo intervenidos 8 — clima: mañana nublado tarde: Soleado.

Actividades Realizadas:

* Instalación de caseton en losa piso 9, tramo A (1-4/D-F)
* Armado de acero de refuerzo para losa piso 9, tramo A (1-4/D-F)
* Armado de encofrado horizontal para losa piso 9, tramo B (1-4/A-D)
* Encofrado muro M-1 eje 8.
* Desencofrado y reapuntalamiento de losa piso 8.
* Ajuste de caseton para losa piso 9.
* Fundición de columnetas en concreto de 3000 psi, en piso 2 y 3.
* Armado de muros en mampostería con bloque #5 en piso 2 y 3.
* Fundición de antepecho de concreto de 3000 psi en piso 2.
* Fundición de solado de limpieza en zona de tanque.
* Fundición muro M-1 en concreto de 3.000 psi en piso 8.

Jueves 29/8/24

Reporte del personal administrativo y operativo C.U.1 : 1 Director de obra, 1 apoyo tecnico, 1 residente de redes 1 residente SST, 1 almacenista, 1 controller, 1 vigilante 1 residente administrativo, 1 operador de bomba estacionaria 1 operador de pluma grúa, 1 operador torre grúa, 1 aparejador 1 maestro de obra, 8 ayudante — Alquiler : 1 ingeniero 1 inspector SST, 15 oficiales, 17 ayudante — Obras civiles L.Q : 1 maestro, 10 oficiales, 5 ayudante, 1 inspector SST — Ice porcas : 1 oficial, 3 ayudante — Alquiler : 1 operador de maquina — personal administrativo intervenidos (8) mañana : soleada; tarde: Soleado.

Actividades Realizadas:

* Armado de acero de refuerzo para losa piso 9, tramo A (1-4/D-F)
* Encofrado horizontal para losa piso 9, tramo B (1-4/A-D).
* Desencofrado y reapuntalamiento de losa piso 8, tramo B (1-4/A-D)
* Ajuste de caseton para losa piso 9
* Instalación de caseton para losa piso 9, tramo A (1-4/D-F).
* Muros en mampostería bloque #5 en pisos 2, 3, 4.
* Fundición de columnetas en concreto de 3.000 psi en piso 2, 3 y 4.
* Nivelación de sótano con material cargadores, para replanteo de redes.
* Retiro de tanque abastecimiento.
* Armado de acero de refuerzo para ordinarias en piso 2.
* Suburación de concreto ciclopeo 60-40 para estabilización de excavación en zona de tanque.

Viernes 30/8/24

Reporte personal administrativo y operativo O.C.J : 1 director de obra, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 2 residente SST, 1 almacenero, 1 contador, 1 vigilante, 1 residente administrativo, 1 operador de bomba estacionaria, 1 operador torre grua 1 operador pluma grua, 1 operegador, 1 maestro, 6 ayudante — AQUA : 1 ingeniero, 1 inspector SST, 14 oficiales, 15 ayudante — Obras civiles L.Q : 1 maestro 1 inspector SST, oficiales 11, 8 ayudante — Serpucos 1 oficial, 5 ayudante — Navamo : 1 operador de maquinaria — personal administrativo intervenidos. clima : mañana : soleado, tarde: Nublado.

Actividades Realizadas.

* Fundición de losa piso 9, tramo A (1-4/D-F), en concreto de 4000 psi.
* Descimbrado y reapuntalamiento de losa, piso 8, tramo B (1-4/A-D)
* Adecuación de caseton para losa piso 9.
* Fundición columnas en piso 2, 3 y 4, en concreto de 3000 psi.
* Armado de muros en bloque #5 en piso 2, 3 y 4.
* Armado de acero de refuerzo para jardineras en piso 9.
* Retiro de material de excavación con mini cargador de Estero.
* Fundición de subestructura en concreto ciclopeo 60-40, en zona de tanque.

Sábado 31/8/24

Reporte personal administrativo y operativo C.O.J : 1 director de obra, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 1 residente de redes, 2 residente SST, 1 almacenero, 1 contador, 1 vigilante

1 residente administrativo, 1 operador de torre grua, 1 operador de pluma grua, 1 operegador, 1 operador de bomba estacionaria, 1 maestro de obra, 6 ayudante — AQUA : 1 ingeniero, 1 inspector SST, 14 oficiales, 15 ayudante — Obras civiles L.Q : 1 maestro, 1 inspector SST, 11 oficiales, 8 ayudante — Serpucos : 1 oficial 5 ayudante — Navamo : 1 operador de maquinaria personal interventor [8] clima : mañana soleado, Tarde: Nublado.

Actividades Realizadas:

* Armado de acero de refuerzo para columnas F-1, F-2 y F3 en piso 9.
* Armado de encofrado horizontal para losa piso 9, tramo B.
* Descimbrado y reapuntalamiento de losa piso 8.
* Adecuación de caseton para losa piso 9.
* Armado de muros en bloquetto en piso 2, 3 y 4.
* Fundición de columnetas en piso 2 y 3, en concreto de 3000psi.
* Retiro de material de excavación proveniente del sistema.
* Fundición de subestructura en zona de tanque.

Domingo 1/09/24

No se realizo labores.

Lunes 2/09/24

Reporte personal administrativo y operativo O.C.J : 1 director de obra, 1 apoyo tecnico, 2 residente de obra, 2 residente SST, 1 almacenero, 1 contador, 1 vigilante 1 residente administrativo, 1 operador de bomba estacionaria

CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 1 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ- VALLEDUPAR-323/22-OFC- 856

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: DISEÑO DE MEZCLA CONCRETO 5000 psi LASS COMERCIALIZADORA S.A.S.

Buenos días,

La presente con el fin de compartir diseño de laboratorio solicitado en **OFICIO No. CSJ-377-2024**.

Se anexa COPIA de ello.

Atentamente,

Ing. Iván Salvador Carpentier Ospino.
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Elaboró LDS

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 02 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-857

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. PLAN DE CONTINGENCIA ACTUALIZADO

Cordial Saludo;

El Consorcio Obras Judiciales, atendiendo sus obligaciones y cumpliendo los compromisos adquiridos en el comité de obra No 79 del 26 de julio del presente años, se permite remitir el plan de acción para recuperar el atraso presentado en obra.

Quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

2-08-2024

ING IVAN CARPENTIER
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

Anexo: 2024.08.02 PLAN DE CONTINGENCIA V2

CV

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 02 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 858

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO CERTIFICADO DE ALTURA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES ESTRUCTURA LQ S.A.S

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar las certificaciones de altura de los trabajadores subcontratista obras civiles y estructura S.A.S **resolución 4227 de 2021**.

- Alvaro Javier Jimenez Ortiz
- Jhon Moya Gamboa
- Richard Palacio Ayala
- Mario Perez Mercado

Cordialmente,

2-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 05 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 859

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO INFORME SST CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Cordial saludo,

Mediante la presente envio informe SST – mes de julio 2024 con los anexos correspondiente.

Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos.
Anexo 2 Certificado de competencia.
Anexo 3 Inducción, evaluación de inducción, notificación de riesgo.
Anexo 4 Notificación de Riesgos visitantes.
Anexo 5 Inspecciones de emergencias.
Anexo 6 Preoperacionales.
Anexo 7 ATS –Permisos.
Anexo 8 Asistencia Charla SST.
Anexo 9 Acta reunión COPASST
Anexo 10 Planilla de seguridad Social
Anexo 11 Entrega de EPP.
Anexo 12 Inspección de pre-uso equipos de alturas
Anexo 13 Observación para la Prevención de Incidente y Accidente
Anexo 14 Indicadores HHT
Anexo 15 Base de dato del personal
Anexo 16 Investigació de accidente laboral

Powered by CamScanner

Cordialmente,

5-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 05 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 860

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO INFORME AMBIENTAL CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024

Cordial saludo,

Mediante la presente envio ambiental – mes de julio 2024 con los anexos correspondiente.

Anexo 1 Acta De Reunión Ambiental
Anexo 2 Charlas Ambientales
Anexo 3 Carpeta Plan De Capacitaciones
Anexo 4 Permisos Tala De Arbol
Anexo 5 Permisos De Agregados
Anexo 6 Permisos De Disposición Final RCD
Anexo 7 Prefabricado - Certificado De Calidad
Anexo 8 Socialización Inicio De Proyecto
Anexo 19 Inspección Properacional
Anexo 10 Inspección Ambiental
Anexo 11 Consumo De Agua
Anexo 12 Constancia No Retiro De RCD -Julio

Powered by CamScanner

Cordialmente,

5-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 05 de agosto de 2024

Señor :
MURICIO MORA
CYS SEGUROS
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-861

REF CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)
ASUNTO Respuesta de solicitud de reconsideración afectación Póliza: CBC-100009016

Respetado señor

Atentamente reenvío el oficio de respuesta de SEGUROS MUNDIAL a la solicitud hecha por el CONSORCIO OBRAS JUDICIALES de reconsideración de afectación de la póliza del asunto en **contr**a de **KELLY J VARGAS FABRICA DE CASETONES SAS**

Sin otro particular

Cordialmente,

GUSTAVO DURAN
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de obra

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 05 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
ATN. ING NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
Representante legal
Interventoría
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-862

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO. DOCUMENTACIÓN PARA PAGO DEL ACTA DE CORTE DE OBRA No.12.

Cordial saludo,

Por medio de la presente enviamos muy respetuosamente a ustedes los documentos requeridos para el pago del acta de corte de obra No.12 y los cuales se relacionan a continuación:

1. Acta de corte de obra No.12.
2. Memorias de cálculo corte de obra No. 12.
3. Balance financiero del contrato.
4. Factura proforma
5. Rut.
6. Certificación bancaria.
7. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales.
8. Documentos del contador.
9. Certificado de consignación de los rendimientos financieros.
10. Control de almacén corte de obra No.12.

Cordialmente,

5-08-2024

Ing. Ivan Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 6 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ- VALLEDUPAR-323/22-OFC- 863

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO

Buenos días,

La presente con el fin de compartir resultados de ensayos

Se anexa COPIA de ello.

Atentamente,

6-08-2024

Ing. Iván Salvador Carpentier Ospino.
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Elaboró LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 06 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 864

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q S.A.S

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar enviar la planilla de seguridad social correspondiente del mes de julio – agosto del presente año. Subcontratista obras civiles y estructuras L.Q S.A.S.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

6-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 08 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 865

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA ICOPORCES.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar la planilla de seguridad social del subcontratista Icoporces correspondiente mes de agosto.

Cordialmente,

8-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 08 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 866

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A OBRA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ S.A.S

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a obra trabajadores del Subcontratista Obra civil y estructura LQ S.A.S

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
EMIL JOSE OCHOA BOLAÑO AYUDANTE	11064707336	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTURA

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

8-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 08 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 867

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA SEGURITY FORCE

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar la planilla de seguridad social del subcontratista Segurity Force correspondiente mes de agosto.

Cordialmente,

8-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 08 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 868

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL SUBCONTRATISTA INVERSIONES ALQUIR.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar la planilla de seguridad social del subcontratista Inversiones Alquir correspondiente mes de agosto.

Cordialmente,

8-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 09 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 870

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR SUBCONTRATISTA SANTA LUCIA DEL VALLE S.A.S

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a obra trabajador del Subcontratista Santa Lucia del Valle S.A.S

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
CARMELO ENRIQUE LÓPEZ OROZCO OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	1085227719	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Nota: Anexo documento de la máquina.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

9-8-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 09 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-871

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. INFORME MENSUAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA V/PAR MES DE JULIO DE 2024

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito enviar enlace virtual donde está contenido el informe mensual de obra Palacio de Justicia V/par. correspondiente al mes de julio de 2024 con sus respectivos anexos.

https://we.tl/t-w0IMTmXgnE

Quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

9-8-2024

ING IVAN CARPENTIERE
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

CV

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 09 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 872

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR SUBCONTRATISTA ICOPORCES.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajador del Subcontratista Icoporces.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
RAFEL ARTURO MEYER AYUDANTE	1066873978	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTURA, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

9-8-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 09 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 874

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA MAQUINARIA MINICARGADOR.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra Maquinaria Minicargador.

- Declaración de importación.
- Plan de mantenimiento.
- Registro de mantenimiento.
- Tarjeta de registro.

Nota: El operador de este equipo es el señor Gustavo Andres Alvear, los documentos fueron radicados.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

9 - 8. 2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 10 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-875

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. INFORME SEMANAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA V/PAR 77 AL 83

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito remitir informe semanal correspondiente a la semana 77 a la 83.

Quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

10-08-2024

ING IVAN CARPENTIERE
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

CV

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 10 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 876

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR SUBCONTRATISTA ICOPORCES.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajador del Subcontratista Icoporces.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
JEAN CARLOS CORDOBA MOLINA AYUDANTE	1003230723	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTURA.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

10-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 10 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ- VALLEDUPAR-323/22-OFC- 877

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO

Buenos días,

La presente con el fin de compartir resultados de ensayos

Se anexa COPIA de ello.

Atentamente,

10-08-2024

Ing. Iván Salvador Carpentier Ospino.
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Elaboró LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 13 de agosto de 2024

Señores:
INVERSIONES ALQUIR
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 878

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: NO CONFORMIDAD POR FALTA DE ORDEN Y LIMPIEZA.

Cordial saludo,

Se observa con preocupación la falta de orden y limpieza en las diferentes áreas, esto puede conllevar a un incidente o accidente de trabajo.

El subcontratista debe de garantizar el orden y la limpieza de los frentes de trabajo, no se trata de una cuestión de estética, si no de un factor clave que puede incluir en la productividad; la eficacia, calidad, reducción de riesgos y el bienestar de los trabajadores.

Los invitamos a establecer rutina diaria de orden y limpieza en los frentes de trabajo antes de culminar la jornada laboral.

Powered by CamScanner

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

15-08-2024

Ing. Iván Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 13 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 879

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. MEDIDAS Y CAMBIO NECESARIOS PARA LOGRAR MANEOBRA SEGURA EN EL IZAJE DE CARGA


Cordial saludo,

Informamos a ustedes que a la fecha hemos tenidos tres incidentes en los cuales se han afectado los vidrios del edificio antiguo del PALACIO DE JUSTICIA del ala oriental durante el Izaje de las barras de acero de refuerzo de las placas de los pisos 8 y 9, que tenemos distribuido en el piso uno en lo que será la futura plazoleta.

Lo anterior se viene presentado desde que se instaló la protección perimetral, en el eje 4 de la nueva torre y entre los ejes E y F, que es la zona por donde se viene realizando esta actividad, teniendo en cuenta la falta de espacio que se tiene en el proyecto para el almacenamiento y trasiego del material.

Por lo anterior, solicitamos a ustedes prescindir de la protección perimetral instalada en el tramo señalado y convenir entre las partes otro tipo de protección que nos permita hacer el Izaje del acero alejándonos del eje E acercándonos al eje F para finalmente elevar la carga desde el antiguo espacio de almacenamiento de acero adyacente al eje F.

Ver esquema anexo

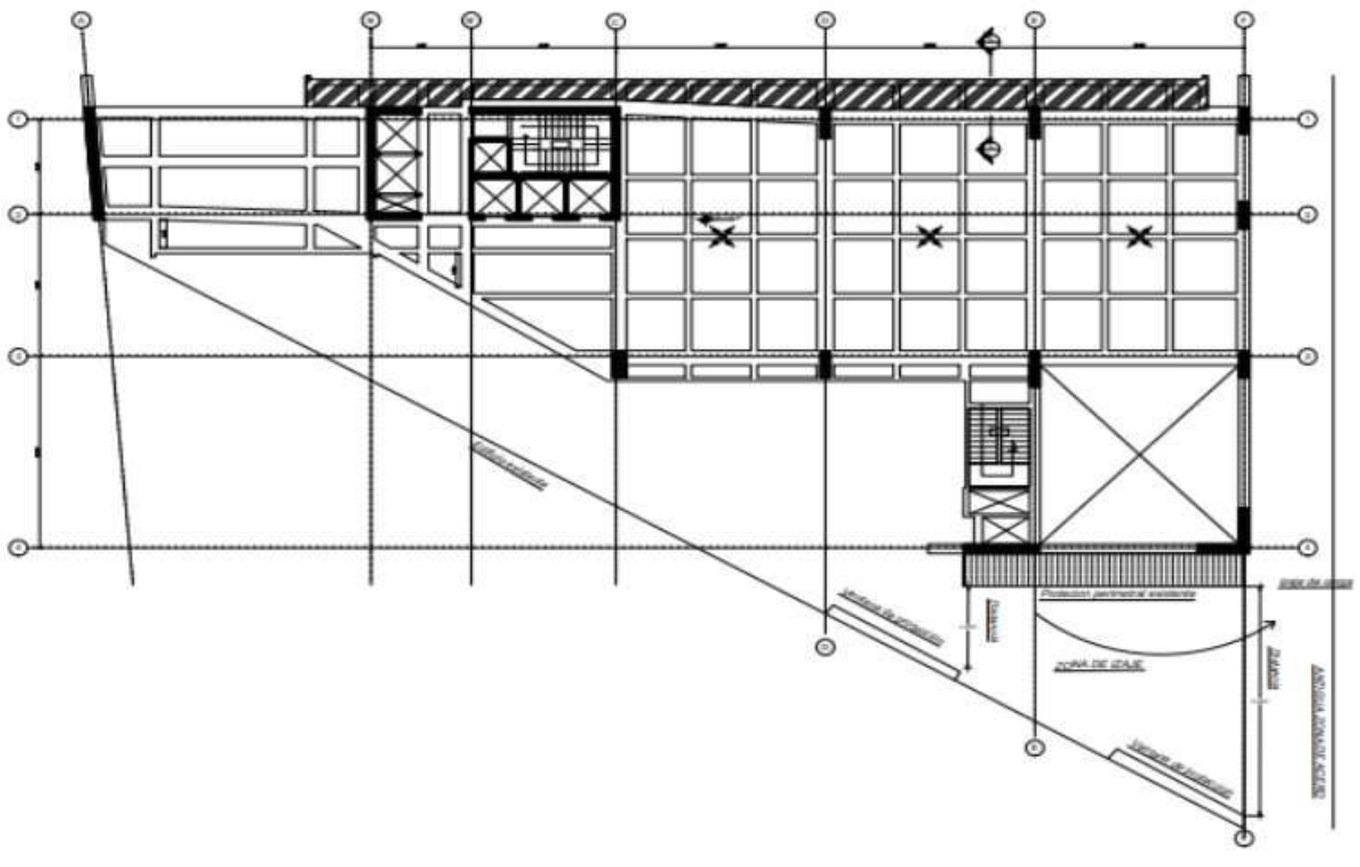

Powered by CamScanner

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

15-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 14 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 880

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar la planilla de seguridad social contratista Consorcio Obras Judiciales correspondiente mes de agosto.

Cordialmente,

14-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 14 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 881

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajadores del Subcontratista Obra Civiles y estructura LQ.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
HIDELFONSO BAENA DIAZ OFICIAL	5022817	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTURA.
OSCAR DARIO RODRIGUEZ ESCOBAR OFICIAL	12686410	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTURA.
RONALD TOBIA CANTILLO OFICIO VARIO	1007457012	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTURA, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

14-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 14 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 883

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajadores del Subcontratista Obra Civiles y estructura LQ.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
LUS ALFONSO CRUZ VALERO	80357968	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTURA.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

15 - AGOSTO - 2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 16 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-884

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. RESPUESTA A: OFICIO No. CSJ-394-2024 Fisuras en elementos estructurales."

Cordial saludo;

El consorcio Obras judiciales con el fin de cumplir con su recomendaciones preventivas en la viga 312 ubicada en eje 3 entre ejes E y F, se apuntalo la viga donde se encontró fisura VERTICAL de ancho variable y analizaremos con el asesor estructural para ver que sugiere y compartirlo con ustedes para su aprobación al igual que en muro M1 en nivel de piso 4 se hará seguimiento y se analizara con nuestro asesor estructural.

Anexo evidencia,

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8





agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

16-08-2024

ING IVAN CARPENTIER
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 16 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 885

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES SUBCONTRATISTA KELLY VARGAS FABRICA DE CASETÓN S.A.S.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajadores del Subcontratista Kelly Vargas Fabrica de casetón S.A.S.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
JHON FREDY FERNANDEZ MERCADO AYUDANTE	1038817124	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP
NICOLAS JAVIER GAITAN VARGAS AYUDANTE	1028400810	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP
WILLAM ALEXANDER VARGAS RICO AYUDANTE	1032375134	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

16-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 17 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-886

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO: REPUESTA A OFICIO CSJ 391-2024 DAÑOS DE VENTANERIA AL EDIFICIO EXISTENTE POR IZAJE DE CARGA

Cordial Saludo,

La presente con el fin de enviar los documentos solicitados del oficio **CSJ 391-2024.**

- Investigación del evento 12/08/2024
- Lección aprendida
- Plan de acción
- Plan de izaje y esquema de izaje
- Matriz de peligro y valoración de riesgo

Sin otra particular, cordialmente.

14 08 2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 20 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-887

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. INFORME SEMANAL DE OBRA PALACIO DE JUSTICIA V/PAR 84

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito remitir informe semanal correspondiente a la semana 84.

Quedamos atentos a sus inquietudes.

Cordialmente,

20-08-2024
ING IVAN CARPENTIER
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

CV

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 20 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 888

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajador del Contratista Consorcio Obras Judiciales.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
NESTOR JOSE GUERRA AYUDANTE	1119816611	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

20-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 20 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 889

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES DEL SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ S.A.S

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajadores del Subcontratista Obras Civiles y Estructura LQ S.A.S

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
WILLAM JAVIER ROBLES ROMERO OFICIAL DE OBRA	1067034794	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, ALTURA
ANDERSON BUZON DIAZ OFICIAL DE OBRA	1063965063	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, ALTURA
YEILDER RAFAEL CELIN AREVALO AUXILIAR	1065664301	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, ALTURA
CARLOS ANTONIO ARDILA RUIZ OFICIAL DE OBRA	9116362	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, ALTURA

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente
20-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 21 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 880

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL SUBCONTRATISTA GEOTERRA TOPOGRAFÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar enviar la planilla de seguridad social correspondiente del mes de julio – agosto del presente año. Subcontratista Geoterra Topografía y Obras Civiles S.A.S.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

21-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 21 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-891

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. CERTIFICADO DE ESTACION GEOMAX

Cordial saludo;

Anexo evidencia,

Cordialmente,

21-08-2024

ING IVAN CARPENTIER
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 21 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ- VALLEDUPAR-323/22-OFC- 892

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO

Buenos días,

La presente con el fin de compartir resultados de ensayos

Se anexa COPIA de ello.

Atentamente,

21-08-2024

Ing. Iván Salvador Carpentier Ospino.
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 22 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 893

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO FICHA TECNICA DE LA MAQUINA CORTADORA DE LABRILLO.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar la Ficha Técnica de la Maquina Cortadora de Bloque.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

22/08/2024

Ing. Ivan Salvador Carrentier Osrina
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 23 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ- VALLEDUPAR-323/22-OFC- 894

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: PUNTALES PARA RIGIDIZAR EL CUERPO DE LA TORRE GRÚA NUEVA TORRE PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR.

La presente con el fin de compartir Anexo al oficio 0F-50-22-08-2024 de nuestro asesor estructural Atenógenes Beleño Pérez, detalles para rigidizar Torre Grúa

Se anexa archivo.

Atentamente,

23-08-2024

Ing. Iván Salvador Carpentier Ospino.
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Elaboró iC

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 23 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 895

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. REPUESTAS Y GENERALIDADES SOBRE INQUIETUDES MANIFESTADAS EN COMITÉ 23/08/2024.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar repuesta y generalidades sobre inquietudes manifestadas en comité 23/08/2024 Aspectos ambientales y SST.

Sin otra particular.

Cordialmente,

23-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 24 de Agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
ATN. ING NESTOR CAMILO ARTUNDUAGA AVILA
Representante legal
Interventoría
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-896

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO. SOLICITUD DE LA REPROGRAMACIÓN No.3 DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

Cordial saludo,

En relación con los giros que se han efectuado desde los recursos disponibles para el contrato de la referencia, los cuales provienen del anticipo de este, me permito solicitar muy amablemente a ustedes se evalué la posibilidad de ajustar la actual programación del plan de inversión del anticipo que estamos manejando, esto con el fin de atender las necesidades que se adelantan el proyecto.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

PROGRAMACIÓN INICIAL		FECHA	4 de julio de 2024
REPROGRAMACIÓN	**X**		
CONTRATO DE OBRA No.		323 de 2022	
OBJETO DEL CONTARTO		REALIZAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	
VALOR DEL CONTRATO		$	49.420.292.192,00
CONTRATISTA		CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	**20%**	$	9.884.058.438,40

DATOS ESPECIFICOS

ITEM	Descripción	Valor	Porcentaje
1	**Compra de equipos especiales**	**$ 3.116.196.443,00**	**32%**
1.1	Equipos Hidrosanitarios y concreto	$ 768.133.275,00	
1.2	Equipos electricos y concreto	$ 878.832.980,00	
1.3	Equipos de transporte vertical y acero	$ 1.469.230.188,00	
2	**Compra de materiales**	**$ 6.767.901.995,40**	**68%**
2.1	Acero	$ 4.000.020.447,50	
2.2	Concreto	$ 2.267.881.547,90	
2.3	Otros materiales	$ 500.000.000,00	
TOTAL		**$ 9.884.098.438,40**	**100%**

Tabla 1. Estado actual del plan de inversión del anticipo.

Teniendo en cuenta los giros que se han efectuado y los saldos disponibles a la fecha para cada uno de los rubros en la plataforma de la fiducia, presentamos a ustedes la nueva propuesta para la reprogramación del actual plan de inversión de anticipo, esta se realiza reasignando los saldos disponibles en los rubros establecidos de la siguiente manera:

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			
PROGRAMACIÓN INICIAL		FECHA	24 de agosto de 2024
REPROGRAMACIÓN	**X**		
CONTRATO DE OBRA No.		323 de 2022	
OBJETO DEL CONTARTO		REALIZAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	
VALOR DEL CONTRATO		$	49.420.292.192,00
CONTRATISTA		CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	
PORCENTAJE DEL ANTICIPO	**20%**	$	9.884.058.438,40

DATOS ESPECIFICOS				
ITEM	**Descripción**	**Valor**		**Porcentaje**
1	**Compra de equipos especiales**	**$**	**2.250.000.000,00**	**23%**
1.1	Equipos Hidrosanitarios y concreto	$	500.000.000,00	
1.2	Equipos electricos y concreto	$	550.000.000,00	
1.3	Equipos de transporte vertical y acero	$	1.200.000.000,00	
2	**Compra de materiales**	**$**	**7.634.098.438,40**	**77%**
2.1	Acero	$	4.000.020.447,50	
2.2	Concreto	$	2.596.714.527,90	
2.3	Otros materiales	$	1.037.363.463,00	
TOTAL		**$**	**9.884.098.438,40**	**100%**

Tabla 2. Reprogramación No.3 Plan de inversión del anticipo.

Quedo atento a sus comentarios y/o aprobación.

Cordialmente,

ING. VICTOR ANDERSON VALBUENA QUIROGA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Anexo archivo PDF. REPROGRAMACIÓN No.3 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 27 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-897

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. Resultados de pruebas de absorción a unidades de mampostería.

Cordial saludo

El Consorcio Obras Judiciales remite los resultados obtenidos a las pruebas en mención.

Cordialmente,

24-09-2024

ING IVAN CARPENTIERE
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

CV

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 26 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 898

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO HOJA DE VIDA RESIDENTE SST DEL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviarle la hoja de vida de la profesional residente seguridad y salud en el trabajo.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

26-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 27 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-899

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: PROCESO CONSTRUCTIVO TANQUE DE RESERVA

Cordial saludo;

La construcción del tanque de reserva tendrá como proceso el que a continuación se describe, sin embargo, debe tenerse en cuenta de dada la altura de los muros del tanque es necesario que se contemple la fundida de los mismos en dos etapas.

En reunión con los asesores estructurales de la interventoría y del consorcio se convino en que debe fundirse la base y cuello de arranque de muros con la mayor altura posible, pensando en que la junta horizontal de la fundida de la etapa 2 con la etapa 1 quede lo malta posible y así aprovechar la baja presión en ese nivel para no tener que colocar cinta PVC.

Por la naturaleza de la labor solamente se considera trabajo diurno con horario extendido hasta las 6:00 pm.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Trazado y localización

Cerramiento

Demolición de Pisos y alistados

Excavación mecánica

Nivelación con topografía

Perfilado de taludes

Pañete protección de taludes

Demarcación perimetral con cinta de la excavación

Colocación de escalera de descenso

Traslado de Redes existentes

Solado de limpieza

Submuración con ciclópeo en donde se requiera

Amarrado de aceros de base y arranque de muros

Formaleta de cuellos de muros y colocación de cinta PVC

Colocación de niples de nivel inferior

Amarre de aceros de muros y colocación del resto de niples y pases

Formaleta de base y cuellos

Vaciado de base y cuellos

Encofrado de muros

Fundida

Desencofrado

Armado y fundida de cárcamos y pozos eyectores

Armado de formaleta de placa

Armado de aceros de placa

Fundida de placa tapa tanque

Fraguado

Desencofrado de formaleta de placa

Recuperación y entrega de formaleta

Resane de corbatas y juntas de muros de tanque

Revestimiento impermeabilizante según diseño

PERSONAL PARA LABORAR

El personal que se relaciona a continuación será fluctuante dependiendo las actividades que se realicen dependiendo del proceso.

Habrá acompañamiento del SST del consorcio, del residente técnico y de la dirección de obra.

Maestro

Oficiales (5)

Ayudantes (4)

Herreros (5)

SST

EQUIPO REQUERIDO

Retroexcavadora

Secciones de andamio tubular

Escalera metálica de descenso

Parales

Cerchas

Alineadores

Tableros metálicos y de madera

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Carretillas

Herramienta menor

Minicargador (etapa de llenado)

Compactador de material granular.

PROTECCIONES A TENER EN CUENTA

Cerramiento del área del tanque

Señalización con cinta y avisos al borde de la excavación

Pañete de muros para evitar socavación

Submuración en tramos donde se requiera

Para las labores internas del tanque se harán los análisis requeridos de aire y se tendrá personal con competencia en trabajo confinado.

Se contará con un sistema de ventilación constante y vigilancia de las labores

Habrá iluminación con luz led al interior del tanque.

agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

24-09-2024

ING IVAN CARPENTIER
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 27 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 900

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL SUBCONTRATISTA ALDEMAR NAVARRO Y EQUIPO MINICARGADOR.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra del trabajador subcontratista Aldemar Navarro y Equipo Minicargador.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
LUIS FERNANDO OSPONO BATISTA OPERADOR	1065808705	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CERTIFICADO DE OPERADOR, PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Nota: Se anexa documento del equipo minicargador.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

24-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 27 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 901

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO EN EXCAVACIÓN.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar enviarles el procedimiento de trabajo seguro en excavación.

Sin otra particularidad.

Cordialmente,

24-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 27 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 902

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADORES DEL SUBCONTRATISTA INVERSIONES ALQUIR.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajadores del Subcontratista Inversiones Alquir.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
EDWAR GARCIA LOPEZ AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	7121392	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÓN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÓN CCF, CERTIFICADO AFP.
FABRICO BALLESTERO RIVERO AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1065830351	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÓN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÓN CCF, CERTIFICADO AFP.
MANUEL VEGA SEGOVIA AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN	1067590433	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÓN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÓN CCF, CERTIFICADO AFP.
ROBERT AGUILERA ACOSTA AYUDANTE DE CONSTRUCCION	5104246	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÓN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÓN CCF, CERTIFICADO AFP.
OLGA DOLORES MENDOZA MENDOZA INSPECTORA SST	1131072953	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÓN ARL, RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÓN CCF, CERTIFICADO AFP.

Quedamos atentos a comentarios.

Cordialmente,

28-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 28 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 903

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajador del Contratista Consorcio Obras Judiciales.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
LINA MARCELA CARABALI ROMERO RESIENTE SST	1065622477	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÓN ARL RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÓN CCF, CERTIFICADO AFP

Sin otra particularidad.

Cordialmente,

28-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 28 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ- VALLEDUPAR-323/22-OFC- 904

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO: RESULTADOS DE ENSAYOS DE CONCRETO

Buenos días,

La presente con el fin de compartir resultados de ensayos

Se anexa COPIA de ello.

Atentamente

28-08-2024

Ing. Iván Salvador Carpentier Ospino.
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 28 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 905

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO PROFESIOGRAMA CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

Cordial saludo,

La presente con el fin de entregarle el Profesiograma del Consorcio Obras Judiciales..

Sin otra particularidad.

Cordialmente,

28-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 30 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 906

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. REPOSICIÓN DE LOS INDIVIDUOS HURTADOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA OSWALDO QUINTANA QUINTANA.

Cordial saludo,

La presente con el fin de informarles la reposición de 12 individuos hurtados y a su vez el mantenimiento a los individuos existente en la Institución Educativa Oswaldo Quintana Quintana.

SIEMBRA DE INDIVIDUO	
	
	

Powered by CamScanner

MANTENIMIENTO DE LOS INDIVIDUOS EXISTENTE	
	
	

Anexo: Ficha Técnica y georreferenciación.

Sin otra particularidad.

Cordialmente,

30-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar, 29 de agosto de 2024

Doctor
BERNARDO ARDILA FERNANDEZ
Director Territorial de Cesar
MINISTERIO DE TRABAJO
Carrera 13 Nº 9A – 62 Barrio San Joaquín

Doctor
JOSE JAIME CASTILLA SARMIENTO
Inspector de Trabajo
Director Territorial de Cesar
MINISTERIO DE TRABAJO
Carrera 13 Nº 9A – 62 Barrio San Joaquín

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-907

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).

ASUNTO. Respuesta requerimiento Auto No. 628 del 12-08-2024
Radicación: 05EE2024742000100001913

Respetado Doctor


En atención a lo ordenado mediante Auto de averiguación Preliminar No. 628 del 12 de agosto de 2024 dentro del expediente de la referencia, CONSORCIO OBRAS JUDICIALES se permite adjuntar la siguiente documentación:

1. Certificado de Existencia y Representación Legal no superior a un mes.
2. Copia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Constancia del porcentaje de ejecución de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado por la ARL.
4. Copia de pagos de aportes al Sistema de seguridad social integral de los últimos tres meses.
5. Copia nómina del trabajador RAFAEL ERNESTO MORENO MORENO
6. Copia plan de emergencias.
7. Copia de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso del trabajador RAFAEL ERNESTO MORENO MORENO si fuere del caso
8. Copia de acta de conformación del COPASST.
9. Copias tres últimas reuniones del COPASST.
10. Copia Reglamento de Higiene.

11. Copia capacitaciones hechas al trabajador accidentado en materia de riesgos laborales año 2023 – 2024 donde participo el trabajador RAFAEL ERNESTO MORENO MORENO.
12. Copia del certificado de curso de altura del trabajador RAFAEL ERNESTO MORENO MORENO
13. Copia de planillas de entrega de EPP
14. Copia de los documentos relacionados con capacitaciones del trabajador RAFAEL ERNESTO MORENO MORENO
15. Copia del informe de accidente de trabajo ocurrido al señor RAFAEL ERNESTO MORENO, enviado a la ARL.
16. Copia de la investigación del accidente de trabajo ocurrido al señor RAFAEL ERNESTO MORENO MORENO, con su constancia de remisión a la ARL.
17. Copia de las Comunicaciones enviadas al trabajador donde le ponen en conocimiento los riesgos existentes en su puesto de trabajo y de las recomendaciones a seguir para minimizarlos o prevenirlos
18. Copia de las recomendaciones dadas por la ARL y de su ejecución después del accidente laboral.
19. Copia de la conformación equipo investigador de incidentes y accidentes de trabajo y enfermedades laborales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º Resolución 1401 de 2007.

De acuerdo a los documentos requeridos y teniendo en cuenta que CONSORCIO OBRAS JUDICIALES ha cumplido a cabalidad con todos los procedimientos y ha desplegado todas las acciones que pudieran mitigar el riesgo para evitar la consumación del lamentable accidente del Señor RAFAEL ERNESTOMORENO MORENO, solicitamos de manera atenta se sirva archivar las presentes diligencias.

Cordialmente,



VICTOR ANDERSON VALBUENA QUIROGA
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Representante Legal

Anexo USB

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 30 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 908

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. ENVIO DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA INGRESO A LA OBRA TRABAJADOR DEL SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q.

Cordial saludo,

La presente con el fin de enviar documentos requeridos para ingreso a la obra trabajador del Subcontratista Obras Civiles y Estructura L.Q.

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	DOCUMENTOS
GABRIEL ANTONIO VERGARA BERRIO AYUDANTE	1081000131	COPIA CEDULA DE CUIDADANIA, CERTIFICADO AFILIACIÒN ARL RADICADO EPS, EXAMEN MEDICOS, AFILIACIÒN CCF, CERTIFICADO AFP, CURSO DE ALTUAR

Sin otra particularidad.

Cordialmente,

30-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 29 de agosto de 2024

Señores:
CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 909

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. REPUESTA AL OFICIO No CSJ-397-2024 APREMIO No 1 ASPECTO AMBIENTAL

Cordial saludo,

Por medio de la presente nos permitimos dar repuesta al apremio No 1 Aspectos Ambientales.

1. Manejo y disposición de residuos.

    a. El consorcio obras judicial cuenta con almacenamiento de sustancias peligrosas, el área está señalizada, dique de contención con una altura de 30 cm, fichas datos de seguridad (FDS), matriz de compatibilidad, kit control de derrame, rotulación de los recipientes.



Se realizaron mejora al área recomendaciones dadas por la interventoria comité del 23/08/2024



b. El material que se encuentra en el sótano es sobrante producido por la excavación de las vigas de cimentación.





c. Contamos con shut de basura instalados en el piso 1,2,3,4,5 para retirar el material residuos de construcción RCD, una vez que se tenga una cantidad mínima requerida para llenar la volqueta se retirara.





d. Con respecto a los residuos de madera, en los diferentes pisos generamos puntos de acopio residuales y reutilizable, una vez que se tenga una cantidad considerada se retirara los reciduales.





e. Contamos con acopio temporales de diferentes materiales de construcción como: Icopor, acero, parales, respectivamente señalizado.



1. Acopio de casetón



2. Acopio de acero



3. Acopio de parales, cerchas

f. El orden y limpieza son aspectos fundamentales para garantizar un ambiente laboral eficiente y seguro, con regularidad realizamos esta actividad en las diferentes áreas.









g. Las raíces de los árboles se descubrieron por un costado para da cabida a la construcción del sótano y semisótano, ya que estos árboles se encuentran muy cerca de la edificación nueva a menos de un metro de distancia. A fecha de hoy atendiendo las observaciones de retiro de sobrante de concreto de las excavaciones donde se encuentran estos árboles, consideramos en el término de tres semanas habremos terminado los rellenos que confinan en su totalidad las raíces de los árboles.


h. Se realizo mantenimiento de los individuos existente compensación forestal Institución Educativa Oswaldo Quintana Quintana para garantizar la supervivencia de estas especies, arreglando el encerramiento y georrefenciación de cada individuo.







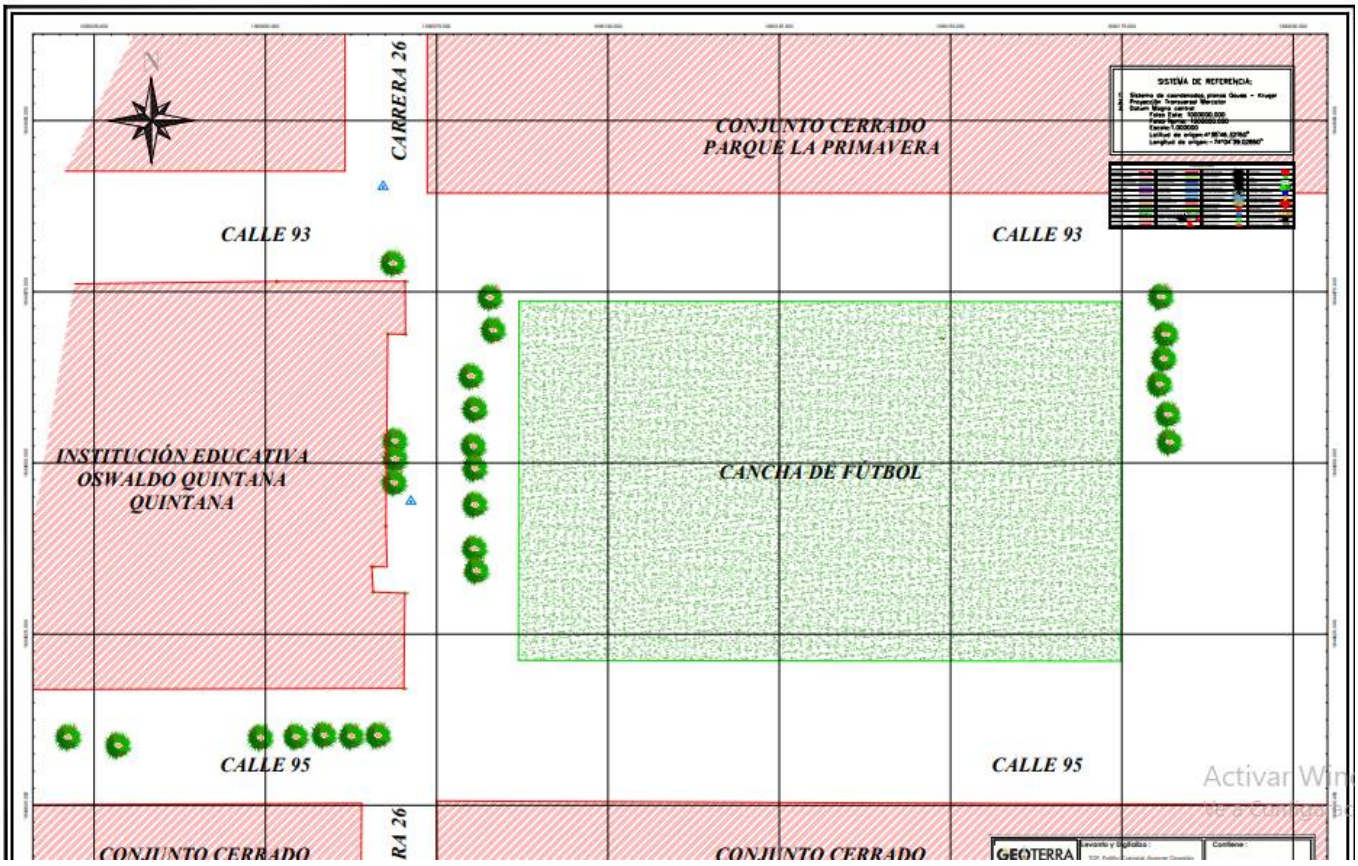


CARRERA 26
CONJUNTO CERRADO
PARQUE LA PRIMAVERA
CALLE 93
CALLE 93
INSTITUCIÓN EDUCATIVA
OSWALDO QUINTANA
QUINTANA
CANCHA DE FÚTBOL
CALLE 95
CALLE 95
CONJUNTO CERRADO
CONJUNTO CERRADO
GEOTERRA

i. Disposición de residuos peligrosos: Ya se hizo el acercamiento con la empresa LIMPIEZA URBANA , que relativamente es nueva en la ciudad y se encarga de este tipo de tratamientos. Estamos a la espera de la propuesta económica para la recolección de los residuos.

En cuanto a lo relacionado en el numeral conrespecto al retiro de material de excavación del sótano, se informa que ya se encuentra en proceso .



Sin otra particularidad.

Cordialmente,

_____

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Valledupar., 31 de agosto de 2024

Señores:
OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA LQ S.A.S
Ciudad

CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC- 910

REF. CONTRATO DE OBRA No. 323 de 2022 CONSTRUCCION Y DOTACION EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

ASUNTO. NO CONFORMIDAD SUBCONTRATISTA OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURA L.Q.

Cordial saludo,

Se observa con preocupación la falta de compromiso y de supervisión del subcontratista Obras Civiles y Estructura L.Q hacia sus trabajadores. Con regularidad están violando las políticas de seguridad y salud en él trabaja en.

1. El mal uso de los Elementos de Protección Contra Caída (EPCC)



La eslinga en **Y** con absorción que utiliza es la inadecuada, ya que este equipo se debe usar a una altura superior de 6 mts.



No protegen las líneas de vida, para evitar que lo bordes dañen estos equipos.

Resolución 4272 de 20221

CAPÍTULO V.
MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN ALTURAS

Artículo 22. Medidas de protección contra caídas en alturas. El empleador o contratante debe definir las medidas de protección a ser utilizadas en cada sitio de trabajo donde exista por lo menos una persona trabajando en alturas ya sea de manera rutinaria o no rutinaria, estas medidas deben estar acordes con la actividad económica y tareas que la componen.

Powered by CamScanner

2. La falta de orden y limpieza en los frentes de trabajo.



Herramientas eléctricas obstaculizando las zonas transitorias: Puede ocasionar que una persona se tropiece y sufra una lección.

Manual de Contratista

Garantizar el orden y la limpieza de los frentes de trabajo, entrega uniformes, carnés de identificación y los elementos de protección personal necesarios y requeridos de acuerdo con los riesgos de la labor a realizar, así como los exigidos por el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.

3. Los trabajadore no están usando los Elementos de Protección Personal (EPP)



Estos trabajadores se encuentran realizando trabajo de carpintería (Formaleta) en lo cual no usan los EPP (Guantes de seguridad y gafas)

4. Retiro de los elemento de seguridad protección de los bordes.



Los Residente SST del contratista Consorcio Obras Judiciales, intervienen las diferentes áreas protegiendo los bordes con : (Malla anaranjada, cinta de seguridad, señalización de advertencia) para evitar caídas de diferente nivel.

Los trabajadores del subcontratista retiran las protecciones instaladas para realizar su actividad, pero no las reinstalan dejando los bordes desprotegidos, esto puede ocasionar una fatalidad.

Powered by CamScanner

5. El subcontratista tiene aproximadamente mes y medio ejecutando labores en este proyecto, aún no ha realizado entrega de dotación (Botas, camisa manga larga, jeans) al personal.

   El artículo 230 del código sustantivo de trabajo: Indica, la dotación es una prestación social a cargo del empleador, consistente en suministrar a sus trabajadores calzado y vestido de labor.

Sin otra particularidad.

Cordialmente,

31-08-2024

Ing. Ivan Salvador Carpentier Ospino
CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Director de Obra

LDS

Powered by CamScanner
