	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	6
		Vigencia	29/07/2024

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	2/09/2024	**PERIODO REPORTADO DEL:**	30/07/2024	**AL:**	2/09/2024
CONTRATO Nº	031-00-M-CAMAN-GRUAL-2024	**CONTRATISTA**	G&V ASOCIADOS S.A.S		
OBJETO	CONTRATO DE OBRA DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO				
FECHA DE INICIO	3/07/2024	**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/10/2024		

VALOR INICIAL	$ 1.298.856.723,81	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 1.298.856.723,81

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMO EL DÍA 25-06-2024 EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO, LOS NUMEROS DE PÓLIZAS SON No.21-44-101444718 Y 21-40-101235052 DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Pintura Esmalte	5 Galones	Cortadora	2	Residente de obra	2	100	100	SI	**Se presentan Sin Novedad**
		Perfiles Metalicos	3 Ml	Equipo de Soldadura	1	Gestor SISO	1	100	100	SI	**Se presentan Sin Novedad**
		Luminarias	30 Und			Tecnólogo en Construcción	1	60	100	SI	**Se presentan Sin Novedad**
		Tuberia EMT	10 Ml			Tecnico en Electricidad	1	40	100	SI	**Se presentan Sin Novedad**
		Cemento	10 Bultos			Oficial	4				
		Arena	5 m3			Ayudante	8				
		Ladrillos	100 Und								
		Acero	30 Kg								
						TOTAL	17				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (AGOSTO)				
Semana 1	1,00%	**23,60%**	**23,00%**	**0,60%**
Semana 2	2,00%			
Semana 3	2,00%			
Semana 4	4,00%			
Semana 5	5,00%			
Semana 6	9,60%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA






































































AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**23,00%**
EJECUTADO		**23,60%**


































GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS










CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
VIVIENDAS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**79,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**100,00%**
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		**100,00%**
	EJECUTADO		**86,00%**
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**98,00%**
7. INSTALACIONES MECÁNICAS	PROGRAMADO		**10,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		40,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		26,00%
	EJECUTADO		0,00%
11. CARPINTERÍA EN MADERA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		82,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
SANIDAD			
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		52,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
MATERIALES COMPUESTOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		42,00%
	EJECUTADO		32,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		61,00%
	EJECUTADO		100,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		65,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		29,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		63,00%
CERRAMIENTO			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
MISCELANEOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		64,00%

	EJECUTADO		22,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		41,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		62,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		55,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		31,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		10,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. IMPERMEABILIZACIÓN	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ECONOMATO Y ALMACEN ARMAMENTO TERRESTRE			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		89,00%
	EJECUTADO		0,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		30,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		96,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		1,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
ESCAM			
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
12. CARPINTERÍA	PROGRAMADO		69,00%

METALICA	EJECUTADO		81,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
SERVOS Y PINTURAS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		41,00%
	EJECUTADO		0,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		20,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		35,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		16,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
19. IMPERMEABILIZACIÓN	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
20. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
LABORATORIO DE INSPECCIÓN			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		73,00%
	EJECUTADO		73,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		20,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		100,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
DEPOT T-53			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
4. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%

	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
7. INSTALACIONES MECÁNICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
13. CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
BODEGA PT6			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		78,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		98,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
TALLER ELECTRICOS			
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		93,00%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
3. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
6. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		61,00%

8. PAÑETE	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
9. CIELO RASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
10. ACABADOS DE MUROS Y PINTURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
12. CARPINTERÍA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
14. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
15. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
16. MAMPOSTERÍA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
17. CERRADURAS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
18. PISOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

5- PLAZO (DÍAS)


Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	121	62	59
Proyección	120	62	58

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/ adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
62	1	30/10/2024

6- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL



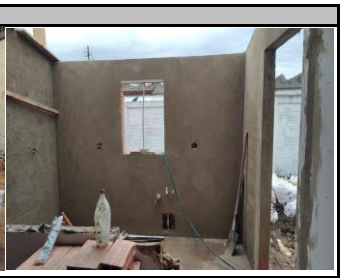

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

FRENTE DE OBRA – VIVIENDAS

1.DEMOLICIÓN DE ENCHAPES PISOS Y PAREDES
2.DEMOLICIÓN DE POYOS DUCHAS
3.DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS
4.DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA
5.DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS
6.EXCAVACIONES
7.RED DE TUBERÍA SANITARIA DE 2”
8.RED DE TUBERÍA SANITARIA DE 4”
9.RED DE TUBERÍA VENTILACIÓN DE 2”
10.RED TUBERÍA PVC ½”
11.RED TUBERÍA CPVC ½”
12.ACERO DE REFUERZO EN VIGAS Y COLUMNAS
13.CONCRETO PARA VIGAS
14.MALLA 5 MM PARA REFUERZO DE PLACAS
15.PLACAS CONCRETO
16.MAMPOSTERÍA
17.CONCRETO PARA COLUMNAS
18.RED ELÉCTRICA
19.PRUEBA DE PRESIÓN RED HIDRÁULICA
20. MAMPOSTERÍA
21. ACERO DE REFUERZO PARA VIGAS AÉREAS
22. CONCRETO PARA VIGAS
22. PAÑETE
23. AMPLIACIÓN VENTANA
24. SOBREPISOS

FRENTE DE OBRA – CERRAMIENTO

1.DESMONTE DE CERRAMIENTO
2.INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO

FRENTE DE OBRA – MATERIALES COMPUESTOS

1.DESMONTE DE CIELO RASO
2.INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE CIELO RASO
3.ALISTAMIENTO DE PISO PARA APLICACIÓN DE PINTURAS EPOXICA
4. PINTURA EPOXICA - CUARTO LIMPIO
5. PINTURA DE TRAFICO - TALLER
6. INSTALACIÓN LUMINARIAS T8 Y PANEL 60X60

FRENTE DE OBRA – ESCAM

1.ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA
2. DESMONTE Y REEMPLAZO: DE PERFIL 4X4 CAL 18
3. PINTURA ANTICORROSIVA M2
4. PINTURA ANTICORROSIVA ML
5. INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

FRENTE DE OBRA – SANIDAD

1. ESCARIFICADO DE PAÑETE
2. PAÑETE M2
3. MEDIACAÑAS
4. MORTERO IMPERMEABILIZADO MUROS TIPO SIKATOP SEAL107 O SIMILAR
5. DEMOLICIÓN ENCHAPES PISOS Y PAREDES
6. DESMONTE DE CIELO RASO

FRENTE DE OBRA – MISCELÁNEOS

1. DEMOLICIÓN ENCHAPES PISOS Y PAREDES
2. DESMONTE DE CIELO RASO

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
FRENTE DE OBRA – VIVIENDA 1.ACABADOS 2.CUBIERTA FRENTE DE OBRA - SANIDAD 1.ESTRUCTURA FRENTE DE OBRA – MISCELANEOS 1.ESTRUCTURA 2.INSTALACIONES ELÉCTRICAS 3.CUBIERTA 4.PISOS FRENTE DE OBRA – ECONOMATO Y ALMACÉN ARMAMENTO TERRESTRE 1.MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.ESTRUCTURA 3.INSTALACIONES HIDROSANITARIAS FRENTE DE OBRA - SERVOS Y PINTURAS 1.MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.ESTRUCTURA 3.INSTALACIONES ELÉCTRICAS Las actividades atrasadas presentadas fueron ocasionadas por el suministró de materiales, las cuales fueron afectadas por el paro nacional de camioneros interrumpiendo la salida del material de la ciudad y a los alrededores del pueblo	SI		NO	X

OBSERVACIONES: Por parte del contratista solicita empezar nuevos frentes para realizar mayor actividades de obra para cumplir con los porcentajes de ejecución del contrato

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.298.856.723,81	$ 1.298.856.723,81	$ 306.530.186,82	23,60%	$ 992.326.536,99	76%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.298.856.723,81	$ 1.298.856.723,81				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.298.856.723,81	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.298.856.723,81	

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión y se diligencia formato GA-JELOG-FR-078
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
PARAFISCALES, ARL DE TODO EL PERSONAL Y PLANTILLAS PILA	SI	SI	SI	Se entregan por el contratista para pago final
CRONOGRAMA DE OBRA TIPO GANT, PDF Y EXCEL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO CURSO DE ALTURAS DEL PERSONAL QUE TRABAJE EN ALTURAS	SI	SI	SI	No se requirio realizar trabajos en alturas para las ultimas actividades pendientes
SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
CERTIFICADO ACCIDENTALIDAD EXPEDIDA POR LA ARL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se anexa al acta de inicio
FORMATOS DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI	SI	SI	Se realiza la revisión se entrega al Grupo de Inteligencia

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES


Se solicita al contratista siempre el uso de elementos de protección personal para los trabajadores, así como la información con tiempo de personal y proveedores nuevos para el ingreso a la Unidad

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

No se presentaron lluvias durante el periodo informado

ELABORO:	REVISO:
TE. CUADROS ROMERO CARLOS ANDRES Supervisor Principal	TC. DE LA CRUZ CASTRO RAUL MANUEL ACERO 946-24 VoBo Gerente del Proyecto

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO

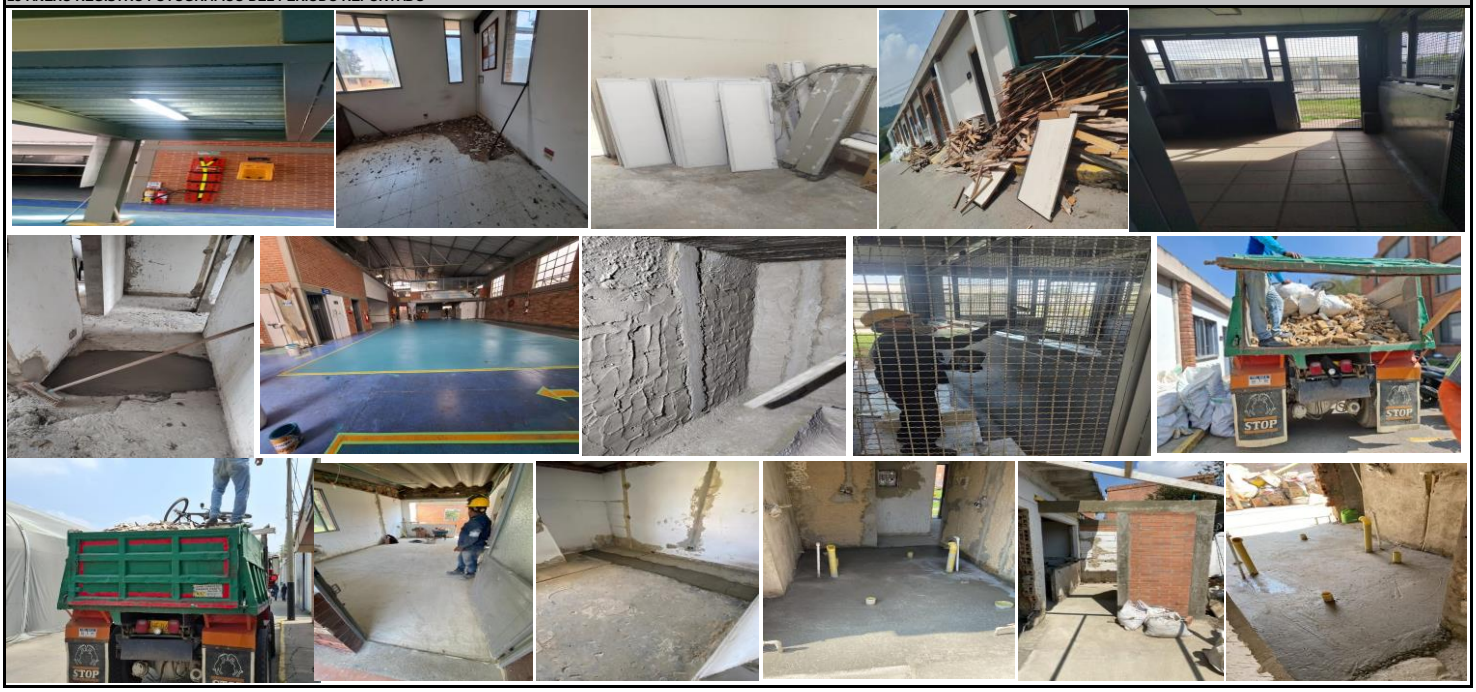

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según	X		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	especificaciones y anexos técnicos			
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	X		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		Se entrega Mensualmente
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		A la fecha no se presenta incumplimiento
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			No Aplica, el Contrato está en Ejecución
