CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1,824.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR41+520	PR41+510	10.00	0.62	0.62	0.62	6.17	
PR41+510	PR41+500	10.00	0.62	0.62	0.62	6.17	
PR41+500	PR41+490	10.00	0.62	0.62	0.62	6.17	
PR41+490	PR41+480	10.00	0.62	0.62	0.62	6.17	
PR41+480	PR41+470	10.00	0.62	1.17	0.90	8.95	
PR41+470	PR41+460	10.00	1.17	1.17	1.17	11.73	
PR41+460	PR41+450	10.00	1.17	1.17	1.17	11.73	
PR41+450	PR41+440	10.00	1.17	1.17	1.17	11.73	
PR41+440	PR41+430	10.00	1.17	1.87	1.52	15.20	
PR41+430	PR41+420	10.00	1.87	1.25	1.56	15.59	
PR41+420	PR41+410	10.00	1.25	1.25	1.25	12.50	
PR41+410	PR41+400	10.00	1.25	1.25	1.25	12.50	
PR41+400	PR41+390	10.00	1.25	1.25	1.25	12.50	
PR41+390	PR41+380	10.00	1.25	2.33			
PR41+380	PR41+370	10.00	2.33	2.33	2.33	23.32	
PR41+370	PR41+360	10.00	2.33	1.47	1.90	18.99	
PR41+360	PR41+350	10.00	1.47	1.47	1.47	14.67	
PR41+350	PR41+340	10.00	0.77	1.47	1.12	11.20	
PR41+340	PR41+330	10.00	1.47	1.47	1.47	14.67	
PR41+330	PR41+320	10.00	1.47	0.77	1.12	11.20	
PR41+320	PR41+310	10.00	0.77	0.77	0.77	7.73	
PR41+310	PR41+300	10.00	0.77	2.94	1.86	18.58	
PR41+300	PR41+290	10.00	2.94	2.94	2.94	29.43	
PR41+290	PR41+280	10.00	2.94	2.94	2.94	29.43	
PR41+280	PR41+270	10.00	2.94	0.95	1.95	19.49	
PR41+270	PR41+260	10.00	0.95	0.95	0.95	9.55	
PR40+300	PR40+290	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR40+290	PR40+280	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR40+280	PR40+270	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR40+270	PR40+260	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR40+260	PR40+250	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR40+250	PR40+240	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR40+240	PR40+230	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR40+150	PR40+140	10.00	1.39	2.08	1.74	17.36	
PR40+140	PR40+130	10.00	2.08	1.39	1.74	17.36	
PR40+130	PR40+120	10.00	1.39	0.69	1.04	10.42	
PR40+050	PR40+040	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR39+860	PR39+850	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR39+850	PR39+840	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR39+810	PR39+800	10.00	0.28	0.28	0.28	2.78	
PR39+800	PR39+790	10.00	0.28	0.28	0.28	2.78	Vo. Correspondientes a cajeos
PR39+790	PR39+780	10.00	0.28	0.97	0.63	6.25	
PR39+780	PR39+770	10.00	0.97	0.97	0.97	9.72	
PR39+760	PR39+750	10.00	0.10	0.10	0.10	1.04	
PR39+750	PR39+740	10.00	0.10	0.80	0.45	4.51	
PR39+740	PR39+730	10.00	0.80	0.80	0.80	7.99	
PR39+730	PR39+720	10.00	0.80	0.45	0.63	6.25	
PR39+720	PR39+710	10.00	0.45	0.45	0.45	4.51	
PR39+710	PR39+700	10.00	0.45	0.80	0.63	6.25	
PR39+700	PR39+690	10.00	0.80	0.80	0.80	7.99	
PR39+690	PR39+680	10.00	0.80	0.10	0.45	4.51	
PR39+680	PR39+670	10.00	0.10	0.10	0.10	1.04	
PR39+670	PR39+660	10.00	0.10	0.10	0.10	1.04	
PR38+610	PR38+600	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR38+600	PR38+590	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR38+510	PR38+500	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+500	PR38+490	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+490	PR38+480	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+480	PR38+470	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+470	PR38+460	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+460	PR38+450	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+450	PR38+440	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+440	PR38+430	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+430	PR38+420	10.00	0.54	0.54	0.54	5.40	
PR38+350	PR38+340	10.00	0.69	0.69	0.69	6.95	
PR38+250	PR38+240	10.00	1.08	1.08	1.08	10.80	
PR38+240	PR38+230	10.00	1.08	1.08	1.08	10.80	
PR38+230	PR38+220	10.00	1.08	1.08	1.08	10.80	
PR38+220	PR38+210	10.00	1.08	1.08	1.08	10.80	
PR38+210	PR38+200	10.00	1.08	0.39	0.73	7.33	
PR38+200	PR38+190	10.00	0.39	0.39	0.39	3.86	
PR38+190	PR38+180	10.00	0.39	0.39	0.39	3.86	
PR38+180	PR38+170	10.00	0.39	0.39	0.39	3.86	
PR38+170	PR38+160	10.00	0.39	0.39	0.39	3.86	
PR38+160	PR38+150	10.00	0.39	0.39	0.39	3.86	
PR38+150	PR38+140	10.00	0.39	0.39	0.39	3.86	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1,824.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR38+130	PR38+120	10.00	1.35	1.35	1.35	13.54	
PR38+120	PR38+110	10.00	1.35	2.06	1.71	17.08	
PR38+110	PR38+100	10.00	2.06	1.54	1.80	18.01	
PR38+100	PR38+090	10.00	1.54	1.54	1.54	15.41	
PR38+090	PR38+080	10.00	1.54	2.35	1.95	19.46	
PR38+080	PR38+070	10.00	2.35	2.35	2.35	23.51	
PR38+070	PR38+060	10.00	2.35	1.50	1.93	19.28	
PR38+060	PR38+050	10.00	1.50	1.50	1.50	15.05	
PR37+990	PR37+980	10.00	1.22	2.88	2.05	20.49	
PR37+980	PR37+970	10.00	1.67	1.67	1.67	16.67	
PR37+970	PR37+960	10.00	1.67	1.67	1.67	16.67	
PR37+960	PR37+950	10.00	1.67	1.67	1.67	16.67	
PR37+950	PR37+940	10.00	1.67	1.67	1.67	16.67	
PR37+940	PR37+930	10.00	1.67	1.67	1.67	16.67	
PR37+920	PR37+910	10.00	0.87	0.87	0.87	8.68	
PR37+910	PR37+900	10.00	0.87	0.87	0.87	8.68	
PR37+900	PR37+890	10.00	0.87	0.87	0.87	8.68	
PR37+890	PR37+880	10.00	0.87	0.87	0.87	8.68	
PR37+470	PR37+460	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
PR37+460	PR37+450	10.00	2.32	2.66	2.49	24.89	
PR37+450	PR37+440	10.00	2.66	1.27	1.97	19.68	
PR37+410	PR37+400	10.00	1.04	1.04	1.04	10.42	
PR37+400	PR37+390	10.00	1.04	3.13	2.08	20.84	
PR37+390	PR37+380	10.00	3.13	4.11	3.62	36.18	
PR37+380	PR37+370	10.00	4.11	2.37	3.24	32.41	
PR37+370	PR37+360	10.00	2.37	2.55	2.46	24.60	
PR37+360	PR37+350	10.00	2.55	2.20	2.37	23.73	
PR37+350	PR37+340	10.00	2.20	1.94	2.07	20.69	
PR37+340	PR37+330	10.00	1.94	3.15	2.55	25.45	
PR37+330	PR37+320	10.00	3.15	3.59	3.37	33.69	
PR37+320	PR37+310	10.00	3.59	2.60	3.09	30.94	
PR37+310	PR37+300	10.00	2.60	2.60	2.60	26.02	
PR37+300	PR37+290	10.00	2.60	3.30	2.95	29.49	
PR37+290	PR37+280	10.00	3.30	2.08	2.69	26.90	
PR37+280	PR37+270	10.00	2.08	2.08	2.08	20.84	
PR37+270	PR37+260	10.00	2.08	0.78	1.43	14.32	
PR37+260	PR37+250	10.00	0.78	0.78	0.78	7.81	
PR37+250	PR37+240	10.00	0.78	0.78	0.78	7.81	
PR37+240	PR37+230	10.00	0.78	0.78	0.78	7.81	
PR37+230	PR37+220	10.00	0.78	0.78	0.78	7.81	
PR37+220	PR37+210	10.00	0.78	0.78	0.78	7.81	
PR37+210	PR37+200	10.00	0.78	0.78	0.78	7.81	
PR37+200	PR37+190	10.00	0.78	0.78	0.78	7.81	
PR37+190	PR37+180	10.00	0.78	1.30	1.04	10.42	
PR37+180	PR37+170	10.00	1.30	1.30	1.30	13.02	
PR37+170	PR37+160	10.00	1.30	0.96	1.13	11.29	
PR37+160	PR37+150	10.00	0.96	0.96	0.96	9.55	
PR37+150	PR37+140	10.00	0.96	1.22	1.09	10.85	
PR37+140	PR37+130	10.00	1.22	1.91	1.56	15.63	
PR37+130	PR37+120	10.00	1.91	1.91	1.91	19.10	
PR37+120	PR37+110	10.00	1.91	2.72	2.32	23.15	
PR37+110	PR37+100	10.00	2.72	1.33	2.03	20.26	
PR37+100	PR37+090	10.00	1.33	2.72	2.03	20.26	
PR37+090	PR37+080	10.00	2.72	3.13	2.92	29.23	
PR37+080	PR37+070	10.00	3.13	1.27	2.20	21.99	
PR37+070	PR37+060	10.00	1.27	1.27	1.27	12.73	
PR37+060	PR37+050	10.00	1.27	1.27	1.27	12.73	
PR37+010	PR37+000	10.00	1.04	1.04	1.04	10.42	
PR37+000	PR36+990	10.00	1.04	1.04	1.04	10.42	
PR36+990	PR36+980	10.00	1.04	1.04	1.04	10.42	
PR36+970	PR36+960	10.00	0.81	0.81	0.81	8.10	
PR36+960	PR36+950	10.00	0.81	0.81	0.81	8.10	
PR36+950	PR36+940	10.00	0.81	1.50	1.16	11.58	
PR36+940	PR36+930	10.00	1.50	1.50	1.50	15.05	
PR36+930	PR36+920	10.00	1.50	1.50	1.50	15.05	
PR36+920	PR36+910	10.00	1.50	1.50	1.50	15.05	
PR36+910	PR36+900	10.00	1.50	2.20	1.85	18.52	
PR36+900	PR36+890	10.00	2.20	2.20	2.20	21.99	
					TOTAL	1,824.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1,824.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+070



PR37+990



PR37+920



PR38+110



PR38+130



PR37+470



PR40+240



PR37+110

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
5	Excavación sin clasificar de préstamos	1,824.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES





PR38+400 - PR38+510

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	5,599.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR41+520	PR41+510	10.00	1.44	1.44	1.44	14.41	
PR41+510	PR41+500	10.00	1.44	1.44	1.44	14.41	
PR41+500	PR41+490	10.00	1.44	1.44	1.44	14.41	
PR41+490	PR41+480	10.00	1.44	1.44	1.44	14.41	
PR41+480	PR41+470	10.00	1.44	2.74	2.09	20.89	
PR41+470	PR41+460	10.00	2.74	2.74	3.65	36.49	
PR41+460	PR41+450	10.00	3.65	3.65	3.65	36.49	
PR41+450	PR41+440	10.00	3.65	3.65	3.65	36.49	Vo. Correspondientes a cajeos
PR41+440	PR41+430	10.00	3.65	5.27	4.46	44.59	
PR41+430	PR41+420	10.00	5.27	3.83	4.55	45.49	
PR41+420	PR41+410	10.00	3.83	3.83	3.83	38.29	
PR41+410	PR41+400	10.00	3.83	3.83	3.83	38.29	
PR41+400	PR41+390	10.00	3.83	3.83	3.83	38.29	
PR41+390	PR41+380	10.00	3.83	6.35	5.09	50.91	
PR41+380	PR41+370	10.00	6.35	6.35	6.35	63.52	
PR41+370	PR41+360	10.00	6.35	4.34	5.34	53.44	Cajeo - Conformación lateral y Perfilación de talud
PR41+360	PR41+350	10.00	4.34	4.34	4.34	43.36	
PR41+350	PR41+340	10.00	2.72	4.34	3.53	35.25	
PR41+340	PR41+330	10.00	4.34	4.34	4.34	43.36	Cajeo - Conformación lateral y Perfilación de talud
PR41+330	PR41+320	10.00	4.34	2.72	3.53	35.25	
PR41+320	PR41+310	10.00	2.72	2.72	2.72	27.15	
PR41+310	PR41+300	10.00	2.72	7.78	5.25	52.47	
PR41+300	PR41+290	10.00	7.78	7.78	7.78	77.80	Cajeo - Conformación lateral y Perfilación de talud
PR41+290	PR41+280	10.00	7.78	7.78	7.78	77.80	
PR41+280	PR41+270	10.00	7.78	3.14	5.46	54.60	
PR41+270	PR41+260	10.00	3.14	3.14	3.14	31.40	
PR41+260	PR41+250	10.00	3.14	0.91	2.03	20.26	
PR40+400	PR40+390	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+390	PR40+380	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+380	PR40+370	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+370	PR40+360	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+360	PR40+350	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+350	PR40+340	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+340	PR40+330	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+330	PR40+320	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+320	PR40+310	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR40+310	PR40+300	10.00	0.91	2.53	1.72	17.22	
PR40+300	PR40+290	10.00	2.53	2.53	2.53	25.33	
PR40+290	PR40+280	10.00	2.53	2.53	2.53	25.33	
PR40+280	PR40+270	10.00	2.53	1.62	2.08	20.77	Vo. Correspondientes a cajeos
PR40+270	PR40+260	10.00	1.62	1.62	1.62	16.21	
PR40+260	PR40+250	10.00	1.62	2.53	2.08	20.77	
PR40+250	PR40+240	10.00	2.53	2.53	2.53	25.33	
PR40+240	PR40+230	10.00	2.53	2.53	2.53	25.33	
PR40+220	PR40+210	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+210	PR40+200	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+200	PR40+190	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+190	PR40+180	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+180	PR40+170	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+170	PR40+160	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+160	PR40+150	10.00	0.91	4.15	2.53	25.32	
PR40+150	PR40+140	10.00	4.15	6.68	5.42	54.19	
PR40+140	PR40+130	10.00	6.68	5.06	5.87	58.74	Cajeo - Conformación lateral margen izquierdo
PR40+130	PR40+120	10.00	5.06	5.06	5.06	50.64	
PR40+120	PR40+110	10.00	5.06	0.91	2.99	29.87	
PR40+110	PR40+100	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+100	PR40+090	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+090	PR40+080	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+080	PR40+070	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	Vo. Correspondiente a cajeo
PR40+070	PR40+060	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+060	PR40+050	10.00	0.91	2.53	1.72	17.21	
PR40+050	PR40+040	10.00	2.53	2.53	2.53	25.32	
PR40+030	PR40+020	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+020	PR40+010	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+010	PR40+000	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR40+000	PR39+990	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR39+990	PR39+980	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR39+980	PR39+970	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR39+970	PR39+960	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR39+960	PR39+950	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR39+950	PR39+940	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR39+940	PR39+930	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	5,599.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR39+860	PR39+850	10.00	1.62	1.62	1.62	16.21	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR39+850	PR39+840	10.00	1.62	1.62	1.62	16.21	
PR39+810	PR39+800	10.00	0.65	0.65	0.65	6.48	
PR39+800	PR39+790	10.00	0.65	0.65	0.65	6.48	
PR39+790	PR39+780	10.00	0.65	2.27	1.46	14.58	
PR39+780	PR39+770	10.00	2.27	2.27	2.27	22.69	
PR39+760	PR39+750	10.00	0.24	0.24	0.24	2.43	
PR39+750	PR39+740	10.00	0.24	2.77	1.51	15.09	
PR39+740	PR39+730	10.00	2.77	2.77	2.77	27.75	
PR39+730	PR39+720	10.00	2.77	1.96	2.37	23.70	Vo. Correspondiente a cajeo
PR39+720	PR39+710	10.00	1.96	1.96	1.96	19.64	
PR39+710	PR39+700	10.00	1.96	2.77	2.37	23.70	
PR39+700	PR39+690	10.00	2.77	2.77	2.77	27.75	
PR39+690	PR39+680	10.00	2.77	1.15	1.96	19.64	
PR39+680	PR39+670	10.00	1.15	1.15	1.15	11.54	
PR39+670	PR39+660	10.00	1.15	1.15	1.15	11.54	
PR39+660	PR39+650	10.00	1.15	0.91	1.03	10.33	
PR39+650	PR39+640	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR38+640	PR38+630	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR38+630	PR38+620	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR38+620	PR38+610	10.00	0.91	2.53	1.72	17.22	
PR38+610	PR38+600	10.00	2.53	2.53	2.53	25.33	Cajeo - Conformación lateral y perfilación de talud
PR38+600	PR38+590	10.00	2.53	2.53	2.53	25.33	
PR38+590	PR38+580	10.00	2.53	0.91	1.72	17.22	
PR38+580	PR38+570	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR38+570	PR38+560	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR38+510	PR38+500	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+500	PR38+490	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+490	PR38+480	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+480	PR38+470	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+470	PR38+460	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	Cajeo - Conformación lateral y perfilación de talud
PR38+460	PR38+450	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+450	PR38+440	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+440	PR38+430	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+430	PR38+420	10.00	1.26	1.26	1.26	12.61	
PR38+390	PR38+380	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR38+380	PR38+370	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR38+370	PR38+360	10.00	0.91	0.91	0.91	9.12	
PR38+360	PR38+350	10.00	0.91	2.53	1.72	17.22	
PR38+350	PR38+340	10.00	2.53	2.53	2.53	25.33	
							Vo. Correspondiente a cajeos
PR38+250	PR38+240	10.00	2.52	2.52	2.52	25.21	
PR38+240	PR38+230	10.00	2.52	2.52	2.52	25.21	
PR38+230	PR38+220	10.00	2.52	3.43	2.98	29.76	
PR38+220	PR38+210	10.00	3.43	3.43	3.43	34.32	
PR38+210	PR38+200	10.00	3.43	3.43	3.43	34.32	
PR38+200	PR38+190	10.00	3.43	0.90	2.17	21.66	
PR38+190	PR38+180	10.00	0.90	0.90	0.90	9.00	
PR38+180	PR38+170	10.00	0.90	0.90	0.90	9.00	Excavaciones de cunetas - Perfilación de talud
PR38+170	PR38+160	10.00	0.90	0.90	0.90	9.00	
PR38+160	PR38+150	10.00	0.90	0.90	0.90	9.00	
PR38+150	PR38+140	10.00	0.90	0.90	0.90	9.00	
PR38+130	PR38+120	10.00	3.16	3.16	3.16	31.60	
PR38+120	PR38+110	10.00	3.16	4.81	3.99	39.86	
PR38+110	PR38+100	10.00	4.81	3.60	4.20	42.03	
PR38+100	PR38+090	10.00	3.60	3.60	3.60	35.95	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR38+090	PR38+080	10.00	3.60	5.49	4.54	45.41	
PR38+080	PR38+070	10.00	5.49	5.49	5.49	54.86	
PR38+070	PR38+060	10.00	5.49	3.51	4.50	44.99	
PR38+060	PR38+050	10.00	3.51	3.51	3.51	35.11	
PR37+990	PR37+980	10.00	2.84	6.73	4.78	47.81	
PR37+980	PR37+970	10.00	3.89	3.89	3.89	38.89	
PR37+970	PR37+960	10.00	3.89	3.89	3.89	38.89	
PR37+960	PR37+950	10.00	3.89	3.89	3.89	38.89	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR37+950	PR37+940	10.00	3.89	3.89	3.89	38.89	
PR37+940	PR37+930	10.00	3.89	3.89	3.89	38.89	
PR37+920	PR37+910	10.00	2.03	2.03	2.03	20.26	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	5,599.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR37+910	PR37+900	10.00	2.03	2.03	2.03	20.26	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR37+900	PR37+890	10.00	2.03	2.03	2.03	20.26	
PR37+890	PR37+880	10.00	2.03	2.03	2.03	20.26	
PR37+480	PR37+470	10.00	0.91	6.31	3.61	36.12	
PR37+470	PR37+460	10.00	6.31	6.31	6.31	63.14	
PR37+460	PR37+450	10.00	6.31	7.12	6.72	67.19	
PR37+450	PR37+440	10.00	7.12	0.91	4.02	40.18	
PR37+440	PR37+430	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR37+430	PR37+420	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR37+420	PR37+410	10.00	0.91	3.34	2.13	21.27	
PR37+410	PR37+400	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+400	PR37+390	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+390	PR37+380	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+380	PR37+370	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+370	PR37+360	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+360	PR37+350	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+350	PR37+340	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+340	PR37+330	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+330	PR37+320	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+320	PR37+310	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+310	PR37+300	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+300	PR37+290	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+290	PR37+280	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+280	PR37+270	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+270	PR37+260	10.00	5.20	5.20	5.20	52.00	
PR37+260	PR37+250	10.00	2.73	2.73	2.73	27.34	
PR37+250	PR37+240	10.00	2.73	2.73	2.73	27.34	
PR37+240	PR37+230	10.00	2.73	2.73	2.73	27.34	
PR37+230	PR37+220	10.00	2.73	2.73	2.73	27.34	
PR37+220	PR37+210	10.00	2.73	2.73	2.73	27.34	
PR37+210	PR37+200	10.00	2.73	2.73	2.73	27.34	
PR37+200	PR37+190	10.00	2.73	2.73	2.73	27.34	
PR37+190	PR37+180	10.00	2.73	3.95	3.34	33.42	
PR37+180	PR37+170	10.00	3.95	3.95	3.95	39.50	
PR37+170	PR37+160	10.00	3.95	3.14	3.54	35.45	
PR37+160	PR37+150	10.00	3.14	3.14	3.14	31.40	
PR37+150	PR37+140	10.00	3.14	3.75	3.44	34.43	
PR37+140	PR37+130	10.00	3.75	5.37	4.56	45.58	
PR37+130	PR37+120	10.00	5.37	5.37	5.37	53.68	
PR37+120	PR37+110	10.00	5.37	7.26	6.31	63.13	
PR37+110	PR37+100	10.00	7.26	4.02	5.64	56.38	
PR37+100	PR37+090	10.00	4.02	7.26	5.64	56.38	
PR37+090	PR37+080	10.00	7.26	8.20	7.73	77.31	
PR37+080	PR37+070	10.00	8.20	3.88	6.04	60.43	
PR37+070	PR37+060	10.00	3.88	3.88	3.88	38.82	
PR37+060	PR37+050	10.00	3.88	3.88	3.88	38.82	
PR37+050	PR37+040	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR37+040	PR37+030	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR37+030	PR37+020	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR37+020	PR37+010	10.00	0.91	0.91	0.91	9.11	
PR37+010	PR37+000	10.00	3.34	3.34	3.34	33.42	
PR37+000	PR36+990	10.00	3.34	3.34	3.34	33.42	
PR36+990	PR36+980	10.00	3.34	3.34	3.34	33.42	
PR36+980	PR36+970	10.00	0.91	1.82	1.37	13.67	
PR36+970	PR36+960	10.00	2.80	2.80	2.80	28.02	
PR36+960	PR36+950	10.00	2.80	2.80	2.80	28.02	
PR36+950	PR36+940	10.00	2.80	4.42	3.61	36.12	
PR36+940	PR36+930	10.00	4.42	4.42	4.42	44.23	
PR36+930	PR36+920	10.00	4.42	4.42	4.42	44.23	
PR36+920	PR36+910	10.00	4.42	4.42	4.42	44.23	
PR36+910	PR36+900	10.00	4.42	6.04	5.23	52.33	
PR36+900	PR36+890	10.00	6.04	6.04	6.04	60.43	
					TOTAL	5,599.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	5,599.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+510



PR37+090



PR37+920



PR37+330



PR38+230



PR37+290

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	5,599.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES



PR37+140



PR37+400





PR38+400 - PR38+510

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	7,867.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR41+540	PR41+530	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+530	PR41+520	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+520	PR41+510	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+510	PR41+500	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+500	PR41+490	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+490	PR41+480	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+480	PR41+470	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+470	PR41+460	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+460	PR41+450	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+450	PR41+440	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+440	PR41+430	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+430	PR41+420	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+420	PR41+410	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+410	PR41+400	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+400	PR41+390	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+390	PR41+380	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+380	PR41+370	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+370	PR41+360	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+360	PR41+350	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+350	PR41+340	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+340	PR41+330	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+330	PR41+320	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+320	PR41+310	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+310	PR41+300	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+300	PR41+290	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+290	PR41+280	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+280	PR41+270	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+270	PR41+260	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR41+260	PR41+250	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						752.19	
PR40+470	PR40+460	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+460	PR40+450	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+450	PR40+440	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+440	PR40+430	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+430	PR40+420	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+420	PR40+410	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR40+410	PR40+400	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						181.56	
PR39+830	PR39+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+820	PR39+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+810	PR39+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+800	PR39+790	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+790	PR39+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+780	PR39+770	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+770	PR39+760	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+760	PR39+750	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+750	PR39+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+740	PR39+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+730	PR39+720	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+720	PR39+710	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+710	PR39+700	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+700	PR39+690	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						363.13	
PR39+520	PR39+510	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR39+510	PR39+500	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						51.88	
PR38+250	PR38+240	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+240	PR38+230	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+230	PR38+220	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+220	PR38+210	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+210	PR38+200	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+200	PR38+190	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+190	PR38+180	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+180	PR38+170	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+170	PR38+160	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+160	PR38+150	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+150	PR38+140	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+140	PR38+130	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+130	PR38+120	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+120	PR38+110	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+110	PR38+100	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+100	PR38+090	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+090	PR38+080	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+080	PR38+070	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+070	PR38+060	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+060	PR38+050	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+050	PR38+040	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+040	PR38+030	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+030	PR38+020	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR38+020	PR38+010	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	7,867.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR38+010	PR38+000	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						648.44	
					TOTAL VOLUMEN SUBBASE GRANULAR (M3)	**1,997.19**	
				SUBBASE GRANULAR CLASE A			
PR41+520	PR41+510	10.00	2.06	2.06	2.06	20.58	Vo. Correspondientes a cajeos
PR41+510	PR41+500	10.00	2.06	2.06	2.06	20.58	
PR41+500	PR41+490	10.00	2.06	2.06	2.06	20.58	
PR41+490	PR41+480	10.00	2.06	2.06	2.06	20.58	
PR41+480	PR41+470	10.00	2.06	3.91	2.98	29.84	
PR41+470	PR41+460	10.00	3.91	3.91	3.91	39.10	
PR41+460	PR41+450	10.00	3.91	3.91	3.91	39.10	
PR41+450	PR41+440	10.00	3.91	3.91	3.91	39.10	
PR41+440	PR41+430	10.00	3.91	6.23	5.07	50.68	
PR41+430	PR41+420	10.00	6.23	4.17	5.20	51.96	
PR41+420	PR41+410	10.00	4.17	4.17	4.17	41.67	
PR41+410	PR41+400	10.00	4.17	4.17	4.17	41.67	
PR41+400	PR41+390	10.00	4.17	4.17	4.17	41.67	
PR41+390	PR41+380	10.00	4.17	7.77	5.97	59.69	
PR41+380	PR41+370	10.00	7.77	7.77	7.77	77.72	
PR41+370	PR41+360	10.00	7.77	4.89	6.33	63.31	Cajeo - Conformación lateral y Perfilación de talud
PR41+360	PR41+350	10.00	4.89	4.89	4.89	48.91	
PR41+350	PR41+340	10.00	2.58	4.89	3.73	37.33	
PR41+340	PR41+330	10.00	4.89	4.89	4.89	48.91	Cajeo - Conformación lateral y Perfilación de talud
PR41+330	PR41+320	10.00	4.89	2.58	3.73	37.33	
PR41+320	PR41+310	10.00	2.58	2.58	2.58	25.76	Cajeo - Conformación lateral y Perfilación de talud
PR41+310	PR41+300	10.00	2.58	9.81	6.19	61.93	
PR41+300	PR41+290	10.00	9.81	9.81	9.81	98.11	
PR41+290	PR41+280	10.00	9.81	9.81	9.81	98.11	
PR41+280	PR41+270	10.00	9.81	3.18	6.50	64.97	
PR41+270	PR41+260	10.00	3.18	3.18	3.18	31.83	
						1211.04	
PR40+300	PR40+290	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	Vo. Correspondientes a cajeos
PR40+290	PR40+280	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
PR40+280	PR40+270	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
PR40+270	PR40+260	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
PR40+260	PR40+250	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
PR40+250	PR40+240	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
PR40+240	PR40+230	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
						162.06	
PR40+150	PR40+140	10.00	4.67	4.67	4.67	46.67	Cajeo - Conformación lateral margen izquierdo
PR40+140	PR40+130	10.00	4.67	4.67	4.67	46.67	
PR40+130	PR40+120	10.00	4.67	4.67	4.67	46.67	
						140.00	
PR40+050	PR40+040	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	Mejoramiento
						23.15	
PR39+860	PR39+850	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR39+850	PR39+840	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
						46.30	
PR39+810	PR39+800	10.00	0.93	0.93	0.93	9.26	Vo. Correspondiente a cajeo
PR39+800	PR39+790	10.00	0.93	0.93	0.93	9.26	
PR39+790	PR39+780	10.00	0.93	3.24	2.08	20.83	
PR39+780	PR39+770	10.00	3.24	3.24	3.24	32.41	
						71.76	
PR39+760	PR39+750	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+750	PR39+740	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+740	PR39+730	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+730	PR39+720	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+720	PR39+710	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+710	PR39+700	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+700	PR39+690	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+690	PR39+680	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+680	PR39+670	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
PR39+670	PR39+660	10.00	1.12	1.12	1.12	11.20	
						112.00	
PR38+610	PR38+600	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	Cajeo - Conformación lateral y perfilación de talud
PR38+600	PR38+590	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	
						46.30	
PR38+510	PR38+500	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+500	PR38+490	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+490	PR38+480	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+480	PR38+470	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+470	PR38+460	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+460	PR38+450	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+450	PR38+440	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+440	PR38+430	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
PR38+430	PR38+420	10.00	1.80	1.80	1.80	18.01	
						162.08	
PR38+350	PR38+340	10.00	2.32	2.32	2.32	23.15	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	7,867.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
						23.15	
PR38+250	PR38+240	10.00	3.60	3.60	3.60	36.01	
PR38+240	PR38+230	10.00	3.60	3.60	3.60	36.01	
PR38+230	PR38+220	10.00	3.60	3.60	3.60	36.01	
PR38+220	PR38+210	10.00	3.60	3.60	3.60	36.01	
PR38+210	PR38+200	10.00	3.60	1.29	2.44	24.44	
PR38+200	PR38+190	10.00	1.29	1.29	1.29	12.86	
PR38+190	PR38+180	10.00	1.29	1.29	1.29	12.86	
PR38+180	PR38+170	10.00	1.29	1.29	1.29	12.86	
PR38+170	PR38+160	10.00	1.29	1.29	1.29	12.86	Excavaciones de cunetas - Perfilación de talud
PR38+160	PR38+150	10.00	1.29	1.29	1.29	12.86	
PR38+150	PR38+140	10.00	1.29	1.29	1.29	12.86	
						245.65	
PR38+130	PR38+120	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	
PR38+120	PR38+110	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	
PR38+110	PR38+100	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	
PR38+100	PR38+090	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	
PR38+090	PR38+080	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR38+080	PR38+070	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	
PR38+070	PR38+060	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	
PR38+060	PR38+050	10.00	4.37	4.37	4.37	43.70	
						349.60	
PR37+990	PR37+980	10.00	4.05	9.61	6.83	68.30	
PR37+980	PR37+970	10.00	5.56	5.56	5.56	55.56	
PR37+970	PR37+960	10.00	5.56	5.56	5.56	55.56	
PR37+960	PR37+950	10.00	5.56	5.56	5.56	55.56	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR37+950	PR37+940	10.00	5.56	5.56	5.56	55.56	
PR37+940	PR37+930	10.00	5.56	5.56	5.56	55.56	
						346.08	
PR37+920	PR37+910	10.00	2.89	2.89	2.89	28.94	
PR37+910	PR37+900	10.00	2.89	2.89	2.89	28.94	
PR37+900	PR37+890	10.00	2.89	2.89	2.89	28.94	Obra de drenaje - Mejoramiento
PR37+890	PR37+880	10.00	2.89	2.89	2.89	28.94	
						115.77	
PR37+470	PR37+460	10.00	7.72	7.72	7.72	77.18	
PR37+460	PR37+450	10.00	7.72	8.88	8.30	82.96	
PR37+450	PR37+440	10.00	8.88	4.24	6.56	65.60	
						225.74	
PR37+410	PR37+400	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+400	PR37+390	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+390	PR37+380	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	Vo. Correspondientes a cajeo
PR37+380	PR37+370	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+370	PR37+360	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+360	PR37+350	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+350	PR37+340	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+340	PR37+330	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+330	PR37+320	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+320	PR37+310	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	Cajeo - Conformación lateral y perfilación de talud
PR37+310	PR37+300	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+300	PR37+290	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+290	PR37+280	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+280	PR37+270	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+270	PR37+260	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+260	PR37+250	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+250	PR37+240	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+240	PR37+230	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+230	PR37+220	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+220	PR37+210	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+210	PR37+200	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	Vo. Correspondientes a cajeo
PR37+200	PR37+190	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+190	PR37+180	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+180	PR37+170	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+170	PR37+160	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+160	PR37+150	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+150	PR37+140	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+140	PR37+130	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+130	PR37+120	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+120	PR37+110	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+110	PR37+100	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+100	PR37+090	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	Cajeo - Conformación lateral y perfilación de talud
PR37+090	PR37+080	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+080	PR37+070	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+070	PR37+060	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
PR37+060	PR37+050	10.00	5.42	5.42	5.42	54.17	
						1950.00	
PR37+010	PR37+000	10.00	3.47	3.47	3.47	34.73	
PR37+000	PR36+990	10.00	3.47	3.47	3.47	34.73	
PR36+990	PR36+980	10.00	3.47	3.47	3.47	34.73	
						104.18	
PR36+970	PR36+960	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	7,867.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR36+960	PR36+950	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	Vo. Correspondientes a cajeo
PR36+950	PR36+940	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	
PR36+940	PR36+930	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	
PR36+930	PR36+920	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	
PR36+920	PR36+910	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	
PR36+910	PR36+900	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	
PR36+900	PR36+890	10.00	5.78	5.78	5.78	57.75	
						462.00	
PR39+850	PR39+845	5.00	5.62	5.62	5.62	28.10	Mejoramiento en obras de drenaje
PR39+510	PR39+505	5.00	3.60	3.60	3.60	18.00	
PR40+430	PR40+427	3.00	9.00	9.00	9.00	27.00	
						73.10	
					TOTAL VOLUMEN SUBBASE GRANULAR CLASE A (M3)	**5,869.96**	
					TOTAL VOLUMEN (M3)	**7,867.00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUBBASE GRANULAR



PR41+520



PR41+410



PR41+520



PR41+520

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	7,867.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES





SUBBASE GRANULAR DESDE PR39+760 - PR39+670

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUBBASE GRANULAR CLASE A



PR40+150 - PR40+140



PR38+060 - PR38+050



PR41+300 - PR41+260



PR39+510

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	7,867.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES



PR37+090 - PR37+080


PR37+110 - PR37+090 LADO IZQUIERDO


PR37+180 - PR37+125


PR35+350

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	3,042.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR41+530	PR41+520	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+520	PR41+510	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+510	PR41+500	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+500	PR41+490	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+490	PR41+480	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+480	PR41+470	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+470	PR41+460	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+460	PR41+450	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+450	PR41+440	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+440	PR41+430	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+430	PR41+420	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+420	PR41+410	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+410	PR41+400	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+400	PR41+390	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+390	PR41+380	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+380	PR41+370	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+370	PR41+360	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+360	PR41+350	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+350	PR41+340	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+340	PR41+330	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+330	PR41+320	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+320	PR41+310	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+310	PR41+300	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+300	PR41+290	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+290	PR41+280	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+280	PR41+270	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+270	PR41+260	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR41+260	PR41+250	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						546.00	
PR40+470	PR40+460	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+460	PR40+450	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+450	PR40+440	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+440	PR40+430	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+430	PR40+420	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+420	PR40+410	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+410	PR40+400	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						136.50	
PR40+140	PR40+130	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+130	PR40+120	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+120	PR40+110	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+110	PR40+100	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+100	PR40+090	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+090	PR40+080	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+080	PR40+070	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+070	PR40+060	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+060	PR40+050	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+050	PR40+040	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+040	PR40+030	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+030	PR40+020	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+020	PR40+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+010	PR40+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR40+000	PR39+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+990	PR39+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+980	PR39+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+970	PR39+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+960	PR39+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+950	PR39+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+940	PR39+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+930	PR39+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+920	PR39+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+910	PR39+900	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+900	PR39+890	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+890	PR39+880	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+880	PR39+870	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+870	PR39+860	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+860	PR39+850	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+850	PR39+840	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+840	PR39+830	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+830	PR39+820	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+820	PR39+810	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+810	PR39+800	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+800	PR39+790	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+790	PR39+780	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+780	PR39+770	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+770	PR39+760	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+760	PR39+750	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+750	PR39+740	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+740	PR39+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+730	PR39+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+720	PR39+710	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+710	PR39+700	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+700	PR39+690	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						877.50	
PR39+520	PR39+510	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR39+510	PR39+500	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	3,042.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
						39.00	
PR38+740	PR38+730	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+730	PR38+720	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+720	PR38+710	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+710	PR38+700	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+700	PR38+690	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+690	PR38+680	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+680	PR38+670	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+670	PR38+660	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+660	PR38+650	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+650	PR38+640	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+640	PR38+630	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+630	PR38+620	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+620	PR38+610	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+610	PR38+600	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+600	PR38+590	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+590	PR38+580	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+580	PR38+570	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+570	PR38+560	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+560	PR38+550	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+550	PR38+540	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+540	PR38+530	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+530	PR38+520	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+520	PR38+510	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+510	PR38+500	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+500	PR38+490	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+490	PR38+480	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+480	PR38+470	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+470	PR38+460	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+460	PR38+450	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+450	PR38+440	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+440	PR38+430	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+430	PR38+420	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+420	PR38+410	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+410	PR38+400	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+400	PR38+390	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+390	PR38+380	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+380	PR38+370	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+370	PR38+360	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+360	PR38+350	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+350	PR38+340	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+340	PR38+330	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+330	PR38+320	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+320	PR38+310	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+310	PR38+300	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+300	PR38+290	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+290	PR38+280	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+280	PR38+270	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+270	PR38+260	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+260	PR38+250	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+250	PR38+240	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+240	PR38+230	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+230	PR38+220	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+220	PR38+210	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+210	PR38+200	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+200	PR38+190	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+190	PR38+180	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+180	PR38+170	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+170	PR38+160	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+160	PR38+150	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+150	PR38+140	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+140	PR38+130	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+130	PR38+120	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+120	PR38+110	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+110	PR38+100	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+100	PR38+090	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+090	PR38+080	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+080	PR38+070	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+070	PR38+060	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+060	PR38+050	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+050	PR38+040	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+040	PR38+030	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+030	PR38+020	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+020	PR38+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR38+010	PR38+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						1443.00	
					TOTAL VOLUMEN (M3)	3,042.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	3,042.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





BASE GRANULAR DEL PR40+350 - PR40+150





BASE GRANULAR DEL PR40+080 - PR39+850





BASE GRANULAR DEL PR40+080 - PR39+770

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	3,042.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	





BASE GRANULAR DEL PR40+080 - PR39+480

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	19,872.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	
PR41+530	PR41+520	10.00	9.20	92.00	
PR41+520	PR41+510	10.00	9.20	92.00	
PR41+510	PR41+500	10.00	9.20	92.00	
PR41+500	PR41+490	10.00	9.20	92.00	
PR41+490	PR41+480	10.00	9.20	92.00	
PR41+480	PR41+470	10.00	9.20	92.00	
PR41+470	PR41+460	10.00	9.20	92.00	
PR41+460	PR41+450	10.00	9.20	92.00	
PR41+450	PR41+440	10.00	9.20	92.00	
PR41+440	PR41+430	10.00	9.20	92.00	
PR41+430	PR41+420	10.00	9.20	92.00	
PR41+420	PR41+410	10.00	9.20	92.00	
PR41+410	PR41+400	10.00	9.20	92.00	
PR41+400	PR41+390	10.00	9.20	92.00	
PR41+390	PR41+380	10.00	9.20	92.00	
PR41+380	PR41+370	10.00	9.20	92.00	
PR41+370	PR41+360	10.00	9.20	92.00	
PR41+360	PR41+350	10.00	9.20	92.00	
PR41+350	PR41+340	10.00	9.20	92.00	
PR41+340	PR41+330	10.00	9.20	92.00	
PR41+330	PR41+320	10.00	9.20	92.00	
PR41+320	PR41+310	10.00	9.20	92.00	
PR41+310	PR41+300	10.00	9.20	92.00	
PR41+300	PR41+290	10.00	9.20	92.00	
PR41+290	PR41+280	10.00	9.20	92.00	
PR41+280	PR41+270	10.00	9.20	92.00	
PR41+270	PR41+260	10.00	9.20	92.00	
PR40+370	PR40+360	10.00	9.20	92.00	
PR40+360	PR40+350	10.00	9.20	92.00	
PR40+350	PR40+340	10.00	9.20	92.00	
PR40+340	PR40+330	10.00	9.20	92.00	
PR40+330	PR40+320	10.00	9.20	92.00	
PR40+320	PR40+310	10.00	9.20	92.00	
PR40+310	PR40+300	10.00	9.20	92.00	
PR40+300	PR40+290	10.00	9.20	92.00	
PR40+290	PR40+280	10.00	9.20	92.00	
PR40+280	PR40+270	10.00	9.20	92.00	
PR40+270	PR40+260	10.00	9.20	92.00	
PR40+260	PR40+250	10.00	9.20	92.00	
PR40+250	PR40+240	10.00	9.20	92.00	
PR40+240	PR40+230	10.00	9.20	92.00	
PR40+230	PR40+220	10.00	9.20	92.00	
PR40+220	PR40+210	10.00	9.20	92.00	
PR40+210	PR40+200	10.00	9.20	92.00	
PR40+200	PR40+190	10.00	9.20	92.00	
PR40+190	PR40+180	10.00	9.20	92.00	
PR40+180	PR40+170	10.00	9.20	92.00	
PR40+170	PR40+160	10.00	9.20	92.00	
PR40+160	PR40+150	10.00	9.20	92.00	
PR40+150	PR40+140	10.00	9.20	92.00	
PR40+140	PR40+130	10.00	9.20	92.00	
PR40+130	PR40+120	10.00	9.20	92.00	
PR40+120	PR40+110	10.00	9.20	92.00	
PR40+110	PR40+100	10.00	9.20	92.00	
PR40+100	PR40+090	10.00	9.20	92.00	
PR40+090	PR40+080	10.00	9.20	92.00	
PR40+080	PR40+070	10.00	9.20	92.00	
PR40+070	PR40+060	10.00	9.20	92.00	
PR40+060	PR40+050	10.00	9.20	92.00	
PR40+050	PR40+040	10.00	9.20	92.00	
PR40+040	PR40+030	10.00	9.20	92.00	
PR40+030	PR40+020	10.00	9.20	92.00	
PR40+020	PR40+010	10.00	9.20	92.00	
PR40+010	PR40+000	10.00	9.20	92.00	
PR40+000	PR39+990	10.00	9.20	92.00	
PR39+990	PR39+980	10.00	9.20	92.00	
PR39+980	PR39+970	10.00	9.20	92.00	
PR39+970	PR39+960	10.00	9.20	92.00	
PR39+960	PR39+950	10.00	9.20	92.00	
PR39+950	PR39+940	10.00	9.20	92.00	
PR39+940	PR39+930	10.00	9.20	92.00	
PR39+930	PR39+920	10.00	9.20	92.00	
PR39+920	PR39+910	10.00	9.20	92.00	
PR39+910	PR39+900	10.00	9.20	92.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	19,872.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	
PR39+900	PR39+890	10.00	9.20	92.00	
PR39+890	PR39+880	10.00	9.20	92.00	
PR39+880	PR39+870	10.00	9.20	92.00	
PR39+870	PR39+860	10.00	9.20	92.00	
PR39+860	PR39+850	10.00	9.20	92.00	
PR39+850	PR39+840	10.00	9.20	92.00	
PR39+840	PR39+830	10.00	9.20	92.00	
PR39+830	PR39+820	10.00	9.20	92.00	
PR39+820	PR39+810	10.00	9.20	92.00	
PR39+810	PR39+800	10.00	9.20	92.00	
PR39+800	PR39+790	10.00	9.20	92.00	
PR39+790	PR39+780	10.00	9.20	92.00	
PR39+780	PR39+770	10.00	9.20	92.00	
PR39+770	PR39+760	10.00	9.20	92.00	
PR39+760	PR39+750	10.00	9.20	92.00	
PR39+750	PR39+740	10.00	9.20	92.00	
PR39+740	PR39+730	10.00	9.20	92.00	
PR39+730	PR39+720	10.00	9.20	92.00	
PR39+720	PR39+710	10.00	9.20	92.00	
PR39+710	PR39+700	10.00	9.20	92.00	
PR39+700	PR39+690	10.00	9.20	92.00	
PR39+690	PR39+680	10.00	9.20	92.00	
PR39+680	PR39+670	10.00	9.20	92.00	
PR39+670	PR39+660	10.00	9.20	92.00	
PR39+660	PR39+650	10.00	9.20	92.00	
PR39+650	PR39+640	10.00	9.20	92.00	
PR39+640	PR39+630	10.00	9.20	92.00	
PR39+630	PR39+620	10.00	9.20	92.00	
PR39+620	PR39+610	10.00	9.20	92.00	
PR39+610	PR39+600	10.00	9.20	92.00	
PR39+600	PR39+590	10.00	9.20	92.00	
PR39+590	PR39+580	10.00	9.20	92.00	
PR39+580	PR39+570	10.00	9.20	92.00	
PR39+570	PR39+560	10.00	9.20	92.00	
PR39+560	PR39+550	10.00	9.20	92.00	
PR39+550	PR39+540	10.00	9.20	92.00	
PR39+540	PR39+530	10.00	9.20	92.00	
PR39+530	PR39+520	10.00	9.20	92.00	
PR39+520	PR39+510	10.00	9.20	92.00	
PR39+510	PR39+500	10.00	9.20	92.00	
PR39+500	PR39+490	10.00	9.20	92.00	
PR39+490	PR39+480	10.00	9.20	92.00	
PR39+480	PR39+470	10.00	9.20	92.00	
PR39+470	PR39+460	10.00	9.20	92.00	
PR39+460	PR39+450	10.00	9.20	92.00	
PR39+450	PR39+440	10.00	9.20	92.00	
PR39+440	PR39+430	10.00	9.20	92.00	
PR39+430	PR39+420	10.00	9.20	92.00	
PR39+420	PR39+410	10.00	9.20	92.00	
PR39+410	PR39+400	10.00	9.20	92.00	
PR39+400	PR39+390	10.00	9.20	92.00	
PR39+390	PR39+380	10.00	9.20	92.00	
PR39+380	PR39+370	10.00	9.20	92.00	
PR39+370	PR39+360	10.00	9.20	92.00	
PR39+360	PR39+350	10.00	9.20	92.00	
PR39+350	PR39+340	10.00	9.20	92.00	
PR39+340	PR39+330	10.00	9.20	92.00	
PR39+330	PR39+320	10.00	9.20	92.00	
PR39+320	PR39+310	10.00	9.20	92.00	
PR39+310	PR39+300	10.00	9.20	92.00	
PR39+300	PR39+290	10.00	9.20	92.00	
PR39+290	PR39+280	10.00	9.20	92.00	
PR39+280	PR39+270	10.00	9.20	92.00	
PR39+270	PR39+260	10.00	9.20	92.00	
PR39+260	PR39+250	10.00	9.20	92.00	
PR39+250	PR39+240	10.00	9.20	92.00	
PR39+240	PR39+230	10.00	9.20	92.00	
PR39+230	PR39+220	10.00	9.20	92.00	
PR39+220	PR39+210	10.00	9.20	92.00	
PR39+210	PR39+200	10.00	9.20	92.00	
PR39+200	PR39+190	10.00	9.20	92.00	
PR39+190	PR39+180	10.00	9.20	92.00	
PR39+180	PR39+170	10.00	9.20	92.00	
PR39+170	PR39+160	10.00	9.20	92.00	
PR39+160	PR39+150	10.00	9.20	92.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	19,872.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	
PR39+150	PR39+140	10.00	9.20	92.00	
PR39+140	PR39+130	10.00	9.20	92.00	
PR39+130	PR39+120	10.00	9.20	92.00	
PR39+120	PR39+110	10.00	9.20	92.00	
PR39+110	PR39+100	10.00	9.20	92.00	
PR39+100	PR39+090	10.00	9.20	92.00	
PR39+090	PR39+080	10.00	9.20	92.00	
PR39+080	PR39+070	10.00	9.20	92.00	
PR39+070	PR39+060	10.00	9.20	92.00	
PR39+060	PR39+050	10.00	9.20	92.00	
PR39+050	PR39+040	10.00	9.20	92.00	
PR39+040	PR39+030	10.00	9.20	92.00	
PR39+030	PR39+020	10.00	9.20	92.00	
PR39+020	PR39+010	10.00	9.20	92.00	
PR39+010	PR39+000	10.00	9.20	92.00	
PR39+000	PR38+990	10.00	9.20	92.00	
PR38+990	PR38+980	10.00	9.20	92.00	
PR38+980	PR38+970	10.00	9.20	92.00	
PR38+970	PR38+960	10.00	9.20	92.00	
PR38+960	PR38+950	10.00	9.20	92.00	
PR38+950	PR38+940	10.00	9.20	92.00	
PR38+940	PR38+930	10.00	9.20	92.00	
PR38+930	PR38+920	10.00	9.20	92.00	
PR38+920	PR38+910	10.00	9.20	92.00	
PR38+910	PR38+900	10.00	9.20	92.00	
PR38+900	PR38+890	10.00	9.20	92.00	
PR38+890	PR38+880	10.00	9.20	92.00	
PR38+880	PR38+870	10.00	9.20	92.00	
PR38+870	PR38+860	10.00	9.20	92.00	
PR38+860	PR38+850	10.00	9.20	92.00	
PR38+850	PR38+840	10.00	9.20	92.00	
PR38+840	PR38+830	10.00	9.20	92.00	
PR38+830	PR38+820	10.00	9.20	92.00	
PR38+820	PR38+810	10.00	9.20	92.00	
PR38+810	PR38+800	10.00	9.20	92.00	
PR38+800	PR38+790	10.00	9.20	92.00	
PR38+790	PR38+780	10.00	9.20	92.00	
PR38+740	PR38+730	10.00	9.20	92.00	
PR38+730	PR38+720	10.00	9.20	92.00	
PR38+720	PR38+710	10.00	9.20	92.00	
PR38+710	PR38+700	10.00	9.20	92.00	
PR38+700	PR38+690	10.00	9.20	92.00	
PR38+690	PR38+680	10.00	9.20	92.00	
PR38+680	PR38+670	10.00	9.20	92.00	
PR38+670	PR38+660	10.00	9.20	92.00	
PR38+660	PR38+650	10.00	9.20	92.00	
PR38+650	PR38+640	10.00	9.20	92.00	
PR38+640	PR38+630	10.00	9.20	92.00	
PR38+630	PR38+620	10.00	9.20	92.00	
PR38+620	PR38+610	10.00	9.20	92.00	
PR38+610	PR38+600	10.00	9.20	92.00	
PR38+600	PR38+590	10.00	9.20	92.00	
PR38+590	PR38+580	10.00	9.20	92.00	
PR38+580	PR38+570	10.00	9.20	92.00	
PR38+570	PR38+560	10.00	9.20	92.00	
PR38+560	PR38+550	10.00	9.20	92.00	
PR38+550	PR38+540	10.00	9.20	92.00	
PR38+540	PR38+530	10.00	9.20	92.00	
PR38+530	PR38+520	10.00	9.20	92.00	
PR38+520	PR38+510	10.00	9.20	92.00	
PR38+510	PR38+500	10.00	9.20	92.00	
PR38+500	PR38+490	10.00	9.20	92.00	
PR38+490	PR38+480	10.00	9.20	92.00	
PR38+480	PR38+470	10.00	9.20	92.00	
PR38+470	PR38+460	10.00	9.20	92.00	
PR38+460	PR38+450	10.00	9.20	92.00	
PR38+450	PR38+440	10.00	9.20	92.00	
			TOTAL	19,872.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	19,872.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO





RIEGO DE IMPRIMACIÓN PR40+080 - PR39+770




RIEGO DE IMPRIMACIÓN PR40+150




RIEGO DE IMPRIMACIÓN PR38+740

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	1,188.80	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR41+530	PR41+520	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+520	PR41+510	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+510	PR41+500	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+500	PR41+490	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+490	PR41+480	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+480	PR41+470	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+470	PR41+460	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+460	PR41+450	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+450	PR41+440	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+440	PR41+430	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+430	PR41+420	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+420	PR41+410	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+410	PR41+400	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+400	PR41+390	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+390	PR41+380	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+380	PR41+370	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+370	PR41+360	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+360	PR41+350	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+350	PR41+340	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+340	PR41+330	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+330	PR41+320	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+320	PR41+310	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+310	PR41+300	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+300	PR41+290	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+290	PR41+280	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+280	PR41+270	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR41+270	PR41+260	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						135.27	
PR40+370	PR40+360	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+360	PR40+350	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+340	PR40+330	10.00	0.50	0.55	0.52	5.24	
PR40+330	PR40+320	10.00	0.55	0.67	0.61	6.09	
PR40+320	PR40+310	10.00	0.67	0.81	0.74	7.40	
PR40+310	PR40+300	10.00	0.81	0.90	0.85	8.53	
PR40+300	PR40+290	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+290	PR40+280	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+280	PR40+270	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+270	PR40+260	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+260	PR40+250	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+250	PR40+240	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+240	PR40+230	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+230	PR40+220	10.00	0.90	0.90	0.90	8.97	
PR40+220	PR40+210	10.00	0.90	0.82	0.86	8.59	
PR40+210	PR40+200	10.00	0.82	0.71	0.76	7.64	
PR40+200	PR40+190	10.00	0.71	0.60	0.65	6.54	
PR40+190	PR40+180	10.00	0.60	0.50	0.55	5.50	
PR40+180	PR40+170	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+170	PR40+160	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+160	PR40+150	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+150	PR40+140	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+140	PR40+130	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+130	PR40+120	10.00	0.50	0.57	0.54	5.36	
PR40+120	PR40+110	10.00	0.57	0.71	0.64	6.39	
PR40+110	PR40+100	10.00	0.71	0.79	0.75	7.49	
PR40+100	PR40+090	10.00	0.79	0.82	0.81	8.05	
PR40+090	PR40+080	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR40+080	PR40+070	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR40+070	PR40+060	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR40+060	PR40+050	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR40+050	PR40+040	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR40+040	PR40+030	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR40+030	PR40+020	10.00	0.82	0.82	0.82	8.20	
PR40+020	PR40+010	10.00	0.82	0.81	0.81	8.14	
PR40+010	PR40+000	10.00	0.81	0.70	0.75	7.53	
PR40+000	PR39+990	10.00	0.70	0.55	0.63	6.25	
PR39+990	PR39+980	10.00	0.55	0.50	0.53	5.27	
PR39+980	PR39+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+970	PR39+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+960	PR39+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+950	PR39+940	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+940	PR39+930	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+930	PR39+920	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+920	PR39+910	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+910	PR39+900	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+900	PR39+890	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+880	PR39+870	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+870	PR39+860	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+860	PR39+850	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+850	PR39+840	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+840	PR39+830	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+830	PR39+820	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+820	PR39+810	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+810	PR39+800	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+800	PR39+790	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+790	PR39+780	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+780	PR39+770	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+770	PR39+760	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+760	PR39+750	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+750	PR39+740	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+740	PR39+730	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+730	PR39+720	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+720	PR39+710	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+710	PR39+700	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+700	PR39+690	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+690	PR39+680	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+680	PR39+670	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+670	PR39+660	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+660	PR39+650	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+650	PR39+640	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+640	PR39+630	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+630	PR39+620	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+620	PR39+610	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+610	PR39+600	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+600	PR39+590	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+590	PR39+580	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+580	PR39+570	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+570	PR39+560	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+560	PR39+550	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+550	PR39+540	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+540	PR39+530	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+530	PR39+520	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+520	PR39+510	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+510	PR39+500	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	1,188.80	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR39+500	PR39+490	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+490	PR39+480	10.00	0.58	0.58	0.58	5.83	
PR39+480	PR39+470	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+470	PR39+460	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+460	PR39+450	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+450	PR39+440	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+440	PR39+430	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+430	PR39+420	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+420	PR39+410	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+410	PR39+400	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+400	PR39+390	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+390	PR39+380	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+380	PR39+370	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+370	PR39+360	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+360	PR39+350	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+350	PR39+340	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+340	PR39+330	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+330	PR39+320	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+320	PR39+310	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+310	PR39+300	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+300	PR39+290	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+290	PR39+280	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+280	PR39+270	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+270	PR39+260	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+260	PR39+250	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+250	PR39+240	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+240	PR39+230	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+230	PR39+220	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+220	PR39+210	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+210	PR39+200	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+200	PR39+190	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+190	PR39+180	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+180	PR39+170	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+170	PR39+160	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+160	PR39+150	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+150	PR39+140	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+140	PR39+130	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+130	PR39+120	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+120	PR39+110	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+110	PR39+100	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+100	PR39+090	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+090	PR39+080	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+080	PR39+070	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+070	PR39+060	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+060	PR39+050	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+050	PR39+040	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+040	PR39+030	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+030	PR39+020	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+020	PR39+010	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+010	PR39+000	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR39+000	PR38+990	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+990	PR38+980	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+980	PR38+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+970	PR38+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+960	PR38+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+950	PR38+940	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+940	PR38+930	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+930	PR38+920	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+920	PR38+910	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+910	PR38+900	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+900	PR38+890	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+890	PR38+880	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+880	PR38+870	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+870	PR38+860	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+860	PR38+850	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+850	PR38+840	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+840	PR38+830	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+830	PR38+820	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+820	PR38+810	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+810	PR38+800	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+800	PR38+790	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+790	PR38+780	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						903.23	
PR38+740	PR38+730	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+730	PR38+720	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+720	PR38+710	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+710	PR38+700	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+700	PR38+690	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+690	PR38+680	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+680	PR38+670	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+670	PR38+660	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+660	PR38+650	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+650	PR38+640	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+640	PR38+630	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+630	PR38+620	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+620	PR38+610	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+610	PR38+600	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+600	PR38+590	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+590	PR38+580	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+580	PR38+570	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+570	PR38+560	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+560	PR38+550	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+550	PR38+540	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+540	PR38+530	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+530	PR38+520	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+520	PR38+510	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+510	PR38+500	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+500	PR38+490	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+490	PR38+480	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+480	PR38+470	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+470	PR38+460	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+460	PR38+450	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+450	PR38+440	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						150.30	
					TOTAL	**1188.80**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ASFALTO EN PRIMERA CAPA



CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	1,188.80	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	





PR39+480 - PR38+820





PR38+740 - PR38+380





PR41+530 - PR41+270

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	210.00	m3

ALCANTARILLAS		DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA		LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR44+010	PR43+946	64	1.20	0.65	49.92	EXCAVACIÓN PARA CANAL DE VIA
PR44+710	PR44+600	110	1.20	0.55	72.60	EXCAVACIÓN PARA CANAL DE VIA
PR42+020		5.00	3.00	2.40	36.00	ENCOLE
PR39+510		5.00	2.00	1.50	15.00	DESCOLE
PR38+130		5.00	4.00	1.80	36.00	DESCOLE
				TOTAL	210.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



CANAL PR44+710





CANAL PR44+010





PR42+020





PR38+130




PR39+510

FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	07/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	36.50	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES							OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN DE TUBO (m3)	VOLUMEN (m3)	
		ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR39+510	1.90	1.43	1.73		0.25		0.75	Aleta margen derecho 1
	1.90	1.43	1.73		0.25		0.75	Aleta margen derecho 2
	1.28	2.30	4.86		0.30		1.37	Zarpa margen derecho
		4.86		0.25	0.30		0.36	Dentellón margen derecho
	2.03	1.77			0.25	0.95	0.66	Cabezal margen derecho
	1.53	4.86	2.30		0.30		1.64	Zarpa margen izquierdo
		4.86		0.25	0.30		0.36	Dentellón margen izquierdo
PR39+745		1.90		0.90	0.25		0.43	Ampliación de box culvert - caja
PR40+040	1.53	2.20	4.86		0.30		1.62	Zarpa margen derecho
PR40+430	2.70			4.00	0.40		4.32	Zapatas paso fauna margen izquierdo
	2.40			3.00	0.30		2.16	
	12.30	2.40			0.37	0.70	10.66	Aletas margen derecho
PR41+735		1.50		3.30	0.30		1.49	Zapata prolongación de muro margen izquierdo
	3.00	1.92	1.60		0.25		1.32	Aleta margen izquierdo
PR43+170		2.90		6.00	0.40		6.96	Zarpa de muro modulo 3
		0.70		6.00	0.40		1.68	Dentellón muro modulo 3
					TOTAL		36.50	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR39+510



PR39+510



PR40+430



PR41+735



PR39+745

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	66.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES								OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	VOLUMEN DE TUBERÍA	ANCHO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR39+510		9.60			0.810			7.78	Atraque para tubería
	1.60	9.60		0.20				3.07	Placa sobre tubería
PR40+430	1.60	5.75	1.10		0.550			4.66	Solado de tubería
PR40+040		5.00			0.810			4.05	Atraque para tubería
CANAL PR44+710 - PR44+600		1.00	55.00	0.15				8.25	Piso de canal de via
	1.15		55.00	0.15				9.49	Borde de canal a via + bordillo
	0.45		55.00	0.15				3.71	Borde de canal
CANAL PR44+010 - PR43+946		1.00	64.00	0.15				9.60	Piso de canal de via
	1.15		64.00	0.15				11.04	Borde de canal a via + bordillo
	0.45		64.00	0.15				4.32	Borde de canal
							TOTAL	66.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR44+010 PISO CANAL DE VIA




PR44+010 CANAL DE VIA




PR40+040



PR39+510



PR39+510



PR39+510

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	29.30	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	
PR44+470		4.65	9.00	0.120	5.02	Concreto ciclopeo
PR41+735		1.50	3.30	0.100	0.50	Solado prolongación de muro
PR40+430		2.95	10.00	0.100	2.95	Solado paara tubería faltante en paso fauna
		2.60	3.10	0.100	0.81	Solado aletas margen izquierdo
PR40+040		1.70	5.00	0.100	0.85	Solado para tubería
PR39+510		1.60	10.00	0.100	1.60	Solado para tubería
	1.28	2.60	4.70	0.070	0.33	Solado aletas
CANAL PR44+710		1.40	90.00	0.080	10.08	Solado para construcción de canal de via
CANAL PR44+010		1.40	64.00	0.080	7.17	Solado para construcción de canal de via
				TOTAL	29.30	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





CANAL PR44+710







CANAL PR44+010



PR44+470 CICLOPEO

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	1,777.10	kg

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR41+735	1/2"	1.80	32.00	0.996	57.37	PROLONGACIÓN DE ALETA - ACERO DE ZAPATA
	1/2"	3.20	14.00	0.996	44.62	
	1/2"	2.50	2.00	0.996	4.98	
	1/2"	2.46	2.00	0.996	4.90	
	1/2"	2.43	2.00	0.996	4.84	
	1/2"	2.41	2.00	0.996	4.80	
	1/2"	2.38	2.00	0.996	4.74	
	1/2"	2.35	2.00	0.996	4.68	
	1/2"	2.33	4.00	0.996	9.28	
	1/2"	2.28	2.00	0.996	4.54	
	1/2"	2.23	6.00	0.996	13.33	
	1/2"	2.17	2.00	0.996	4.32	
	1/2"	2.12	6.00	0.996	12.67	
	1/2"	3.00	14.00	0.996	41.83	
	1/2"	3.45	3.00	0.996	10.31	ACERO DE GUARDARUEDA
	1/2"	3.75	3.00	0.996	11.21	
	1/2"	2.45	7.00	0.996	17.08	
	1/2"	2.28	7.00	0.996	15.90	
	1/2"	2.15	4.00	0.996	8.57	
	1/2"	0.82	5.00	0.996	4.08	ACERO PARA AMARRE DE MURO
	1/2"	0.90	5.00	0.996	4.48	
	1/2"	0.85	5.00	0.996	4.23	
	1/2"	1.00	5.00	0.996	4.98	
				TOTAL DE ACERO DE ALCANTARILLA KG	**297.74**	
PR39+510	1/2"	1.50	98.00	0.996	146.41	ACERO PARILLA DOBLE SOBRE TUBERÍA
	1/2"	9.50	14.00	0.996	132.47	
	1/2"	5.84	1.00	0.996	5.82	ACERO MARGEN MARGEN IZQUIERDO CARA INTERNA Y EXTERNA
	1/2"	6.08	1.00	0.996	6.06	
	1/2"	6.30	1.00	0.996	6.27	
	1/2"	6.53	1.00	0.996	6.50	
	1/2"	6.76	1.00	0.996	6.73	
	1/2"	6.96	1.00	0.996	6.93	
	1/2"	2.50	6.00	0.996	14.94	
	1/2"	2.45	6.00	0.996	14.64	
	1/2"	2.35	4.00	0.996	9.36	
	1/2"	2.40	4.00	0.996	9.56	
	1/2"	5.90	1.00	0.996	5.88	
	1/2"	4.45	1.00	0.996	4.43	
	1/2"	3.15	2.00	0.996	6.27	
	1/2"	2.31	6.00	0.996	13.80	GANCHOS MARGEN IZQUIERDO
	1/2"	2.16	2.00	0.996	4.30	
	1/2"	1.97	2.00	0.996	3.92	
	1/2"	1.75	2.00	0.996	3.49	
	1/2"	1.56	2.00	0.996	3.11	
	1/2"	1.32	2.00	0.996	2.63	
	1/2"	0.85	20.00	0.996	16.93	
	1/2"	1.28	2.00	0.996	2.55	GUARDARUEDA MARGEN IZQUIERDO
	1/2"	1.23	2.00	0.996	2.45	
	1/2"	1.20	2.00	0.996	2.39	
	1/2"	1.19	2.00	0.996	2.37	
	1/2"	1.17	2.00	0.996	2.33	
	1/2"	2.16	6.00	0.996	12.91	
	1/2"	2.01	2.00	0.996	4.00	ACERO PARRILLA SUPERIOR MARGEN IZQUIERDO
	1/2"	1.82	2.00	0.996	3.63	
	1/2"	1.60	2.00	0.996	3.19	
	1/2"	1.71	2.00	0.996	3.41	
	1/2"	1.17	2.00	0.996	2.33	
	1/2"	1.66	6.00	0.996	9.92	
	1/2"	2.40	1.00	0.996	2.39	
	1/2"	2.70	1.00	0.996	2.69	
	1/2"	2.98	1.00	0.996	2.97	
	1/2"	3.27	1.00	0.996	3.26	ALETAS DE ACERO Y ZARPA MARGEN DERECHO
	1/2"	3.56	1.00	0.996	3.55	
	1/2"	3.82	1.00	0.996	3.80	
	1/2"	4.12	1.00	0.996	4.10	
	1/2"	4.40	1.00	0.996	4.38	
	1/2"	4.71	1.00	0.996	4.69	
	1/2"	6.16	1.00	0.996	6.14	
	1/2"	6.42	1.00	0.996	6.39	
	1/2"	6.66	1.00	0.996	6.63	
	1/2"	6.89	1.00	0.996	6.86	

	1/2"	7.10	1.00	0.996	7.07	BASTONES MARGEN DERECHO
	1/2"	7.28	1.00	0.996	7.25	
	1/2"	7.52	1.00	0.996	7.49	
	1/2"	7.72	1.00	0.996	7.69	GANCHOS DENTELLÓN
	1/2"	7.97	1.00	0.996	7.94	
				TOTAL ALCANTARILLA KG	**577.22**	
	1/2"	6.82	4.00	0.996	27.17	AMPLIACIÓN CAJA DE BOX CULVERT MARGEN DERECHO
	1/2"	6.89	3.00	0.996	20.59	
	1/2"	3.10	4.00	0.996	12.35	
	1/2"	2.77	22.00	0.996	60.70	
	1/2"	2.15	3.00	0.996	6.42	
	1/2"	1.75	2.00	0.996	3.49	
	1/2"	5.15	5.00	0.996	25.65	
	1/2"	3.55	10.00	0.996	35.36	
	1/2"	1.75	20.00	0.996	34.86	
	1/2"	2.15	16.00	0.996	34.26	
	1/2"	2.00	2.00	0.996	3.98	
	1/2"	3.37	6.00	0.996	20.14	
	1/2"	1.20	2.00	0.996	2.39	GUARDARUEDA MARGEN DERECHO
	1/2"	1.09	2.00	0.996	2.17	
	1/2"	1.06	2.00	0.996	2.11	
	1/2"	1.09	2.00	0.996	2.17	
	1/2"	1.20	2.00	0.996	2.39	
	1/2"	1.90	6.00	0.996	11.35	
	1/2"	2.50	6.00	0.996	14.94	ALETAS Y ACERO DE PARIILA ZARPA ZUPERIOR MARGEN DERECHO
	1/2"	2.40	4.00	0.996	9.56	
	1/2"	2.45	6.00	0.996	14.64	
	1/2"	2.35	4.00	0.996	9.36	
	1/2"	4.10	2.00	0.996	8.17	
	1/2"	2.95	1.00	0.996	2.94	
	1/2"	5.90	1.00	0.996	5.88	
	1/2"	1.00	8.00	0.996	7.97	
	1/2"	1.65	6.00	0.996	9.86	
	1/2"	1.66	6.00	0.996	9.92	
	1/2"	4.36	4.00	0.996	17.37	
	1/2"	2.31	4.00	0.996	9.20	
	1/2"	2.16	2.00	0.996	4.30	
	1/2"	1.97	2.00	0.996	3.92	
PR39+755	1/2"	1.75	2.00	0.996	3.49	
	1/2"	1.56	2.00	0.996	3.11	
	1/2"	1.32	2.00	0.996	2.63	
	1/2"	2.11	5.00	0.996	10.51	
	1/2"	0.85	20.00	0.996	16.93	
	1/2"	3.93	8.00	0.996	31.31	
	1/2"	2.40	1.00	0.996	2.39	
	1/2"	2.70	1.00	0.996	2.69	
	1/2"	2.98	1.00	0.996	2.97	
	1/2"	3.27	1.00	0.996	3.26	
	1/2"	3.56	1.00	0.996	3.55	
	1/2"	3.82	1.00	0.996	3.80	
	1/2"	4.12	1.00	0.996	4.10	
	1/2"	4.40	1.00	0.996	4.38	
	1/2"	4.71	1.00	0.996	4.69	
	1/2"	7.20	1.00	0.996	7.17	
	1/2"	7.42	1.00	0.996	7.39	
	1/2"	7.67	1.00	0.996	7.64	
	1/2"	2.12	2.00	0.996	4.22	BASTONES MARGEN DERECHO
	1/2"	2.09	2.00	0.996	4.16	
	1/2"	2.06	2.00	0.996	4.10	
	1/2"	2.03	2.00	0.996	4.04	
	1/2"	2.00	2.00	0.996	3.98	
	1/2"	1.97	2.00	0.996	3.92	
	1/2"	1.94	2.00	0.996	3.86	
	1/2"	1.91	2.00	0.996	3.80	
	1/2"	1.88	2.00	0.996	3.74	
	1/2"	2.16	4.00	0.996	8.61	PARILLA ZARPA Y ALETAS INFERIOR MARGEN DERECHO
	1/2"	2.01	2.00	0.996	4.00	
	1/2"	1.82	2.00	0.996	3.63	
	1/2"	1.60	2.00	0.996	3.19	
	1/2"	1.47	2.00	0.996	2.93	
	1/2"	1.17	2.00	0.996	2.33	
				TOTAL BOX CULVERT KG	**618.10**	

PR39+850	1/2"	2.50	1	0.996	2.49	ACERO MURO EXTERIOR Y ZARPA INFERIOR MARGEN DERECHO
	1/2"	2.80	1	0.996	2.79	
	1/2"	2.08	1	0.996	2.07	
	1/2"	3.37	1	0.996	3.36	
	1/2"	3.66	1	0.996	3.65	
	1/2"	3.92	1	0.996	3.90	
	1/2"	4.22	1	0.996	4.20	
	1/2"	4.50	1	0.996	4.48	
	1/2"	4.81	1	0.996	4.79	
	1/2"	2.45	12	0.996	29.28	
	1/2"	2.35	14	0.996	32.77	
	1/2"	2.25	6	0.996	13.45	
	1/2"	3.15	2	0.996	6.27	
	1/2"	5.90	1	0.996	5.88	
	1/2"	4.45	1	0.996	4.43	
	1/2"	1.33	2	0.996	2.65	GUARDARUEDA
	1/2"	1.21	2	0.996	2.41	
	1/2"	1.30	2	0.996	2.59	
	1/2"	1.15	2	0.996	2.29	
	1/2"	1.18	2	0.996	2.35	
	1/2"	2.02	2	0.996	4.02	
	1/2"	1.99	2	0.996	3.96	
	1/2"	1.96	2	0.996	3.90	
	1/2"	1.19	2	0.996	2.37	GANCHOS
	1/2"	1.45	2	0.996	2.89	
	1/2"	1.65	2	0.996	3.29	
	1/2"	1.83	1	0.996	1.82	
	1/2"	1.66	1	0.996	1.65	
	1/2"	2.16	1	0.996	2.15	
	1/2"	1.48	1	0.996	1.47	
	1/2"	1.67	1	0.996	1.66	
	1/2"	1.88	1	0.996	1.87	
	1/2"	2.09	1	0.996	2.08	
	1/2"	2.62	4	0.996	10.44	ALETAS MARGEN DERECHO INTERIOR
	1/2"	4.08	4	0.996	16.25	
	1/2"	6.14	1	0.996	6.12	
	1/2"	6.32	1	0.996	6.29	
	1/2"	6.52	1	0.996	6.49	
	1/2"	6.77	1	0.996	6.74	
	1/2"	6.98	1	0.996	6.95	
	1/2"	7.20	1	0.996	7.17	
	1/2"	7.44	1	0.996	7.41	
	1/2"	7.66	1	0.996	7.63	
	1/2"	7.91	1	0.996	7.88	
	1/2"	2.22	2	0.996	4.42	BASTONES MARGEN DERECHO
	1/2"	2.17	2	0.996	4.32	
	1/2"	2.15	2	0.996	4.28	
	1/2"	2.12	2	0.996	4.22	
	1/2"	2.08	2	0.996	4.14	
	1/2"	2.05	2	0.996	4.08	
				TOTAL ACERO MURO KG	**284.06**	
				TOTAL	**1,777.10**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR39+850





PR39+510





PR39+745

FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	25.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR39+510	10.00				10.00	Tubería encole
PR40+040	5.00				5.00	Tubería instalada
PR40+430	10.00				10.00	Tubería instalada
				TOTAL	25.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.




PR40+430



PR40+040



PR40+040




PR39+510

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	17,184.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR41+520	PR36+890	2.32				7,423.00	17,184.25	Vo. Excavaciones
							00	
							00	
							00	
							00	
						TOTAL	17,184.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR36+900




PR37+270



PR38+110



PR40+130

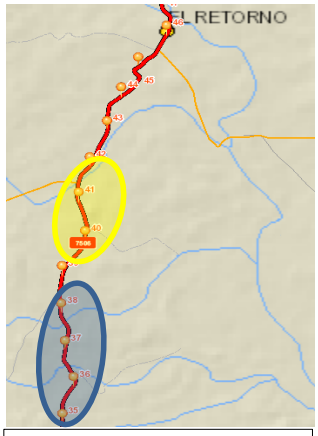

Recorrido transporte de materiales de excavación y llenos

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA Nº 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	2,586,888.00	m3-km

ABSCISAS			DIMENSIONES					
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
Granada Coordenandas Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	236.00	PR41+540	PR41+260	4.33	240.330	752.19	180,773.22	SUBBASEGRANULAR
	236.00	PR40+470	PR40+410	5.07	241.070	181.56	43,769.27	
	236.00	PR39+830	PR39+700	5.82	241.815	363.13	87,809.07	
	236.00	PR39+520	PR39+510	5.95	241.945	51.88	12,550.90	
	236.00	PR38+250	PR38+010	7.56	243.560	648.44	157,933.44	
					TOTAL VOLUMEN DE SUBBASE GRANULAR (m3)	**1,997.19**	0.00	
Fuente de Oro Coordenandas Lat. 3.425163N Long. -73.636824W	218.50	PR41+530	PR41+260	4.33	222.825	546.00	121,662.45	BASE GRANULAR
	218.50	PR40+470	PR40+410	5.07	223.570	136.50	30,517.31	
	218.50	PR40+140	PR39+700	5.97	224.470	877.50	196,972.43	
	218.50	PR39+520	PR39+510	5.95	224.445	39.00	8,753.36	
	218.50	PR38+740	PR38+010	7.81	226.305	1,443.00	326,558.12	
					TOTAL VOLUMEN DE BASE GRANULAR (m3)	**3,042.00**	0.00	
Granada Coordenandas Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	236.00	PR41+520	PR41+260	0.37	236.365	1,211.04	286,248.53	TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A
	236.00	PR40+300	PR40+230	2.35	238.345	162.06	38,625.81	
	236.00	PR40+150	PR40+120	0.84	236.840	140.00	33,157.60	
	236.00	PR40+050	PR40+040	3.45	239.445	23.15	5,543.44	
	236.00	PR39+860	PR39+840	3.56	239.560	46.30	11,092.20	
	236.00	PR39+810	PR39+770	5.22	241.220	71.76	17,309.56	
	236.00	PR39+760	PR39+660	5.07	241.065	112.00	26,999.28	
	236.00	PR38+610	PR38+590	5.41	241.405	46.30	11,177.63	
	236.00	PR38+510	PR38+420	5.45	241.450	162.08	39,133.15	
	236.00	PR38+350	PR38+340	7.02	243.015	23.15	5,626.09	
	236.00	PR38+250	PR38+140	7.25	243.245	245.65	59,754.28	
	236.00	PR38+130	PR38+050	7.62	243.620	349.60	85,169.55	
	236.00	PR37+990	PR37+930	8.06	244.060	346.08	84,463.53	
	236.00	PR37+920	PR37+880	8.06	244.060	115.77	28,254.35	
	236.00	PR37+470	PR37+440	8.06	244.060	225.74	55,093.92	
	236.00	PR37+410	PR37+050	8.06	244.060	1,950.00	475,916.41	
	236.00	PR37+010	PR36+980	8.06	244.060	104.18	25,426.27	
	236.00	PR36+970	PR36+900	8.06	244.060	462.00	112,755.72	
	236.00	PR39+850	PR39+845	8.06	244.060	28.10	6,858.09	
	236.00	PR39+510	PR39+505	8.06	244.060	18.00	4,393.08	
	236.00	PR40+430	PR40+427	8.06	244.060	27.00	6,589.62	
					TOTAL TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A	**5,870.00**	0.00	
						TOTAL	**2,586,888.00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

TRANSPORTE DE BASE GRANULAR





PR40+080 - PR39+770

TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A



PR38+130 - PR38+110 LADO IZQUIERDO



PR38+130 - PR38+110 LADO DERECHO



PR41+300



PR37+110 - PR37+090 LADO IZQUIERDO




PR37+215 - PR37+190 LADO DERECHO




PR37+210

FUENTE DE MATERIALES DE SUBBASE MAS CERCANOS RIO ARIARI TRITURADOS DEL ARIARI A 218.5 KM DE PR45+450

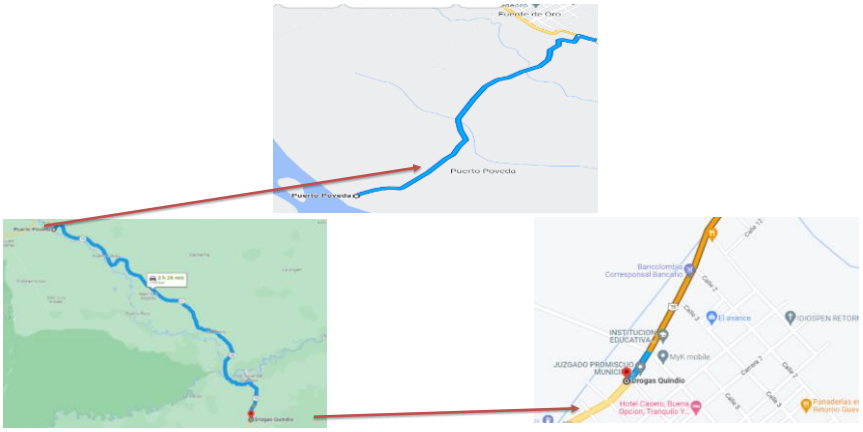


FUENTE DE MATERIALES DE BASE MAS CERCANOS RIO ARIARI MINERALES DEL LLANO A 236 KM DE PR45+450

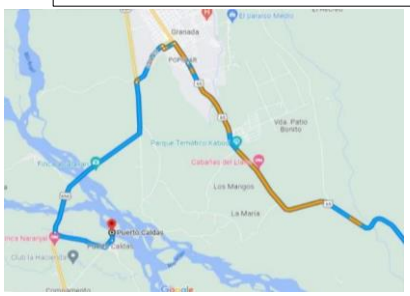



FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR CLASE A 236 KM DE PR45+450

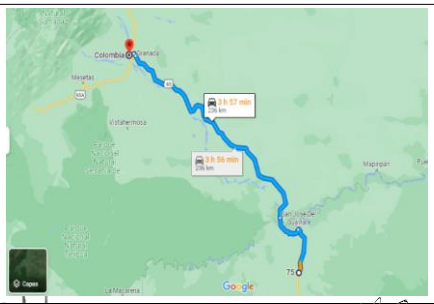

FIRMA		
NOMBRE	**EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA**	**OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ**
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	253,443.00	m3-km

ABSCISAS			DIMENSIONES						OBSERVACIONES
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA				
	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
Fuente de Oro coordenandas (3.425163, -73.636824)	PR41+530	PR41+270	4.31	222.81	5.5%	135.30	127.86	28488.66	Vo. MEZCLA ASFÁLTICA
	PR40+370	PR38+790	7.45	225.95	5.5%	903.41	853.72	192897.82	
	PR38+740	PR38+450	7.15	225.65	5.5%	150.34	142.07	32056.83	
	TOTAL VOLUMEN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE (m3)					1,189.04		0.00	
						TOTAL		253,443.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA






PR39+480 - PR38+820





PR38+740 - PR41+530

TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE FUENTE DE ORO

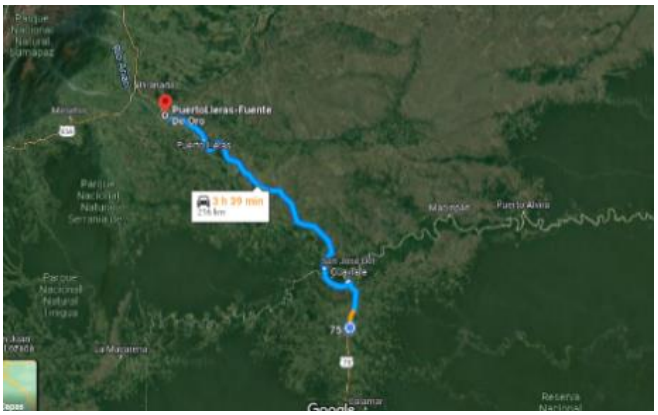

RECORRIDO AGREGADOS PÉTREOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 13

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/junio/2022	06/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	7,423.00	m3-E

ACTIVIDADES	DIMENSIONES			
TRANSPORTE DE	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-E)	OBSERVACIONES
Excavaciones	7,423.00	1.00	7,423.00	
		TOTAL	7,423.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR37+240




PR37+920



PR37+190



PR37+220

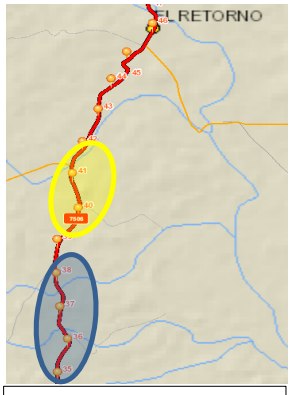

Recorrido de excavaciones

FIRMA		
NOMBRE	EDWIN JAVIER BUSTOS IBARRA	OSCAR FERNANDO ALVARADO DIAZ
CARGO	DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190
