CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
2	Demolición de Estructuras	7.70	m3

ABSCISAS	DIMENSIONES										
INICIO	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	ESPESOR (m)	ÁREA TUBO (m2)	MURO 1 (m)	MURO 2 (m)	ÁREA (m2)	CANTIDAD (und)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR38+135	3.70	1.00	1.25	0.20						0.50	Zarpa costado derecho
		1.50		0.20		0.50	1.05		2.00	5.42	Aletas margen derecho
		1.25	1.30	0.20				0.63		0.20	Cabezal
		1.25	0.25	0.20						0.06	Guardarueda
	3.70	1.00	1.25	0.20						0.50	Zarpa costado izquierdo
		1.50		0.20		0.50	1.05		2.00	0.77	Aletas margen izquierdo
		1.25	1.30	0.20				0.63		0.20	Cabezal
		1.25	0.25	0.20						0.06	Guardarueda
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
										0.00	
									TOTAL	7.70	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







PR38+135

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
3	Remoción de alcantarillas	10.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (m)	
PR38+135	10.00				10.00	
				TOTAL	10.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	1,424.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR43+146	PR43+140	6.00	4.35	4.35	4.35	26.10	Vo. Correspondientes a excavacion para muro
PR43+140	PR43+130	10.00	4.35	4.37	4.36	43.60	
PR43+130	PR43+120	10.00	4.37	4.46	4.42	44.15	
PR43+120	PR43+110	10.00	4.46	4.78	4.62	46.20	
PR43+110	PR43+100	10.00	4.78	4.32	4.55	45.50	
						205.55	
PR38+420	PR38+410	10.00	1.80	1.80	1.80	18.00	Excavación para filtro
PR38+410	PR38+400	10.00	1.80	1.80	1.80	18.00	
PR38+400	PR38+390	10.00	1.80	1.80	1.80	18.00	
PR38+390	PR38+380	10.00	1.80	1.80	1.80	18.00	
PR38+380	PR38+370	10.00	1.80	3.60	2.70	27.00	
PR38+370	PR38+360	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+360	PR38+350	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+350	PR38+340	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+340	PR38+330	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+330	PR38+320	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+320	PR38+310	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+310	PR38+300	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+300	PR38+290	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+290	PR38+280	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+280	PR38+270	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+270	PR38+260	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+260	PR38+250	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+250	PR38+240	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+240	PR38+230	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+230	PR38+220	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+220	PR38+210	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+210	PR38+200	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+200	PR38+190	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+190	PR38+180	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+180	PR38+170	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+170	PR38+160	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+160	PR38+150	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
PR38+150	PR38+140	10.00	3.60	3.60	3.60	36.00	
						927.00	
PR37+860	PR37+850	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	Perfilacion lateral y manejo de aguas
PR37+850	PR37+840	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+840	PR37+830	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+830	PR37+820	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+820	PR37+810	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+810	PR37+800	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+800	PR37+790	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+790	PR37+780	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+780	PR37+770	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+770	PR37+760	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+760	PR37+750	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+750	PR37+740	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+740	PR37+730	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+730	PR37+720	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+720	PR37+710	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
PR37+710	PR37+700	10.00	1.82	1.82	1.82	18.22	
						291.52	
					TOTAL	**1,424.00**	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
6	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	1,424.00	m3

ABSCISAS			DIMENSIONES				
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+380



PR37+810



PR37+720



PR37+860

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/07/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
9	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	3,014.00	m2

ABSCISAS			DIMENSIONES		
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m2)	OBSERVACIONES
PR41+520	PR41+430	90.00	3.36	302.00	CARRIL DERECHO
PR41+515	PR41+500	15.00	4.00	60.00	CARRIL IZQUIERDO
PR41+470	PR41+370	100.00	3.16	316.00	CARRIL DERECHO
PR38+250	PR38+215	35.00	2.114	73.99	CARRIL IZQUIERDO
PR38+080	PR38+040	40.00	3.70	148.00	CARRIL DERECHO
PR38+050	PR38+020	30.00	2.60	78.00	CARRIL IZQUIERDO
PR38+040	PR38+010	30.00	2.80	84.00	CARRIL DERECHO
PR38+070	PR38+050	20.00	4.00	80.00	CARRIL DERECHO
PR38+060	PR38+000	60.00	3.44	206.40	CARRIL IZQUIERDO
PR36+990	PR36+950	40.00	3.50	140.00	CARRIL DERECHO
PR37+020	PR36+980	40.00	3.50	140.00	CARRIL IZQUIERDO
PR37+920	PR37+890	30.00	2.00	60.00	CARRIL DERECHO
PR37+990	PR37+900	90.00	3.26	293.40	CARRIL IZQUIERDO
PR37+935	PR37+920	15.00	4.00	60.00	CARRIL DERECHO
PR37+450	PR37+405	45.00	4.00	180.00	CARRIL DERECHO
PR37+450	PR37+425	25.00	4.00	100.00	CARRIL IZQUIERDO
PR37+010	PR36+975	35.00	4.00	140.00	CARRIL IZQUIERDO
PR37+080	PR37+050	30.00	3.73	112.00	CARRIL IZQUIERDO
PR36+975	PR36+910	65.00	4.00	260.00	CARRIL IZQUIERDO
PR36+940	PR36+900	40.00	3.00	120.00	CARRIL DERECHO
PR36+960	PR36+940	20.00	3.00	60.00	CARRIL DERECHO
			TOTAL	3,014.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR38+050 - PR38+020





PR36+960 - PR36+940

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/07/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
9	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	3,014.00	m2

ABSCISAS			DIMENSIONES		OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ÁREA (m2)	







PR37+010 - 36+970

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	1/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
10	Conformación de la calzada existente	27,594.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO (m)			CANTIDAD (m²)	
28+100	36+040	3780.00	7.30			27,594.00	Carril izquierdo y derecho
						0.00	
					TOTAL	27,594.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR33+800 - PR32+420





PR30+390 - PR28+890

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO: 08

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA		UND.
11	Afirmado	6,171.60		m3

CANTIDADES AFIRMADO PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RETORNO -CALAMAR

ABSCISAS							
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
45+000	45+320	320.00	1.11	1.11	1.11	355.20	
40+830	40+910	80.00	1.11	1.11	1.11	88.80	
35+650	36+065	415.00	1.11	1.11	1.11	460.65	
34+965	35+165	200.00	1.11	1.11	1.11	222.00	
32+500	32+620	120.00	1.11	1.11	1.11	133.20	
35+210	35+500	290.00	1.11	1.11	1.11	321.90	
35+100	35+215	115.00	1.11	1.11	1.11	127.65	
44+960	45+340	380.00	1.11	1.11	1.11	421.80	
40+900	40+830	70.00	1.11	1.11	1.11	77.70	
33+660	34+220	560.00	1.11	1.11	1.11	621.60	
34+560	34+780	220.00	1.11	1.11	1.11	244.20	
32+760	33+085	325.00	1.11	1.11	1.11	360.75	
31+910	32+290	380.00	1.11	1.11	1.11	421.80	
29+960	30+470	510.00	1.11	1.11	1.11	566.10	
29+010	29+500	490.00	1.11	1.11	1.11	543.90	
28+730	28+995	265.00	1.11	1.11	1.11	294.15	
28+060	28+475	415.00	1.11	1.11	1.11	460.65	
30+780	31+005	225.00	1.11	1.11	1.11	249.75	
29+710	29+890	180.00	1.11	1.11	1.11	199.80	
					TOTAL	6,171.60	
					TOTAL AFIRMADO (m3)	6,171.60	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR37+690





PR37+590

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	5,806.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR38+000	PR37+990	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+990	PR37+980	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+980	PR37+970	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+970	PR37+960	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+960	PR37+950	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+950	PR37+940	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+940	PR37+930	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+930	PR37+920	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+920	PR37+910	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+910	PR37+900	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+900	PR37+890	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+890	PR37+880	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+880	PR37+870	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+870	PR37+860	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+860	PR37+850	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+850	PR37+840	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+840	PR37+830	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+830	PR37+820	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+820	PR37+810	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+810	PR37+800	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+800	PR37+790	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+790	PR37+780	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+780	PR37+770	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+770	PR37+760	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+760	PR37+750	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+750	PR37+740	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+740	PR37+730	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
						700.38	
PR37+480	PR37+470	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+470	PR37+460	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+460	PR37+450	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+450	PR37+440	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+440	PR37+430	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+430	PR37+420	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+420	PR37+410	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+410	PR37+400	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+400	PR37+390	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+390	PR37+380	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+380	PR37+370	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+370	PR37+360	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+360	PR37+350	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+350	PR37+340	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+340	PR37+330	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+330	PR37+320	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+320	PR37+310	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+310	PR37+300	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+300	PR37+290	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+290	PR37+280	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+280	PR37+270	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+270	PR37+260	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+260	PR37+250	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+250	PR37+240	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+240	PR37+230	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+230	PR37+220	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+220	PR37+210	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+210	PR37+200	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+200	PR37+190	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+190	PR37+180	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+180	PR37+170	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+170	PR37+160	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+160	PR37+150	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+150	PR37+140	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+140	PR37+130	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+130	PR37+120	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+120	PR37+110	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+110	PR37+100	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+100	PR37+090	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+090	PR37+080	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+080	PR37+070	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+070	PR37+060	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+060	PR37+050	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+050	PR37+040	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+040	PR37+030	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+030	PR37+020	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+020	PR37+010	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+010	PR37+000	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR37+000	PR36+990	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+990	PR36+980	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+980	PR36+970	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+970	PR36+960	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+960	PR36+950	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+950	PR36+940	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+940	PR36+930	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+930	PR36+920	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+920	PR36+910	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	
PR36+910	PR36+900	10.00	2.59	2.59	2.59	25.94	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	5,806.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
						1504.52	
PR45+380	PR45+330	50.00	0.56	0.56	0.56	28.00	Subbase para cuneta y recuperación de franjas de protección
						28.00	
					TOTAL VOLUMEN SUBBASE GRANULAR (M3)	**2232.90**	
SUBBASE GRANULAR CLASE A							
PR44+470	PR44+460	10.00	11.20	11.20	11.20	112.00	Cantidades correspondientes a lleno de obra hidraulica, paso de fauna y mejoramiento de via
PR44+460	PR44+450	10.00	11.20	11.20	11.20	112.00	
PR44+450	PR44+440	10.00	11.20	11.20	11.20	112.00	
PR44+440	PR44+430	10.00	11.20	11.20	11.20	112.00	
						448.00	
PR43+146	PR43+140	6.00	3.30	3.30	3.30	19.80	Lleno para muro
PR43+140	PR43+130	10.00	3.30	3.30	3.30	33.00	
						52.80	
PR42+050	PR42+040	10.00	11.20	11.20	11.20	112.00	Paso fauna y mejoramiento de via
PR42+040	PR42+030	10.00	11.20	11.20	11.20	112.00	
						224.00	
PR40+880	PR40+870	10.00	1.22	1.22	1.22	12.20	Mejoramiento via
PR40+870	PR40+860	10.00	1.22	1.22	1.22	12.20	
PR40+860	PR40+850	10.00	1.22	1.22	1.22	12.20	
						36.60	
PR40+470	PR40+460	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	Mejoramiento subrasante
PR40+460	PR40+450	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	
PR40+450	PR40+440	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	
PR40+440	PR40+430	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	
PR40+430	PR40+420	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	
PR40+420	PR40+410	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	
PR40+410	PR40+400	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	
PR40+400	PR40+390	10.00	5.18	5.18	5.18	51.80	
						414.40	
PR37+830	PR37+820	10.00	2.24	2.24	2.24	22.40	Mejoramiento para fallo
						22.40	
PR38+420	PR38+410	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	Mejoramiento de subrasante y conformacion de filtro
PR38+410	PR38+400	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+400	PR38+390	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+390	PR38+380	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+380	PR38+370	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+370	PR38+360	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+360	PR38+350	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+350	PR38+340	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+340	PR38+330	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+330	PR38+320	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+320	PR38+310	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+310	PR38+300	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+300	PR38+290	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+290	PR38+280	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+280	PR38+270	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+270	PR38+260	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+260	PR38+250	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+250	PR38+240	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+240	PR38+230	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+230	PR38+220	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+220	PR38+210	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+210	PR38+200	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+200	PR38+190	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+190	PR38+180	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+180	PR38+170	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+170	PR38+160	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+160	PR38+150	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+150	PR38+140	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+140	PR38+130	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
PR38+130	PR38+120	10.00	2.28	2.28	2.28	22.80	
						684.00	
PR37+980	PR37+970	10.00	2.24	2.24	2.24	22.40	Mejoramiento para fallo
						22.40	
PR37+940	PR37+930	10.00	5.04	5.04	5.04	50.40	Cajeo para mejoramiento
PR37+930	PR37+920	10.00	5.04	5.04	5.04	50.40	
						100.80	
PR37+840	PR37+830	10.00	2.24	2.24	2.24	22.40	Lleno de alcantarrilla
						22.40	
PR37+810	PR37+800	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	Cantidades correspondientes a mejoramiento de subrasante y
PR37+800	PR37+790	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+790	PR37+780	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+780	PR37+770	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+770	PR37+760	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+760	PR37+750	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+750	PR37+740	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+740	PR37+730	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+730	PR37+720	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+720	PR37+710	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+710	PR37+700	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+700	PR37+690	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	5,806.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES
PR37+690	PR37+680	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	Mejoramiento de subrasante y estabilizacion de hombros para lleno y compactacion de talud
PR37+680	PR37+670	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+670	PR37+660	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+660	PR37+650	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+650	PR37+640	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+640	PR37+630	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+630	PR37+620	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+620	PR37+610	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+610	PR37+600	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+600	PR37+590	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+590	PR37+580	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+580	PR37+570	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
PR37+570	PR37+560	10.00	5.83	5.83	5.83	58.30	
						1457.50	
PR37+350	PR37+340	10.00	0.32	0.32	0.32	3.20	Mejoramiento para fallo
PR37+340	PR37+330	10.00	0.32	0.32	0.32	3.20	
PR37+330	PR37+320	10.00	0.32	0.32	0.32	3.20	
PR37+320	PR37+310	10.00	0.32	0.32	0.32	3.20	
PR37+310	PR37+300	10.00	0.32	0.32	0.32	3.20	
PR37+300	PR37+290	10.00	0.32	0.32	0.32	3.20	
PR37+290	PR37+280	10.00	0.32	0.32	0.32	3.20	
						22.40	
PR37+190	PR37+180	10.00	1.28	1.28	1.28	12.80	Mejoramiento para fallo
PR37+180	PR37+170	10.00	1.28	1.28	1.28	12.80	
PR37+170	PR37+160	10.00	1.28	1.28	1.28	12.80	
PR37+160	PR37+150	10.00	1.28	1.28	1.28	12.80	
						51.20	
PR36+600	PR36+590	10.00	1.40	1.40	1.40	14.00	Mejoramiento para fallo
						14.00	
					TOTAL VOLUMEN (m3)	**3,573.00**	
					TOTAL VOLUMEN (M3)	**5,806.00**	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUBBASE GRANULAR





PR38+000 TOMA DE DENSIDADES DE SUBBASE GRANULAR





PR38+000 CEREO DE SUBBASE GRANULAR

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	5,806.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES




PR37+740 CEREO DE SUBBASE GRANULAR




PR37+480 CEREO DE SUBBASE GRANULAR

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SUBBASE GRANULAR CLASE A




PR37+960




PR38+240

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
12	Subbase Granular clase A (No incluye Transporte)	5,806.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO TERRAPLEN (m2)	VOLUMEN (m3)	OBSERVACIONES



PR37+720



PR37+770

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.

CONTRATO 976-2021
OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	1,385.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR38+000	PR37+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+990	PR37+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+980	PR37+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+970	PR37+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+960	PR37+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+950	PR37+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+940	PR37+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+930	PR37+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+920	PR37+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+910	PR37+900	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+900	PR37+890	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+890	PR37+880	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+880	PR37+870	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+870	PR37+860	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						273.00	
PR37+480	PR37+470	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+470	PR37+460	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+460	PR37+450	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+450	PR37+440	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+440	PR37+430	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+430	PR37+420	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+420	PR37+410	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+410	PR37+400	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+400	PR37+390	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+390	PR37+380	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+380	PR37+370	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+370	PR37+360	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+360	PR37+350	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+350	PR37+340	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+340	PR37+330	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+330	PR37+320	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+320	PR37+310	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+310	PR37+300	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+300	PR37+290	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+290	PR37+280	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+280	PR37+270	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+270	PR37+260	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+260	PR37+250	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+250	PR37+240	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+240	PR37+230	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+230	PR37+220	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+220	PR37+210	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+210	PR37+200	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+200	PR37+190	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+190	PR37+180	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+180	PR37+170	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+170	PR37+160	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+160	PR37+150	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+150	PR37+140	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+140	PR37+130	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+130	PR37+120	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+120	PR37+110	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+110	PR37+100	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+100	PR37+090	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+090	PR37+080	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+080	PR37+070	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+070	PR37+060	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+060	PR37+050	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+050	PR37+040	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+040	PR37+030	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+030	PR37+020	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+020	PR37+010	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+010	PR37+000	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR37+000	PR36+990	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+990	PR36+980	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+980	PR36+970	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+970	PR36+960	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+960	PR36+950	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+950	PR36+940	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+940	PR36+930	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+930	PR36+920	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
PR36+920	PR36+910	10.00	1.95	1.95	1.95	19.50	
						1111.50	
					TOTAL VOLUMEN (M3)	**1,385.00**	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
13	Base granular clase A (No incluye Transporte)	1,385.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	CANTIDAD (m3)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.




PR37+990 INICIO CEREO DE BASE GRANULAR




PR37+950 SUBBASE GRANULAR




PR37+440 CEREO Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	10,856.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	
PR40+470	PR40+460	10.00	9.20	92.00	
PR40+460	PR40+450	10.00	9.20	92.00	
PR40+450	PR40+440	10.00	9.20	92.00	
PR40+440	PR40+430	10.00	9.20	92.00	
PR40+430	PR40+420	10.00	9.20	92.00	
PR40+420	PR40+410	10.00	9.20	92.00	
PR40+410	PR40+400	10.00	9.20	92.00	
PR40+400	PR40+390	10.00	9.20	92.00	
PR40+390	PR40+380	10.00	9.20	92.00	
PR38+440	PR38+430	10.00	9.20	92.00	
PR38+430	PR38+420	10.00	9.20	92.00	
PR38+420	PR38+410	10.00	9.20	92.00	
PR38+410	PR38+400	10.00	9.20	92.00	
PR38+400	PR38+390	10.00	9.20	92.00	
PR38+390	PR38+380	10.00	9.20	92.00	
PR38+380	PR38+370	10.00	9.20	92.00	
PR38+370	PR38+360	10.00	9.20	92.00	
PR38+360	PR38+350	10.00	9.20	92.00	
PR38+350	PR38+340	10.00	9.20	92.00	
PR38+340	PR38+330	10.00	9.20	92.00	
PR38+330	PR38+320	10.00	9.20	92.00	
PR38+320	PR38+310	10.00	9.20	92.00	
PR38+310	PR38+300	10.00	9.20	92.00	
PR38+300	PR38+290	10.00	9.20	92.00	
PR38+290	PR38+280	10.00	9.20	92.00	
PR38+280	PR38+270	10.00	9.20	92.00	
PR38+270	PR38+260	10.00	9.20	92.00	
PR38+260	PR38+250	10.00	9.20	92.00	
PR38+250	PR38+240	10.00	9.20	92.00	
PR38+240	PR38+230	10.00	9.20	92.00	
PR38+230	PR38+220	10.00	9.20	92.00	
PR38+220	PR38+210	10.00	9.20	92.00	
PR38+210	PR38+200	10.00	9.20	92.00	
PR38+200	PR38+190	10.00	9.20	92.00	
PR38+190	PR38+180	10.00	9.20	92.00	
PR38+180	PR38+170	10.00	9.20	92.00	
PR38+170	PR38+160	10.00	9.20	92.00	
PR38+160	PR38+150	10.00	9.20	92.00	
PR38+150	PR38+140	10.00	9.20	92.00	
PR38+140	PR38+130	10.00	9.20	92.00	
PR38+130	PR38+120	10.00	9.20	92.00	
PR38+120	PR38+110	10.00	9.20	92.00	
PR38+110	PR38+100	10.00	9.20	92.00	
PR38+100	PR38+090	10.00	9.20	92.00	
PR38+090	PR38+080	10.00	9.20	92.00	
PR38+080	PR38+070	10.00	9.20	92.00	
PR38+070	PR38+060	10.00	9.20	92.00	
PR38+060	PR38+050	10.00	9.20	92.00	
PR38+050	PR38+040	10.00	9.20	92.00	
PR38+040	PR38+030	10.00	9.20	92.00	
PR38+030	PR38+020	10.00	9.20	92.00	
PR38+020	PR38+010	10.00	9.20	92.00	
PR38+010	PR38+000	10.00	9.20	92.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	10,856.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	
PR38+000	PR37+990	10.00	9.20	92.00	
PR37+990	PR37+980	10.00	9.20	92.00	
PR37+980	PR37+970	10.00	9.20	92.00	
PR37+970	PR37+960	10.00	9.20	92.00	
PR37+960	PR37+950	10.00	9.20	92.00	
PR37+950	PR37+940	10.00	9.20	92.00	
PR37+940	PR37+930	10.00	9.20	92.00	
PR37+930	PR37+920	10.00	9.20	92.00	
PR37+920	PR37+910	10.00	9.20	92.00	
PR37+910	PR37+900	10.00	9.20	92.00	
PR37+900	PR37+890	10.00	9.20	92.00	
PR37+890	PR37+880	10.00	9.20	92.00	
PR37+880	PR37+870	10.00	9.20	92.00	
				0.00	
PR37+450	PR37+440	10.00	9.20	92.00	
PR37+440	PR37+430	10.00	9.20	92.00	
PR37+430	PR37+420	10.00	9.20	92.00	
PR37+420	PR37+410	10.00	9.20	92.00	
PR37+410	PR37+400	10.00	9.20	92.00	
PR37+400	PR37+390	10.00	9.20	92.00	
PR37+390	PR37+380	10.00	9.20	92.00	
PR37+380	PR37+370	10.00	9.20	92.00	
PR37+370	PR37+360	10.00	9.20	92.00	
PR37+360	PR37+350	10.00	9.20	92.00	
PR37+350	PR37+340	10.00	9.20	92.00	
PR37+340	PR37+330	10.00	9.20	92.00	
PR37+330	PR37+320	10.00	9.20	92.00	
PR37+320	PR37+310	10.00	9.20	92.00	
PR37+310	PR37+300	10.00	9.20	92.00	
PR37+300	PR37+290	10.00	9.20	92.00	
PR37+290	PR37+280	10.00	9.20	92.00	
PR37+280	PR37+270	10.00	9.20	92.00	
PR37+270	PR37+260	10.00	9.20	92.00	
PR37+260	PR37+250	10.00	9.20	92.00	
PR37+250	PR37+240	10.00	9.20	92.00	
PR37+240	PR37+230	10.00	9.20	92.00	
PR37+230	PR37+220	10.00	9.20	92.00	
PR37+220	PR37+210	10.00	9.20	92.00	
PR37+210	PR37+200	10.00	9.20	92.00	
PR37+200	PR37+190	10.00	9.20	92.00	
PR37+190	PR37+180	10.00	9.20	92.00	
PR37+180	PR37+170	10.00	9.20	92.00	
PR37+170	PR37+160	10.00	9.20	92.00	
PR37+160	PR37+150	10.00	9.20	92.00	
PR37+150	PR37+140	10.00	9.20	92.00	
PR37+140	PR37+130	10.00	9.20	92.00	
PR37+130	PR37+120	10.00	9.20	92.00	
PR37+120	PR37+110	10.00	9.20	92.00	
PR37+110	PR37+100	10.00	9.20	92.00	
PR37+100	PR37+090	10.00	9.20	92.00	
PR37+090	PR37+080	10.00	9.20	92.00	
PR37+080	PR37+070	10.00	9.20	92.00	
PR37+070	PR37+060	10.00	9.20	92.00	
PR37+060	PR37+050	10.00	9.20	92.00	
PR37+050	PR37+040	10.00	9.20	92.00	
PR37+040	PR37+030	10.00	9.20	92.00	
PR37+030	PR37+020	10.00	9.20	92.00	
PR37+020	PR37+010	10.00	9.20	92.00	
PR37+010	PR37+000	10.00	9.20	92.00	
PR37+000	PR36+990	10.00	9.20	92.00	
PR36+990	PR36+980	10.00	9.20	92.00	
PR36+980	PR36+970	10.00	9.20	92.00	
PR36+970	PR36+960	10.00	9.20	92.00	
PR36+960	PR36+950	10.00	9.20	92.00	
PR36+950	PR36+940	10.00	9.20	92.00	
PR36+940	PR36+930	10.00	9.20	92.00	
				0.00	
			TOTAL	10,856.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
14	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	10,856.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES			OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA FIN (m2)	ÁREA (m2)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO





PR40+470 - PR40+380 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CARRIL IZQUIERDO





PR38+440 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CARRIL IZQUIERDO





PR37+050 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CARRIL IZQUIERDO





PR37+050 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CARRIL DERECHO

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESDEINTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	607.20	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR40+470	PR40+460	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+460	PR40+450	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+450	PR40+440	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+440	PR40+430	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+430	PR40+420	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+420	PR40+410	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+410	PR40+400	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+400	PR40+390	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR40+390	PR40+380	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						45.09	
PR38+440	PR38+430	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+430	PR38+420	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+420	PR38+410	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+410	PR38+400	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+400	PR38+390	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+390	PR38+380	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+380	PR38+370	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+370	PR38+360	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+360	PR38+350	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+350	PR38+340	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+340	PR38+330	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+330	PR38+320	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+320	PR38+310	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+310	PR38+300	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+300	PR38+290	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+290	PR38+280	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+280	PR38+270	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+270	PR38+260	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+260	PR38+250	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+250	PR38+240	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+240	PR38+230	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+230	PR38+220	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+220	PR38+210	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+210	PR38+200	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+200	PR38+190	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+190	PR38+180	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+180	PR38+170	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+170	PR38+160	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+160	PR38+150	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+150	PR38+140	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+140	PR38+130	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+130	PR38+120	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+120	PR38+110	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+110	PR38+100	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+100	PR38+090	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+090	PR38+080	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+080	PR38+070	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+070	PR38+060	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+060	PR38+050	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+050	PR38+040	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+040	PR38+030	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+030	PR38+020	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+020	PR38+010	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+010	PR38+000	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR38+000	PR37+990	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+990	PR37+980	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+980	PR37+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+970	PR37+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+960	PR37+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+950	PR37+940	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+940	PR37+930	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+930	PR37+920	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+920	PR37+910	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+910	PR37+900	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+900	PR37+890	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+890	PR37+880	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+880	PR37+870	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						285.57	
PR37+450	PR37+440	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+440	PR37+430	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+430	PR37+420	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+420	PR37+410	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+410	PR37+400	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+400	PR37+390	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+390	PR37+380	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+380	PR37+370	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+370	PR37+360	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+360	PR37+350	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+350	PR37+340	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+340	PR37+330	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+330	PR37+320	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+320	PR37+310	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+310	PR37+300	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+300	PR37+290	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+290	PR37+280	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+280	PR37+270	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+270	PR37+260	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+260	PR37+250	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+250	PR37+240	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+240	PR37+230	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+230	PR37+220	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+220	PR37+210	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+210	PR37+200	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+200	PR37+190	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+190	PR37+180	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+180	PR37+170	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+170	PR37+160	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+160	PR37+150	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+150	PR37+140	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+140	PR37+130	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+130	PR37+120	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+120	PR37+110	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+110	PR37+100	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+100	PR37+090	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+090	PR37+080	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+080	PR37+070	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+070	PR37+060	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+060	PR37+050	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+050	PR37+040	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+040	PR37+030	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+030	PR37+020	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+020	PR37+010	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR37+010	PR37+000	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	607.20	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	
PR37+000	PR36+990	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR36+990	PR36+980	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR36+980	PR36+970	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR36+970	PR36+960	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR36+960	PR36+950	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR36+950	PR36+940	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
PR36+940	PR36+930	10.00	0.50	0.50	0.50	5.01	
						260.52	
PR58+500	PR58+505	5.00	3.20	3.20	3.20	16.00	Parcheo visita presidente
						16.00	
					TOTAL	**607.20**	


REGISTRO FOTOGRÁFICO.

ASFALTO EN PRIMERA CAPA





PR40+470 - PR40+380 ASFALTO EN LOS DOS CARRILES - PRIMERA CAPA

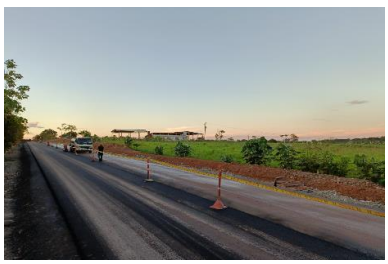
PR38+440 ASFALTO EN CARRIL IZQUIERDO - PRIMERA CAPA




PR38+440 ASFALTO EN CARRIL DERECHO - PRIMERA CAPA





PR37+450 ASFALTO EN CARRIL IZQUIERDO - PRIMERA CAPA

CONSORCIO DSC	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
16	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19 (No incluye Transporte)	607.20	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD INTERVENIDA	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO (m2)	VOLUMEN (m^3)	





PR37+050 ASFALTO EN CARRIL IZQUIERDO - PRIMERA CAPA







PR37+050 RIEGO DE IMPRIMACIÓN CARRIL DERECHO



FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
18	Excavaciones varias sin clasificar	318.00	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES				OBSERVACIONES
ABSCISA	LONGITUD (m)	ANCHO (m)	ALTO (m)	VOLUMEN (m3)	
PR38+135	12	3.00	1.80	64.8	PASO FAUNA
PR37+835	11.00	2	1.50	33	ALCANTARILLA
PR42+020	5.00	8	2.50	100	PASO FAUNA
PR44+470	5.00	9.6	2.50	120	ENCOLE - PASO FAUNA
			TOTAL	318.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+135



PR37+835



PR44+470

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA NÚMERO:14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
23	Concreto clase 28 MPA	84.70	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES							OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)		LARGO (m)	ESPESOR (m)	ÁREA DE TUBO	VOLUMEN (m3)	
		ANCHO 1 (m)	ANCHO 2 (m)					
PR44+470	3.74	13.60			0.35	11.40	13.81	Muro costado derecho descole. Se resta el area de tres tubos de 1.80m dos para paso fauna y uno hidráulico.
			2.90	13.50	0.35		13.70	Zarpa de muro
	3.23			1.70	0.35		1.92	Aleta margen derecho
PR43+170		0.70		6.00	0.40		1.68	Dentellón muro módulo 1
		2.90		6.00	0.40		6.96	Zarpa muro módulo 1
	2.40			6.00	0.40		5.76	Vástago módulo 1 - sección 1
		0.70		6.00	0.40		1.68	Dentellón muro módulo 2
		2.90		6.00	0.40		6.96	Zarpa muro módulo 2
	2.40			6.00	0.40		5.76	Vástago módulo 2 (sección1) - Se resta tubería de 1.20
		0.70		6.00	0.40		1.68	Dentellón muro módulo 4
		2.90		6.00	0.40		6.96	Zarpa muro módulo 4
	2.40			6.00	0.40		5.76	Vástago módulo 3 - sección 1
	1.90			6.00	0.35		3.99	Muro de módulo 1 - Sección 2
	1.90			6.00	0.35		3.99	Muro de módulo 2 - Sección 2
PR38+135	2.42	1.90			0.25	0.24	0.91	Caja de encole carril derecho
	2.12	1.90			0.25		1.01	
	2.12	1.00			0.25		1.06	
		1.90	1.90		0.30		1.08	
					TOTAL		84.70	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR44+470







MURO PR43+170, ZARPA, ELEVACIÓN DE MURO 1 Y ELEVACIÓN DE MURO 2





PR38+135 CAJA DE ENCOLE

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
24	Concreto clase 21 MPA	45.40	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES								OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	RADIO TUBERÍA	PERÍMETRO DE TUBERÍA	ÁREA DEL TUBO	VOLUMEN (m3)	
PR44+470	0.25	0.35			1.10	3.46		0.91	Concreto anillado de tubería tres hilos costado izquierdo
	0.75	1.17	2.50					32.91	Atraque para tubos instalados paso fauna e hidráulico (15 tubos) 5 por linea. 2 paso fauna y 1 paso hidráulico
PR38+135	1.10	1.60	6.00		0.55		0.95	4.86	Atraque tubería 90 paso fauna carril izquierdo
	1.10	1.60	5.00		0.55		0.95	4.05	Atraque tubería 90 paso hidráulico carril derecho
		1.60	6.00	0.15				1.44	Parrilla paso fauna
		1.60	5.00	0.15				1.20	Parrilla paso hidráulico
							TOTAL	45.40	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.







PR44+470 ATRAQUE DE TUBERÍA DE 1.80 PASO FAUNA Y PASO HIDRÁULICO





PR38+135 ATRAQUE DE TUBERÍA DE PASO FAUNA Y PASO HIDRÁULICO

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
25	Concreto clase 14 MPA	48.40	m3

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	ALTO (m)	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN (m3)	
PR44+470		0.50	3.00	13.80	20.70	Ciclopeo para mejoramiento piso para tubería de 1.80 costado izquierdo
		0.20	3.00	13.80	8.28	Ciclopeo para mejoramiento de piso para muro costado izquierdo
		0.40	3.60	3.40	4.90	Ciclopeo para mejoramiento de piso para un tubo de 1.80 costado derecho
PR44+010		0.15	0.45	25.00	1.69	Canal margen derecho mejoramiento por socavación
		0.15	0.25	15.00	0.56	Canal margen derecho mejoramiento por socavación
PR43+170		2.95	6.00	0.100	1.77	Solado zarpa muro módulo 1
		2.95	6.00	0.100	1.77	Solado zarpa muro módulo 2
		2.95	6.00	0.100	1.77	Solado zarpa muro módulo 3
		2.95	6.00	0.100	1.77	Solado zarpa muro módulo 4
PR38+135		1.60	11.00	0.100	1.76	Solado calzada izquierdo y derecho para instalación de tubería paso fauna
		1.60	10.00	0.100	1.60	Solado calzada izquierdo y derecho para instalación de tubería paso hidráulico
		1.60	1.90	0.070	0.21	Solado caja costado derecho
PR37+837		1.60	10.00	0.100	1.60	Solado calzada izquierdo y derecho para instalación de tubería de 0.90
				TOTAL	48.40	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR44+470 CICLOPEO PARA MEJORAMIENTO





PR37+837



PR38+135 Solado para paso fauna y paso hidráulico



PR44+470 SOLADO ZARPA

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
26	Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	6,408.00	kg

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	DIÁMETRO	LONGITUD (m)	CANTIDAD	PESO KG	PESO (kg)	
PR44+470	1/2"	3.24	97.00	0.996	313.02	Acero zarpa inferior
	5/8"	3.24	119.00	1.560	601.47	Acero zarpa superior
	1/2"	14.40	31.00	0.996	444.61	Refuerzo de zarpa
	5/8"	4.55	25.00	1.560	177.45	Vastago
	5/8"	3.20	25.00	1.560	124.80	Refuerzo vastago
	5/8"	1.70	25.00	1.560	66.30	
	1/2"	4.55	21.00	0.996	95.17	Refuerzo para muro externo
	5/8"	1.70	19.00	1.560	50.39	Refuerzo ubicado encima de la tubería
	1/2"	1.70	28.00	0.996	47.41	
	5/8"	3.80	12.00	1.560	71.14	Refuerzo para dados de tubería
	1/2"	0.80	24.00	0.996	19.12	
	5/8"	2.00	12.00	1.560	37.44	
	1/2"	2.12	6.00	0.996	12.67	Aleta de cierre acero de zarpa
	1/2"	3.15	11.00	0.996	34.51	
	5/8"	3.25	13.00	1.560	65.91	
	5/8"	1.60	32.00	1.560	79.87	
	5/8"	4.08	5.00	1.560	31.82	
	5/8"	3.20	5.00	1.560	24.96	
	5/8"	1.70	5.00	1.560	13.26	
	1/2"	4.08	7.00	0.996	28.45	
	1/2"	1.60	40.00	0.996	63.74	
				TOTAL DE ACERO DE ALCANTARILLA KG	2403.51	
ACERO MURO CALZADA IZQUIERDA						
PR43+170	5/8"	5.30	31.00	1.560	256.31	Acero Refuerzo 3
	5/8"	3.20	30.00	1.560	149.76	Acero Refuerzo 4
	5/8"	1.70	30.00	1.560	79.56	Acero Refuerzo 5
	5/8"	3.25	93.00	1.560	471.51	Acero Refuerzo 2
	1/2"	5.30	49.00	0.996	258.66	Acero Refuerzo 6
	1/2"	3.15	76.00	0.996	238.44	Acero Refuerzo 1
	1/2"	12.00	42.00	0.996	501.98	Acero Refuerzo 7 - Zarpa
	1/2"	12.00	4.00	0.996	47.81	Acero de dentellón
	1/2"	12.00	46.00	0.996	549.79	Acero vastago
	1/2"	8.00	2.00	0.996	15.94	
	1/2"	1.05	12.00	0.996	12.55	Acero burros zarpa
				TOTAL DE ACERO DE MURO MÓDULO 1 Y 2	2582.31	
	5/8"	5.46	16.00	1.560	136.28	Acero Refuerzo 3
	5/8"	3.20	16.00	1.560	79.87	Acero Refuerzo 4
	5/8"	1.70	15.00	1.560	39.78	Acero Refuerzo 5
	5/8"	3.25	46.00	1.560	233.22	Acero Refuerzo 2
	1/2"	5.46	25.00	0.996	135.95	Acero refuerzo 6
	1/2"	3.15	38.00	0.996	119.22	Acero Refuerzo 1
	1/2"	12.00	4.00	0.996	47.81	Acero de dentellón
	1/2"	6.00	42.00	0.996	250.99	Acero vastago
	1/2"	8.00	46.00	0.996	366.53	
	1/2"	1.05	12.00	0.996	12.55	Acero burros zarpa
				TOTAL DE ACERO DE MURO MÓDULO 3	1422.20	
				TOTAL	6,408.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.






PR44+470





PR43+170







PR38+135

FIRMA		
NOMBRE	**MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA**	**GABRIEL [illegible] PEREZ GRANADOS**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
27	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	31.00	ml

ALCANTARILLAS	DIMENSIONES					OBSERVACIONES
ABSCISA	CANTIDAD	LARGO (m)	LARGO (m)	ALTO (m)	LONGITUD (ml)	
PR38+135	11.00				11.00	Tubería margen derecho e izquierdo paso fauna
	10.00				10.00	Tubería margen derecho e izquierdopaso hidráulico
PR37+837	10.00				10.00	Tubería margen derecho e izquierdo
				TOTAL	31.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR38+135





PR37+837 CALZADA IZQUIERDA

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
39	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	3,878.00	m3-km

ABSCISAS		DIMENSIONES						
INICIO	FIN	LONGITUD TRANSPORTE	AREA (m2)	ALTO (m)	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
PR43+146	PR37+700	2.72				1,424.00	3,877.55	Vo. Excavaciones
							00	
							00	
							00	
							00	
						TOTAL	3,878.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.




PR42+050



PR38+150



PR44+470

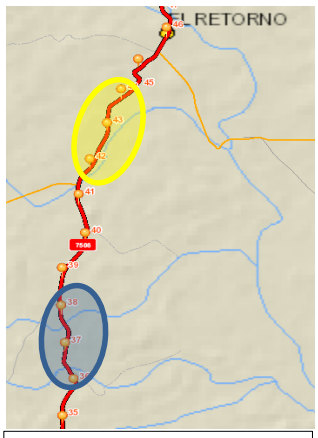

Recorrido transporte de materiales de excavación y llenos

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA Nº 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
40	Transporte de materiales de sub-base y base granular, compactos	1,842,632.00	m3-km

Teniendo en cuenta la Resolución

ABSCISAS			DIMENSIONES					
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
Granada Coordenandas Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	241.00	PR38+000	PR37+730	7.86	248.855	700.38	174,293.06	SUBBASEGRANULAR
	241.00	PR37+480	PR36+900	8.84	249.840	1,504.52	375,889.28	
	241.00	PR45+380	PR45+330	0.15	241.145	28.00	6,752.06	
					TOTAL VOLUMEN DE SUBBASE GRANULAR (m3)	2,232.90	0.00	
Fuente de Oro Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	218.50	PR38+000	PR37+860	7.66	226.160	273.00	61,741.68	BASE GRANULAR
	218.50	PR37+480	PR36+910	8.83	227.325	1,111.50	252,671.74	
					TOTAL VOLUMEN DE BASE GRANULAR (m3)	1,385.00	0.00	
Granada Coordenandas Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	241.00	PR44+470	PR44+430	0.37	241.365	448.00	108,131.52	TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A
	241.00	PR43+146	PR43+130	2.35	243.345	52.80	12,848.62	
	241.00	PR42+050	PR42+030	0.84	241.840	224.00	54,172.16	
	241.00	PR40+880	PR40+850	3.45	244.445	36.60	8,946.69	
	241.00	PR40+470	PR40+390	3.56	244.560	414.40	101,345.66	
	241.00	PR37+830	PR37+820	5.22	246.220	22.40	5,515.33	
	241.00	PR38+420	PR38+120	5.07	246.065	684.00	168,308.46	
	241.00	PR37+980	PR37+970	5.41	246.405	22.40	5,519.47	
	241.00	PR37+940	PR37+920	5.45	246.450	100.80	24,842.16	
	241.00	PR37+840	PR37+830	7.02	248.015	22.40	5,555.54	
	241.00	PR37+810	PR37+560	7.25	248.245	1,457.50	361,817.09	
	241.00	PR37+350	PR37+280	7.62	248.620	22.40	5,569.09	
	241.00	PR37+190	PR37+150	8.06	249.060	51.20	12,751.87	
	241.00	PR36+600	PR36+590	8.06	249.060	14.00	3,486.84	
					TOTAL TRANSPORTE DE SUBBASE GRANULAR CLASE A	3,573.00	0.00	
					TOTAL		1,750,158.00	

ABSCISAS				DIMENSIONES				
INICIO	LONGITUD AL PR45+450 (Km)	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD TRANSPORTE	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN (m^3-Km)	OBSERVACIONES
UBICACIÓN	DISTANCIA	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO			
	5.00	PR41+540	PR41+250	4.35	9.345	752.26	7,029.87	
	5.00	PR40+470	PR40+400	5.09	10.085	181.58	1,831.23	
	5.00	PR39+830	PR39+690	5.83	10.830	363.16	3,933.02	
	5.00	PR39+520	PR39+500	5.96	10.960	51.88	568.60	SUBBASE GRANULAR MES DE JUNIO
	5.00	PR38+250	PR38+000	7.58	12.575	648.50	8,154.89	
					TOTAL VOLUMEN DE SUBBASE GRANULAR MES DE JUNIO (m3)	**1,997.38**	0.00	
	5.00	PR41+520	PR41+260	4.32	9.320	1,211.02	11,286.71	
	5.00	PR40+300	PR40+230	5.26	10.255	162.05	1,661.82	
	5.00	PR40+150	PR40+120	5.35	10.345	140.01	1,448.40	
	5.00	PR40+050	PR40+040	5.42	10.415	23.15	241.11	
	5.00	PR39+860	PR39+840	5.62	10.620	46.30	491.71	
	5.00	PR39+810	PR39+770	5.70	10.700	71.76	767.83	
	5.00	PR39+760	PR39+660	5.84	10.840	112.00	1,214.08	
	5.00	PR38+610	PR38+590	6.87	11.870	46.30	549.58	
	5.00	PR38+510	PR38+420	7.08	12.075	162.09	1,957.24	
Granada Coordenandas Lat. 3.4827924N Long. -73.7164277W	5.00	PR38+350	PR38+340	7.12	12.115	23.15	280.46	
	5.00	PR38+250	PR38+140	7.37	12.365	245.64	3,037.34	SUBBASE GRANULAR CLASE A MES DE JUNIO
	5.00	PR38+130	PR38+050	7.44	12.440	349.60	4,349.02	
	5.00	PR37+990	PR37+930	7.55	12.550	346.10	4,343.56	
	5.00	PR37+920	PR37+880	7.59	12.590	115.76	1,457.42	
	5.00	PR37+470	PR37+440	8.03	13.025	225.74	2,940.26	
	5.00	PR37+410	PR37+050	8.58	13.580	1,950.12	26,482.63	
	5.00	PR37+010	PR36+980	8.49	13.485	104.19	1,405.00	
	5.00	PR36+970	PR36+900	8.59	13.585	462.00	6,276.27	
	5.00	PR39+850	PR39+845	5.61	10.608	28.10	298.07	
	5.00	PR39+510	PR39+505	5.95	10.948	18.00	197.06	
	5.00	PR40+430	PR40+427	5.02	10.025	27.00	270.66	
					TOTAL VOLUMEN DE SUBBASE GRANULAR CLASE A MES DE JUNIO (m3)	**5,870.08**	0.00	
						TOTAL	**92,474.00**	

	TOTAL TRANSPORTE m3-Km	**1,842,632.00**

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR40+430



PR38+000




PR37+830




37+720

FUENTE DE MATERIALES DE SUBBASE MAS CERCANOS RIO ARIARI TRITURADOS DEL ARIARI A 218.5 KM DE PR45+450

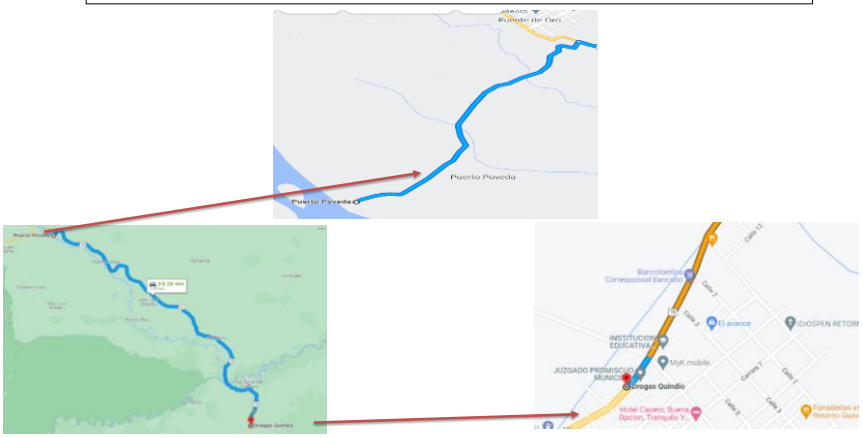


FUENTE DE MATERIALES DE BASE MAS CERCANOS RIO ARIARI MINERALES DEL LLANO A 236 KM DE PR45+450

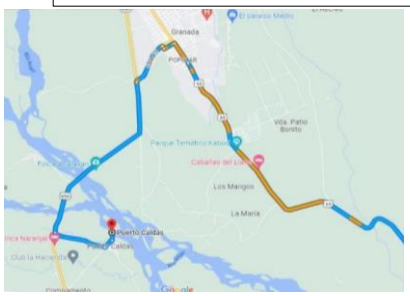



FUENTE DE MATERIALES SUBBASE GRANULAR Y SUBBASE GRANULAR CLASE A 241 KM DE PR45+450

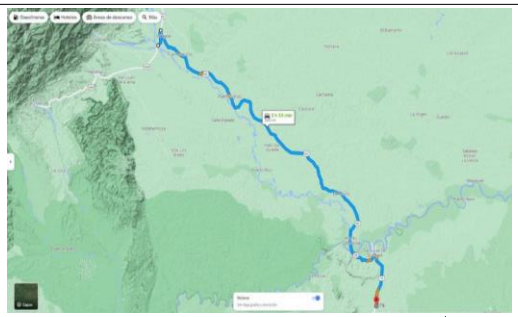

FIRMA		
NOMBRE	**MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA**	**OSCAR FERNANDO [illegible] DIAZ**
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
41	Transporte de mezcla asfáltica, compactos	129,950.00	m3-km

ABSCISAS			DIMENSIONES						
INICIO	COLOCACION		LONGITUD EN OBRA	LONGITUD AL PR45+450	MEZCLA ASFALTICA				OBSERVACIONES
	INICIO	FIN	LO	218,5 KM + LO	PORCENTAJE ASFALTO (%)	VOLUMEN MATERIALES (m^3)	VOLUMEN DE AGREGADOS (m3)	VOLUMEN (m^3-Km)	
Fuente de Oro coordenandas (3.425163, -73.636824)	PR40+470	PR40+380	5.115	223.615	5.5%	45.09	42.61	9528.25	Vo. MEZCLA ASFÁLTICA
	PR38+440	PR37+870	7.87	226.37	5.5%	285.57	269.86	61087.69	
	PR37+450	PR36+930	8.78	227.28	5.5%	260.52	246.19	55954.38	
	PR58+505	PR58+505	5.00	223.50	5.5%	16.00	15.12	3379.32	
	TOTAL VOLUMEN DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE (m3)					607.20		0.00	
						TOTAL		129,950.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA




PR38+440 ASFALTO EN CARRIL DERECHO - PRIMERA CAPA






PR37+050 ASFALTO EN CARRIL IZQUIERDO - PRIMERA CAPA





PR37+050 RIEGO DE IMPRIMACION CARRIL DERECHO

TRANSPORTE DE ASFALTO DESDE FUENTE DE ORO

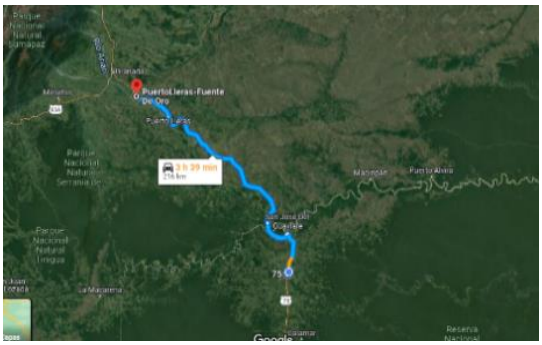

RECORRIDO AGREGADOS PÉTREOS PARA MEZCLA ASFÁLTICA

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL [illegible] GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	01/07/2022	31/07/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	44,000.00	KG

FECHA	PR INSTALADOS		CALZADA		%	CAL VIVA (KG)	OBSERVACIONES
			IZQUIERDA	DERECHA			
09/07/2022	PR37+690	PR37+590	X			6000	
15/07/2022	PR37+690	PR37+590		X		8000	
16/07/2022	PR37+680	PR37+590		X		8000	
19/07/2022	PR37+690	PR37+580	X	X		4000	
21/07/2022	PR37+690	PR37+580		X		9000	
22/07/2022	PR37+690	PR37+580	X			9000	
						44000	




PR37+690 - PR37+590 CAL VIVA EN CALZADA DERECHA




PR37+690 - PR37+590 CAL VIVA EN CALZADA IZQUIERDA




PR37+690 - PR37+580 CAL VIVA CALZADA DERECHA E IZQUIERDA

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	01/07/2022	31/07/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-2	Suministro de Cal Viva	44,000.00	KG





PR37+580 - PR37+690 CAL VIVA CALZADA DERECHA

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	NOMBRE	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-3	Mejoramiento de la Subrasante con Cal Viva, no incluye suministro de Cal ni transporte. (Con material de prestamo).	1,338.30	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	
PR37+700	PR37+690	10.00	5.25	6.70	5.98	59.75	Cantidades obtenidas por secciones de terraplen
PR37+690	PR37+680	10.00	6.70	7.85	7.28	72.75	
PR37+680	PR37+670	10.00	7.85	8.95	8.40	84.00	
PR37+670	PR37+660	10.00	8.95	10.45	9.70	97.00	
PR37+660	PR37+650	10.00	10.45	11.98	11.22	112.15	
PR37+650	PR37+640	10.00	11.98	14.94	13.46	134.60	
PR37+640	PR37+630	10.00	14.94	15.15	15.05	150.45	
PR37+630	PR37+620	10.00	15.15	16.22	15.69	156.85	
PR37+620	PR37+610	10.00	16.22	13.44	14.83	148.30	
PR37+610	PR37+600	10.00	13.44	12.24	12.84	128.40	
PR37+600	PR37+590	10.00	12.24	9.68	10.96	109.60	
PR37+590	PR37+580	10.00	9.68	7.21	8.45	84.45	
					TOTAL (m3)	1,338.30	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR37+580 - PR37+690 ESTABILIZACIÓN CON CAL VIVA



PR37+590 - PR37+690 ESTABILIZACIÓN CON CAL VIVA



PR37+690 ESTABILIZACIÓN CON CAL VIVA

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	NOMBRE	GABRIEL ANDRES PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE - ACTA	DESDE	HASTA
	01/07/2022	31/07/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDAD
NP-5	Cemento hidraulico para suelo cemento	1,062.50	KG

FECHA	PR INSTALADOS		CALZADA		CEMENTO (Unidad)	CEMENTO (Kg)	OBSERVACIONES
			IZQUIERDA	DERECHA			
22/07/2022	PR38+310	PR38+440	X		16	680	
	PR38+140	PR38+170		x	9	383	
					TOTAL (Kg)	1062.50	





PR38+310 - PR38+440 CEMENTO CALZADA IZQUIERDA





PR38+140 - PR38+170 CEMENTO CALZADA IZQUIERDA

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	NOMBRE	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN-190°

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-6	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos entre 100 metros y 1000 metros de distancia.	1,424.00	m3-E

ACTIVIDADES	DIMENSIONES			
TRANSPORTE DE	VOLUMEN DESCAPOTE (m^3)	VOLUMEN EXCAVACIONES (m^3)	VOLUMEN (m^3-E)	OBSERVACIONES
Excavaciones	1,424.00	1.00	1,424.00	
		TOTAL	1,424.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+160




PR37+990



PR37+000



PR38+340

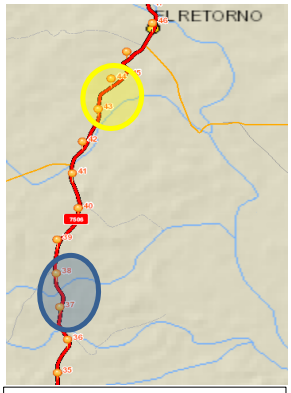

Recorrido de excavaciones

FIRMA		
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	GABRIEL ALEXANDER PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Rellenos con Material Filtrante	702.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	OBSERVACIONES
PR44+010	PR44+000	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR44+000	PR43+990	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+990	PR43+980	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+980	PR43+970	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+970	PR43+960	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+960	PR43+950	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+950	PR43+940	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+940	PR43+930	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+930	PR43+920	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	Filtro por los dos carriles
PR43+920	PR43+910	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+910	PR43+900	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+900	PR43+890	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+890	PR43+880	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+880	PR43+870	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+870	PR43+860	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+860	PR43+850	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR43+850	PR43+840	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	Filtro costado izquierdo
PR43+840	PR43+830	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	
						0.00	
PR41+500	PR41+490	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	
PR41+490	PR41+480	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	
PR41+480	PR41+470	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	Filtro costado izquierdo
PR41+470	PR41+460	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	
PR41+460	PR41+450	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	
PR41+450	PR41+440	10.00	0.48	0.48	0.48	4.80	
PR41+440	PR41+430	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+430	PR41+420	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+420	PR41+410	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+410	PR41+400	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+400	PR41+390	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+390	PR41+380	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+380	PR41+370	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+370	PR41+360	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+360	PR41+350	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+350	PR41+340	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	Filtro por los dos carriles
PR41+340	PR41+330	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+330	PR41+320	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+320	PR41+310	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+310	PR41+300	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+300	PR41+290	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+290	PR41+280	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+280	PR41+270	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+270	PR41+260	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
PR41+260	PR41+250	10.00	0.96	0.96	0.96	9.60	
						0.00	
PR38+420	PR38+410	10.00	0.63	0.63	0.63	6.30	
PR38+410	PR38+400	10.00	0.63	0.63	0.63	6.30	
PR38+400	PR38+390	10.00	0.63	0.63	0.63	6.30	Filtro costado derecho
PR38+390	PR38+380	10.00	0.63	0.63	0.63	6.30	
PR38+380	PR38+370	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+370	PR38+360	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+360	PR38+350	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+350	PR38+340	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+340	PR38+330	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+330	PR38+320	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+320	PR38+310	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+310	PR38+300	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+300	PR38+290	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+290	PR38+280	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+280	PR38+270	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+270	PR38+260	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+260	PR38+250	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	Filtro por los dos carriles
PR38+250	PR38+240	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+240	PR38+230	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+230	PR38+220	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+220	PR38+210	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+210	PR38+200	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+200	PR38+190	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+190	PR38+180	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+180	PR38+170	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+170	PR38+160	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+160	PR38+150	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
PR38+150	PR38+140	10.00	1.26	1.26	1.26	12.60	
					TOTAL (m3)	702.00	

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-7	Rellenos con Material Filtrante	702.00	m3

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	AREA ABSCISA INICIO (m2)	AREA ABSCISA FIN (m2)	AREA PROMEDIO EXCAVACION (m2)	CANTIDAD (m3)	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR38+340



PR41+420



PR41+260

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARIA CRISPINA MAZUERA PARRAGA	NOMBRE	GABRIEL ELIAS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-8	Tubería de Plastico Tipo corrugada de Diametro 100mm.	1,300.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)				LONGITUD (m)	
PR44+010	PR43+830	IZQUIERDA				180.00	Tubería usada para filtros
PR44+010	PR43+850	DERECHA				160.00	
PR41+500	PR41+250	IZQUIERDA				250.00	
PR41+440	PR41+250	DERECHA				190.00	
PR38+420	PR38+140	IZQUIERDA				280.00	
PR38+380	PR38+140	DERECHA				240.00	
						0.00	
					TOTAL (m3)	1,300.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.



PR38+140



PR37+980



PR38+210



PR38+380

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	NOMBRE	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-9	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido.	5,200.00	m2

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	LONGITUD (m)	ANCHO	ÁREA (m2)	ANCHO	ÁREA (m2)	
PR44+010	PR43+830	180.00	4.00	720.00	4.00	720.00	Filtro por los dos carriles
PR44+010	PR43+850	160.00	4.00	640.00	4.00	640.00	
PR41+500	PR41+250	250.00	4.00	1000.00	4.00	1000.00	
PR41+440	PR41+250	190.00	4.00	760.00	4.00	760.00	
PR38+420	PR38+140	280.00	4.00	1120.00	4.00	1120.00	
PR38+380	PR38+140	240.00	4.00	960.00	4.00	960.00	
					TOTAL (m3)	5,200.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR38+310



PR38+080



PR38+270

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	NOMBRE	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISIÓN 190

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC.	CONTRATO 976-2021 OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	INTERVENTOR

PREACTA DE OBRA N° 14

PERIODO PRE-ACTA	DESDE	HASTA
	01/julio/2022	31/julio/2022

No. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN ÍTEM	CANTIDAD EJECUTADA	UND.
NP-12	Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1800mm de diámetro interior.	50.00	m

ABSCISAS		DIMENSIONES					OBSERVACIONES
INICIO	FIN	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ESPESOR	LONGITUD (ml)	
PR44+470- PASO FAUNA		2.50	5.00			12.50	TRES LÍNEAS DE TUBERÍA; UNA PARA PASO FAUNA Y DOS PASO HIDRÁULICO
PR44+470 - PASO HIRÁULICO		2.50	5.00			12.50	
PR44+470 - PASO HIRÁULICO		2.50	5.00			12.50	
PR42+050		2.5	5.00			12.50	UNA LÍNEA PARA PASO FAUNA
						0.00	
					TOTAL (m3)	50.00	

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





PR44+470





PR42+050

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	MARIA CRISTINA MAZUERA PARRAGA	NOMBRE	GABRIEL ALEXIS PEREZ GRANADOS
CARGO	RESIDENTE DE OBRA	CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
ENTIDAD	CONSORCIO DSC	ENTIDAD	CONSORCIO ECOVISION 190
