Radicado R:2024010254118
Fecha:2024/06/07 8:59:09 AM
Tipo:OFICIO
Responsable VANESSA CAROLINA HOYOS R

02

Jose 11 BC

EMPROCIV S.A.S.

El Retiro, Antioquia, 6 de junio de 2024 EPC-GS-IER6135-8.2-328-24

Señores
GOBERNACION DE ANTIOQUIA
Atn. Ing. JOSÉ BERNARDO ÁLVAREZ PULGARIN
Supervisor de Contrato
Secretaria de Infraestructura Física
Calle 42B Número 52- 106 CAD "José María Córdova" - La Alpujarra.
La ciudad

Ref.: *Contrato de Interventoría N° 4600016135 - Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia.*

Asunto: Entrega de informes mensuales. Informe N.9 – mayo 2024.

Estimados Señores:

Dando cumplimiento a nuestras obligaciones administrativas contractuales, adjunto remitimos informes mensuales correspondientes a los periodos comprendido entre el 01 de mayo y 31 de mayo de 2024:

DESCRIPCIÓN	FOLIOS (Doble cara)	CD
Informe SGSST	16	1
Informe Técnico	25	1
Informe Ambiental	64	1
Informe Social	22	1

Quedamos atentos a sus comentarios,

Cordialmente,

YENY MARCELA PÉREZ VELÁSQUEZ
Directora Interventoría

Anexo: Lo Anunciado
DG/YP

ARCHIVO SIF
2024 SEP 11 13:43:04

Tels. (571) 300 1964780
Calle 13 No 3-46 Ofc. 301 – Cra 24 No 20A-59
int16135.emprociv@gmail.com / lperalta@emprociv.com
www.emprociv.com
COTA, CUNDINAMARCA – EL RETRIO, ANTIOQUIA - COLOMBIA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

PROYECTO:

CONTRATO 46000016135 DE 2023

Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia.

INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA No. 9

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024.

FIRMA INTERVENTORA: EMPROCIV SAS

Elaborado por: Mireya Maricsa Higuera Calderon.	Revisado y Aprobado: Yeny Marcela Pérez Velásquez.
Cargo: Residente SST de Interventoría	Cargo: Director Interventoría
Firma:	Firma:
Aprobado: Supervisor Seguridad y Salud en el Trabajo (Gobernación)	Luis Alcides Díaz Firma:

INTERVENTORIA EMPROCIV S.A.S

CONTRATISTA CONSORCIO EL RETIRO PG



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No.9

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5
2. ALCANCE 7
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 8
3. LOCALIZACIÓN DE LAS VÍAS DEL PROYECTO 9
4. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y OBRA 10
4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 10
5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO EL RETIRO PG12
5.1 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA 15
6. PREVENCION Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES 16
7. PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO 17
8. Gestión SGSST 18
Inducciones de ingreso trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas, de acuerdo al decreto 1075 de 2012. Relacionadas a continuación para la gestión del mes de abril de 2024. 18
Contratista e interventoría realizan inducciones de ingreso para personal administrativo y operativo. Ver Anexo1. 18
9. REGISTRO FOTOGRÁFICO: 22
10. CONCLUSIONES 29
11. RECOMENDACIONES 30
ANEXOS. 32

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Información General Consultaria 10
Tabla 2. Información General Obra 11
Tabla 3. Listado de personal actico del periodo contratista 12
Tabla 4. Listado de personal activo del periodo interventoria 15
Tabla 5. Listado de personal retirado del periodo contratista 15
Tabla 6. Listado de personal retirado del periodo interventoria 16
Tabla 7. Listado de capacitaciones y charlas del periodo 20
Tabla 8. Registro fotografico 22

LISTADO DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización general del proyecto 7
Ilustración 2. Localización especifica del proyecto 8
Ilustración 3. Localización especifica del proyecto 9

INFORME MENSUAL GSST No. 9, DEL 01 al 31 de mayo de 2024.

Mantener informada a la entidad contratante sobre el seguimiento, el control, las dificultades y las acciones tomadas por la Entidad Contratante, El Constructor y por la presente Interventoría en las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, ejecutadas por el contratista CONSORCIO EL RETIRO PG y esta interventoría EMPROCIV SAS, en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2024, las cuales se encuentran enmarcadas en el avance del contrato que tiene por objeto. AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL - LA MARIA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En el año 2019, la Secretaría de Infraestructura Física del Departamento de Antioquia, mediante Resolución No. S98042019060049209 del 28 de mayo de 2019, abrió el Proceso de Contratación por Licitación Pública No. 9804, con el fin de contratar la "**Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de Obras Complementarias en la Vía Carabanchel - La María Municipio del Retiro, Subregión Oriente del Departamento de Antioquia".**

Mediante las resoluciones N° S2019060144915 Y S2019060145590 del 18 y 23 de julio de 2019 respectivamente, la entidad adjudicó el contrato N° 4600010113 de 2019 a La Unión Temporal Vial SCS Oriente, y el contrato de consultoría N°4600010111 de 2019 con la sociedad VIASTOP SAS, como producto del concurso de méritos 10107 cuyo objeto es: "**Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de Obras Complementarias en la Vía Carabanchel La María Municipio del Retiro, Subregión Oriente del Departamento de Antioquia**".

El alcance del contrato de obra N° 4600010113 de 2019 tuvo como finalidad realizar la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias sobre la vía Carabanchel – La María en una longitud de 2,6 Km, desde el puente la María hasta el sector conocido como el Mall de Carabanchel por un valor de $ 7.792.013.412, dichas actividades se realizarían con recursos obtenidos a través del derrame de Valorización del sector. El contrato de obra tuvo una adición por valor de $1.250.000.000, recursos propios.

Siendo así las cosas, el proyecto consiste en realizar el mejoramiento del tramo de vía restante, el cual comprende aproximadamente 1,3 Km de longitud del Corredor vial ARROYITO - CONEJERAS conocido como "CARABANCHEL LA MARÍA" del Municipio del Retiro, (CÓDIGO 05607VT12) - Subregión Oriente, tramo vial ubicado del **K1+300 al K2+600**, a través de la pavimentación, ampliación, rectificación, construcción de andenes, y construcción de ciclo ruta, construcción de obras de drenaje, sub-drenaje, obras de estabilización de taludes y obras de contención entre otras, de esta forma se culmina los trabajos sobre todo el corredor vial correspondiente a 2,6 Km, quedando totalmente pavimentada y con una sección de vía de aproximadamente 12 m, de los cuales 7 m corresponde a carriles viales, 3 m a carril de ciclo vía, 1,5 m de anden y 0,5 m de zonas verdes, de esta forma se conecta el punto denominado Carabanchel con El Puente La María.

La vía Arroyito - Conejeras con código 05607VT12 se cataloga como vía de Tercer orden, a cargo del Municipio de El Retiro, el tramo ubicado de la abscisa K1+300 al K2+600, cuenta con una superficie de rodadura en concreto asfáltico en regular estado, con presencia de grietas longitudinales y transversales, pieles de cocodrilo y baches. La vía presenta un ancho promedio de calzada de 5,0 m.


De acuerdo con la Circular No. 9 Inventario de la Red Vial en el Departamento de Antioquia de Diciembre de 2015 (Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia) La vía "CARABANCHEL LA MARÍA" se encuentra denominada, como vía ARROYITO - CONEJERAS código 05607VT12, vía terciaria a cargo del Municipio de El Retiro.

Es importante anotar que el mantenimiento de las vías terciarias es competencia de los Municipios. sin embargo, El Departamento de Antioquia cuenta con el permiso de intervención de fecha 29 de marzo de 2019 otorgado por el Municipio de El Retiro, para la ejecutar las actividades de ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias sobre la vía Carabanchel - La María Municipio de El Retiro subregión oriente del Departamento de Antioquia.

2. ALCANCE

El alcance del contrato de obra al que realizaremos la interventoría corresponde a la Ampliación, rectificación, pavimentación de 1.3 kilómetros de vía y construcción de obras de drenajes y muros de contención. Ancho total de la sección transversal o corona de 12.00 m, e incluye anden (1.5m), vía vehicular (7.0m), zona verde (0.5m) y ciclo ruta (3.0m).

Ilustración 1 sección vial del proyecto

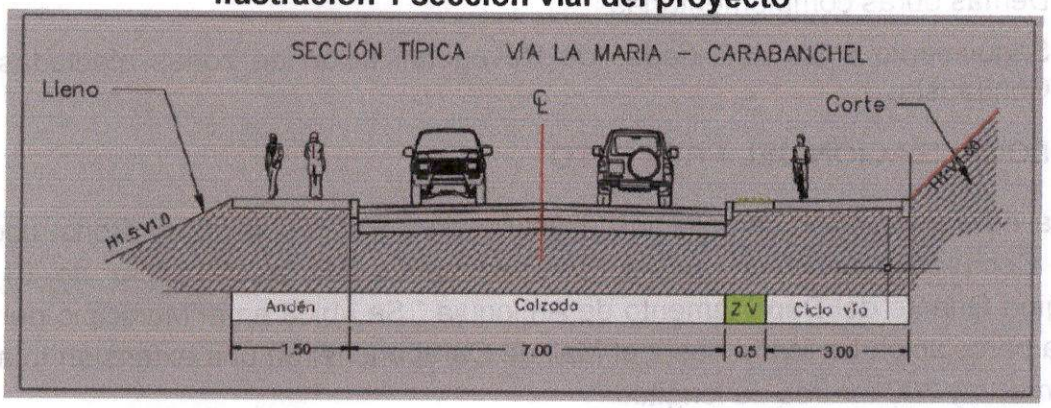

ACTIVIDADES A DESAROLLAR


- Rocería.
- Tala de Árboles.
- Gestión predial
- Explanaciones, Conformación de banca.
- Llenos estructurales.
- Construcción de alcantarillas con Tubería.
- Construcción alcantarillas tipo Box coulvert.
- Limpieza de obras transversales existentes.
- Excavaciones sin clasificar de la explanación, canales y préstamos.
- Mejoramiento de la subrasante.
- Suministro, colocación, conformación y compactación de material de sub- base Granular y base granular.
- Imprimación.

- Suministro y colocación de mezcla densa en caliente Tipo MDC 2.
- Construcción de filtros y cunetas.
- Transporte de material proveniente de la excavación y material granular.
- Obras de mitigación del impacto ambiental.
- Concretos: Todas las obras que incluyan esta actividad.
- Revegetalización.
- Demás obras complementarias.
- Seguimiento a las actividades de Revegetalización de zonas afectadas por el Contratista.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La obra de construcción "Ampliación, Rectificación, Pavimentación y Construcción de Obras Complementarias en la vía Carabanchel-La María Municipio de El Retiro Subregión Oriente del Departamento de Antioquia." Se ubica en el Municipio del Retiro, entre la parcelación La María hasta el Mall de Carabanchel en una extensión total de un (1) kilómetro y 300 metros de longitud.

Ilustración 2. Localización del proyecto

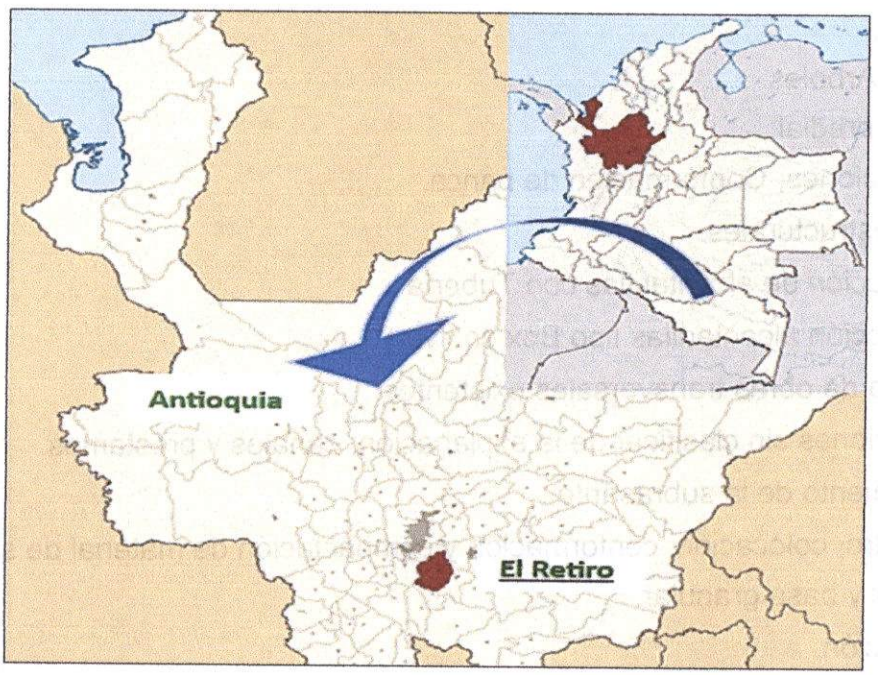

La obra tiene como propósito de la ampliación de la vía actual a dos carriles cada uno de 3.50 m, se contempla la construcción de un andén sobre la margen izquierda y en su margen derecha la construcción de ciclo vía, en dirección de la quebrada Pantanillo sector La María hacia el Mall de Carabanchel, obras que se contemplan a lo largo de la longitud de la vía. Esta zona, contempla un alto nivel de valorización, proyección habitacional, de tal manera que se justifique el desarrollo urbanístico.


3. LOCALIZACIÓN DE LAS VÍAS DEL PROYECTO

A continuación, se detalla la longitud de la vía que compone el alcance del Contrato de Obra:

Desde el PR 1+300 al PR 2+600 (Carabanchel)

En la siguiente ilustración se describe la localización de la vía del proyecto.

Ilustración 3.Vías para intervenir del Proyecto

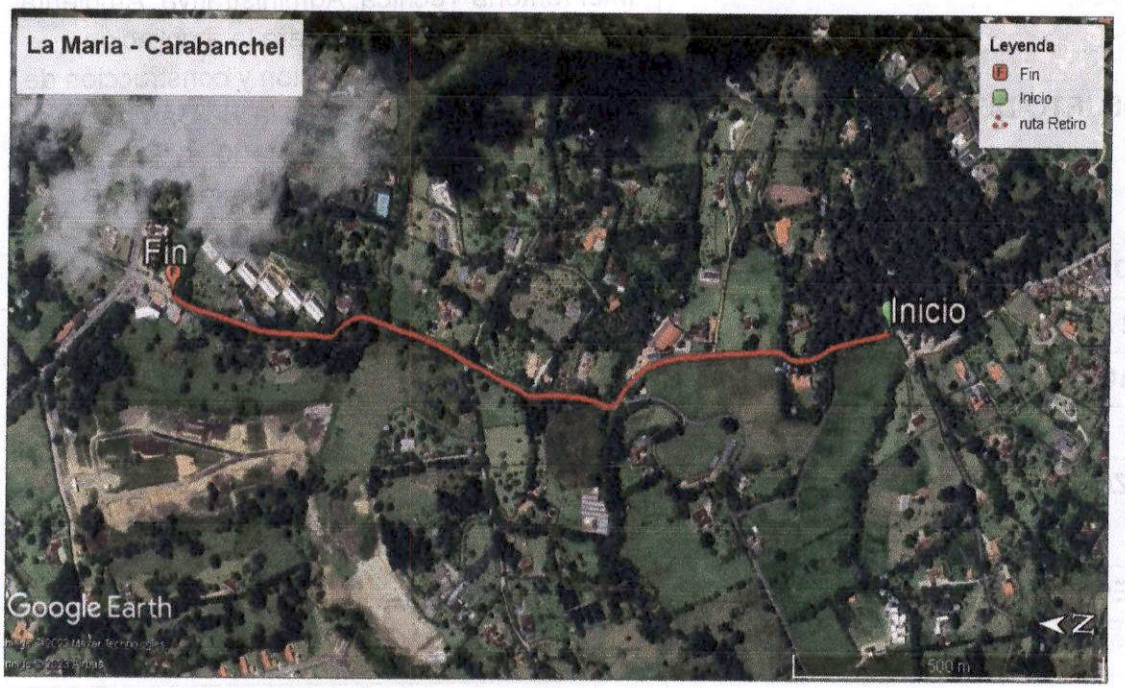

Fuente: Adaptado y modificado de la plataforma tecnológica de Google Earth Pro.

4. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA Y OBRA

4.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1. Información General Consultoría Fuente: Elaboración Propia

CONTRATO DE CONSULTORÍA	
CONTRATO DE CONSULTORÍA No.	4600016135 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16 de Julio de 2023
CONTRATISTA:	EMPROCIV S.A.S
INTEGRANTES:	EMPROCIV SAS. 100 %
NIT	900.096.419.-9.
DIRECCIÓN:	Calle 13 No. 3-46 Oficina 301 Cota, Cundinamarca.
TELÉFONO:	3001964780
OBJETO DEL CONTRATO:	Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental, Financiera y Legal para la ampliación, rectificación, pavimentación y construcción de obras complementarias en la vía Carabanchel - La María abscisas del k1+300 al k2+600, Municipio de El Retiro Subregión oriente del departamento de Antioquia
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 904.962.427
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	$357.278.055
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$1.268.240.482
FECHA DE INICIO:	25 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Seis (6) Meses y Quince (15) días
SUSPENSION No. 01	22 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 1	07 de febrero 2024
PRORROGA No. 1	Cuatro (4) Meses y Quince (15) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	Hasta el 01 de julio de 2024
SUPERVISOR:	ING. JOSE ALVAREZ

Tabla 2. Información General Obra

Fuente: Elaboración Propia Emprociv S.A.S

CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	4600015848 de 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	11 de Julio 2023
CONTRATISTA:	COSORCIO EL RETIRO PG
INTEGRANTES:	INTEGRADO POR PROMCIVILES SAS, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 70%, Y PROMOTORA PUGA LTDA, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 30%.
NIT:	901.720.055-2
DIRECCIÓN:	Av. Carrera 19 No 95-12 oficina. 605
TELÉFONO:	4327903
OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA CARABANCHEL – LA MARÍA ABSCISAS DEL K1+300 AL K2+600, MUNICIPIO DE EL RETIRO SUBREGIÓN ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.693´070.651 AIU 29.32%
VALOR FINAL	
FECHA DE INICIO:	25 de Julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Seis (6) meses
FECHA DE REINICIO No. 1	07 de febrero 2024
SUSPENSION No. 01	22 de diciembre de 2023
PRORROGA No. 1	Cuatro (4) Meses y Quince (15) días
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	Hasta el 01 de julio de 2024

5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO EL RETIRO PG

Tabla 3. Listado de personal activo administrativo y operativo del periodo

PERSONAL CONSORCIO EL RETIRO PG		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
DEISON ALEXANDER MAYA RODRIGUEZ	15517707	CADENERO I
CARLOS ALBERTO AFRICANO CHAVES	19492977	DIRECTOR DE OBRA
MARISELA DURANGO CARVAJAL	1039623493	RESIDENTE SOCIAL
ELKIN JOVANNI GARCIA PATIÑO	1094891150	TOPOGRAFO
SARA MARIA PINEDA MONROY	1040748194	RESIDENTE AMBIENTAL
LUZ DARY MUÑOZ RAMIREZ	43689223	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
ARGEMIRO HUMBERTO CUADROS ARIAS	71490442	CONDUCTOR DOBLETROQUE
JANER ARLEY ROMAN SUAZA	71556687	TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES
JORGE ARMANDO CHAVEZ GARCIA	73192001	RESIDENTE DE OBRA
YESSICA ANDREA AFRICANO RODRIGUEZ	1010206850	PROFESIONAL ELECTRICO
ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ GIRALDO	1128466807	OPERADOR DE MAQUINARIA
ANDRES MAURICIO RODRIGUEZ GIRALDO	1128466807	OPERADOR DE MAQUINARIA
JOSE LUIS BOTERO BETANCUR	71385659	RESIDENTE SST
PERSONAL DIPS INGENIERÍA		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
CARLOS ALBERTO CUADRADO PASCACIO	1001596751	PERFORADOR ENCARGADO
EDWIN YULIAN IDARRAGA PEREZ	1054989072	DIRECTOR DE OPERACIONES
JOIMAR DAVID ALVAREZ PADILLA	1005525656	AUXILIAR DE PERFORACION
DIMAR DE JESUS ALVAREZ ACEVEDO	1007066319	AUXILIAR DE PERFORACION
SANTIAGO CORREA CARDONA	1036686242	AUXILIAR DE PERFORACION
CRISTIAN HINCAPIE MUÑOZ	1036947726	AUXILIAR DE PERFORACION
DANIELA ARBELAEZ LOPEZ	1006958525	AUXILIAR SST
ROBERT ALEXANDER RIVAS RUIZ	PPT 4631587	PERFORADOR ENCARGADO
LEONARDO RAFAEL CONTRERAS ATENCIA	1099992313	AUXILIAR DE PERFORACION
LUIS FERNANDO CONTRERAS ATENCIA	1007299332	AUXILIAR DE PERFORACION
ROOSVELT STIVEN ANDRADE CASTILLO	1006094745	AUXILIAR DE PERFORACION
YAMID POSA GARCIA	1036403656	AUXILIAR DE PERFORACION
LUIS DAVID GUTIERREZ GUTIERREZ	7145425	AUXILIAR DE PERFORACION

JANIER YESITH ARCIA GUEVARA	1102229145	AUXILIAR DE PERFORACION
ABEL JOEL CEGARRA ESCALONA	6414924	AUXILIAR DE PERFORACION
PERSONAL LINIEROS UPEGUI		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
LUIS ANTONIO YARCE GOMEZ	71189842	OFICIAL ELECTRICISTA
DANIEL LOPEZ SERNA	1032071536	OFICIAL ELECTRICISTA
DIEGO ALEJANDRO UPEGUI SALDARRIAGA	1045076967	COORDINADOR EN OBRA.
ESTIVEN ALBERTO YARCE GOMEZ	1037504452	OFICIAL ELECTRICISTA
PERSONAL MANTENIMIENTO Y MEJORAS (PAISAJES HECTOR S.A.S)		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
DANIELA ANLLELY MIRA BURITICA	1037071966	SST
GERARDO DE JESUS PINO SANCHEZ	15272726	AUXILIAR DE TALA Y PODA
LUIS CARLOS FLOREZ USUGA	8111242	AUXILIAR DE TALA Y PODA
JOSE WILLINTON VILLEGAS CASTAÑEDA	1116160660	AUXILIAR DE TALA Y PODA
ROGELIO RUIZ CANO	15263642	AUXILIAR DE TALA Y PODA
JESUS ARLEY ESPINOSA JULIO	1010159276	OFICIAL DE TALA Y PODA
HENRY OROZCO AGUIRRE	98677450	AUXILIAR DE TALA Y PODA
MIGUEL FERNANDO HOYOS BOHORQUEZ	71685185	INGENIERO FORESTAL
LUIS ALFONSO GOEZ LOPEZ	70434415	AUXILIAR DE TALA Y PODA
PERSONAL RENTAL EP S.A.S.		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
ANDRES CAMILO SEGURA GONZALEZ	1020797251	OPERADOR MULTIPLE
PEDRO WILLIAM BAQUERO DUARTE	79510760	CONDUCTOR
LUIS FERNANDO PORRAS QUITIAN	800500823	CONDUCTOR
ARMANDO GOMEZ ORTIZ	79753514	OPERADOR MINICARGADOR
EDGAR GUERRERO CABRERA	3185713	CONDUCTOR DOBLETROQUE
MICHAEL STEVEN CASTIBLANCO RAMIREZ	1022376344	AYUDANTE DE SOLDADOR
JOHN ALEXANDER BOYACA MARTIN	80022111	AYUDANTE DE SOLDADOR
JUNIOR YESID RODRIGUEZ JIMENEZ	1192924869	OPERADOR DE MINICARGADOR

PERSONAL ALEJANDRO CARO		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
RICHARD ALBERTO CARO ROMERO	79976967	ENCARGADO DE OBRA
HOMES ALBEN MANJARREZ SANTOS	93451440	AYUDANTE DE OBRA
DIEGO ALEJANDRO CARO CRUZ	1000930326	ENCARGADO DE OBRA
RAFAEL ORJUELA	71753217	OFICIAL DE OBRA
JORGE LUIS MURILLO LOPEZ	71351409	OFICIAL DE OBRA
RIGOBERTO CARO ROMERO	1020755555	OFICIAL DE OBRA
HENRY ORLANDO CONTRERAS JAMES	1093854014	AYUDANTE DE OBRA-CONTROLADOR VIAL
COROMOTO DE CARMEN LOPEZ ROJAS	P.P.T 7039907	CONTROLADOR VIAL
MIGUEL MARTINEZ MONTERO	18235838	OFICIAL DE OBRA
LUZ MARYORI AGUDELO	43267118	AYUDANTE DE OBRA-CONTROLADOR VIAL
LUIS ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ	1030586765	AYUDANTE ALMACEN
JOEL HORMIGA CASTAÑEDA	1114727401	OFICIAL DE OBRA
LIBANIEL SERNA PEÑA	1114727348	AYUDANTE DE OBRA-CONTROLADOR VIAL
SANTIAGO JOSE ROMERO ROCA	PPT 6171716	AYUDANTE DE OBRA-CONTROLADOR VIAL
JOSE PASCUAL MONTAÑEZ GALLO	13560772	OFICIAL DE OBRA
JOVAN ENRIQUE PINEDA AGUIRRE	1092350360	AYUDANTE DE OBRA-CONTROLADOR VIAL
YAIR HURTADO ROMAÑA	1003786772	AYUDANTE DE OBRA CONTROL VIAL
JAVIER URIANA BENEDICTO	17873206	AYUDANTE DE OBRA CONTROL VIAL
REINEL RICARDO BALBIN VILLEGAS	1040181410	AYUDANTE DE OBRA CONTROL VIAL
YULISA ANDREA DIAZ FLOREZ	1001780164	CONTROLADOR VIAL
JAIRO ANTONIO CAVIEDES SOLER	1012339018	AYUDANTE DE OBRA CONTROL VIAL
ANA SOFIA PEREZ CORREA	1063719099	CONTROLADOR VIAL
JOHANDRIS CASTILLO DE LA CRUZ	1005417219	CONTROLADOR VIAL
LEVIS LILIANA PEREZ CORREA	1063719100	CONTROLADOR VIAL
JESUS ARMANDO CHALA MENA	1077440709	AYUDANTE DE OBRA
MARIA CAMILA CASTAÑO CARVAJAL	1020491062	CONTROLADOR VIAL

LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

Tabla 4. Listado de personal activo administrativo y operativo del periodo.

PERSONAL INTERVENTORIA		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
YENY MARCELA PEREZ VELASQUEZ	43155491	DIRECTOR INTERVENTORIA
DIEGO LEONARDOGONZALEZ PINZON	1049615512	INGENIERO RESIDENTE
JULIO CESAR AGUILAR ACEVEDO	1036619413	INGENIERO AMBIENTAL
YERIS ANITH FLOREZ JAIMES	63554570	PROFESIONAL SOCIAL
MIREYA MARICSA HIGUERA CALDERON	52490454	RESIDENTE SST
LEYDI ALEJANDRA PERALTA GUIO	1118563056	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
HERNAN ALBERTO VARELA AVENDAÑO	1053765818	TOPOGRAFIA
CRISTIAN CAMILO VALERA AVENDAÑO	1053784640	TOPOGRAFIA
ORLANDO GOMEZ GONZALEZ	70082143	TOPOGRAFO
JUAN ESTEBAN CARDONA	1040183298	CADENERO
JOSE ARLEY GIRALDO CALDERON	1033762859	CADENERO I
EDILBERTO DE JESUS VILLA RUIZ	79449271	CADENERO II
ROBINSON ANDRÉS MESA GONZÁLEZ	79542726	CONDUCTOR

5.1. LISTADO DE PERSONAL RETIRADO DEL CONTRATISTA CONSORCIO EL RETIRO PG

Tabla 5. Listado de personal retirado administrativo y operativo del periodo.

PERSONAL RETIRADO CONSORCIO PG			
EMPRESA	**NOMBRE DEL TRABAJADOR**	**CEDULA**	**CARGO**
CONSORCIO EL RETIRO PG	WALTER ANDRES DURANGO ALZATE	1000287624	CONDUCTOR
ALEJANDRO CARO	LUIS ALBERTO CARDONA TABARES	70056728	OFICIAL DE OBRA
ALEJANDRO CARO	LUZ DARY AMARILES VANEGAS	1090076599	CONTROLADOR VIAL
ALEJANDRO CARO	JOHAN CARLOS CESPEDES DAVILA	PPT 6902037	AYUDANTE DE OBRA

LISTADO DE PERSONAL RETIRADO DE INTERVENTORIA

Tabla 6. Listado de personal retirado administrativo y operativo del periodo.

PERSONAL RETIRADO INTERVENTORIA		
NOMBRE DEL TRABAJADOR	**CEDULA**	**CARGO**
JUAN ESTEBAN CARDONA	1040183298	CADENERO

6. Prevención y control de los factores de Riesgos asociado a las actividades.

- Identificación, valoración y priorización de los riesgos, utilizando la jerarquía de controles.
- Política asociada a la prevención de lesiones y enfermedades orientada a la mejora continua.
- Establecer reglamento de higiene y seguridad industrial.
- Conformación de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), o vigía de SST, cuyos integrantes se establece curso Virtual de 50 horas del SG-SST, así como la coordinación de las reuniones mensuales establecidas.
- Conformación e implementación del comité convivencia laboral en cumplimiento a la resolución 652 de 2012 y resolución 1356 de 2012.
- Matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos.
- Matriz de requisitos legales aplicables.
- Elaboración de Plan de emergencias y medevac del contrato.
- Elaboración plan de trabajo anual de la gestión SST.
- Elaboración plan de capacitaciones y entrenamiento SST.
- Elaboración y entrega de programa de inspecciones SST, adicionando programa de actividades.
- Elaboración de Procedimientos de trabajo seguro (anexo estándar de seguridad).
- Elaboración e implementación de programa gestión del Riesgo, para riesgos valorados en la matriz de peligros.
- Elaboración manual SST para manejo de subcontratista.
- Elaboración Informe gestión SST
- Acompañamiento a visitas o recorridos por la Interventoría, Gobernación o entes de control que lo requieran.
- Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Inducciones al SG-SST de los trabajadores.

7. Programa de Seguridad en el trabajo.

- Elaboración de instructivos, procedimiento, análisis de trabajo seguro, protocolos de trabajo.
- Relación de oficios críticos y actividades de alto riesgo.
- Procedimiento para la notificación e investigación de accidentes e incidentes laborales.
- Inventario de productos químicos, con sus correspondientes hojas de seguridad, en el sitio de manipulación y almacenamiento.
- Disposición de Kit de derrames, para caso de vertido accidental.
- Demarcación de áreas de almacenamiento de productos químicos.
- Manejo y disposición de los empaques, embalajes y productos sobrantes, el cual será manejado por gestor ambiental externo, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente Decreto 4741 de 2005, o la que lo modifique.
- Suministro de elementos de protección personal, teniendo en cuenta el oficio y riesgo expuesto el trabajador, con frecuencia de entrega como se en la normatividad legal vigente.
- Programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipo.
- Diseño y e implementación de plan estratégico de seguridad vial, dependiendo las condiciones y acorde a la normatividad vigente.
- Elaboración plan de inspecciones, incluyendo áreas críticas, de acuerdo con la matriz de identificación de peligros, incluyendo periocidad y responsable.
- De acuerdo con lo anterior, el contratista evidencia las siguientes actividades para el mes de abril:
- Cumplimiento a Inducciones, re-inducciones y notificación de riesgos al personal que ingresa incluyendo los trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas, de acuerdo al decreto 1075 de 2012.
- Exámenes médicos ocupacionales, como medida de prevención, antes que aparezcan patologías clínicas de origen laboral o común que se puedan agravar por las condiciones laborales.
- Pago integrado de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales.
- Seguimiento a ausentismo laboral con el fin de identificar las causas más frecuentes de inasistencia laboral (accidentes laborales, enfermedad común, enfermedad, laboral).
- Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones en relación la prevención del contagio por COVID-19 de acuerdo a la Resolución 692 de 2022.
- Capacitaciones y Charlas de seguridad donde se orienta, sensibiliza y se acompaña a los trabajadores para la identificación y control de peligros y riesgos de acuerdo a las características de las actividades ejecutadas.

- Inspecciones de seguridad en herramientas, maquinaria y equipos como medidas de prevención que permitan identificar condiciones de riesgo que pueden materializarse en incidentes o accidentes laborales.
- Controles preventivos y gestión documental para el Programa de Alturas de acuerdo a la legislación vigente Resolución 472 de 2021, vigente desde el 01 de agosto de 2022.
- Investigación de los accidentes reportados para la identificación que los generaron e implementar las acciones correctivas y preventivas que eviten la ocurrencia de eventos similares.

8. Gestión SGSST

Inducciones de ingreso trabajadores dependientes, cooperados, en misión y contratistas, de acuerdo al decreto 1075 de 2012. Relacionadas a continuación para la gestión del mes de mayo de 2024.

Contratista e interventoría realizan inducciones de ingreso para personal administrativo y operativo. **Ver Anexo1.**

Personal Subcontratista

Consorcio PG:	1 inducciones de ingreso
Alejandro Caro:	3 inducciones de ingreso
Dips Ingeniería:	5 inducciones de ingreso
Rental EP:	1 inducciones de ingreso

Personal Interventoría

Emprociv:	2 inducción de ingreso

Seguimiento estado de salud previo al ingreso a obra, del cual define el sistema de vigilancia epidemióloga para el mes de mayo de 2024, en la relación de aptitudes médicas entregadas por el contratista No se evidencian Restricciones médica laborales **Ver Anexo 1.**

Contratista e interventoría realizan los correspondientes pagos de liquidación, entrega de paz y salvos por prestaciones sociales a los trabajadores retirados para el periodo. **Ver Anexo 2.**

Certificaciones de revisoría fiscal y representante legal por parte del contratista e interventoría donde se garantiza el cumplimiento de pagos de salarios, honorarios y de aportes parafiscales propios al sistema de seguridad social integral. **Ver Anexo 3.**

Pago integrado de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales: Interventoría mensualmente verifica que todo el personal que ingresa al proyecto cuente con todas las afiliaciones a las entidades prestadoras de servicios tales como: EPS- ARL- AFP- CCF. Para el periodo los aportes a pagos de seguridad social se encuentran al día para el contratista y subcontratista. **Ver Anexo 4.**

Contratista

- ✓ Consorcio el retiro PG
- ✓ Alejandro Caro
- ✓ Dips Ingeniería
- ✓ Mantenimiento y Mejoras (Paisajes Héctor)
- ✓ Rental

Interventoría

- ✓ Emprociv
- ✓ H&C Topografía
- ✓ Robinson Mesa

Pagos de nómina del personal de contratista e interventoría firmadas por los trabajadores correspondientes al periodo. **Ver Anexo 5.**

Entregas de Dotación y elementos de protección personal durante el periodo. **Ver Anexo 6**.

Para el mes de mayo, Contratista e Interventoría realiza las siguientes Charlas y capacitaciones. **Ver anexo 7.**

Tabla 7. Listado de capacitaciones y charlas de seguridad del periodo

CONSORCIO EL RETIRO PG	
FECHA	**TEMA**
06/05/2024	Observaciones generales en seguridad
07/05/2024	Uso de EPP
08/05/2024	Cargos y responsabilidades de Obra
09/05/2024	Socialización de AT, Causas Condiciones que se deben evitar procedimientos inconclusos.
14/05/2024	Que son los ATS, Objetivos y la importancia de su cumplimiento
15/05/2024	Importancia de firmar la asistencia en obra
16/05/2024	Riesgos por el uso de bisutería , importancia de alternar las actividades diarias
17/05/2024	Acondicionamiento físico, Dolor lumbar
18/05/2024	Importancia del acondicionamiento físico
21/05/2024	Riesgo Locativo
23/05/2024	Importancia en la instalación de equipos que permitan restringir caídas a un nivel inferior
27/05/2024	Verificación de condiciones iniciales orden y aseo en el frente de trabajo
28/03/2024	Vaciado de concreto y sus peligros
CAPACITACIONES	
10/05/2024	Generalidades riesgo locativo
11/05/2024	Generalidades riesgo mecánico
15/05/2024	Control vial
20/05/2024	Importancia de implementar estilos de vida saludable Generalidades Deporte Alimentación Descansos
22/05/2024	Generalidades Riesgo eléctrico y proyección de objetos contundentes
23/05/2024	Aseo General Importancia de culminar los procesos constructivos, Cuidado de manos al manipular Variedad de objetos en las actividades diarias
DIPS INGENIERÍA	
01/05/2024	Riesgo Mecánico
02/05/2024	Diferencia entre riego y peligro
06/05/2024	Inspecciones de seguridad
07/05/2024	Tipos de riesgos
08/05/2024	Que es el ATS
09/05/2024	Riesgos expuestos con las bandas de inyección y preparación de lechada
10/05/2024	Uso y mantenimiento de EPP
11/05/2024	Que son los EPP

17/05/2024	Retroalimentación Levantamiento adecuado de cargas manuales las consecuencias y medidas preventivas de este riesgo
18/05/2024	Riesgo químico
20/05/2024	Riesgo Psicosocial
22/05/2024	Definición de riesgo Biológico medidas preventivas y consecuencias
24/05/2024	Riesgo Psicosocial Medidas preventivas y consecuencias
25/05/2024	Tipos de riesgos
CAPACITACIONES	
03/05/2024	Riesgos asociados
10/05/2024	Técnicas de levantamiento de cargas
23/05/2024	Inteligencia emocional y tipos de inteligencia
INTERVENTORIA	
02/05/2024	En qué lugares de trabajo se ve reflejado el riesgo locativo
03/05/2024	Aseo y mantenimiento de los EPP
06/05/2024	Causas de la perdida de la audición en el entorno laboral
07/05/2024	Hábitos saludables para prevenir enfermedades respiratorias
08/05/2024	Cuidado y manejo de puntillas en obra
09/05/2024	Reporte de accidentes laborales
10/05/2024	Tipos de protección respiratoria y auditiva.
14/05/2024	Prevención de AT de orden y aseo
15/05/2024	Prevención de trastornos musculo esqueléticos
16/05/2024	Etiquetado de sustancias químicas re envasadas de acuerdo al SGA
17/05/2024	La empatía como clave del trabajo en equipo
20/05/2024	Actos y condiciones inseguras
21/05/2024	Prevención VIH
22/05/2024	Socialización de los objetivos del SG-SST
23/05/2024	Sobreesfuerzo- Riesgo Biomecánico.
24/05/2024	Importancia de las buenas relaciones interpersonales en el trabajo.
27/05/2024	Hábitos Corporales para mejorar la salud
28/05/2024	Que es el acoso laboral
29/05/2024	Manejo situaciones de estrés
30/05/2024	Aspectos a tener en cuenta evacuación
CAPACITACIONES	
07/05/2024	Riesgo osteomuscular
16/05/2024	Manejo seguro de sustancias químicas.
22/05/2024	Sismos y Evacuaciones

Para el mes de mayo se realizan ATS para actividades de obra como Fundida de muro, Excavación y fundida de micro pilotes, Permisos de trabajo en caliente para instalación de cerramiento perimetral, Alturas para la poda de individuos arbóreos, **Ver anexo 8.**

Inspección y control de maquinaria, equipos, herramientas e insumos para la atención de emergencia, Para el mes de mayo el contratista realiza los siguientes pre-operacionales. **Ver anexo 9.**

Pre-operacional Volqueta.
Pre-operacional Vehículos.
Pre-operacional Maquinaria amarilla- Excavadora.
Pre-operacional Maquinaria amarilla- Retroexcavadora.
Pre-operacional Maquinaria amarilla- Mini cargador.
Pre-operacional Maquinaria amarilla- Retro cargador.
Pre-operacional Maquinaria amarilla- Vibro compactador.
Pre-operacional de equipo menor Compresor.
Pre-operacional de equipo menor Pulidora.
Pre-operacional de equipo menor Apisonador.
Pre-operacional de equipo menor Martillo neumático.
Pre-operacional de equipo menor Concretadora.
Inspecciones Botiquín y camilla.
Inspecciones Extintores.


9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:
Ver anexo 10.

Tabla 8. Registro fotográfico del periodo.

	
Fotografía N°1 Charla de seguridad	**Fotografía N°2 Charla de seguridad**



Fotografía N°3 Pausas activas

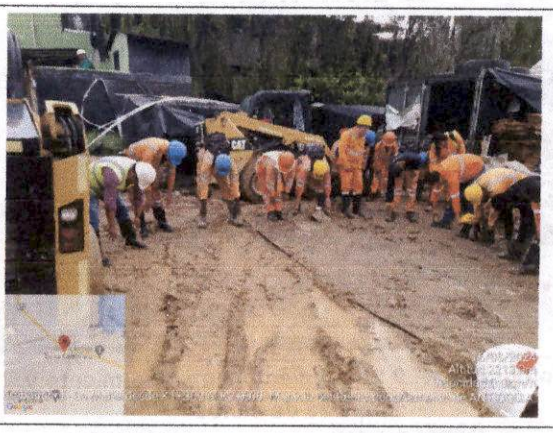


Fotografía N°4 Pausas activas



Fotografía N°5 Pausas activas



Fotografía N°6 Pausas activas

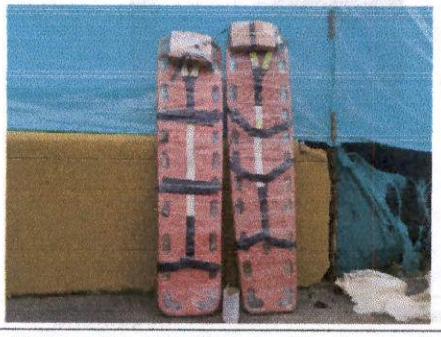

Fotografía N° 7 Inspección de camillas




Fotografía N° 8 Inspección de kits de emergencias



Fotografía N° 9 Seguimiento a mantenimiento y limpieza de baños



Fotografía N° 10 Inspección de señalización y demarcación de obra

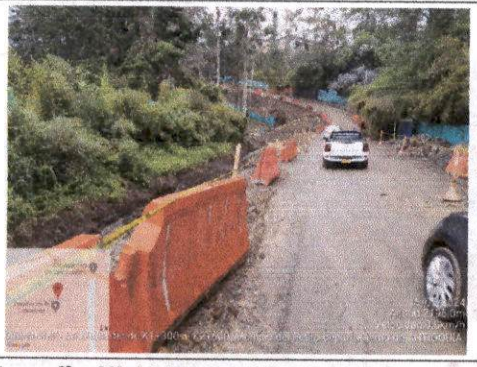

Fotografía N° 11 Inspección de señalización y demarcación de obra




Fotografía N° 12 Inspección de señalización y demarcación de obra



Fotografía N° 13 Traslado de maquinaria



Fotografía N° 14 Traslado de maquinaria

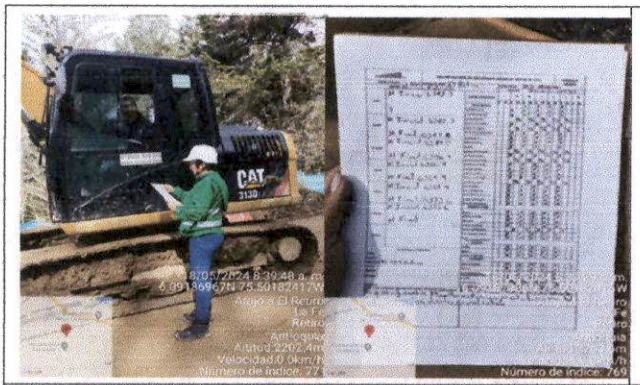

Fotografía N° 15 Inspección de Pre-operacional



Fotografía N° 16 Inspección de Pre-operacional



Fotografía N° 17 Inspección de condiciones de seguridad y ATS en excavación



Fotografía N° 18 Inspección de condiciones de seguridad y ATS en armado y fundida de muros




Fotografía N° 19 Inspección de ATS en instalación de formaleta para fundida de zapatas




Fotografía N° 20 Inspección de ATS excavación y fundida de micro-pilotes




Fotografía N° 21 Inspección de condiciones de seguridad y Permisos de trabajo en alturas actividad de tala

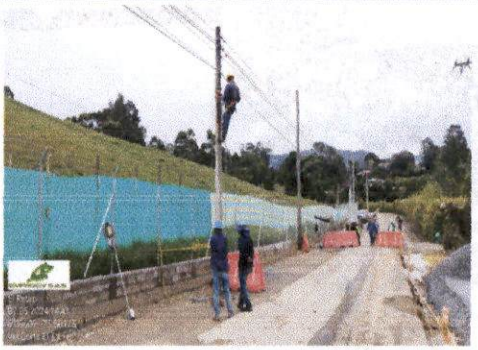

Fotografía N° 22 Inspección de condiciones de seguridad y Permisos de trabajo en alturas actividad de instalación de postes

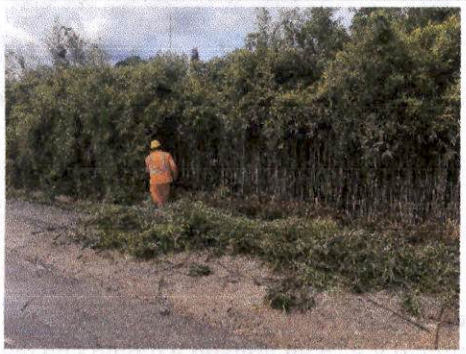

Fotografía N° 23 Inspección de ATS en actividad de corte de Bambú

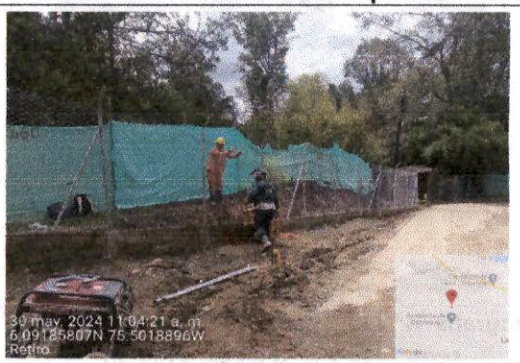

Fotografía N° 24 Inspección de Permisos de trabajo en caliente para instalación de malla



Fotografía N° 25 Reunión con supervisor SST de la gobernación



Fotografía N° 26 Verificación de investigación de AT



Fotografía N° 27 Comité de Obra con el contratista



Fotografía N° 28 Comité de Obra con el contratista



Fotografía N° 29 Reunión con Veeduría



Fotografía N° 30 Reunión con Veeduría

Actas de comités

Comité de convivencia laboral procurará promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad de los empleados de todos los niveles jerárquicos de la Corporación, mediante estrategias de promoción, prevención e intervención para la resolución de conflictos. **Ver Anexo 14.**

Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst), promoción y vigilancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo. **Ver Anexo 15.**

Interventoría realiza actualización matriz de riesgos laborales, de forma objetiva, cuáles son los riesgos prioritarios para la seguridad y salud de los trabajadores que tiene una empresa, el contratista Consorcio El Retiro PG queda pendiente de actualización por Accidente de trabajo presentado al terminar el mes de mayo. **Ver Anexo 16.**

Para el mes de mayo se realiza actualización de Perfil Sociodemográfico relacionando el personal activo y retirado durante el mes de abril. **Ver Anexo 17.**

Investigación de los accidentes reportados para la identificación que los generaron e implementar las acciones correctivas y preventivas que eviten la ocurrencia de eventos similares para el periodo de mayo se reportan 2 accidentes laborales para contratista así:

- Consorcio el Retiro PG, reporta: El Colaborador Reinel Ricardo Balbin Villegas CC 1040181410 cargo Ayudante de subcontratista Alejandro Caro, el día miércoles 8 de mayo siendo las 7:40 a.m., estaba realizando actividades de ayudante de construcción al momento de instalar unas estibas para acopiar el acero en el área de almacén, sujeta una de ellas con la mano y no se percató que debajo de la estiba había una puntilla, la cual le generó una punzada en la mano derecha cerca de la fascia sobre el músculo aductor pollicis generando dolor leve. Se realiza valoración y atención de primeros auxilios por parte de Consorcio PG, se realiza reporte a ARL Sura.
  Diagnóstico: S 602 Contusión de otras partes de la muñeca y de la mano.
  Incapacidad: dos (2) Del 09 al 10 mayo de 2024.
- Consorcio el Retiro PG, reporta: La Colaboradora Luz Maryori Agudelo CC 43267118 cargo Ayudante de Obra-Controlador Vial de subcontratista Alejandro Caro, el día martes 28/05/2024 siendo las 11:00 am, se encontraba en la vía la María- Carabanchel en la k 1+185 en el predio de la Sra. Martha Gómez realizando el corte de unas plantas (Guaduas) al realizar el corte de una de ellas se reventó otra cortada previamente a la mitad el cual hizo látigo con otra guadua, golpeando a la colaboradora generándole lesiones en hombro y brazo derecho, en boca labio superior e inferior en el costado izquierdo y ojo izquierdo, se realiza valoración y atención de primeros auxilios por parte de Consorcio PG y trasladada al hospital de El Retiro para atención médica, se realiza reporte a ARL Sura.
  Diagnóstico: S 011 Herida del parpado y de la región periocular.
  Incapacidad: siete (7) Del 29/05/2024 al 04/06/2024.

Seguimiento a ausentismo laboral con el fin de identificar las causas más frecuentes de inasistencia laboral (accidentes laborales, enfermedad común, enfermedad, laboral): para el mes de mayo de 2024, No se reporta incapacidades laborales. **Ver Anexo 18.**

10. CONCLUSIONES

A partir de jueves 15 de febrero 2024 se está realizando cierre total de la vía con acceso únicamente para residentes, de acuerdo al radicado N 2024020743 del 07 de febrero de 2024, expedido por la Secretaria de Tránsito del municipio del Retiro del Departamento de Antioquia; los horarios serán los siguientes:
Lunes a Sábado: de 7:00 am a 5:00 pm.
Domingos y Festivos: se realizarán cierres según programación obra.

De acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Manejo de Transito revisado, y analizando lo aprobado por Inspección de transito del Retiro el día 21 de marzo de 2024, se solicita al Consorcio El Retiro PG en comité de obra completar esquemas de señalización planteados, De igual manera dar cumplimiento a las estrategias y tácticas de prevención para garantizar la seguridad de los actores viales.

Se reitera al contratista en comité de obra el cumplimiento de los principios fundamentales para el manejo transito establecidos en PLAN DE MANEJO DE TRANSITO V2. - La seguridad de los usuarios debe ser un elemento integral y de alta prioridad en todo el proyecto - La circulación vial deberá ser restringida lo menos posible. - Los conductores y peatones deben ser guiados de manera clara y coordinada por los controladores viales. - Debido al incremento potencial del riesgo, la seguridad de los actores viales debe contar con constante atención. - Dado que el control vial es una parte esencial en la ejecución de la obra, se solicita de manera explícita contar con el personal para realizar actividades de PARE y SIGA; así mismo este personal debe estar en la capacidad de recibir e informar adecuada y oportunamente sobre los cierres establecidos a la comunidad del área de influencia y demás actores viales que transiten por la vía. - Contar con los dispositivos de comunicación adecuados para garantizar la comunicación entre puestos de control vial,

Se reitera al contratista en comité de obra el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la gobernación de Antioquia en la entrega de documentación de personal nuevo, visitantes, maquinaria y equipos un día antes del ingreso y así garantizar que los equipos se encuentran en óptimas condiciones para laborar, y

personal se encuentra afiliado a los aportes a pagos de seguridad social.

11. RECOMENDACIONES

Mediante comunicado EPC-GS-IER6135-5.3-310-24 nuevamente se solicita al contratista el cumplimiento de entrega de documentación de ingreso de personal, esto con el fin de Garantizar que el personal se encuentra al día con las afiliaciones y/o Pago integrado de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales (EPS- ARL- AFP- CCF.) y dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la gobernación de Antioquia.

Mediante comunicado EPC-GS-IER6135-5.3-317-24 se le reitera al contratista garantizar la seguridad en actividades de obra, garantizar medidas de prevención en tareas de alto riesgo, (alturas, izaje de cargas, trabajo en caliente, excavaciones profundas etc...) contar con accesos seguros, medidas de restricción en actividades de fundida de muros, dotación adecuada para el personal en actividades de manejo de aguas, dar cumplimiento a la normatividad vigente Decreto. 1072 y manual de contratista establecido por la gobernación de Antioquia.

En Comité de obra se solicita al contratista garantizar medidas de prevención en tareas de alto riesgo, (alturas, izaje de cargas, trabajo en caliente, excavaciones profundas etc...) contar con los pagos de seguridad social vigente, permisos de trabajo firmados por persona competente, personal y equipos certificados, señalización y demarcación de áreas de trabajo, acompañamiento y supervisión permanente, según la normatividad vigente para evitar accidentes de trabajo.

En comité de obra se le solicita la instalación de guarda de protección de seguridad correspondiente a la inyectora de concreto y/o cambio del equipo por uno que cumpla con las medidas de seguridad necesarias para las actividades a ejecutar.

En comité de obra se le solicita al contratista que según lo dispuesto en el plan de manejo de transito revisado, analizado y aprobado por inspección de transito del Retiro el día 08 de noviembre de 2023, completar esquemas de señalización planteados, de igual manera dar cumplimiento a las estrategias y tácticas de prevención para garantizar la seguridad de los actores viales, contar con los dispositivos de comunicación adecuados para garantizar la comunicación entre puestos de control vial.

En comité de obra y registros en bitácora se le reitera al contratista realizar mantenimientos diarios de señalización, demarcación del tramo de intervención, garantizar senderos peatonales y que estos se encuentren libres de obstáculos y/o material de obra, para evitar accidentes de tránsito con terceros y propios durante la ejecución de las actividades.

En comités de obra se reitera al contratista realizar entrega de dotación al personal como lo estipula el código sustantivo del trabajo cada 4 meses, el porte de dotación (imagen corporativa) de todo el personal, además de entrega y reposición de elementos de protección personal, dotación de invierno de acuerdo a las actividades ejecutadas.

En comité de Obra se solicita al contratista la entrega de investigación de Accidente de trabajo de la colaboradora Maryory Agudelo el día 12 de mayo y Socializar el AT, Divulgación de Lección Aprendida, realizar Campaña de Autocuidado para cierre de Accidente de trabajo.

En comité de Obra se le solicita al contratista realizar memorandos informativos para el personal sobre uso obligatorio de EPP y el No uso de joyas (Anillos, aretes, cadenas, pulseras, etc...) durante la jornada laboral por prevención de accidentes de trabajo por riesgo Mecánico.

En comité de obra se le solicita al contratista para el próximo informe realizar la entrega de los insumos los días 28 de cada mes.

En comité de obra y registros en bitácora se le reitera al contratista realizar diariamente jornadas de orden y aseo esto con el fin de evitar accidentes de trabajo por riesgo locativo.

En recorrido con el supervisor SST de la gobernación de Antioquia realiza observaciones de entrega de dotación al personal (Imagen Corporativa), petos reflectivos a los controladores viales, mejorar la presentación de casetas viales, capacitar al personal vial en funciones a cumplir, completar esquemas de señalización vial, instalación de señalización en obra, adecuar el terreno en el área de baños y garantizar la limpieza de los mismos por la empresa que realiza el mantenimiento de baños.

Anexos.

Anexo 01.Documentos de ingreso.
Anexo 02.Documentos de egreso.
Anexo 03.Certificados revisor fiscal y/o representante legal.
Anexo 04.Seguridad Social.
Anexo 05.Pagos de Nomina.
Anexo 06. Entrega de Dotación y EPP
Anexo 07.Capacitaciones.
Anexo 08.AST-Permisos de Trabajo.
Anexo 09.Inspecciones.
Anexo 10.Registro Fotográfico.
Anexo 11.Plan de Emergencia.
Anexo 12.Riesgo Químico.
Anexo 13.PMT.
Anexo 14. Comité Convivencia Laboral
Anexo 15. Copasst
Anexo 16.Matriz RP.
Anexo 17.Perfil Sociodemográfico.
Anexo 18.Indicadores.
Anexo 19.Presupuesto SST.
Anexo 20.Licencias SST.
Anexo 21.Correspondencia.
Anexo 22.Calificación de estándares
