

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**DIAGNOSTICO CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA FASE IV, LOTE 4**	**28,13 días?**	**mié 29/11/23**	**vie 29/12/23**	
2		**ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION**	**25,88 días**	**mié 29/11/23**	**mié 27/12/23**	
3		Excavación mecánica	5 días	mié 29/11/23	lun 4/12/23	
4		Corte de pavimento asfaltico	2 días	mié 29/11/23	jue 30/11/23	3CC
5		Demolición de pavimento asfaltico (incluye compresor con martillo demoledor)	5 días	mié 29/11/23	lun 4/12/23	3CC
6		Conformación de subrasante	3 días	lun 4/12/23	jue 7/12/23	5
7		Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA CONSTRUCCION (Incluye suministro y aplicación)	9 días	jue 7/12/23	lun 18/12/23	6
8		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA CONSTRUCCION (Incluye Suministro, extendido, nivelación y compactación, incluye transporte del material)	16,88 días	sáb 9/12/23	mié 27/12/23	10;7CC
9		Base estabilizada con cemento al 6% (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactador 8 ton, incluye transporte)	14,63 días	mar 5/12/23	jue 21/12/23	6CC+1 día
10		Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (para cargue mecánico) aplica para distancias menores a 15 km	9 días	mié 29/11/23	vie 8/12/23	3CC
11		Generación y disposición de sobrantes	9 días	mié 29/11/23	jue 7/12/23	10CC
12		**ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO**	**13,13 días**	**jue 14/12/23**	**jue 28/12/23**	
13		Excavación manual para BACHEO Y PARCHEO	10,13 días	lun 18/12/23	jue 28/12/23	

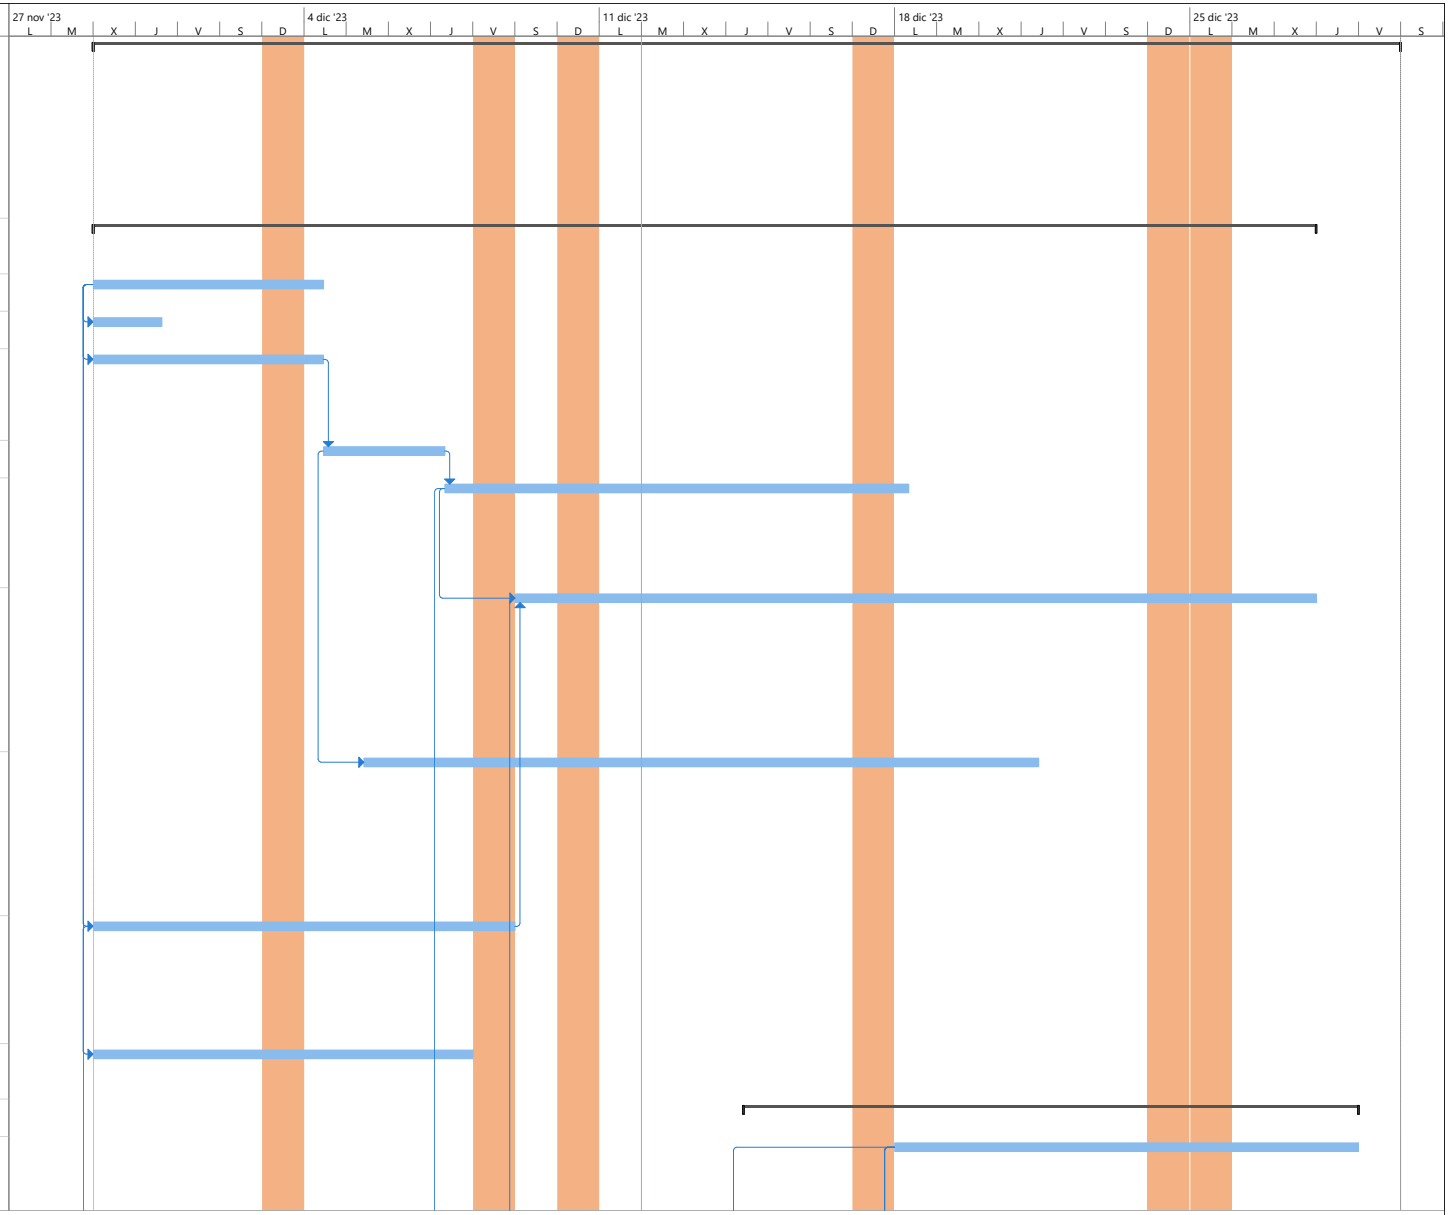

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: mar 12/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
14		Base granular BACHEO Y PARCHEO (incluye Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación con Vibrocompactor manual,	10,13 días	lun 18/12/23	jue 28/12/23	13CC
15		Riego de Liga con emulsión asfáltica CRR-1 PARA BACHEO (Incluye suministro y	10,13 días	lun 18/12/23	jue 28/12/23	13CC
16		MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO MDC-19 PARA BACHEO (Incluye Suministro,	10,13 días	lun 18/12/23	jue 28/12/23	13CC
17		Retiro de sobrantes a sitio final de disposición (incluye cargue	10,13 días	lun 18/12/23	jue 28/12/23	13CC
18		Limpieza de sumideros	7,88 días	jue 14/12/23	vie 22/12/23	13CC-3 días
19		**OBRAS COMPLEMENTARIA**	**6 días**	**jue 14/12/23**	**mié 20/12/23**	
20		Realce de Pozos en concreto de 3000 psi (incluye demolición de concreto y refuerzo)	6 días	jue 14/12/23	mié 20/12/23	18CC
21		**COMPONENTES**	**1 día?**	**mié 29/11/23**	**mié 29/11/23**	
22		Componente SST	1 día?	mié 29/11/23	mié 29/11/23	3CC
23		Componente Amb	1 día?	mié 29/11/23	mié 29/11/23	3CC
24		Componente Soci	1 día?	mié 29/11/23	mié 29/11/23	23CC
25		Componente Sig	1 día?	mié 29/11/23	mié 29/11/23	24CC
26		Plan de manejo de	1 día?	mié 29/11/23	mié 29/11/23	25CC
27		**DIAGNOSTICO**	**1 día?**	**mié 6/12/23**	**mié 6/12/23**	
28		ENTREGABLE DE	1 día?	mié 6/12/23	mié 6/12/23	
29		**ITEM NO PREVIST**	**20,13 días**	**jue 7/12/23**	**vie 29/12/23**	
30		MEZCLA ASFÁLT	5 días	jue 7/12/23	mié 13/12/23	7CC
31		GEOMALLA PARA	5 días	sáb 16/12/23	jue 21/12/23	30CC+1 día
32		CONCRETO ESTRUCTURAL PARA CUNETA	16,88 días	mar 12/12/23	vie 29/12/23	8CC

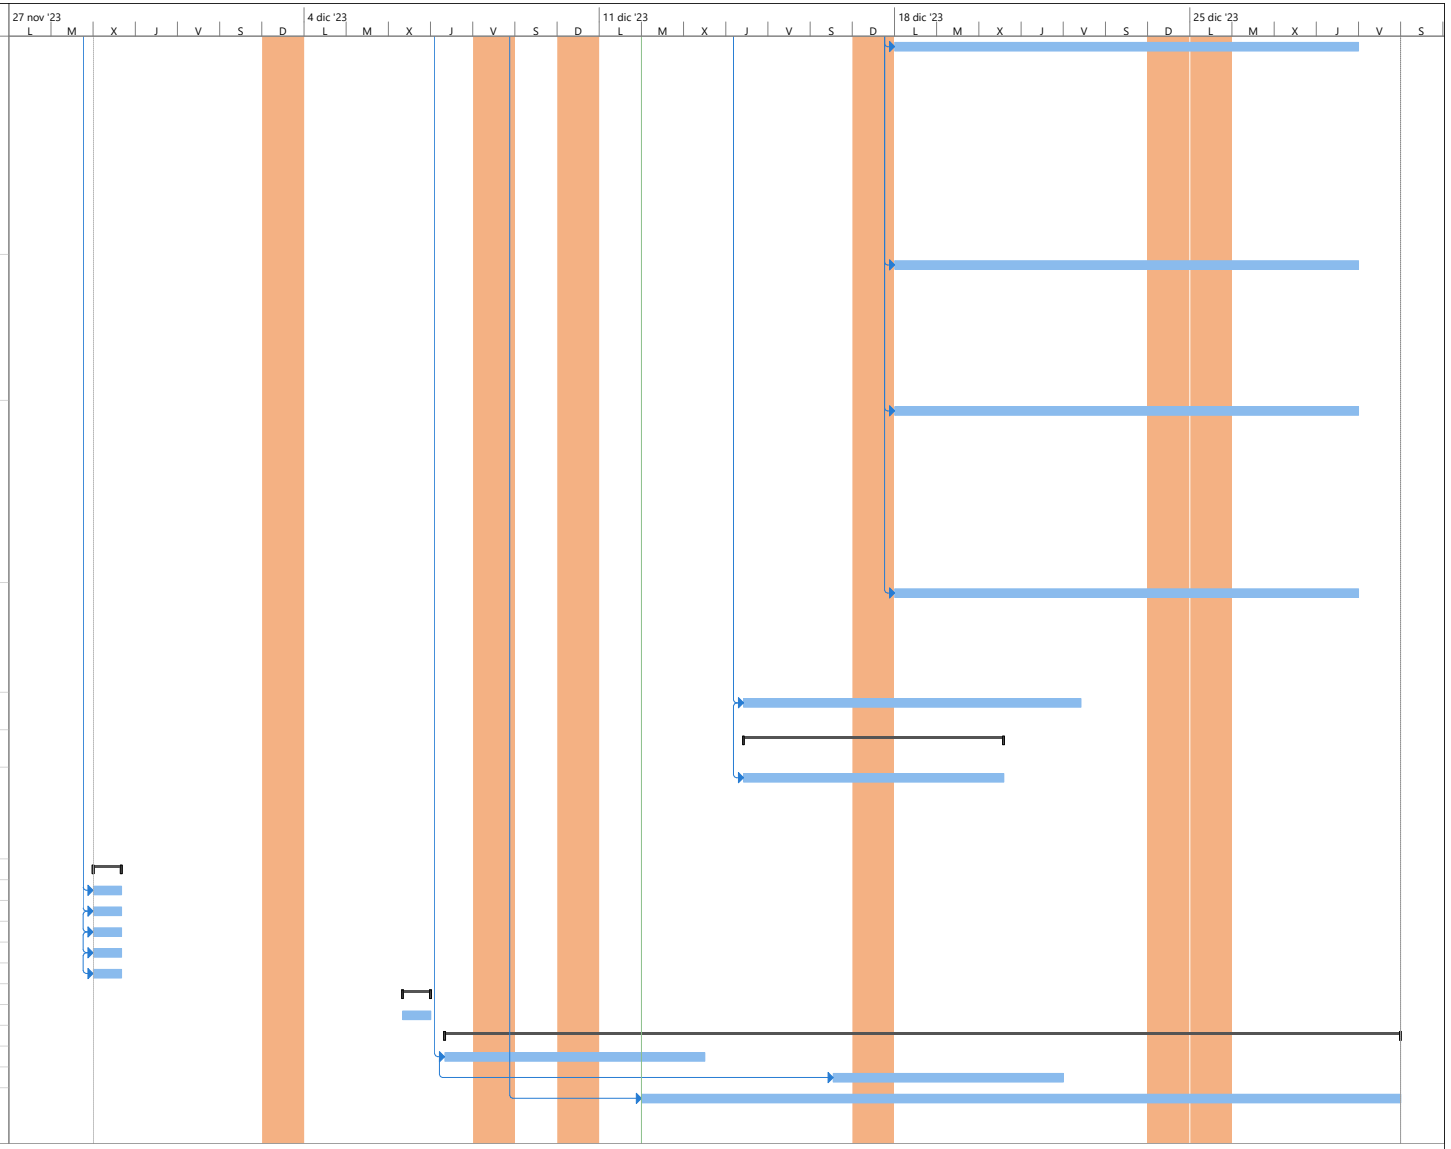

Proyecto: PROGRAMACION DE
Fecha: mar 12/12/23

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
