CONTRATO No. 3654-2023

OBJETO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

INFORME DE SUPERVISION No 4

PERIODO INFORME: 01/07/2024 AL 31/07/2024

San Juan de Pasto, Julio de 2024

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: INFORME DE SUPERVISION - FICHA INFORMATIVA DE CONVENIO Y/O CONTRATO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

FECHA DE PRESENTACION:	1-ago-24	CORTE	31/07/2024

1. ASPECTOS ADMISTRATIVOS

PROCESO LICITATORIO:	**CM003-2023**				
CONTRATO No:	GN3654-2023				
CDP DEPARTAMENTAL No.:	2023030039	FECHA:	6-mar-23	VALOR	$ 400.000.000,00
REGISTRO DEPARTAMENTAL No:	2023070809	FECHA:	31-jul-23	VALOR	$ 295.743.798,00
OBJETO DEL CONTRATO:	**CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II DEL PROYECTO DENOMINADO: PUENTES UBICADOS EN TERRITORIO UNIPA EN LOS SECTORES DE GUIZA, PULGANDE, RIO NULPE, RIO ÑAMBÍ, RIO TELEMBÍ, PALVI Y GUELMAMBI DE LAS SUBREGIONES DE TELEMBI Y PACIFICO SUR - DEPARTAMENTO DE NARIÑO**				
CONTRATISTA DE CONSULTORIA:	CONSORCIO NOGAC R.L. ANDRES MAURICIO CARDOZO ROA - Nit. 901737531-1				
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	HELBER VALENCIA MEJIA Nit: 79745984-7				
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS				
PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION	JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA				
META FISICA	DISEÑO 7 PUENTES FASE II				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 295.743.798,00				
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO:	26-jul-23				
APORTE DEPARTAMENTO CONTRATO:	$ 295.743.798,00				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cinco (5) Meses, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del mismo				
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	20-dic-23				
FECHA DE ACTA INICIO:	12-abr-24				
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	**11-sep-24**				
PORCENTAJE ANTICIPO	20% del valor del contrato				
TOTAL ANTICIPO 20%	$ 59.148.759,60				
VALOR PAGADO ACTAS + ANTICIPO	$ 177.446.278,80				
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
PÓLIZA No.:	18-44-101091264				
% AVANCE FISICO CONVENIO	% PROGRAMADO:	60%		% EJECUTADO:	40%
% AVANCE FINANCIERO	% PROGRAMADO	20%		% EJECUTADO	20%
META FISICA A LA FECHA	DISEÑO 7 PUENTES FASE II			% EJECUTADO	40%

2. DESCRIPCION AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTOS TECNICOS: El alcance del contrato incluye el Diseño Fase II (Fase Factibilidad) de Siete (7) Puentes Vehiculares en Territorio Unipa, los volúmenes tecnicos a entregar son: Volumen I Estudio de Tránsito, Volumen II Levantamiento Topográfico, Volumen III Estudio y Diseño Geométrico, Volumen IV Estudio Geologia y Geomorfologia, Volumen V Estudio Geotécnico, Volumen VI Estudio de Estabilidad de Taludes, Volumnen VII Estudio de Pavimentos, Volumen VIII Estudio Hidrológico e Hidráulico, Volumen IX Estudio Estructural, Volumen X Estudio Impacto Ambiental, Volúmen XI Estimacion Costos, Volúmen XII Documentacion SGR, Volumen XIII Informe Final. **ABRIL 2024:** Se adelanta Evaluacion del Equipo Profesional de Trabajo (**08-04-2024**), Comite Técnico (**24-04-2024**) Unipa-Gobernacion-Consultor para Coordinacion Visitas de Campo. Visitas de Campo: Guiza, Pulgande, Rio Nulpe, Rio Ñambi, Rio Telembí, Palvi y Guelmambi. **MAYO 2024:** Se presenta Informe de Visita de Campo (**31-05-2024**), donde se puede identificar las condiciones de cada una de las siete zonas a intervenir. Según comite celebrado con Unipa-Contratistas-SIMD, la organizacion UNIPA plantea los tipos de puente asi: **1. Puentes Vehiculares:** Guiza, Pulgande, Nulpe, Ñambi, Telembí y Guelmambi. **2. Puentes Peatonales:** Palvi. El informe de Visita de Campo identifico que no existe accesibilidad vehícular en ninguna de las 7 zonas a intervenir, por lo anteriormente expresado se adelantará comites tecncos con UNIPA para dar claridad a la viabilidad tecnica de ejecutar puentes vehículares. **JUNIO 2024:** Se adelantan Comites Técnicos con la organizacion **UNIPA** y la **SIMD** con el propósito de socializar los hallazgos de las Visitas de Campo y el tipo de puentes a implementarse. **UNIPA** manifiesta que existen compromisos con **INVIAS**, en virtud del **AUTO 620** de **2017,** segun el cual se obliga al Gobierno Nacional a la Proteccion de los derechos fundamentales de los pueblos indigenas y se ordena a la Vicepresidencia de la Republica de Colombia a adelantar obras de infraestructura vial en los territorios jurisdicción de la organizacion **UNIPA.** Entre dichos compromisos esta la adecuacion de corredores para transito vehicular en los cuales se encuentran ubicados algunos de los puentes objeto del presente proceso**. JULIO 2024: Se adelantan Comites Técnicos con INVIAS y VICEPRESIDENCIA de la República con el propósito de identificar cuales de los puentes a diseñarse estan sobre corredores viales a adecuarse como vehiculares dentro de compromisos del AUTO 620 de 2017. Una vez adelantados dichos comites y articulada la informacion de la consultoria con los compromisos del INVIAS y el VICEMINISTERIO, se concluyó lo siguiente: 1. Puentes Vehiculares: Guiza, Pulgande, Nulpe, Ñambi y Telembí 2. Puentes Peatonales: Palvi y Guelmambi. Se presentan los productos de Topografia y Estudio de Tránsito, por parte del Consultor, debidamente avalados por Interventoria.**

ASPECTOS FINANCIEROS: Según la forma de pago establecida en el anexo contractual, se pactó la entrega de un anticipo equivalente al 20% del valor del contrato (**$ 59'148.759,60**), Pagos Parciales Mensuales con amortizacion de anticipo, de acuerdo a consultoria ejecutada, recibida, revisada y aprobada por Interventoria. **ABRIL 2024:** Plan de Inversion Anticipo (**22-04-2024** Aprobacion Anticipo Interventoria (**22-04-2024**)**. MAYO 2024:** El Contratista realiza solicitud de cambio de Cuenta Bancaria **(03-04-2024**). La cual se tramita segun **SIM-0390-2024** (**04-05-2024**)**.** Pago Anticipo (**$ 59'148.759,60**) (**16-05-2024**)**. JUNIO 2024:** No se adelantó tramites de pago durante este periodo de informe. **JULIO 2024: Se adelantó suscripción documentacion de Pago Parcial No 1 (12-07-2024).**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: ABRIL 2024: Acta Inicio (**12-04-2024**). Comité Técnico (**24-04-2024**). Informe Interventoria No 1. **MAYO 2024:** Comité Tecnico (**28-05-2024**)**. JUNIO 2024: Comité Tecnico (14-06-2024). Comité Tecnico (24-06-2024). JULIO 2024: Comité Técnico Vicepresidencia (07-07-2024), Comite Técnico Vicepresidencia-INVIAS (26-07-2024), Comite Técnico Vicepresidencia-INVIAS (30-07-2024). SIM-1045-2024 (19-07-2024) Tipo Puentes, Acta Parcial No 1 (12-07-2024), Certifcacion Parcial Cumplimiento No 1 (17-07-2024)**

ASPECTOS LEGALES: ABRIL 2024: Certificado Legalizacion Inicial (**30-12-2023**)**,** Correo Trámite Póliza (**16-04-2024**)**. MAYO 2024:** Radicacion Poliza Acta Inicio (**01-05-2024**), la cual se remite al DAC para legalizacion**. JUNIO 2024:** Se aprueba Póliza Acta Inicio por el **DAC. JULIO 2024: No se adelantan legalizaciones durante este periodo de informes.**

3.OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se debe avanzar en la ejecucion contractual de la Consultoria, una vez se han definido el tipo de puentes por parte de VICEPRESIDENSIA DE LA REPUBLICA e INVIAS en virtud del AUTO 620 de 2017.



Proyecto: Ing. **JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA**
Contratista Apoyo a la Supervisión - SIMD
Gobernación de Nariño



Revisó: Ing. **LUIS ALBERTO CASTILLO JOJOA**
Subsecretario de Infraestructura y Vias - SIMD
Gobernación de Nariño

Revisó: Ing. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE**
Secretario de Infraestructura y Minas - SIMD
Gobernación de Nariño

4. REGISTRO PRODUCTOS

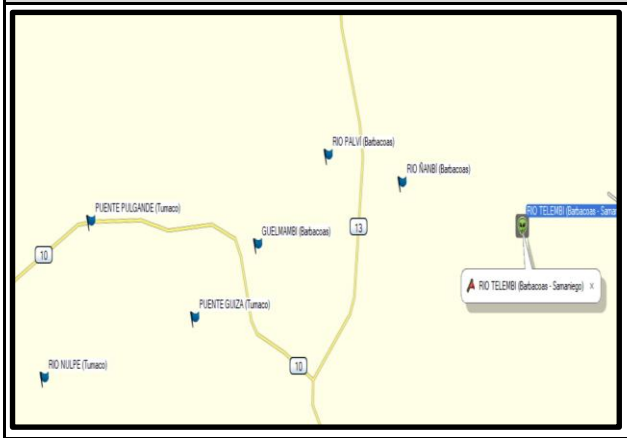


Imagen 1: Localizacion Puentes Unipa



Imagen 2: Caracterizacion Geotecnica Ñambi



Imagen 3: Caracterizacion Geotécnica Guelmambí

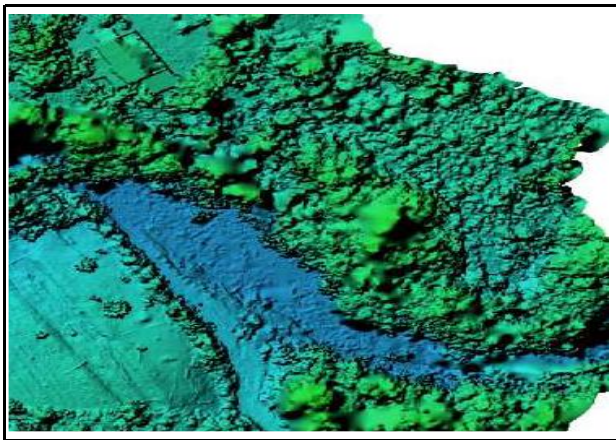


Imagen 4: Modelo Topografico Rio Pulgande

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS **SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS** **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - SEGUIMIENTO FINANCIERO**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

5. INFORME FINANCIERO

CONTRATO No:	**GN3654-2023**

ACTAS	FECHA	VALOR TOTAL	ACUMULADO	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR NETO	VALOR EGRESO	TOTAL DESCUENTOS	COM EGRESO No	FECHA PAGO
ANTICIPO	16/05/2024	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	2024002931	16/05/2024
ACTA PARCIAL No 1	12/07/2024	$ 59.148.759,60	$ 118.297.519,20	$ 11.829.751,92	$ 47.319.007,68				
TOTAL			**$ 177.446.278,80**	**$ 11.829.751,92**	**$ 106.467.767,28**	**$ 59.148.759,60**	**$ -**		

AVANCE FISICO	**40%**
AVANCE FINANCIERO	**36%**

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS **FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO - CONTROL POLIZAS**	Código.: SIVEYC.FTO. Versión: 0.0 Vig: 23/05/2016

6. CONTROL POLIZAS

CONTRATO No:	GN3654-2023
GARANTIAS:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA No:	18-44-101091264

AMPARO	VALOR	TIEMPO
Cumplimiento del Contrato	20% del valor del contrato	Hasta liquidacion del contrato
Buen Manejo Anticipo	100% del valor del anticipo	Hasta liquidacion del contrato o hasta amortización anticipo
Salarios, Prestaciones Sociales	10% del valor del contrato	Plazo ejecucion del contrato y 3 años mas
Calidad Servicio	30% del valor del contrato	Plazo ejecucion contrato y 3 años mas

ANEXO 0			FECHA APROBACION	19/12/2023	FECHA EXPEDICION	1/08/2023
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 59.148.760,00	20%	31-jul-23	30-jun-24	Póliza Inicial del Contrato	(32)
Buen Manejo Anticipo	$ 59.148.760,00	100%	31-jul-23	30-jun-24	Póliza Inicial del Contrato	(32)
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 29.574.380,00	10%	31-jul-23	31-dic-26	Póliza Inicial del Contrato	882
Calidad Servicio	$ 88.723.139,40	30%	31-jul-23	31-dic-26	Póliza Inicial del Contrato	882

ANEXO 1			FECHA APROBACION	18/04/2024	FECHA EXPEDICION	18/04/2024
DETALLE	**VALOR**	**%**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES**	**ALERTA**
Cumplimiento del Contrato	$ 59.148.760,00	20%	12-abr-24	13-mar-25	Poliza Acta de Inicio	224
Buen Manejo Anticipo	$ 59.148.760,00	100%	12-abr-24	13-mar-25	Poliza Acta de Inicio	224
Salarios, Prestaciones Sociales	$ 29.574.380,00	10%	12-abr-24	13-sep-27	Poliza Acta de Inicio	1.138
Calidad Servicio	$ 88.723.139,40	30%	12-abr-24	13-sep-27	Poliza Acta de Inicio	1.138

Gobernación de Nariño	GOBERNACIÓN DE NARIÑO	Código.: SIVEYC.FTO.
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MINAS	
	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS	Versión: 0.0
	FORMATO: SEGUIMIENTO CONTRATO Y/O CONVENIO- BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION	Vig: 23/05/2016

7. BALANCE CONTRATACION VS EJECUCION

CONTRATO No.:	**GN3654-2023**

CAP.	ACTIVIDAD	DETALLE - ACTIVIDADES	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	DIFERENCIA	%
1	MES 1	Visita Campo-Informe Visita	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	100,00%
2	MES 2	Tránsito-Topografia	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	100,00%
3	MES 3	Geometrico-Geologia-Geotecnia-Estabilidad	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	$ (59.148.759,60)	0,00%
4	MES 4	Pavimento-Hidrologico-Estructural-Ambiental	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	$ (59.148.759,60)	0,00%
5	MES 5	Costos-SGR-Informe Final	$ 59.148.759,60	$ 59.148.759,60	$ -	$ (59.148.759,60)	0,00%
6	FINAL	COSTO TOTAL	$ 295.743.798,00	$ 295.743.798,00	$ 118.297.519,20	$ (177.446.278,80)	40,00%

