

Bogotá, 17 de mayo de 2024

CE-CGED2024

Señores
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.
Atn. KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO
Representante Legal
Interventoría

REF: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 358 DE 2023 "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN Y/O DOTACIÓN DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C"

Asunto: Solicitud de ampliación de suspensión del contrato de Obra No. 358 de 2023.

Cordial saludo,


Debido a que el plazo de la suspensión aprobada el pasado 19 de abril de 2024, se termina el día 17 de mayo de 2024, nos permitimos poner en consideración los siguientes hechos:

- La actividad representativa que se debe retomar corresponde al acabado de las canchas con pintura acrílica, la cual, según el proveedor, debe tener en cuenta algunas recomendaciones para su aplicación, entre las cuales se encuentra:
  "Se recomienda aplicar la PINTURA PARA CANCHAS a temperaturas entre 10 - 35° C y a una humedad relativa máxima del 95%, la lluvia y la humedad elevada retardan el secado y disminuyen su adherencia.

- Teniendo en cuenta la temporada de lluvias que inicio en el mes de abril, como se puede detallar en las gráficas a continuación, no es posible la intervención de las canchas, por la humedad presente, que afecta el acabado y las propiedades del material de la pintura acrílica.



Porcentaje de precipitaciones presentadas durante la última semana – fuente https://weather.com/es-CO/tiempo/hoy/l/4.71,-74.07?par=google

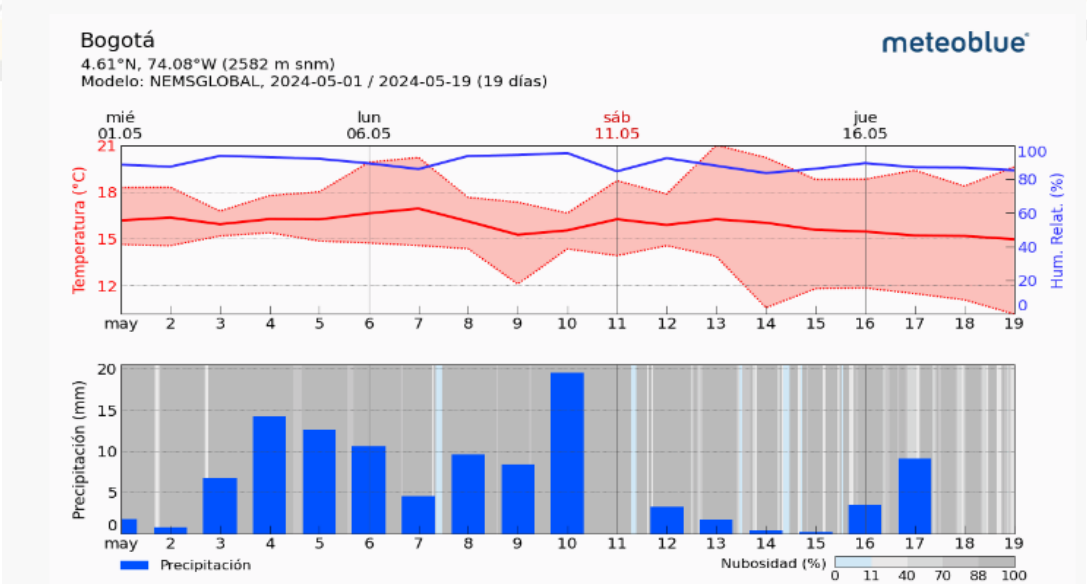

Precipitaciones durante el mes de mayo – fuente https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/weatherarchive/bogot%C3%A1_colombia_3688689

- De acuerdo a la imagen anterior, se evidencia la presencia de precipitaciones durante la última semana, las cuales generan humedad en la superficie, de las canchas, la cual no es recomendable para la aplicación del acabado de pintura, según la ficha técnica del proveedor. Ver anexo ficha técnica de pintura.



Humedad de superficie de canchade microfutbol en parque de san Benito



Humedad en cancha multifuncional de parque de San Benito

Por lo anterior expuesto, y con el fin de darle tiempo a las superficies de que pierdan la humedad obtenida durante la última semana y en especial el 17 de mayo de 2024 fecha en la cual se evidenció se encontraban húmedas y esperando se encuentren las áreas completamente secas se solicita muy amablemente la ampliación de la suspensión, dado que se requiere que por condiciones naturales se permita el secado adecuado para la posterior aplicación del acabado de pintura para las canchas, la cual se estima se desarrolle en un tiempo de 3 días, es así como se reiniciarían las actividades el próximo 21 de mayo de 2024, con condiciones más convenientes para la terminación de las actividades de acabado de demarcación de pintura de las canchas.

Sin otro particular,

Daniela Triana

DANIELA TRIANA
RL CONSTRUCTORA GED SAS
C.C Ing. Fredy Fuquen Moreno – Apoyo de supervisión

Anexo 1 archivo comprimido
