INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO No.	MS-CPUB-003-2024		
OBJETO:	"EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA COMO RESPUESTAS A LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA Y CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS"		
CONTRATISTA:	CONSTRULIFE G&B		
FECHA DE INICIO:	24-07-2024	**FECHA DE FIN:**	24-11-2024
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL MILLONES DE PESOS MCTE. ($2.000.000.000).	**CERTIFICADO PRESUPUESTAL:**	CDP-0722004
RESPONSABLE SUPERVISIÓN:	LUCIA LÓPEZ TRILLOS	**FECHA DE INFORME:**	11-09-2024

1. RESUMEN DE LA GESTIÓN

El contrato se planteó con un presupuesto por precios unitarios y con monto agotable, utilizando las cantidades que se requieren de acuerdo a las necesidades que se vienen presentando en el municipio. Los ítems del contrato utilizados a la fecha del informe, son:

- ✓ Rocería manual desmonte y retiro de material vegetal
- ✓ Transporte para el retiro de material sobrante
- ✓ Limpieza manual de canales recolectores de agua
- ✓ Limpieza de red alcantarillado
- ✓ Retiro y Limpieza de residuos sólidos de pozos de inspección
- ✓ Suministro de material de compactación para relleno de vías
- ✓ Suministro de motobomba autocebante centrifuga con una potencia de 10 hp con boquilla de succión de 4" y Boquilla de descargue de 4"(motor diesel)
- ✓ Dotación para limpieza manual

A la fecha el contrato se encuentra en un avance de ejecución del 57,33%.

2. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El Contrato inicia el día 24 de julio de 2024.

Pólizas del Contrato:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	24/07/2024	24/05/2025	$200,000,000.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	24/07/2024	24/05/2025	$1,000,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	24/07/2024	24/11/2027	$200,000,000.00

Al contratista se le hace un giro por concepto de anticipo por el 50 % del valor del contrato y correspondiente a Mil Millones de Pesos Mcte. ($1.000.000.000).

3. ACTIVIDADES TECNICAS

ÍTEM 1.1 ROCERÍA MANUAL DESMONTE Y RETIRO DE MATERIAL VEGETAL

El día 29 de julio del 2024 se da inicio con 18 personas a la rocería y desmonte en los alrededores de los canales que se encuentran en el casco urbano del municipio los canales intervenidos son

- Rodeo-Zarcita (ubicado en la entrada del municipio por la enea que se encuentra cerca a la cancha julio kenke).
- Aguas vivas (en el inicio que conecta las salidas de aguas al barrio san José).

De este ítem se han ejecutado hasta la fecha 4327 m2










ÍTEM 1.3 TRANSPORTE PARA EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

Se realiza el retiro del material de corte saturado de las vías intervenidas en el municipio, del ítem 1.7 y el material residuo de la limpieza de la red de alcantarillado, del ítem 1.5.



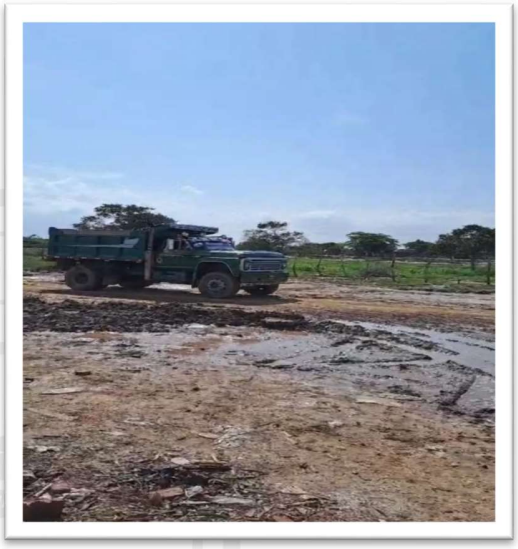

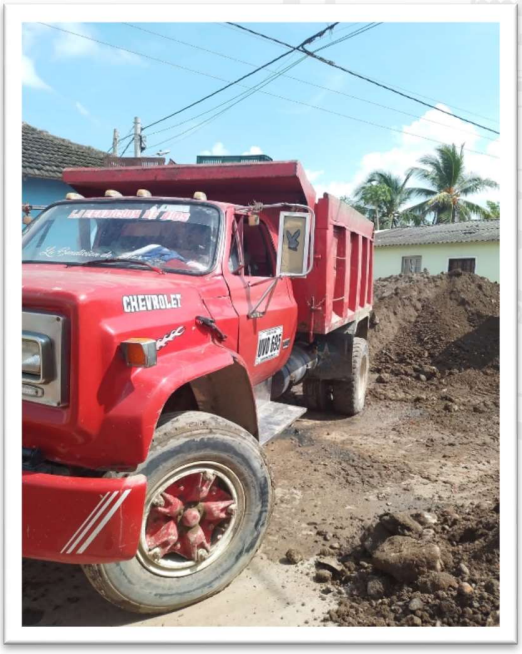

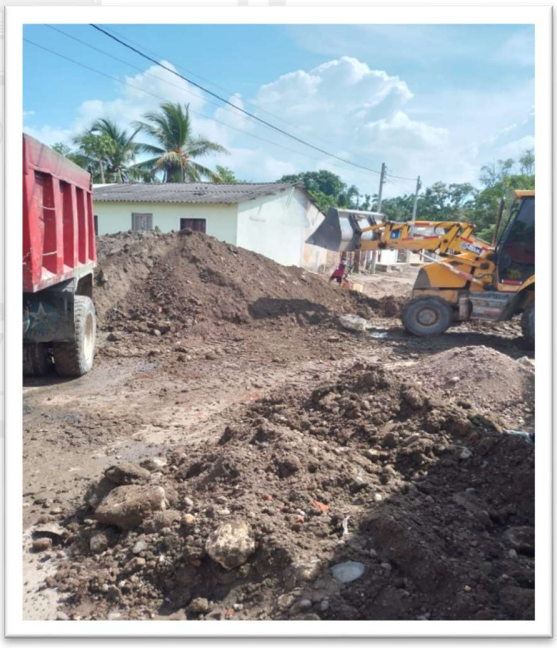

ÍTEM 1.4 LIMPIEZA MANUAL DE CANALES RECOLECTORES DE AGUA

El día 15 de agosto del 2024, se dio inicio con las limpiezas manuales de los canales recolectores de agua lluvia en la cabecera del municipio comenzando por el barrio san jose en las calles 12 con Cra 13 hasta la cra 10 continuando por la vía al matadero cruzando por la finca la fortuna específicamente logrando la desembocadura al canal aguas vivas, con esto evitamos la retención de las aguas lluvias por los residuos sólidos de basuras que taponan a estos mismos.

De este ítem en la presente acta se ejecutaron 5324 ML







ÍTEM 1.5 LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO


Se hace necesaria la limpieza de la tubería ocasionado por el taponamiento de las mismas debido al material arrastrado por las lluvias, encontramos estas sedimentadas, y había


vertimiento de aguas residuales sobre las calles del municipio a continuación dejamos la relación de las tuberías intervenidas.

CALLES INTERVENIDAS	ML
CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 - 7	480
CALLE 1A ENTRE CARRERAS 1 - 3	240
CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 - 17	1.150
CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 - 18	1.230
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 1 - 21	1.369
CALLE 5 ENTRE CARRERAS 1-21	1.318
CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1-21	1.310
CARRERA 10 ENTRE CALLES 9 Y 6	187
CARRERA 1A ENTRE CALLES 4A Y 6	91
TOTALES	**7.375**

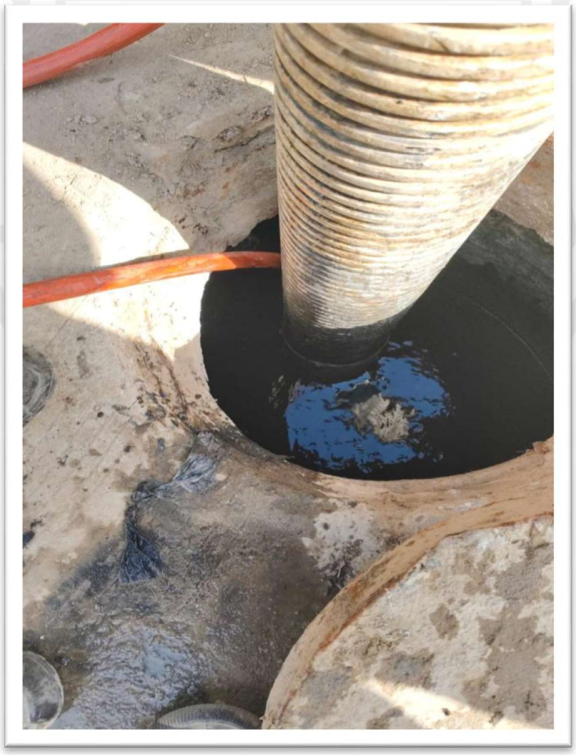

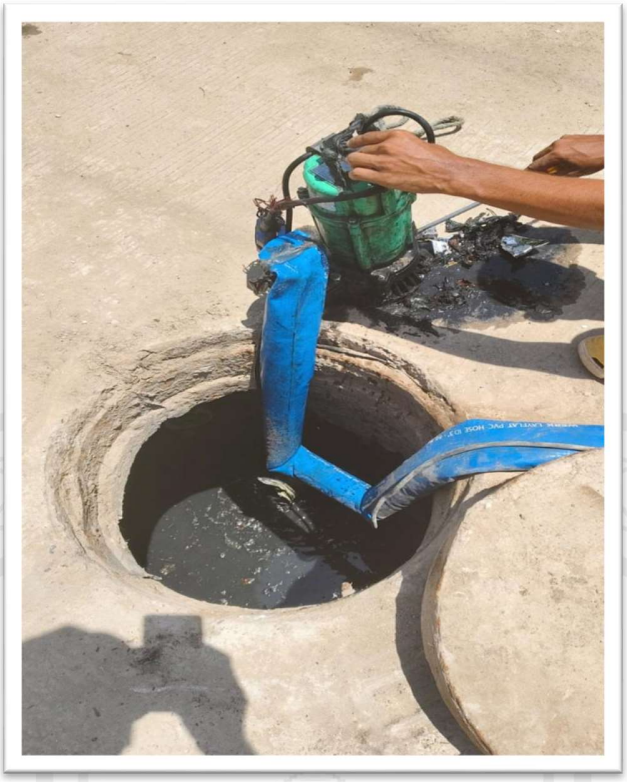

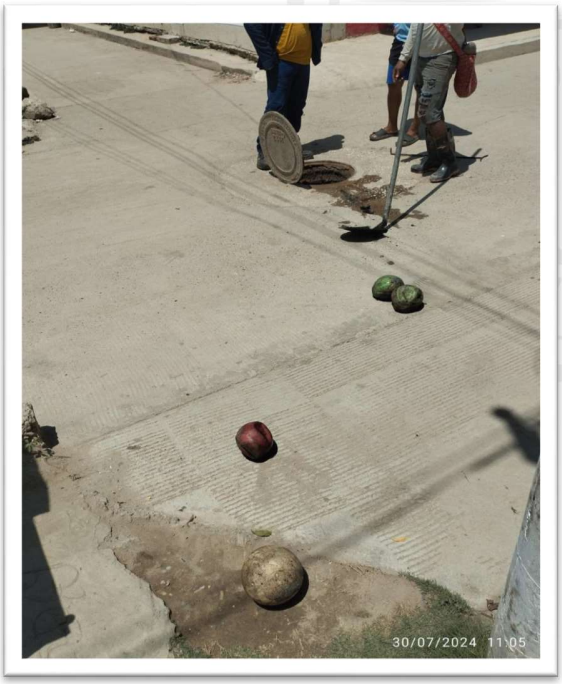
30/07/2024 11:05

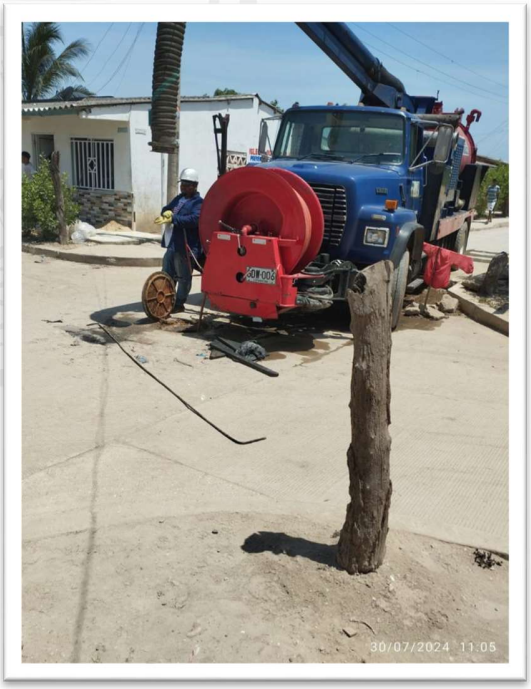
30/07/2024 11:05


ÍTEM 1.6 RETIRO Y LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS DE POZOS DE INSPECCIÓN

CALLES INTERVENIDAS	TOTAL, MANJOLES
CALLE 1 ENTRE CARRERAS 1 - 7	7
CALLE 1A ENTRE CARRERAS 1 - 3	3
CALLE 2 ENTRE CARRERAS 1 - 17	17
CALLE 3 ENTRE CARRERAS 1 - 18	15
CALLE 4 ENTRE CARRERAS 1 - 21	19
CALLE 5 ENTRE CARRERAS 1-21	19
CALLE 6 ENTRE CARRERAS 1-21	16
CARRERA 10 ENTRE CALLES 9 Y 6	3
CARRERA 1A ENTRE CALLES 4A Y 6	1
TOTALES	100







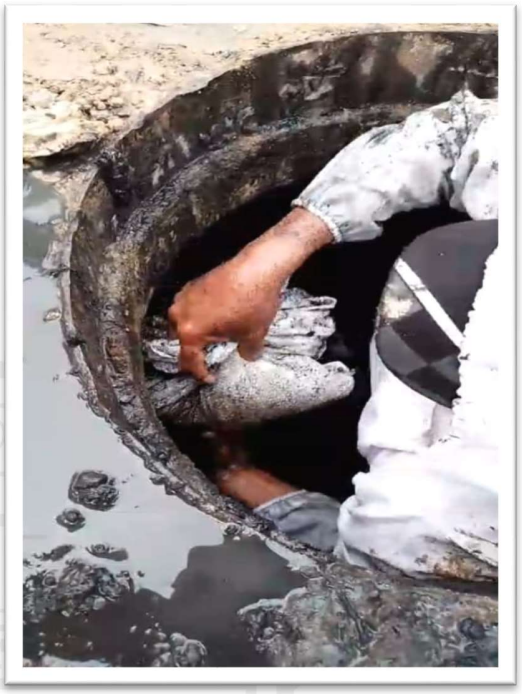

ÍTEM 1.7 SUMINISTRO DE MATERIAL DE COMPACTACIÓN PARA RELLENO DE VÍAS

El día 29 de julio del 2024, Ingresa Suministro de material de compactación para relleno de vías y uso de motobombas en diferente punto de la cabecera municipal específicamente intervenimos las calles 2 desde la Cra 1 hasta la Cra 7, la calle 4 desde la Cra 3 hasta la Cra 7 y calle 4 desde Cra 7 hasta la Cra 9 se realiza la intervención con un equipo topográfico para garantizar la pendiente y no se produzca estancamiento de las aguas lluvias en las vías a intervenir, equipos utilizados:

- Motoniveladora
- Retrocargador
- Vibro compactador
- Volquetas de 8 m3
- Comisión de topografía

De este ítem se han ejecutado 3520 m3











ÍTEM 1.8. SUMINISTRO DE MOTOBOMBA AUTOCEBANTE CENTRIFUGA CON UNA POTENCIA DE 10 HP CON BOQUILLA DE SUCCIÓN DE 4" Y BOQUILLA DE DESCARGUE DE 4"(MOTOR DIÉSEL)

Se suministra motobomba en los cales y carreras donde se presentan las inundaciones causadas por las lluvias como fueron Cra 7 entre calle 3 y 4 calle 2 entre Cra 2 y 3 y demás puntos autorizados a intervenir por la supervisión del contrato de este ítem en la presente acta se ejecutó una (1) unidad





RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

1	ATENCION DE CALAMIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VL. UNITARIO	VL. TOTAL
1,1	Roceria manual desmonte y retiro de material vegetal	M2	4327,00	$ 3.463,90	$ 14.988.308,77
1,2	Limpieza mecanica de canales recolectores de agua lluvia	M3	0,00	$ 17.584,39	$ -
1,3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	1918,00	$ 9.800,00	$ 18.796.400,00
1,4	Limpieza manual de canales recolectores de agua	ML	5324,00	$ 22.417,00	$ 119.348.108,00
1,5	Limpieza de red alcantarillado	ML	7375,00	$ 6.818,00	$ 50.282.750,00
1,6	Retiro y Limpieza de residuos solidos de pozos de inspeccion	UND	100,00	$ 108.752,00	$ 10.875.200,00
1,7	Sumnistro de material de compactacion para relleno de vias	M3	3520,00	$ 185.000,00	$ 651.200.000,00
1,8	Suministro de motobomba autocebante cebtrifuga con una potencia de 10 hpcon boquilla de succion de 4" y boquilla de descargue de 4"(motor diesel)	UND	1,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00
1,9	Dotacion para limpieza manual	UND	18,00	$ 135.000,00	$ 2.430.000,00
1,10	Conformacion de jarillones con material seleccionado	M3	0,00	$ 58.000,00	$ -
1,11	Suministro e instalacion de bolsacreto con arena	M3	0,00	$ 198.000,00	$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				$ 876.920.766,77
	ADMINISTRACCION			**24%**	$ 210.460.984,03
	IMPREVISTOS			**2%**	$ 17.538.415,34
	UTILIDAD			**4%**	$ 35.076.830,67
	IVA/UTILIDAD			**19%**	$ 6.664.597,83
	TOTAL COSTO DE LA OBRA				**$ 1.146.661.594,63**

REALIZADO POR:

LUCIA LÓPEZ TRILLOS
Secretaría de Prospectiva Estratégica
Y Ordenamiento Territorial
Alcaldía de Sitionuevo
