AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V03
08/06/2023

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-0
No. CARPETA:	6
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO EDUCACIAS** CONTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META. **CONTRATO N°502 23 PY306-22 PRECONTRATUAL C6-6 C80**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
23	CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	15636 - 15644
24	ACTAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL	15645 - 15663
25	ACTAS DE RECONOCIMIENTO Y PAGO	15664 - 15665
26	ENTREGA ACTAS DE COBRO	15666 - 15670
27	ENTREGA OBSERVACIONES PARCIAL # 1	15671 - 15674

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	

Firma		Firma	
Nombre:	JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO	Nombre:	WILLIAM VALENCIA CAMPOS
Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	Cargo:	SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

15636

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	26/09/2024	N° DE TRABAJADORES:	40

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	X				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).	X				
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	90	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					X
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.	X				
14	El material, equipos y herramientas están organizado.	X				
15	El materia de descapote se acopia y se protege	X				
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	X				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica	X				
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.	X				
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.					X
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)	X				
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		X			
	SUBTOTAL	40	5	0	0	2
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	90%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo	X				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.	X				
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	120	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	X				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	X				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención				X	
	SUBTOTAL	40	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	80%				

15637

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	25/03/2024	N° DE TRABAJADORES:	40

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y caracteristicas del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).	X				
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)	X				
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor	X				
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas	X				
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas				X	
	SUBTOTAL	40	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	80%				

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	X				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	X				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	X				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	100%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	100%	90	0	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	120	0	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	60	0	0	0	1
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	30	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	90%	40	5	0	0	2
6	SEÑALIZACIÓN	80%	40	0	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS	80%	40	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	100%	60	0	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	93,8%	480	5	0	0	7

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

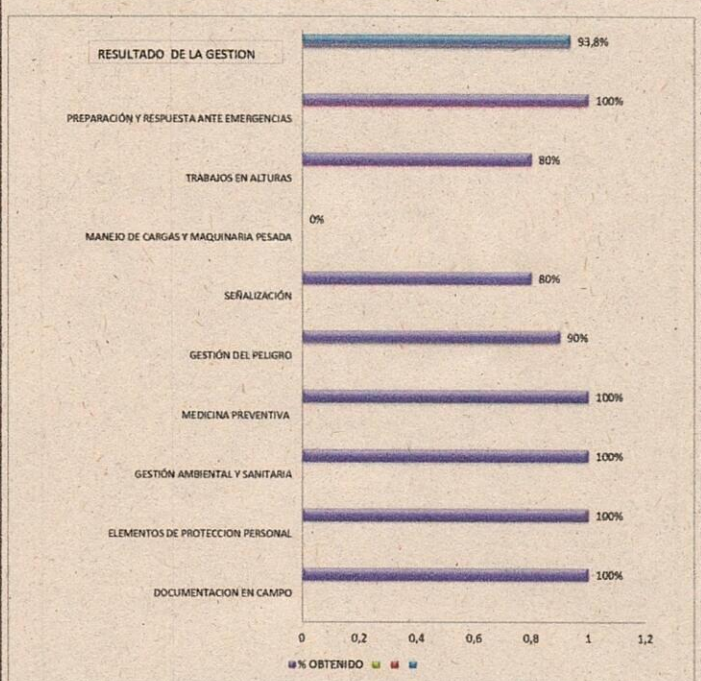


GRAFICO DE GESTION SISO

15638

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**502 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022005500306**

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	25/08/2024	N° DE TRABAJADORES:	40

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN					ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A			10	5	3	0	N.A

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
58	No se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas, solicitr al contratista el rescatista	Abril

OBSERVACIONES GENERALES

Firma
Nombre CARLOS RODRIGUEZ CORREDOR
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A1381232015-1049611735

Firma
Nombre: JULIETH SALAS SEÑA
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional: Resolucion 009802 de 2021

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15639

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	22/04/2024	N° DE TRABAJADORES:	41

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	X				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).	X				
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades criticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades criticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	90	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					X
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.	X				
14	El material, equipos y herramientas están organizado.	X				
15	El materia de descapote se acopia y se protege	X				
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	X				
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica	X				
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.	X				
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.					X
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)	X				
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados		X			
	SUBTOTAL	40	5	0	0	2
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	90%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo	X				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.	X				
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	120	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Articulo 21 de la Ley 50 de 1990.	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	X				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	X				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

15640

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**502 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022005500306**

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023
FECHA DE INSPECCIÓN:	22/04/2024
N° DE TRABAJADORES:	41

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ÍTEM	**MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA**	**10**	**5**	**3**	**0**	**N.A**
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					X
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).					X
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).					X
27	Se señaliza y demarca la carga					X
	SUBTOTAL	0	0	0	0	4
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)					

ÍTEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	X				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	X				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	X				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	100%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
ÍTEM	**TRABAJOS EN ALTURAS**	**10**	**5**	**3**	**0**	**N.A**
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).	X				
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)	X				
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor	X				
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas	X				
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas				X	
	SUBTOTAL	40	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	80%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	100%	90	0	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	120	0	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	60	0	0	0	1
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	30	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	90%	40	5	0	0	2
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA		0	0	0	0	4
8	TRABAJOS EN ALTURAS	80%	40	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	100%	60	0	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	96,3%	490	5	0	0	7

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

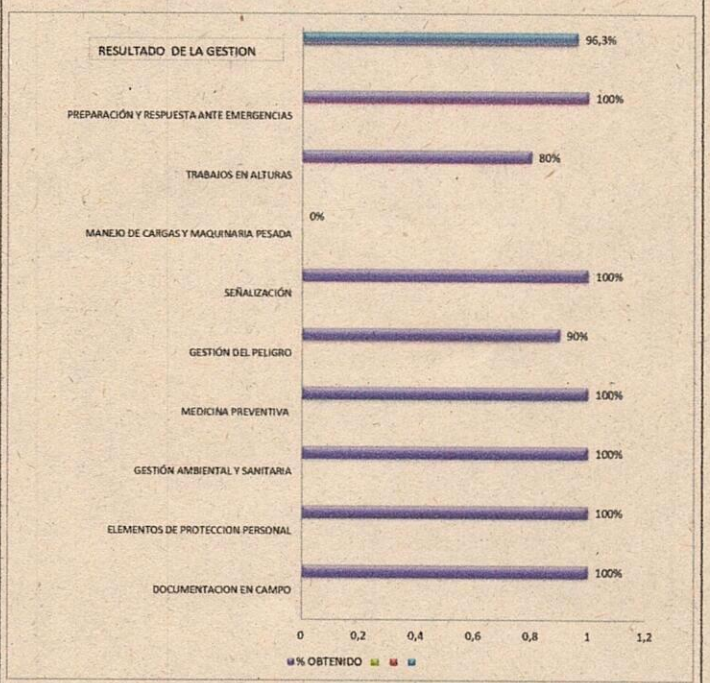


GRAFICO DE GESTION SISO

15641

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**502 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022005500306**
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	22/04/2024	N° DE TRABAJADORES:	41

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN					ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A			10	5	3	0	N.A

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
58	No se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas, solicitr al contratista el rescatista	Mayo

OBSERVACIONES GENERALES

Firma
Nombre CARLOS RODRIGUEZ CORREDOR
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A1361232015-1048611735

Firma
Nombre: JULIETH SALAS SENA
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional:Resolucion 009802 de 2021

Firma
Nombre: DARIO ALEXANDER AGUDELO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 252022-10446CND

Firma
Nombre LIZETH NATALIA LAGOS MARIN
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:2350/2014

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15642

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 226 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	31/05/2024	N° DE TRABAJADORES:	41

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevos) y pagos(> 30 días) ARP, EPS y AFP	X				
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	X				
3	Existen inspecciones o registros preoperacionales de: (Herramientas, EPP)	X				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.	X				
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	X				
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.).	X				
7	Se poseen procedimientos de trabajo , en el cual encuentran identificadas las actividades críticas con sus riesgos y controles.	X				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.	X				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SGSST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo.(divulgacion de procedimientos)	X				
	SUBTOTAL	90	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(90- NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N.A
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	X				
11	Las unidades sanitarias fijas ó portátiles están limpias.	X				
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final					X
13	Esta demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.	X				
14	El material, equipos y herramientas está organizado.	X				
15	El materia de descapote se acopia y se protege	X				
16	La bodega de almacenamiento esta en orden y aseo	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	100%				

ÍTEM	GESTIÓN DEL PELIGRO	10	5	3	0	N.A
17	Las Excavaciones son seguras (escombro a 1 metro de la orilla o más según profundidad)					X
18	La excavación cuenta con escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene entibado o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					
19	Herramientas y/o escombros en areas vecinas, que generen algun tipo de riesgo al personal.	X				
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesitarse.					X
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosferas requerido (gases)					X
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranas, mezcladoras, etc..)	X				
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	3
	Valor % Obtenido (A+B+C)/(70-NA)	75%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor	X				
35	El personal cuenta con dotación adecuada	X				
36	Cascos de seguridad con ratcher para trabajos en alturas	X				
37	Se cuenta con barbuquejo	X				
38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada	X				
39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada	X				
40	Protección respiratoria adecuada para la labor.	X				
41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	X				
42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	X				
43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	X				
44	se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	X				
45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	X				
	SUBTOTAL	120	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-NA)	100%				

ÍTEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N.A
46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores, Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)	X				
47	Conformación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	X				
48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 50 de 1990.	X				
	SUBTOTAL	30	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-NA)	100%				

ÍTEM	SEÑALIZACIÓN	10	5	3	0	N.A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	X				
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	X				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o pisos	X				
52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	X				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
	SUBTOTAL	50	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	100%				

15643

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	**502 de 2023**	**PROYECTO N°**	**2022005500306**

OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	31/05/2024	N° DE TRABAJADORES:	41

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
24	Están las Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante	X				
25	Se cuenta con Plan de Izaje y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).	X				
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aparejador, supervisor del Izaje, Operador).	X				
27	Se señaliza y demarca la carga	X				
	SUBTOTAL	40	0	0	0	0
	Valor : % Obtenido (A+B+C)/(40-NA)	100%				

ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A
54	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (escaleras, andamios, plataformas).	X				
55	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)	X				
56	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura especifico para la labor	X				
57	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas	X				
58	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas				X	
	SUBTOTAL	40	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-NA)	80%				

ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	10	5	3	0	N.A

ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS	10	5	3	0	N.A

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	10	5	3	0	N.A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y numero de trabajadores expuestos.	X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes	X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	X				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	X				
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	X				
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (incendio, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.	X				
	SUBTOTAL	60	0	0	0	0
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(60-NA)	100%				

GESTION EN CAMPO

	COMPONENTES	% OBTENIDO	10	5	3	0	N.A
1	DOCUMENTACION EN CAMPO	100%	90	0	0	0	0
2	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	100%	120	0	0	0	0
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	100%	60	0	0	0	1
4	MEDICINA PREVENTIVA	100%	30	0	0	0	0
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	75%	30	0	0	0	3
6	SEÑALIZACIÓN	100%	50	0	0	0	0
7	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA	100%	40	0	0	0	0
8	TRABAJOS EN ALTURAS	80%	40	0	0	0	0
9	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	100%	60	0	0	0	0
	RESULTADO DE NUESTRA GESTIÓN EN CAMPO	95,0%	520	0	0	0	4

ALTO	MEDIO	BAJO
X		

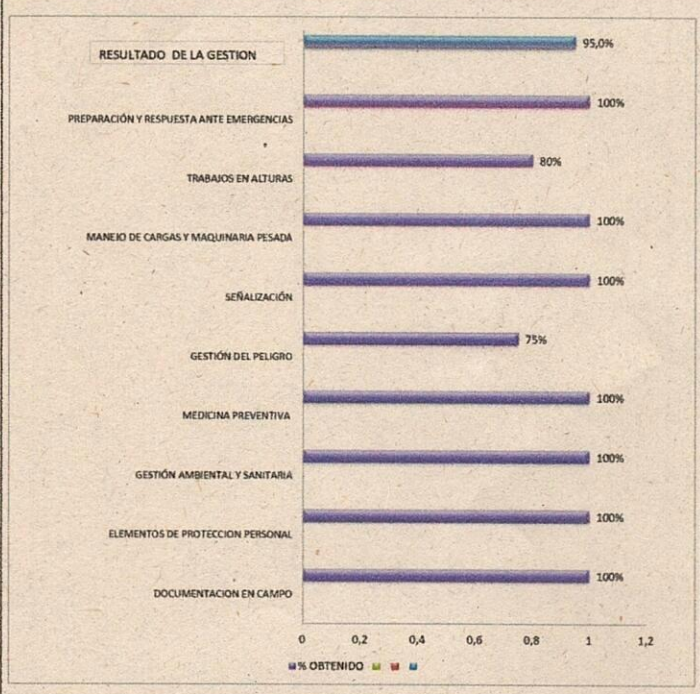


GRAFICO DE GESTION SISO

15644

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-9

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
112-ECP-FR-019-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	502 de 2023	**PROYECTO N°**	2022005500306
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	510 de 2023		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023		
FECHA DE INSPECCIÓN:	31/05/2024	N° DE TRABAJADORES:	41

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE SISO

Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.

ÍTEM	DOCUMENTACION BASICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN					ÍTEM	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A			10	5	3	0	N.A

OBSERVACIONES

ÍTEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES	FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
58	No se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas, solicitr al contratista el rescatista	JUNIO

OBSERVACIONES GENERALES

Firma
Nombre CARLOS RODRIGUEZ CORREDOR
RESIDENTE DE OBRA
N° Matrícula Profesional: A1381232015-1049611735

Firma
Nombre: JULIETH SALAS SENA
PROFESIONAL SGSST OBRA
N° Matrícula Profesional:Resolucion 009802 de 2021

Firma
Nombre: DARIO ALEXANDER AGUDELO
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional: 252022-10446CND

Firma
Nombre LIZETH NATALIA LAGOS MARIN
PROFESIONAL EN SGSST INTERVENTORIA
N° Matrícula Profesional:2350/2014

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15645

CONSORCIO EDUCACIAS

ACTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

INFORME DE OBRA

15646

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META"
CONTRATISTA	Consorcio Educacias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	Contrato N° 510 DEL 2023
INTERVENTORIA:	Consorcio Inter-educativo 2023

FECHA DE INSPECCION: 23/12/2023

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA SI	PRESENTA NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal		X	SI	0	Se debe establecer por parte del contratista el gestor para el manejo de los residuos sólidos ordinarios generados por el personal administrativo
	Separación y clasificación		X	SI	0	
	Disposición Final		X	SI	0	
	Programación de retiro		X	SI	0	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas		X	N/A	N/A	
	Limpieza interna y externa de la obra		X	SI	0	
	Almacenamiento de materiales y combustibles		X	N/A	N/A	
	Campamento		X	SI	0	
	Manejo de Vegetacion		X	N/A	N/A	
	Estabilidad de Taludes		X	N/A	N/A	
				SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA SI	PRESENTA NO	APLICA	CALIFICACION CALIFICACIÓN	CALIFICACION OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal		X	SI	0	Se debe establecer por parte del contratista, como se llevará a cabo el manejo de las aguas residuales de las unidades sanitarias y aguas residuales producto del lavado de mezcladoras entre otras aguas servidas
	Manejo Escorrentía		X	SI	0	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	N/A	N/A	
	Medidas de contingencia		X	N/A	N/A	
	Zonas de trabajo secas		X	N/A	N/A	
	Manejo nivel freático		X	N/A	N/A	
	Separación y clasificación de vertimientos		X	N/A	N/A	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)		X	SI	0	
				SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS		
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		
OCUPACIÓN DE CAUCE		

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA SI	PRESENTA NO	APLICA	CALIFICACION CALIFICACIÓN	CALIFICACION OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal		X	SI	0	El contratista debe hacer entrega del plan de formación que incluya temas de manejo atmosferico y control del ruido
	Humedicimiento de áreas de trabajo		X	N/A	N/A	
	Cubrimiento de acopios de materiales		X	N/A	N/A	
	Uso de mallas proctectoras		X	N/A	N/A	
	No exceder volumenes del volco de los camiones		X	N/A	N/A	
	Olores desagradables		X	N/A	N/A	
	Aseo Interno y externo de la obra		X	N/A	N/A	
	Uso de equipos en buen estado		X	N/A	N/A	
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	N/A	
	Planificación de horarios de trabajo		X	N/A	N/A	
	Medidas de Contingencia	X		SI	0	
				SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

15647

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales			N/A	N/A	No aplica para este periodo ya que no se han iniciado labores constructivas
	Almacenamiento adecuado de combustibles			N/A	N/A	
	Localización y señalización en el Campamento			N/A	N/A	
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros			N/A	N/A	
	Obras de contención			N/A	N/A	
	Capacitación del Personal			N/A	N/A	
				SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal		X	SI	0	El contratista debe hacer entrega del plan de formación y capacitaciones y debe hacer la demarcación y zonificación de la obra
	Demarcación del perímetro		X	SI	0	
	Zonificación de la obra		X	SI	0	
	Lona de Cerramiento		N/A	N/A	N/A	
	Cinta de Reflectiva		N/A	N/A	N/A	
	Señales Informativas y preventivas		N/A	N/A	N/A	
	Uso de Paleteros		N/A	N/A	N/A	
	Iluminación Nocturna		N/A	N/A	N/A	
				SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	SI	0	
	Dotación de elementos de protección personal			NO	0	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional			NO	0	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	SI	0	
	Programa de información a a la comunidad			NO	0	
	Socializaciones	X		SI	4,6	El contratista hace entrega de la socialización con la comunidad
				SUMATORIA	4,6	
				PROMEDIO	0,766666667	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal			NO	0	No aplica este componente ya que aún no se da inicio con labores constructivas
	Mantenimiento Preventivo			NO	0	
	Definición de Horarios de trabajo			NO	0	
	Ficha de control de actividades			NO	0	
	Uso de equipos en buen estado, Certificados			NO	0	
	Elementos de protección personal			NO	0	
	Extintores			NO	0	
	Medidas de Contingencia			NO	0	
				SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal			NO	0	No aplica este componente ya que aún no se da inicio con labores constructivas
	Mantenimiento Preventivo			NO	0	
	Definición de Horarios de trabajo			NO	0	
	Ficha de control de actividades			NO	0	
	Uso de equipos en buen estado,			NO	0	
	Elementos de protección personal			N/A	0	
	Extintores			NO	0	
	Medidas de Contingencia			NO	0	
	Volumen de material (m3)			NO	0	
	Volumen de excavcion (m3)			NO	0	
	Volumen de demolicion (m3)			NO	0	
	Volumen de tierra (m3)			NO	0	
				SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:		

15648

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	SI	0	
	Dotación de elementos de protección personal		X	SI	0	El contratista cuenta con permiso para llevar a cabo las talas, sin embargo no dio inicio con esta actividad
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional		X	SI	0	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos		X	SI	0	
	Programa de información a a la comunidad		X	SI	0	
	Socializaciones		X	SI	0	
	Arboles talados		X	SI	0	
	Arboles podados		X	SI	0	
	Arboles bloqueados			N/A	0	
	Arboles sembrados		X	SI	0	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	0	
				PROMEDIO	0	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	0,766666667	1,0	Deficiente

OBSERVACIONES GENERALES

- El contratista debe realizar un plan de acción que incluya cronograma de ejecución de las actividades a desarrollar para el cumplimiento de las fichas de manejo del PMA propuesto a la interventoría.
- El contratista debe actualizar los permisos para disposición del material sobrante de las excavaciones y demoliciones ya que el actual se encuentra vencido desde el mes de noviembre de 2023.
- El contratista debe hacer entrega de los gestores a emplear para la disposición de los residuos generados por el proyecto con sus respectivos permisos ambientales.
- El contratista debe hacer entrega de un plan de formación y capacitación en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo con fecha de inicio para el próximo periodo.
- El contratista debe hacer entrega de las evidencias de la socialización del PMA y de la inducción al personal que se encuentre laborando actualmente ya sea administrativo u operativo.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **viernes, 29 de diciembre de 2023**

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:

Firma
Nombre:
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 5238164814 ANT

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15649

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS
CONTRATISTA	Consorcio Educacias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	Contrato N° 510 DEL 2023
INTERVENTORIA:	Consorcio Inter-educativo 2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 29/01/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	6	
	Separación y clasificación		X	SI	2,5	realizar la adecuada separación, pesaje para poder medir este indicador
	Disposición Final	X		SI	4,6	
	Programación de retiro	X		SI	4,6	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	4,0	
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	4,0	
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	2,5	Se debe modificar el material en que se construyó el cuarto de almacenamiento de sustancias quimicas y combustibles por uno que no sea inflamable
	Campamento	X		SI	4,0	
	Manejo de Vegetacion	X		SI	4,0	
	Estabilidad de Taludes			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	36,2	
				PROMEDIO	4,022222222	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Manejo Escorrentia	X		SI	4,6	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	3,0	
	Medidas de contingencia	X		SI	3,0	
	Zonas de trabajo secas	X		SI	4,6	
	Manejo nivel freático			N/A	4,6	
	Separación y clasificación de vertimientos	X		SI	4,6	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	33,6	
				PROMEDIO	4,20	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS		
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		
OCUPACIÓN DE CAUCE		

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Humedicimiento de áreas de trabajo		X	SI	2,5	
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	4,6	
	Uso de mallas proctectoras	X		SI	4,6	
	No exceder volumenes del volco de los camiones	X		SI	4,6	
	Olores desagradables	X		SI	4,6	
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	4,6	
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	4,6	
	Apantallamiento sonoro del área			N/A		
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	4,6	
	Medidas de Contingencia			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	39,3	
				PROMEDIO	4,366666667	

15650

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X		SI	4,6	
	Almacenamiento adecuado de combustibles		X	SI	2,5	
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	4,6	
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	4,6	
	Obras de contención			N/A		
	Capacitación del Personal	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	20,9	
				PROMEDIO	4,18	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Demarcación del perímetro	X		SI	4,6	
	Zonificación de la obra	X		SI	4,6	
	Lona de Cerramiento	X		SI	4,6	
	Cinta de Reflectiva			N/A		
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	4,6	
	Uso de Paleteros			N/A		
	Iluminación Nocturna			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	23	
				PROMEDIO	4,6	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	4,6	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4,6	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	4,6	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	4,6	
	Socializaciones	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	27,6	
				PROMEDIO	4,6	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		NO	4,6	
	Mantenimiento Preventivo			NO	2,5	
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	4,6	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado, Certificados		X	SI	4,6	
	Elementos de protección personal			SI	4,6	
	Extintores			SI	4,6	
	Medidas de Contingencia			SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	30,1	
				PROMEDIO	4,3	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		NO	2,5	
	Mantenimiento Preventivo			N/A		
	Definición de Horarios de trabajo	X		NO	4,0	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado,	X		NO	4,0	
	Elementos de protección personal			N/A		
	Extintores	X		NO	4,0	
	Medidas de Contingencia			N/A		
	Volumen de material (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de demolicion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	32,9	
				PROMEDIO	4,1125	

DOCUMENTACIÓN	NÚMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:		

15653

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS
CONTRATISTA	Consorcio Educacias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	Contrato N° 510 DEL 2023
INTERVENTORIA:	Consorcio Inter-educativo 2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 29/02/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO			
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	6	
	Separación y clasificación		X	SI	2,5	realizar la adecuada separación, pesaje para poder medir este indicador
	Disposición Final	X		SI	4,6	
	Programación de retiro	X		SI	4,6	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	4,0	
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	4,0	
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	2,5	Se debe modificar el material en que se construyó el cuarto de almacenamiento de sustancias quimicas y combustibles por uno que no sea inflamable
	Campamento	X		SI	4,0	
	Manejo de Vegetacion	X		SI	4,0	
	Estabilidad de Taludes			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	36,2	
				PROMEDIO	4,022222222	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		APLICA	CALIFICACION	
		SI	NO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Manejo Escorrentía	X		SI	4,6	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	3,0	
	Medidas de contingencia	X		SI	3,0	
	Zonas de trabajo secas	X		SI	4,6	
	Manejo nivel freático			N/A	4,6	
	Separación y clasificación de vertimientos	X		SI	4,6	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	33,6	
				PROMEDIO	4,20	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS		
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		
OCUPACIÓN DE CAUCE		

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		APLICA	CALIFICACION	
		SI	NO		CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Humedicimiento de áreas de trabajo		X	SI	2,5	
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	4,6	
	Uso de mallas proctectoras	X		SI	4,6	
	No exceder volumenes del volco de los camiones	X		SI	4,6	
	Olores desagradables	X		SI	4,6	
	Aseo interno y externo de la obra	X		SI	4,6	
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	4,6	
	Apantallamiento sonoro del área			N/A		
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	4,6	
	Medidas de Contingencia			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	39,3	
				PROMEDIO	4,366666667	

15654

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	4,6	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	4,6	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	4,6	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	4,6	
	Socializaciones	X		SI	4,6	
	Arboles talados	X		NO	3	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	NO	3	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	33,6	
				PROMEDIO	4,2	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	38,58	50,8	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES
Contratista debe realizar cambio del material empleado para fabricar cuarto de sustancias químicas y combustibles ya que se realizó en polisombra el cual es inflamable
Contratista debe implementar la separación, clasificación y pesaje de los residuos generados para poder llevar los indicadores de residuos ordinarios, aprovechables y peligrosos
Contratista debe hacer entrega de los planes de mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo realizados en el mes El contratista debe hacer entrega de los gestores a emplear para la disposición de los residuos generados por el proyecto con sus respectivos permisos ambientales.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **jueves, 29 de febrero de 2024**

Firma
Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
N° Matricula Profesional:

Firma
Nombre:
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional: 5238164814 ANT

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15655

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS
CONTRATISTA	Consorcio Educacias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	Contrato N° 510 DEL 2023
INTERVENTORIA:	Consorcio Inter-educativo 2023

FECHA DE INSPECCION: 27/03/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	6	
	Separación y clasificación		X	SI	6	realizar la adecuada separación, pesaje para poder medir este indicador
	Disposición Final	X		SI	6	
	Programación de retiro	X		SI	6	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	5,0	
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5,0	
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	2,5	Se debe modificar el material en que se construyó el cuarto de almacenamiento de sustancias químicas y combustibles por uno que no sea inflamable
	Campamento	X		SI	5,0	
	Manejo de Vegetacion	X		SI	5,0	
	Estabilidad de Taludes			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	46,5	
				PROMEDIO	**5,166666667**	

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Manejo Escorrentía	X		SI	5,0	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	3,0	
	Medidas de contingencia	X		SI	3,0	
	Zonas de trabajo secas	X		SI	5,0	
	Manejo nivel freático			N/A	5,0	
	Separación y clasificación de vertimientos	X		SI	5,0	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	5,0	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	36	
				PROMEDIO	**4,50**	

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS		
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		
OCUPACIÓN DE CAUCE		

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Humedecimiento de áreas de trabajo		X	SI	2,5	
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	5,0	
	Uso de mallas proctectoras	X		SI	5,0	
	No exceder volumenes del volco de los camiones	X		SI	5,0	
	Olores desagradables	X		SI	5,0	
	Aseo interno y externo de la obra	X		SI	5,0	
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5,0	
	Apantallamiento sonoro del área			N/A		
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	5,0	
	Medidas de Contingencia			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	42,5	
				PROMEDIO	**4,722222222**	

15656

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X		SI	5,0	
	Almacenamiento adecuado de combustibles		X	SI	2,5	
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	5,0	
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	5,0	
	Obras de contención			N/A		
	Capacitación del Personal	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	22,1	
				PROMEDIO	**4,42**	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Demarcación del perímetro	X		SI	5,0	
	Zonificación de la obra	X		SI	5,0	
	Lona de Cerramiento	X		SI	5,0	
	Cinta de Reflectiva			N/A		
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	5,0	
	Uso de Paleteros			N/A		
	Iluminación Nocturna			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	25,0	
				PROMEDIO	**5**	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5,0	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5,0	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5,0	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	5,0	
	Socializaciones	X		SI	5,0	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	30	
				PROMEDIO	**5**	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		NO	4,6	
	Mantenimiento Preventivo			NO	2,5	
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	4,6	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado, Certificados		X	SI	4,6	
	Elementos de protección personal			SI	4,6	
	Extintores			SI	4,6	
	Medidas de Contingencia			SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	30,1	
				PROMEDIO	**4,3**	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		NO	4,6	
	Mantenimiento Preventivo			N/A		
	Definición de Horarios de trabajo	X		NO	4,0	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado,	X		NO	4,6	
	Elementos de protección personal			N/A		
	Extintores	X		NO	4,6	
	Medidas de Contingencia			N/A		
	Volumen de material (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de demolicion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	36,2	
				PROMEDIO	**4,525**	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:		

15657

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	6	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	6	
	Socializaciones	X		SI	6	
	Arboles talados	X		NO	4,6	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	NO	3	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	42,2	
				PROMEDIO	5,275	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	42,91	56,5	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES
Contratista debe realizar cambio del material empleado para fabricar cuarto de sustancias químicas y combustibles ya que se realizó en polisombra el cual es inflamable
Contratista debe hacer entrega de los planes de mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo realizados en el mes

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **miércoles, 27 de marzo de 2024**

Firma
Nombre:DARIO ALEXANDER AGUDELO DUARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:252022-10446CND

Firma
Nombre:SILVIA LIDA SOLIPA HENAO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:No. 5238164814 ANT

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15658

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS
CONTRATISTA	Consorcio Educacias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	Contrato N° 510 DEL 2023
INTERVENTORIA:	Consorcio Inter-educativo 2023

FECHA DE INSPECCION: 30/04/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	6	
	Separación y clasificación	X		SI	6	
	Disposición Final	X		SI	6	
	Programación de retiro	X		SI	6	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	5,0	
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5,0	
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	3	
	Campamento	X		SI	5,0	
	Manejo de Vegetacion	X		SI	5,0	
	Estabilidad de Taludes			N/A		
				SUMATORIA	47	
				PROMEDIO	5,222222222	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Manejo Escorrentía	X		SI	5,0	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	3,0	
	Medidas de contingencia	X		SI	3,0	
	Zonas de trabajo secas	X		SI	5,0	
	Manejo nivel freático			N/A	5,0	
	Separación y clasificación de vertimientos	X		SI	5,0	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	5,0	
				SUMATORIA	36	
				PROMEDIO	4,50	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS		
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		
OCUPACIÓN DE CAUCE		

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Humedecimiento de áreas de trabajo		X	SI	2,5	
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	5,0	
	Uso de mallas proctectoras	X		SI	5,0	
	No exceder volumenes del volco de los camiones	X		SI	5,0	
	Olores desagradables	X		SI	5,0	
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5,0	
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5,0	
	Apantallamiento sonoro del área			N/A		
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	5,0	
	Medidas de Contingencia			N/A		
				SUMATORIA	42,5	
				PROMEDIO	4,722222222	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

15659

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X		SI	5,0	
	Almacenamiento adecuado de combustibles		X	SI	2,5	
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	5,0	
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	5,0	
	Obras de contención			N/A		
	Capacitación del Personal	X		SI	4,6	
				SUMATORIA	22,1	
				PROMEDIO	4,42	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Demarcación del perímetro	X		SI	5,0	
	Zonificación de la obra	X		SI	5,0	
	Lona de Cerramiento	X		SI	5,0	
	Cinta de Reflectiva			N/A		
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	5,0	
	Uso de Paleteros			N/A		
	Iluminación Nocturna			N/A		
				SUMATORIA	25,0	
				PROMEDIO	5	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5,0	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5,0	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5,0	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	5,0	
	Socializaciones	X		SI	5,0	
				SUMATORIA	30	
				PROMEDIO	5	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		NO	4,6	
	Mantenimiento Preventivo			NO	2,5	
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	4,6	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado, Certificados		X	SI	4,6	
	Elementos de protección personal			SI	4,6	
	Extintores			SI	4,6	
	Medidas de Contingencia			SI	4,6	
				SUMATORIA	30,1	
				PROMEDIO	4,3	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		NO	4,6	
	Mantenimiento Preventivo			N/A		
	Definición de Horarios de trabajo	X		NO	4,0	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado,	X		NO	4,6	
	Elementos de protección personal			N/A		
	Extintores	X		NO	4,6	
	Medidas de Contingencia			N/A		
	Volumen de material (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de demolicion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	4,6	
				SUMATORIA	36,2	
				PROMEDIO	4,525	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:		

15660

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	6	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	6	
	Socializaciones	X		SI	6	
	Arboles talados	X		NO	4,6	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	NO	3	
				SUMATORIA	42,2	
				PROMEDIO	5,275	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	42,96	56,5	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES
Contratista debe realizar cambio del material empleado para fabricar cuarto de sustancias químicas y combustibles ya que se realizó en polisombra el cual es inflamable
Contratista debe hacer entrega de los planes de mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo realizados en el mes

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia martes, 30 de abril de 2024

Firma
Nombre:DARIO ALEXANDER AGUDELO DUARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matricula Profesional:252022-10446CND

Firma
Nombre:SILVIA LIDA SOLIPA HENAO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:No. 5238164814 ANT

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15661

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL
112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

OBJETO PROYECTO:	"CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS
CONTRATISTA	Consorcio Educacias
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	Contrato N° 510 DEL 2023
INTERVENTORIA:	Consorcio Inter-educativo 2023

FECHA DE INSPECCIÓN: 30/05/2024

SUELO

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	6	
	Separación y clasificación	X		SI	6	
	Disposición Final	X		SI	6	
	Programación de retiro	X		SI	6	
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas	X		SI	5,0	
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5,0	
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	3	
	Campamento	X		SI	5,0	
	Manejo de Vegetacion	X		SI	5,0	
	Estabilidad de Taludes			N/A		
				SUMATORIA	47	
				PROMEDIO	5,222222222	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

AGUA

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Manejo Escorrentía	X		SI	5,0	
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.	X		SI	3,0	
	Medidas de contingencia	X		SI	3,0	
	Zonas de trabajo secas	X		SI	5,0	
	Manejo nivel freático			N/A	5,0	
	Separación y clasificación de vertimientos	X		SI	5,0	
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domesticas)	X		SI	5,0	
				SUMATORIA	36	
				PROMEDIO	4,50	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESOLUCIONES	NUMERO	
CONCESIÓN DE AGUAS		
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS		
OCUPACIÓN DE CAUCE		

AIRE

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Humedecimiento de áreas de trabajo		X	SI	2,5	
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	5,0	
	Uso de mallas proctectoras	X		SI	5,0	
	No exceder volumenes del volco de los camiones	X		SI	5,0	
	Olores desagradables	X		SI	5,0	
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	5,0	
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5,0	
	Apantallamiento sonoro del área			N/A		
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	5,0	
	Medidas de Contingencia			N/A		
				SUMATORIA	42,5	
				PROMEDIO	4,722222222	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

15662

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	- contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X		SI	5,0	
	Almacenamiento adecuado de combustibles		X	SI	2,5	
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	5,0	
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	5,0	
	Obras de contención			N/A		
	Capacitación del Personal	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	22,1	
				PROMEDIO	4,42	

SEÑALIZACIÓN

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Demarcación del perímetro	X		SI	5,0	
	Zonificación de la obra	X		SI	5,0	
	Lona de Cerramiento	X		SI	5,0	
	Cinta de Reflectiva			N/A		
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	5,0	
	Uso de Paleteros			N/A		
	Iluminación Nocturna			N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	25,0	
				PROMEDIO	5	

GESTIÓN SOCIAL

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal	X		SI	5,0	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5,0	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5,0	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5,0	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	5,0	
	Socializaciones	X		SI	5,0	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	30	
				PROMEDIO	5	

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		NO	4,6	
	Mantenimiento Preventivo			NO	2,5	
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	4,6	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado, Certificados		X	SI	4,6	
	Elementos de protección personal			SI	4,6	
	Extintores			SI	4,6	
	Medidas de Contingencia			SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	30,1	
				PROMEDIO	4,3	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACION		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal	X		NO	4,6	
	Mantenimiento Preventivo			N/A		
	Definición de Horarios de trabajo	X		NO	4,0	
	Ficha de control de actividades			N/A		
	Uso de equipos en buen estado,	X		NO	4,6	
	Elementos de protección personal			N/A		
	Extintores	X		NO	4,6	
	Medidas de Contingencia			N/A		
	Volumen de material (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de excavcion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de demolicion (m3)	X		SI	4,6	
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	4,6	
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5		SUMATORIA	36,2	
				PROMEDIO	4,525	

DOCUMENTACIÓN	NUMERO	
REGISTRO PROVEEDOR:		
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:		

15663

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA SEGUIMIENTO AMBIENTAL

112-ECP-FR-020-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	contrato de obra N. 502 de 2023	PROYECTO N°	2022005500306

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA		CALIFICACIÓN		
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal	X		SI	4,6	
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	6	
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	6	
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	6	
	Programa de información a a la comunidad	X		SI	6	
	Socializaciones	X		SI	6	
	Arboles talados	X		NO	4,6	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	NO	3	
				SUMATORIA	42,2	
				PROMEDIO	5,275	

Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	42,96	56,5	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES
Contratista debe realizar cambio del material empleado para fabricar cuarto de sustancias químicas y combustibles ya que se realizó en polisombra el cual es inflamable
Contratista debe hacer entrega de los planes de mantenimiento preventivo, rutinario y correctivo realizados en el mes

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el dia **jueves, 30 de mayo de 2024**

Firma
Nombre:DARIO ALEXANDER AGUDELO DUARTE
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:252022-10446CND

Firma
Nombre:SILVIA LIDA SOLIPA HENAO
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:No. 5238164814 ANT

Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, asi mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

15664

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

ACTA DE RECONOCIMIENTO Y PAGO

INFORME DE OBRA

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHlsantama	LEONARDO SANTAMARIA REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-500002	AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-06-5:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13923 de fecha 2023-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	12323	**Fecha Registro:**	2023-09-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	26.037.178.957,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	26.037.178.957,00	**Saldo x Obligar:**	11.622.307.374,20
TERCERO								
Identificacion:	901737315	**Razon Social:**	CONSORCIO EDUCACIAS				**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:	357339738	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.			**Tipo:**	Ahorro	**Estado:** Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	79724607	**Nombre:**	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS		**Cargo:**	GERENTE GENERAL		
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	502 DE 2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2023-08-15
VIGENCIA ANTERIOR								
Proviene Vigencia Anterior:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03-500002 AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META-AIM	00AD-2201-0700-2022-00550-0306 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META	Nación	AD50000	CSF	2023-09-08	26.037.178.957,00	0,00		
					Total:	26.037.178.957,00	0,00	26.037.178.957,00	11.622.307.374,20

Objeto:	CPC 53129- PROYECTO 2022005500306 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META

15666

CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023

Villavicencio, 11 de Julio del 2024

CI-N°510-2023-OFI N°076

Ingeniera:
GINA TATIANA ELAICA NIETO
Dirección operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de proyecto.
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. 502 DE 2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META

ASUNTO: Entrega Acta de cobro parcial N ° 1 de obra.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y con aras de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales del proyecto, se hace entrega del Acta de cobro Parcial N ° 1 de obra correspondiente al periodo del 13 de diciembre del 2023 al 17 de junio del 2024, con sus respectivos anexos según la LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE OBRA PAGO PARCIAL 112-ECP-FR-173-V04

Sin otro particular, atentamente,

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - A.I.M.
Radicado N° 2297
Fecha 12 Julio 2024
Hora: 12:05 Folios 4 004
Recibido por: Yidari YB.

Firma: _____
Ing. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL - RES. 217 de 2023 A.I.M.
CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023

Con copia: Enrique Manuel Alejandro Vargas Castro - Apoyo a la supervisión
Fabian Camilo Sastoque Ortiz- Apoyo a la supervisión

Anexo: Acta Parcial N°1 Obra (4 Carpetas)

15667

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

GOBERNACIÓN DEL **META**

Villavicencio, 08 de agosto de 2024

112.07.01.0607

SEÑOR.
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023
interventoriaacaciascolper@gmail.com

REFERENCIA: Contrato 510 de 2023 cuyo objeto es: "CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META".

ASUNTO: Respuesta Radicado 2297-24 del 12 de julio 2024

Cordial saludo,

Con el fin de culminar la revisión es necesario subsanar documentación presentada y allegar documentación pendiente. A continuación, detallo puntos que requieren su atención y ajuste para asegurar que toda la documentación cumpla con los requisitos y estándares establecidos:

1. **Lista de Chequeo formato** (112-ECP-FR-181-V03): diligenciar el número de contrato y del proyecto en el formato.

2. **Plan de Cobros interventoría formato** (112-ECP-FR-048-V04): No aparece el objeto del contrato completo, la Fecha del Compromiso en el Plan de Cobros es incorrecta, favor revisar el registro presupuestal del contrato.

3. **Acta de Pago de Interventoría** (112-ECP-FR-054-V04): Es necesario reimprimir el documento debido a que la imagen no es clara y no aparecen todas las márgenes. Además, el número del proyecto es incorrecto (BPIN) y las condiciones originales o actualizadas deben coincidir con el clausulado del contrato. Por lo tanto, el valor total no concuerda con las condiciones iniciales, lo cual afecta los valores posteriores. Adicionalmente, el porcentaje de avance de le presente acta en cada uno de los profesionales debe ser igual al porcentaje que cobra la obra, también el % ejecutado debe expresarse redondeando a dos decimales.

4. **Informe de Gestión de Interventoría** (112-ECP-FR-051-V05): Cambiar la hoja 3 no es legible, y en la gestión/observaciones en la hoja 9 no se ve la división en las actividades 8 y 9, también en la actividad 23 y 29 no relacionan todos los meses de ejecución a la fecha de la presente acta.

5. **Informe de Gestión de Interventoría** (112-ECP-FR-051-V05): En la sección de Gestión Técnica, numeral 5, es necesario describir detalladamente los procesos realizados por el director de interventoría, el residente, el especialista estructural, el especialista geotécnico y el topógrafo, ya que las descripciones actuales son demasiado generales. Además, en el ítem F describen dos anexos que no los encuentro en el informe, al mismo tiempo anexan los informes de los profesionales, pero no los relaciona en el ítem F, las firmas no deben aparecer en una sola hoja sin incluir información adicional del informe.

6. **informe de Plan de Inversión del Anticipo** formato (112-ECP-FR-055-V04): corregir el código del proyecto el que aparece en dos espacios es erróneo, el objeto del contrato no se visualiza completo, y la fecha de terminación en dos espacios es incorrecta. También solo Relacionar y anexar solo lo referente a la amortización actual, además anexar cuentas de cobro, RUT, facturas y/o certificados de pago.

7. **Certificado de Ejecución del Proyecto**: En el oficio, indicar el porcentaje y el valor ejecutado del proyecto en cada municipio. El valor indicado no concuerda con el valor cobrado. Si se realiza la multiplicación del valor total del contrato por el % cobrado (14.63%), no se refleja el mismo valor.

8. **Factura Proforma**: Actualizar los datos de la agencia (dirección), y revisar el nombre del consorcio (se menciona "Vía Cabuyaro" y "Consorcio Inter-2023"). Verificar los valores debido a la incoherencia del % cobrado. El % del ICA debe calcularse antes del IVA.

9. **Acta relación personal interventoría** formato (112-ECP-FR-047-V04): en el mes de diciembre la asignación salarial del director de interventoría es diferente al informe entregado para ese periodo, no anexan la planilla de pago del residente, especialista ambienta, la profesional sst y el inspector de interventoría.

10. **Acta relación personal interventoría** formato (112-ECP-FR-047-V04):la presente acta es diferente a la presentada mensualmente (mes de enero), no se evidencia la planilla del residente, especialista ambiental, la profesional sst y del inspector de interventoría saliente y entrante de interventoría. Revisar las planillas del personal de obra ya que no se pueden evidenciar los números de cédula de los mismos.

11. **Presupuesto:** Actividades redondeadas a cero, el porcentaje de avance en obra e interventoría redondeado a 2 para coincidencias en el avance económico.

12. **Acta relación personal interventoría** formato (112-ECP-FR-047-V04):no presentan las planillas de pago del mes de febrero del director de interventoría, residente, especialista estructural, especialista en geotecnia, especialista ambiental, la profesional sst del que ingresa y el que sale, trabajador social que ingresa y del inspector de interventoría.

13. **Acta relación personal interventoría** formato (112-ECP-FR-047-V04): no adicionan la planilla del especialista en geotecnia. No coincide la planilla de secretaria con el formato mencionado.

14. Revisar las **actividades de concretos** presentadas en el informe de obra ya que las están presentando como actividades de cimentación (6.01 – 6.10); igualmente con la actividad 7.01, 9.01, 9.02; Anexar diseño de mezclas para concretos de 2000, 3000, 4000 PSI.

15. Revisar y corregir la información relacionada con la seguridad social. Además, verificar el porcentaje de cobro presentada por ustedes que coincida con el % de cobro de obra del (14.63%), redondeándolo a dos decimales para eliminar los decimales ocultos que afectan la multiplicación. También es necesario rectificar el porcentaje y el valor en todos los documentos anexos.

15671

CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023

Villavicencio, 12 de agosto 2024

CI-N°510-2023-OFI N°091

Ingeniera:
GINA TATIANA ELAICA NIETO
Directora Operativa de Ejecución, seguimiento y ejecución de proyectos
Agencia para la Infraestructura del Meta
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA N. 502 DE 2023 CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - META.

ASUNTO: Entrega observaciones Parcial No 1 de obra

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas mediante oficio con radicado 112.07.01.0607 de fecha 8 de agosto de 2024 nos permitimos remitir las correcciones hechas por el contratista de obra a la parcial No 1.

Sin otro particular,

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - A.I.M
Radicado N° 2697
Fecha: 12 - Agosto 2024
Hora: 4:37 Folios 4 Cop.
Recibido por

Firma:
Ing. WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL - RES. 217 de 2023 A.I.M.
CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023

Proyectó:	Aprobó:
Ing. Dario Agudelo - Residente interventoría.	Ing. William Valencia Campos - Director interventoría.

15672

Recibo
12/08/2024
En Revisión.

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

Acacías - Meta, 09 de agosto de 2024

Señores
WILLIAM VALENCIA CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER-EDUCATIVO 2023
La Ciudad

REFERENCIA: Contrato 502 de 2023 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META"

ASUNTO: Observaciones A.I.M. Acta Parcial No. 01

Cordial Saludo:

Teniendo en cuenta el oficio del AIM del asunto recibido el día 09 de agosto de 2024, el cual contiene 18 observaciones, damos respuesta a las observaciones que corresponden a la parcial de obra No. 01, de acuerdo con la numeración original enviada por AIM, así:

Observación 11: Presupuesto: Actividades redondeadas a cero, el porcentaje de avance en obra e interventoría redondeado a 2 para coincidencias en el avance económico

Respuesta: Se ajustan los valores redondeando a cero la administración, imprevistos y utilidad en el formato 112-ECP-FR-029-V03.

Observación 14: Revisar las actividades de concretos presentadas en el informe de obra ya que las están presentando como actividades de cimentación (6.01 – 6.10); igualmente con la actividad 7.01, 9.01, 9.02; Anexar diseño de mezclas para concretos de 2000, 3000, 4000 PSI.

Respuesta: se realiza la corrección solicitada en los concretos indicados para el informe de obra y se anexa el diseño de mezclas de 2000, 3000 y 4000 psi en 21 folios.

Observación 16: Relacionar el anticipo en la relación de pagos.

Respuesta: Se ajusta el formato 112-ECP-FR-029-V03 incluyendo en la relación de pagos del proyecto el valor del anticipo

Observación 17: Anexar certificados de calidad de lámina metaldeck, acero AT500, malla electrosoldada y acero de refuerzo.

Respuesta: Estos certificados se entregaron en su momento en los informes de obra, se anexan al informe de obra los certificados de calidad

Acero de refuerzo: son 8 hojas
Lamina Metaldeck: es 1 folio

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023


Acero A500: son 10 folios
Malla electrosoldada: es 1 folio

Observación 18: Anexar laboratorios de tinta de soldaduras para aceros estructurales, certificados de calidad de tuberías de redes sanitarias, laboratorios para subbase con caracterización del material y Proctor.


Respuesta: se anexan al informe de obra los certificados de calidad

Tuberías redes sanitarias: son 7 folios
Caracterización de subbase: son 5 folios

1. Los perlines utilizados son elaborados con láminas fabricadas en frio, anexamos ficha técnica del fabricante Corpacero en 6 folios al informe de obra.
2. Según la norma NSR 10 título F estructuras metálicas en el capítulo F.4 Estructuras de acero con perfiles de lámina formada en frío incluye los aceros de calidad estructural ASTM A1011 grado 50 (340 MPa) que es la norma bajo la cual se fabrican los perlines de Corpacero que utilizamos y para este capítulo la norma no establece que se deban realizar ensayos no destructivos a las soldaduras, los capítulos de la norma que exigen estos ensayos son el capítulo F2 y F3 que son para materiales laminados en caliente, siempre y cuando no hayan pasado la inspección visual inicial.
3. Adicionalmente se puede observar que las soldaduras aplicadas corresponden a conexiones menores para unir los perlines entre si con cordones de 5cm, el diseño inicial de la estructura propende porque estos perlines trabajen mecánicamente con las vigas aéreas, ya que estos están empotrados en las vigas y parte del concreto entra 30 cm en los perlines como se puede ver en los diseños estructurales:

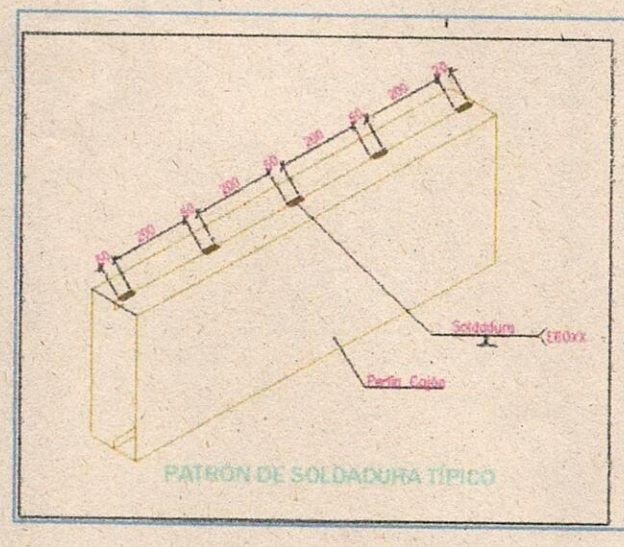

PATRÓN DE SOLDADURA TÍPICO

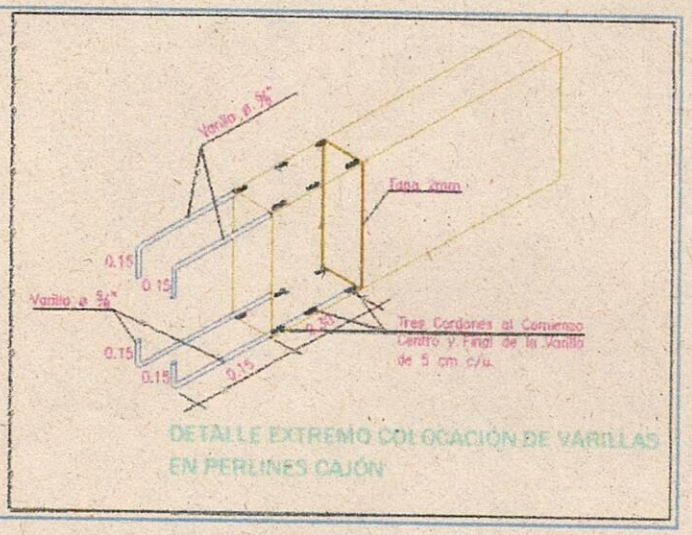


DETALLE EXTREMO COLOCACIÓN DE VARILLAS EN PERLINES CAJÓN

15674

CONSORCIO EDUCACIAS

CONTRATO 502 de 2023

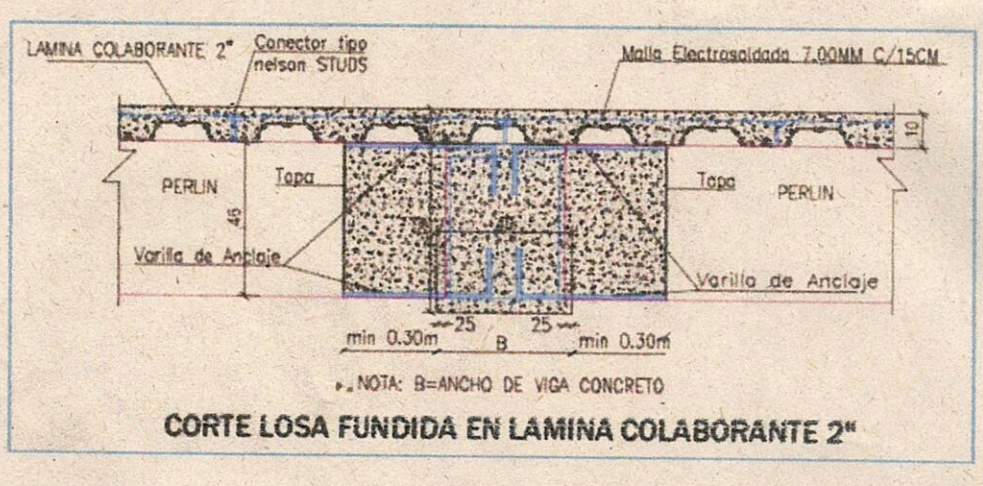

CORTE LOSA FUNDIDA EN LAMINA COLABORANTE 2"

Así las cosas, no se tienen cordones de soldadura que sean estructurales y las conexiones menores se inspeccionaron visualmente por nuestros profesionales y por la interventoría cumpliendo con los requerimientos exigidos, como son: No se encuentran grietas ni agujeros, ni porosidades en el cordón. El cordón tiene ondas, anchura y altura uniformes. El producto terminado cumple con las dimensiones del diseño y casi no tiene distorsión. La soldadura cumple con la resistencia requerida. Recordamos que la prueba de tinta se solicita o ejecuta si no se cumplen algunos de estos requisitos de inspección visual en soldaduras o si los cordones están trabajando estructuralmente sometidos a esfuerzos de corte, flexión o torsión y no pasan la inspección visual inicial.

Atentos a cualquier aclaración adicional,

JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO
Director de Obra
CONSORCIO EDUCACIAS

Anexo: lo enunciado
Copia: Supervisión de AIM

AGENCIA PARA LA
INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

GOBERNACIÓN DEL **META**

Villavicencio, 27 de agosto de 2024

112.07.01- 669 /24

Ingeniero
SERGIO IVAN MUÑOZ YAÑEZ
Gerente AIM
Ciudad.

Asunto. Pago Parcial No. 01 – Contrato de OBRA 502 de 2023 – Proyecto 2022005500306

Reciba un cordial Saludo.

En atención a la solicitud de pago de **CONSORCIO EDUCACIAS** relacionado en el asunto, certifico que cumple con los requisitos del formato "Lista de chequeo Contrato de OBRA **"112-ECP-FR-181-V03"** para el pago Parcial No. 01

Cordialmente.

GINA TATIANA ELAICA NIETO
Dirección Operativa de Ejecución, Seguimiento y Control de proyectos.

Elaboro: Liliana Cadena
Auxiliar Cps

A.I.M.
SUBGECORP.
RAD N° 813
FECHA: 06 SEP 2024
05:20 pm
