	PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES	Código:	IP-FM-35
		VERSION:	01
		FECHA:	07/09/2021

OBJETO DEL PROYECTO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
POSTULANTE:	DELFINA MARIA LOPEZ		
DIRECCIÓN:	K 12A 94 64	BARRIO:	CIUDAD MODESTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		
FECHA:	JUNIO 28 DE 2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	VALOR UNITARIO	PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO		CANTIDADES EJECUTADAS	
				CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	**INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS**						
282	PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC, DE 1/2"	UN	$ 42.483,74	5,00	$ 212.418,70	5,00	$ 212.418,70
293	PUNTO SANITARIO EN PVC. DIAMETRO 4"	UN	$ 115.209,49	1,00	$ 115.209,49	1,00	$ 115.209,49
288	PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIAMETRO 2"	UN	$ 78.586,44	3,00	$ 235.759,32	3,00	$ 235.759,32
318	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"	ML	$ 49.962,76	5,95	$ 297.308,17	5,95	$ 297.308,17
274	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"	ML	$ 63.912,10	2,15	$ 137.411,02	2,15	$ 137.411,02
272	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"	ML	$ 24.395,25	9,10	$ 221.999,78	9,10	$ 221.999,78
8892	REGISTRO DE 0,50X0,30X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:5 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	$ 265.446,59	0,00	$ -	0,00	$ -
8893	EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)	ML	$ 20.027,00	5,95	$ 119.160,65	5,95	$ 119.160,65
1683	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	M3	$ 84.839,10	0,00	$ -	0,00	$ -
2	**PISO BAÑO Y VIVIENDA**						
283	DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 17.333,54	26,25	$ 455.026,23	26,25	$ 455.026,23
901	PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0,05 MTS	M2	$ 34.860,53	26,25	$ 915.139,75	26,25	$ 915.139,75
8748	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 M/M SEPARACIÓN DE 0,15 MTS	M2	$ 41.896,00	0,00	$ -	0,00	$ -
8895	PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	$ 80.100,00	3,34	$ 267.534,00	3,34	$ 267.534,00
8897	ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIVENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	$ 79.459,20	22,82	$ 1.813.195,38	22,82	$ 1.813.195,38
1448	ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0,10 X 0,20 METROS	ML	$ 11.449,01	18,59	$ 212.837,10	18,59	$ 212.837,10
3	**ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS**						
129	DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0,12 Y RETIRO DE MATERAL	M2	$ 23.349,83	0,00	$ -	0,00	$ -
419	DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 11.899,00	0,00	$ -	0,00	$ -
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO ALLANADO SOBRE MURO	M2	$ 27.271,66	35,39	$ 965.198,59	35,39	$ 965.198,59
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$ 49.662,43	0,00	$ -	0,00	$ -
262	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 22.599,83	12,74	$ 287.826,89	12,74	$ 287.826,89
3.1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0,30 M	M2	$ 79.459,20	14,33	$ 1.138.491,42	14,33	$ 1.138.491,42
264	DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 34.970,60	1,00	$ 34.970,60	1,00	$ 34.970,60
313	DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL	UN	$ 21.582,35	1,00	$ 21.582,35	1,00	$ 21.582,35
349	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACION DE PAPELERA	UN	$ 309.057,12	1,00	$ 309.057,12	1,00	$ 309.057,12
351	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS LINEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UN	$ 246.738,37	1,00	$ 246.738,37	1,00	$ 246.738,37
737	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA	UN	$ 48.490,02	1,00	$ 48.490,02	1,00	$ 48.490,02
317	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"	UN	$ 24.142,53	1,00	$ 24.142,53	1,00	$ 24.142,53
3.2	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM	UND	$ 29.172,00	1,00	$ 29.172,00	1,00	$ 29.172,00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA	UND	$ 80.215,00	1,00	$ 80.215,00	1,00	$ 80.215,00
3.4	REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA	ML	$ 14.094,00	12,10	$ 170.537,40	12,10	$ 170.537,40
3.5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø 2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	$ 12.571,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO, INCLUYE TODOS LOS ELEVENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	$ 8.343,00	0,00	$ -	0,00	$ -

4	**ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES**							
417	ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	M2	$ 8.545,83	0,00	$ -	0,00	$ -
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	$ 13.888,09	74,14	$ 1.029.643,36	74,14	$ 1.029.643,36
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	$ 11.978,09	74,14	$ 888.041,22	74,14	$ 888.041,22
3,1	ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	M2	$ 79.459,20	5,93	$ 470.835,49	5,93	$ 470.835,49
934	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	ML	$ 30.852,91	1,10	$ 33.938,20	1,10	$ 33.938,20
4,1	DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE	UND	$ 25.550,00	1,00	$ 25.550,00	1,00	$ 25.550,00
1101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA	UN	$ 243.673,82	1,00	$ 243.673,82	1,00	$ 243.673,82
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$ 49.962,43	4,92	$ 244.339,16	4,92	$ 244.339,16
4,2	FILOS O CARTERA	ML	$ 19.230,00	11,50	$ 221.145,00	11,50	$ 221.145,00
4,3	SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE	ML	$ 170.637,89	1,10	$ 187.701,68	1,10	$ 187.701,68
3,5	SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS	ML	$ 12.571,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3,6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	ML	$ 8.343,00	11,34	$ 94.609,62	11,34	$ 94.609,62
191	VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0.20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0.15 MTS	ML	$ 77.357,02	2,80	$ 216.599,66	2,80	$ 216.599,66
1847	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS	ML	$ 79.913,92	2,80	$ 220.958,98	2,80	$ 220.958,98
4647	CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO)	M3	$ 1.138.191,57	0,00	$ -	0,00	$ -
76	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	$ 7.894,35	0,00	$ -	0,00	$ -
5	**PUERTAS, VENTANAS Y OTROS**						
929	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO	M2	$ 335.898,26	0,24	$ 80.615,59	0,24	$ 80.615,59
5,1	DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES	UND	$ 49.180,00	2,00	$ 98.360,00	2,00	$ 98.360,00
671	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA	UN	$ 286.341,39	2,00	$ 572.682,78	2,00	$ 572.682,78
5,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA	UND	$ 68.297,00	2,00	$ 136.594,00	2,00	$ 136.594,00
5,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)	ML	$ 8.984,00	11,50	$ 103.316,00	11,50	$ 103.316,00
5,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE	UND	$ 345.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS**						
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp	UND	$ 174.609,17	1,00	$ 174.609,17	1,00	$ 174.609,17
6,2	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO	UND	$ 137.013,73	3,00	$ 411.041,19	3,00	$ 411.041,19
6,3	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO	UND	$ 175.976,18	2,00	$ 351.952,36	2,00	$ 351.952,36
6,4	SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO	UND	$ 226.272,78	4,00	$ 905.091,12	4,00	$ 905.091,12
6,5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	$ 474.335,20	1,00	$ 474.335,20	1,00	$ 474.335,20
6,6	DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES	GL	$ 130.076,74	1,00	$ 130.076,74	1,00	$ 130.076,74
6,7	CERTIFICACIÓN RETIE	UND	$ 257.736,01	1,00	$ 257.736,01	1,00	$ 257.736,01
7	**SOCIALIZACIÓN, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA**						
7,1	SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD)	UND	$ 44.166,26	1,00	$ 44.166,26	1,00	$ 44.166,26
7,2	SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	GL	$ 51.507,08	1,00	$ 51.507,08	1,00	$ 51.507,08
7,3	LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA	UND	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00	1,00	$ 200.000,00
7,4	ASEO GENERAL	M2	$ 5.304,90	26,12	$ 138.561,03	26,12	$ 138.561,03
8	**NO PREVISTOS**						
N.P.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO	UND	$ 132.727,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.02	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	$ 33.095,00	14,29	$ 472.857,60	14,29	$ 472.857,60
N.P.03	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4", INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN	ML	$ 37.933,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO	M2	$ 100.828,00	0,00	$ -	0,00	$ -
N.P.05	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M3	$ 29.109,00	0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO				$ 16.819.950,45		$ 16.819.950,45
	COSTO INDIRECTO (ARJ 28%)				$ 4.709.586,13		$ 4.709.586,13
	VALOR TOTAL				$ 21.529.536,58		$ 21.529.536,58

OBSERVACIONES:

Firma:

Nombre: GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Mg Fda. Barros C.

INTERVENTORIA

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				3,00	UND	3,00
COCINA				2,00	UND	2,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**5,00**

ITEM: 293 — PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 288 — PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				2,00	UND	2,00
COCINA				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**3,00**

ITEM: 318 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				4,30	ML	4,30
BAÑO				1,65	ML	1,65
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**5,95**

ITEM: 274 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC DIAMETRO 4"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				2,15	ML	2,15
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,15**

ITEM: 272 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				4,50	ML	4,50
BAÑO				4,60	ML	4,60
				0,00	ML	0
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**9,1**

ITEM: 8892 — REGISTRO DE 0,50X0,50X0,50 MTS EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
CAJA DE AIRE				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 8893 — EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				4,30	ML	4,30

EDUVAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	DELFINA MARIA LOPEZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 84		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	282				PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
					TOTAL PRESENTE ACTA:	5,95

ITEM:	1683				RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO APISONADO	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

CAPITULO 2 - PISO BAÑO Y VIVIENDA

ITEM:	263				DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	3,30	1,04		3,43	M2	3,43
ALCOBA 5	3,76	2,27		8,54		8,54
COCINA	3,40	3,04		10,34		10,34
ALCOBA 2	0,00	0,00		0,00		0,00
HALL	3,76	1,05		3,95		3,95
					TOTAL PRESENTE ACTA:	26,25

ITEM:	901				PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	3,30	1,04		3,43	M2	3,43
ALCOBA 5	3,76	2,27		8,54		8,54
COCINA	3,40	3,04		10,34		10,34
ALCOBA 2	0,00	0,00		0,00		0,00
HALL	3,76	1,05		3,95		3,95
					TOTAL PRESENTE ACTA:	26,25

ITEM:	8748				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM SEPARACIÓN DE 0.15 MTS	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
ALCOBA 5	2,40		2,30	**0,00**		0
COCINA	2,20		2,50	**0,00**		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
						0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,00

ITEM:	8895				PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M	
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	3,31	1,04		3,34	M2	3,34
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	3,34

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 8897 — ENCHAPE EN CERAMICA PARA PISOS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	0,00	0		0,00		0,00
ALCOBA 5	3,76	2,27		8,54		8,54
COCINA	3,40	3,04		10,34		10,34
ALCOBA 2	0,00	0,00		0,00		0,00
HALL	3,76	1,05		3,95		3,95
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**22,82**

ITEM: 1448 — ZOCALO EN BALDOSA CERAMICA 0.10 X 0.20 METROS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
ALCOBA 5	9,27			9,27	ML	9,27
COCINA	5,37			5,37	ML	5,37
HALL	3,95			3,95	ML	3,95
				0,00	ML	0,00
				0,00	ML	0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**18,59**

CAPITULO 3 - ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

ITEM: 129 — DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12 Y RETIRO DE MATERAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00	M2	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 419 — DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00	M2	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 435 — PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	7,96		1,60	12,74	M2	12,74
ALCOBA 5 (MURO NUEVO)	2,96		2,40	7,10		7,10
ALCOBA 5	6,48		2,40	15,55		15,55
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**35,39**

ITEM: 133 — LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00	M2	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 262 — DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	7,96		1,60	12,74		12,74
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**12,74**

ITEM: 3,1 — ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	7,96		1,80	14,33		14,33
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**14,33**

ITEM: 264 — DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 313 — DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 349 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 351 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 797 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 317 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 3,2 — TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
COCINA				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 3,3 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 3,4 — REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				3,60		3,60
BAÑO				1,30		1,30
ALCOBA 2				3,60		3,60
ALCOBA 1				3,60		3,60
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**12,10**

ITEM: 3,5 — SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 3,6 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

CAPITULO 4 - ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES

ITEM: 417 — ESCARIFICACION DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 152 — PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	7,96		0,60	4,78	M2	4,78
COCINA	5,37		0,60	3,22	M2	3,22
ALCOBA 5 (MURO NUEVO)	8,78		2,36	20,72	M2	20,72
MURO BARRA	4,20		1,10	4,62		4,62
SALA COMEDOR	17,00		2,40	40,80		40,80
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**74,14**

ITEM: 432 — ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO	7,96		0,60	4,78	M2	4,78
COCINA	5,37		0,60	3,22	M2	3,22
ALCOBA 5 (MURO NUEVO)	8,78		2,36	20,72	M2	20,72
MURO BARRA	4,20		1,10	4,62		4,62
SALA COMEDOR	17,00		2,40	40,80		40,80
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**74,14**

ITEM: 3,1 — ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR A 0.30 M

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
MESON COCINA	3,85	0,63		2,43		2,43
MUROS MESON COCINA	1,80	1,70		3,50		3,50
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**5,93**

ITEM: 934 — DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,10		1,10
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,10**

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 4,1 — DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 1161 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 133 — LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
ALCOBA 5	2,05		2,40	4,92	M2	4,92
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**4,92**

ITEM: 4,2 — FILOS O CARTERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
ALCOBA 2				0,00	ML	0,00
ALCOBA 5				4,80	ML	4,80
BAÑO				6,70	ML	6,70
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**11,50**

ITEM: 4,3 — SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,10	ML	1,10
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,10**

ITEM: 3,5 — SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
CAJA DE AIRE				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: 3,6 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
MESON COCINA				7,13		7,13

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	**282**			PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**11,34**

ITEM:	**191**			VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PARED ALCOBA 5	2,8			2,8		2,8
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,8**

ITEM:	**1847**			VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
PARED ALCOBA 5	2,8			2,8		2,8
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,8**

ITEM:	**4647**			CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO).		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM:	**78**			ACERO DE REFUERZO FIGURADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

EDUBAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	DELFINA MARIA LOPEZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 84		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	282			PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			

CAPITULO 5 - PUERTAS, VENTANAS Y OTROS

ITEM:	929			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO				0,24	M2	0,24
COCINA				0,00	M2	0
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	0,24

ITEM:	5,1			DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
ALCOBA 2				1,00	UND	1,00
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	2,00

ITEM:	671			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
				0,00	UND	0,00
ALCOBA 5				1,00	UND	1,00
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	2,00

SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL

ITEM: 5,2 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
ALCOBA 2				0,00	UND	0,00
ALCOBA 5				1,00	UND	1,00
BAÑO				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**2,00**

ITEM: 5,3 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO)

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
BAÑO				6,70	ML	6,70
COCINA				4,80	ML	4,80
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**11,50**

ITEM: 5,4 — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
PATIO				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

CAPITULO 6 - ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM: 6,1 — SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 3 BREAKERS DE 20Amp CONTROL, SIFON, SOPORTE EN MAMPOSTERIA CON MORTERO IMPERMEABILIZADO Y LLAVE

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA				1,00	UND	1,00
						0,00
						0,00
						0,00
						0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**1,00**

ITEM: 6,2 — SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO.

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
COCINA				1,00	UND	1,00
ALCOBA 2				1,00	UND	1,00
ALCOBA 5				1,00	UND	1,00
				0,00	UND	0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**3,00**

EDUBAR	SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	CIUDAD MODESTO	POSTULANTE	DELFINA MARIA LOPEZ
DIRECCIÓN	K 12A 94 84		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM:	282			PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			

ITEM:	6,3			SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA				1,00	UND	1,00
BAÑO				1,00		1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	2,00

ITEM:	6,4			SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO.		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
COCINA				1,00	UND	1,00
BAÑO				1,00	UND	1,00
ALCOBA 2				1,00	UND	1,00
ALCOBA 5				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	4,00

ITEM:	6,5			SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
CAJA DE AIRE				1,00	UND	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	6,5			DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
SALA-COMEDOR-COCINA				1,00	GBL	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

ITEM:	6,7			CERTIFICACION RETIE		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
INTERVENCION ELECTRICA VIVIENDA				1,00	GBL	1,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	1,00

CAPITULO 7 - SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDAS

ITEM:	7,4			ASEO GENERAL		
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES			CANT	UNIDAD	TOTAL
	LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)			
BAÑO	3,30	1,04		3,43		3,43
ALCOBA 5	3,76	2,24		8,41		8,41
COCINA	3,40	3,04		10,34		10,34
ALCOBA 2	0,00	0,00		0,00		0,00
HALL	3,76	1,05		3,95		3,95
					TOTAL PRESENTE ACTA:	26,12

EDUBAR	**SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES**
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD

MEMORIAS DE CALCULO

BARRIO	**CIUDAD MODESTO**	**POSTULANTE**	**DELFINA MARIA LOPEZ**
DIRECCIÓN	**K 12A 94 84**		

CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

ITEM: 282 — PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2"

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

CAPITULO 8 - NO PREVISTOS

ITEM: N.P. 01. — SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: N.P. 02. — SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
SALA - COMEDOR - ALCOBA				14,29		14,29
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**14,29**

ITEM: N.P. 03. — SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: N.P. 04. — SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

ITEM: N.P. 05. — DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE FIBRO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES LONG (M)	ANCHO (M)	ALTURA (M)	CANT	UNIDAD	TOTAL
	0,00	0,00		0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
				0,00		0,00
					TOTAL PRESENTE ACTA:	**0,00**

EDUBAR	LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE VIVIENDA	CÓDIGO:	IP-FM-38
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/2021

OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
POSTULANTE:	DELFINA MARIA LOPEZ	No. DE IDENTIFICACIÓN:	39026532
DIRECCIÓN:	K 12A 94 84	BARRIO:	CIUDAD MODESTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		

1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA



2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

- Desmonte de suministro de combo sanitario, accesorios de ducha y rejilla de piso.

-Demolicion plantilla de piso, instalaciones piso ceramica antideslizante.
- Demolicion de pañete en mal estado y levante de pañete en muros baño, enchape en ceramica sobre muros baño, enchape sobre muros baño H:1.80m.
- Estuco y pintura sobre enchape H:0.60m.
- Suministro e instalacion de puerta madera(0.80m) y ventana de aluminio(0.60x0.40) , suministro e instalacion de interruptor sencillo y puerta de baño.



- Levante de muros, sobre viga cimiento, viga aerea, pañetes, estuco, pintura y puerta estuco y pintura sobre muros h: 2.40m; tambien viga cimiento, levante de muro, pañetes, estuco y pintura habitacion nueva y puerta.

- Demolicion de piso existente plantilla sobre excavacion de tuberia sanitaria e hidraulica , enchape ceramica para piso de dimensiones variables de 20x20 a 60x60 o similar + zocalos.
- Enchape en cerámica sobre mesón de cocina y barra, estuco y pintura sobre enchape y muros interiores cocina, desmonte de lavaplatos y montaje del mismo, instalación de toma GFCI, tomacorrientes normales e interruptor, enchape de mesón barra + estuco y pintura sobre muro barra.

FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE CONTRATISTA

Nombre: GEOVANY E. ALVAREZ CERVANTES
Cargo: DIRECTOR DE OBRAS.
Matricula Profesional:A08072000-72194947

FIRMA DEL POSTULANTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN

Delfina Lopez

Nombre:
No. de Identificación: 39026532


FECHA: 04-06-2024

EDUBAR	LOCALIZACIÓN DE VIVIENDAS A INTERVENIR	CÓDIGO:	IP-FM-37
		VERSION:	01
		FECHA:	7/09/2021


OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" MODULO III.		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
POSTULANTE:	DELFINA MARIA LOPEZ	**No. DE IDENTIFICACIÓN:**	39026532
DIRECCIÓN:	K 12A 94 84		
BARRIO:	CIUDAD MODESTO		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		


1. LOCALIZACIÓN DE LA VIVIENDA A INTERVENIR



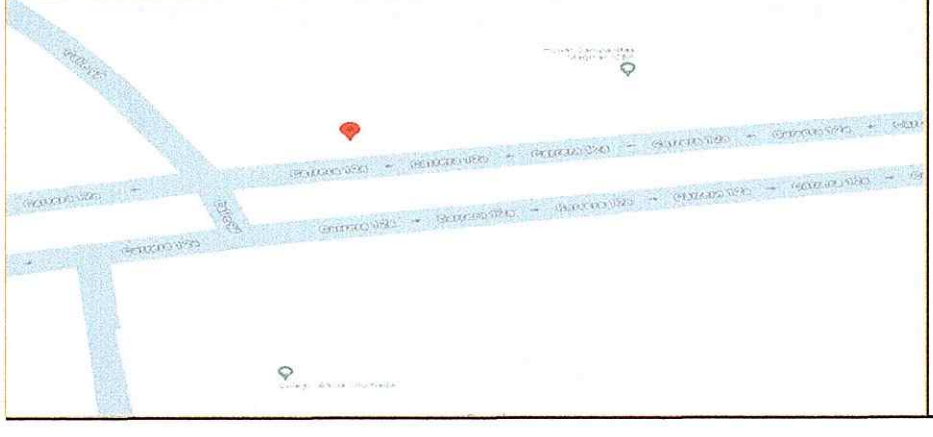

2. CORTES DE LA PROPUESTA

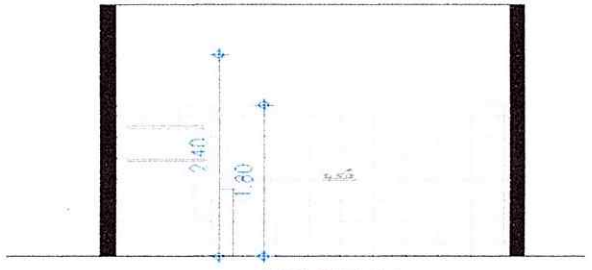

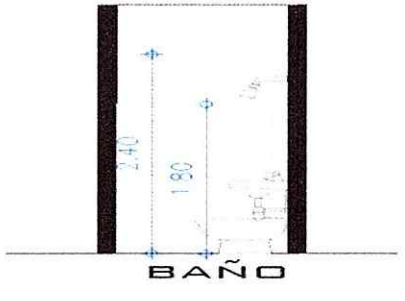

RECIBO DE VIVIENDA

CÓDIGO:	IP-FM-36
VERSION:	01
FECHA:	7/09/2021


OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL		
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES		
INTERVENTORIA:	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD		
POSTULANTE:	DELFINA MARIA LOPEZ	No. DE IDENTIFICACIÓN:	39026532
DIRECCIÓN:	K 12A 94 84	BARRIO:	CIUDAD MODESTO
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	BARRANQUILLA - ATLÁNTICO		

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA





ACTIVIDAD FINALIZADA

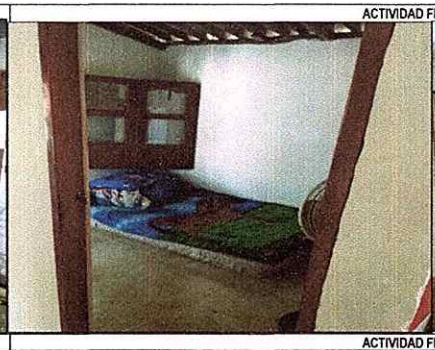





ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA





ACTIVIDAD FINALIZADA

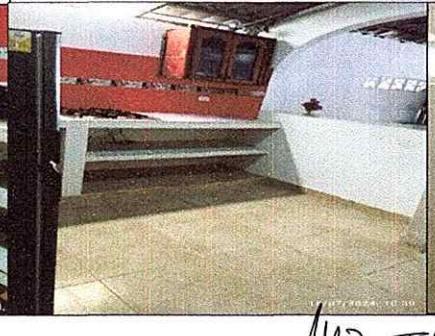

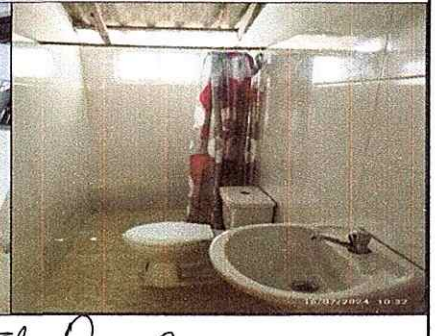

RECIBE A SATISFACCIÓN

Firma: Delfida Lopez

Nombre: Delfida Lopez

POSTULANTE

C.C. 39026532.

Firma:

Nombre: Gloony Nuñez

CONTRATISTA

Firma:

Nombre: Ma Fda. Barros C.

INTERVENTORÍA

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	SA-EDU-015-2024	PROYECTO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	Apertura ☐ Cierre ☑
6	INTERVENTORIA	CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD			04/06/24 – 28/06/24

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: DELFINA MARIA LOPEZ
Tenencia: Propietario X Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual?___
Nombre del Propietario DELFINA MARIA LOPEZ
Dirección K12A 94-84 C. Hodesto. Teléfono 3017678826
Long. del frente (mts) 6.90 mts. Matrícula inmobiliaria No.
Cédula catastral ___ No. de pisos 1

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☑	☐
2. Alcantarillado	☑	☐
3. Energía	☑	☐
4. Teléfonos	☐	☑
5. Gas	☑	☐
6, Televisión cable	☑	☐
7, Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 Cocina
2 Baño
3 Alcoba2
4
5
6
7
8

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☐	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☐	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☐ NO ☑
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Mamposteria	Rejas corriel y hierro	Fibrocemento	concreto	Mamposteria.	concreto.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	X	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Delfina Lopez Delfina Lopez 39026532

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
fachada: Muros en mampostería pañetado con acabado en pintura. Cubierta en fibro cemento y loza en concreto soportada en columna con entrepecho en bloque de cemento, piso en plantilla regular, puerta y ventanas en madera con protector en hierro Cerramiento en muro de concreto y hierro	Se realiza cierre de acta de vecindad no se presentan afectaciones por obra.
Sala: Muros en mampostería, pañetado con acabado en pintura en mal estado presenta grietas y esgarificación, piso en baldosa en regular estado, cubierta en fibrocemento.	fachada: no se observan afectaciones cocina: demolición de piso existente plantilla sobre excavación de tubería sanitaria e hidráulica, enchape ceramica para piso, enchape en ceramica sobre meson de cocina y barra, Pañete, estuco y pintura por encima de ceramica y muro interiores
Cocina: Muros en mampostería pañetado con acabado en Ceramica en regular estado, piso en baldosa, meson en regular estado, y lavaplatos en mal estado, Barra divisora en concreto con acabado en ceramica y barra pantry.	sobre cocina demonte de lavaplato y montaje del mismo, instalación de toma 6 f c i, instalaciones de toma corriente normales e interruptura
Baño: Muros en mampostería pañetado en mal estado presenta humedad, piso en plantilla en mal estado, combo sanitario griferia en mal estado, cubierta en fibrocemento	Baño: Desmonte de suministro de combo Sanitario, accesorios de ducha y rejilla de piso, demolición de plantilla de piso en ceramica, instalación de ceramica antideslizante, demolición de pañete en muro de baño, enchape en ceramica sobre muro de baño (H= 1.80 m) estuco y pintura sobre altura de ceramica
Habitación 1: Muros en mampostería, pañetado con grietas en muro, piso en ceramica en regular estado, cubierta en fibrocemento.	
Habitacion 2: Muros en mampostería, pañetado con grieta en muro piso en plantilla en regular estado, cubierta en lamina de fibrocemento.	Suministro e instalacion de puerta en madera y ventana de aluminio. Suministro e instalación de interruptor sencillo y puerta de baño.
Habitacion 3: Muros en mampostería con bloque a la vista, sin muro divisor entre habitación y hall piso en plantilla en mal estado.	habitaciones: se intervinieron todas las alcobas excluyendo alcoba 1. se realizo piso en ceramica, pintura y pañete en muros intervenidos
patio: Muro en mampostería pañetado y con bloque a la vista, piso en terreno natural.	patio: no aplica

Delfida Lopez Delfida Lopez 39026532

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit



	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO

PISOS

Antes	Después
	

TECHO

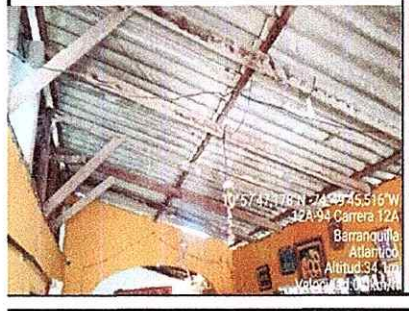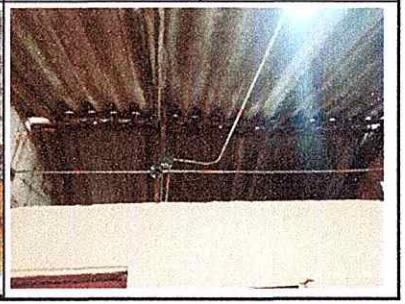Antes	Después
	

PAREDES

Antes	Después
	



COCINA

Antes	Después
	

BAÑO

Antes	Después
	

PATIO

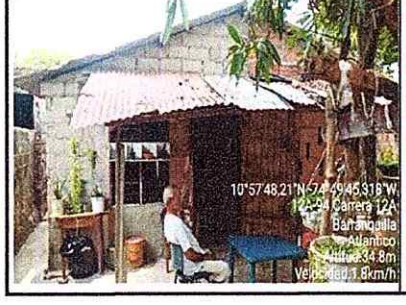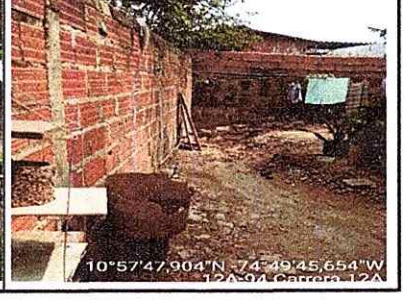Antes	Después
	

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Delfida Lopez

Firma responsable unidad social

Nombre Delfida Lopez

C.C o Nit 39026532

Representante del contratista

Nombre GEOVANY ALVAREZ CERVANTES

Representante de la interventoría

Nombre Mg Feda. Barros

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo Delfina Maria Lopez identificado (a) con la cédula de ciudadanía No 39026532 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura K 12A 94 84. de la ciudad de BARRANQUILLA, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES; Interventoria, CONSORCIO PROSPERAR HABITABILIDAD y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día 23 de Junio de 2024

Delfida Lopez

Firma responsable unidad social

Nombre Delfida Lopez

C.C o Nit 39026532

Dimf 22.194.947.

Representante del contratista

Nombre GEOVANY ALVAREZ CERVANTES

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante de la Interventoría

Nombre Mg Feda Barros

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **39.026.532**

LOPEZ De MORALES

APELLIDOS

DELFIDA MARIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-NOV-1943**

CIENAGA
(MAGDALENA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

04-SEP-1972 CIENAGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0300150-00145801-F-0039026532-20090107 0009338240A 1 3320008278

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO	EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III"

LUGAR K 12A 94 84 C. Modisto FECHA 04-06-2024 HORA INICIO Y FIN 08:00 - 08:15am.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion	X	SOCIALIZACION INDIVIDUAL DE ALCANCE DE OBRA Y COMPROMISOS CON EL BENEFICIARIO
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoria		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Socializar a los beneficiarios del proyecto de mejoramiento de vivienda, el alcance de las obras en las viviendas y los compromisos asumidos por ellos.

ORDEN DEL DÍA	1. Presentacion del equipo de trabajo.
	2. Socializacion tecnica del alcance de las intervenciones.
	3. Revision tecnica en todas las areas de la vivienda principalmente baño y cocina.
	4.Socializacion de compromisos y acuerdos sociales con el propietario.
	5.Toma de firmas de formatos.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

se realiza visita en la vivienda del beneficiario: Delfina Maria lopez .
quien recide en la direccion: K 12A 94 84 C. Modisto. , con el objetivo de socializar el alcance de la obra, su objetivo y, caracteristicas,de las intervenciones a realizar en la vivienda, teniendo encuenta el monto del presuspuesto asignado con el fin de mejorar las condiciones de habitabiliadad del beneficiario y su familia, seguido se da la presentacion de los profesionales tecnicos y sociales presente, como tercer punto se da a conocer al beneficiario tecnicamente las areas a intervenir, mediante una propuesta tecnica la cual debe ser firmada por el beneficiario, aceptando a satisfaccion el beneficio otorgado. Continuando con el orden del dia las profesionales sociales leen al propietario y sus familia cuales son los compromisos y acuerdos entre el beneficiario y el contratista, tales como el cuido de los materiales y fomento del buen trato entre otros, Una ves planteadas las actividades estas no se podran ser modificadas ya que estan sujetas a un presupuesto aprobado, por ultimo se hace entrega de volantes con la informacion y se realiza la toma de firmas por parte del beneficiario y los participantes.

Delfina

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

El desarrollo del proceso se hace mediante el esfuerzo conjunto entre la Alcaldia del Distrito de Barranquilla y la empresa de desarrollo urbano de Barranquilla EDUBAR, por lo tanto anunciamos acontinuacion, los compromisos que usted y su grupo familiar adquieren en este proceso: 1. El propietario y su familia aprueban la intervencion y la puesta en marcha del actual programa de mejoramiento de viviendaen su inmueble. 2. el propietario y su familia se comprometen a prestar su colaboracion en todo tiempo hasta la terminacion de la obra.
3. el propietario y su familia autorizan al acceso del personal para dicha intervencion y el tiempo que dure la obra. 4. El propietario y su familia se comprometen a cuidar los materiales durante el tiempo de ejecusion de la obra, asegurando un adecuado almacenamiento y manejo de los mismos. 5. Una vez recibidos los materiales, usted y su familia se comprometen a cuidar los materiales durante el tiempo de ejecusion de la obra, en caso de perdida o robo de estos mismos la familia y el beneficiario debera asumir el costo y reponerlo para dar cumplimiento a la propuesta de intervencion. 6. Por seguridad ninguna persona ajena al contratista, podra ingresar a la obra y usted no suministrara ninguna informacion a terceros sin contar con la presencia del CONTRATISTA. 7.En las intervenciones de mejoramiento de vivienda, la familia debes desocupar los espacios a intervenir y no hacer ningun tipo de modificaciones no proyectadas por los profesionales. 8. Participar activamente en las reuniones y socializaciones programadas por el contratista donde se fomenta la participacion de la ciudadania. 9.El propietario debera firmar la documentacion requerida por el contratista desde la apertura de la vivienda (acta de vecindad) hasta el cierre de esta y la firma del recibo a satisfacion del beneficiario una vez sea terminada su obra.
10. Durante la ejecusion de la obra debe permanecer en la vivienda una persona mayor de edad, que permita verificar el personal de su vivienda y el cuidado de sus pertenencias personales; no esta permitido niños o niñas solos en las viviendas ejecutadas. 11. El propietario se compromete a adoptar habitos y practicas saludables que fomenten el buen uso de las areas intervenidas.

ALCANCE TECNICO DE LA INTERVENCION

EN LA VIVIENDA SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES INTERVENCIONES:
COCINA
BAÑO
ALCOBA 2 Y 5
INSTALACIONES ELECTRICAS.

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA III" **CONTRATISTA** UNION TEMPORAL VIVIENDAS DISTRITALES

LUGAR K12A 94 84 Ciudad Modesto. **FECHA** 04 06 2024.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD JOHANA BOSS DE LA HOZ

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			Socialización individual de alcance del proyecto.
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Delfina Lopez	39026532	Ciudad Modesto	Propietaria	
2	Miguel Angel Rabio	1129486264	ciudad Modesto	Nieto	
3	Alexandra Freile	3089300	EDOBAR S/A	Social	
4	Jennifer Gonzalez	55300409	Interventoria	Social.	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Johanna Boss.

(Nombre) JOHANA BOSS DE LA HOZ
Contratista

Interventoría

ONAC ACREDITADO
ISO/IEC17020:2012
17-OIN-033

electricert sas
NIT 901057816-7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
DICTAMEN DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO RETIE

A. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO DE INSPECCIÓN

Lugar y fecha de expedición	Medellin, 2024-08-05	**Dictamen No.**	011137EL-24
Nombre Organismo de Inspección:	ELECTRICERT S.A.S	Resolución de Acreditación:	17-OIN-033
Nit. Organismo de Inspección:	901057816-7		
Dirección domicilio:	Medellin, CRA 98 N° 37B - 18 INT 201	Teléfono:	3043621312-5575085

B. IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL DICTAMEN

Localización	Municipio	BARRANQUILLA - ATLANTICO	Dirección	K 12A No. 94-84					Barrio o sector	CIUDAD MODESTO	
Tipo de Servicio	Público		Residencial	X	Comercial		Industrial			Especial-Tipo	N/A
Cap.Instalada [kVA ó kW]	1		Tensión[kV]	0.240/0.120V	Fases	1	X	3	Año de terminación		2024

C. IDENTIFICACIÓN DE PROFESIONALES COMPETENTES RESPONSABLES DE LA INSTALACIÓN

Diseñador	LESSING JUNIOR CARDENAS	Mat. Prof. No	AT 205-136953
Interventor (si lo hay)	N/A	Mat. Prof. No	N/A
Responsable construcción	WILSON RIPOLL MENDOZA	Mat. Prof. No	AT 205-91837

D. ASPECTOS EVALUADOS

ITEM	REQUISITO ESENCIAL	ASPECTO A EVALUAR	APLICA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	Diseño Eléctrico	Planos, Diagramas y Esquemas*	SI	SI	
2		Análisis de Riesgo de Origen Eléctrico*	SI	SI	
3		Especificaciones Técnicas, Memorias de Calculo*	SI	SI	
4		Matriculas Profesionales de personas calificadas	SI	SI	
5	Campos	Valores de campo electromagnéticos	NO		
6	Distancias	Distancias de seguridad	SI	SI	
7	Iluminación	Iluminación que requiere dictamen de RETILAP	NO		
8	Protecciones	Accesibilidad a todos los dispositivos de protección*	SI	SI	
9		Funcionamiento del corte automático de alimentación*	SI	SI	
10		Selección de conductores*	SI	SI	
11		Selección de dispositivos de protección contra sobrecorrientes*	SI	SI	
12		Selección de dispositivos de protección contra sobretensiones	NO		
13	Protección contra rayos	Evaluación nivel de riesgo*	SI	SI	
14		Implementación de la protección	SI	SI	
15	Sistema de puesta a tierra	Continuidad de los conductores de tierra y conexiones equipotenciales*	SI	SI	
16		Corrientes en el sistema de puesta a tierra*	NO		
17		Resistencia de puesta a tierra*	SI	SI	
18	Señalización	Identificación de Tableros y Circuitos*	SI	SI	
19		Identificación de canalizaciones*	SI	SI	
20		Identificación de conductores de fases, neutro y tierra*	SI	SI	
21		Diagramas, Esquemas, Avisos y Señales	SI	SI	
22	Documentación final	Memoria del Proyecto	SI	SI	
23		Plano(s) de lo construido	SI	SI	
24		Certificaciones de productos*	SI	SI	
25	Otros	Bomba contra incendios	NO		
26		Compatibilidad térmica de equipos y materiales	SI	SI	
27		Ejecución de las conexiones*	SI	SI	
28		Ensayos funcionales*	SI	SI	
29		Materiales acordes con las condiciones ambientales*	SI	SI	
30		Protección contra arcos internos	SI	SI	
31		Protección contra electrocución por contacto directo*	SI	SI	
32		Protección contra electrocución por contacto indirecto*	SI	SI	
33		Resistencia de aislamiento*	SI	SI	
34		Sistemas de emergencia	NO		
35		Sujeción mecánica de elementos de la instalación	SI	SI	
36		Ventilación de equipos	NO		

Nota: * Items a verificar en instalaciones de vivienda y pequeños comercios

E. OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES

SOLICITUD DE SERVICIO N°: 002194 **NOMBRE DEL PROPIETARIO:** DELFINA MARIA LOPEZ **C.C/Nit:** C.C. 39.026.532

ALCANCE: ESTA INSPECCION COMPRENDIO LA REVISIÓN DE UNA CASA, DESDE TABLERO DE DISTRIBUCION CON LAS PROTECCIONES PRINCIPALES PARA LOS CIRCUITOS RAMALES QUE VAN POR TUBERIA EXPUESTA (EMT) HASTA LAS SALIDAS ELECTRICAS DE ILUMINACION Y FUERZA.

Medición de resistencia de puesta a tierra (Ω): 2.08
Menor valor medición de aislamiento (MΩ): 206
Medición de corrientes en el sistema de puesta a tierra (mA): N/A
Menor valor medición de iluminación (Lx): N/A
Medición de campo electromagnetico (μT ó kV/m): N/A
Versión del RETIE que le aplica a la instalación: Resolución 9 0708 de agosto 30 de 2013
El dictamen corresponde a una construcción, RETIF 34.3.H: CONSTRUCIÓN
Este dictamen es para la obra en mención, con los diseños, materiales, aparatos y conexiones tal como se encontraron el día de la inspección: FECHAS DE INSPECCIÓN
2024-07-06
Las modificaciones realizadas posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario de la instalación y debe ejecutarse de acuerdo al RETIE.
ESTE DICTAMEN REEMPLAZA LA HOJA No. 012310 LA FECHA DE EXPEDICION INICIAL FUE 2024-07-10

F. RELACIÓN DE ANEXOS

G. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

RESULTADO: **Aprobada** X **No aprobada**

Nombredirector técnico de Organismo de Inspección	KARINA GUERRA SANCHEZ	Mat. Prof.	AT205-59731	Firma y sello	KARINA ISABEL GUERRA SANCHEZ Firmado digitalmente por KARINA ISABEL GUERRA SANCHEZ Fecha: 2024.08.05 11:21:51 -05'00'
Nombre y Apellidos del Inspector:	WILLI BORJA MOSQUERA	Mat. Prof.	AN205-128601	Firma	WILLI BORJA MOSQUERA Firmado digitalmente por WILLI BORJA MOSQUERA Fecha: 2024.08.05 11:21:38 -05'00'

012544
