CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032

CE-CU23-065
Al responder cite este consecutivo

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2024

Alcaldía Local de Usme
R No.
2024-551-014289-2
2024-09-11 08:21 - Folios 1 Anexos 40
Destino Área de Gestion de Desarr
RemD CONSORCIO ACUEDUCTO USME
20245510142892

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
Atte. Arquitecto Edwin Andrés López Amaya
Supervisor del Contrato 699-2023-CMA (99056)
edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO No. 699-2023-CMA (99056) cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.7

Respetados señores:

En atención al asunto, el **CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032**, se permite hacer entrega del informe mensual de interventoría No.7 de interventoría con todos sus anexos para su aprobación.

Agradecemos su atención, sin otro en particular.

Cordialmente,

Ing. Miguel Eduardo Joven Grafe
Representante Legal
Consorcio ACUEDUCTO USME 032

Powered by CamScanner

CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032

CE-CU23-065
Al responder cite este consecutivo

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2024

Señores
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
Atte. Arquitecto Edwin Andrés López Amaya
Supervisor del Contrato 699-2023-CMA (99056)
edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co

REFERENCIA: CONTRATO No. 699-2023-CMA (99056) cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME.

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.7

Respetados señores:

En atención al asunto, el **CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032**, se permite hacer entrega del informe mensual de interventoría No.7 de interventoría con todos sus anexos para su aprobación.

Agradecemos su atención, sin otro en particular.

Cordialmente,

Ing. Miguel Eduardo Joven Grafe
Representante Legal
Consorcio ACUEDUCTO USME 032

INFORME DE INTERVENTORÍA No.7
CONTRATO No. 699-2023-CMA (99056)

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA E REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME"

CONTRATISTA
CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032

1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN


TÍTULO DOCUMENTO		INFORME DE INTERVENTORÍA No.03	
APROBADO	RESPONSABLE POR REVISIÓN.	NOMBRE	MIGUEL EDUARDO JOVEN
		CARGO	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
		FIRMA	
		FECHA ACTUAL DE ENTREGA	
	RESPONSABLE POR APROBACIÓN	NOMBRE	EDWIN ANDRÉS LÓPEZ AMAYA
		CARGO	APOYO A LA SUPERVISIÓN
		FIRMA	

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 7
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 8
2.1. ANTECEDENTES 8
2.2. LOCALIZACIÓN 8
2.3. ALCANCE DEL CONTRATO 10
3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 10
3.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA 11
3.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA 12
3.2.1. Forma de pago 12
3.2.2. Imputación presupuestal 12
3.3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA 13
3.4. ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO OBRA 16
3.4.1. PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA 16
3.5. CONTROL DE EQUIPO 16
3.6. COMITÉ DE OBRA 17
3.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA 17
3.7.1. Informe mensual de Gestión Social 17
3.7.2. Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 18
3.7.3. Actividades de obra. 18
3.7.3.1. Transporte de materiales 18
3.7.3.2. Replanteo y señalización 19
3.7.3.3. Excavación 19
3.7.3.4. Instalación de cama de arena 20
3.7.3.5. Suministro e instalación de tubería. 20
3.7.3.6. Relleno con recebo compactado y con material del sitio seleccionado 21
3.8. CONTROL DE EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN 23
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24
4.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 24
4.1.1. RELACIÓN DE PÓLIZA 25
4.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 25
4.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 26
4.3.1. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 26
4.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA 26

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA: 26
4.4.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA: 27
4.4.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:....27
4.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA 28
4.5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO REPORTADO....28
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....28
6. ANEXOS 29

TABLAS

Tabla 1. Información general del contrato....10
Tabla 2. Documentos legales del contrato de obra....11
Tabla 3. Relación de Pólizas del contrato de Obra....11
Tabla 4. Información financiera del contrato....12
Tabla 5. Disponibilidad presupuestal....12
Tabla 6. Avance general de la facturación....13
Tabla 7. Avance de facturación Acueducto Aguas Claras Olarte....13
Tabla 8. Avance de facturación Acueducto Asopicos Andes....13
Tabla 9. Avance de facturación Acueducto Asogualinda Chiguaza....14
Tabla 10. Resumen de facturación....14
Tabla 11. Resumen de facturación....15
Tabla 12. Control del personal....16
Tabla 13. Equipo empleado en el periodo....16
Tabla 14. Actas de comité de obra....17
Tabla 15. Registro Fotográfico Transporte de materiales....18
Tabla 16. Registro Fotográfico Señalización....19
Tabla 17. Registro Fotográfico Excavación....19
Tabla 18. Registro Fotográfico Arena de peña....20
Tabla 19. Registro Fotográfico Instalación de tubería....20
Tabla 20. Registro Fotográfico Relleno con recebo común y con material del sitio....21
Tabla 21. Avance físico del contrato....23
Tabla 22. Información del contrato de Interventoría....24
Tabla 23. Información del contrato de Interventoría....25
Tabla 24. Relación de Pólizas del contrato de Obra....25
Tabla 25. Información financiera del contrato de interventoría....25
Tabla 26. Personal dispuesto por parte de la Interventoría....26
Tabla 27. Control de personal de interventoría....26
Tabla 28. Correspondencia enviada por la interventoría....28
Tabla 29. Correspondencia recibida....28

ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización de la localidad de Usme 9
Ilustración 2. localización del proyecto 9
Ilustración 3. Punto de acopio de materiales 18
Ilustración 4. Transporte de materiales pétreos 18
Ilustración 5. Señalización 19
Ilustración 6. Señalización 19
Ilustración 7. Excavación de zanja de 1 m de y 0.7m profundidad 19
Ilustración 8. Excavación de zanja 19
Ilustración 9. Instalación cama de 0.10m de arena de peña 20
Ilustración 10. Cama de arena de peña 20
Ilustración 11. Suministro de tubería de 2" de polietileno de alta densidad PN16 20
Ilustración 12. Instalación de tubería de 1 ½" de polietileno de alta densidad PN 16. 20
Ilustración 13. Instalación de relleno de 0.5m en recebo común 21
Ilustración 14. Compactación del recebo común 21

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe corresponde a las actividades ejecutadas por la Interventoría en el cumplimiento del contrato No. 699-2023-CMA (99056) cuyo objeto es: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA E REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME*". Desde el 1 al 29 de febrero 2024, realizando el seguimiento al contrato de obra No. 676- 2023-LP (96548) objeto es *"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME".*

El informe incluye la información el seguimiento técnico, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, de igual manera se anexan los documentos soporte de lo actuado en cumplimiento de los compromisos contractuales de la interventoría.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta información presentada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME en el Anexo técnico 1 de las condiciones y términos de referencia, se conoce que La Localidad de Usme cuenta con infraestructura que permite el abastecimiento de agua potable contando con 10 acueductos veredales a saber así: Asocristalina Curubital, Aguas claras Olarte, El Destino, Corinto Cerro redondo, Aguas Doradas, Acuamarg, Soches, Asopicos Boca grande, Aguas lindas Chiguaza y Arrayanes Argentina, los cuales se encuentran operando hace más de 15 años, lapso de tiempo en que la cobertura en el área rural se ha incrementado en cantidad de usuarios, generando una demanda del recurso mayor, así mismo la falta de mantenimiento de las estructuras existentes, como el deterioro de las redes por temporadas invernales en los últimos años.

Bajo este contexto, los objetivos principales están dirigidos a atender las necesidades sentidas de la comunidad transmitidas a la Alcaldía Local de Usme en los encuentros ciudadanos en cumplimiento del Plan de Desarrollo Local de Usme, denominado: "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI " adoptado mediante Acuerdo local No. 002 del 04 de octubre de 2020, a fin de mejorar y optimizar el sistema de acueducto incluyendo la realización de estudios y diseños, obras nuevas, mantenimiento, optimización y demás intervenciones requeridas de la infraestructura existente, que para la vigencia 2023, se establece la ejecución de los acueductos ASOAGUALINA CHIGUAZA, AGUAS CLARAS OLARTE y ASOPICOS ANDES.

Por esta razón, el presente contrato comprende la interventoría a la intervención de los 3 acueductos veredales, cuyas obras a ejecutar serán establecidas teniendo en cuenta los diagnósticos, presupuesto y programación realizados por el contratista de obra.

2.2. LOCALIZACIÓN

La localidad de Usme se encuentra situada en el suroriente de Bogotá, limita al norte con las localidades San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (18) y Tunjuelito (6); al oriente con los municipios de Chipaque y Une; al sur con la localidad de Sumapaz (20); y al occidente con la localidad Ciudad Bolívar (19), con el Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha.



Ilustración 1. Localización de la localidad de Usme

El contrato será ejecutado en la Localidad de Usme, en la Vereda Olarte, Vereda Chiguaza, Veredas Andes y Unión y como se ilustra a continuación:

- ACUEDUCTO ASOAGUALINDA CHIGUAZA – Vereda Chiguaza
- AGUAS CLARAS OLARTE – Vereda Olarte
- ASOPICOS ANDES – Veredas Andes y Unión

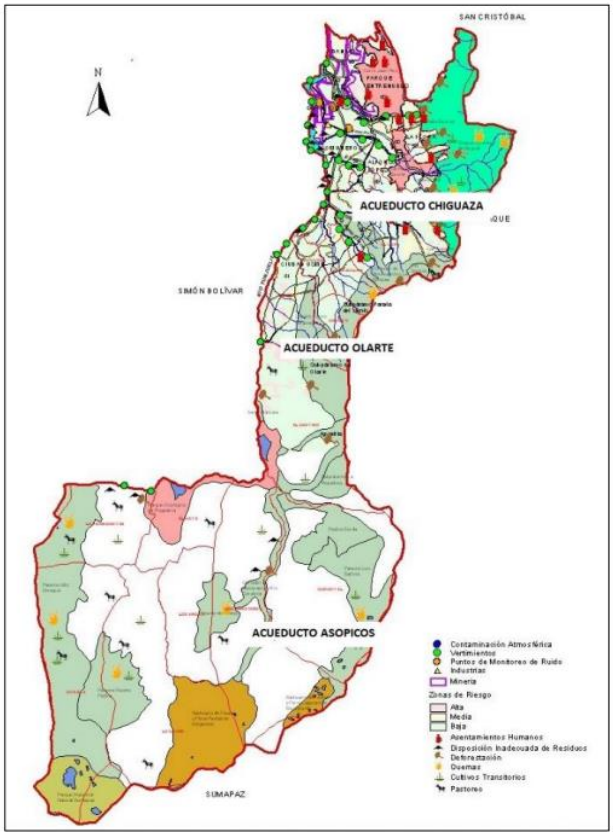


Ilustración 2. localización del proyecto

Fuente Anexo Técnico FDLU

2.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El contrato consiste en la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST al contrato de obra para la conservación y obras requeridas para la optimización y mejoramiento de los tres acueductos veredales de la localidad de Usme, en donde el contratista de obra realizará la identificación de las necesidades y elaborará un diagnóstico por cada acueducto para que junto con la matriz de necesidades establecido en el anexo técnico del contrato de obra se determinen las actividades a ejecutar.

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Se realiza la verificación de la información general del contrato de obra adjudicado por el Fondo de Desarrollo Local de Usme, a través de la invitación publica FDLU-LP-018-2023 (96548) y el contrato de obra No. 676-2023-LP (96548), el cual tiene por objeto: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME". A continuación, se presenta la información más relevante del contrato.

Tabla 1. Información general del contrato

TIPO DE CONTRATO	OBRA
No. CONTRATO	676-2023-LP (96548)
OBJETO	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS A MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME
CONTRATANTE	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME NIT:899999061-9 R.L. DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE C.C. . 7.143.271 DE SANTA MARTA DIRECCIÓN: CL. 137 SUR #3A-44, BOGOTÁ
CONTRATISTA	CONSORCIO USME 2023 NIT: 901784770-5 R.L. OSMAR FABIAN PINZON ACOSTA C.C. . 80.545.787 DE ZIPAQUIRÁ DIRECCIÓN: CRA 16 # 80 – 11 BOGOTÁ D.C TEL: 3106807496 – 3218027069 – 3002955104
INTERVENTORIA	CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032

	NIT: 901785936-5 R.L. MIGUEL JOVEN GRAFE C.C. 77.134.442 DE PITAL DIRECCIÓN: CR 7 16A 29 NEIVA – HUILA TEL. 311 8353226 - 313 3768996
VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($913.500.000.oo)
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES
FECHA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	ARQ. EDWIN ANDRES LOPEZ AMAYA

3.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se relacionan los documentos de carácter legal que el contrato desde su inicio ha presentado.

Tabla 2. Documentos legales del contrato de obra

No.	DOCUMENTO	FECHA DE FIRMA
1	Contrato de obra No. 676-2023-LP (96548)	29/12/2023
2	Acta de inicio	29/01/2024
3	Prorroga en tiempo (1 mes) desde el 29 de agosto hasta el 28 de septiembre de 2024	28/08/2024

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato las cuales se encuentran actualizadas con el acta de inicio suscrita el día 29 de enero de 2024, aprobadas el 26 de febrero de 2024.

Tabla 3. Relación de Pólizas del contrato de Obra

PÓLIZA DE SEGURO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. B-100044241 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	$ 274.050.000	29/01/2024	28/03/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 91.350.000	29/01/2024	29/09/2027
	ESTABILIDAD DE OBRA	$ 274.050.000	29/08/2024	29/09/2029
RCE No. B-100011653 ANEXO 2	PREDIOS LABORALES Y OPERACIONES	$ 232.000.000	29/01/2024	28/09/2024
	PATRONAL	$69.000.000	29/01/2024	28/09/2024
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	$69.000.000	29/01/2024	28/09/2024

	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$69.000.000	29/01/2024	28/09/2024
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			

3.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA

3.2.1. Forma de pago

La forma de pago por parte del Fondo de Desarrollo Local de Usme, según términos y condiciones, se especifica en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

Tabla 4. Información financiera del contrato

DESCRIPCIÓN DE VALORES	TOTAL
COSTO DIRECTO	$ 699.624.722,37
ADMINISTRACIÓN	$ 181.902.427,82
IMPREVISTO	$ 6.996.247,22
UTILIDAD	$ 20.988.741,67
IVA	$ 3.987.860,92
VALOR TOTAL	$ 913.500.000,00

3.2.2. Imputación presupuestal

El Contrato de Obra 676-2023-LP (96548) se encuentra registrado con el Certificado de Registro Presupuestal No.1401 del 20 de octubre de 2023:

Tabla 5. Disponibilidad presupuestal

NÚMERO CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTA	FECHA CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VALOR CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
1401	20 de octubre 2023	$913.500.000

3.2.3. Anticipo

Para el presente contrato, el Fondo de Desarrollo Local de Usme no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

3.3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATISTA

A continuación, se relaciona la facturación a la fecha:

Tabla 6. Avance general de la facturación

FACTURA NO	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURADO	VALOR RETENCIONES	VALOR DESEMBOLSO
FACTURA NO 1	01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	$ 74.311.240	$ 6.138.108,42	$ 68.173.132
FACTURA NO 2	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	$ 258.637.908	$ 21.363.491,20	$ 237.274.417
FACTURA NO 3	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO	$ 222.537.330	$ 18.381.583,46	$ 204.155.747
FACTURA NO 4	01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO	$ 265.430.900	$ 21.924.592,34	$ 243.506.308
TOTALES		$ 820.917.378	$ 67.807.775,42	$ 753.109.603

Tabla 7. Avance de facturación Acueducto Aguas Claras Olarte

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 45.414.133	4,97%	$ 3.751.207	$ 41.662.926
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 239.975.238	26,27%	$ 19.821.955	$ 220.153.283
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 85.889.243	9,40%	$ 7.094.451	$ 78.794.792
TOTAL ACUEDUCTO AGUAS CLARAS			**$ 371.278.614**	**40,64%**	**$ 30.667.614**	**$ 340.611.001**

Tabla 8. Avance de facturación Acueducto Asopicos Andes

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 11.536.203	1,26%	$ 952.890	$ 10.583.313
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 10.479.807	1,15%	$ 865.632	$ 9.614.175
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 222.537.330	24,36%	$ 18.381.583	$ 204.155.746
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 2.951.754	0,32%	$ 243.815	$ 2.707.939
TOTAL ACUEDUCTO ASOPICOS			**$ 247.505.094**	**27,09%**	**$ 20.443.921**	**$ 227.061.173**

Tabla 9. Avance de facturación Acueducto Asogualinda Chiguaza

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 17.360.903	1,90%	$ 1.434.011	$ 15.926.892
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 8.182.863	0,90%	$ 675.904	$ 7.506.959
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 176.589.904	19,33%	$ 14.586.326	$ 162.003.578
TOTAL ACUEDUCTO ASOGUALINDA			**$ 202.133.670**	**22,13%**	**$ 16.696.241**	**$ 185.437.429**

Tabla 10. Resumen de facturación

ITEM	PERIODO	ACUEDUCTO	VALOR EJECUTADO
1	01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO	ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	$ 45.414.134
		ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 11.536.203
		ACUEDUCTO ASOAGULINDA CHIGUAZA	$ 17.360.903
VALOR EJECUTADO MES 1 Y 2			$ 74.311.240
2	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL	ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	$ 239.975.238
		ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 10.479.807
		ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	$ 8.182.863
VALOR EJECUTADO MES 3			$ 258.637.908
4	01 DE MYO AL 31 DE MAYO	ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 222.537.330
VALOR EJECUTADO MES 4			$ 222.537.330
5	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO	ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 2.553.962
VALOR EJECUTADO MES 5			$ 2.553.962
6	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO	ACUEDUCTOR AGUAS CLARAS OLARTE	$ 85.889.243
		ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	$ 176.589.904
		ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	$ 397.792
VALOR EJECUTADO MES 5			$ 262.876.939
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			**$ 820.917.378**

Tabla 11. Resumen de facturación

# ACTA	DESCRIPCIÓN	PERIODO	VALOR FACTURADO	% PAGADO TOTAL	VALOR DE RETENCIONES	VALOR NETO A PAGAR
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 45.414.133	4,97%	$ 3.751.207	$ 41.662.926
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 239.975.238	26,27%	$ 19.821.955	$ 220.153.283
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO AGUAS CLARAS OLARTE	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 85.889.243	9,40%	$ 7.094.451	$ 78.794.792
TOTAL ACUEDUCTO AGUAS CLARAS			**$ 371.278.614**	**40,64%**	**$ 30.667.614**	**$ 340.611.001**
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 11.536.203	1,26%	$ 952.890	$ 10.583.313
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 10.479.807	1,15%	$ 865.632	$ 9.614.175
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 222.537.330	24,36%	$ 18.381.583	$ 204.155.746
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOPICOS ANDES	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 2.951.754	0,32%	$ 243.815	$ 2.707.939
TOTAL ACUEDUCTO ASOPICOS			**$ 247.505.094**	**27,09%**	**$ 20.443.921**	**$ 227.061.173**
1	ACTA PARCIAL No.1 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 20 DE FEBRERO DE 2024	$ 17.360.903	1,90%	$ 1.434.011	$ 15.926.892
2	ACTA PARCIAL No.2 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	$ 8.182.863	0,90%	$ 675.904	$ 7.506.959
3	ACTA PARCIAL No.3 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 AL 31 DE MAYO DE 2024	$ 0	0,00%	$ 0	$ 0
4	ACTA PARCIAL No.4 ACUEDUCTO ASOGUALINDA CHIGUAZA	DE 1 JUNIO A 31 DE JULIO DE 2024	$ 176.589.904	19,33%	$ 14.586.326	$ 162.003.578
TOTAL ACUEDUCTO ASOGUALINDA			**$ 202.133.670**	**22,13%**	**$ 16.696.241**	**$ 185.437.429**
TOTAL PROYECTO			**$ 820.917.378**	**90%**	**$ 67.807.775**	**$ 753.109.602**

3.4. ASPECTOS TÉCNICOS CONTRATO OBRA

3.4.1. PERSONAL APROBADO DEL CONTRATISTA

En la tabla 12, se relaciona el listado de personal (mínimo requerido administrativo) para la ejecución del contrato de acuerdo con los pliegos del contrato de obra.

Tabla 12. Control del personal

CARGO	NOMBRE	CEDULA	DEDICACIÓN	FECHA DE INGRESO
DIRECTOR DE OBRA	ANDRÉS MORENO POSADA	80827088	20%	29/01/2024
RESIDENTE DE OBRA	YEISON EDUARDO BENITEZ IBAGUE	1018461423	100%	17/04/2024
RESIDENTE SST	ANGIE LORENA ESPINEL GARNICA	1057598604	20%	29/01/2024
RESIDENTE AMBIENTAL	ANGIE LORENA ESPINEL GARNICA	1057598604	20%	29/01/2024
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	OMAR FÉLIX ALMEIDA ROSERO	11225826	30%	29/01/2024
RESIDENTE SOCIAL	MARIA CAMILA CAMARGO FIGUEREDO	1018489013	20%	26/04/2024
INSPECTORA DE OBRA	MARÍA ALEJANDRA MÉNDEZ GARCÍA	1007806778	50%	29/01/2024
TOPÓGRAFO	MIGUEL ANGEL RAMIREZ FARFAN	79889006	20%	29/01/2024

3.5. CONTROL DE EQUIPO

En la siguiente tabla se relaciona la maquinaria y vehículos utilizados en el periodo.

Tabla 13. Equipo empleado en el periodo

MAQUINARIA O EQUIPO	CANTIDAD	CARACTERÍSTICAS
CAMIONETA CAMPERO	1	PLACA GLL932 MARCA: MAZDA MODELO: 2020
VOLQUETA SENCILLA	1	PLACA FUD182 MARCA: CHEVROLET MODELO: 1985
FURGÓN	1	PLACA: LPL148 MARCA: JMC MODELO: 2023

PORTATIL	1	MARCA: LENOVO CORE I5 GEN RAM 8GB-SSD

3.6. COMITÉ DE OBRA

En el transcurso del presente mes se llevó a cabo una reunión con la presencia de la supervisión y contratista, en los cuales se trataron aspectos técnicos, administrativos, ambientales y sociales pertinentes al contrato, dichas reuniones se llevaron a cabo vía virtual y presencial. Anexo 5.

Tabla 14. Actas de comité de obra

FECHA	CONSECUTIVO	TEMAS BÁSICOS TRATADOS
30/08/2024	Reunión	- Se realiza reunión con contratista y supervisión para tratar temas relacionados con el avance de obra y la adición del contrato.

3.7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

3.7.1. Informe mensual de Gestión Social

Teniendo en cuenta el Plan de Gestión Social aprobado por parte de la interventoría, elaborado de acuerdo con los lineamientos establecidos en el “Apéndice H Diálogo Ciudadano FDLU-LP-018- 2023” y “Anexo 1- Anexo Técnico FDLU-LP-018-2023”, el cual busca garantizar la participación activa para la apropiación ciudadana y la sostenibilidad social de la obra y establecer medidas de manejo para prevenir, mitigar y/o compensar los impactos negativos y potenciar los positivos de la obra; el CONSORCIO USME 2023 realiza las actividades programadas para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2024 para la ejecución del contrato No.676- 2023-LP (96548) en el cual se ejecutaron actividades enfocadas en potencializar la comunicación con los líderes de las veredas Aguas Claras Olarte, Asopicos Andes y Chiguaza, entre ellas, reuniones, socializaciones de los trabajos constructivos que se van a realizar a medida que avance la obra, recorridos rurales entre los profesionales del Consorcio, los lideres de las veredas y la comunidad interesada en conocer más acerca del proyecto e iniciar con el registro fotográfico de las zonas posibles a intervenir, que durante este mes correspondieron al predio el Arrayan y predio el Durazno. Así mismo, crear y ejecutar estrategias de sostenibilidad, corresponsabilidad y control social al desarrollo del proyecto.

3.7.2. Informe mensual de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST, fue radicado y aprobado mediante radicado CE-CU23-018, por parte de la interventoría, el cual declara su compromiso de cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (SST), mejoramiento continuo y desarrollo de las actividades de prevención, y promoción de la salud, que permitan proteger la salud de todos los trabajadores directos, e indirectos, evaluando, valorando y controlando los riesgos existentes en la empresa, destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del plan de SST, actuando con la convicción de preservar los recursos naturales y propender por la conservación del medio ambiente.

3.7.3. Actividades de obra.

Se realizan actividades en el acueducto Aguas Claras Olarte, en el tramo de Los Gómez, así mismo se realizó la intervención en la ptap del sistema de acueducto Asopicos Andes, las evidencias de las actividades ejecutadas se muestran a continuación:

3.7.3.1. Transporte de materiales

Se realizó transporte de materiales a sitio, materiales necesarios para la señalización, como materiales pétreos (arena, recebo) y la tubería, así mismo se tuvo que realizar por diferentes medios tractor, carretilla y transporte mular el transporte de los materiales desde el punto de acceso vehicular hasta el frente de obra para poder realizar las actividades correspondientes.

Tabla 15. Registro Fotográfico Transporte de materiales

	
Ilustración 3. Punto de acopio de materiales	*Ilustración 4. Transporte de materiales pétreos*

3.7.3.2. Replanteo y señalización

Se realizó instalación de campamento y señalización para dar seguridad a la excavación a realizar.

Tabla 16. Registro Fotográfico Señalización

	
Ilustración 5. Señalización	*Ilustración 6. Señalización*

3.7.3.3. Excavación

Se realiza excavación de 200 metros en el centro poblado Gómez de acuerdo con diseño aprobado, el cual consta de un ancho de 0,7 m y una profundidad promedio de 1,15 m.

Tabla 17. Registro Fotográfico Excavación

	
Ilustración 7. Excavación de zanja de 1 m de y 0.7m profundidad	*Ilustración 8. Excavación de zanja*

3.7.3.4. Instalación de cama de arena

Se realiza instalación de arena de peña para realizar la cama de protección de la tubería. Esta cama tiene un ancho de 0,7m y un espesor de cama de 10cm, la actividad se realizó en los 200 metros.

Tabla 18. Registro Fotográfico Arena de peña

	
Ilustración 9. Instalación cama de 0.10m de arena de peña	*Ilustración 10. Cama de arena de peña*

3.7.3.5. Suministro e instalación de tubería.

Se realiza suministro e instalación de 200 metros de tubería PEAD PN 16 de 2" en el predio de los Gómez.

Tabla 19. Registro Fotográfico Instalación de tubería

	
Ilustración 11. Suministro de tubería de 2" de polietileno de alta densidad PN16	*Ilustración 12. Instalación de tubería de 2" de polietileno de alta densidad PN 16.*

3.7.3.6. Relleno con recebo compactado y con material del sitio seleccionado

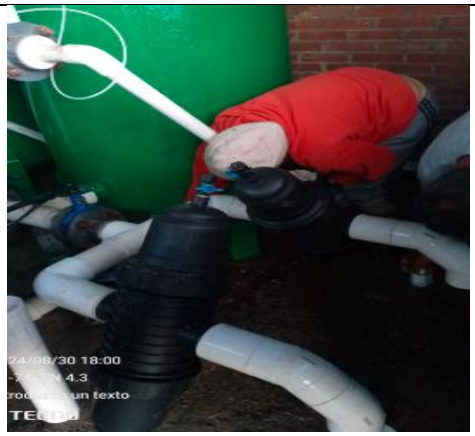
Se realiza relleno con recebo 50 cm encima de cota clave de la tubería para protección de esta, y el material restante fue instalado el material procedente de la excavación de acuerdo con los diagnósticos aprobados.

Tabla 20. Registro Fotográfico Relleno con recebo común y con material del sitio

	
Ilustración 13. Instalación de relleno de 0.5m en recebo común	*Ilustración 14. Compactación del recebo común*

3.7.3.7. Suministro e instalación de filtro de anillos en la Ptap del sistema de acueducto Asopicos Andes.

Se realiza el suministro e instalación de 2 anillos de cierre en la ptap del sistema de acueducto Asopicos Andes.

	
Ilustración 15. Suminitro e instalación de anillos en ptap del sistema de aceuducto Asopicos Andes.	*Ilustración 16. Suminitro e instalación de anillos en ptap del sistema de aceuducto Asopicos Andes.*

3.7.3.8. Mantenimiento de estructura de tanques de filtrado.

Se realiza mantenimiento de los tanques de filtrado de la ptap del sistema de acueducto Asopicos Andes..



Ilustración 17. Estructuras tanques de filtrado antes.



Ilustración 18. Estructura tanques de filtrado luego del mantenimiento.

3.7.3.9. Suministro e instalación de válvula de cierre de 3".

Se realiza suministro e instalación de válvulas de cierre de 3"



Ilustración 19. Válvulas de cierre de 3" antes.



Ilustración 20. Válvula de cierre de 3" instaladas..


Así mismo se realizan instalación de manómetros, tee, codo y demás accesorios en la Ptap del sistema de acueducto de Asopicos Andes.

3.8. CONTROL DE EJECUCIÓN DE PROGRAMACIÓN

A continuación, se relaciona el avance ejecutado del contrato:

Tabla 21. Avance físico del contrato

PERIODO	MES	AVANCE FISICO EJECUTADO	AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO	AVANCE FISICO PROGRAMADO ACUMULADO	AVANCE TIEMPO
0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01-02-2024 A 29-02-2024	1	8,13%	8,13%	0,00%	0,00%	14,29%
01-03-2024 A 31-03-2024	2	0,00%	8,13%	0,00%	0,00%	28,57%
01-04-2024 A 30-04-2024	3	28,31%	36,45%	16,67%	16,67%	42,86%
01-05-2024 A 31-05-2024	4	24,36%	60,81%	16,67%	33,33%	57,14%
01-06-2024 A 30-06-2024	5	0,28%	61,09%	16,67%	50,00%	71,43%
01-07-2024 A 31-07-2024	6	28,78%	89,87%	16,67%	66,67%	85,71%
01-08-2024 A 31-08-2024	7	7,57%	97,43%	16,67%	83,33%	87,50%

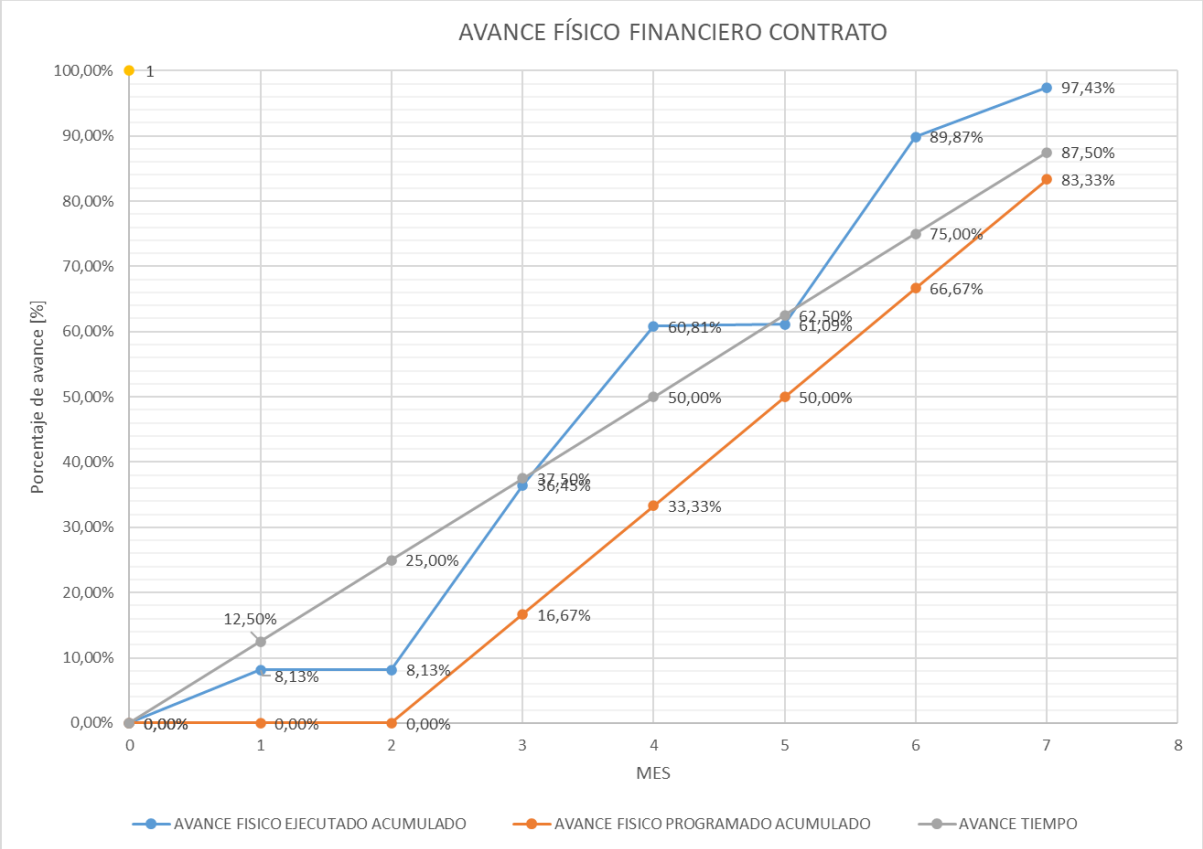

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 22. Información del contrato de Interventoría

TIPO DE PROCESO	Concurso de Méritos Abierto No. FDLU-CMA-032-2023 (99556)
TIPO DE CONTRATO	Interventoría
LOCALIDAD EJECUCIÓN	Usme
No. CONTRATO	699-2023-CMA (99056)
OBJETO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, social, ambiental y SST al contrato de obra pública cuyo objeto es: realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y hasta monto agotable, la conservación y las obras requeridas para la optimización y mejoramiento de los acueductos veredales en la localidad de Usme
VALOR DEL CONTRATO	Ciento Un Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente ($101.500.000.oo)
PORCENTAJE ANTICIPO	N/A
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTO USME 032
NIT DEL CONTRATISTA	901785936-5
DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA	CR 7 # 16 A – 29, Neiva
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Miguel Eduardo Joven Grafe
FECHA SUSCRIPCIÓN	29 de diciembre de 2023
PLAZO EJECUCIÓN	8 meses
FECHA INICIO	29 de enero de 2024
FECHA TERMINACIÓN	28 de septiembre de 2024

4.1. ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A continuación, se relacionan los documentos de carácter legal que el contrato desde su inicio ha presentado.

Tabla 23. Información del contrato de Interventoría

No.	DOCUMENTO	FECHA DE FIRMA
1	Contrato de obra No. 699-2023-CMA (99056)	29/12/2023
2	Acta de inicio	29/01/2024
3	Prorroga de un mes	28/08/2024

4.1.1. RELACIÓN DE PÓLIZA

El contrato de interventoría No. 699-2023-CMA (99056) cuenta con la póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal No. 100036010 y la de responsabilidad civil No. 100005976, expedida por la compañía aseguradora SEGUROS MUNDIAL tu compañía de seguros.

Tabla 24. Relación de Pólizas del contrato de Obra

PÓLIZA DE SEGURO	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO No. 96-44-101187700 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO	$ 10.150.000	29/01/2024	28/03/2025
	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 5.075.000	29/01/2024	28/09/2027
	CALIDAD DEL SERVICIO	$ 30.450.000	29/08/2024	29/08/2029
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.			

4.2. ASPECTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 25. Información financiera del contrato de interventoría

BALANCE FINANCIERO VALOR INICIAL CONTRATO						
VALOR DEL CONTRATO	$ 101.500.000					
95% CONTRA OBRA	$ 96.425.000					
5% CONTRA LIQUIDACION	$ 5.075.000					
	MES 1	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**
% AVANCE DE OBRA	8,13%	0,00%	28,31%	24,36%	0,00%	29,06%
VALOR EJECUTADO ANTES DE IVA	$ 6.938.491	$ 0	$ 24.149.198	$ 20.778.462	0,00%	$ 24.783.464
IVA	$ 1.318.313	$ 0	$ 4.588.348	$ 3.947.908	0,00%	$ 4.708.858
VALOR TOTAL	$ 8.256.804	$ 0	$ 28.737.546	$ 24.726.370	0,00%	$ 29.492.322
VALOR RETENCIONES	$ 708.836	$ 0	$ 2.467.082	$ 2.122.728	0,00%	$ 2.531.879
VALOR NETO A PAGAR	$ 7.547.968	$ 0	$ 26.270.464	$ 22.603.642	0,00%	$ 26.960.443
TOTAL EJECUTADO DURANTE EL PERIODO					**$ 29.492.322**	

4.3. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

4.3.1. CONTROL DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

En la siguiente tabla, se relaciona el listado de personal (mínimo requerido administrativo) para la ejecución del contrato de acuerdo con los pliegos del contrato de obra.

Tabla 26. Personal dispuesto por parte de la Interventoría

CARGO	PROFESIONAL	CEDULA	DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE	7.713.442	50%
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOURDAN YALID MARIN HURTADO	1.030.627.623	20% MES 1 100% MES 2 AL MES 7
ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO	VICTOR ALFONSO MANRIQUE ANDRADE	80.751.278	20% MES 1 AL MES 3 10% MES 4 AL MES 7

Tabla 27. Control de personal de interventoría

PERSONAL DE INTERVENTORÍA EN EL MES DE FEBRERO			
PROFESIONAL	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	ESPECIALISTA EN AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO
DEDICACIÓN	50%	100%	20%

4.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA

4.4.1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

- El día 13 de agosto mediante el oficio No. CE-CU23-055, radicado bajo consecutivo 2024-551-012677-2 la interventoría realizó el traslado de solicitud de modificación contractual prorroga en tiempo de contrato de obra

- El día 13 de agosto mediante el oficio No. CE-CU23-056, radicado bajo consecutivo 2024-551-012675-2 la interventoría radico la solicitud de modificación contractual prorroga en tiempo contrato de interventoria.

- El día 28 de agosto mediante el oficio No. CE-CU23-057, la interventoría realizó la revisión y traslado del acta de pago No 4 bajo consecutivo 2024-551-013340-2.

- El día 30 de agosto mediante oficios No. CE-CU23-058 y No. CE-CU23-059, la interventoría realizó la revisión y traslado del acta de los informes mensuales No 5 y 6 de obra bajo consecutivos 2024-551-013513-2 y 2024-551-013514-2

4.4.2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

Durante el periodo del 01 al 31 de agosto de 2024, la interventoría realizó el acompañamiento en el área social del contratista a las siguientes actividades:

- Se realiza acompañamiento al contratista en obra para ejecutar el predio de los Gómez.
- Se realiza acompañamiento para la instalación del Pmt en el predio de los Gómez.

4.4.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES Y SST EJECUTADAS POR LA INTERVENTORÍA:

Las actividades SSTMA ejecutadas en el periodo del presente informe fueron las siguientes:

- Se verifican las inducciones Ambientales y SST al personal.
- Se realiza seguimiento al cronograma de actividades SSTMA
- Se verifica campamento móvil para los trabajadores con instalación de kit de emergencias, punto ecológico.
- Se realizo revisión y aprobación de los informes mensuales del componente SST y ambiental.

4.5. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

4.5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORÍA EN EL PERIODO REPORTADO

Tabla 28. Correspondencia enviada por la interventoría

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DESTINATARIO	ANEXOS	OBSERVACIONES
13/8/2024	CEP-055	"SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PRORROGA EN TIEMPO CONTRATO DE OBRA No 676-2023-LP (96548)" A TRAVES DE COMUNICACIÓN CU23-037.24	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	Radicado en fisico 2024-551-012677-2 13/08/2024
13/8/2024	CEP-056	SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA No 699-2023-CMA (99056)	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	SOLICITUD DEL CONTRATISTA	Radicado en fisico 2024-551-012677-2 13/08/2024
28/8/2024	CEP-057	TRASLADO ACTA DE PAGO NO 4 DE OBRA	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	ACTA DE PAGO DE OBRA Y SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-013340-2 28/08/2024
30/8/2024	CEP-058	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No 5.	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-013513-2 30/08/2024
30/8/2024	CEP-059	TRASLADO Y APROBACIÓN INFORME MENSUAL DE OBRA No 6.	edwin.lopez@gobiernobogota.gov.co	INFORME MENSUAL DE OBRA CON SUS ANEXOS	Radicado en fisico 2024-551-013514-2 30/08/2025

En la siguiente tabla, se relaciona la correspondencia recibida por la interventoría.

Tabla 29. Correspondencia recibida

FECHA	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN	REMITENTE	ANEXOS	OBSERVACIONES
9/08/2024	C-CU23-037.24	Solicitud Modificación contractual (Prorroga en tiempo) del contrato de obra No. 676-2023-LP (96548)	consorciousme2023.676@gmail.com	N/a	Se recibe en digital y en fisico
13/08/2024	C-CU23-038.24	ENTREGA ACTA No: 4 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA.	consorciousme2023.676@gmail.com	ACTA PARCIAL DE OBRA Y SUS ANEXOS	Se recibe en digital y en fisico
13/08/2024	C-CU23-039.24	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.5 y ANEXOS.	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME MENSUAL DE OBRA Y ANEXOS	Se recibe en digital y en fisico
13/08/2024	C-CU23-040.24	ENTREGA INFORME MENSUAL DE OBRA No.6 y ANEXOS.	consorciousme2023.676@gmail.com	INFORME MENSUAL DE OBRA Y ANEXOS	Se recibe en digital y en fisico

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El contrato 676-2023-LP (96548) presenta un avance físico ejecutado del 97.5% con respecto al valor contratado, correspondiente a las actividades instalación de tubería con un 95% de avance en el acueducto Aguas Claras Olarte, un 100% de avance en el acueducto Asopicos Andes y un 100% en el acueducto Asogualinda Chiguaza., así mismo se instalaron los equipos y accesorios en la Ptap del sistema de acueducto Asopicos Andes.

- El contrato 676-2023-LP (96548) presenta un avance del 87,5%, respecto al tiempo de ejecución.

- Para el periodo correspondido entre el 1 de junio de 2024 al 31 de agosto de 2024, se genera la facturación del contrato de interventoría por valor de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL, TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 29.492.322,00) el cual iguala el valor de % de facturación de obra es decir un 89,87%.

6. ANEXOS

ANEXO 1. Certificado Parafiscales Obra

ANEXO 2. Planillas de pago de seguridad social de obra

ANEXO 3. Planillas de pago de seguridad social de interventoría

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002, 828 DE 2003, LEY 1607 DE 2012 Y DECRETO 862 DE 2013

Bogotá D.C., 6 de Septiembre de 2024

Señores:
ALCALDÍA LOCAL DE USME

Yo, **OSMAR FABIÁN PINZÓN ACOSTA,** identificado con cédula de ciudadanía **80.545.787** de Zipaquirá, actuando en mi condición de representante legal del **CONSORCIO USME 2023**, manifesto bajo gravedad de juramento lo siguiente:

Que el contratista ha cumplido durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto del 2024 al 31 de agosto del 2024 con el pago de los aportes de salud, , riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo.

OSMAR FABIÁN PINZÓN ACOSTA
80.545.787 de Zipaquirá
Representante legal

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901270562-3	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS	CALLE 22A NO. 18B- 16	3218027069	recepcion@ductosycanales.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	13/08/2024	78934988	$4.818.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	286.000	0		0		0	0	0	0	286.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	130.500	0		0		0	0	0	0	130.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
MIN002	MIN002 Fondo Sol y Gar Min Salud	901037916-1	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	2.225.800	0	0	0	0	0	0		2.225.800	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	895.300				895.300	0	0	895.300			8.953	895.300	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	688.500	0	0	688.500	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	688.500	688.500
Pensión	2	2.545.800	2.545.800
Riesgos Laborales	1	895.300	895.300
CCF	1	688.500	688.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.818.100	4.818.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901270562-3	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN DUCTOS Y CANALES SAS		CALLE 22A NO. 18B- 16	3218027069	recepcion@ductosycanales.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E	13/08/2024	78934988	$4.818.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007806778	MENDEZ GARCIA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	3.260.870	521.800	0	0	0	0	EPS017	3.260.870	130.500	14-11	3.260.870	5	227.000	CCF24	3.260.870	130.500	0	0	0	0	0
2	CC	1014280512	ORTIZ PAEZ LEIDY JOHANA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS008	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
3	CC	1026577860	ARDILA ARANGO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-11	3.000.000	5	208.800	CCF24	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
4	CC	1032444078	SOLANO JIMENEZ LAURA YOLIMA	1	0			S																	230301	1.650.000	264.000	0	0	0	0	EPS005	1.650.000	66.000	14-11	1.650.000	5	114.900	CCF24	1.650.000	66.000	0	0	0	0	0
5	CC	1033766988	MOYA QUINTERO IVON LORENA	1	0			S											X						230301	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-11	2.500.000	1	0	CCF24	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0
6	CC	1057598604	ESPINEL GARNICA ANGIE LORENA	1	0			S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS037	3.500.000	140.000	14-11	3.500.000	5	243.600	CCF24	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0
7	CC	91136252	GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FREDY	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	MIN002	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901228673-5	SENSYS GROUP SAS	CARRERA 54 # 160A 33	3106807496	am.sensys@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E		79130817	$4.018.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	119.500	0		0		0	0	0	0	119.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	52.000	0		0		0	0	0	0	52.000	1
EPS010	EPS Sura	800088702-2	306.000	0		0		0	0	0	0	306.000	3
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	3.500	0		0		0	0	0	0	3.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	55.500	0		0		0	0	0	0	55.500	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	221.900	0	0	0	0	0	0		221.900	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.379.500	0	0	0	0	0	0		1.379.500	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	528.000	0	0	0	0	0	0		528.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	711.600				711.600	0	0	711.600			7.116	711.600	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	588.500	0	0	588.500	11

PAGADO 8933292

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901228673-5	SENSYS GROUP SAS		CARRERA 54 # 160A 33	3106807496	am.sensys@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E		79130817	$4.018.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	588.500	588.500
Pensión	3	2.129.400	2.129.400
Riesgos Laborales	1	711.600	711.600
CCF	1	588.500	588.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	4.018.000	4.018.000

PAGADO 843322792

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901228673-5	SENSYS GROUP SAS		CARRERA 54 # 160A 33	3106807496	am.sensys@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-07	E		79130817	$4.018.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018479612	PADILLA LUGO JOSE CAMILO	1	0			S																	230301	1.450.000	232.000	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	1	7.600	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
2	CC	1018479612	PADILLA LUGO JOSE CAMILO	1	0			S									X								230301	50.000	8.000	0	0	0	0	EPS005	50.000	0	14-11	50.000	1	0	CCF24	50.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	19619936	JULIO HERRERA FRAY LUIS	1	0			S		X															230201	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS017	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
4	CC	52109894	SANCHEZ BEDOYA LINNA MARIA	1	0			S										X							230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS001	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	1	0	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
5	CC	80827088	MORENO POSADA ANDRES	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
6	CC	91204493	ARDILA PINTO PEDRO ANTONIO	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	EPS005	1.450.000	58.000	14-11	1.450.000	5	101.000	CCF24	1.450.000	58.000	0	0	0	0	0
7	CC	1018461423	BENITEZ IBAGUE YEISON EDUARDO	1	0			S																	230301	4.347.826	695.700	0	0	0	0	EPS010	4.347.826	174.000	14-11	4.347.826	5	302.700	CCF24	4.347.826	174.000	0	0	0	0	0
8	CC	7254576	IBAGUE TORRES ALEXANDER	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS010	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
9	CC	79992238	PARRA POVEDA ABDON	1	0			S																	230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-11	1.300.000	5	90.500	CCF24	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	CC	1013659410	GOMEZ RODRIGUEZ YESICA NATALIA	1	0			S																	25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	80.000	14-11	2.000.000	1	10.500	CCF24	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
11	CC	1114786970	HERRERA ALMANZA EDWIN GIOVANNY	1	0			S		X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS037	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0
12	CC	80161057	LOPEZ GIRALDO JUAN DAVID	1	0			S		X															230301	86.667	13.900	0	0	0	0	EPS005	86.667	3.500	14-11	86.667	5	6.100	CCF24	86.667	3.500	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19266128		RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 16 A 29	NEIVA-HUILA	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	9471306661	9471306661	I	2024/09/06	2024/08/20	BANCO DE BOGOTA	0	$162,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	19266128	RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$162,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19266128		RODRIGUEZ RAMIREZ VICTOR GUILLERMO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 7 16 A 29	NEIVA-HUILA	8744488	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	9471306661	9471306661	I	2024/09/06	2024/08/20	BANCO DE BOGOTA	0	$162,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				**1**	**$162,500**	**$0**	**$0**	**$162,500**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7713442	MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE	CALLE 24A # 57-69 INT 3 APTO 604	3133768996	mejoven@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	14/08/2024	79473927	$384.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	162.500	0		0		0	2	300	0	162.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	208.000	0	0	0	0	2	400	0	208.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.600				13.600	2	100	13.700			136	13.700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.800
Pensión	1	208.000	208.400
Riesgos Laborales	1	13.600	13.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	384.100	384.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7713442	MIGUEL EDUARDO JOVEN GRAFE		CALLE 24A # 57-69 INT 3 APTO 604	3133768996	mejoven@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	I	14/08/2024	79473927	$384.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	7713442	JOVEN GRAFE MIGUEL EDUARDO	57	0			N																	231001	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	162.500	14-23	1.300.000	2	13.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información
