	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA - TOMO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 3180 de 2023

Contratista: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

Contrato de Interventoría No. 5066 de 2023

Interventoría: CONSTRUMAJ SAS.

Objeto Contrato de Obra:
"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INFORME MENSUAL No. 2

MES O PERIODO: 01 al 29 de enero

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		6
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		7
2.1	Localización		7
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		8
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		8/9
2.4	Características técnicas del proyecto		9/10/11
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		11
3.1	Información general del contrato		11
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		12
3.3	Seguimiento Items no previstos		12
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		12/13/14
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		14
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	14 - 22/32
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	14
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	14
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	15
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	15 - 33/35
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	15
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	15 - 36/45
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	15
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		15
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	15
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	15
	• Seguimiento Programa de Obra		15
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	15
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	15
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	16
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	16 - 46/49
	• Informes especialistas y profesionales		16 - 50/53
	• Informe matriz de riesgos		N/A
5	**Conclusiones y recomendaciones**		16
6	**Anexos**		17
6.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		18
6.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		19
6.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		20
6.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		21

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	
VERSION	
PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA **ERIODO MES:** 01/02/2024 al 29/02/2024

CONVENIO No.: 3180 de 2023

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

PLAZO INICIAL: 13 días habiles
FECHA DE INICIO: 12 de diciembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 de diciembre de 2023
FECHA DE REANUDACIÓN: 19 de enero de 2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 30 de abril de 2024
PLAZO ACUMULADO:

VALOR INICIAL : $ 200.447.374,00
VALOR ADICIONALES: $ -
VALOR ACUMULADO: $ 200.447.374,00
DESEMBOLSO CONCEDIDO: $ -
DESEMBOLSO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MAURICIO HOYOS SIERRA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD(ml)
Pavimentación	Mejoramiento		120
Estructuras	Alcantarillas	2	
	Muro de Contención		
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONVENIO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Mejoramiento			
Estructuras	Alcantarillas			
	Muro de Contención			
Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	VALOR
OBRAS	147.436.904,00
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL	4.393.107,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	48.617.363,00
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	200.447.374,00

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	VALOR	ACUMULADO
OBRAS		
GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
VALOR EJECUTADO		

Estos conceptos deben corresponder a los balances que debe realizar periodicamente la interventoría al presupuesto del convenio

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)	**Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)**
Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)	**Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)**
Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)	**Indicar la localización y actividad. (A la fecha del presente informe no se han ejecutado actividades)**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202 097497 CND.

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

CONTRATO INVIAS N° 5066-2023

INFORME TÉCNICO MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 2



Versión 2
Tomo 2

PERIODO: DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.

CONSTRUMAJ SAS

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Residente de Interventoría **Julio César Córdoba**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**	**Director de Interventoría** **Juan Diego Jiménez Serna**

Tabla 2. Control de distribución de documentos.

CONVENIO SOLIDARIO No. 3180 DE 2023

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe comprende las actividades realizadas en el periodo del 01 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024 por la Junta de Acción Comunal vereda Palo blanco en el municipio de Ituango, Antioquia del convenio solidario No. 3180 del 2023 con número de proceso en SECOP II: SPSC-CD-CS-163-2023, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", y cuyo número de ID en SECOP II es CO1.PCCNTR.5360711.

La interventoría del Contrato del convenio la realiza Construmaj S.A.S. bajo el contrato No. 5066 de 2023 con ID en SECOP II: CO1.SLCNTR.11855324 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" - LOTE 1. Generado por el Instituto Nacional de Vías - INVIAS como entidad contratante y adjudicado mediante resolución No. 4637 del 18 de diciembre de 2023 a través del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DEO-SVR-149-2023.

Mediante resolución No. 4993 de fecha 30 de diciembre de 2023, se designó como supervisor al Ing. Mauricio Hoyos Sierra, mediante Resolución No. 2418 del 14 de julio de 2022 se designó como gestor técnico al ingeniero Diego Felipe Pabón Carrillo; Gestor Social - Subdirección de Sostenibilidad: Carlos Andrés Ossa Gestor Ambiental - Subdirección de Sostenibilidad: Audry Dayanna Menjura

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS estructuró el programa "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL", que tiene como objetivo mantener y mejorar la transitabilidad y accesibilidad a la red vial rural del país, priorizando corredores viales estratégicos que incrementen la productividad del campo en las regiones, mediante ejecución de obras de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de ejecución.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO VERDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

De acuerdo con el Convenio No. 3180 de 2023, suscrito entre la Junta de Acción Comunal de la vereda Palo Blanco – Ituango, Ant. y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, en virtud de este y en atención a que el mejoramiento de las condiciones viales y de movilidad, se convierten en una necesidad para los habitantes de la zona rural de esta vereda, se tiene que; la entidad proyecta construir 120 metros de placa huella y 2 alcantarillas.

La vía objeto del alcance del convenio se encuentra catalogada como vía rural, y se encuentra en mal estado y sin ningún tipo de mantenimiento, deterioro en la superficie de rodadura, por lo cual se realizará la intervención a la vía, con el fin de restituir la normalidad al sitio descrito a continuación:

IDENTIFICACIÓN LAS COORDENADAS DEL TRAMO A INTERVENIR EN LA VEREDA PALO BLANCO, ITUANGO	
VEREDA PALO BLANCO:	• INICIA: 7°10´23.52" N, 75°47´21.84" O • FINAL: 7°11´12.48" N, 75°47´17.88" O

Tabla 3. Identificación de coordenadas.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA PALO BLANCO – ITUANGO, ANTIOQUIA.

Palo Blanco es una vereda del municipio de Ituango, Antioquia, Colombia y tiene una altitud de 1.748 metros sobre el nivel del mar. La vereda Palo Blanco está situada a 3 kilómetros y medio al suroeste de Ituango. Esta cerca de la localidad naranjo 2 y la Hormiga. El tramo para mejorar se localiza desde el K0+000 (Coordenadas de inicio 7°10´23.52" N, 75°47´21.84" O) al K0+120 (Coordenadas final 7°11´12.48" N, 75°47´17.88" O).

Figura 1. Zona de localización de la vereda Palo Blanco



Fuente: Google mapa

2.2 MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Ituango es un Municipio de Colombia, situado en la subregión Norte del departamento de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Taraza y el departamento de Córdoba, por el este con el municipio de Valdivia, por el sur con Briseño, Toledo y Peque, y por el oeste con Dabeiba y Mutata. Su cabecera está a 196 kilómetros de la capital de Antioquia, Medellín. El Municipio de Ituango tiene un total 28,634 habitantes, de los cuales: 11,325 son mujeres 39.6% y 17,309 son hombres 60.4%. El municipio de Ituango tiene una población Urbana de 7,074 habitantes lo que equivale al 24,70% del total de la población y un a población Rural de 20,000 habitantes lo que equivale al 69,84% del total de la población.

Ituango es un municipio de vocación agrícola en donde sus principales ingresos dependen de la ganadería, el cultivo de café, caña de azúcar, el frijol y el maíz. También la minería artesanal de oro y platino ha servido de sustento para muchas de las familias y la cual ha sido ejercida de manera tradicional, así como también se explota la madera. Es un municipio que su economía se encuentra en transición, dado que esta dependía en gran parte de los cultivos de uso ilícito, los cuales fueron erradicados de manera voluntaria gracias a la implementación de los acuerdos de paz. Por ser un municipio en desarrollo, presenta muchos vacíos a nivel de movilidad vial e infraestructura.

Con el desarrollo del proyecto que se pretende ejecutar, se busca principalmente brindar una infraestructura vial que satisfaga requerimientos mínimos de seguridad, comodidad y transpirabilidad para los usuarios de las vías, contribuyendo así, al desarrollo sostenible y a la integración del país a través de una red vial eficiente, cómoda y segura; por lo tanto, con la ejecución de este proyecto, el Instituto busca el cumplimiento de uno de los fines constitucionales del estado, como es el de darle continuidad al servicio de transporte terrestre y apoyar al desarrollo de la política de intermodalidad del transporte para de esta manera apoyar y contribuir con el desarrollo económico de la región.

2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA

En la siguiente tabla, se evidencia el inventario recibido por parte del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para la estructuración del anexo técnico del proyecto y que se encuentra en proceso de actualización de levantamiento y replanteo por parte de la JAC para la caracterización vial que se debe ejecutar:

INVENTARIO VIAL

VEREDA	TRAMO VIAL POR INTERVENIR	LONGITUD PLACA HUELLA (M)	ALCANTARILLAS (UND)
Pablo Blanco	Coordenadas de inicio 7°10´23.52" N, 75°47´21.84" O; Coordenadas final 7°11´12.48" N, 75°47´17.88" O	120,00	2

Tabla 4. Inventario vial.

Figura 2. Estado inicial de la vía.



Fuente: Levantamiento técnico

2.4CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La vía por intervenir está catalogada de tipo rural, a la cual se le realizara mejoramiento, por medio de la construcción de placa huella, y alcantarilla.


Tramo por intervenir:


Dimensiones (m)			Obra por ejecutar
L	**a**	**H**	
120	4,5	0,15	PLACA HUELLA
5			2 ALCANTARILLAS


Tabla 5. Tramo para intervenir.


Para las secciones, se muestran las siguientes ilustraciones, en las cuales se encuentras las secciones transversales presentadas, por el IVIAS en la cartilla de Colombia rural.


Figura 3. Diseños de placa huella y alcantarilla.

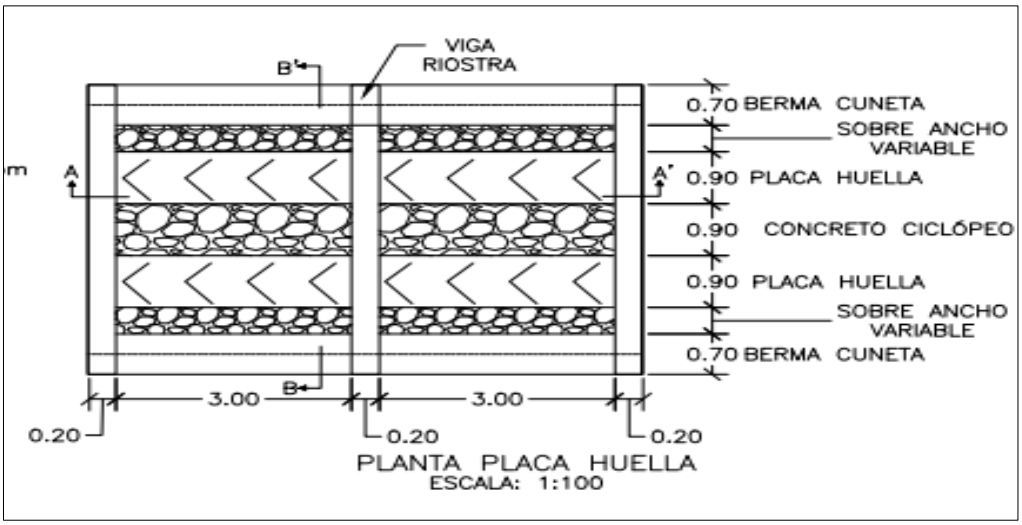

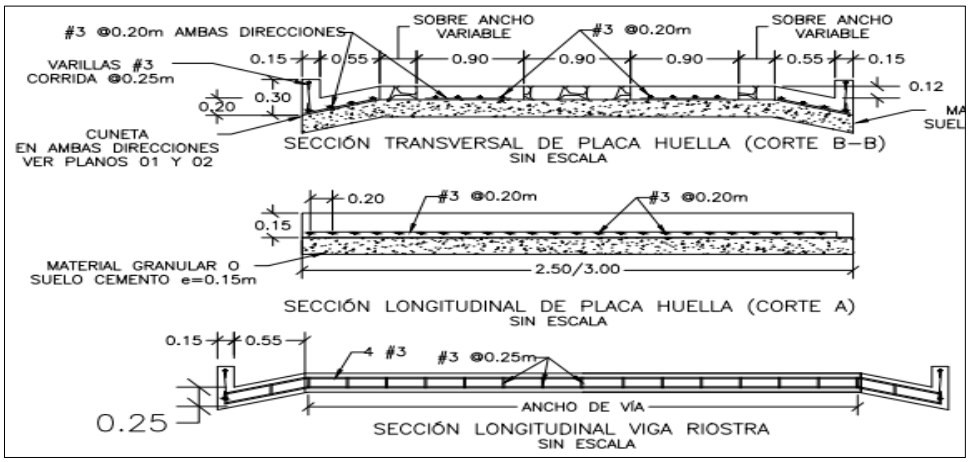

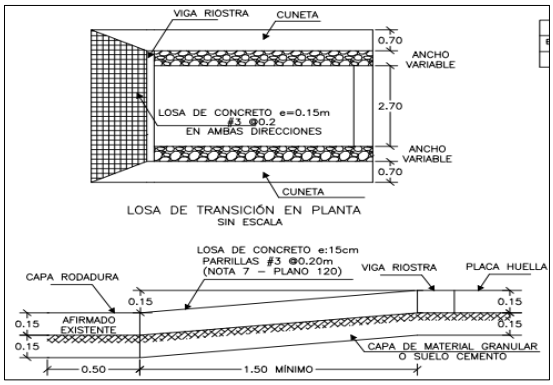

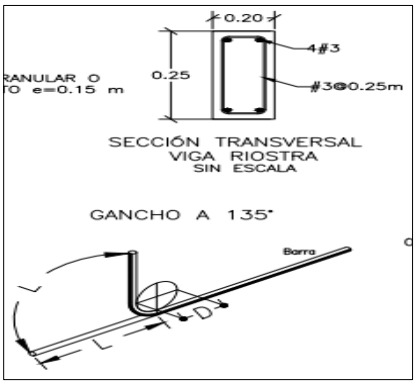

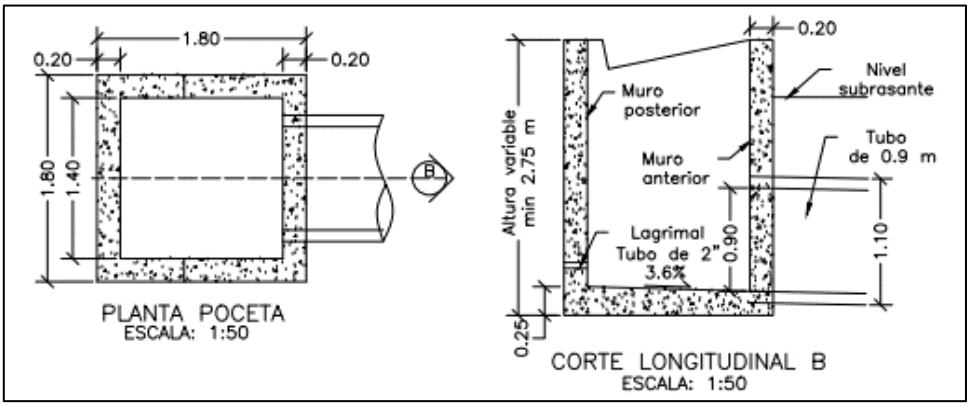

Fuente: Presupuesto oficial.

3. INFORMACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO.

Concepto	Fecha / Valor
NÚMERO PROCESO DE SELECCIÓN	**SPSC-CD-CS-163-2023**
NÚMERO ID DEL SECOP	**CO1.PCCNTR.5360711**
NÚMERO DEL CONTRATO	3180 de 2023
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08 de septiembre de 2023
CONTRATISTA	**JUNTA DE ACCION COMUNAL EL ASTILLERO**
OBJETO	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL ASTILLERO, MUNICIPIO DE VALDIVIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.447.374
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA	Vereda Palo Blanco, finca las brisas.
NÚMERO DE TELÉFONO	3206423560
CORREO ELECTRÓNICO	jacveredapaloblanco2050@gmail.com
FECHA DE INICIO	12 DE DICIEMBRE DEL 2023
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DICIEMBRE DEL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 DICIEMBRE DEL 2023
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024

Tabla 6. Información general del proyecto.

3.2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 29 febrero de 2024:

A la fecha del presente informe la JAC aún no ha generado ninguna actividad. Para la fecha de corte del presente informe no se evidencia porcentaje programado y ejecutado por parte de la JAC, porque aún no se ha logrado iniciar a ejecutar obra física. Además, aún no han entregado programación de obra.

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEM NO PREVISTOS.

Hasta la fecha no se ha realizado ninguna adición de ítems no previstos.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

AVANCE TÉCNICO DEL PROYECTO:

Para el período de ejecución del 01 al 29 de febrero de 2024, el avance técnico de proyecto obedece a la revisión de los siguientes documentos:

Presupuesto y diseños entregados por la entidad contratante.
Elaboración del cronograma de obra
Posibles fuentes de material
Señalización (Valla informativa)
Análisis de precios unitarios – APU

De acuerdo con los soportes de estudio y de experiencia de los profesionales, remitidos por la Junta de acción comunal - JAC, mediante comunicados C.MAJ-CI-5066-23-182 y C.MAJ-CI-5066-23-190 del 10 y 16 de febrero, respectivamente, se emitió concepto por parte de esta interventoria, donde se emitió aprobación del residente de obra y del contador.

Por lo anterior, la etapa de revisión de los documentos técnicos citados, no se ha culminado, puesto que a la fecha del 29 de febrero de 2024 la JAC no ha hecho entrega de dichos documentos para su revisión. Por ende, el avance técnico en su etapa inicial es de 0%.

AVANCE FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO DE 2024:

VALOR PROGRAMADO PERIODO	$ 0.00
VALOR EJECUTADO	$ 0.00

AVANCE FÍSICO DEL MES DE FEBRERO DE 2024:

PROGRAMADO	0.00 %
EJECUTADO	0.00 %

A la fecha de presentación del informe, el contratista se encuentra retrasado con el inicio de las actividades de obra, debido a que no ha entregado la documentación técnica preliminar del proyecto.

AVANCE PREDIAL AL MES DE FEBRERO DE 2024:

- Predios por intervenir: 0
- Predios aprobados estudios técnicos (incluye avalúos): 0
- Promesas de compraventa aprobadas: 0
- Permisos de intervención pendientes: 0

AVANCE AMBIENTAL AL MES DE FEBRERO DE 2024:

- Fuentes de material: 0
- Permiso minero: 0
- Licencia ambiental: 0
- Aprovechamiento forestal: 0
- Concesión de aguas: 0

AVANCE SOCIAL AL MES DE FEBRERO DE 2024:

- Empleos generados: 0
- Empleos directos: 0
- Empleos indirectos: 0
- Socializaciones de inicio: 0
- Capacitaciones: 0
- SAU: 0
- Actas de vecindad: 0
- Actas de cierre: 0

ACCIONES POR SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

- A la fecha de este reporte la interventoría continua en constante comunicación con la JAC con la intención de seguir apoyándolos en lo necesario para que, puedan cumplir con la entrega oportuna de la documentación requerida para darle pronto inicio físico al proyecto.
- Por lo que se requiere de la socialización del proyecto con la comunidad y la visita técnica inicial para lograr definir algunos aspectos relevantes de planeación para la ejecución de las obras; sin embargo, dicha reunión no se logró coordinar para el mes de febrero debido a que no se cuenta con aprobación por parte de INVIAS del personal profesional social de la interventoría, es de aclarar que los soportes de estudio y experiencia de dicho personal fueron entregados mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 el 23 de enero

de 2024, y reiterada la solicitud mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-211 del 28 de febrero de 2024, sin obtener respuesta alguna.

- La interventoría ha estado en constante comunicación con la territorial Antioquia del INVIAS, para saber cuáles son los pasos para seguir, una vez se realice el cambio de firmas para los respectivos desembolsos del convenio solidario, pues según lo indicado por la supervisión del contrato, para la visita técnica inicial se requiere de los profesionales de INVIAS; sin embargo, han mencionado que se encuentran en un proceso de contratación de dicho personal, por ende, estamos a la espera por parte del INVIAS para poder gestionar lo pertinente a la socialización y visita técnica inicial.
- Desde la interventoría en conjunto con el representante legal de la JAC se realizó el trámite correspondiente al cambio de firmas, para gestionar los recursos del proyecto una vez se requiera.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO

4.1 INFORME SEMANAL

A continuación, presentamos la relación de informes semanales presentados hasta el corte del presente informe, los cuales se adjuntan en el Anexo Informes semanales.

SEMANA	DESDE	HASTA
Semana 3	01/01/2024	04/02/2024
Semana 4	05/02/2024	11/02/2024
Semana 5	12/02/2024	18/02/2024
Semana 6	19/02/2024	25/02/2024
Semana 7	26/02/2024	29/02/2024

Por lo anterior, anexamos los informes semanales mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se ha vinculado maquinaria al proyecto, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo el presente informe no se ha vinculado personal por parte de la Junta de Acción Comunal – JAC, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.4 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONVENIO SOLIDARIO

La información financiera y presupuestal del convenio solidario a la fecha de corte del presente informe, es del 0%, debido a que no se han realizado desembolsos. Por lo anterior, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.

Se anexan reportes semanales del estado del tiempo, mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

4.6 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

Para el periodo del presente informe no se han iniciado actividades en obra, por lo cual no se han realizado ensayos de laboratorio, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO SOLIDARIO

Anexamos el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12 con la relación de las garantías actualizadas de acuerdo con el acta de prorroga No. 01.

4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONVENIO SOLIDARIO

Para el periodo del presente informe no se presenta seguimiento al plan de calidad, por ende, no se anexa el formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

4.9 OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

- **Seguimiento a la inversión de los desembolsos.**

Para el periodo del presente informe no se han aprobado desembolsos, por lo cual, no se anexa el informe de inversión y buen manejo del desembolso convenios.

- **Seguimiento Programa de Obra**

Inicialmente se solicitó a la Junta de Acción comunal, realizar la entrega del programa de obra; sin embargo, a la fecha no han presentado dicho programa, igualmente no se han iniciado actividades físicas del contrato, por lo cual no se realiza seguimiento durante el mes de febrero.

- **Seguimiento Programa de Inversiones**

Inicialmente se solicitó la documentación a la JAC; sin embargo, para el corte del 29 de febrero de 2024, no han radicado documentación previa al inicio de obra, por lo cual, el programa de

inversiones de los desembolsos aún no ha sido remitida por la JAC para revisión y/o aprobación por la interventoría.

- **Actas de Comité de Obra**

No se han realizado comités de obra a la fecha.

- **Actas de Reunión**

Se anexa reporte de acta de reunión, mediante formato MEPI-MN1-IN-14.

- **Informes especialistas y profesionales**

Se anexa informe del especialista en vías.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- A la fecha de corte del presente informe se realizó la aprobación del personal profesional para el desarrollo de actividades del convenio solidario 3180 de 2023, se recomienda a la Junta de acción comunal agilizar la revisión de documentos previos al inicio actividades en obra.

- Se recomienda al INVIAS aprobar la hoja de vida de la profesional social de interventoría, cuyos soportes fueron enviados el 23 de enero de 2024 mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-158 y reiterados mediante comunicado C.MAJ-CI-5066-23-211 del 28 de febrero de 2024, pues el no contar con el profesional social se han generado retrasos significativos para el normal desarrollo del convenio.

- Se recomienda a la Junta de Acción Comunal Palo blanco, Ituango–Antioquia, agilizar la etapa documental donde se incluya el plan de inversión de los desembolsos y la programación de obra para poder dar inicio a las actividades de obra, pues a la fecha de corte del presente informe la ejecución física es del 0%.

- El día 27 de febrero del 2024, se llevó a cabo una reunión en la territorial Antioquía (INVIAS), donde se autorizó realizar la socialización del proyecto, junto a la visita técnica inicial, donde se verificará si es necesario el concepto de especialistas para la revisión y/o ajuste de estudios y diseños.

6. ANEXOS.

6.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

6.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

6.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

6.4. Copia de la Bitácora del mes correspondiente

6.5. Otros anexos:

- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10
- Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12
- Formato MEPI-MN1-IN-14.
- Informe de especialista en vías.

6.1. RELACIÓN DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR INCLUYENDO ASUNTO, REFERENCIA, FECHA DE RECIBO.

ENVIADA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
05-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-169	Solicitud Documentos iniciales	Interventoria	OAC ITUANGO
06-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-170	Documentos Técnicos - Ituango	Interventoria	OAC ITUANGO
10-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-182	Revisión Hojas de Vida - Ituango	Interventoria	OAC ITUANGO
16-feb-24	C.MAJ-CI-5066-23-190	Revisión 2 Hojas de Vida - Ituango	Interventoria	OAC ITUANGO

RECIBIDA

FECHA	No. DE COMUNICADO	ASUNTO	REMITE	DESTINO
07/02/2024	Sin consecutivo	Documentos contadora Ituango	OAC ITUANGO	Interventoria
13/02/2024	Sin consecutivo	Documentos faltantes de la contadora	OAC ITUANGO	Interventoria
14/02/2024	Sin consecutivo	últimos documentos de la contadora	OAC ITUANGO	Interventoria
22/02/2024	Sin consecutivo	Documentos maestro Ituango	OAC ITUANGO	Interventoria

6.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DEL AVANCE DE LAS OBRAS.

No aplica para el presente periodo debido a que no se han realizado actividades en obra

6.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES, SOCIALES, PREDIALES Y DE SOSTENIBILIDAD ADELANTADAS.

No aplica para el presente periodo debido a que no se han realizado actividades en obra

6.4. COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE.

No aplica para el presente periodo debido a que no se han realizado actividades en obra

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 3 del 1/02/2024 al 4/02/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PABON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA - CONSTRUCCIÓN DE 2 UND DE ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ituango del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial Norte: 7° 10' 23.52", Oeste: 75° 47' 21.84" y el punto de referencia la coordenada final Norte: 7° 11' 12.48", Oeste: 75° 47' 17.88', del tramo postulado por la comunidad de la JAC Vereda Palo Blanco para su intervención con el programa; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

CONVENIO No.	3180 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.447.374,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.447.374,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 de abril de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.780.410,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de marzo de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 188.780.410,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 2.065.782,88		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 186.714.627,12		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$	200.447.374,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	-	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	-	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	-	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	-	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	-	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$	-	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	-	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	%

Observaciones:A la fecha del presente informe, el contratista aun no a entregado el programa de inversion, para su revision y posterior aprobacion y finalmente hacere seguimiento a su cumplimiento. La interventoria ya le ha reiterado a la JAC la importancia de la pronta entrega del plan de inversiones, porque si en el mismo, la interventoria no autorizaria el desembolso, cuando ya se haga el cambio de firmas. Ellos manifiestan que aun no han contratado el ingeniero que le apoye en esas labores. La interventoria ya les aprobo la hoja de vida del ingeniero residente para que lo contraten y tengan como cumplir con esta solicitud.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	8.090.589,00	4,29%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	2.065.782,88	1,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	2.696.863,00	1,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	1.032.891,44	0,55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación. La interventoria espera que durante la semana venidera, se haga entrega de esta información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS:

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informa solicitada por la interventoria referente a la documentacion preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica. Se el solicito a la JAC entregar las hojas de vida del personal de la comunidad que trabajara con en el proyecto, como mano de obra no calificada.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE ESTA SEMANA LA INTERVENTORIA CONOCIO DE PARTE DE LA JAC QUE ELLOS NO TENIAN LA INFORMACION TECNICA DEL PROYECTO, Y QUE ESO ESTABA RETRASANDO LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION PRELIMINAR QUE SE LES SOLICITO. DESPUES DE ESTO LA INTERVENTORIA LES ENTREGO VIA CORREO, TODA LA INFORMACION QUE SE TENIA SOBRE EL PROYECTO, PARA QUE ELLOS PIDIERAN CONOCER EL ALCANCE DEL PROYECTO E INICIARAN A CUMPLIR LOS REQUERIMIENTO. ENTRE LA INFORMACION QUE SE LES ENTREGO ESTA:
1.PRESUPUESTO
2.CUADRO DE COSTOS
3.PRECIOS UNITARIOS
4.EL ALCANCE DEL PROYECTO…
SE ESPERA QUE CON ESTA INFORMACION LA JAC SE PONGA AL DIA CON LA INFORMACIÓN PRELIMAR, ASÍ NOSOTROS REVISAR Y APROBAR SI ES EL CASO Y DE NO CUMPLIR, INFORMARLES CON TIEMPO, PARA QUE SE SUSANE.

ADEMAS, DURANTE ESTA SEMANA EL CONTRATISTA A ESTA ENVIANDO HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROFESIONAL, Y LA INTERVENTORIA A ESTADO REVISANDO Y PROBANDO LAS QUE CUMPLEN Y LA QUE NO, PIDIENDO SUSANAR LO MAS PRONTO POSIBLE.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE ESPERA QUE EL CONTRATISTA, YA TENGA CONTRATADO AL RESIDENTE DE OBRA, PARA QUE LE APOYE CON TODA ESA GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA, PARA IR AVANZANDO, PARA QUE UNA VEZ SE DE LA VISITA DEL SUPERVISOR DE LA TERRITORIAL, SE LOGRE HACER LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO Y REALIZAR BALANCE E INICIAR A EJECUTAR.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA	AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA	AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNUCACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. LA INTERVENTORIA LE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA CONTINUAR ENTREGANDO LAS HOJAS DE VIDAS DEL PERSONAL Y DEMAS DOCUMENTACIÓN DURANTE LA SEMANA VENIDERA, PARA IR DEJARNDO LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS DEFINIDOS, PARA CUANDO SE DE LA VISITA DE LA TERRITORIAL, PODER INICIAR OBRA FISICA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 4 del 5/02/2024 al 11/02/2024 Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PAVON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA - CONSTRUCCIÓN DE 2 UND DE ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ituango del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial Norte: 7° 10' 23.52", Oeste: 75° 47' 21.84" y el punto de referencia la coordenada final Norte: 7° 11' 12.48", Oeste: 75° 47' 17.88', del tramo postulado por la comunidad de la JAC Vereda Palo Blanco para su intervención con el programa; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

CONVENIO No.	3180 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.447.374,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.447.374,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 de abril de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.780.410,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de marzo de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 188.780.410,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 3.098.674,32		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 185.681.735,68		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.447.374,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones:A la fecha del presente informe, el contratista aun no a entregado el programa de inversion, para su revision y posterior aprobacion y finalmente hacere seguimiento a su cumplimiento. La interventoria ya le ha reiterado a la JAC la importancia de la pronta entrega del plan de inversiones, porque si en el mismo, la interventoria no autorizaria el desembolso, cuando ya se haga el cambio de firmas. Durante este periodo la JAC manifiestó que ya contrataron al ingeniero residente para trabajarle a la programacion y hacer el plan de inversión. Se espera que durante la semana entrante se haga la entrega del mismo.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.787.452,00	5,71%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 3.098.674,32	1,64%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.696.863,00	1,43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.032.891,44	0,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación. La interventoria espera que durante la semana venidera, se haga entrega de esta información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informa solicitada por la interventoria referente a la documentacion preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica. Se el solicito a la JAC entregar las hojas de vida del personal de la comunidad que trabajara con en el proyecto, como mano de obra no calificada.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE ESTA SEMANA SE CONTINUO CON LA REVISION DE HOJAS DE VIDA PARA SU POSTERIOR APROBACIÓN. EN ESTE CONVENIO YA SE LES APROBÓ EL INGENIERO RESIDENTE Y EL CONTADOR. EL CONTRATISTA INFORMA QUE EL RESIDENTE YA ESTABA TRABAJANDO EN EL PLAN DE INVERSION.
SE LE HIZO APOYO A LA JAC EN CUANTO A DUDAS SOBRE CÓMO GESTIONAR LA INFORMACIÓN PRELIMINAR SOLICITADA.
LA INTERVENTORÍA REALIZO GESTIONES PARA ACELERAR EL PROCESO DE CAMBIO DE FIRMAS Y ASÍ PODER TENER PRONTITUD EN EL INICIO DE LAS LABORES FÍSICAS.
EL APOYO DE LA SUPERVISION DE LA TERRITORIAL INFORMO QUE YA EL DINERO ESTA EN LOS BANCO, PARA SU FIRMA, LA INTERVENTORIA ESTA COORDINANDO CON EL PRESIDENTE DE LA JAC DE PALO BLANCO, PARA INICIAR EL PROCESO DE DESEMBOLSO, UNA VEZ SE ENTRE EL PLAN DE INVERSION.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE ESPERA QUE LA JAC ENTREGUE EL PLAN DE INVERSION Y POSTERIOR A ELLO, LA INTERVENTORIA LE HAGA LA REVISION Y SE APRUEBA, PARA QUE SE HAGA EL DESEMBOLSO Y SE INICIEN LA OBRA FISICA Y ASÍ CUMPLIR CON LOS TIEMPOS CONTRATUALES DEL CONVENIO EN MESION.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA	AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA	AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNUCACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. EN VISTA DE QUE LA JAC YA CONTRATO EL RESISENTE, LA INTERVENTORIA LE HA REITERADO LA IMPORTANCIA DE ENTREGAR EL PLAN DE INVERSION CUANTO ANTES, PARA QUE SE PUEDA EJECUTAR EL DESEMBOLSO Y TENER CELERIDAD EN LOS INICIOS DE LA OBRA FISICA.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....
NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA
Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 5 del 12/02/2024 al 18/02/2024 Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PAVON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA - CONSTRUCCIÓN DE 2 UND DE ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ituango del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial Norte: 7° 10' 23.52", Oeste: 75° 47' 21.84" y el punto de referencia la coordenada final Norte: 7° 11' 12.48", Oeste: 75° 47' 17.88', del tramo postulado por la comunidad de la JAC Vereda Palo Blanco para su intervención con el programa; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

CONVENIO No.: 3180 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.447.374,00

FECHA DE INICIO: 12 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.447.374,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de abril de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.: 5066 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 188.780.410,00

FECHA DE INICIO: 12 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 188.780.410,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23 de marzo de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 188.780.410,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 4.131.565,76		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 184.648.844,24		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.447.374,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: A la fecha del presente informe, el contratista aun no a entregado el programa de inversion, para su revision y posterior aprobacion y finalmente hacerle seguimiento a su cumplimiento. Para el día martes 27 del mes en curso, se tiene programada una reunión en la territorial en medellín y se espera que en la misma, se defina cuando se pueda hacer la primera visita tecnica al tramo a intervenir, con participacion de la JAC, el INVIAS y la interventoria. En dicha visita, se espera definir las cantidades a ejecutar de acuerdo al presupuesto y a los ajustes al diseño, si es necesario. Ya teniendo el balance final de lo que se va a realizar, la JAC puede montar el plan de inversion, para su revision y aprobacion por parte de la interventoria, para inicar a ejecutar la obra fisica.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 13.484.315,00	7,14%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 4.131.565,76	2,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.393.726,00	2,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.032.891,44	0,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %:

Meta Física Ejecutada %:

Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1:

TRAMO Y/O SECTOR 2:

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación. La interventoria espera que durante la semana venidera, se haga entrega de esta información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aun, no a iniciado obra fisica, y tampoco a entregado los permisos referentes a la gestion ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación.

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la informa solicitada por la interventoria referente a la documentacion preliminar, que deben entregar, para su revision y posterior aprobacion para darle inicio a la obra fisica.

Para el día martes 27 del mes en curso, se tiene programada una reunión en la territorial en medellín y se espera que en la misma, se defina cuando se pueda hacer la socializacion inicial del proyecto con la comunidad.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE ESTA SEMANA LA INTERVENTORÍA ESTUVO EN CONTACTO CON EL BANCO AGRARIO, PARA CORROBORAR QUE EL DINERO SI ESTUVIERA EN CUENTA Y ADEMAS, PARA SABER SI HACIA FALTA ALGUNA DOCUMENTACION PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS. EFECTIVAMENTE NO SE HABI ENTREGADO EL OTRO SI, DEL CAMBIO DE FIRMA, COMO TAMBIEN EL PLAN DE CONDICIONES DEL MANEJO DE LOS RECURSO. LA INTERVENTORIA SE LO SOLICITO A LA TERRITORIAL MEDELLIN Y SE LE ENTREGO AL BANCO. ESTE INFORMO A LA INTERVENTORIA QUE PRONTO AVISARIA, PARA QUE SE FUERA A REALIZAR EL CAMBIO DE FIRMA. LUEGO LA INTERVENTORIA SE COMUNICO CON EL PREDIDENTE DE LA JAC, PARA COORDINAR LA IDA AL BANCO PARA HACER EL CAMBIO DE FIRMA CON EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA.

A ESTA JAC YA SE LE APROBO EL INGENIERO RESIDENTE Y LA CONTADORA, Y SE LE HA SOLICITADO EL ENVIO DE LA HOJA DE VIDA DEL MAESTRO DE OBRA.

SE CONTINUO HACIENDOLE APOYO A LA JAC EN CUANTO A DUDAS SOBRE CÓMO GESTIONAR LA INFORMACIÓN PRELIMINAR SOLICITADA.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARA LA SEMANA VENIDERA SE TIENE PROGRAMADO PARA EL DÍA MARTES 27 DEL MES EN CURSO, UNA REUNION EN LA TERRRITORIAL EN MEDELLÍN, DONDE SE ESPERA SE DEFINA, CUANDO SE HACE LA PRIMERA VISITA TECNICA EN CONJUNTO CON EL INVIAS, LA JAC Y LA INTERVENTORIA, DONDE SE PUEDA MEDIR EL TRAMO A EJECUTAR, SE REVISEN LOS DISEÑOS PARA VER SI ES NECESARIO HACERSE AJUESTES A DISEÑO Y POSTRIOR A ELLO, SE REALICE UN BALANCE CON LA CANTIDADES FINALES Y SE PUEDA DAR INICIO A LA OBRA FISICA.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 2

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

FOTO 3

AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNUCACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTENTE COMUNICACION CON LA TERRITORIAL MEDELLIN, PARA SABER CUALES SON LOS PASOS A SEGUIR, YA TENIENDO EL DINERO EN EL BANCO Y COMO RESPUESTA, SE PLANTEO UNA REUNION PARA EL DÍA MARTES 27 DEL MES PRESENTE, PARA DEDINIR CUANDO SE HACE LA PRIMERA SOCIALIZACION EN LA VEREDAD PALO BLANCO, TANTO TECNICA COMO SOCIAL Y AMBIENTAL, QUE PERMITA EL INICIO DE LA OBRA FISICA Y ASÍ EL CONTRATISTA PUEDA CUMPLIR CON LOS TIEMPOS CONTRATUALES DEL CONVENCIO EN MENSION.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 6 del 19/02/2024 al 25/02/2024 — Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PAVON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA - CONSTRUCCIÓN DE 2 UND DE ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ituango del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial Norte: 7° 10' 23.52", Oeste: 75° 47' 21.84" y el punto de referencia la coordenada final Norte: 7° 11' 12.48", Oeste: 75° 47' 17.88', del tramo postulado por la comunidad de la JAC Vereda Palo Blanco para su intervención con el programa; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

CONVENIO No. 3180 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 200.447.374,00

FECHA DE INICIO: 12 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 200.447.374,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de abril de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No. 5066 de 2023 — VALOR INICIAL: $ 188.780.410,00

FECHA DE INICIO: 12 de diciembre de 2023 — VALOR ADICIONES: $ -

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 30 de diciembre de 2023 — VALOR ACUMULADO: $ 188.780.410,00

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30 de abril de 2024 — VALOR ANTICIPO: $ -

VALOR AMORTIZADO: $ -

SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 188.780.410,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 5.164.457,20		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 183.615.952,80		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.447.374,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: A la fecha del presente informe, ya se realizo el cambio de firmas conjunta entre el presidente de la JAC Palo Blanco y el representante legal de la interventoría. Ya los recuersos estaban en el banco, en ese orden de ideas ya teniendo el dinero, se planea realizar un primer desembolso para que la JAC, pueda ir haciendo compra de materiales, dotación del personal y examenes de ingreso del personal y posterior a ello el ingeniero residente haga el cronograma y el plan de inversiones y lo entregue a la interventoría para su revisión y aprobación.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 16.181.178,00	8,57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 5.164.457,20	2,74%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.696.863,00	1,43%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.032.891,44	0,55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

	Meta Física (Programa de Obra)		
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista auún no ha iniciado obra fisica y tampoco ha entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación**.** La interventoria espera que durante la semana siguiente, se haga entrega de esta información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	.....	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	.....	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	.....	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	.....	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	.....	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	.....	
EMISIONES:	SI	NO	N/A	.....	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	.....	

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aún no ha iniciado obra fisica y tampoco ha entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación**.**

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aún no ha iniciado obra fisica y tampoco ha entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra fisica, entreguen la documentación**.**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: .....

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista esta en la logistica de entregar la información solicitada por la interventoria referente a la documentación preliminar, que deben entregar, para su revisión y posterior aprobación para darle inicio a la obra fisica.

Durante la reunión que se llevo a cabo e pasado 27 de febrero, se autorizó a la interventoría realizar la socialización cuanto antes. Sin embargo, la socialización, se hara cuando se contrate a la profesional social de la interventoría, la cual, esta sujeta a aprobación y autorización de su contratación por parte del INVIAS. Apenas sea autorizada su contratación esta interventotia realizara la socialización del proyecto, para darle inicio a las labores de campo.

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante la semana del 27 de febrero, se realizo el cambio de firmas en el Banco Av Villas en Bello, Antioquia, realizado entre el representante legal de interventoría y el de la Junta de Acción Comunal.
El mismo día, se llevo a cabo una reunión en la territorial Antioquia, donde se autorizo realizar la socialización del proyecto lo más pronto posible, junto a la visita técnica para verificar si es necesario utilizar el rubo de estudios y diseños.
El INVIAS quedo en dar la aprobación a la profesional social de interventoría, para su contratación y así poder realizar la socialización con la comunidad lo más pronto posible; también la aprobación de un inspector de obra.
A la fecha, ya se le aprobó todo el personal profesional inicial para el desarrollo del proyecto.
Se continua apoyando a la JAC sobre como gestionar todo la información preliminar solicitada para el desarrollo del proyecto.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la semana siguiente, se tiene programado realizar la socialización y la visita técnica , teniendo en cuenta que ya se debe contar con la profesional social de interventoría, después de realizada la socialización se gestionará el primer desembolso.

VIII. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA	**AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA**	**AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNUCACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. DESPUES DE REAIZAR EL CAMBIO DE FIRMAS, LA INTERVENTORÍA LE A SOLICITADO AL INVIAS LA APROBACIÓN DE LA SOCIAL, PARA PODER REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN LA SEMANA VENIDERA. ASÍ MISMO ENVIO LA HOJA DE VIDA DE LOS DEMAS PROFESIONALES A CONTRATAR PARA SU AUTORIZACIÓN Y PODER CONTRATARLOS E INICIAR LABORES.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 2520209749 7 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME SEMANAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA-CONTRUCCION DE ALCANTARILLAS

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA — SEMANA No.: 7 del 26/02/2024 al 29/02/2024 Último Informe Semanal ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MAURICIO HOYOS SIERRA — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: DIEGO FELIPE PAVON CARRILLO

OBJETO CONVENIO: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE 120 ML DE PLACA HUELLA - CONSTRUCCIÓN DE 2 UND DE ALCANTARILLA

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El OAC deberá desarrollar el objeto del Convenio en la vía terciaria ubicada en la zona de influencia de la VEREDA PALO BLANCO, DEL MUNICIPIO DE ITUANGO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas por el INSTITUTO de acuerdo con la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, documentos que hacen parte integral del Convenio. El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Ituango del departamento de Antioquia, teniendo como punto de referencia la coordenada inicial Norte: 7° 10' 23.52", Oeste: 75° 47' 21.84" y el punto de referencia la coordenada final Norte: 7° 11' 12.48", Oeste: 75° 47' 17.88', del tramo postulado por la comunidad de la JAC Vereda Palo Blanco para su intervención con el programa; conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Antioquia del INVIAS.

CONVENIO SOLIDARIO:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

CONVENIO No.	3180 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.447.374,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.447.374,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30 de abril de 2024		

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS.

INTEGRANTES:

CONTRATO No.	5066 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 188.780.410,00
FECHA DE INICIO:	12 de diciembre de 2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	30 de diciembre de 2023	VALOR ACUMULADO:	$ 188.780.410,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	23 de marzo de 2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONVENIO/ CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
CONVENIO	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA				
	SALDO DE VIGENCIA		$ 200.447.374,00		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 188.780.410,00		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ 6.197.348,64		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 182.583.061,36		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

CONVENIO

VALOR BÁSICO CONVENIO (A):	$ 200.447.374,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ -	%
(Estudios y Diseños, gestión social, ambiental, costos indirectos)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

Observaciones: A la fecha del presente informe, ya se realizo el cambio de firmas conjunta entre el presidente de la JAC Palo Blanco y el representante legal de la interventoría. La semana venidera se realizara la solicializacion y la visita tecnica del proyecto, para definir las cantidades a ajecutar con los recursos consignados.

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 18.878.041,00	10,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 6.197.348,64	3,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 2.696.863,00	1,43%
INVERSION EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 1.032.891,44	0,55%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %

Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico %

Meta Física (Programa de Obra)

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad
*			
*			
*			

Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada

Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					
Prog					
Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra incluido la revisión de los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Se debe relacionar la maquinaria y equipo presente en campo para la ejecución de las actividades según el anexo técnico

TRAMO Y/O SECTOR 1: ..... TRAMO Y/O SECTOR 2: .....

TRAMO Y/O SECTOR (n): .....

IV. GESTION AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO		
.....	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aún no ha iniciado obra física y tampoco ha entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra física, entreguen la documentación**.** La interventoria espera que durante la semana siguiente, se haga entrega de esta información.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A		
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A		
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A		
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A		
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A		
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A		
EMISIONES:	SI	NO	N/A		
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A		

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aún no ha iniciado obra física y tampoco ha entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra física, entreguen la documentación**.**

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: .....

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista aún no ha iniciado obra física y tampoco ha entregado los permisos referentes a la gestión ambiental. Esta interventoria ya les hizo la solicitud pertinente para que antes de iniciar obra física, entreguen la documentación**.**

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:		2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:		2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		1

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: .....

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: .....

ACTAS DE VECINDAD REALIZADAS: .....

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A la fecha del presente informe el contratista está en la logística de entregar la información solicitada por la interventoría referente a la documentación preliminar, que deben entregar, para su revisión y posterior aprobación para darle inicio a la obra física.
Durante esta semana el INVIAS autorizo la contratación de la profesional social, por ello, la semana siguiente será contratada la profesional y en ese orden de ideas, se planea iniciar con la socialización del proyecto en esa misma semana.

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: .....

VI. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

Durante esta semana se realizó una reunión virtual con el residente de obra de la vereda Palo Blanco, donde la interventoria les compartio los lineamientos a tener en cuenta durante la ejecución. A su vez, fue un espacio donde se aclararon dudas generales, se llego a un acuerdo en la reunión que la semana siguiente, el día 11 de marzo se llevará a cabo la socialización en la vereda Palo Blanco y también la visita técnica, siguiente a eso se debe realizar el balance de obra, con el cual se definiran las cantidades a ejecutar.
Se continua apoyando a la JAC sobre como gestionar todo la información preliminar solicitada para el desarrollo del proyecto..
Esta semana se recibió la aprobación para vincular a la profesional social por parte del INVIAS.

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la semana siguiente, se tiene programado realizar la socialización y la visita técnica, posteriormente se pueda realizar el balance de obra.

VIII. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del convenio.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA	**AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA**	**AUN NO SE HAN EJECUTADO ACTIVIDADES EN CAMPO O REUNION CON LA JAC, PARA DEJAR REGISTRO DE FOTOGRAFIA**

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA

A LA FECHA DE ESTE REPORTE LA INTERVENTORIA A ESTADO EN CONSTANTE COMUNUCACION LA JAC CON LA INTENCION DE APOYARLOS EN LO NECESARIO PARA QUE ELLOS PUEDAN CUMPLIR CON LA ENTREGA OPORTUNA DE LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA DARLE PRONTO INICIO FISICO AL PROYECTO. YA DESPUES DE HABER AUTORIZADO LA CONTRATACIÓN DE LA PROFESIONAL SOCIAL, LA INTERVENTORÍA DE INMEDIATO PROGRAMO LA SOCIALIZACION Y LA VISITA TECNICA, CON LA INTENCION DE DARLE CELERIDAD AL INICIO DE LAS LABORES EN FISICO.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA .....

NOMBRE: JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA

Matrícula Profesional No.: 25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29/02/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No: 3180-2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

MES Y AÑO DEL INFORME SEMANAL: FEBRERO DE 2024 **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			696
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24			

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Durante el periodo de tiempo reporta en este informe, el clima estuvo bajo fuertes soles y noches estrelladas.



Firma
Nombre: Julio Cesar Cordoba
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-351660 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

Radicado N°. 20249050043214 - PIN: 2988
Fecha: 2024-05-24 11:19 Anexos: 0
Destino: 905 RADICACION Remite: CONSTRUMAJ S
Consulte su trámite en:
https://www.ideam.gov.co

Bogotá, 24 de mayo de 2024

Señores
Instituto de Hidrología Meteorología y Estudios Ambientales
Ciudad

Asunto : INFORME PLUVIOMETRICO

Por medio de la presente se solicita, Registro pluviométrico correspondiente a la Estación más cercana a la vereda "Palo Blanco" en el municipio de Ituango en el departamento de Antioquia. De los siguientes meses:
· Enero.
· Febrero
· Marzo
· Abril

Se adjuntan los siguientes archivos:

Por favor responder a través de mi correo electrónico: cmaj2022@gmail.com

Atentamente,

CONSTRUMAJ SAS
Documento: 901563205
Cra 58 #90-53 BOGOTA D.C, BOGOTA D.C..
COLOMBIA
Tel. 6013225888
cmaj2022@gmail.com

FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONVENIO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 29 (Día) 2 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 3180 de 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA NIT. 900.398.878-2

OBJETO DEL CONTRATO:

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

FECHA DE INICIO: 12 de Diciembre de 2023

PLAZO INICIAL: 13 Días

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 de abril de 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.447.374,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.447.374,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSTRUMAJ SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONVENIO SOLIDARIO

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.089.474,80	8	9	2023	31	10	2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.022.368,70	8	9	2023	31	12	2026
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.134.212,20	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100283190

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 27/09/2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONVENIO

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232.000.000,00	8	9	2023	31	12	2023

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100068986 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 27/09/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	20%	$ 40.089.474,80	8	9	2023	1	3	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	$ 10.022.368,70	8	9	2023	30	4	2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 60.134.212,20	30	4	2024	30	4	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100283190

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 20/03/2024

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	200 SMMLV	8	9	2023	30	4	2024

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. NB- 100068986 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 20/03/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Juan Diego Jimenez Serna
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202097497 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®
tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S A
Date: 2023.09.20 08:40:06 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: qGNF9kvPE/3dBcOxs9sSHw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-TPSUS2R000000859-D00I

No. PÓLIZA	NB-100283190	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71748932	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO BLANCO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.398.878-2
DIRECCIÓN	VDA PALO BLANCO FCA LAS BRISAS	**TELÉFONO**	3206423560
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	6028239629
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	CALLE 25 G NO. 73B-90	**TELÉFONO**	6028239629

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3180-2023 DEL 08/09/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO CON NIT 900.398.878-2

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/09/2023	24:00 Horas Del 31/10/2024	40.089.474,80	138.061,56
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/09/2023	24:00 Horas Del 31/12/2026	10.022.368,70	99.674,52
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 31/12/2023	24:00 Horas Del 31/12/2028	60.134.212,20	903.001,69
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.246.055,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS L	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	1.140.737,77
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.140.737,77
GASTOS EXP.	$	7.800,00
IVA	$	218.222,18
TOTAL A PAGAR	$	1.366.759,95

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 19/09/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE. SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Juan Zapata
TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
SUJETO A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
FASECOLDA A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - ADR

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100283190	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71748932	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	20/09/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/09/2023	24:00 Horas Del	31/12/2028		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 08/09/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3180-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cuidemos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Proteja el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

FIJADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT. 860.037.013-6

CERTIFICA

Que **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO BLANCO** identificado con **NIT 900398878** a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de recaudo de primas de la póliza de Cumplimiento **100283190**, certificado **71748932.**

La presente se expide a solicitud del interesado al día Veintidós (22) del mes de septiembre (09) de 2023.

Cordial saludo,

Karol Rodriguez

GERENCIA NACIONAL DE CARTERA
CRÉDITO Y COMISIONES

Elaboró: Karol Rodriguez.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LÍNEAS DE ATENCIÓN EN BOGOTÁ (+601) 327 4712 / 13 | LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 | CELULAR #935 | PÁGINA WEB www.segurosmundial.com.co

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2024.02.26 15:25:49 -05:00

Código de Seguridad: 2aDlJgycoQX6FyzgOu962w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100283190	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71887801	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO BLANCO	**No. DOC. IDENTIDAD**	900.398.878-2
DIRECCIÓN	VDA PALO BLANCO FCA LAS BRISAS	**TELÉFONO**	3206423560
ASEGURADO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	RAPPI SAS	**TELÉFONO**	3770600
BENEFICIARIO	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	**No. DOC. IDENTIDAD**	800.215.807-2
DIRECCIÓN	RAPPI SAS	**TELÉFONO**	3770600

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA PRÓRROGA NÚMERO 01 DE 2024, SE AJUSTA VIGENCIAS.
GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL OAC HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO Y LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCION REFERENTE AL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3180-2023 DEL 08/09/2023 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, DE ACUERDO CON LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SOLIDARIO.

TOMADOR / GARANTIZADO: LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO CON NIT 900.398.878-2

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 08/09/2023	24:00 Horas Del 01/03/2025	40.089.474,80	39.869,81
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 08/09/2023	24:00 Horas Del 30/04/2027	10.022.368,70	9.885,08
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 30/04/2024	24:00 Horas Del 30/04/2029	60.134.212,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 110.246.055,70	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA SOLUTIONS &	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	49.754,89
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	49.754,89
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	9.453,43
TOTAL A PAGAR	$	59.208,32

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/02/2024

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LÍNEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

Juan Zapata
TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y P&SA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	NB-100283190	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	71887801	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	26/02/2024	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTA		

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/09/2023	24:00 Horas Del	30/04/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

NOTA 1: EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONVENIO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONVENIO.
NOTA 2: LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN, SU VIGENCIA ES DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO DEFINITIVO DE LAS OBRAS.
NOTA 3: QUE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIA VIGENCIA A PARTIR DEL 08/09/2023 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO PRINCIPAL 3180-2023, DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA NOVENA NUMERAL 20.3 DEL CONVENIO SOLIDARIO.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.


Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **NB-100283190** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO BLANCO** Asegurado o Beneficiario: **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS / INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS** , expedida por la Compañía en **26/02/2024,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTA a los **26** días del mes **FEBRERO** del año **2024**.



Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT. 860.037.013-6

CERTIFICA

Que **JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PALO BLANCO** identificado con **NIT 900398878** a la fecha se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de recaudo de primas de la póliza de Cumplimiento **100283190**, certificado **71887801.**

La presente se expide a solicitud del interesado al día Diecinueve (19) del mes de Marzo (03) de 2024.

Cordial saludo,

GERENCIA NACIONAL DE CARTERA
CRÉDITO Y COMISIONES

Elaboró: Valentina Carreño.



FORMATO MEPI-MN1-IN-14.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2024 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONVENIO No. 4002-2023, 4082-2023, 3180-2023, 3502-3023, 3705-2023
(Indicar número de contrato y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL: JAC vereda Correntoso y Corrales Nech, Palo Blanco, Ituango, Los Naranjos, Briceño y Astillero, Valdivia

OBJETO DEL CONVENIO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNALES VEREDAS CORRALES Y CORRENTOSO, DEL MUNICIPIO DE NECHÍ DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5066 de 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSTRUMAJ SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

EN TERMINOS GENERALES EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN ES, DEFINIR LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA FISICA DE LOS CONVENIOS DE LAS JAC VEREDA CORRENTOSO Y CORRALES NECHÍ, PALO BLANCO, ITUANGO, LOS NARANJOS, BRICEÑO Y ASTILLERO, VALDIVIA. TAMBIEN SE TOCARÓN OTROS TEMAS, QUE ACONTINUACIÓN SE EVIDENCIAN EN EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

CONVENIOS SOLIDARIOS

1. SOCIALIZACION INICIAL
2. ESTUDIOS Y DISEÑOS
3. TRAMITES DE DESEMBOLSO
4. VINCULACION DEL PERSONAL

CONTRATO INTERVENTORIA

1. TRAMITE ANTICIPO
2. APROBACION PERSONAL
3. LISTA DE CHEQUEO ACTA
4. FECHA DE CORTES, ACTAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

CONVENIOS SOLIDARIOS

1. SOCIALIZACION INICIAL
Estar pendiente de la aprobación de la hoja de vida de la social para que sea contratada de inmediato. Porque apenas la social este contratada, la interventoría tiene autonomía para poder hacer la socialización y la visita técnica en las distintas veredas de los convenios, lo antes posible.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2023 (Día / Mes / Año)

2. ESTUDIOS Y DISEÑOS

El director Mauricio ha expresado que se evitarán la realización de estudios y diseños, a menos que sean estrictamente necesarios, ya que la ejecución de los convenios se llevará a cabo conforme a la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales. En caso de que, tras realizar visitas técnicas, se identifique la necesidad de contar con el concepto de un especialista, se llevará a cabo dicho estudio. En caso contrario, los recursos destinados para este fin podrán ser reasignados a otras actividades que contribuyan al rendimiento de la ejecución de las obras.

En relación con los demás convenios, durante la ejecución del proyecto se evaluará cómo emplear de manera eficiente el rubro de estudios y diseño, buscando maximizar su rendimiento en otras actividades relacionadas.

3. TRAMITES DE DESEMBOLSO

Para los desembolsos el pago de nómina de los trabajadores, se les puede autorizar transferencia a nequi a cada uno de los trabajadores, o por medio de retiro y se les paga en efectivo y se entrega su soporte firmado.
Para el retiro del dinero en los bancos, debe hacer con un carta firmada por el representante legal de interventoría y el presidente de la junta y esta carta se le envía al gerente y subgerente. Esto seria para las cuentas en el banco AV Villas.
Para los soportes de desembolso se deben de entregar facturas y cuenta de cobro y donde se entregue factura el contador de la junta se encarga de hacer el documento equivalente.
El director Mauricio autoriza a la interventoría para que hagan un desembolso a las JAC para que puedan ir comprando material, haciendo exámenes del personal de obra, comprando dotación y paga de las pólizas.

4. VINCULACION DEL PERSONAL

Se puede tener el mismo residente de obra en las dos veredas de nechí. La junta ya puede hacer exámenes de ingreso del personal.

CONTRATO INTERVENTORIA

1. TRAMITE ANTICIPO

Se recomienda por parte de la territorial no solicitar anticipo, por todo el trámite que se necesita para ello, entonces es más fácil pasar actas de cobro cada 5 días después del mes vencido.

2. APROBACION PERSONAL
La territorial se comprometa gestionar para que lo mas pronto se apruebe el personal. Se solicita enviar la hoja de vida de un inspector para que se apruebe de una vez y la social también se aprobara pronto.

3. LISTA DE CHEQUEO ACTA
La territorial quedo de enviar la lista a la interventoría el día miércoles 28 de Febrero de 2024.

4. FECHA DE CORTES, ACTAS
Los primeros cincos días del mes.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Compartir a la interventoria la lista de chequeo, para las actas parciales de interventoria.	miercoles 28/02/2024	María Camila Ramírez Super. INVIAS
La interventoria se compromete a enviar las hojas de vida del personal, pendiente por aprobar para ser contratado y poder hacer la socializacion y la visita tecnica cuanto antes.	miercoles 28/02/2024	Julio Córdoba. INTERVENTORÍA
El INVIAS en representacion de la ingeniera María Camila Ramírez se comprome a aprobar el personal de la interventoria, para su contratacion inmediata.	jueves 29/02/2024	María Camila Ramírez Super. INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 27/02/2023 (Día / Mes / Año)


FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ..... (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Convenio ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
María Camila Ramírez	Apoyo - Supervisor	INVIAS	
Julio Córdoba	Residente Interventoria	CONSTRUMAJ SAS	
Mauricio Hoyos	Director	INVIAS	
Yalile Isaac Toscano	Abogada	INVIAS	
Giovanni Luchini	Representante legal interventoría	CONSTRUMAJ SAS	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INFORME DE ESPECIALISTA EN VÍAS.

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1.



Juan Diego Jimenez Serna
Especialista En Vías

INFORME N°:	FECHA DE ELABORACIÓN	PRESENTADO POR:	PRESENTADO A:
1	29 DE FEBRERO DE 2024	CONSTRUMAJ S.A.S.	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS

1. ACTIVIDADES EJECUTADAS

1.1. ESPECIALISTA EN VIAS

En el presente periodo se llevó a cabo la revisión de los siguientes documentos remitidos por los contratistas, así:

CONVENIO SOLIDARIO No. 3180 DE 2023 - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PALO BLANCO DEL MUNICIPIO DE ITUANGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Se procedió a la revisión de los documentos recibidos por parte del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, lo que constituyó la base de revisión para el presente informe, encontrando lo siguiente:

1. Se verificaron las hojas de cálculo, encontrando documentación faltante, como el levantamiento topográfico realizado, el cual no se anexó.

2. Falta claridad bajo qué plano tipo se trabajarán las huellas, en el archivo recibido no se menciona, en los anexos técnicos se da entender que será bajo la cartilla de Colombia Rural, la cual es la que rige actualmente para este tipo de proyectos, mediante la Resolución No 2483 del 19 de octubre de 2020.

3. No hay información técnica de CBR`s de diseño, por lo tanto, se deberá verificar con la inspección visual que se realice en campo el estado actual de los tramos de intervención y de verlo necesario, realizar los ensayos pertinentes para tener certeza en la implementación de los diseños tipo en terreno.

4. Hay que dejar la salvedad que al trabajar con la Cartilla de Obras Menores de drenaje y estructuras viales programa Colombia Rural, los planos contenidos, son planos tipo, lo que no nos puede alejar de implementar en campo algún cambio acorde a las necesidades específicas de cada proyecto.

5. Se debe prestar especial atención al diseño del sistema de drenaje de la vía para evitar la acumulación de agua en la superficie del pavimento. Esto es crucial para prevenir problemas como la erosión, el deterioro prematuro del pavimento y la formación de baches. Se deben verificar en campo la necesidad de descoles de cunetas, alcantarillas y sistemas de drenaje longitudinal y transversal.
