CONSORCIO BOLIVAR

ALCALDIA DE BOGOTA- SECRETARIA DE GOBIERNO

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) MENSUAL 4

01 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO

2024

CONTRATO COP-466/2023

"REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
V-0	20 MAYO 2024	Versión inicial

Elaborado y/o actualizado por	validado por: RESPONSABLE DIRECTIVO:	Aprobado
 C.C. 52.336150 Licencia No. 255149 firma:	firma:	firma:
Nombre: SST Nelcy Aldana Carrillo. Cargo: Residente SST- de contratista Consorcio Bolívar	Nombre: ING. JOSE Cargo: director de obra CONSORCIO BOLIVAR	Nombre: Cargo: Residente de Obra

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN **2**

1. OBJETIVOS **3**

2. 1.1 OBJETIVOS GENERALES **3**

1.1.2 LOCALIZACION *3*

3. ASISTENCIA A LAS REUNIONES PROGRAMADAS-COMITES DE OBRA **5**

4. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO **5**

5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST: **6**

5.1. 1 AFILIACIONES **6**

5.1.2 EXÁMENES OCUPACIONALES. **7**

5.1.6 CRONOGRAMA: ACTIVIDADES PLANEADAS VS EJECUTADAS **12**

5.1.7 Actividades de promoción y prevención **13**

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

ÍNDICE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 localización general ..... **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 2 Acercamiento localización predio Google maps **¡Error! Marcador no definido.**
Ilustración 3 planteamiento de desarrollo de obra (grafico emitido por el contratista) 5

ANEXOS

1. ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATISTA DE OBRA
2. CERTIFICADO DE LA ARL -CERO ACCIDENTES
3. ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se presenta las actividades realizadas al contrato COP No. -466 DE 2023, del contratista CONSORCIO BOLIVAR. En el cual se describe en detalle la gestión de la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental, *REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ*".

Es por ello que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del Consorcio Bolívar , es un sistema dinámico el cual permite optimizar las acciones preventivas durante el proceso de ejecución de los trabajos, ejecutados por el contratista con el propósito de reducir al mínimo los accidentes e incidentes laborales, daños al Ambiente, entre otros, mediante un control de los riesgos basados en el principio de la mejora continua y orientadas a salvaguardar la integridad física y la vida de los trabajadores, a terceros, los daños a la propiedad, al Medio Ambiente y evitar las pérdidas económicas, para todas las partes interesadas.

1. OBJETIVOS

2. 1.1 Objetivos Generales

Verificar en cumplimiento de las actividades ejecutadas por el Contratista de obra dando cumplimiento al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), según las obligaciones establecidas en el contrato de REALIZAR EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES LOCATIVAS POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EN LOS SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ"

Presentar el resumen de las actividades ejecutadas por la Interventoría, para el presente período del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) dando cumplimiento a las obligaciones del en el contrato de interventoría de *OBRA CIVIL ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DEL CASINO DE EMPLEADOS FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA (FAGECOR)*y demás normatividad vigente en materia de SG-SST

1.1.2 LOCALIZACION


Dentro de las actividades desarrolladas en el periodo de febrero se realizó la visita de los inmuebles objeto de intervención, estos están distribuidos en toda la localidad como se evidencia en la imagen.

Tabla 1 *localización proyecto*

Ilustración 1 *Localización predio*



Ilustración 2 *Localización predio Google maps*

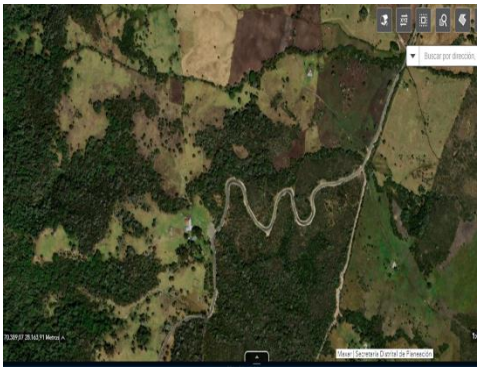





3. ASISTENCIA A LAS REUNIONES PROGRAMADAS-COMITES DE OBRA

Tabla 2 Comités de obra

No.	FECHA	TIPO	PARTICIPANTES	TEMA CENTRAL
1	02/05/2024	Reunión virtual	Supervisión – Interventoría y el contratista	Reunión Comité de obra. Seguimiento de avance.
2	09/05/2024	Reunión virtual	Supervisión – Interventoría y el contratista	Reunión Comité de obra. Seguimiento de avance.
3	16/05/2024	Reunión virtual	Supervisión – Interventoría y el contratista	Reunión Comité de obra. Seguimiento de avance
4	23/05/2024	Reunión virtual	Supervisión – Interventoría y el contratista	Reunión Comité de obra. Seguimiento de avance

Fuente: CONSORCIO BOLIVAR -.2024

4. ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el período del 01 de mayo a 31 de mayo del año en curso el CONSORCIO BOLIVAR

A. Actividades del contratista avance del proyecto:

- Se hizo la revisión de los documentos del vehículo que ingreso a descargar material para la obra
- Se hizo la inducción y reinducción del SG-SST, al personal nuevo que ingreso a obra en el presente mes
- Se hizo la verificación del cumplimento con los requisitos del personal de obra civil que ingresa a realizar actividades en el proyecto
- Se llevo a cabo en campo de las charlas de seguridad diarias al personal operativo
- Se realizo en campo de la charla de prevención diaria al personal operativo
- Se hizo acompañamiento de la realización de las pausas activas del personal operativo.
- Se hizo la entrega de los EPP al personal
- Se realizo la inspección de equipos de alto riesgo, asimismo los ATS y los permisos para trabajo de alto riesgo.
- Se hizo la verificación de los exámenes ocupacionales del personal nuevo y se difundieron las cartas de recomendación

- Se hizo la verificación de las planillas del pago de la seguridad social del personal del Contratista correspondiente al mes de 01 mayo a 31 de mayo de 2024.
- Se hizo el seguimiento al cumplimento de los indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral.

Tabla 4 oficios enviados

Fuente: CONSORCIO BOLIVAR

N° consecutivo	Fecha de oficial	Dirigido a	Asunto
SUM-BOLÍVAR-124	22/05/2024	CONSORCIO CIVIL PRO	Respuesta a oficio con el Radicado No. CCP-2024-132
SUM-BOLÍVAR-127	22/05/2024	CONSORCIO CIVIL PRO	Envió listado de personal que inicia trabajo en altura -en los salones Auras y Tunal

5. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST:

5.1. 1 afiliaciones

Para el presente periodo se presentó ingreso de personal nuevo al proyecto, por lo tanto, se llevó a cabo se verificación de los documentos del pago de las planillas de seguridad y las afiliaciones correspondientes al mes de mayo del 2024.

Tabla 5 Personal que integra el consorcio - Periodo 01 de mayo al 31 de mayo del 2024

PERFILES POR CARGO	
CARGO POR DESEMPEÑAR	**NOMBRE Y APELLIDO**
DIRECTOR DE OBRA	JOSE LUIS VEGA CABALLERO
INGENNIERO RESIDENTE	MILTON CAMILO JIMENEZ COLMENARES
AUXILIAR RESIDENTE	JIMMY BRAYAN DELGADO TORRES
PROFRESIONAL SOCIAL	MARIA PAULA GARAY
PROOFESION AMBIETAL	NORA CRISITINA BERNAL

PROFESIONAL - SST	NELCY ALDANA CARRILLO
AUXILIAR SST	MIGUEL ANGEL CUERVO DIAZ
ALAN RODRIGUEZ	CONDUCTOR Y LOGISTICA
ARMANDO AÑES	MAESTRO
JEFERSON JOSE OLIVEROS	AYUDANTE
MARDONIO ALFONSO	MAESTRO
JHONATAN VELASQUEZ	AYUDANTE
YOHENDRY GONZALEZ	ALBAÑIL
JHONATAN ANDRES DELGADO HERNANDEZ	AYUDANTE
MILTON MILLER CABRERA BOTINA	ALBAÑIL
JUAN PABLO PINTA VASQUEZ	AYUDANTE
CRISTIAN CAMILO ARTEAGA CORAL	AYUDANTE
DIEGO JAVIER TIMANA	AYUDANTE
EIVAR ARMANDO	MAESTRO
OSCAR ANDRES PUERRES	ALBAÑIL
CESAR ALMENJO SUSA MAYORGA	AYUDANTE
ROGELIO BERNAL	SOLDADOR
EDINSON ANCIZAR DIAMTE SUSA	AYUDANTE

Fuente: CONSORCIO BOLIVAR -MAYO-2024

(Anexo No. 1 - Planillas de Seguridad Social Consorcio Bolívar)

5.1.2 Exámenes Ocupacionales.

Dando cumplimiento a las obligaciones contractuales, el Consorcio Bolívar realizo las cartas de seguimiento de las recomendaciones dejadas por parte de la IPS del personal que ingresa nuevo, dejando como evidencia la difusión con la firma del personal en las cartas, para lo cual cada mes de verifica que se cumplan con esas recomendaciones dejadas en el examen médico ocupacional.

5.1.3 Inducciones en Seguridad y Salud en el Trabajo

En cumplimiento a las obligaciones en la implementación del SGSST, se llevó a cabo la inducción del SG-SST del personal que ingreso a realizar actividades de obra en el mes de mayo de 2024.

Fotografía 1. Inducción al personal que ingresa al ejecutar labores en el proyecto de obra	**Fotografía 2**. Inducción al personal que ingresa al proyecto de obra
	

5.1.4 Uso de EPP´s adecuadamente

El Consorcio Bolívar en el presente periodo realizo entregas de Elementos de Protección Personal (EPP´s), ya que se han realizado las actividades de avance de obra en campo, así mismo, se evidencia en el formato de entrega de estos, de la misma forma se registra el buen uso de estos, como se en el registro fotográfico, cabe

mencionar que se da la capacitación y charlas diarios de las recomendaciones generales sobre el uso adecuado de elementos de protección de seguridad**.**


Fotografía 1. Evidencia del buen uso de los EPP	**Fotografía 2**. Uso adecuado de los EPP
	

Fotografía 1. Evidencia de las pausas activas	**Fotografía 2**. Realización de las pausas activas en campo
 	 

Fuente: Consorcio Bolívar

5.1.5 Accidentes e incidentes


Para el presente período y de acuerdo con el seguimiento del mes de mayo del año en curso, no se presentaron incidentes, ni accidentes de trabajo, ya que se están llevando a cabo actividades en campo con el personal operativo, por lo tanto, se llevan 50 días calendario con cero incidentes y cero accidentes de trabajo.

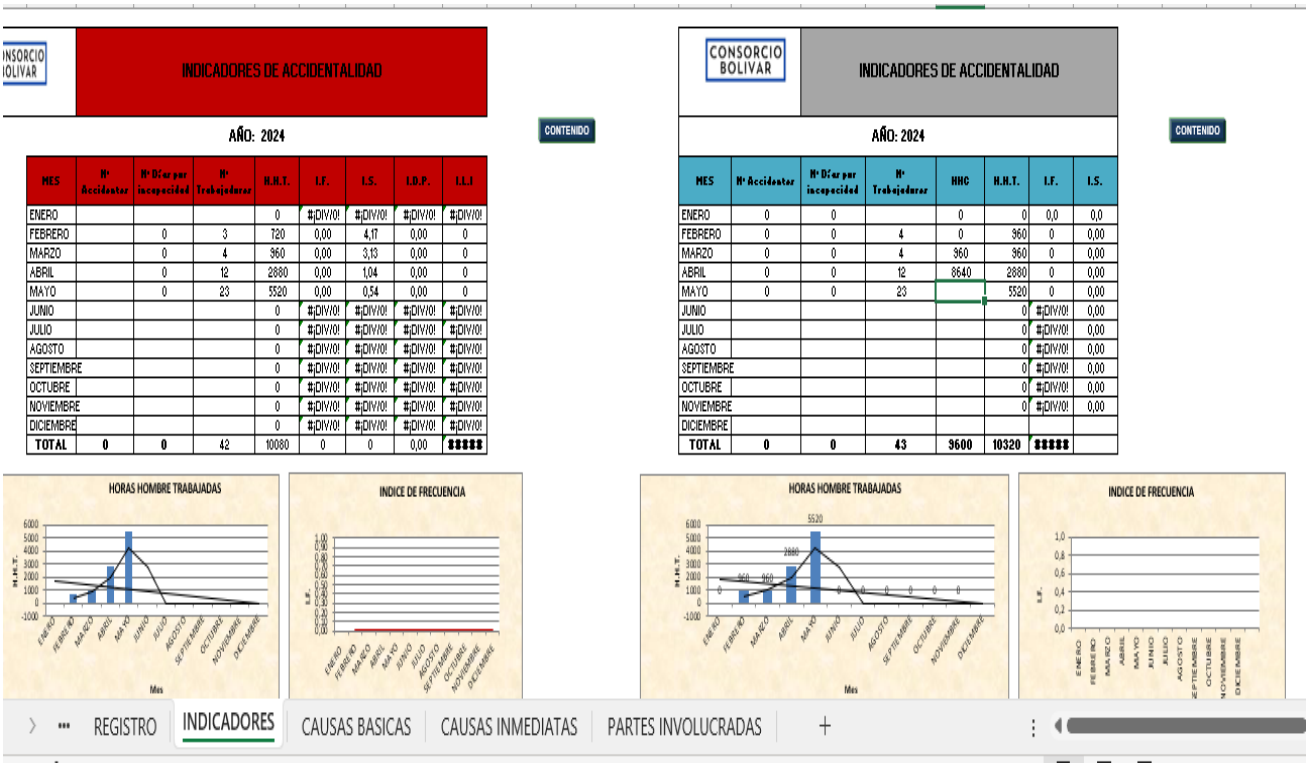

Anexo 2: Certificado de la ARL Cero accidentes

Tabla No.6 Indicador -Resolución 0312 consorcio Bolívar

MES	Frecuencia de los accidentes	Severidad de los accidentes	Prevalencia de la enfermedad	Incidencia de la enfermada	Ausentismo por causa medica
01 de mayo al 31 -2024	0	0	0	0	0

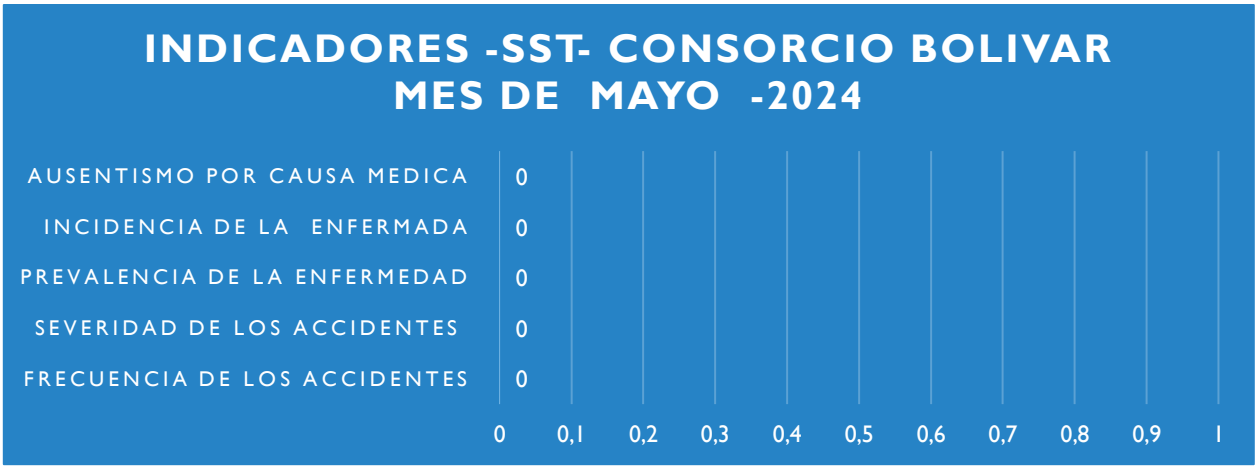

Fuente: Consorcio -Bolívar – mayo 2024

5.1.6 Cronograma: Actividades planeadas vs ejecutadas

El consorcio Bolívar en este período comprendido entre mayo de 2024, realiza las siguientes actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), teniendo en cuenta las observaciones realizadas por de la Ingeniera SST de la Interventoría en cuenta los siguientes documentos aportados:

Tabla 7 Cronograma de Actividades planeadas Vr ejecutadas

DOCUMENTOS APORTADOS Y VERIFICADOS	OBSERVACIONES
Se hizo el diseño los siguientes procedimientos	Se hizo el diseño de los documentos de trabajo en caliente Se hizo la actualización del procedimiento para los exámenes ocupacionales
Se realizara las siguientes campañas	En prevención de consume de alcohol y sustancias psicoactivas
Se realizó la actualización de las actividades mensuales propias para dar avance al SG-SST	Se llevo a cabo el seguimiento a la matriz de indicadores, el diseño de plan de trabajo y plan de capacitación mes de mayo - 2024

Fuente Consorcio BOLIVAR

5.1.7 Actividades de promoción y prevención

CHARLAS SST MES DE MAYO DE 2024-CONSORCIO BOLIVAR				
2/05/2024	Manejo de herramientas manuales	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
3/05/2024	Prevencion en riesgo locativo	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
6/05/2024	Induccion de SG-SST	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	15
6/05/2024	Uso de EPP	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	7
7/05/2024	Prevencion en riesgo locativo	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
8/05/2024	Exceso de confianza en el trabajo	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
9/05/2024	Prevencion por manejo de herramientas	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
10/05/2024	Prevencion de caida de su mismo nivel	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	11
11/05/2024	Orden y aseo en puestos de trabajo	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
14/05/2024	Uso del cuidado de los epp	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	4
15/05/2024	Trabajo en equipo	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	5
16/05/2024	Manejo de equipos y herramientas	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	4
17/05/2024	Prevencion de caidas al mismo nivel	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	12
18/05/2024	Auto cuidado o mutuo cuidado	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	11
19/05/2024	Riesgo publico	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
21/05/2024	Actos y condiciones inseguras	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	7
23/05/2024	Auto cuidado o mutuo cuidado	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
24/05/2024	Trabajo en alturas con andamios	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	5
24/05/2024	Uso adecuado de epp	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	5
25/05/2024	Trabajo en equipo	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	5
27/05/2024	Trabajo en alturas uso de epcc	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	6
27/05/2024	Uso obligatorio de epcc	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	5
29/05/2024	uso de epp y epcc	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	10
30/05/2024	Uso de herramientas manuales	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	10
31/05/2024	Uso obligatorio de epcc	PERSONAL QUE ASISTIO	CANT	10

CHARLAS PROGRAMADAS	25
CHARLAS EJECUTADAS	25
CHARLAS REPROGRAMADAS	0

OTRAS ACTIVIDADES SG-SST

- Se hace la inspección de los documentos del vehículo que ingresa a obra que cumplan con el plan de seguridad vial
- Se hizo verificación de trabajo de alto riesgo y se hacen los ATS diariamente.
- Se llevaron a cabo las pausas activas al personal de obra
- Se hace la inspección de las herramientas
  Se verificaron los cursos de altura del personal de obra
- Se hicieron las cartas de recomendaciones medica de acuerdo con el resultado de los exámenes ocupacionales
- Formatos de entrega de EPP
- Formatos de inducción al personal nuevo
- Formato actualizado del perfil sociodemográfico del personal del Consorcio
- Difusión política de prevención consumo
- Difusión Reglamento de Higienes y Seguridad

Anexo 3: actividades de implementación del SG-SST

Fuente Consorcio BOLIVAR


Fotografía 1. Inspección elementos de trabajo en caliente



Fuente Consorcio Bolívar.

Fotografía 1. Acompañamiento en campo	**Fotografía2.** Acompañamiento en campo
	

Fuente Consorcio Bolívar

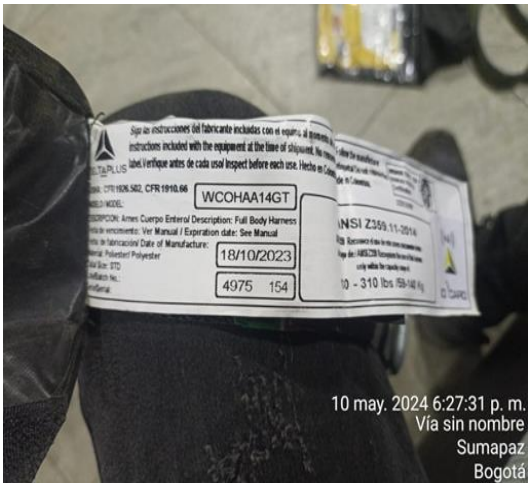Fotografía 1. Inspección de equipos	**Fotografía 2.** Acompañamiento en campo de las actividades propias del SG-SST
	

Fuente Consorcio. Bolívar

9. CONCLUSIONES

AREA SST

El consorcio Bolívar comprometido con la Seguridad y Salud en el Trabajo, ha venido dando el cumplimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, facilitando el avance al diseño e implementación de este, de la misma forma, ha convocado y participado en comité de seguimiento semanal, visitas a las áreas de intervención de la etapa de ejecución de obra.

- Las actividades ejecutadas en el presente período han sido referentes a la ejecución de estas, las cuales, han sido desarrolladas en campo (como avance de la obra) en donde a la fecha llevan 50 días calendario con cero incidentes y cero accidentes de trabajo.

- No se presentaron incidentes, ni accidentes de trabajo, ni enfermedades laborales por parte de interventoría, ni por parte de contratista (indicador en ceros para el presente mes)

- Se ha dado avance con la ejecución de actividades de promoción y prevención, higiene y seguridad industrial y medicina preventiva, con el fin de prevenir accidentes y enfermes laborales de nuestro personal
