Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	feb
1				**TUNAL ALTO**	**156,75 días**	**jue 1/02/24**	**mié 14/08/24**	**$ 396.263.408**	**59%**	
2			**1**	**PRELIMINARES**	**144,75 días**	**jue 1/02/24**	**mar 30/07/24**	**$ 15.285.585**	**18%**	
3	✓		1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	lun 8/04/24	lun 8/04/24	$ 968.660	100%	
4			1,02	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	1 día	mar 9/04/24	mar 9/04/24	$ 127.575	28%	
5			1,03	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24	$ 6.337.742	95%	
6	✓		1,04	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M	2 días	mar 9/04/24	mié 10/04/24	$ 250.044	100%	
7	✓		1,05	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	2 días	vie 12/04/24	lun 15/04/24	$ 217.696	100%	
8	✓		1,06	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	3 días	lun 24/06/24	jue 27/06/24	$ 2.404.426	100%	
9	✓		1,07	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	2 días	lun 29/07/24	mar 30/07/24	$ 35.076	100%	
10	✓		1,08	DESMONTE VENTANAS	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24	$ 74.563	100%	
11			1,09	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	101 días	jue 1/02/24	vie 7/06/24	$ 3.257.666	0%	
12			1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	$ 1.449.646	97%	
13	✓		1,11	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,1	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	$ 162.491	100%	
14			**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**26 días**	**lun 15/04/24**	**jue 16/05/24**	**$ 13.043.673**	**94%**	
15			2,01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTA	26 días	lun 15/04/24	jue 16/05/24	$ 7.803.004	88%	
16	✓		2,02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NE	26 días	lun 15/04/24	jue 16/05/24	$ 5.240.669	100%	
17			**3**	**CIMENTACIÓN**	**6 días**	**jue 16/05/24**	**jue 23/05/24**	**$ 1.486.377**	**97%**	
18			3,01	CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) 6	1 día	jue 16/05/24	vie 17/05/24	$ 538.213	95%	
19			3,02	VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,25X0,25) I	3 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	$ 948.164	98%	
20	✓		**4**	**ACEROS Y MALLAS**	**51 días**	**mar 21/05/24**	**lun 22/07/24**	**$ 1.378.371**	**100%**	
21	✓		4,01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN DE DISTANCIADORES	51 días	mar 21/05/24	lun 22/07/24	$ 1.378.371	100%	
22	✓		**5**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**12 días**	**jue 16/05/24**	**jue 30/05/24**	**$ 25.815.178**	**100%**	

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	feb
23	✓		5.01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE	4 días	jue 16/05/24	mar 21/05/24	$ 19.580.919	100%	
24	✓		5,02	VIGA CINTA O DE CORONACION CONCRE	4 días	sáb 25/05/24	jue 30/05/24	$ 4.445.871	100%	
25	✓		5,03	COLUMNETA NUEVA CC2-B(0,12X0,12M) CONFINANTE EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX,	2 días	mar 21/05/24	jue 23/05/24	$ 1.788.388	100%	
26			**6**	**ANCLAJES**	**2 días**	**jue 23/05/24**	**sáb 25/05/24**	**$ 1.412.352**	**33%**	
27			6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE	2 días	jue 23/05/24	sáb 25/05/24	$ 1.412.352	33%	
28			**7**	**ACOMETIDAS HIDRAULICAS**	**4 días**	**mar 21/05/24**	**sáb 25/05/24**	**$ 2.679.522**	**0%**	
29			7,01	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2"	4 días	mar 21/05/24	sáb 25/05/24	$ 2.679.522	0%	
30			**8**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**65,5 días**	**jue 16/05/24**	**sáb 3/08/24**	**$ 10.688.789**	**89%**	
31			8,01	PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	40 días	lun 10/06/24	sáb 27/07/24	$ 277.790	80%	
32			8,02	REGISTRO RED WHITE DE ½"	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24	$ 75.349	0%	
33			8,03	TAPA REGISTRO 20X20 CM	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	$ 62.103	0%	
34			8,04	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	3 días	mié 31/07/24	sáb 3/08/24	$ 454.012	47%	
35			8,05	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE DIA	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24	$ 45.269	0%	
36			8,06	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	3 días	mié 31/07/24	sáb 3/08/24	$ 282.094	51%	
37	✓		8,07	TUBERÍA PVC S 2"	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$ 329.995	100%	
38			8,08	TUBERÍA PVC S 3"	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	$ 64.158	60%	
39			8,09	TUBERÍA PVC S 4"	58 días	jue 16/05/24	jue 25/07/24	$ 740.099	94%	
40			8,10	CAJA DE INSPECCIÓN 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA	3 días	mié 31/07/24	vie 2/08/24	$ 914.787	50%	
41	✓		8,11	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	2 días	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	$ 313.326	100%	

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
42		8,12	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"	2 días	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	$ 108.990	100%
43		8,13	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	2 días	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	$ 315.951	100%
44		8,14	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SO	2 días	sáb 6/07/24	mar 9/07/24	$ 1.310.883	100%
45		8,15	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	2 días	jue 25/07/24	vie 26/07/24	$ 3.150.576	100%
46		8,16	GEOTEXTIL NO TEJIDO	1 día	jue 16/05/24	vie 17/05/24	$ 1.379.391	100%
47		8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PV	2 días	lun 20/05/24	mié 22/05/24	$ 55.000	100%
48		8,18	ACESORIOS RED SANITARIA 2"	3 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	$ 262.574	81%
49		8,19	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	3 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	$ 54.532	50%
50		8,20	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	60 días	lun 20/05/24	mié 31/07/24	$ 491.910	100%
51		**9**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**1 día**	**mar 13/08/24**	**mar 13/08/24**	**$ 865.800**	**0%**
52		9,01	ASEO GENERAL	1 día	mar 13/08/24	mar 13/08/24	$ 865.800	0%
53		**10**	**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS**	**12 días**	**lun 8/07/24**	**lun 22/07/24**	**$ 25.458.805**	**100%**
54		10,01	CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA ECOROC	12 días	lun 8/07/24	lun 22/07/24	$ 25.458.805	100%
55		**11**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**15,75 días**	**lun 22/07/24**	**vie 9/08/24**	**$ 7.710.501**	**0%**
56		11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA T	1 día	mié 7/08/24	jue 8/08/24	$ 665.784	0%
57		11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUM	1 día	mié 7/08/24	jue 8/08/24	$ 998.631	0%
58		11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO	1 día	jue 8/08/24	vie 9/08/24	$ 156.204	0%
59		11,04	BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAÑOS- E	1 día	jue 8/08/24	vie 9/08/24	$ 31.425	0%
60		11,05	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	2 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	$ 84.295	0%
61		11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECC	2 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	$ 633.112	0%
62		11,07	TUBERÍA EMT GALVANIZADA 3/4"	4 días	vie 2/08/24	mié 7/08/24	$ 4.603.136	0%
63		11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE S	3 días	lun 22/07/24	mié 24/07/24	$ 537.914	0%
64		**12**	**MAMPOSTERIA**	**54,25 días**	**mar 21/05/24**	**jue 25/07/24**	**$ 2.711.279**	**75%**

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
65		12,01	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA	2 días	mié 24/07/24	jue 25/07/24	$ 292.761	100%
66		12,02	REGATAS (CORTE CON DISCO SOBRE MAI	1 día	mié 24/07/24	mié 24/07/24	$ 1.080.560	0%
67		12,03	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	1 día	mar 21/05/24	mié 22/05/24	$ 1.337.958	100%
68		**13**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**14 días**	**sáb 29/06/24**	**mar 16/07/24**	**$ 7.189.936**	**96%**
69		13,01	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGR	14 días	sáb 29/06/24	mar 16/07/24	$ 5.733.925	87%
70		13,02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	13 días	lun 1/07/24	mar 16/07/24	$ 361.495	100%
71		13,03	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE MUROS PARA INSTALACIÓN ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	14 días	sáb 29/06/24	mar 16/07/24	$ 1.094.516	100%
72		**14**	**CUBIERTAS**	**44,25 días**	**jue 30/05/24**	**mar 23/07/24**	**$ 1.435.190**	**100%**
73		14,01	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA	1 día	mar 23/07/24	mar 23/07/24	$ 1.320.944	100%
74		14,02	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA	1 día	mar 23/07/24	mar 23/07/24	$ 114.246	100%
75		14,03	ESTRUCTURA PERFIL EN TUBO RECTANGU	5 días	jue 30/05/24	mié 5/06/24	$ 0	100%
76		**15**	**CARPINTERIA METALICA**	**8 días**	**vie 2/08/24**	**lun 12/08/24**	**$ 6.822.999**	**0%**
77		15,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18 ·	8 días	vie 2/08/24	lun 12/08/24	$ 946.775	0%
78		15,02	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	7 días	vie 2/08/24	sáb 10/08/24	$ 216.056	0%
79		15,03	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORI	7 días	vie 2/08/24	sáb 10/08/24	$ 2.408.524	0%
80		15,04	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICC	7 días	vie 2/08/24	sáb 10/08/24	$ 3.251.644	0%
81		**16**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**65,25 días**	**mar 21/05/24**	**jue 8/08/24**	**$ 26.992.325**	**47%**
82		16,01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H	25 días	sáb 15/06/24	mar 16/07/24	$ 6.570.083	100%
83		16,02	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA REF,: COI	4 días	sáb 3/08/24	jue 8/08/24	$ 2.015.806	0%
84		16,03	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	$ 55.296	0%
85		16,04	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRI	7 días	vie 26/07/24	sáb 3/08/24	$ 12.807.895	23%

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
86		16,05	ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA REF	7 días	vie 26/07/24	sáb 3/08/24	$ 2.756.975	0%
87		16,06	ENCHAPE CERÁMICO PARED BAÑO REF,: F	7 días	vie 26/07/24	sáb 3/08/24	$ 1.752.034	0%
88		16,07	WIN PROTECTOR MARMOLIZADO, WIN ME	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	$ 418.291	0%
89		16,08	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN C	3 días	mar 21/05/24	vie 24/05/24	$ 615.945	0%
90		**17**	**ESTUCOS Y PINTURAS**	**8 días**	**lun 29/07/24**	**mié 7/08/24**	**$ 7.538.524**	**21%**
91		17,01	ESTUCO	4 días	lun 29/07/24	jue 1/08/24	$ 1.652.819	78%
92		17,02	ESTUCO (LINEAL)	4 días	lun 29/07/24	jue 1/08/24	$ 412.156	0%
93		17,03	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	4 días	vie 2/08/24	mié 7/08/24	$ 4.638.674	0%
94		17,04	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24	$ 834.875	0%
95		**18**	**APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA**	**2 días**	**lun 5/08/24**	**mar 6/08/24**	**$ 1.456.404**	**0%**
96		18,01	SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO CO	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	$ 1.138.761	0%
97		18,02	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - S/	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	$ 244.032	0%
98		18,03	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS SENCILLO G	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24	$ 73.611	0%
99		**19**	**ANDENES Y SARDINELES**	**11 días**	**lun 1/07/24**	**sáb 13/07/24**	**$ 2.286.261**	**0%**
100		19,01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.	11 días	lun 1/07/24	sáb 13/07/24	$ 2.286.261	0%
101		**20**	**TRANSPORTE RURALIDAD**	**61,5 días**	**lun 8/04/24**	**jue 20/06/24**	**$ 812.940**	**100%**
102		20.01	Distancias establecidas desde el Borde Urban	61,5 días	lun 8/04/24	jue 20/06/24	$ 812.940	100%
103		**NP**	**NO PREVISTOS**	**106 días**	**lun 8/04/24**	**mié 14/08/24**	**$ 130.561.765**	**40%**
104		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUI	2 días	vie 9/08/24	lun 12/08/24	$ 71.610	0%
105		NP2	MANO DE OBRA PARA EL RETIRO DE RED	2 días	vie 24/05/24	lun 27/05/24	$ 448.417	100%
106		NP3	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #12 LIBRE DE HALOGENOS	2 días	lun 12/08/24	mar 13/08/24	$ 4.805.611	0%
107		NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA 4	2 días	sáb 3/08/24	mar 6/08/24	$ 2.939.077	0%
108		NP5	SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA EX	2 días	sáb 3/08/24	mar 6/08/24	$ 3.115.327	0%

feb

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
109		NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA C	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24	$ 3.192.815	0%
110		NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉI	7 días	lun 22/07/24	mar 30/07/24	$ 5.654.711	50%
111		NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	$ 923.047	0%
112		NP9	SUMINISTRO E INTALACION DE COCINA EN	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24	$ 18.081.148	0%
113		NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE BIFASICO (80 amp)	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	$ 32.837	0%
114		NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE I	1 día	mié 7/08/24	jue 8/08/24	$ 105.721	0%
115		NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 10 LIBRE DE HALÓGENO	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	$ 340.236	0%
116		NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	$ 1.117.634	0%
117		NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZA	4 días	sáb 3/08/24	jue 8/08/24	$ 413.052	0%
118		NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMATICA LED 40W LUZ FRESCA	6 días	mié 7/08/24	mié 14/08/24	$ 2.157.510	0%
119		NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE OVA	3 días	jue 8/08/24	lun 12/08/24	$ 573.866	0%
120		NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA	3 días	jue 8/08/24	lun 12/08/24	$ 5.517.893	0%
121		NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMAN	3 días	lun 5/08/24	mié 7/08/24	$ 2.403.442	0%
122		NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION DE BAÑO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	4 días	mié 7/08/24	lun 12/08/24	$ 18.438.635	0%
123		NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PARA BAÑO (largo de 1,35x0,50 de ancho) incluye un Lavamanos de empotrar y griferia push	5 días	mié 7/08/24	mar 13/08/24	$ 3.737.665	0%
124		NP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4	2 días	mié 7/08/24	jue 8/08/24	$ 867.993	0%
125		NP22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TE	2 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	$ 2.049.247	0%

feb

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
126		NP23	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	105 días	lun 8/04/24	mar 13/08/24	$ 23.983.024	35%
127	✓	NP24	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24	$ 17.326.828	100%
128	✓	NP25	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24	$ 1.267.997	100%
129	✓	NP26	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24	$ 6.842.392	100%
130	✓	NP27	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24	$ 4.154.030	100%
131		NP28	REJILLA METÁLICA PARA CARCAMO TRANSITO VEHICULAR	4 días	lun 22/07/24	jue 25/07/24	$ 0	0%
132			**ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD**	**53 días**	**vie 10/05/24**	**sáb 13/07/24**	**$ 102.630.832**	29%
133			**LAS AURAS**	**104,5 días**	**mié 10/04/24**	**mié 14/08/24**	**$ 54.508.154**	**12%**
134		**1**	**PRELIMINARES**	**37,5 días**	**mié 10/04/24**	**vie 24/05/24**	**$ 24.936.948**	**95%**
135	✓	1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24	$ 1.874.488	100%
136	✓	1,02	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24	$ 1.310.036	100%
137	✓	1,03	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	2 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24	$ 632.174	100%
138	✓	1,04	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	2 días	jue 23/05/24	vie 24/05/24	$ 2.301.356	100%
139	✓	1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	3 días	sáb 13/04/24	mié 17/04/24	$ 2.231.689	100%
140	✓	1,06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	3 días	jue 11/04/24	lun 15/04/24	$ 105.228	100%
141	✓	1,07	DESMONTE VENTANAS	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24	$ 223.690	100%
142		1,08	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	1 día	vie 19/04/24	sáb 20/04/24	$ 10.592.965	0%
143	✓	1,09	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA	2 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24	$ 2.196.896	100%
144	✓	1,10	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,1	2 días	jue 11/04/24	vie 12/04/24	$ 1.365.322	100%
145	✓	1,11	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	3 días	jue 11/04/24	lun 15/04/24	$ 2.103.104	100%
146			**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**7,75 días**	**lun 13/05/24**	**mar 21/05/24**	**$ 1.496.718**	**54%**

feb

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
147		**2,01**	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	1 día	mar 21/05/24	mar 21/05/24	$ 338.796	12%
148		**2,02**	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	2 días	lun 13/05/24	mar 14/05/24	$ 1.157.922	75%
149		**3**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**5 días**	**sáb 3/08/24**	**vie 9/08/24**	**$ 3.602.903**	**0%**
150		3,01	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SO	2 días	sáb 3/08/24	mar 6/08/24	$ 1.123.614	0%
151		3,02	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	5 días	sáb 3/08/24	vie 9/08/24	$ 2.479.289	0%
152		**4**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**2 días**	**mar 13/08/24**	**mié 14/08/24**	**$ 1.034.280**	**0%**
153		4,01	ASEO GENERAL	2 días	mar 13/08/24	mié 14/08/24	$ 1.034.280	0%
154		**5**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**5 días**	**lun 29/07/24**	**vie 2/08/24**	**$ 461.100**	**0%**
155		5,01	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E= 2 CM	5 días	lun 29/07/24	vie 2/08/24	$ 433.505	0%
156		5,02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	5 días	lun 29/07/24	vie 2/08/24	$ 27.595	0%
157		**6**	**CUBIERTAS**	**1 día**	**sáb 3/08/24**	**lun 5/08/24**	**$ 114.246**	**0%**
158		6,01	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA	1 día	sáb 3/08/24	lun 5/08/24	$ 114.246	0%
159		**7**	**ESTUCO Y PINTURAS**	**3 días**	**sáb 3/08/24**	**mié 7/08/24**	**$ 8.756.599**	**6%**
160		7,01	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 C	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	$ 1.654.596	0%
161		7,02	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA A	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	$ 297.797	0%
162		**8**	**TRANSPORTE RURALIDAD**	**8 días**	**sáb 3/08/24**	**mar 13/08/24**	**$ 203.235**	**100%**

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	feb
163	✓		8,01	Distancias establecidas desde el Borde Urbanao - Usme hasta el territorio de Sumapaz - (Valor transporte de insumos por salon a intervenir)	8 días	sáb 3/08/24	mar 13/08/24	$ 203.235	100%	
164			**NP**	**NO PREVISTOS**	**24 días**	**vie 14/06/24**	**vie 12/07/24**	**$ 6.600.971**	**0%**	
165			NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	5 días	mié 7/08/24	mar 13/08/24	$ 3.914.202	0%	
166			NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	$ 1.703.427	0%	
167			NP3	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	100 días	lun 15/04/24	mié 14/08/24	$ 983.342	0%	
168			NP4	MANO DE OBRA PARA EL DESMONTE DE RED SANITARIA EXISTENTE	2 días	mié 31/07/24	jue 1/08/24	$ 0	0%	
169			NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PARA BAÑO (largo de 1,35x0,50 de ancho) incluye dos Lavamanos de empotrar y griferia	4 días	vie 2/08/24	mié 7/08/24	$ 0	0%	
170				**ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD**	74 días	lun 15/04/24	vie 12/07/24	$ 14.105.360	0%	
171				**BETANIA**	**69,25 días**	**lun 29/04/24**	**lun 22/07/24**	**$ 36.426.628**	**68%**	
172			**1**	**PRELIMINARES**	**10 días**	**lun 29/04/24**	**vie 10/05/24**	**$ 2.458.728**	**81%**	
173	✓		1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	lun 29/04/24	lun 29/04/24	$ 835.927	100%	
174	✓		1,02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24	$ 112.456	100%	

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24



Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	feb
175	✓		1,03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24	$ 227.994	100%	
176			1,04	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	2 días	mié 8/05/24	vie 10/05/24	$ 174.785	0%	
177	✓		1,05	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=	2 días	mié 1/05/24	jue 2/05/24	$ 463.591	100%	
178			1,06	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	2 días	vie 3/05/24	lun 6/05/24	$ 493.627	98%	
179	✓		1,07	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M	2 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24	$ 150.348	100%	
180			**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**8 días**	**vie 3/05/24**	**lun 13/05/24**	**$ 2.161.739**	**39%**	
181			2,01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTA	2 días	vie 10/05/24	lun 13/05/24	$ 1.364.059	39%	
182			2,02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NE	2 días	vie 3/05/24	lun 6/05/24	$ 797.680	39%	
183			**3**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**2 días**	**lun 13/05/24**	**mié 15/05/24**	**$ 1.977.883**	**94%**	
184			3,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE	2 días	lun 13/05/24	mié 15/05/24	$ 1.977.883	94%	
185			**4**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**4 días**	**lun 6/05/24**	**vie 10/05/24**	**$ 3.061.907**	**94%**	
186	✓		4,01	PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 27.779	100%	
187	✓		4,02	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 37.093	100%	
188	✓		4,06	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE I	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 45.269	100%	
189	✓		4,07	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 24.008	100%	
190			4,08	RE-VENTILACIÓN DE 3" X 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 105.711	57%	
191	✓		4,09	TUBERÍA PVC S 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 184.674	100%	
192			4,10	TUBERÍA PVC S 3"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 128.316	54%	
193	✓		4,11	TUBERÍA PVC S 4"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 666.950	100%	
194	✓		4,13	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 24.726	100%	
195	✓		4,14	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 208.884	100%	
196	✓		4,15	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 421.268	100%	
197	✓		4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PV	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 82.500	100%	

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
198		4,17	ACCESORIOS RED SANITARIA 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 90.891	100%
199		4,18	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 81.798	100%
200		4,19	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	$ 932.040	100%
201		**5**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**2 días**	**vie 19/07/24**	**lun 22/07/24**	**$ 747.162**	**100%**
202		5,01	ASEO GENERAL	2 días	vie 19/07/24	lun 22/07/24	$ 747.162	100%
203		**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**2 días**	**vie 24/05/24**	**lun 27/05/24**	**$ 285.964**	**100%**
204		6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILU	1 día	vie 24/05/24	sáb 25/05/24	$ 234.972	100%
205		6,02	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ES	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24	$ 50.992	100%
206		**7**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**3 días**	**lun 29/04/24**	**mié 1/05/24**	**$ 352.750**	**98%**
207		7,01	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E	3 días	lun 29/04/24	mié 1/05/24	$ 352.750	98%
208		**8**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**5 días**	**lun 13/05/24**	**sáb 18/05/24**	**$ 3.304.537**	**98%**
209		8,01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H	1 día	mié 15/05/24	jue 16/05/24	$ 1.054.202	100%
210		8,02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRI	1 día	jue 16/05/24	vie 17/05/24	$ 2.055.089	100%
211		8,03	WIN PROTECTOR MARMOLIZADO, WIN M	1 día	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	$ 96.415	92%
212		8,04	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CO	1 día	lun 13/05/24	mar 14/05/24	$ 98.831	100%
213		**9**	**ESTUCOS Y PINTURAS**	**67,25 días**	**mar 30/04/24**	**vie 19/07/24**	**$ 5.776.362**	**22%**
214		9,01	ESTUCO	3 días	mar 30/04/24	jue 2/05/24	$ 485.558	83%
215		9,02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	23 días	jue 20/06/24	mié 17/07/24	$ 405.349	0%
216		9,03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	23 días	jue 20/06/24	mié 17/07/24	$ 464.103	0%
217		9,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	2 días	mié 17/07/24	jue 18/07/24	$ 457.996	100%
218		9,05	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	2 días	jue 18/07/24	vie 19/07/24	$ 559.592	100%
219		9,06	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 C	4 días	mar 7/05/24	sáb 11/05/24	$ 2.827.327	100%
220		9,07	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA A	3 días	mar 30/04/24	jue 2/05/24	$ 576.437	100%

feb

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	feb
221		**10**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**1 día**	**sáb 18/05/24**	**lun 20/05/24**	**$ 122.016**	**100%**	
222		10,1	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - S	1 día	sáb 18/05/24	lun 20/05/24	$ 122.016	100%	
223		**11**	**ANDENES Y SARDINELES**	**2 días**	**lun 13/05/24**	**mié 15/05/24**	**$ 57.516**	**100%**	
224		11,01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0	2 días	lun 13/05/24	mié 15/05/24	$ 57.516	100%	
225		**NP**	**NO PREVISTO**	**15 días**	**lun 29/04/24**	**jue 16/05/24**	**$ 6.685.696**	**100%**	
226		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	4 días	sáb 11/05/24	jue 16/05/24	$ 3.847.749	100%	
227		NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	4 días	sáb 11/05/24	jue 16/05/24	$ 1.675.973	100%	
228		NP3	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24	$ 1.161.974	100%	
229			**ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD**	28 días	lun 29/04/24	vie 31/05/24	**$ 9.434.368**	83%	
230			**SANTA ROSA**	**157 días**	**jue 1/02/24**	**mié 14/08/24**	**$ 115.798.504**	**47%**	
231		**1**	**PRELIMINARES**	**99 días**	**jue 1/02/24**	**mié 5/06/24**	**$ 6.370.723**	**75%**	
232		**1,01**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24	$ 609.889	100%	
233		**1,02**	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24	$ 83.616	77%	
234		**1,03**	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	2 días	jue 1/02/24	vie 2/02/24	$ 3.025.360	0%	
235		**1,04**	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,15 M	2 días	jue 30/05/24	vie 31/05/24	$ 91.154	100%	
236		**1,05**	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	3 días	sáb 1/06/24	mié 5/06/24	$ 2.560.704	98%	
237		**2**	**MOTEROS Y CONCRETOS**	**2 días**	**lun 29/07/24**	**mar 30/07/24**	**$ 50.601**	**100%**	
238		2,01	CONCRETO 2500 PSI	2 días	lun 29/07/24	mar 30/07/24	$ 50.601	100%	

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	feb
239			**3**	**ACEROS Y MALLAS**	**2 días**	**lun 29/07/24**	**mar 30/07/24**	**$ 47.680**	**0%**	
240			3,01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCL	2 días	lun 29/07/24	mar 30/07/24	$ 47.680	0%	
241			**4**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**6 días**	**lun 29/07/24**	**lun 5/08/24**	**$ 3.403.879**	**86%**	
242			4,01	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SO	6 días	lun 29/07/24	lun 5/08/24	$ 1.211.006	85%	
243			4,02	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAR	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24	$ 2.192.873	92%	
244			**5**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**1 día**	**vie 2/08/24**	**vie 2/08/24**	**$ 545.126**	**0%**	
245			5,01	ASEO GENERAL	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	$ 545.126	0%	
246			**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**5 días**	**lun 29/07/24**	**vie 2/08/24**	**$ 1.717.386**	**0%**	
247			6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24	$ 148.792	0%	
248			6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA T	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	$ 380.448	0%	
249			6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUM	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	$ 587.430	0%	
250			6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	$ 156.204	0%	
251			6,05	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ES	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	$ 50.992	0%	
252			6,06	BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAÑOS- E	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	$ 41.900	0%	
253			6,07	PANEL LED RD LUZ BLANCA 10 - 240 V116	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	$ 351.620	0%	
254			**7**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**8 días**	**mié 3/07/24**	**vie 12/07/24**	**$ 1.420.891**	**77%**	
255			7,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E	8 días	mié 3/07/24	vie 12/07/24	$ 1.350.248	60%	
256			7,02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	6 días	mié 3/07/24	mié 10/07/24	$ 70.643	100%	
257			**8**	**CUBIERTAS**	**1 día**	**lun 29/07/24**	**lun 29/07/24**	**$ 95.205**	**100%**	
258			8,01	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24	$ 95.205	100%	
259			**9**	**CARPINTERIA METALICA**	**3 días**	**lun 29/07/24**	**mié 31/07/24**	**$ 738.884**	**0%**	
260			9,01	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTIC	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24	$ 738.884	0%	

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado	feb
261	✓		**10**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**47,75 días**	**sáb 8/06/24**	**mar 6/08/24**	**$ 9.081.332**	**100%**	
262	✓		10,01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H	2 días	sáb 8/06/24	mar 11/06/24	$ 2.776.618	100%	
263	✓		10,02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	15 días	lun 1/07/24	jue 18/07/24	$ 5.412.812	100%	
264	✓		10,03	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA REF,: COR	2 días	jue 18/07/24	vie 19/07/24	$ 631.594	100%	
265	✓		10,04	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CO	2 días	sáb 3/08/24	mar 6/08/24	$ 260.308	100%	
266			**11**	**ESTUCOS Y PINTURAS**	**24,25 días**	**lun 8/07/24**	**mar 6/08/24**	**$ 2.427.180**	**96%**	
267	✓		11,01	ESTUCO	4 días	jue 1/08/24	mar 6/08/24	$ 31.730	100%	
268	✓		11,02	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	3 días	mar 16/07/24	vie 19/07/24	$ 79.834	100%	
269			11,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	mar 16/07/24	vie 19/07/24	$ 427.667	88%	
270			11,04	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3	7 días	mar 16/07/24	mié 24/07/24	$ 1.600.950	96%	
271			11,05	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	5 días	lun 8/07/24	vie 12/07/24	$ 286.999	96%	
272	✓		**12**	**ANDENES Y SARDINELES**	**3 días**	**lun 29/07/24**	**mié 31/07/24**	**$ 2.338.744**	**100%**	
273	✓		12,01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24	$ 2.338.744	100%	
274			**NP**	**NO PREVISTO**	**37 días**	**mié 29/05/24**	**vie 12/07/24**	**$ 57.569.467**	**33%**	
275			NP1	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #12 L	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24	$ 447.034	0%	
276			NP2	SUMINISTRO E INSTALACION Kit Solar 300	1 día	lun 5/08/24	mar 6/08/24	$ 27.863.433	0%	
277			NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARILLAS	1 día	lun 5/08/24	mar 6/08/24	$ 4.346.474	0%	
278			NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	4 días	vie 9/08/24	mié 14/08/24	$ 4.310.458	64%	


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24


Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	% completado
279		NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	3 días	vie 9/08/24	mar 13/08/24	$ 1.877.517	100%
280		NP6	REALIZACIÓN DE MURAL ARTISTICO PARA FACHADA	16 días	lun 22/07/24	vie 9/08/24	$ 12.912.867	40%
281		NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD O FIBROCEMENTO 6 mm PARA MURO FRONTAL DEL SALÓN COMUNAL.	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24	$ 279.620	100%
282		NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO T	2 días	jue 1/08/24	vie 2/08/24	$ 971.808	0%
283		NP9	Transporte de materiales y equipos desde	54 días	mié 29/05/24	vie 2/08/24	$ 4.560.256	26%
284			**ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDA**	**45 días**	**mié 29/05/24**	**lun 22/07/24**	**$ 29.991.406**	12%
285			SAN JUAN	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	$ 0	100%
286		**NP**	**NO PREVISTO**	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	$ 0	0%
287		NP1	DESINSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA REJA METÁLICA CAL18 TIPO CORTINA, INCLUYE RIELES, GUIAS, PASADORES, CHAPA DE SEGURIDAD, ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA.	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	$ 0	0%

feb


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24



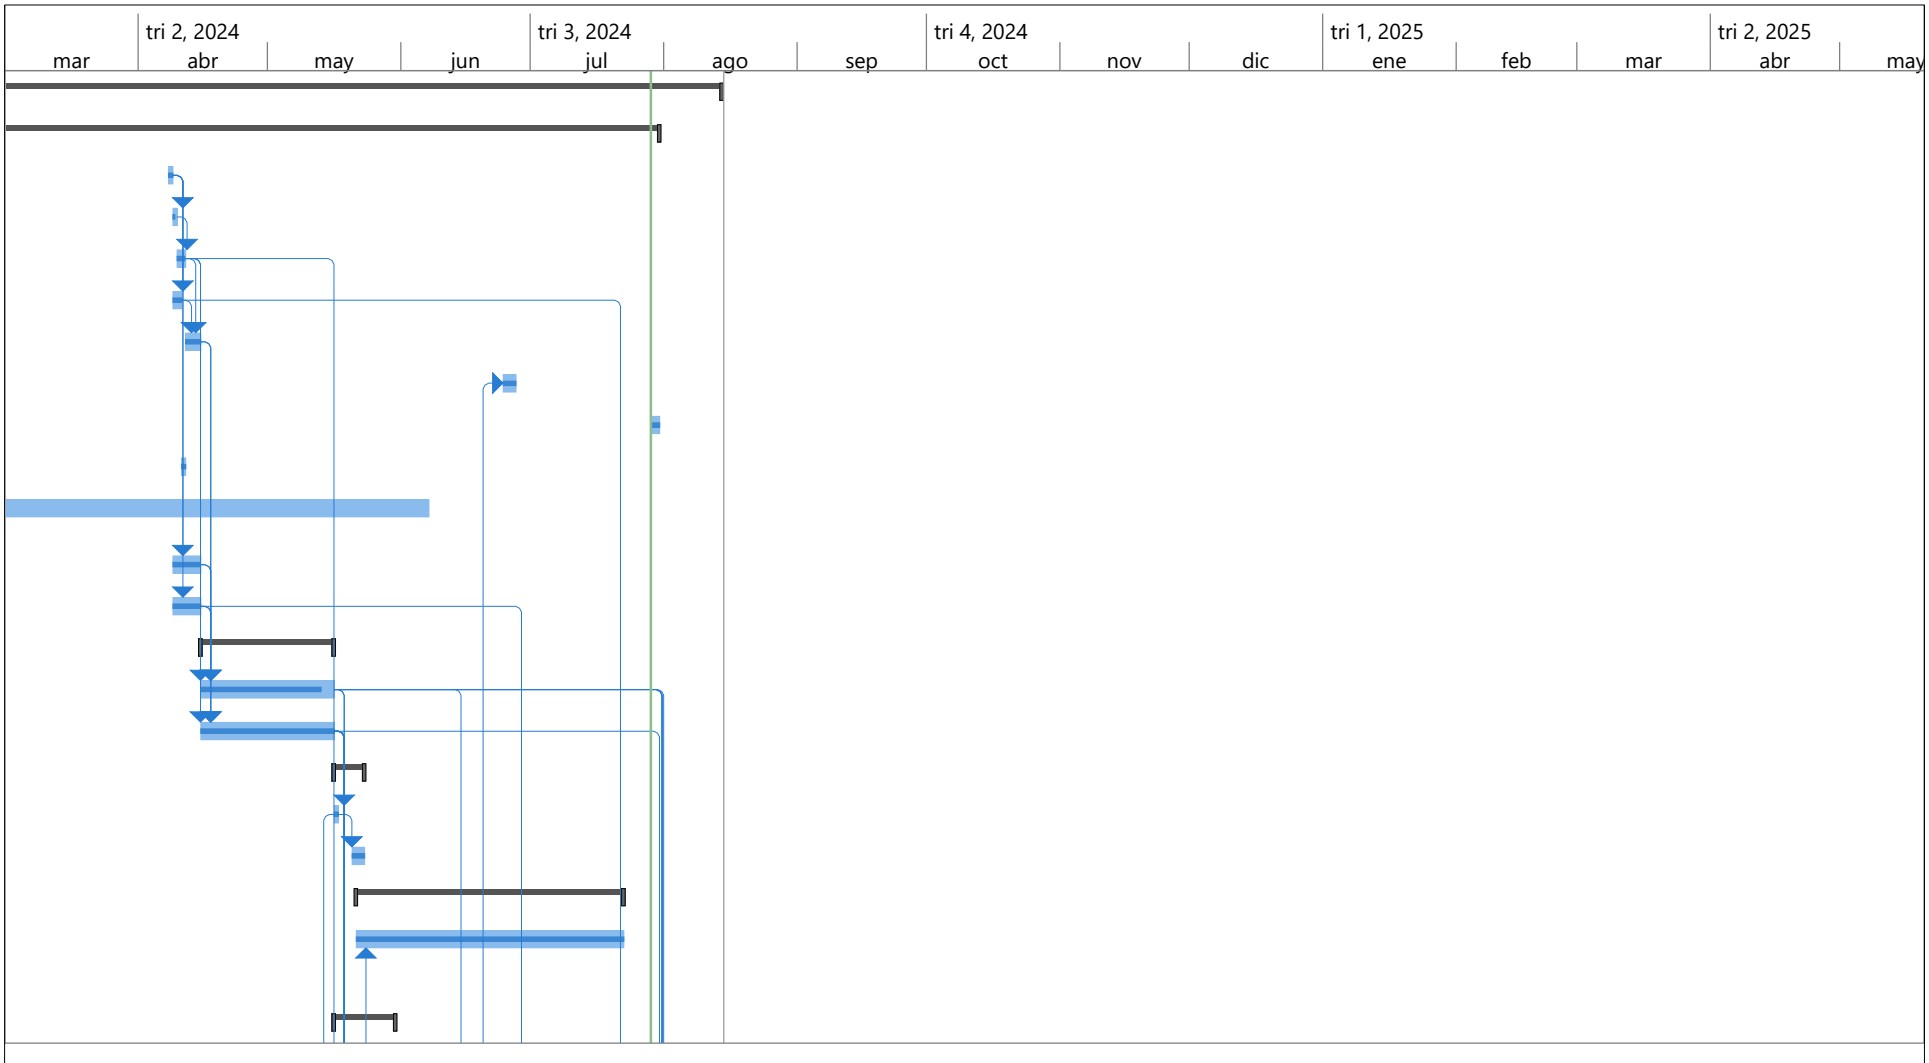


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

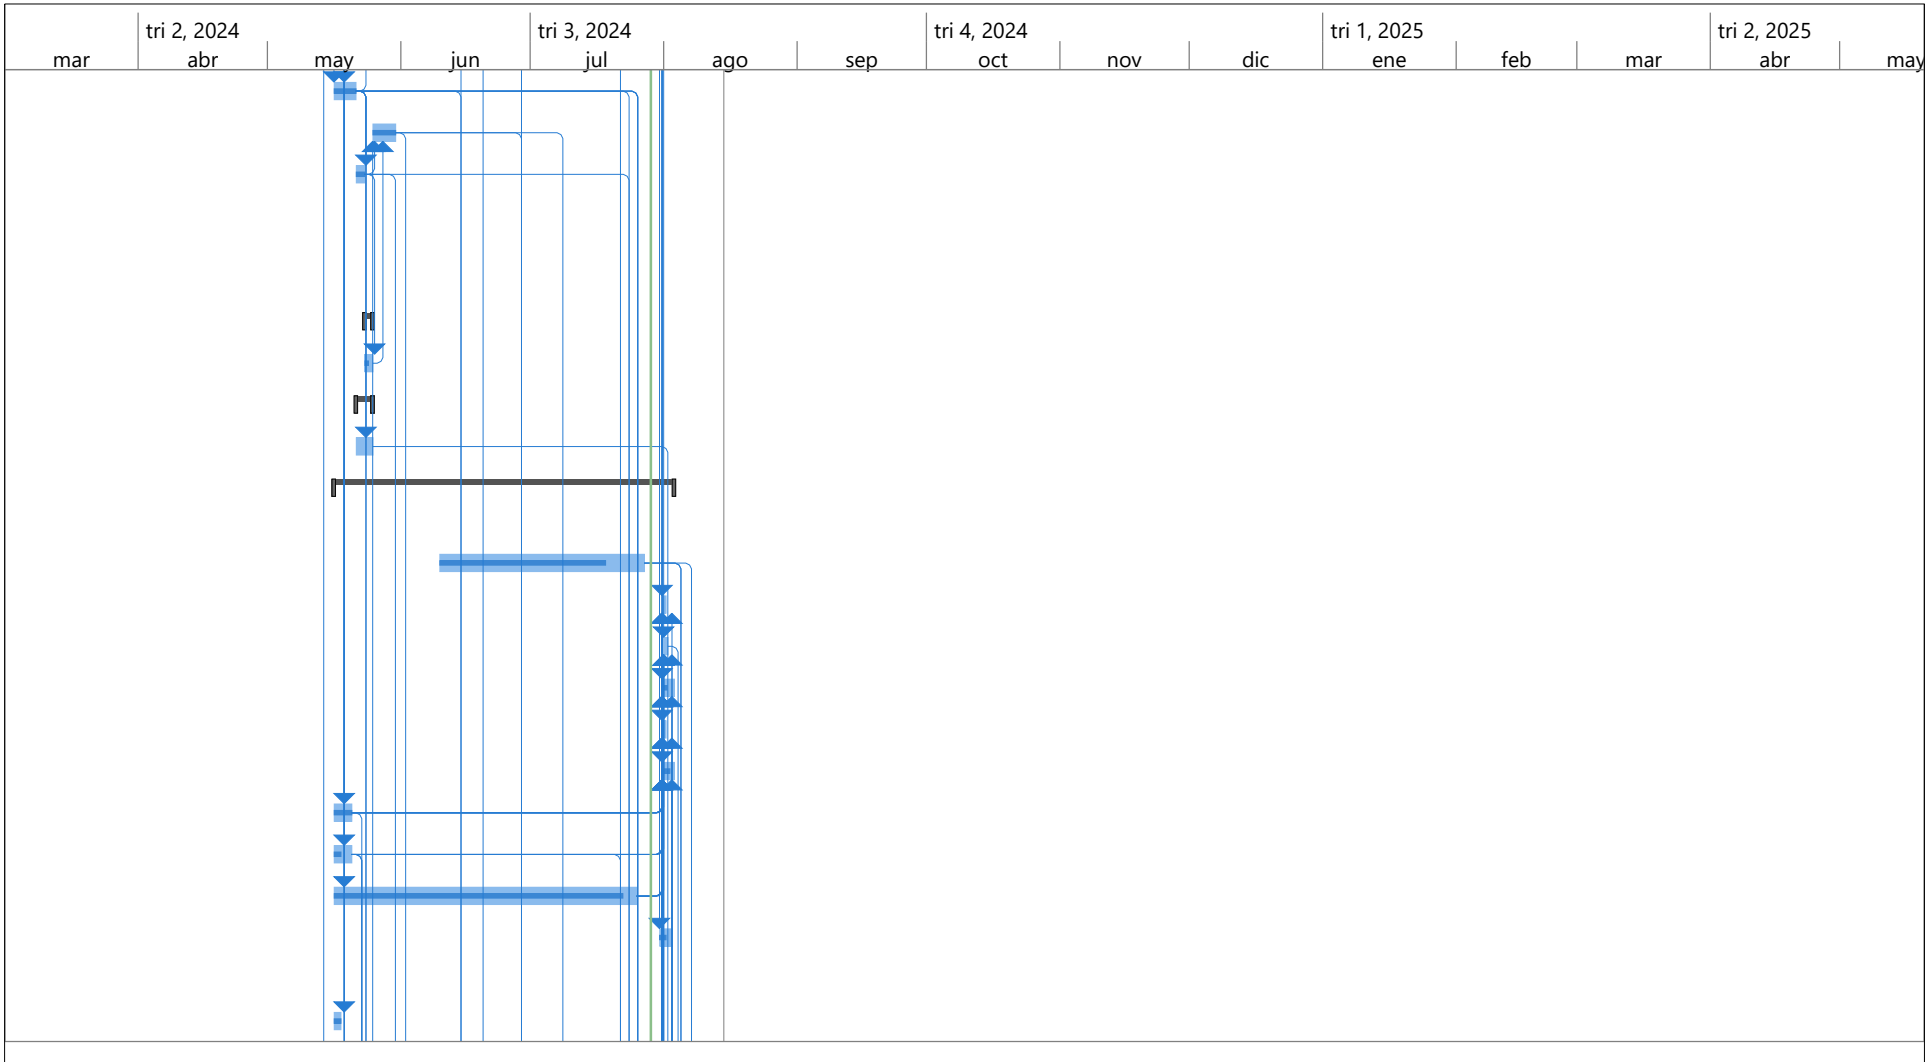


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

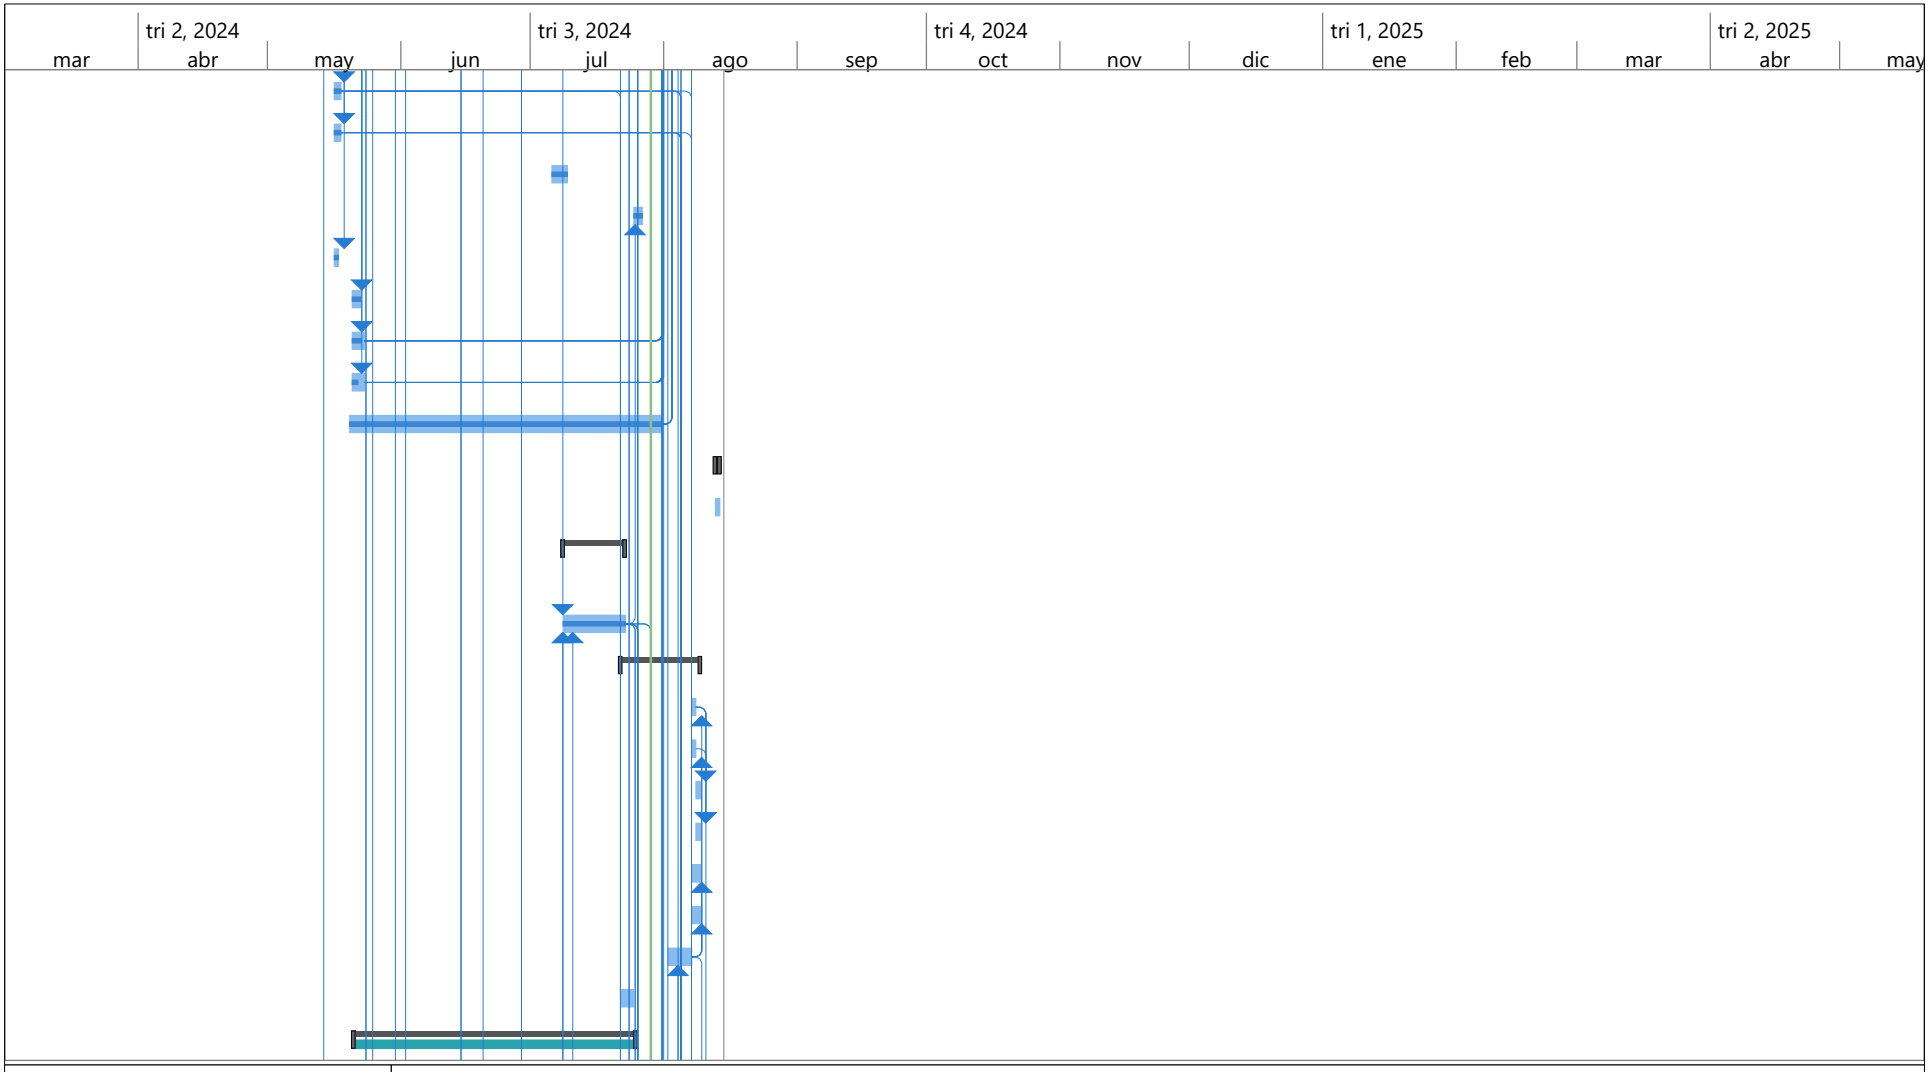


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

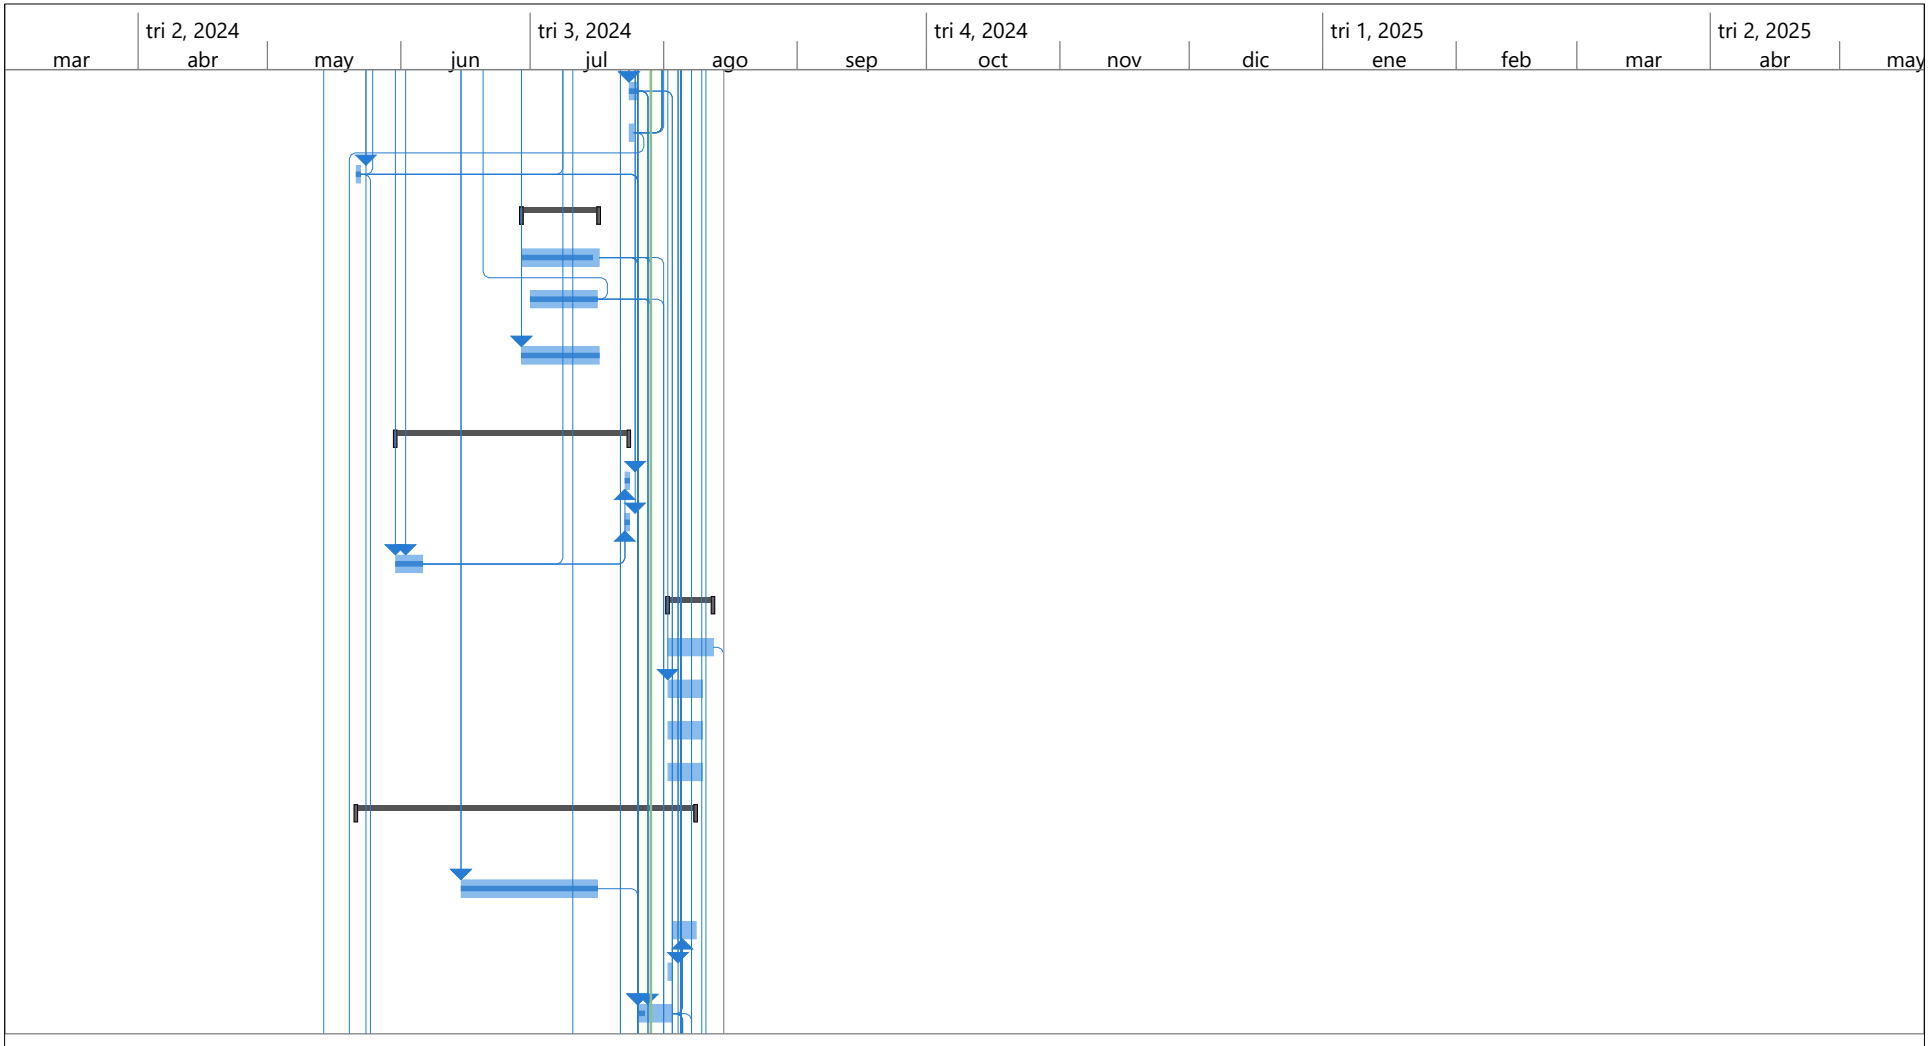


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

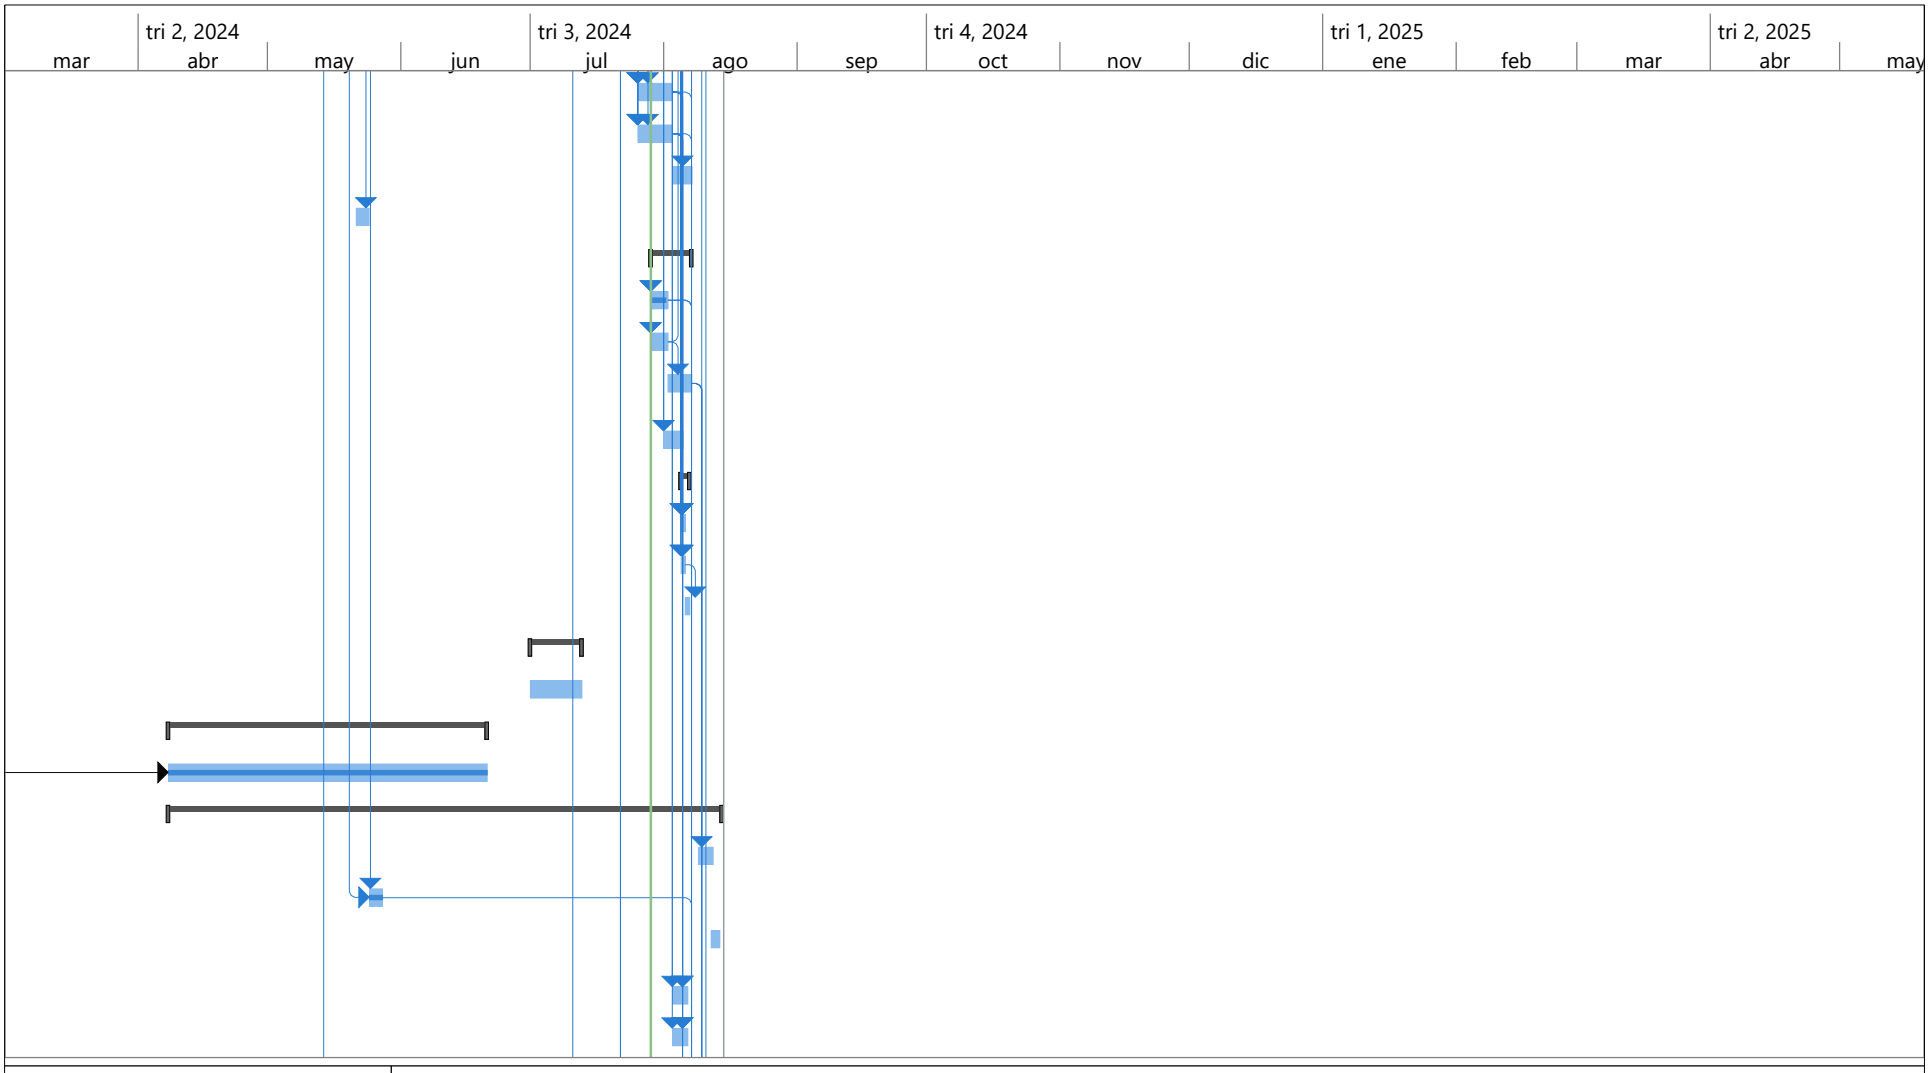


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

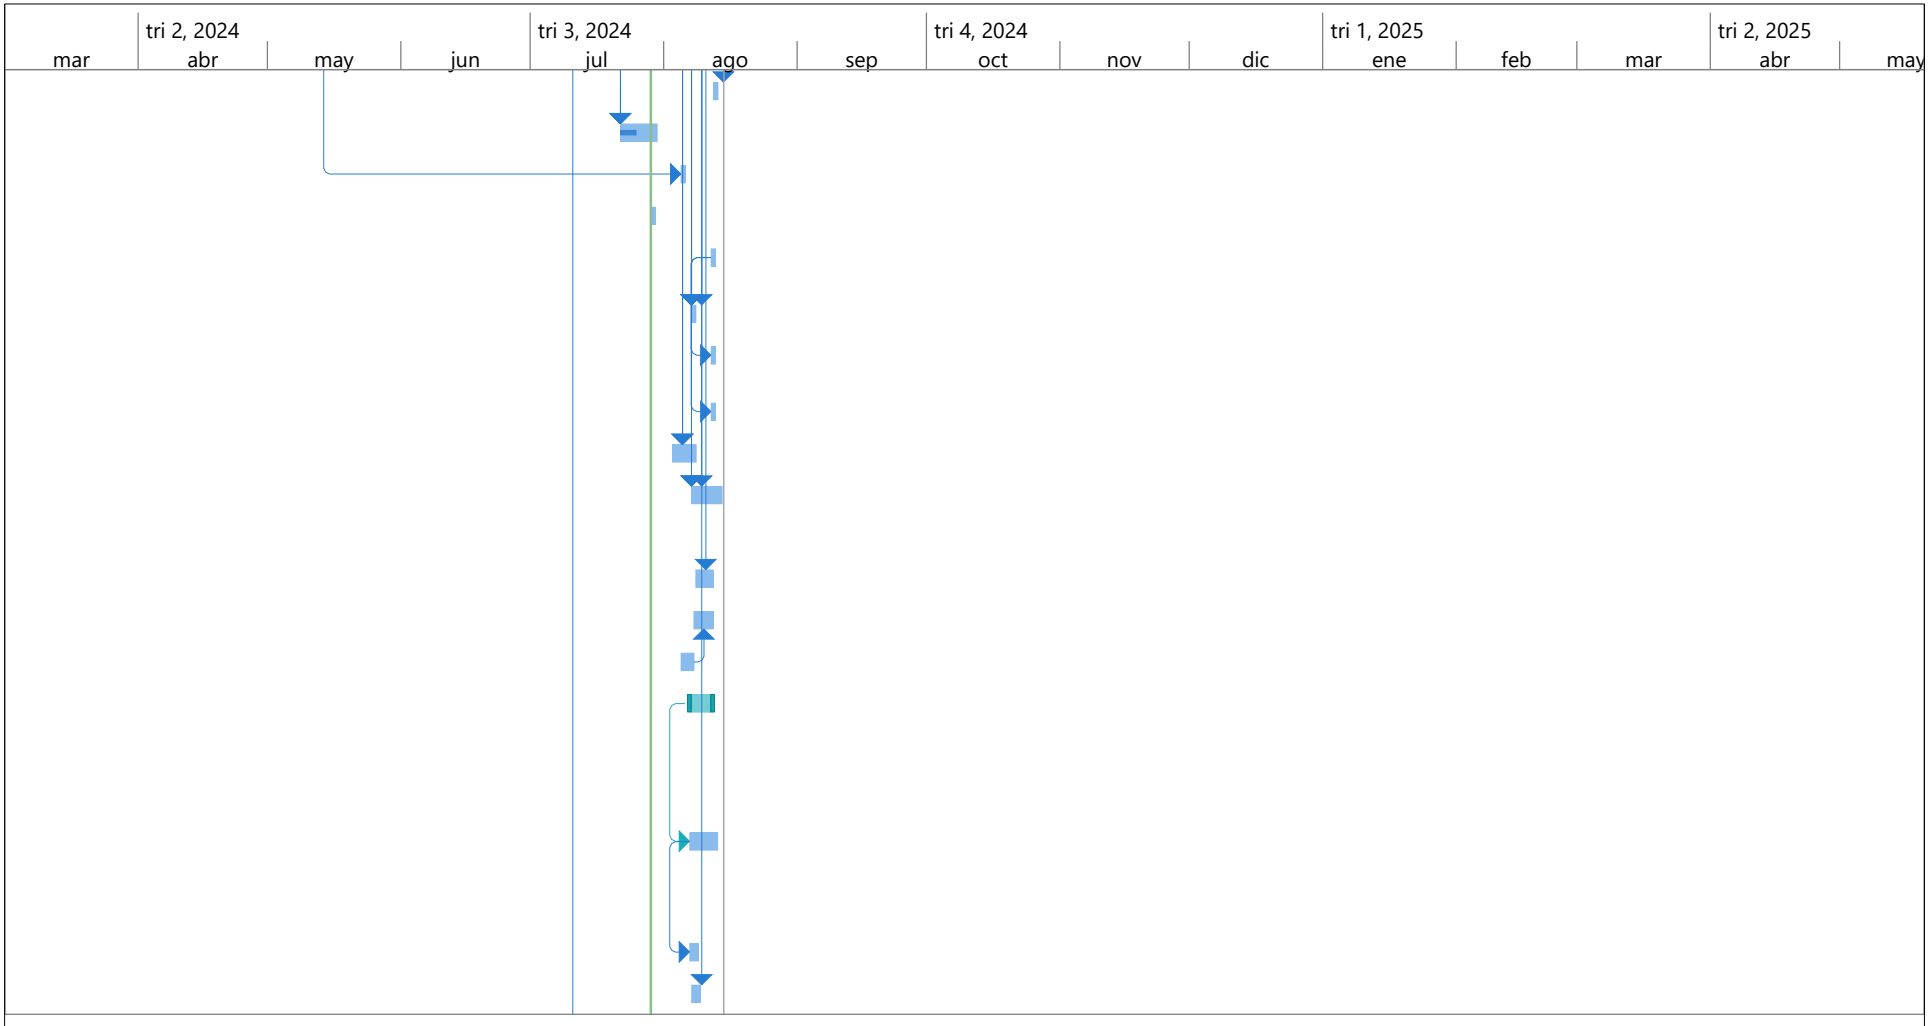


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

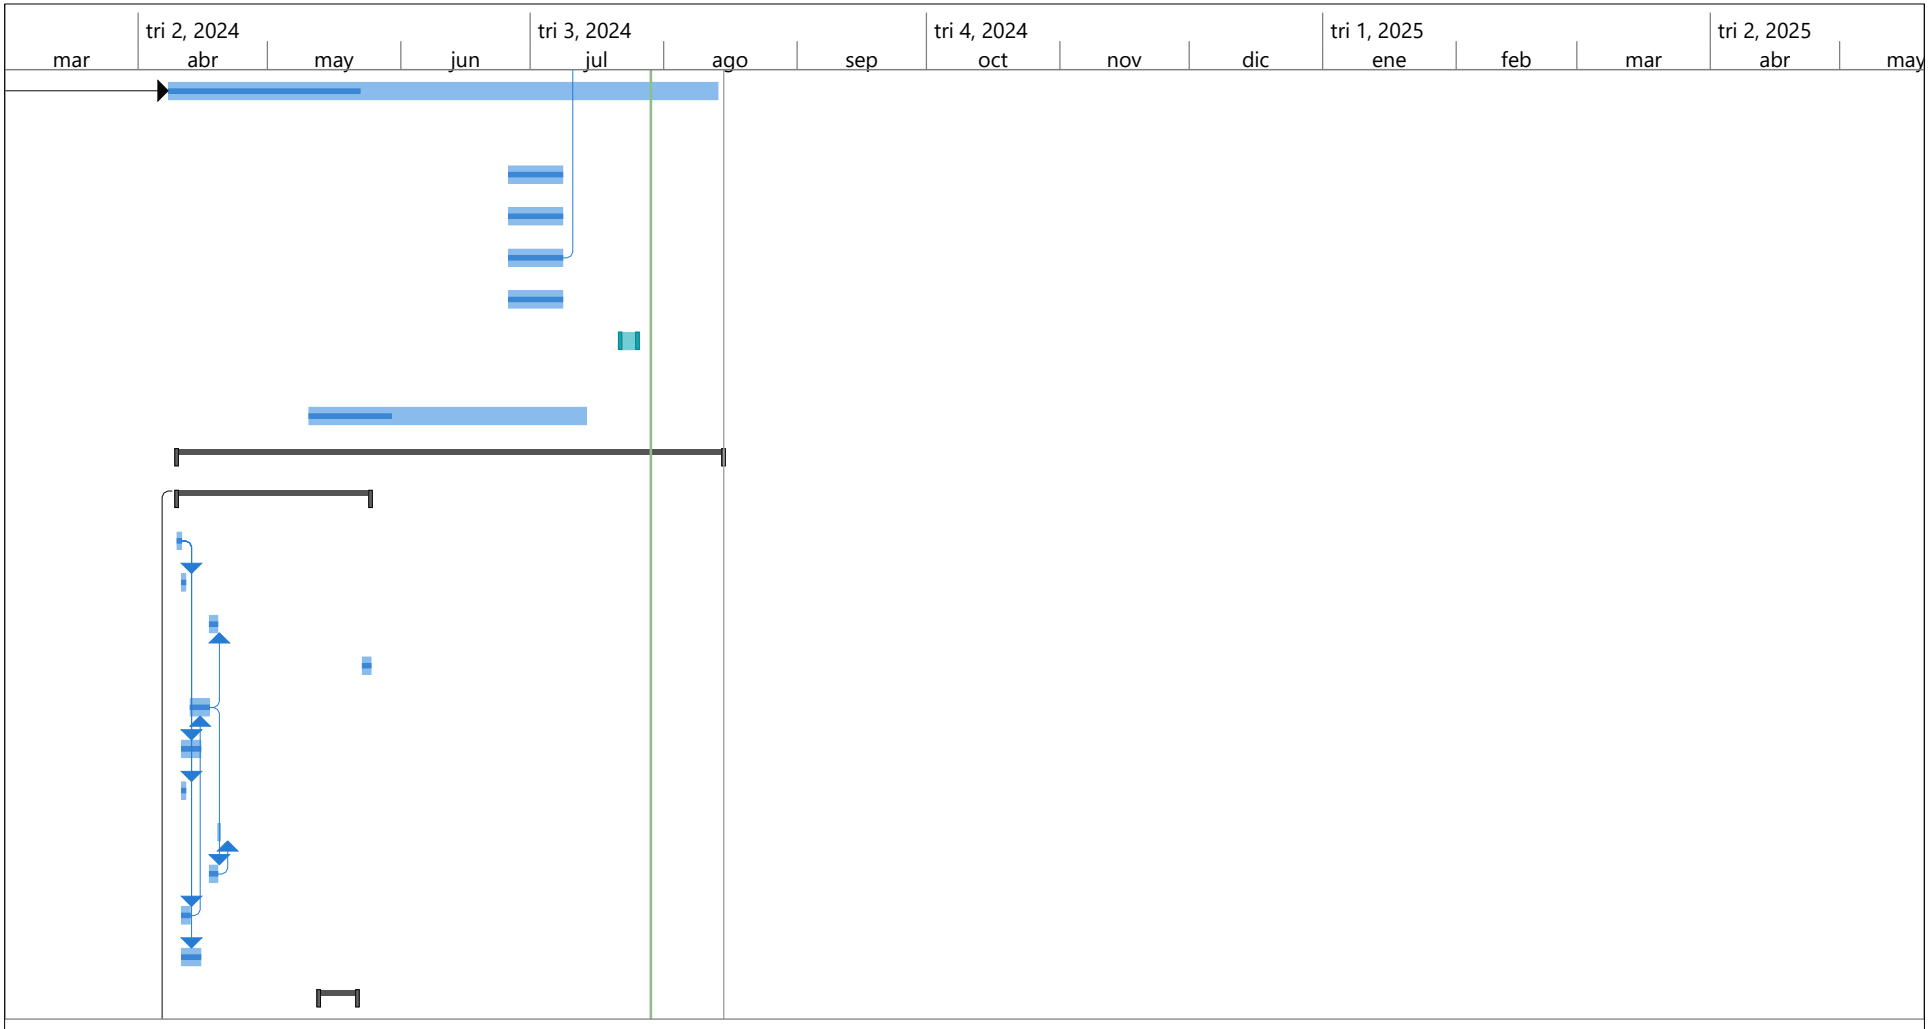


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

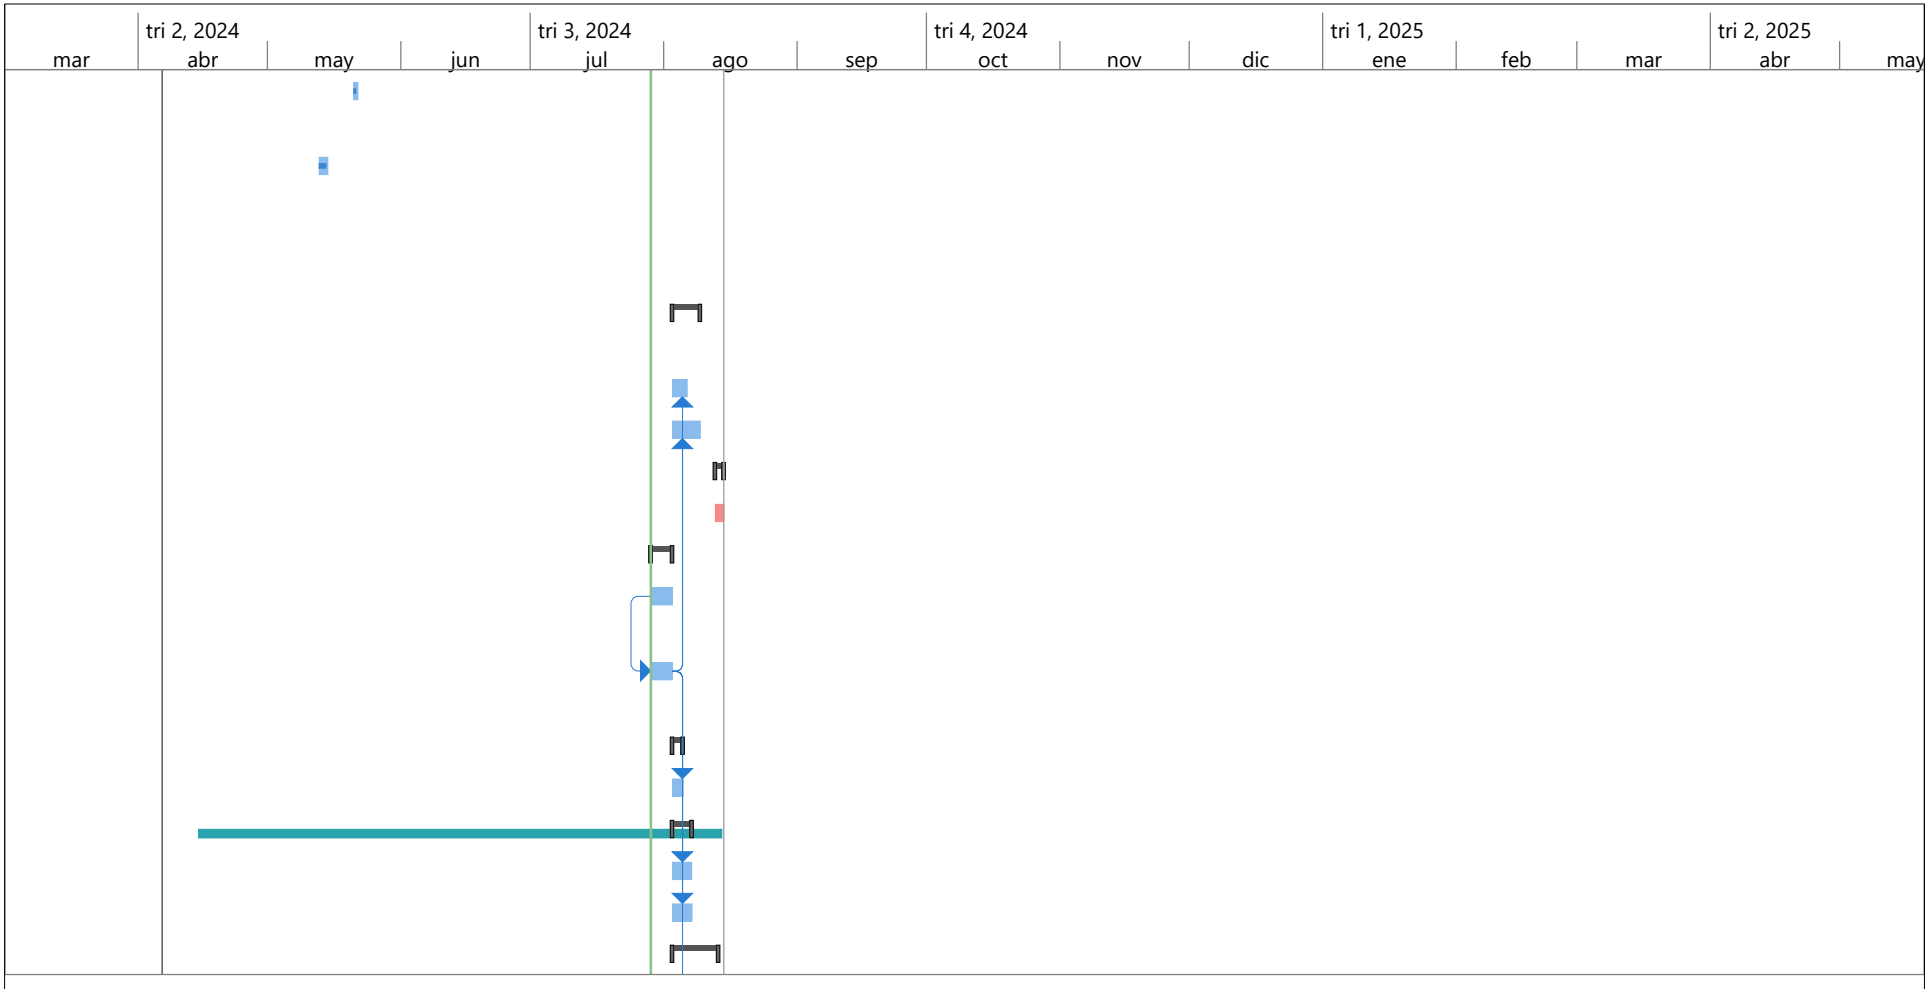


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

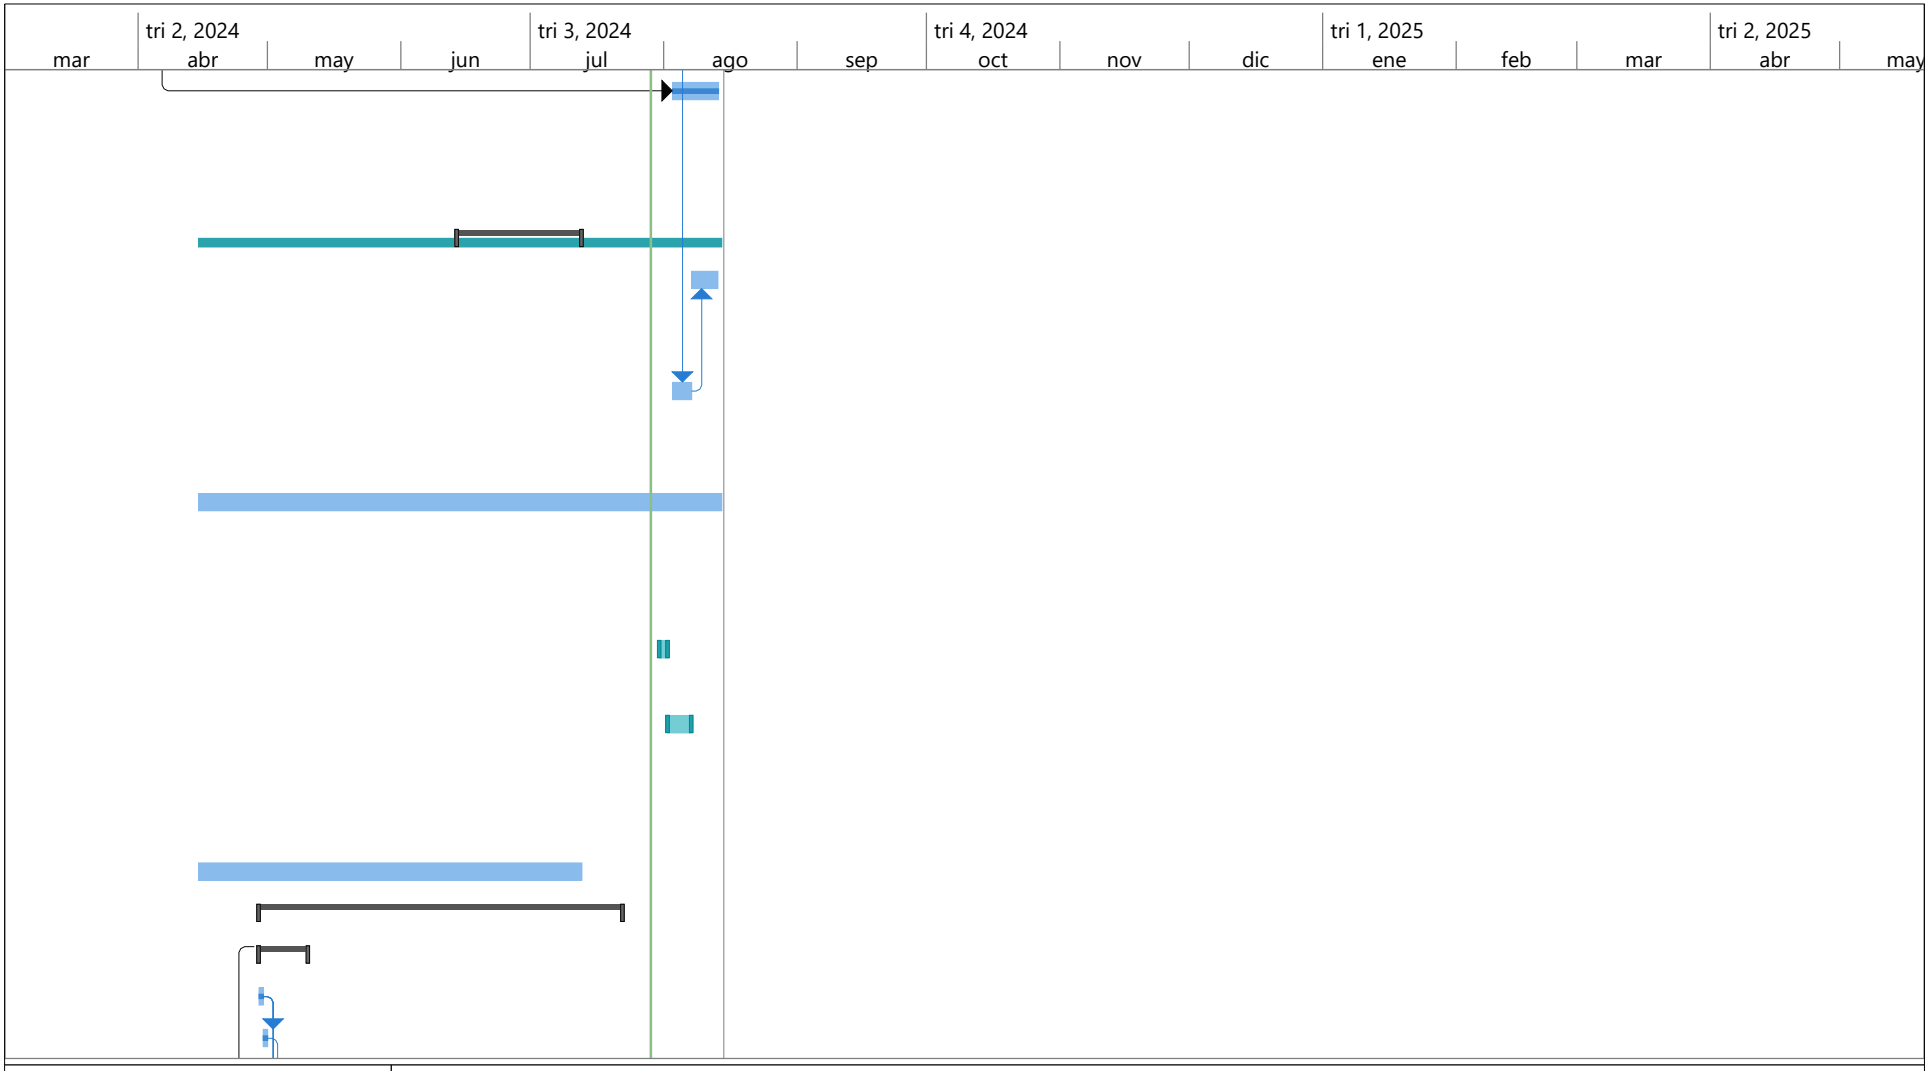


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

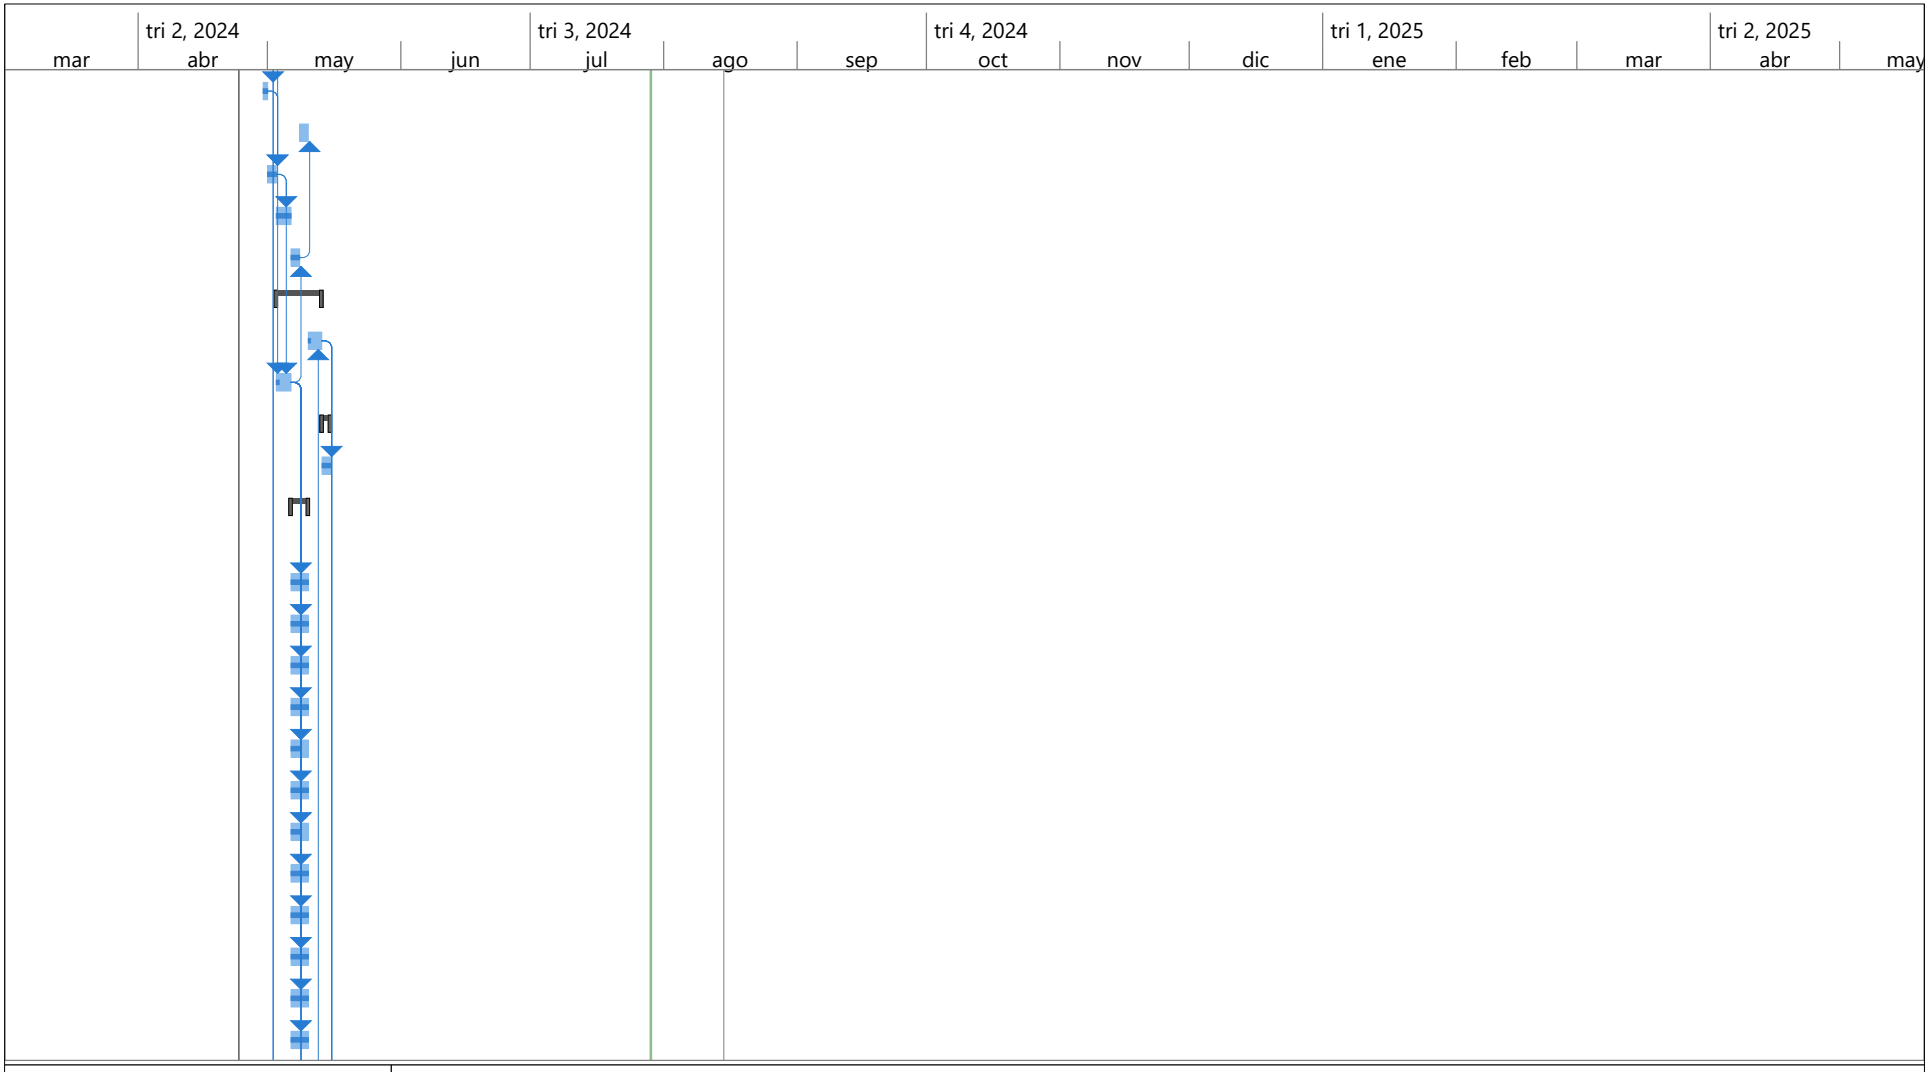


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

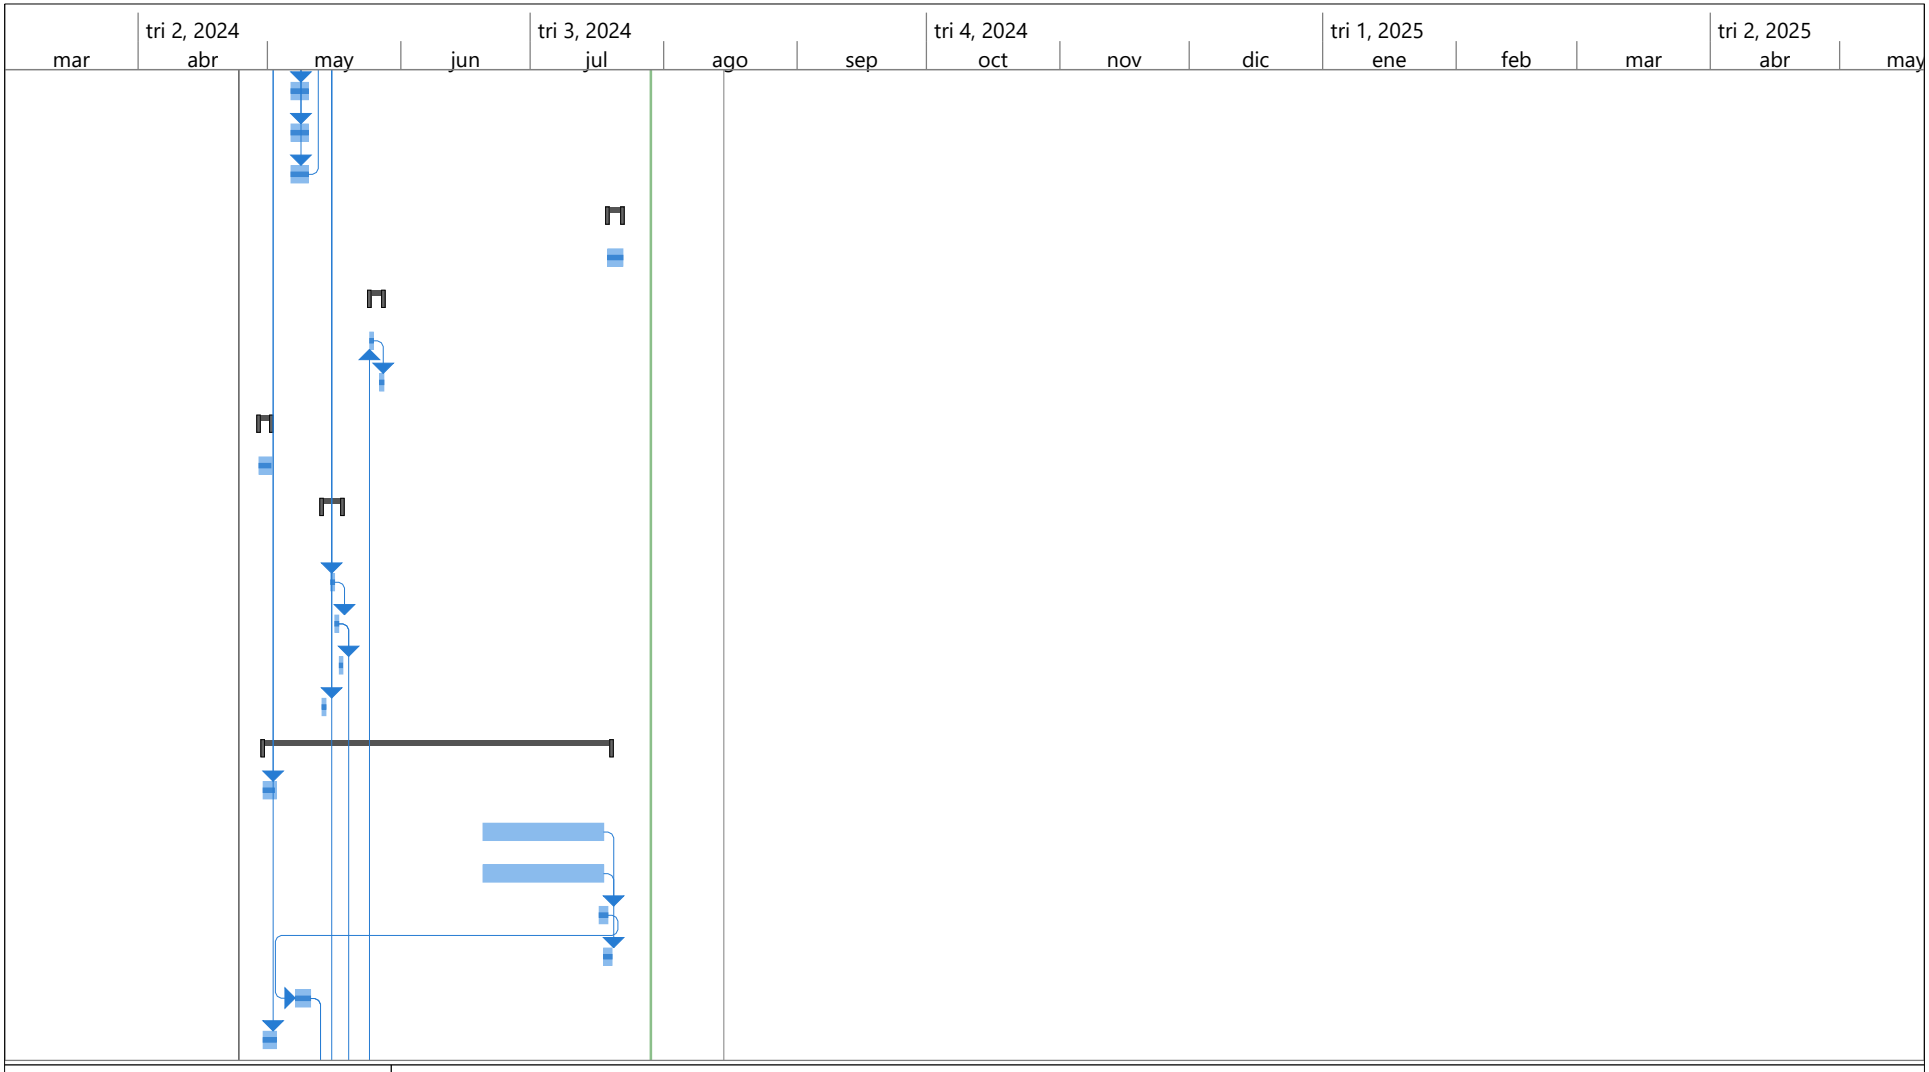


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

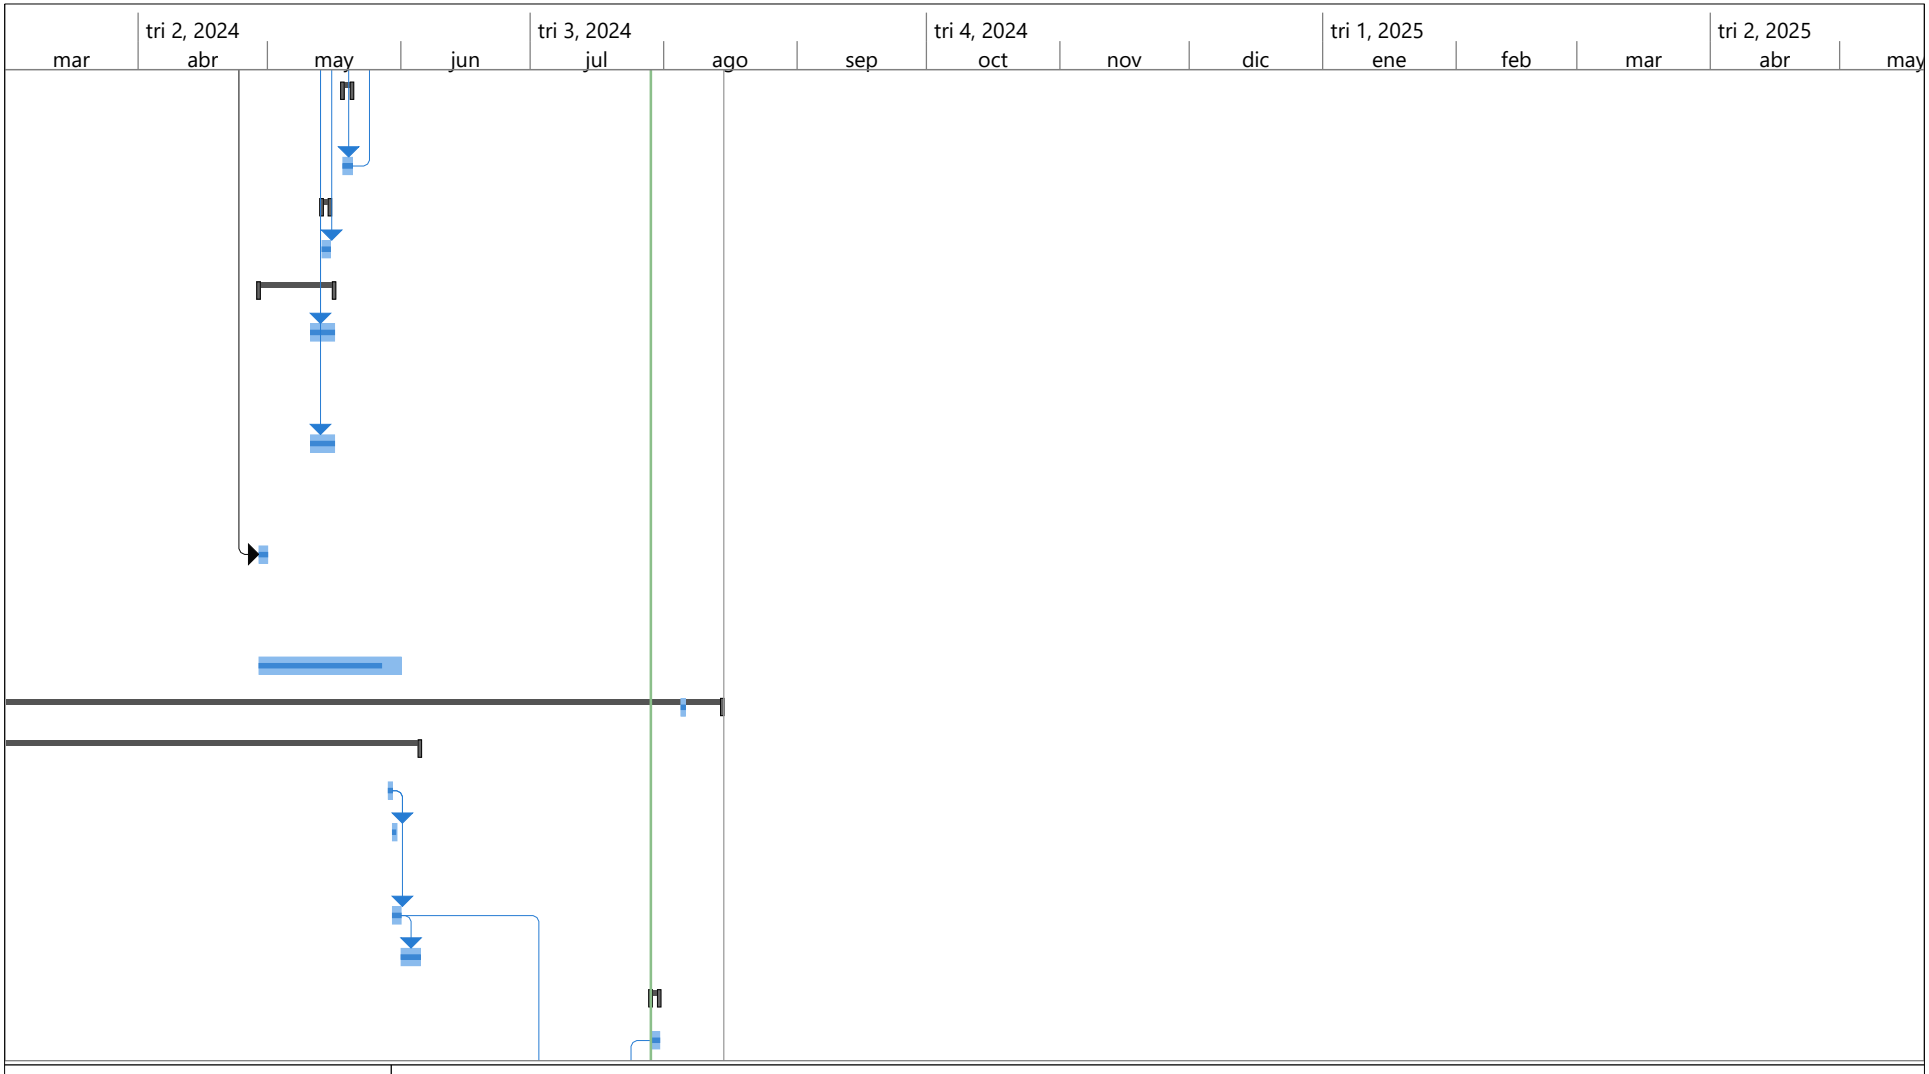


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

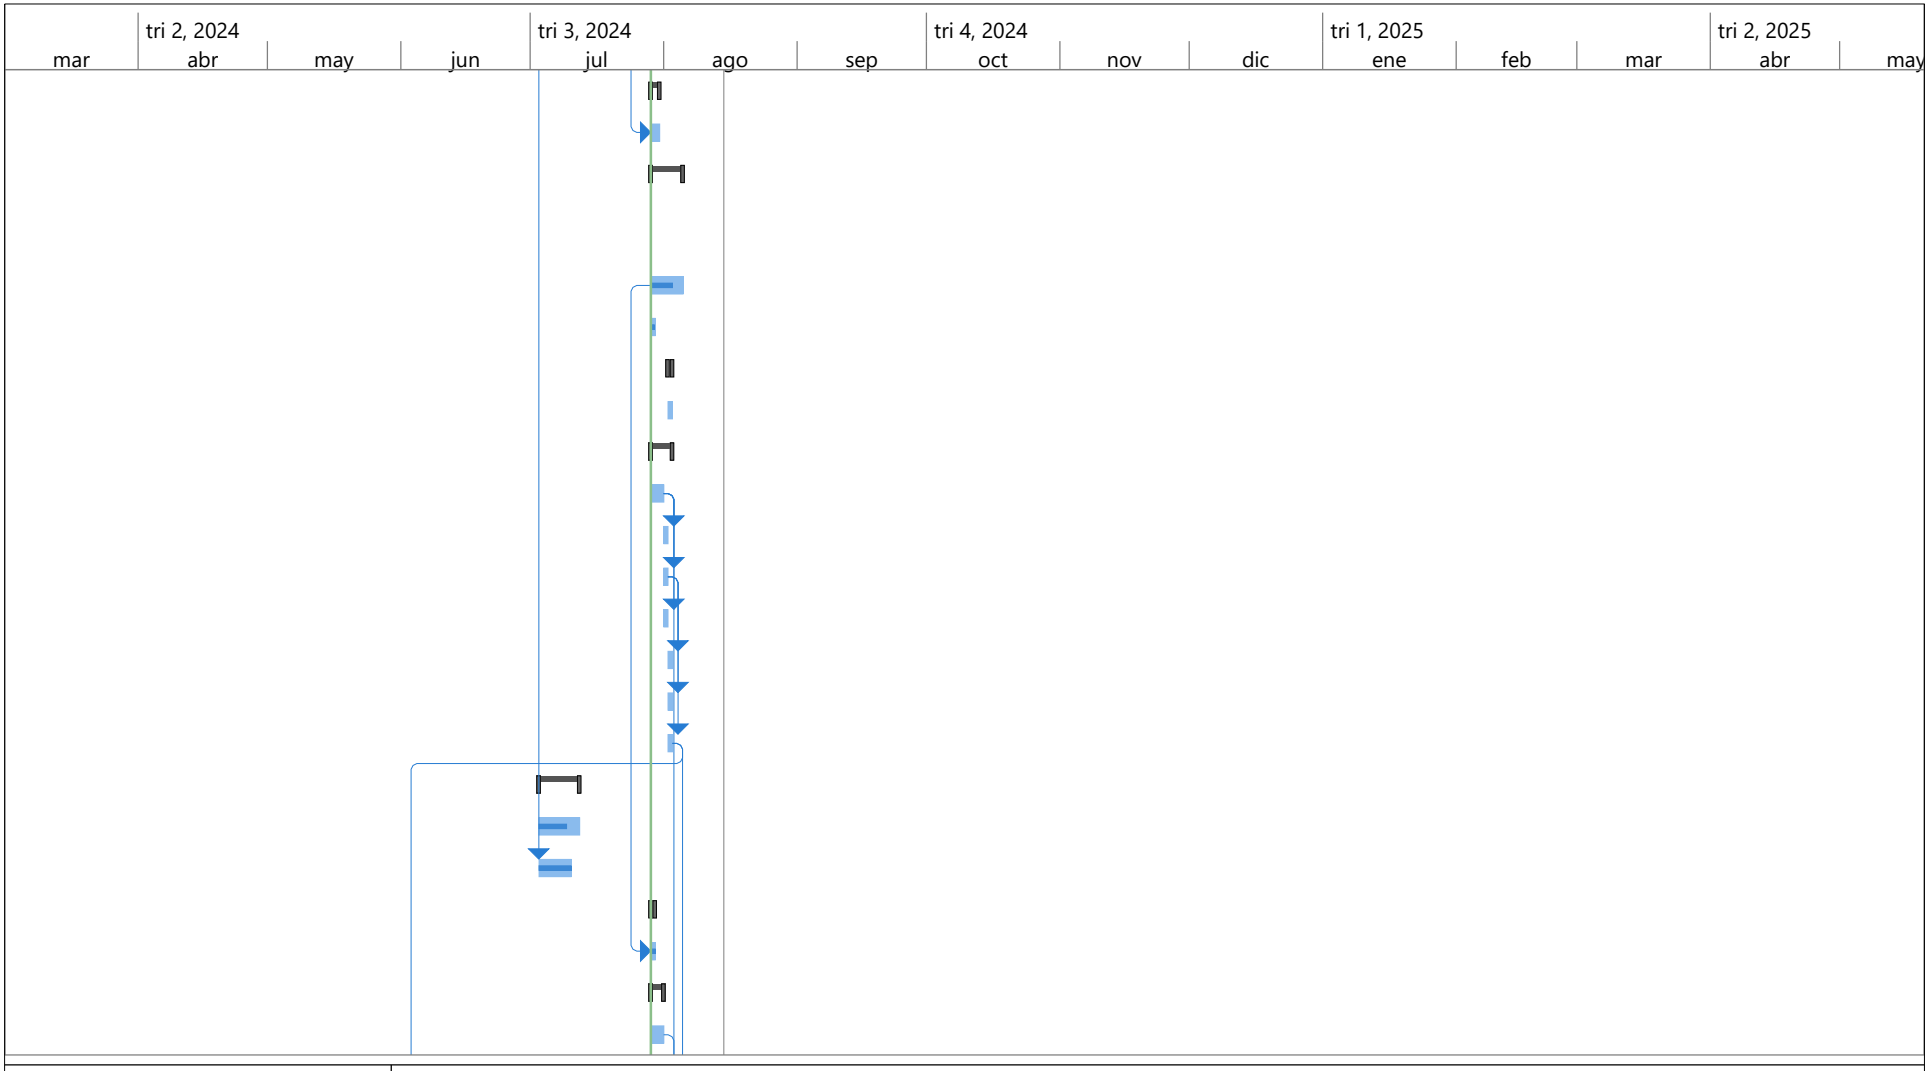


Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

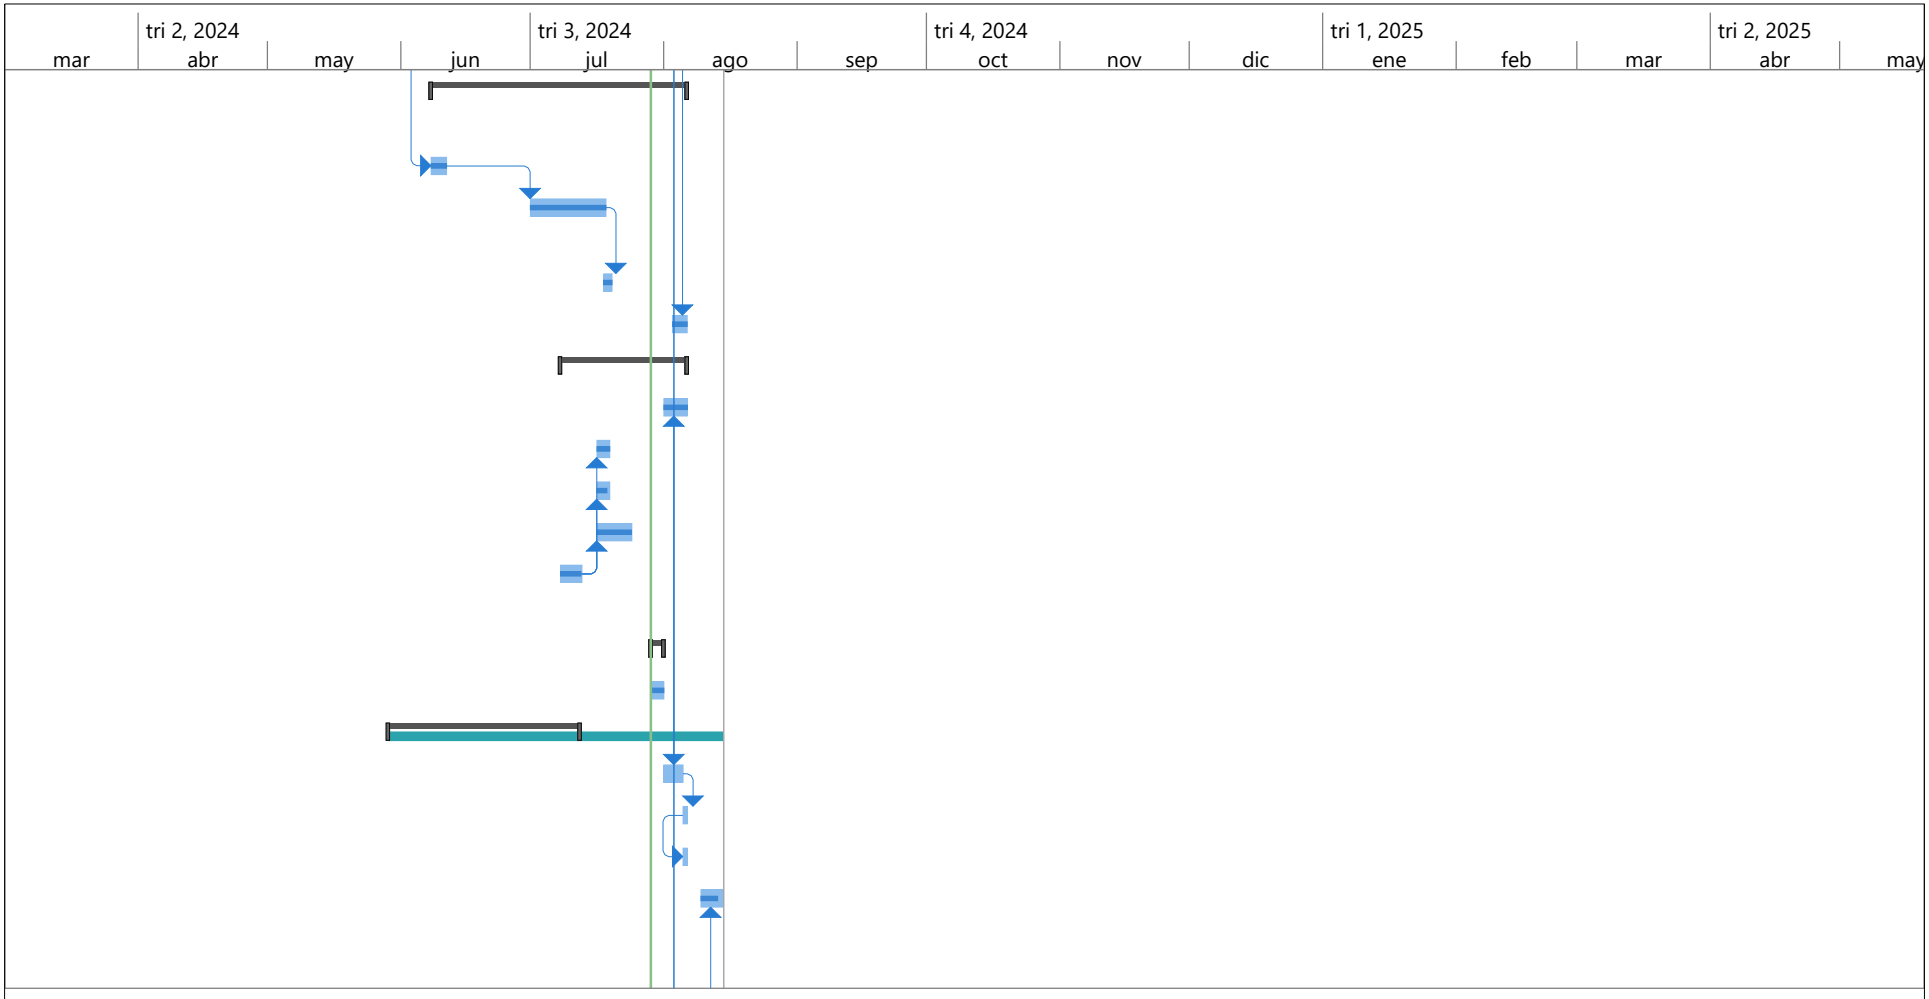

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

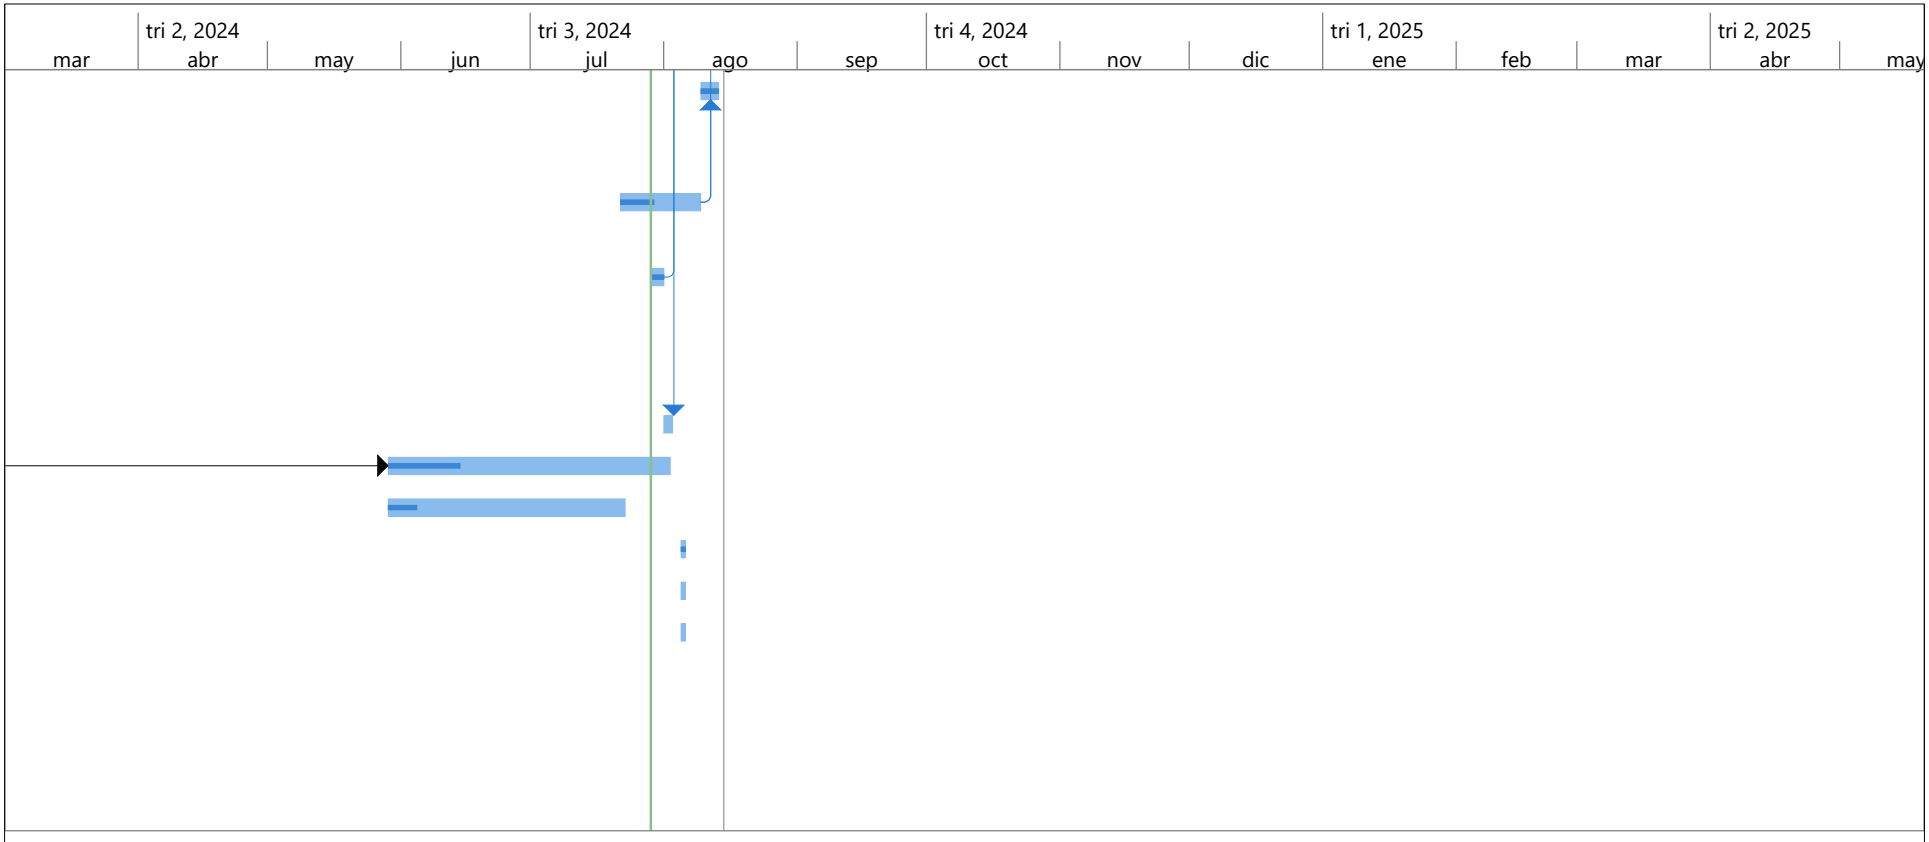

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: lun 29/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual
