

Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
1				**TUNAL ALTO**	**156,75 días**	**jue 1/02/24**	**mié 14/08/24**		**25%**
2			**1**	**PRELIMINARES**	**144,75 días**	**jue 1/02/24**	**mar 30/07/24**		**16%**
3	✓		1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	lun 8/04/24	lun 8/04/24		100%
4			1,02	DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	1 día	mar 9/04/24	mar 9/04/24	3	28%
5			1,03	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24	4	95%
6	✓		1,04	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M	2 días	mar 9/04/24	mié 10/04/24	3	100%
7	✓		1,05	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	2 días	vie 12/04/24	lun 15/04/24	5;6	100%
8	✓		1,06	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	3 días	lun 24/06/24	jue 27/06/24	70	100%
9			1,07	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	2 días	lun 29/07/24	mar 30/07/24		0%
10	✓		1,08	DESMONTE VENTANAS	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24		100%
11			1,09	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM (INCLUYE CARGUE)	101 días	jue 1/02/24	vie 7/06/24		0%
12			1,10	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	3	97%
13			1,11	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,1	5 días	mar 9/04/24	lun 15/04/24	3	79%
14			**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**26 días**	**lun 15/04/24**	**jue 16/05/24**		**94%**
15			2,01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTA	26 días	lun 15/04/24	jue 16/05/24	5;7;12;13	88%
16	✓		2,02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NE	26 días	lun 15/04/24	jue 16/05/24	5;7;12;13	100%
17			**3**	**CIMENTACIÓN**	**6 días**	**jue 16/05/24**	**jue 23/05/24**		**97%**
18			3,01	CONCRETO CICLOPEO (2,500PSI APROX) E	1 día	jue 16/05/24	vie 17/05/24	15	95%
19			3,02	VIGA DE CIMENTACION VC1 (0,25X0,25) I	3 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	18FC+2 días	98%
20			**4**	**ACEROS Y MALLAS**	**51 días**	**mar 21/05/24**	**lun 22/07/24**		**10%**

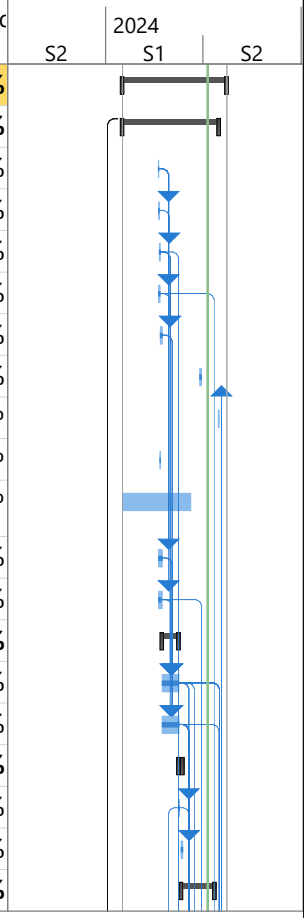

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
21			4,01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCLUYE CORTE, FIGURADO Y FIJACIÓN DE DISTANCIADORES	51 días	mar 21/05/24	lun 22/07/24	23	10%
22			**5**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**12 días**	**jue 16/05/24**	**jue 30/05/24**		**94%**
23	✓		5.01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE	4 días	jue 16/05/24	mar 21/05/24	5;15	100%
24	✓		5,02	VIGA CINTA O DE CORONACION CONCRE	4 días	sáb 25/05/24	jue 30/05/24	25;27;67	100%
25			5,03	COLUMNETA NUEVA CC2-B(0,12X0,12M) CONFINANTE EN CONCRETO 1:2:3 HECHO EN OBRA DE 3,000PSI APROX,	2 días	mar 21/05/24	jue 23/05/24	23	70%
26			**6**	**ANCLAJES**	**2 días**	**jue 23/05/24**	**sáb 25/05/24**		**33%**
27			6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ANCLAJE DE	2 días	jue 23/05/24	sáb 25/05/24	25	33%
28			**7**	**ACOMETIDAS HIDRAULICAS**	**4 días**	**mar 21/05/24**	**sáb 25/05/24**		**0%**
29			7,01	ACOMETIDA NUEVA DE ACUEDUCTO 1/2"	4 días	mar 21/05/24	sáb 25/05/24	23	0%
30			**8**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**65,5 días**	**jue 16/05/24**	**sáb 3/08/24**		**12%**
31			8,01	PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	40 días	lun 10/06/24	sáb 27/07/24		0%
32			8,02	REGISTRO RED WHITE DE ½"	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24	15;66;37;38;39	0%
33			8,03	TAPA REGISTRO 20X20 CM	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	15;66;37;38;39	0%
34			8,04	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	3 días	mié 31/07/24	sáb 3/08/24	15;66;37;38;39	0%
35			8,05	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE DIA	1 día	mié 31/07/24	jue 1/08/24	15;66;37;38;39	0%
36			8,06	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	3 días	mié 31/07/24	sáb 3/08/24	15;66;37;38;39	0%
37	✓		8,07	TUBERÍA PVC S 2"	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	16	100%

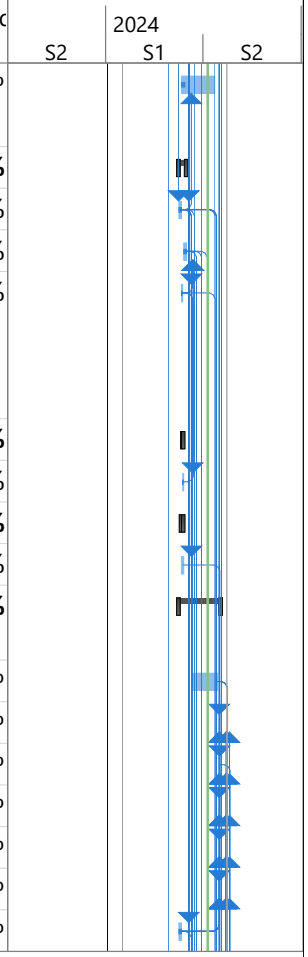

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
38			8,08	TUBERÍA PVC S 3"	3 días	jue 16/05/24	lun 20/05/24	16	60%
39			8,09	TUBERÍA PVC S 4"	58 días	jue 16/05/24	jue 25/07/24	16	3%
40	✓		8,10	CAJA DE INSPECCIÓN 1,00 M X 1,00 M X 1,00 M INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA	3 días	mié 31/07/24	vie 2/08/24	16	100%
41	✓		8,11	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	2 días	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	16	100%
42	✓		8,12	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 3"	2 días	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	16	100%
43			8,13	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	2 días	jue 16/05/24	sáb 18/05/24	16	0%
44			8,14	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SO	2 días	sáb 6/07/24	mar 9/07/24		0%
45			8,15	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAF	2 días	jue 25/07/24	vie 26/07/24	54FC+2 días	0%
46	✓		8,16	GEOTEXTIL NO TEJIDO	1 día	jue 16/05/24	vie 17/05/24	16	100%
47	✓		8,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PV	2 días	lun 20/05/24	mié 22/05/24	38	100%
48			8,18	ACESORIOS RED SANITARIA 2"	3 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	37	81%
49			8,19	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	3 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	38	50%
50			8,20	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	60 días	lun 20/05/24	mié 31/07/24		5%
51			**9**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**1 día**	**mar 13/08/24**	**mar 13/08/24**		**0%**
52			9,01	ASEO GENERAL	1 día	mar 13/08/24	mar 13/08/24		0%
53			**10**	**MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS**	**12 días**	**lun 8/07/24**	**lun 22/07/24**		**0%**
54			10,01	CUBIERTA TEJA TERMOACÚSTICA ECOROC	12 días	lun 8/07/24	lun 22/07/24	24;67;75;129	0%
55			**11**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**15,75 días**	**lun 22/07/24**	**vie 9/08/24**		**0%**
56			11,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA TC	1 día	mié 7/08/24	jue 8/08/24	62	0%
57			11,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUM	1 día	mié 7/08/24	jue 8/08/24	62	0%

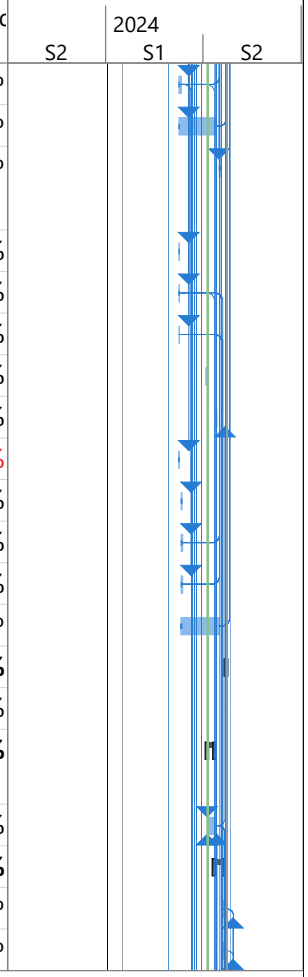

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
58			11,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATO	1 día	jue 8/08/24	vie 9/08/24	56	0%
59			11,04	BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAÑOS- E	1 día	jue 8/08/24	vie 9/08/24	56;57	0%
60			11,05	SALIDA TOMA CORRIENTE GFCI EN MURO	2 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	62	0%
61			11,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECC	2 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	62	0%
62			11,07	TUBERÍA EMT GALVANIZADA 3/4"	4 días	vie 2/08/24	mié 7/08/24	92	0%
63			11,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE	3 días	lun 22/07/24	mié 24/07/24		0%
64			**12**	**MAMPOSTERIA**	**54,25 días**	**mar 21/05/24**	**jue 25/07/24**		**15%**
65			12,01	MESÓN EN CONCRETO MEZCLA EN OBRA	2 días	mié 24/07/24	jue 25/07/24	23;25	0%
66			12,02	REGATAS (CORTE CON DISCO SOBRE MAI	1 día	mié 24/07/24	mié 24/07/24		0%
67			12,03	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	1 día	mar 21/05/24	mié 22/05/24	23	61%
68			**13**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**14 días**	**sáb 29/06/24**	**mar 16/07/24**		**6%**
69			13,01	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGR	14 días	sáb 29/06/24	mar 16/07/24		17%
70			13,02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	13 días	lun 1/07/24	mar 16/07/24		0%
71			13,03	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE MUROS PARA INSTALACIÓN ENCHAPE (INCLUYE PICADA)	14 días	sáb 29/06/24	mar 16/07/24	13;24	0%
72			**14**	**CUBIERTAS**	**44,25 días**	**jue 30/05/24**	**mar 23/07/24**		**0%**
73			14,01	CABALLETE PARA TEJA ARQUITECTÓNICA	1 día	mar 23/07/24	mar 23/07/24	54;75	0%
74			14,02	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA	1 día	mar 23/07/24	mar 23/07/24	54;75	0%
75			14,03	ESTRUCTURA PERFIL EN TUBO RECTANGU	5 días	jue 30/05/24	mié 5/06/24	24;25	0%
76			**15**	**CARPINTERIA METALICA**	**8 días**	**vie 2/08/24**	**lun 12/08/24**		**0%**
77			15,01	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18	8 días	vie 2/08/24	lun 12/08/24		0%



Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
78		15,02	MARCO TAPA CAJA DE INSPECCIÓN	7 días	vie 2/08/24	sáb 10/08/24	29	0%
79		15,03	PUERTA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORF	7 días	vie 2/08/24	sáb 10/08/24		0%
80		15,04	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTICC	7 días	vie 2/08/24	sáb 10/08/24		0%
81		**16**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**65,25 días**	**mar 21/05/24**	**jue 8/08/24**		**3%**
82		16,01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H	25 días	sáb 15/06/24	mar 16/07/24	15;23	7%
83		16,02	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA REF,: COF	4 días	sáb 3/08/24	jue 8/08/24	85	0%
84		16,03	REJILLA PLÁSTICA VENTILACIÓN 20X20	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	33	0%
85		16,04	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRI	7 días	vie 26/07/24	sáb 3/08/24	23;65;67;69;54	0%
86		16,05	ENCHAPE CERÁMICO PARED COCINA REF	7 días	vie 26/07/24	sáb 3/08/24	23;65;67;69;54	0%
87		16,06	ENCHAPE CERÁMICO PARED BAÑO REF,: F	7 días	vie 26/07/24	sáb 3/08/24	23;65;67;69;54	0%
88		16,07	WIN PROTECTOR MARMOLIZADO, WIN ME	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	87	0%
89		16,08	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN C	3 días	mar 21/05/24	vie 24/05/24	23	0%
90		**17**	**ESTUCOS Y PINTURAS**	**8 días**	**lun 29/07/24**	**mié 7/08/24**		**0%**
91		17,01	ESTUCO	4 días	lun 29/07/24	jue 1/08/24	69;70;54	0%
92		17,02	ESTUCO (LINEAL)	4 días	lun 29/07/24	jue 1/08/24	69;70;54	0%
93		17,03	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 CAPAS (COLOR A ELEGIR)	4 días	vie 2/08/24	mié 7/08/24	92	0%
94		17,04	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24	69;70	0%
95		**18**	**APARATOS SANITARIOS Y DE COCINA**	**2 días**	**lun 5/08/24**	**mar 6/08/24**		**0%**
96		18,01	SANITARIO ACUAPLUS ULTRA BLANCO CO	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	31;42;43;85;86	0%
97		18,02	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - S/	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	31;42;43;85;86	0%



Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
98			18,03	GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS SENCILLO G	1 día	mar 6/08/24	mar 6/08/24	97	0%
99			**19**	**ANDENES Y SARDINELES**	**11 días**	**lun 1/07/24**	**sáb 13/07/24**		**0%**
100			19,01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.	11 días	lun 1/07/24	sáb 13/07/24		0%
101			**20**	**TRANSPORTE RURALIDAD**	**61,5 días**	**lun 8/04/24**	**jue 20/06/24**		**100%**
102			20.01	Distancias establecidas desde el Borde Urban	61,5 días	lun 8/04/24	jue 20/06/24	2CC	100%
103			**NP**	**NO PREVISTOS**	**106 días**	**lun 8/04/24**	**mié 14/08/24**		**24%**
104			NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUI	2 días	vie 9/08/24	lun 12/08/24	62	0%
105			NP2	MANO DE OBRA PARA EL RETIRO DE RED	2 días	vie 24/05/24	lun 27/05/24	66;67	100%
106			NP3	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #12 LIBRE DE HALOGENOS	2 días	lun 12/08/24	mar 13/08/24		0%
107			NP4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFA 4	2 días	sáb 3/08/24	mar 6/08/24	65;85;86;87	0%
108			NP5	SUMINISTRO E INSTALACION CAMPANA EX	2 días	sáb 3/08/24	mar 6/08/24	65;85;86;87	0%
109			NP6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA (	1 día	lun 12/08/24	mar 13/08/24	77	0%
110			NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POZO SÉI	7 días	lun 22/07/24	mar 30/07/24	6;38;42	0%
111			NP8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24	18CC	0%
112			NP9	SUMINISTRO E INTALACION DE COCINA EN	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24		0%
113			NP10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE BIFASICO (80 amp)	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24		0%
114			NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE I	1 día	mié 7/08/24	jue 8/08/24	31;42;43;85;86	0%
115			NP12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE # 10 LIBRE DE HALÓGENO	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	113CC	0%
116			NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	113CC	0%
117			NP14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOTALIZA	4 días	sáb 3/08/24	jue 8/08/24	85;86;87	0%

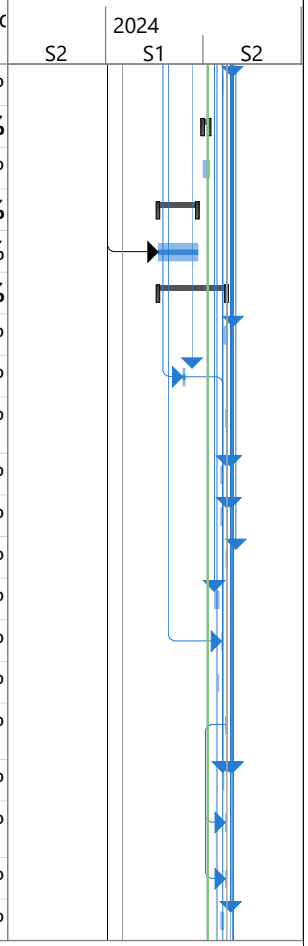

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
118			NP15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMATICA LED 40W LUZ FRESCA	6 días	mié 7/08/24	mié 14/08/24	91;93;105	0%
119			NP16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN APLIQUE OV/	3 días	jue 8/08/24	lun 12/08/24	56	0%
120			NP17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA	3 días	jue 8/08/24	lun 12/08/24	121	0%
121			NP18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMAN	3 días	lun 5/08/24	mié 7/08/24		0%
122			NP19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISION DE BAÑO FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 304, INCLUYE PUERTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	4 días	mié 7/08/24	lun 12/08/24		0%
123			NP20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PARA BAÑO (largo de 1,35x0,50 de ancho) incluye un Lavamanos de empotrar y griferia push	5 días	mié 7/08/24	mar 13/08/24	122CC	0%
124			NP21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4	2 días	mié 7/08/24	jue 8/08/24	123CC	0%
125			NP22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO TE	2 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24	93	0%
126			NP23	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	105 días	lun 8/04/24	mar 13/08/24	2CC	27%
127			NP24	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24		39%
128			NP25	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24		80%
129			NP26	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24		80%
130			NP27	SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE	10 días	mié 26/06/24	lun 8/07/24		0%
131			NP28	REJILLA EN CONCRETO PARA CARCAMO TRANSITO VEHICULAR	4 días	lun 22/07/24	jue 25/07/24		0%
132				**ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD**	**53 días**	**vie 10/05/24**	**sáb 13/07/24**		29%

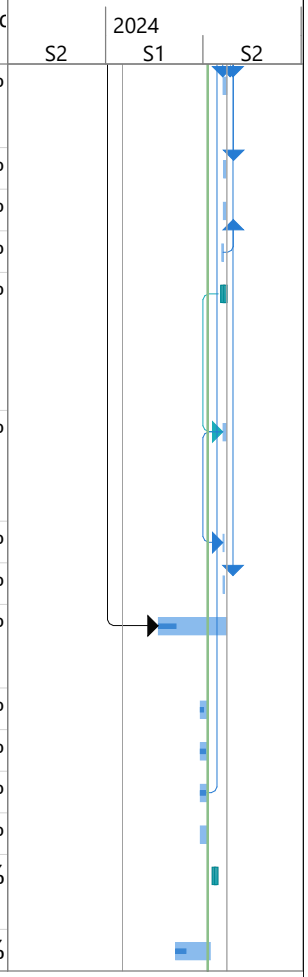

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
133				**LAS AURAS**	**104,5 días**	**mié 10/04/24**	**mié 14/08/24**		**0%**
134			**1**	**PRELIMINARES**	**37,5 días**	**mié 10/04/24**	**vie 24/05/24**		**0%**
135			1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	mié 10/04/24	mié 10/04/24		0%
136			1,02	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24	135	0%
137			1,03	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	2 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24	139	0%
138			1,04	DEMOLICIÓN VIGAS Y COLUMNAS	2 días	jue 23/05/24	vie 24/05/24		0%
139			1,05	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	3 días	sáb 13/04/24	mié 17/04/24	144	0%
140			1,06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	3 días	jue 11/04/24	lun 15/04/24	135	0%
141			1,07	DESMONTE VENTANAS	1 día	jue 11/04/24	jue 11/04/24	135	0%
142			1,08	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	1 día	vie 19/04/24	sáb 20/04/24	143	0%
143			1,09	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA	2 días	mié 17/04/24	vie 19/04/24	139	0%
144			1,10	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,1	2 días	jue 11/04/24	vie 12/04/24	135	0%
145			1,11	CERCA EN TELA VERDE H=2.10 M	3 días	jue 11/04/24	lun 15/04/24	135	0%
146				**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**7,75 días**	**lun 13/05/24**	**mar 21/05/24**		**0%**
147			**2,01**	RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE	1 día	mar 21/05/24	mar 21/05/24		0%
148			**2,02**	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NEGRAS, ACOMETIDAS Y DEMÁS ACTIVIDADES QUE SE PRESENTEN EN MEJORAMIENTO)	2 días	lun 13/05/24	mar 14/05/24		0%
149			**3**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**5 días**	**sáb 3/08/24**	**vie 9/08/24**		**0%**

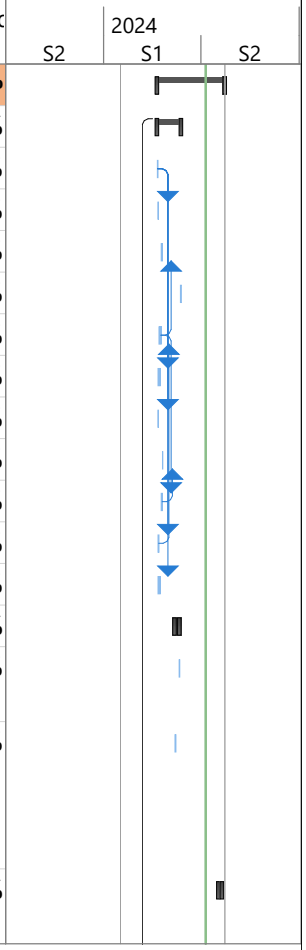

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
150		3,01	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SO	2 días	sáb 3/08/24	mar 6/08/24	156	0%
151		3,02	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAF	5 días	sáb 3/08/24	vie 9/08/24	156	0%
152		**4**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**2 días**	**mar 13/08/24**	**mié 14/08/24**		**0%**
153		4,01	ASEO GENERAL	2 días	mar 13/08/24	mié 14/08/24		0%
154		**5**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**5 días**	**lun 29/07/24**	**vie 2/08/24**		**0%**
155		5,01	PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:3 E= 2 CM	5 días	lun 29/07/24	vie 2/08/24		0%
156		5,02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	5 días	lun 29/07/24	vie 2/08/24	155CC	0%
157		**6**	**CUBIERTAS**	**1 día**	**sáb 3/08/24**	**lun 5/08/24**		**0%**
158		6,01	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA	1 día	sáb 3/08/24	lun 5/08/24	156	0%
159		**7**	**ESTUCO Y PINTURAS**	**3 días**	**sáb 3/08/24**	**mié 7/08/24**		**0%**
160		7,01	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 C	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	156	0%
161		7,02	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA ,	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	156	0%
162		**8**	**TRANSPORTE RURALIDAD**	**8 días**	**sáb 3/08/24**	**mar 13/08/24**		**0%**
163		8,01	Distancias establecidas desde el Borde Urbanao - Usme hasta el territorio de Sumapaz - (Valor transporte de insumos por salon a intervenir)	8 días	sáb 3/08/24	mar 13/08/24	134CC	0%
164		**NP**	**NO PREVISTOS**	**24 días**	**vie 14/06/24**	**vie 12/07/24**		**0%**
165		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	5 días	mié 7/08/24	mar 13/08/24	166	0%

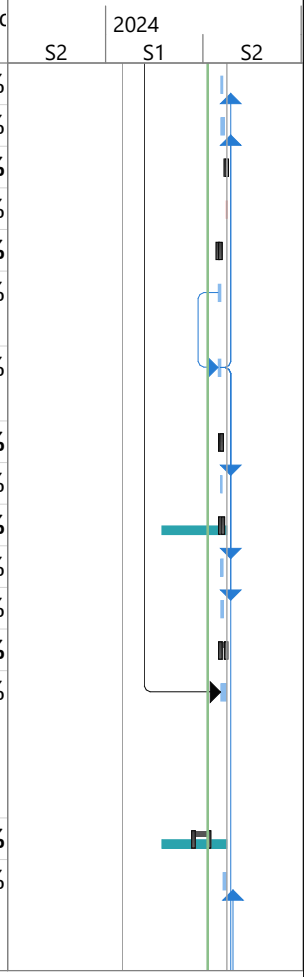

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas	
División	Tarea manual	Hito externo	
Hito	solo duración	Fecha límite	
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas	
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica	
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso	
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
166			NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	3 días	sáb 3/08/24	mié 7/08/24	156	0%
167			NP3	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	100 días	lun 15/04/24	mié 14/08/24		0%
168			NP4	MANO DE OBRA PARA EL DESMONTE DE RED SANITARIA EXISTENTE	2 días	mié 31/07/24	jue 1/08/24		0%
169			NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN EN GRANITO PARA BAÑO (largo de 1,35x0,50 de ancho) incluye dos Lavamanos de empotrar y griferia	4 días	vie 2/08/24	mié 7/08/24		0%
170				**ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD**	74 días	lun 15/04/24	vie 12/07/24		0%
171				**BETANIA**	**69,25 días**	**lun 29/04/24**	**lun 22/07/24**		**64%**
172			**1**	**PRELIMINARES**	**10 días**	**lun 29/04/24**	**vie 10/05/24**		**60%**
173	✓		1,01	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	lun 29/04/24	lun 29/04/24		100%
174	✓		1,02	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24	173	100%
175			1,03	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	1 día	mar 30/04/24	mar 30/04/24	173	62%
176			1,04	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	2 días	mié 8/05/24	vie 10/05/24	179	0%
177	✓		1,05	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO HASTA E=	2 días	mié 1/05/24	jue 2/05/24	174;175	100%
178			1,06	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	2 días	vie 3/05/24	lun 6/05/24	177	98%
179			1,07	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M	2 días	lun 6/05/24	mié 8/05/24	182	0%

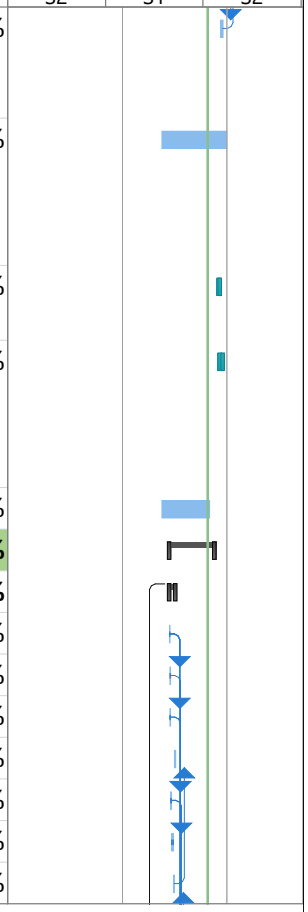

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
180			**2**	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**8 días**	**vie 3/05/24**	**lun 13/05/24**		**33%**
181			2,01	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTA	2 días	vie 10/05/24	lun 13/05/24	200	33%
182			2,02	EXCAVACIÓN MANUAL (REDES, AGUAS NE	2 días	vie 3/05/24	lun 6/05/24	175;177	33%
183			**3**	**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**	**2 días**	**lun 13/05/24**	**mié 15/05/24**		**94%**
184			3,01	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE	2 días	lun 13/05/24	mié 15/05/24	181	94%
185			**4**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**4 días**	**lun 6/05/24**	**vie 10/05/24**		**97%**
186	✓		4,01	PUNTO HIDRÁULICO DE ½"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
187	✓		4,02	RED SUMINISTRO PVC P DE 1/2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
188	✓		4,06	LLAVE JARDÍN DE 1/2" X3/4", 1,9 CM DE	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
189	✓		4,07	ACESORIOS RED HIDRAULICA 1/2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
190			4,08	RE-VENTILACIÓN DE 3" X 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	57%
191	✓		4,09	TUBERÍA PVC S 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
192	✓		4,10	TUBERÍA PVC S 3"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
193	✓		4,11	TUBERÍA PVC S 4"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
194	✓		4,13	REJILLA PLÁSTICA SOSCO 3X2	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
195	✓		4,14	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
196	✓		4,15	PUNTO SALIDA SANITARIA PVC S 4"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
197	✓		4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SIFÓN EN PV	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
198	✓		4,17	ACCESORIOS RED SANITARIA 2"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
199	✓		4,18	ACESORIOS RED SANITARIA 3"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%
200	✓		4,19	ACESORIOS RED SANITARIA 4"	4 días	lun 6/05/24	vie 10/05/24	182	100%

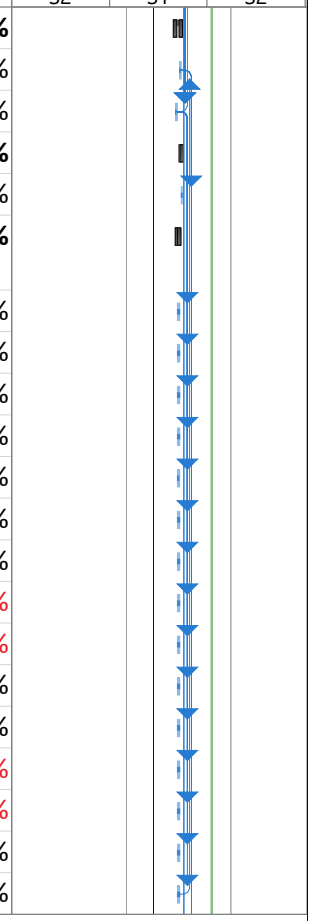

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
201			**5**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**2 días**	**vie 19/07/24**	**lun 22/07/24**		**0%**
202			5,01	ASEO GENERAL	2 días	vie 19/07/24	lun 22/07/24		0%
203	✓		**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**2 días**	**vie 24/05/24**	**lun 27/05/24**		**100%**
204	✓		6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUI	1 día	vie 24/05/24	sáb 25/05/24	222FC+4 días	100%
205	✓		6,02	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ES	1 día	lun 27/05/24	lun 27/05/24	204	100%
206			**7**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**3 días**	**lun 29/04/24**	**mié 1/05/24**		**98%**
207			7,01	PAÑETE LISO DE MURO, MORTERO 1:3 E:	3 días	lun 29/04/24	mié 1/05/24		98%
208			**8**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**5 días**	**lun 13/05/24**	**sáb 18/05/24**		**87%**
209	✓		8,01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H	1 día	mié 15/05/24	jue 16/05/24	181FC+2 días	100%
210	✓		8,02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRI	1 día	jue 16/05/24	vie 17/05/24	209	100%
211			8,03	WIN PROTECTOR MARMOLIZADO, WIN M	1 día	vie 17/05/24	sáb 18/05/24	210	46%
212	✓		8,04	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CO	1 día	lun 13/05/24	mar 14/05/24	181	100%
213			**9**	**ESTUCOS Y PINTURAS**	**67,25 días**	**mar 30/04/24**	**vie 19/07/24**		**15%**
214			9,01	ESTUCO	3 días	mar 30/04/24	jue 2/05/24	173	61%
215			9,02	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	23 días	jue 20/06/24	mié 17/07/24		0%
216			9,03	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	23 días	jue 20/06/24	mié 17/07/24		0%
217	✓		9,04	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	2 días	mié 17/07/24	jue 18/07/24	215	100%
218			9,05	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	2 días	jue 18/07/24	vie 19/07/24	216	0%
219	✓		9,06	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR 3 C	4 días	mar 7/05/24	sáb 11/05/24	217	100%
220			9,07	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA ,	3 días	mar 30/04/24	jue 2/05/24	173	30%

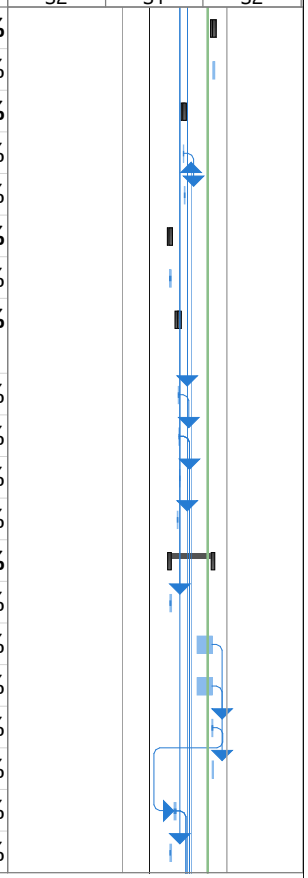

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
221			**10**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**1 día**	**sáb 18/05/24**	**lun 20/05/24**		**50%**
222	✓		10,1	MONTAJE DE APARATOS- LAVAMANOS - S	1 día	sáb 18/05/24	lun 20/05/24	210FC+1 día	100%
223			10,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS	1 día	sáb 18/05/24	lun 20/05/24	210FC+1 día	0%
224			**11**	**ANDENES Y SARDINELES**	**2 días**	**lun 13/05/24**	**mié 15/05/24**		**75%**
225			11,01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0	2 días	lun 13/05/24	mié 15/05/24	181	75%
226	✓		**NP**	**NO PREVISTO**	**15 días**	**lun 29/04/24**	**jue 16/05/24**		**100%**
227	✓		NP1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	4 días	sáb 11/05/24	jue 16/05/24	219	100%
228	✓		NP2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	4 días	sáb 11/05/24	jue 16/05/24	219	100%
229	✓		NP3	Transporte de materiales y equipos desde perimetro urbano (Bomba texaco USME) hasta el punto de obra (Salón comunal)	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24	172CC	100%
230				**ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD**	28 días	lun 29/04/24	vie 31/05/24		83%
231				**SANTA ROSA**	**157 días**	**jue 1/02/24**	**mié 14/08/24**		**13%**
232			**1**	**PRELIMINARES**	**99 días**	**jue 1/02/24**	**mié 5/06/24**		**62%**
233	✓		**1,01**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24		100%
234			**1,02**	DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M	1 día	jue 30/05/24	jue 30/05/24	233	0%
235			**1,03**	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	2 días	jue 1/02/24	vie 2/02/24		0%
236	✓		**1,04**	DEMOLICIÓN MUROS DE E= 0,12 M A 0,15 M	2 días	jue 30/05/24	vie 31/05/24	233	100%

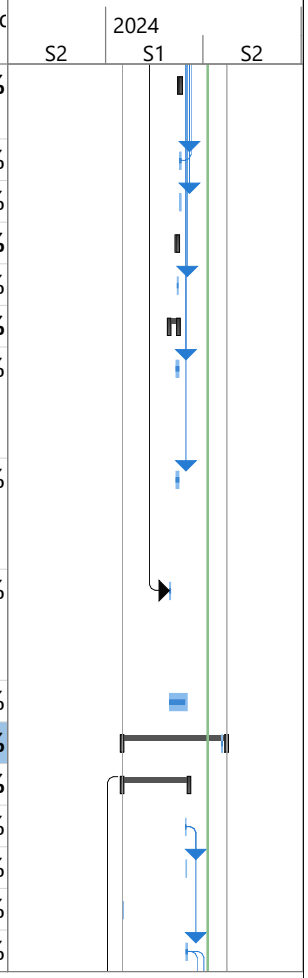

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
237			**1,05**	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	3 días	sáb 1/06/24	mié 5/06/24	236	86%
238			**2**	**MOTEROS Y CONCRETOS**	**2 días**	**lun 29/07/24**	**mar 30/07/24**		**0%**
239			2,01	CONCRETO 2500 PSI	2 días	lun 29/07/24	mar 30/07/24		0%
240			**3**	**ACEROS Y MALLAS**	**2 días**	**lun 29/07/24**	**mar 30/07/24**		**0%**
241			3,01	ACERO DE REFUERZO DE 60,000 PSI, INCL	2 días	lun 29/07/24	mar 30/07/24	239CC	0%
242			**4**	**INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, SUBTERRANEAS, DESAGÜES Y VENTILACIÓN**	**6 días**	**lun 29/07/24**	**lun 5/08/24**		**0%**
243			4,01	BAJANTE PVC BLANCO EXTERNO LISO- SO	6 días	lun 29/07/24	lun 5/08/24		0%
244			4,02	CANAL PAVCO TIPO AMAZONA O SIMILAF	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24		0%
245			**5**	**ASEO GENERAL DE OBRA**	**1 día**	**vie 2/08/24**	**vie 2/08/24**		**0%**
246			5,01	ASEO GENERAL	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24		0%
247			**6**	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**	**5 días**	**lun 29/07/24**	**vie 2/08/24**		**0%**
248			6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24		0%
249			6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA T	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	248	0%
250			6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUI	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	248	0%
251			6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATC	1 día	jue 1/08/24	jue 1/08/24	248	0%
252			6,05	BOMBILLOS LED PARA HABITACIONES - ES	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	250	0%
253			6,06	BOMBILLOS LED PARA COCINAS BAÑOS- E	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	250	0%
254			6,07	PANEL LED RD LUZ BLANCA 10 - 240 V116	1 día	vie 2/08/24	vie 2/08/24	250	0%
255			**7**	**PAÑETES Y ACABADOS PARED**	**8 días**	**mié 3/07/24**	**vie 12/07/24**		**0%**
256			7,01	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:4 E	8 días	mié 3/07/24	vie 12/07/24		0%

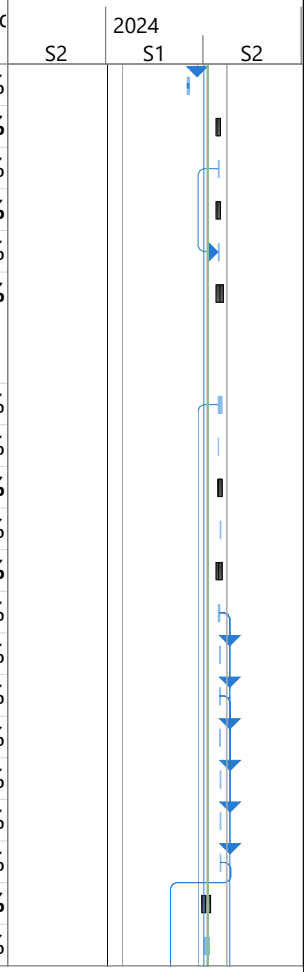

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	


Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
257			7,02	FILOS Y DILATACIONES EN MORTERO 1:3	6 días	mié 3/07/24	mié 10/07/24	236	0%
258			**8**	**CUBIERTAS**	**1 día**	**lun 29/07/24**	**lun 29/07/24**		**0%**
259			8,01	ACCESORIO GALVANIZADO PARA SALIDA	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24	243CC	0%
260			**9**	**CARPINTERIA METALICA**	**3 días**	**lun 29/07/24**	**mié 31/07/24**		**0%**
261			9,01	VENTANA LÁMINA CALIBRE 18 INC. ANTIC	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24		0%
262			**10**	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**	**34,25 días**	**sáb 8/06/24**	**vie 19/07/24**		**40%**
263	✓		10,01	ALISTADO DE PISOS CON MORTERO 1:4 H	2 días	sáb 8/06/24	mar 11/06/24	254	100%
264			10,02	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	15 días	lun 1/07/24	jue 18/07/24	263	23%
265			10,03	GUARDAESCOBA EN CERÁMICA REF,: COR	2 días	jue 18/07/24	vie 19/07/24	264	49%
266	✓		10,04	PREPARACIÓN SUPERFICIE DE PISO EN CO	2 días	sáb 8/06/24	mar 11/06/24	254	100%
267			**11**	**ESTUCOS Y PINTURAS**	**24,25 días**	**lun 8/07/24**	**mar 6/08/24**		**0%**
268			11,01	ESTUCO	4 días	jue 1/08/24	mar 6/08/24	282	0%
269			11,02	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	3 días	mar 16/07/24	vie 19/07/24	272FC+2 días	0%
270			11,03	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	3 días	mar 16/07/24	vie 19/07/24	272FC+2 días	0%
271			11,04	VINILO TIPO 1 PARA MURO INTERIOR - 3	7 días	mar 16/07/24	mié 24/07/24	272FC+2 días	0%
272			11,05	PREPARACIÓN SUPERFICIE PARA NUEVA APLICACIÓN DE PINTURAS	5 días	lun 8/07/24	vie 12/07/24		0%
273			**12**	**ANDENES Y SARDINELES**	**3 días**	**lun 29/07/24**	**mié 31/07/24**		**0%**
274			12,01	ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24		0%
275			**NP**	**NO PREVISTO**	**37 días**	**mié 29/05/24**	**vie 12/07/24**		**11%**

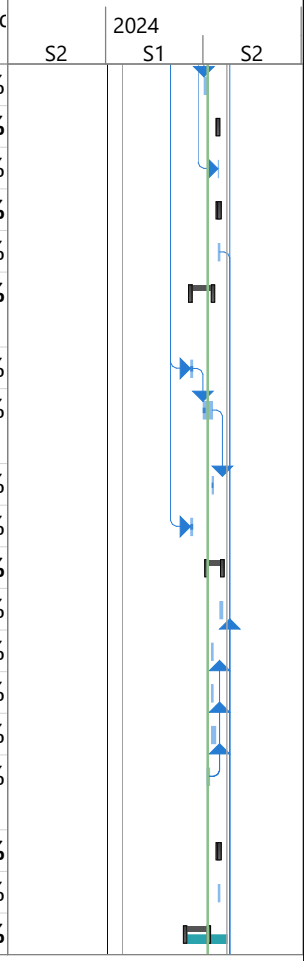

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual


Id	Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
276		NP1	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE #12 L	3 días	jue 1/08/24	lun 5/08/24	248	0%
277		NP2	SUMINISTRO E INSTALACION Kit Solar 30(	1 día	lun 5/08/24	mar 6/08/24	276	0%
278		NP3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARILLAS	1 día	lun 5/08/24	mar 6/08/24	277CC	0%
279		NP4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE FACHADA CON PINTURA KORAZA A DOS MANOS	4 días	vie 9/08/24	mié 14/08/24	281	0%
280		NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRIMANTE PARA MUROS EXTERIORES A UNA MANO	3 días	vie 9/08/24	mar 13/08/24	281	0%
281		NP6	REALIZACIÓN DE MURAL ARTISTICO PARA FACHADA	16 días	lun 22/07/24	vie 9/08/24		0%
282		NP7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUPERBOARD O FIBROCEMENTO 6 mm PARA MURO FRONTAL DEL SALÓN COMUNAL.	3 días	lun 29/07/24	mié 31/07/24		0%
283		NP8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO T	2 días	jue 1/08/24	vie 2/08/24	261	0%
284		NP9	Transporte de materiales y equipos desde	54 días	mié 29/05/24	vie 2/08/24	232CC	18%
285			**ADMINISTRACION, IMPREVISTOS Y UTILIDA**	**45 días**	**mié 29/05/24**	**lun 22/07/24**		12%
286			SAN JUAN	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24		100%
287		**NP**	**NO PREVISTO**	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24		0%

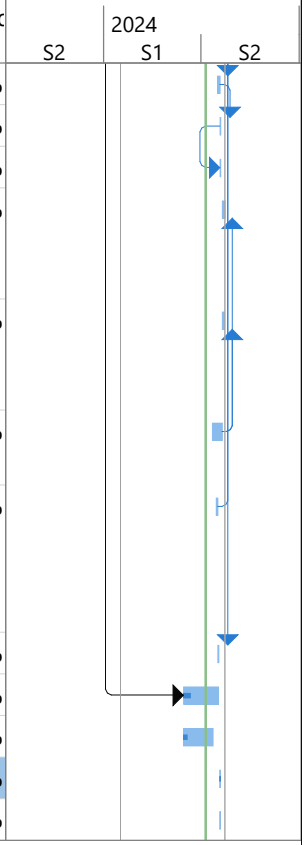

Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Tareas críticas
Resumen del proyecto	Resumen manual	División crítica
Tarea inactiva	solo el comienzo	Progreso
Hito inactivo	solo fin	Progreso manual

Id		Modo de tarea	Item	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	% completac
288			NP1	DESINSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA REJA METÁLICA CAL18 TIPO CORTINA, INCLUYE RIELES, GUIAS, PASADORES, CHAPA DE SEGURIDAD, ANTICORROSIVO Y ACABADO DE PINTURA.	1 día	lun 5/08/24	lun 5/08/24		0%



Proyecto: SANTA ROSA
Fecha: mié 10/07/24
