
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**CONSTRUCCIÓN DE AREA DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTERNATIVOS "DISTRITO URBANO" EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA**	**180 días**	**sáb 3/08/24**	**vie 11/04/25**	
2		**INICIO**	**0 días**	**sáb 3/08/24**	**sáb 3/08/24**	
3		**Preliminares**	**60 días**	**lun 5/08/24**	**vie 25/10/24**	
4		Localización y replanteo del area del proyecto	60 días	lun 5/08/24	vie 25/10/24	2
5		**Movimiento de tierra**	**140 días**	**mié 7/08/24**	**mar 18/02/25**	
6		Excavación manual de 0 a 2 metros de profundidad (material común)	140 días	mié 7/08/24	mar 18/02/25	4CC+2 días
7		Excavación mecánica en material común (incluye corte)	60 días	mié 7/08/24	mar 29/10/24	4CC+2 días
8		Relleno y compactación con material de sitio	60 días	lun 30/09/24	vie 20/12/24	7CC+40 días
9		Suministro, colocación y compactación con material tipo 2 (material gravo arcilloso)	60 días	lun 14/10/24	vie 3/01/25	8CC+10 días
10		Suministro, colocación y compactación con material base granular	60 días	lun 28/10/24	vie 17/01/25	9CC+10 días
11		Retiro de material sobrante existente	110 días	mié 28/08/24	mar 28/01/25	7
12		**Concretos y asfalto**	**150 días**	**lun 26/08/24**	**vie 21/03/25**	
13		Concreto ciclópeo para cimentación de 2000 psi 50% concreto 3000 psi 50% agregado bolo	90 días	mié 28/08/24	mar 31/12/24	6CC+15 días
14		Concreto de 2000 psi, clase f, para solado para protección de estructuras de cimentación	10 días	mié 11/09/24	mar 24/09/24	13CC+10 días
15		Concreto de 3000 psi para zapatas de muros de contención y graderías	60 días	mié 25/09/24	mar 17/12/24	14
16		Placa de contrapiso de concreto de 3000psi con fibra sintética esp. 0.12m	45 días	mié 20/11/24	mar 21/01/25	9;10



Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
17		Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi esp 0.06m incluye malla electrosoldada 6mm, 15cm*15cm.	30 días	mié 20/11/24	mar 31/12/24	9;10
18		Placa de contrapiso de concreto de 3000 psi con fibra sintética esp .0.06m	30 días	mié 20/11/24	mar 31/12/24	9;10
19		Concreto de 3000 psi para muros de contención y graderías	15 días	mié 16/10/24	mar 5/11/24	15
20		Concreto de 3000 psi para placas de graderías y cubierta cuarto eléctrico	20 días	mié 6/11/24	mar 3/12/24	19
21		Concreto de 3000 psi para detalles de zonas de juegos	20 días	lun 20/01/25	vie 14/02/25	9;10
22		Suministro e instalación de sardinel en concreto prefabricado 1m*0,40m*0,15m	20 días	mié 20/11/24	mar 17/12/24	9;10
23		Acero de refuerzo	150 días	lun 26/08/24	vie 21/03/25	2CC+15 días
24		Imprimación con emulsión asfaltica tipo CRL1	3 días	mié 20/11/24	vie 22/11/24	10
25		Suministro, extendido, nivelación y compactación de Mezcla Densa en Caliente MDC-19.	12 días	lun 25/11/24	mar 10/12/24	24
26		Sello de juntas de dilatación de 0 a 6mm	10 días	mié 22/01/25	mar 4/02/25	16;17;18
27		Concreto de 3000 psi para cimentación graderías y cuarto eléctrico	5 días	mié 25/09/24	mar 1/10/24	14
28		Concreto de 3000 psi para vigas y columnas cuarto eléctrico	7 días	mié 20/11/24	jue 28/11/24	36
29		Suministro e instalación acero para cubiertas de c	15 días	vie 29/11/24	jue 19/12/24	28
30		Suministro e instalación de loseta 0.40 X 0.40 color gris	50 días	mié 20/11/24	mar 28/01/25	10
31		Suministro e instalación de podotáctil 0.40 x 0.40 color gris	25 días	mié 4/12/24	mar 7/01/25	30CC+10 días

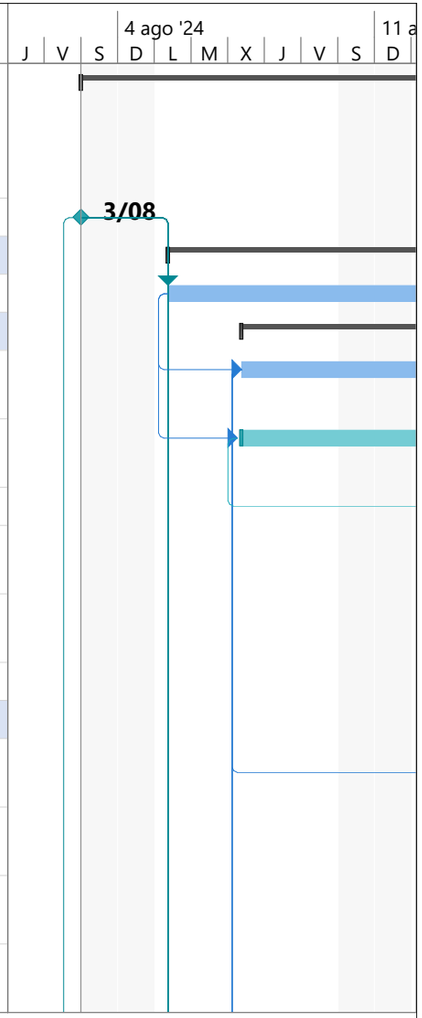

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24


Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
32		Concreto de 3000 psi para zapatas y pedestales cimentación pórtico, mástiles de iluminación y soportes contenedor	20 días	mié 25/09/24	mar 22/10/24	14
33		**Mampostería y acabados**	**70 días**	**mié 30/10/24**	**mar 4/02/25**	
34		Mamposteria en ladrillo de arcilla a la vista (instalación horizontal)	60 días	mié 30/10/24	mar 21/01/25	13;27
35		Friso para muros impermeabilizado incluye dilataciones y filos	30 días	mié 25/12/24	mar 4/02/25	34FC-20 días
36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL CON REFUERZO VERTICAL CADA ,20CM CON REFUERZO NUMERO 3 Y HORIZONTAL CADA ,40 CON REFUERZO N3	15 días	mié 30/10/24	mar 19/11/24	13;27
37		**Eléctrico**	**99 días**	**mié 28/08/24**	**lun 13/01/25**	
38		**Red de media tensión y subestacion eléctrica**	**65 días**	**mié 25/09/24**	**mar 24/12/24**	
39		Suministro e instalación de poste en concreto 12 m 1050 kgf.	1 día	mié 20/11/24	mié 20/11/24	9;10
40		Suministro, transporte e instalación de estructura horizontal terminal con cruceta metalica de 2,4 metros según norma ESSA para conexión desde circuito alimentador de operador de red hacia ramal de derivación.	2 días	jue 21/11/24	vie 22/11/24	39



Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
41		Suministro, transporte e instalación de estructura de arranque, incluye cajas cortacircuitos, DPS, herrajes, aisladores, grapas, transformadores de corriente, transformadores de potencia, equipo de medida, gabinete, crucetas, tubería, cableado de señales	4 días	jue 21/11/24	mar 26/11/24	39
42		Suministro e instalación de transformador trifásico aéreo convencional de 45 KVA 13200/208-120 V	2 días	vie 20/12/24	lun 23/12/24	29
43		Bajante imc de 3"	1 día	mar 24/12/24	mar 24/12/24	42
44		Caja de inspección 0.60 x 0.60 m; en mampostería con tapa en marco metalico fundida en concreto (incluye hierro)	2 días	mié 25/09/24	jue 26/09/24	46
45		Suministro e instalación de tablero general de baja tensión elaborado en lámina galvanizada calibre 18 incluye: 3. Medidores electrónico, totalizador general, sistema control por medio de temporizadores.	3 días	vie 27/09/24	mar 1/10/24	47
46		Suministro y colocación de tubería 3 Ductos PVC 3" . Incluye accesorios, terminales, curvas, soldadura PVC, excavación, botada de escombros, arenilla y compactación.	20 días	lun 28/10/24	vie 22/11/24	9CC+10 días
47		Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 3x#2/0 (F) +2/0(N)+1/0(T) THWN desde bornes del transformador hasta tablero general de baja tensión (no incluye ductos).	2 días	mié 25/09/24	jue 26/09/24	46
48		**Alumbrado Publico**	**45 días**	**mar 12/11/24**	**lun 13/01/25**	

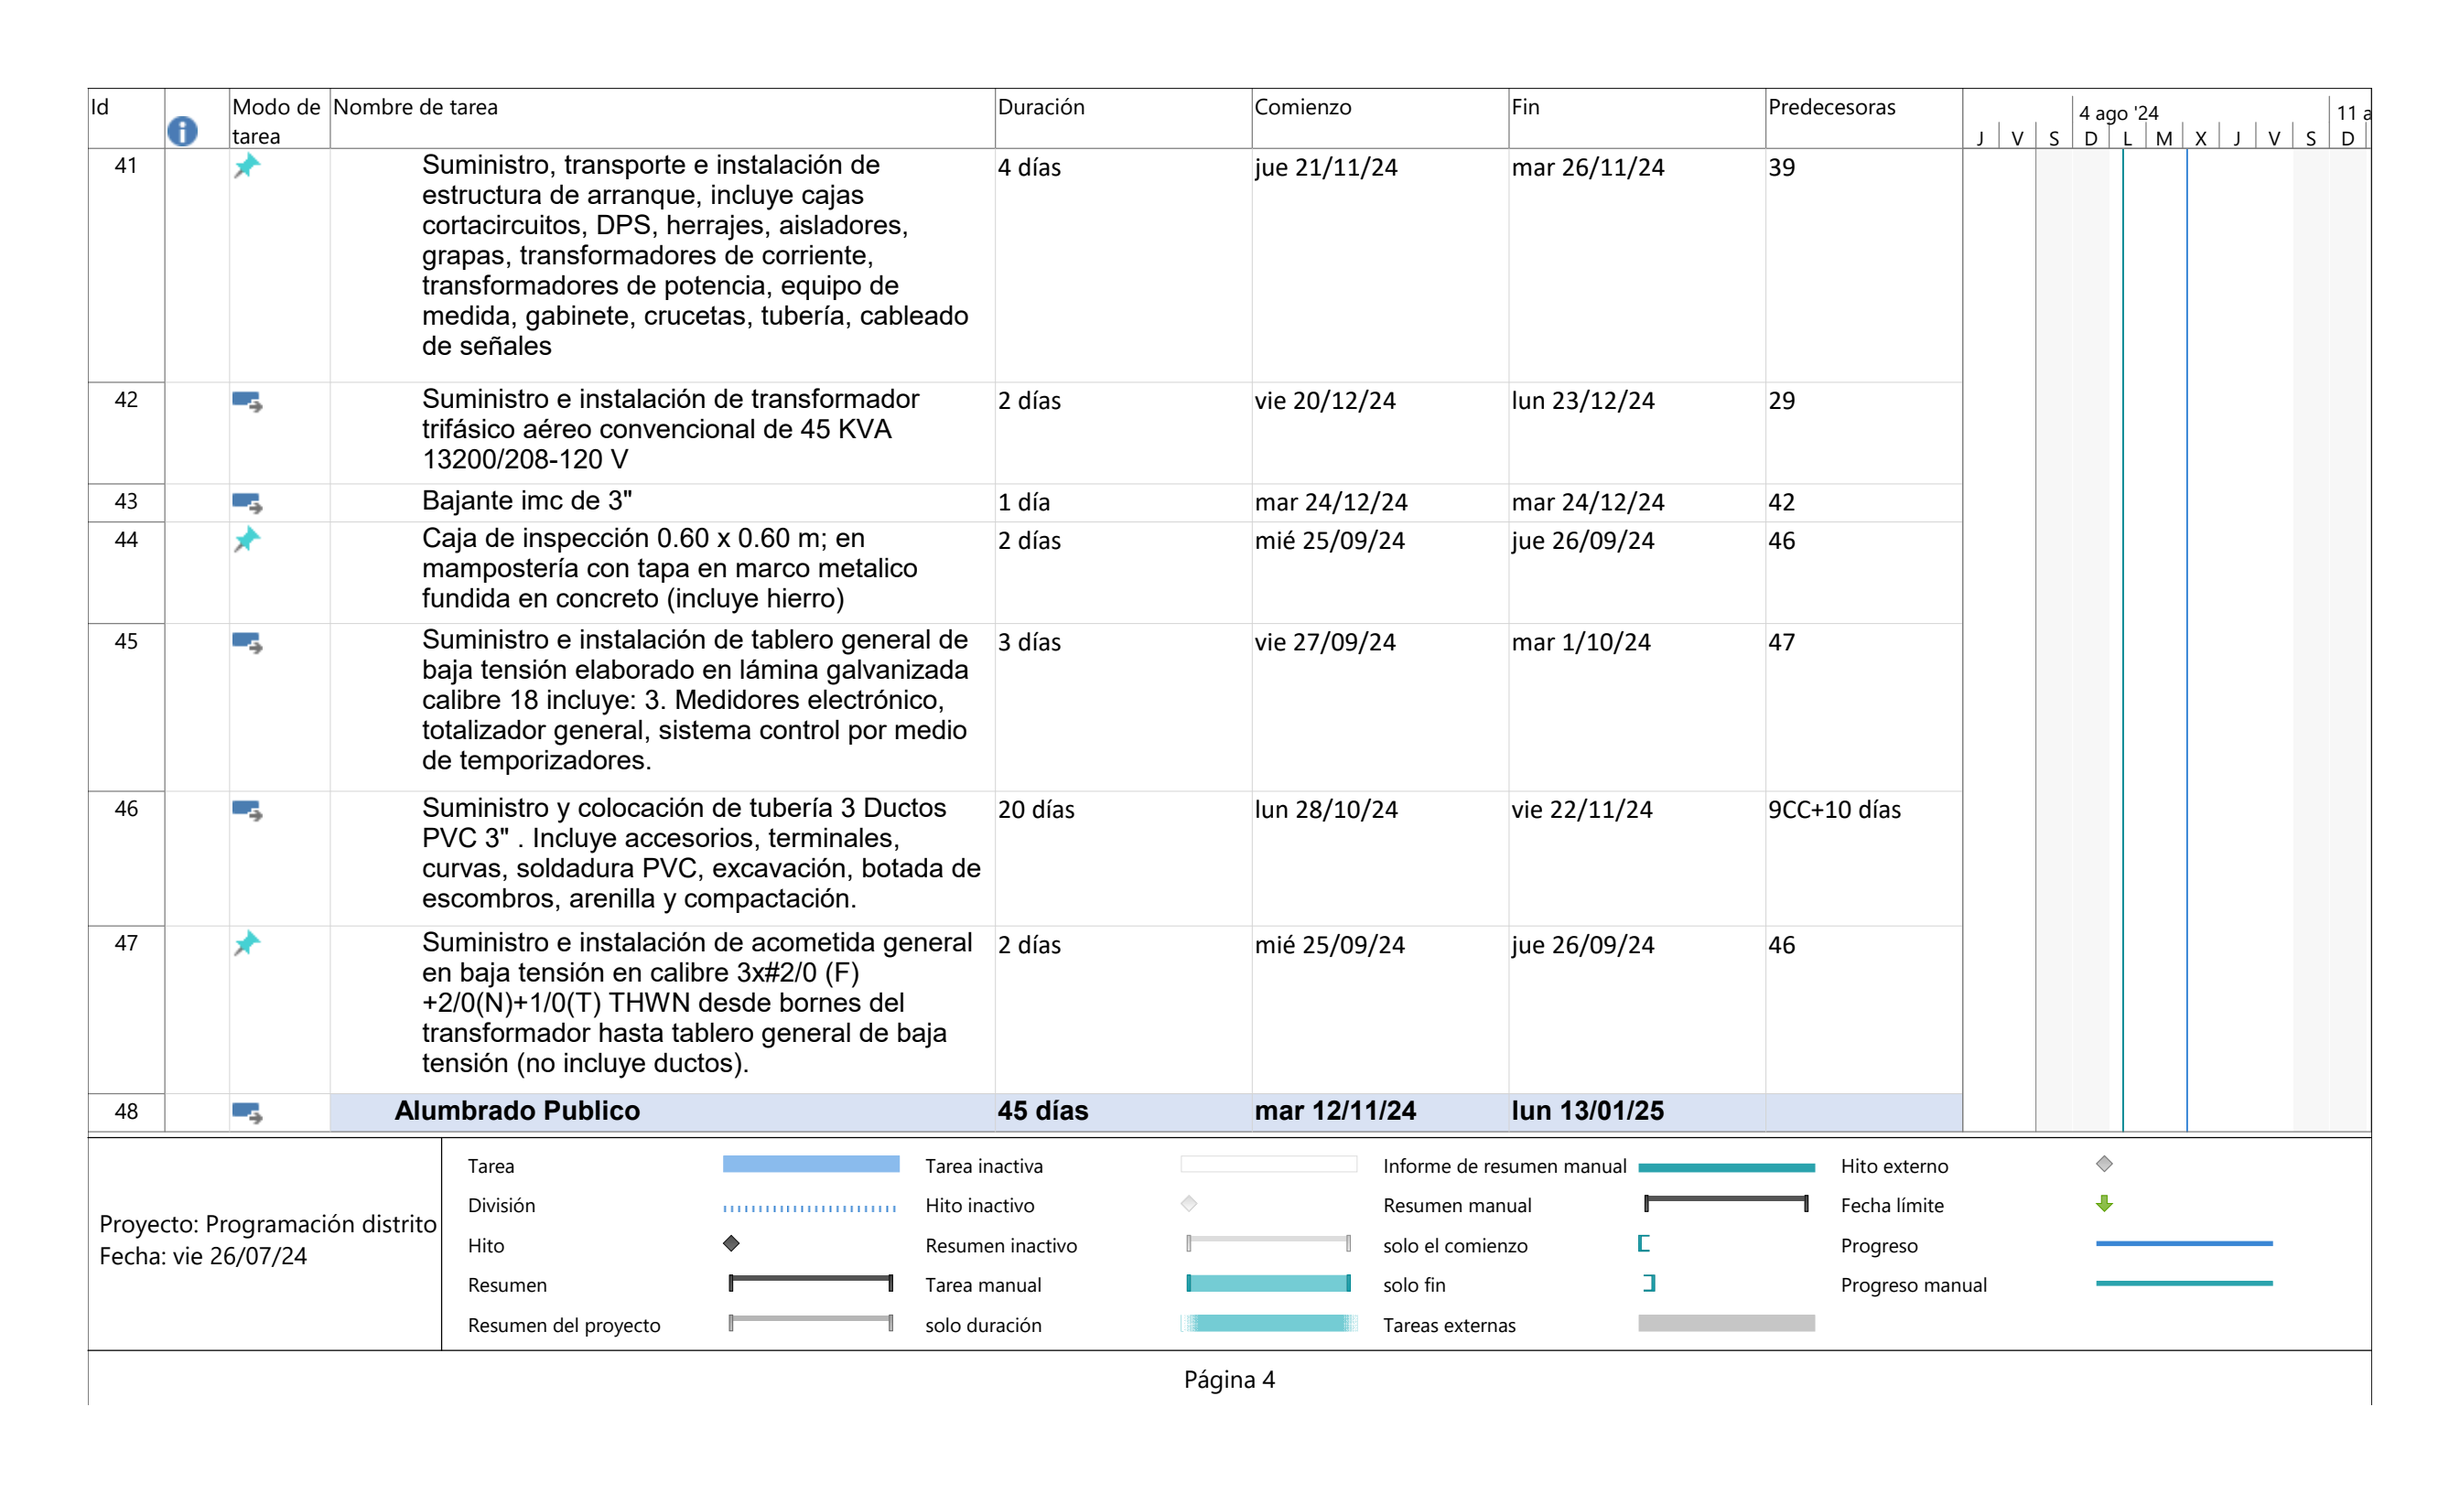

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
49		Suministro e instalación de poste metálico de 10 m para iluminación	9 días	mié 20/11/24	lun 2/12/24	9;10
50		Suministro e instalacion de reflectores led de 200 W	10 días	mar 12/11/24	lun 25/11/24	49
51		Suministro e instalación de cable 2x#6F+ 8T CU THWN para alimentación de luminarias Cto 1	7 días	mar 12/11/24	mié 20/11/24	49
52		Suministro e instalación de cable 2x#8F+ 10T CU THWN para alimentación de luminarias Cto 2	10 días	mar 24/12/24	lun 6/01/25	53
53		Suministro e instalación de acometida en tubería PVC Φ1”	15 días	mar 3/12/24	lun 23/12/24	9CC+10 días;49
54		Suministro e instalación de caja de inspección tipo alumbrado publico 40x40 cm	20 días	mar 17/12/24	lun 13/01/25	52
55		Suministro e instalación de poste metálico de 5 m, tubo estructural de 3", brazo doble de 0,5 m	20 días	mié 20/11/24	mar 17/12/24	9;10
56		Suministro e instalacion de luminaria led de 120 W tipo alumbrado publico o similar	12 días	mié 18/12/24	jue 2/01/25	55
57		Suministro e instalacion de bala led deco de 3w	5 días	vie 3/01/25	jue 9/01/25	53
58		Suministro e instalacion de luminaria led para aviso	4 días	mar 24/12/24	vie 27/12/24	53
59		Suministro e instalacion de Acometida bt conductor CU 2N°10 AWG + 1# 10 CU	5 días	mar 3/12/24	lun 9/12/24	9CC+10 días;49
60		**Container**	**33 días**	**mié 28/08/24**	**vie 11/10/24**	
61		Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2" DB	15 días	mié 28/08/24	mar 17/09/24	9CC+10 días



Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24


Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
62		Suministro y construcción de caja de inspección para baja tensión, medidas 0,6*0,6*0,82 marco metálico y tapa en concreto.	10 días	mié 18/09/24	mar 1/10/24	61
63		Suministro e instalación de acometida general en baja tensión en calibre 2x#6 (F) +6(N) +10(T) THWN desde tablero general de baja tensión hasta tableros de Containeres (no incluye ductería)	10 días	mié 18/09/24	mar 1/10/24	61
64		Suministro e instalación de tablero de distribución bifásico de 12 ctos. con espacio para totalizador, puerta y cerradura.	4 días	mié 18/09/24	lun 23/09/24	61
65		Suministro e instalacion de salida de iluminacion a 120 V en tuberia EMT 3/4" en cable 2#12+1#12. Incluye caja octagonal metalica, accesorios EMT y de fijación.	6 días	mié 18/09/24	mié 25/09/24	61
66		Suministro e instalacion de Luminaria led panel circular de 24/18 W	8 días	mié 2/10/24	vie 11/10/24	63
67		Suministro e instalación de interruptor sencillo.	8 días	jue 26/09/24	lun 7/10/24	65
68		Suministro e instalación sensor infrarrojo.	4 días	jue 26/09/24	mar 1/10/24	65
69		Suministro e instalación de salida de tomacorriente bifásica SISTEMA NORMAL a 220 Volts en cable 2#10+1#10(t) en tubería PVC de 3/4".	6 días	jue 26/09/24	jue 3/10/24	65
70		Suministro e instalación de salida de tomacorriente Monofásica SISTEMA NORMAL a 120 Volts en cable 2#12+1#12(t) en tubería PVC de 3/4".	6 días	jue 26/09/24	jue 3/10/24	65

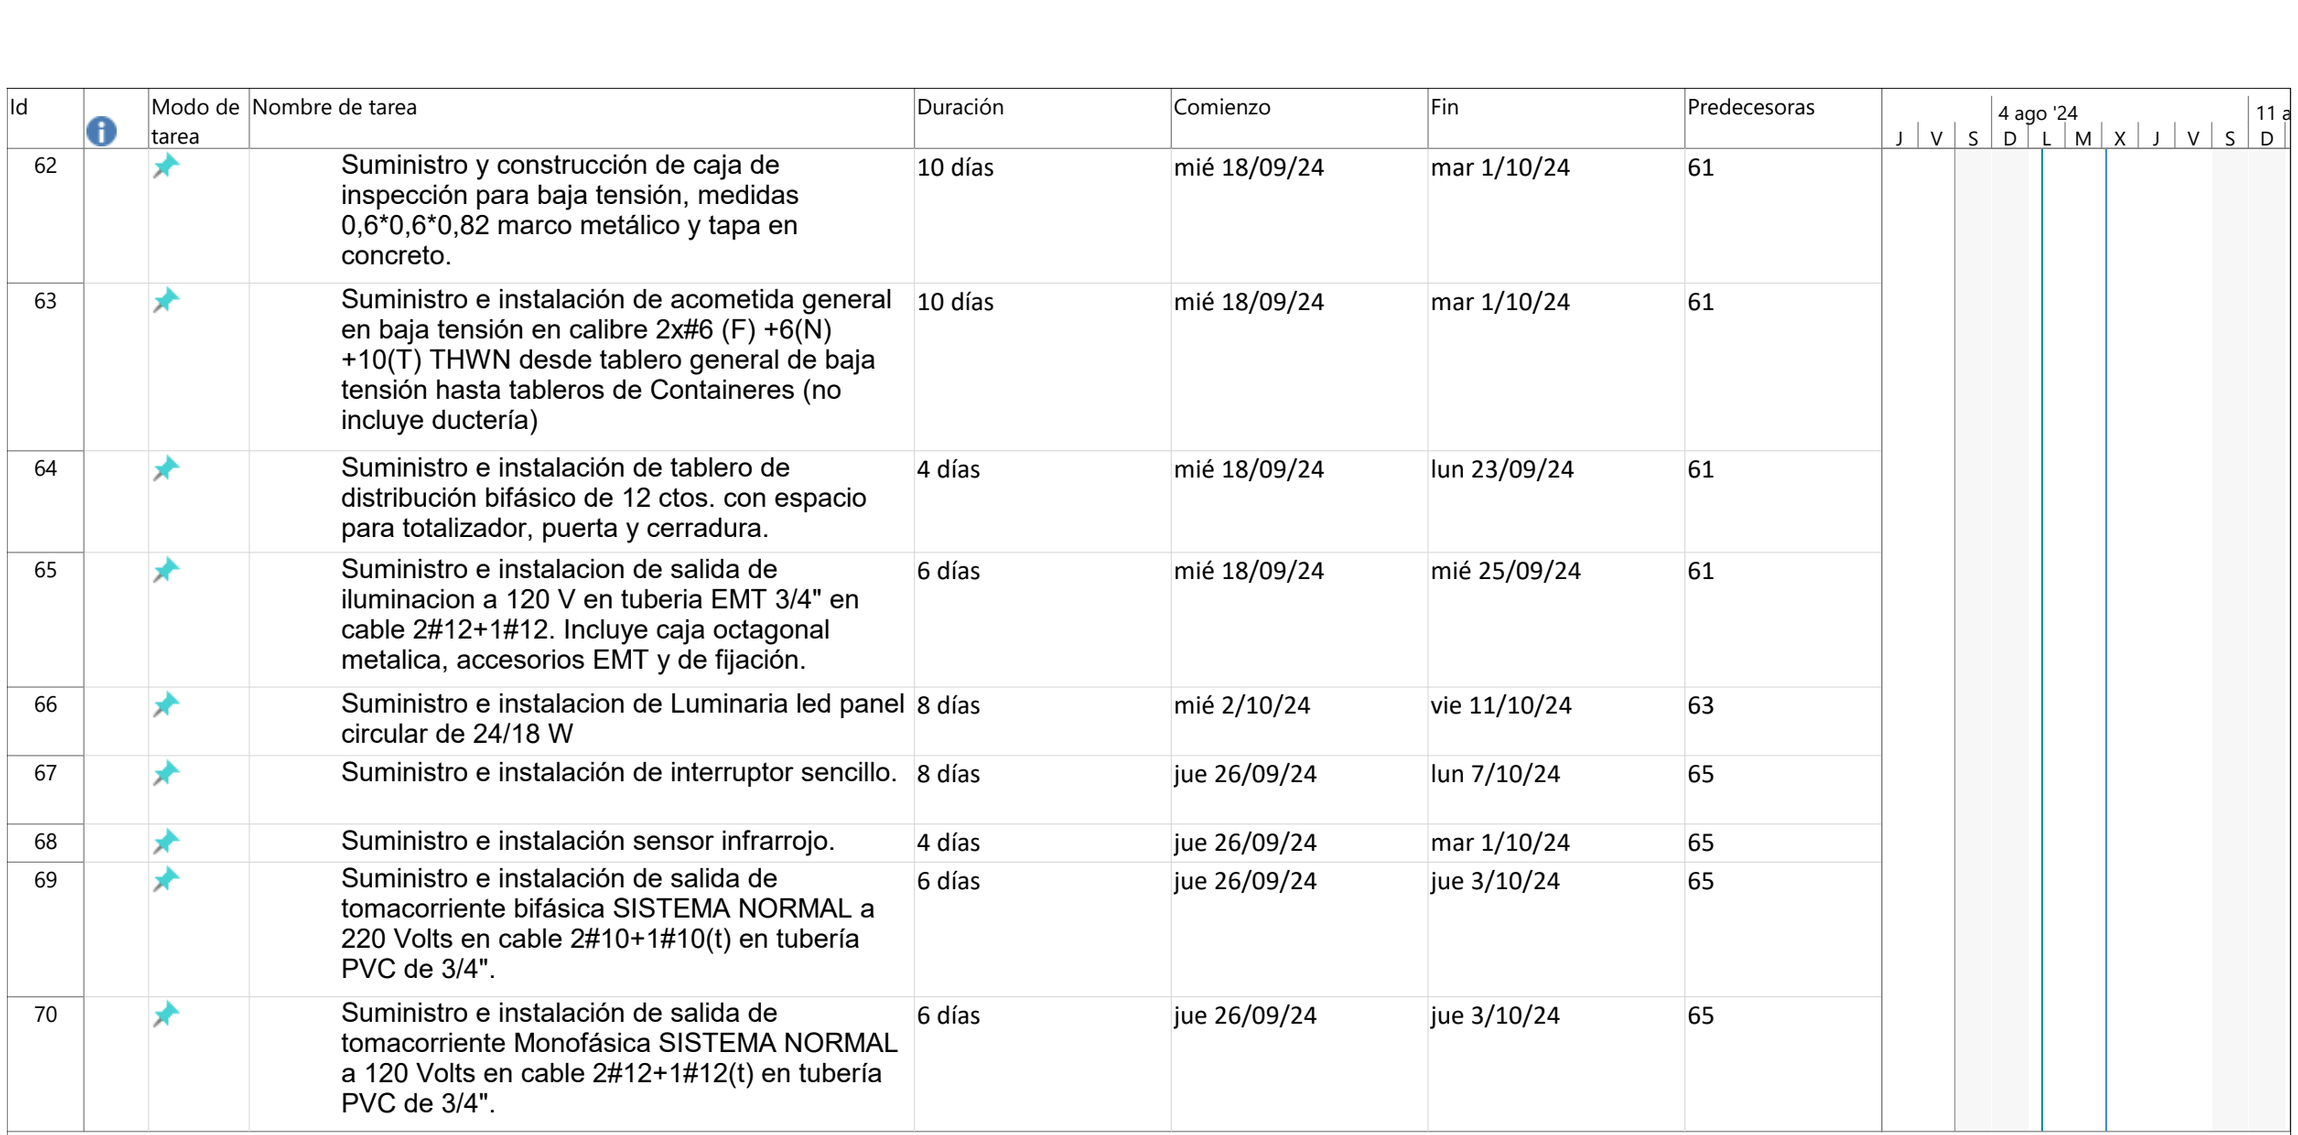

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
71		**Sistema de apantallamiento y proteccion contra rayos Y sistema de puesta a tierra**	**22 días**	**mié 28/08/24**	**jue 26/09/24**	
72		Suministro e instalación de Punta para Pararrayos Tipo Franklin	10 días	vie 13/09/24	jue 26/09/24	73;74
73		Suministro e instalacion de Cable Cu No.2/0 AWG desnudo	12 días	mié 28/08/24	jue 12/09/24	9CC+10 días
74		Suministro e instalación de Varilla de CU de puesta a tierra de 2.4 mts	12 días	mié 28/08/24	jue 12/09/24	9CC+10 días
75		Suministro e instalación de Soldadura Exotérmica Termoweld de 115 grs.	5 días	vie 13/09/24	jue 19/09/24	73;74
76		Suministro e instalacion de Caja de inspección 0.3x0.3m	5 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	75
77		**Estructuras metálicas**	**39 días**	**jue 12/12/24**	**mar 4/02/25**	
78		Estructura metalica para acceso en tuberia circular 4" y 2" tipo estructural	15 días	mié 1/01/25	mar 21/01/25	17
79		Suministro e instalación de Pasamanos en tuberia de acero galvanizado ⌀ 2" E= 2.5mm en sentido vertical y ⌀ 1 1/2" E= 2.5mm en sentido horizontal. (incluye fijaciones, pintura electrostatica y accesorios)	10 días	mié 22/01/25	mar 4/02/25	17
80		Suministro e instalación de tubo estructural de 2" para rieles incluye anticorrosivo y pintado color amarillo	10 días	mié 22/01/25	mar 4/02/25	17
81		Suministro e instalación de tubo cuadrado de 2" para rieles de FUN BOX incluye anticorrosivo y pintado en color amarillo	10 días	mié 22/01/25	mar 4/02/25	17
82		Suministro e instalacion Kit de calistenia modulo master para 8 usuarios	10 días	mié 22/01/25	mar 4/02/25	17

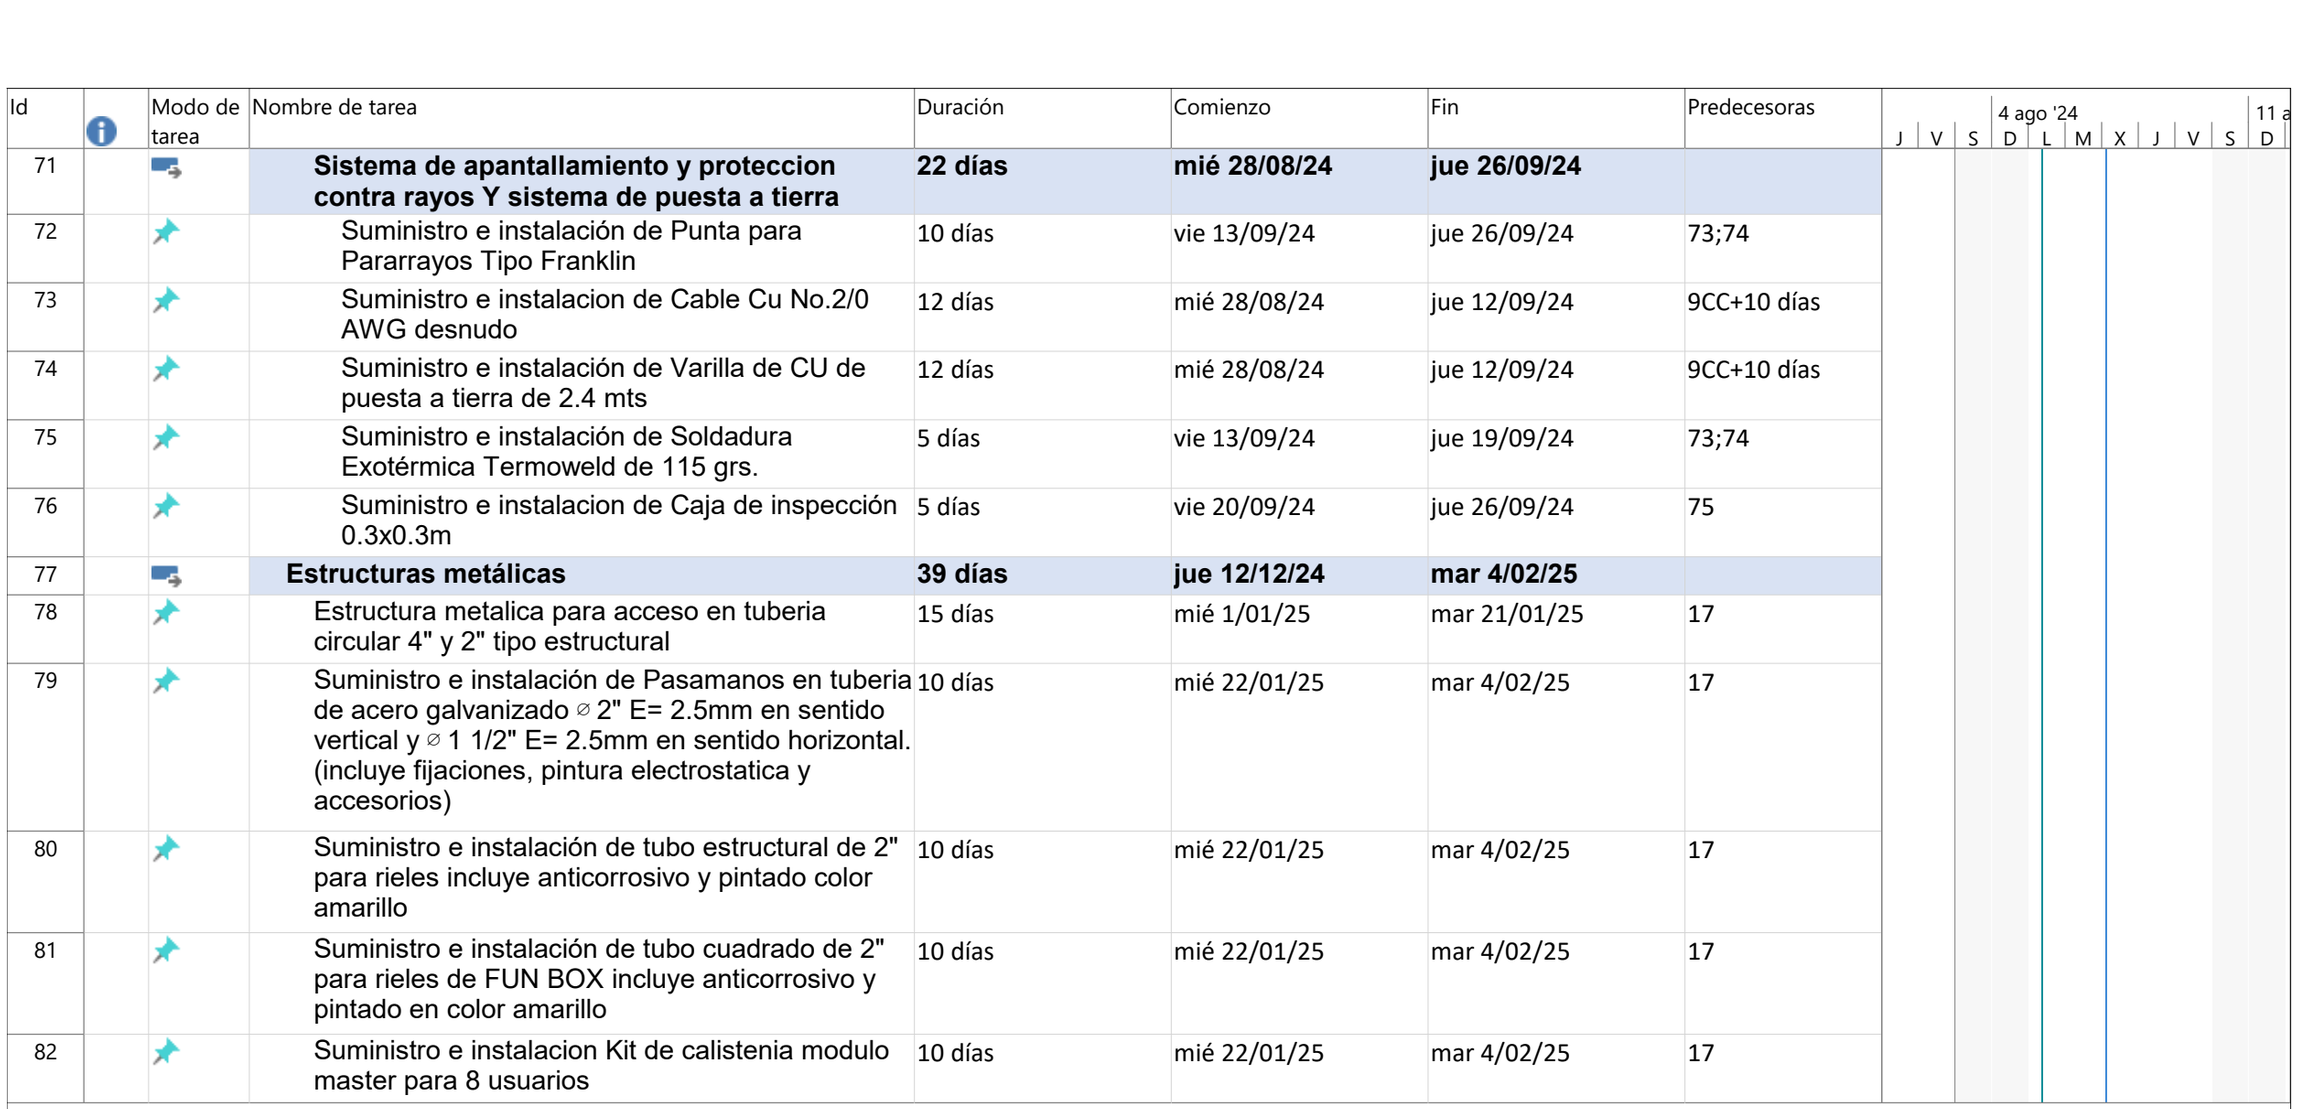


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
83		Suministro e instalación de container modificado para locales. Dimensiones de acuerdo diseño arquitectonico, incluye puertas de baños, bodegas y local, mesón en acero inoxidable, rejas metálicas de accesos laterales y ventanas local.	15 días	mié 1/01/25	mar 21/01/25	17
84		Letrero de acceso "DISTRITO URBANO" en lamina metalica cal 20.	10 días	mié 22/01/25	mar 4/02/25	78
85		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN CALIBRE 22 CON MARCO EN CALIBRE 16 INCLUYE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA COLOR AZUL TIPO ESMALTE DOS MAMOS INCLUYE CHAPA DE SEGURIDAD, VISAGRAS Y CERROJO EXTERNO	4 días	jue 12/12/24	mié 18/12/24	35CF-5 días
86		SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO ALUZINC CALIBRE 28 COLOR AZUL	10 días	vie 20/12/24	jue 2/01/25	29
87		**Instalaciones Hidrosanitarias**	**133 días**	**mié 28/08/24**	**vie 28/02/25**	
88		Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 160 mm (6") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	20 días	mié 28/08/24	mar 24/09/24	6CC+15 días
89		Suministro e instalación de tuberia 4" pvc Saniaria	15 días	mié 28/08/24	mar 17/09/24	6CC+15 días
90		Punto 4" sanitario	2 días	mié 18/09/24	jue 19/09/24	89
91		Punto 2" sanitario	2 días	mié 18/09/24	jue 19/09/24	89
92		Punto 2" ventilación	2 días	mié 18/09/24	jue 19/09/24	89
93		Punto hidrualico 1 1/4" Presión	3 días	jue 29/08/24	lun 2/09/24	95
94		Punto hidraulico 3/4" Presión	3 días	jue 29/08/24	lun 2/09/24	95



Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
95		Tuberia 1" pvc presión	1 día	mié 28/08/24	mié 28/08/24	6CC+15 días
96		Suministro e instalacion de Sanitario de porcelana de 3,5 lt de consumo con fluxometro	2 días	vie 20/09/24	lun 23/09/24	90
97		Suministro e instalacion Lavamanos en porcelana incluye griferia de presion suave tipo PUSH	2 días	vie 20/09/24	lun 23/09/24	91
98		Caja de inspección 0.60 x 0.60 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	4 días	mié 18/09/24	lun 23/09/24	89
99		Sistema septico integrado septilistico 5000 lts.	10 días	mié 18/09/24	mar 1/10/24	89
100		ACOMETIDA DOMICILIARIA 6"x1" pvc (Inc. Micromedidor, caja en hierro fundido y tapa seguridad)	2 días	mié 28/08/24	jue 29/08/24	6CC+15 días
101		Construccion de disipador de energia para aguas de lluvias de 0.60ancho x 0.50 altura y huella de 0,60m. Espesor=10cm	15 días	mié 2/10/24	mar 22/10/24	99
102		Suministro e instalación de Tuberia PVC Ø 200 mm (8") Novafort (Incluye hidrosellos y lubricante)	10 días	mié 28/08/24	mar 10/09/24	6CC+15 días
103		Caja de inspección 1 x 1 m en mampostería con tapa en concreto (incluye hierro)	3 días	mié 11/09/24	vie 13/09/24	102
104		Cuneta perimetral de 0.25 x 0.30 cm interno	30 días	lun 20/01/25	vie 28/02/25	9;10
105		**Mobiliario**	**5 días**	**mié 22/01/25**	**mar 28/01/25**	
106		Suministro e instalación de bicicliteros según especificaciones. Para 4 unidades de bicicletas	4 días	mié 22/01/25	lun 27/01/25	16;17;18
107		Suministro e instalacion de Banca prefabricada tipo OLAND (0,45*1,80)	5 días	mié 22/01/25	mar 28/01/25	16;17;18

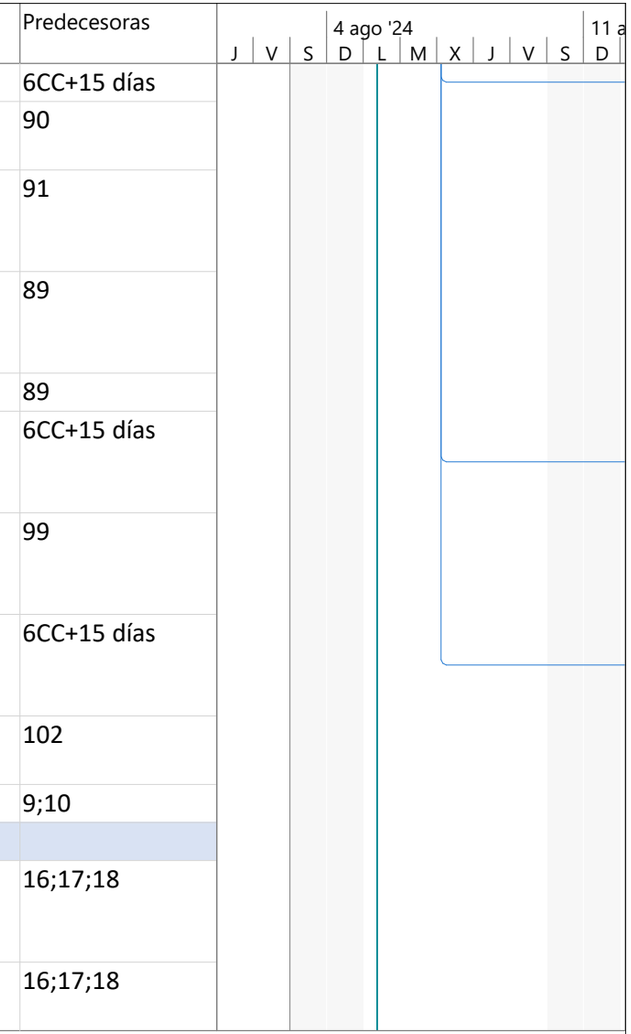


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
108		Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=10cm. Incluye acero de refuerzo	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	16;17;18
109		Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=20cm. Incluye acero de refuerzo	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	16;17;18
110		Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=30cm. Incluye acero de refuerzo	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	16;17;18
111		Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=40cm. Incluye acero de refuerzo	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	16;17;18
112		Modulo circular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones radio=20cm, altura=50cm. Incluye acero de refuerzo	2 días	mié 22/01/25	jue 23/01/25	16;17;18
113		Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,50cm. Incluye acero de refuerzo	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25	16;17;18
114		Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=0,80cm. Incluye acero de refuerzo	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25	16;17;18
115		Modulo rectangular prefabricado en concreto para parkour. Dimensiones ancho=0,75cm, largo=1,25cm y Altura=1m. Incluye acero de refuerzo	1 día	mié 22/01/25	mié 22/01/25	16;17;18
116		Punto ecologico en acero inoxidable	3 días	mié 22/01/25	vie 24/01/25	16;17;18
117		**Demarcaciones y señalizaciones**	**50 días**	**lun 2/12/24**	**vie 7/02/25**	

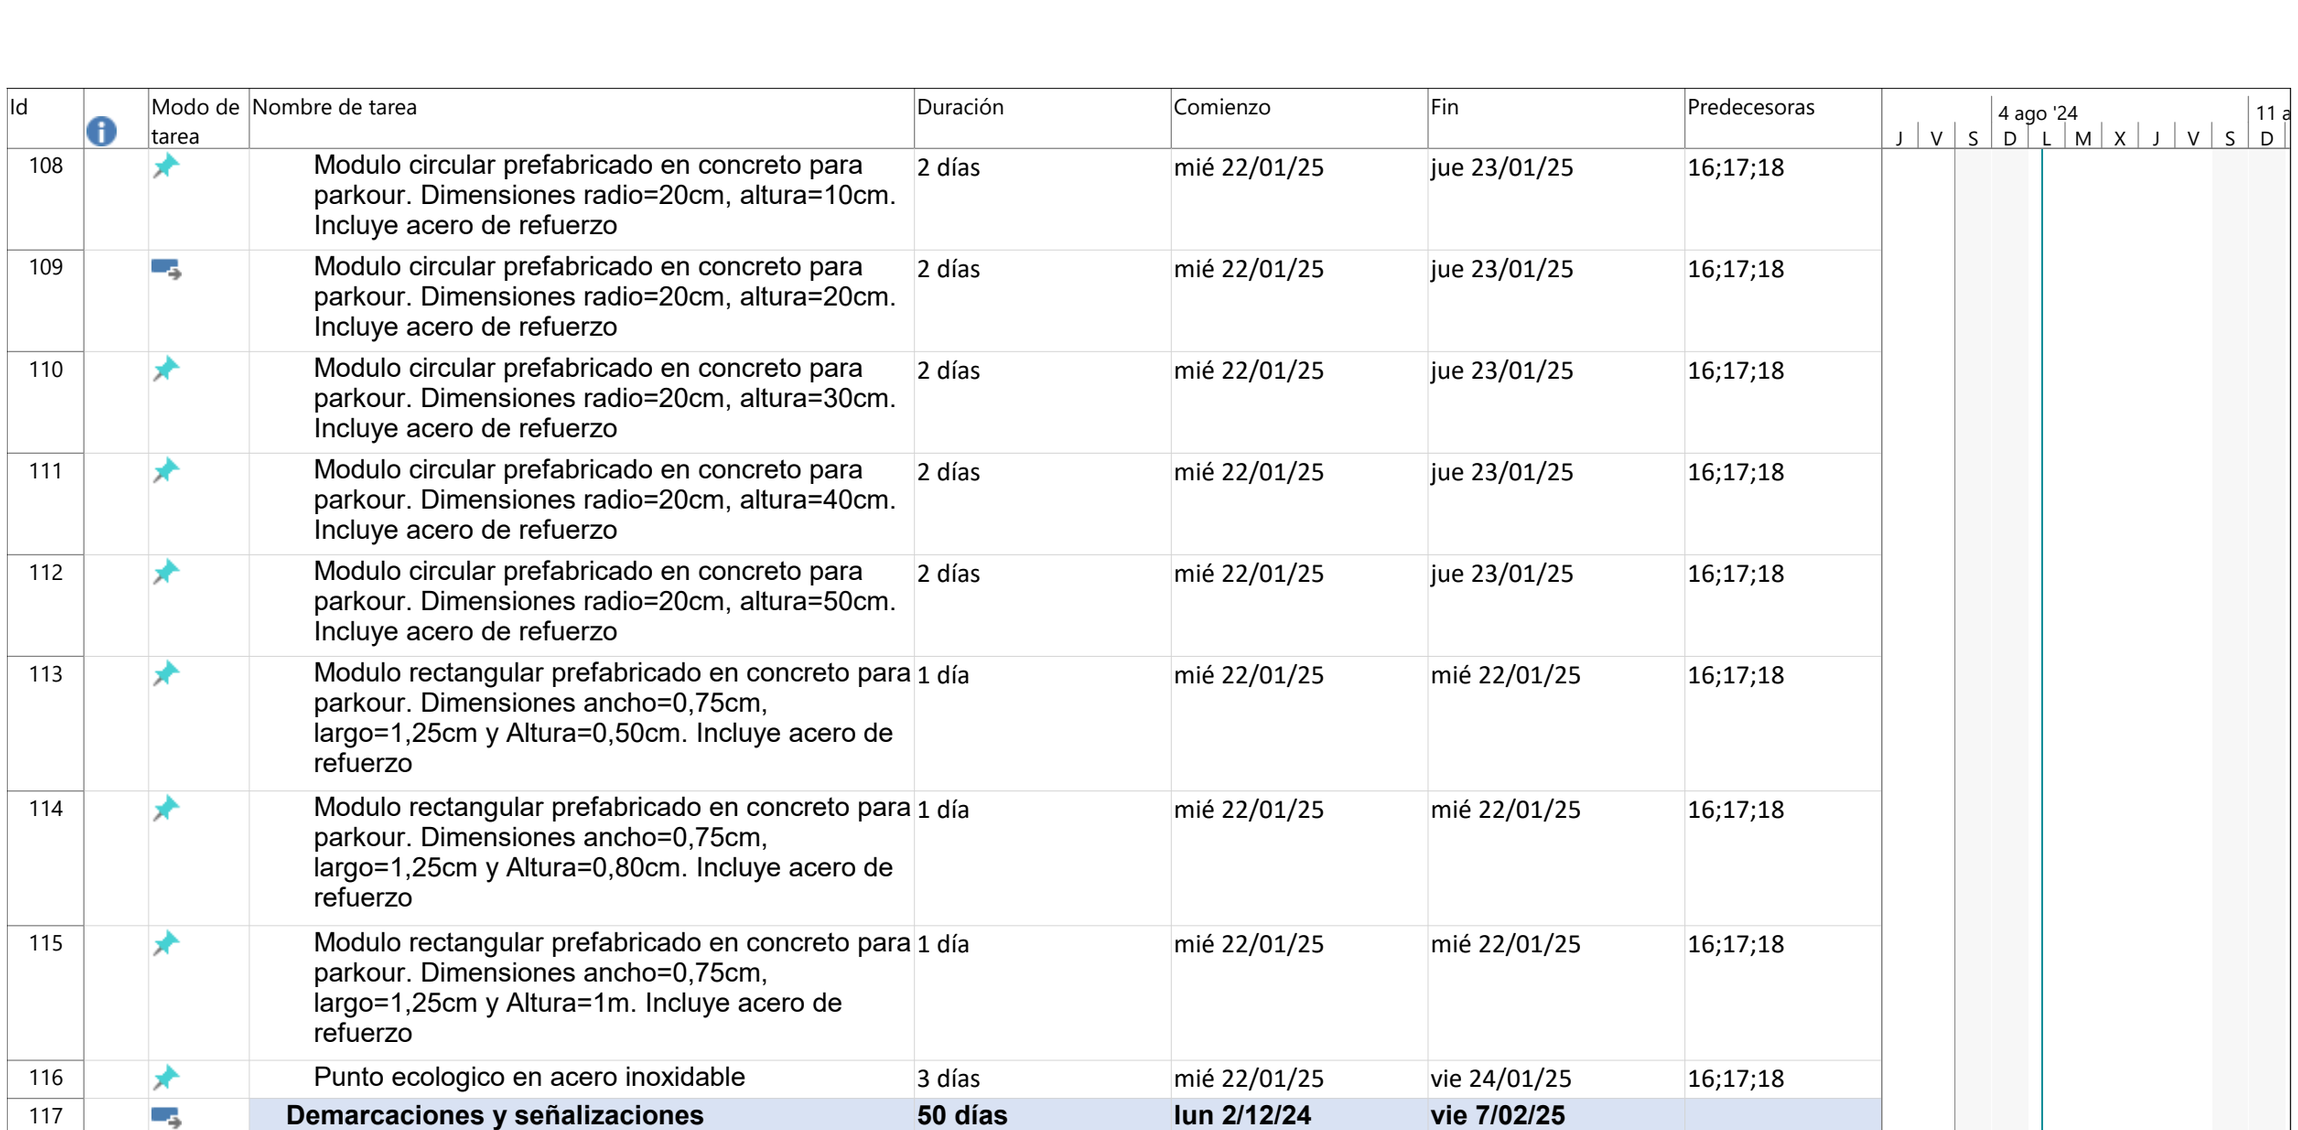


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
128		**Urbanismo y zonas verdes**	**50 días**	**lun 2/12/24**	**vie 7/02/25**	
129		Suministro e instalacion de Topes de concreto prefabricado para Parqueadero de 50cm*14cm*15cm incluye pintura amarilla	15 días	lun 2/12/24	vie 20/12/24	25CC+5 días
130		Suministro e instalacion de jardin en prado chino	8 días	mié 29/01/25	vie 7/02/25	22;30
131		Suministro e instalacion de arboles	8 días	mié 29/01/25	vie 7/02/25	22;30
132		**Administración (28.46%)**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
133		**Imprevistos (1%)**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
134		**Utilidad (5%)**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
135		**Plan de manejo ambiental**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
136		**Interventoria**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
137		**ALUMBRADO PÚBLICO**				
138		**Administración (29%)**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
139		**Imprevistos (1%)**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
140		**Utilidad (5%)**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
141		**RETIE**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
142		**RETILAP**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
143		**Interventoría Alumbrado público**	180 días	lun 5/08/24	vie 11/04/25	2
144		**FIN**	0 días	vie 11/04/25	vie 11/04/25	143

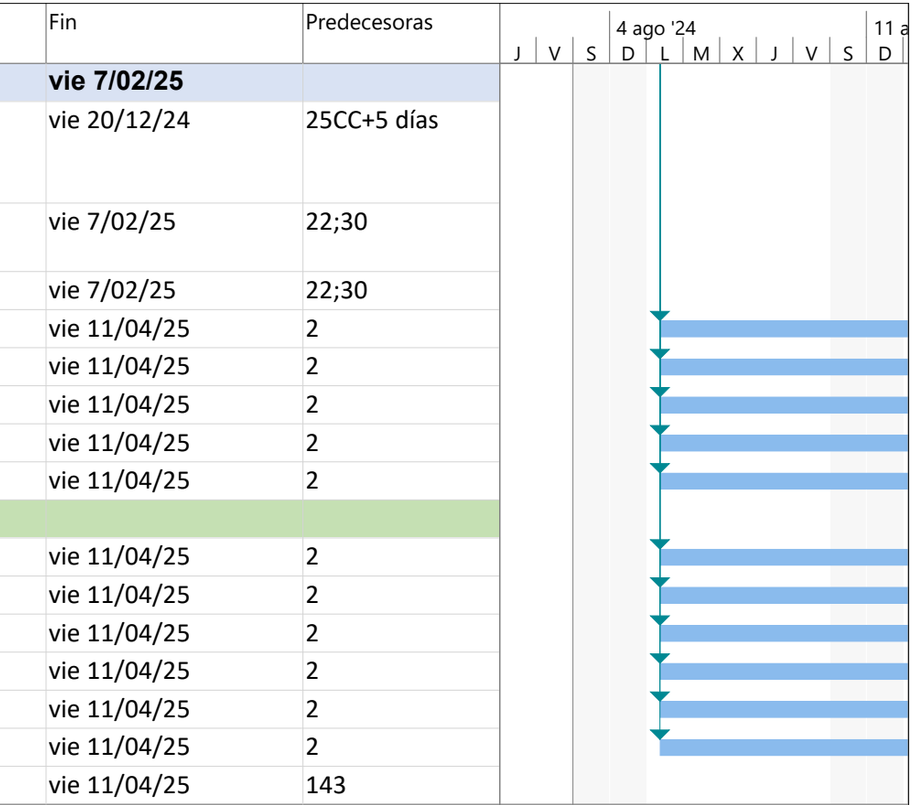


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual

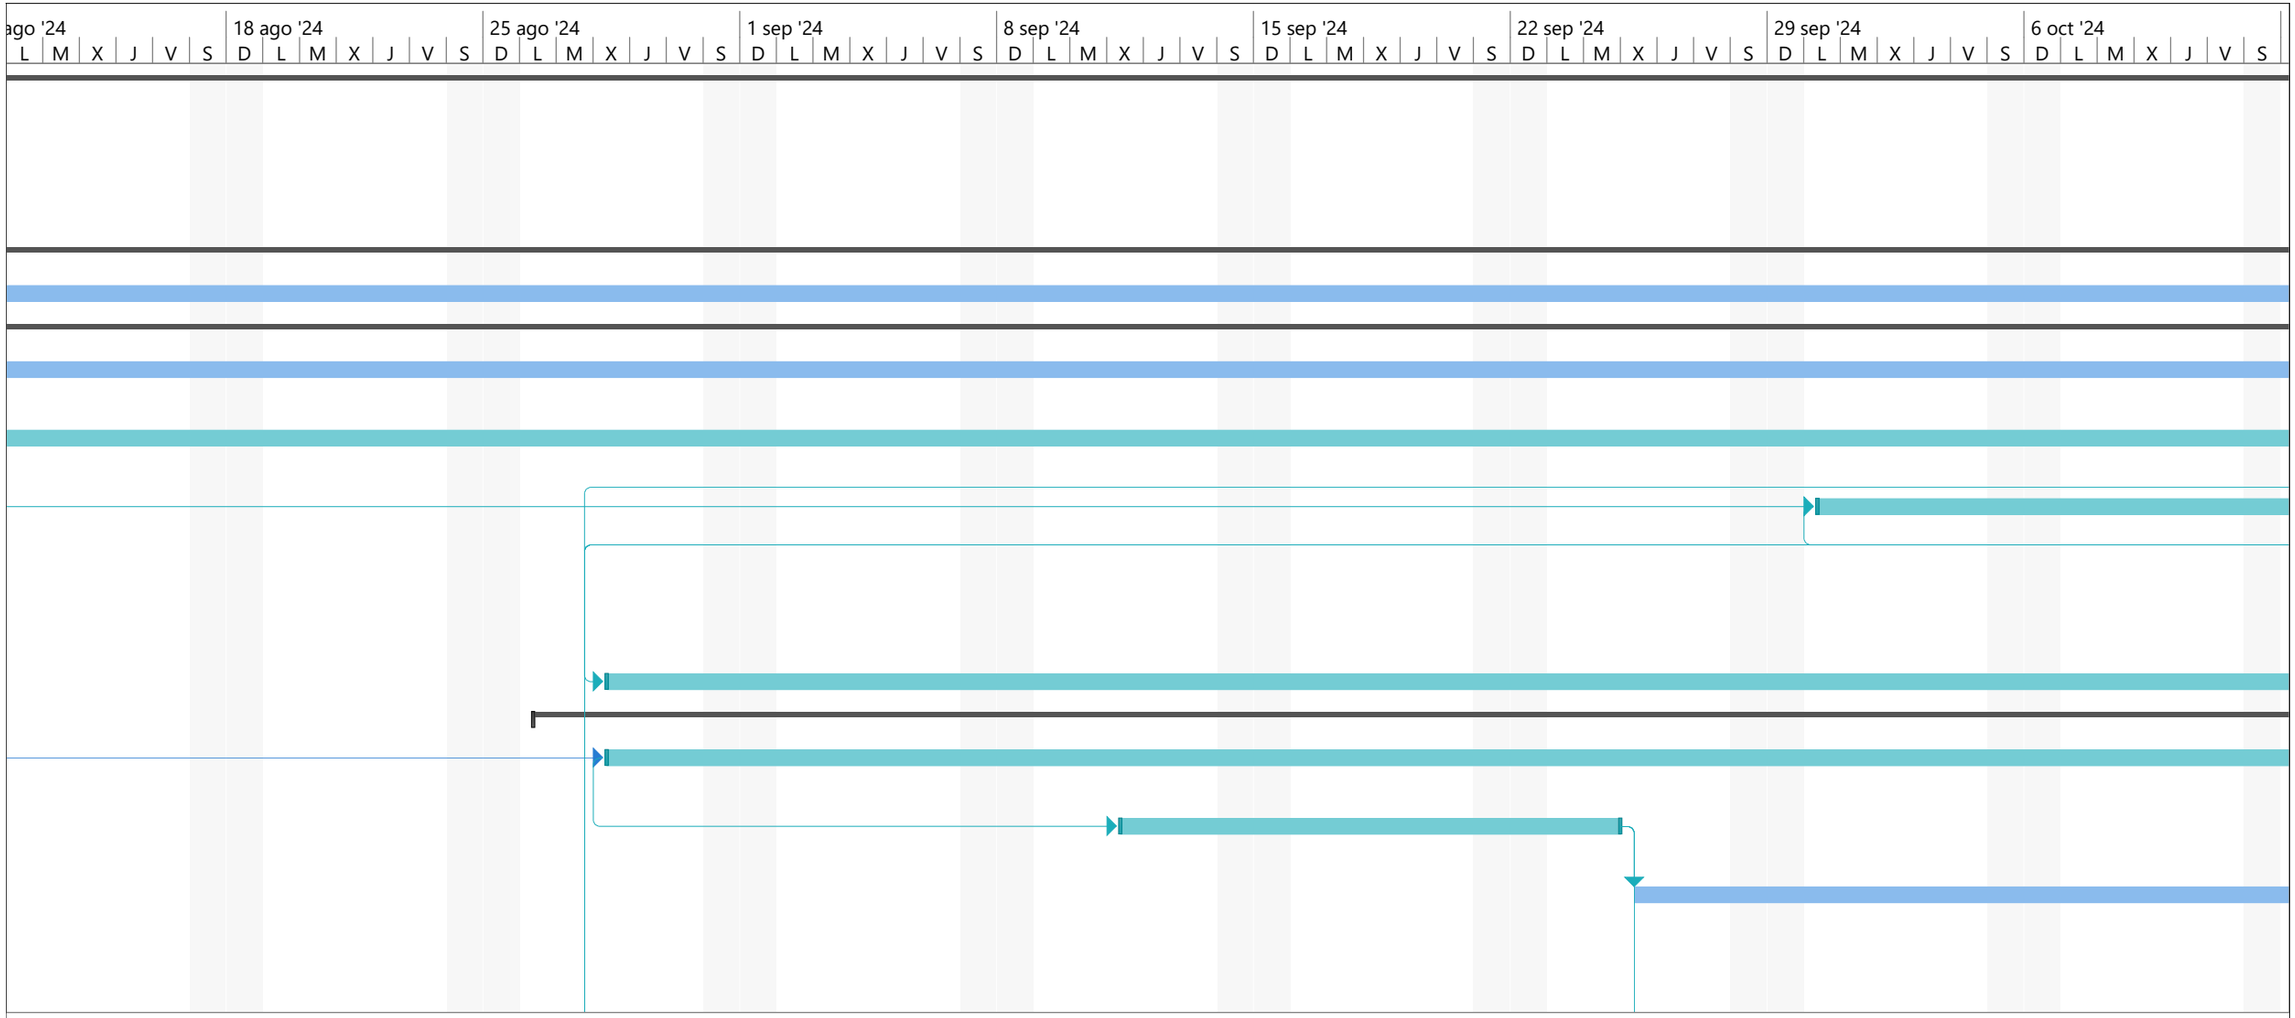


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

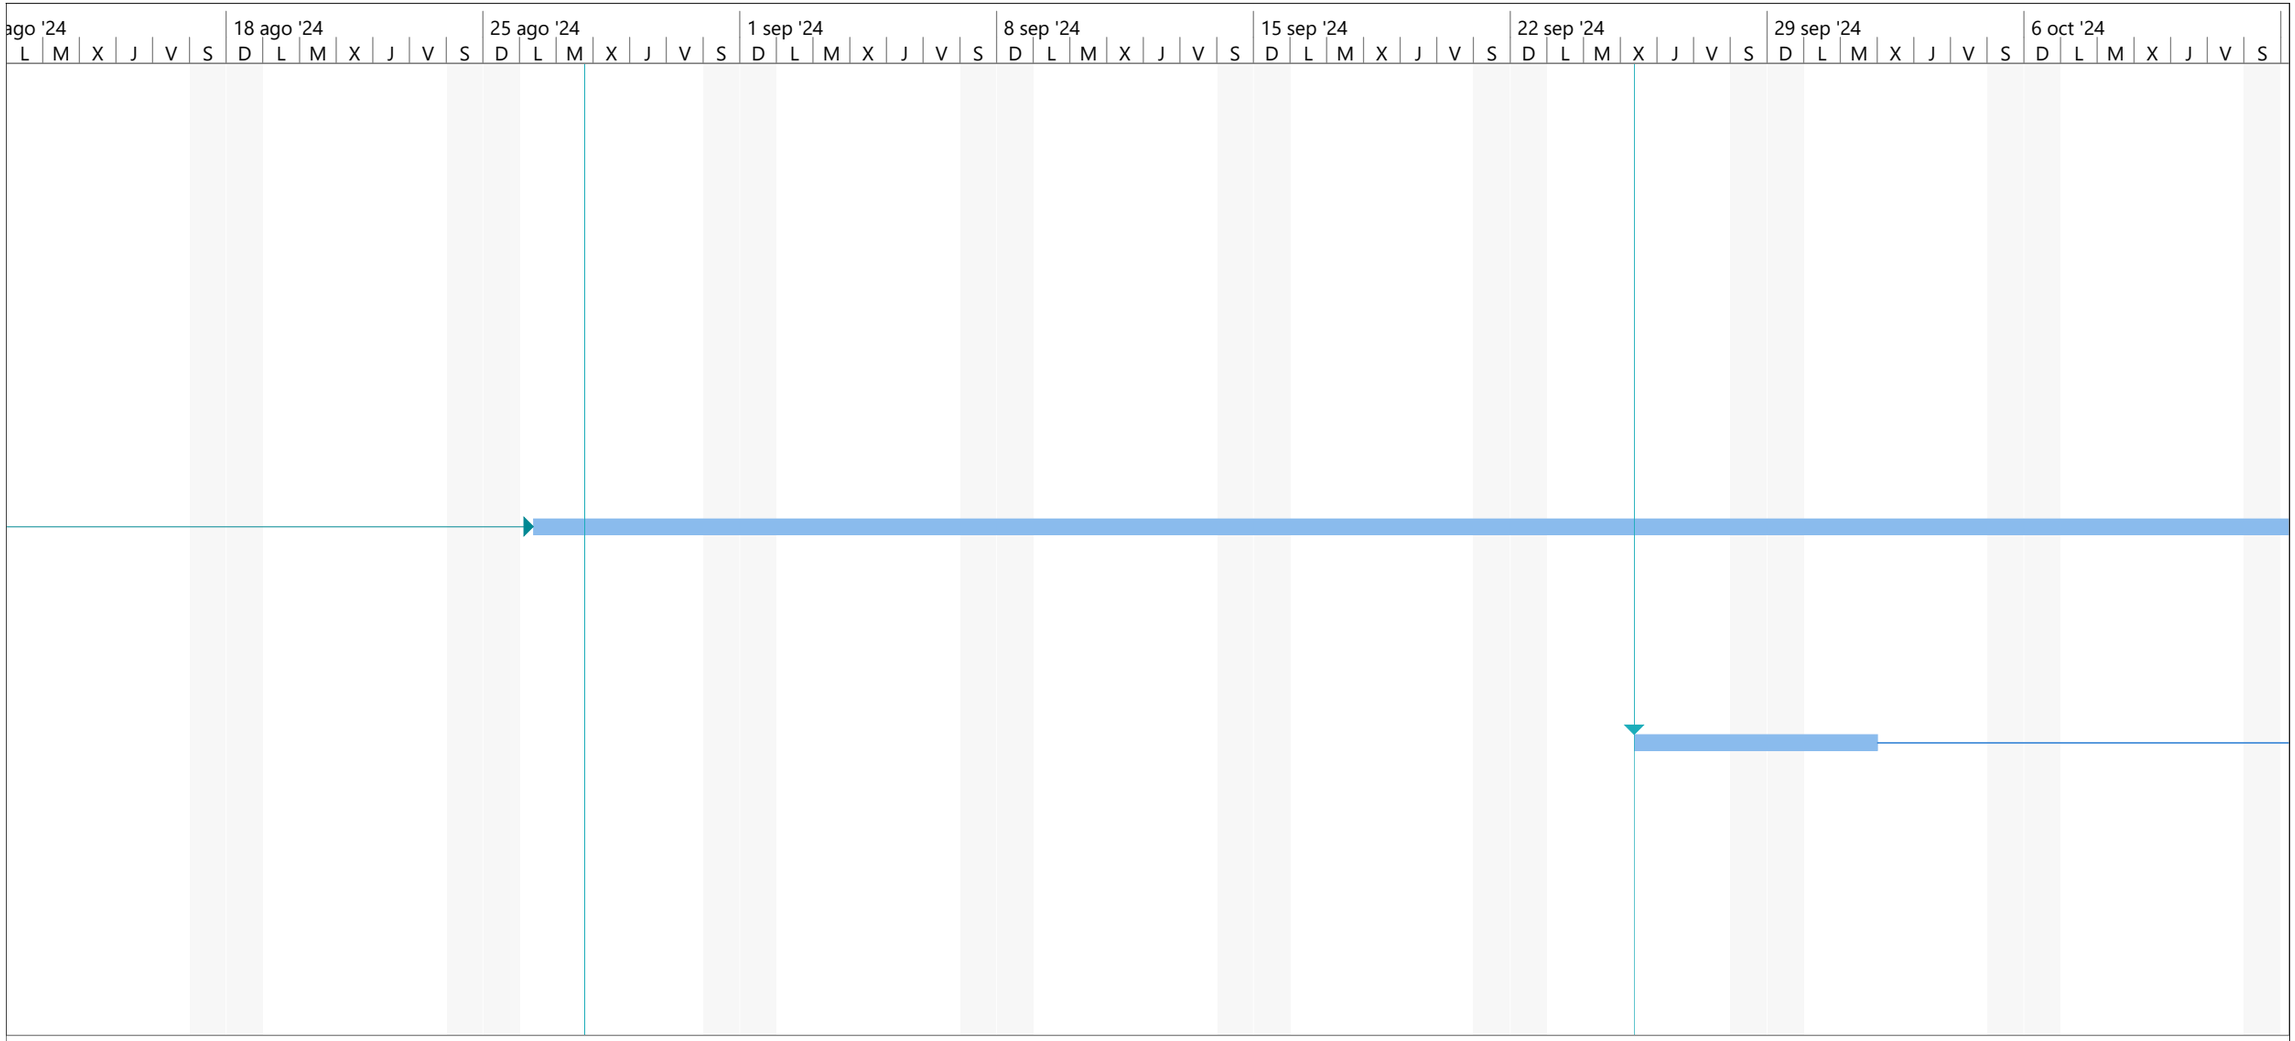


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

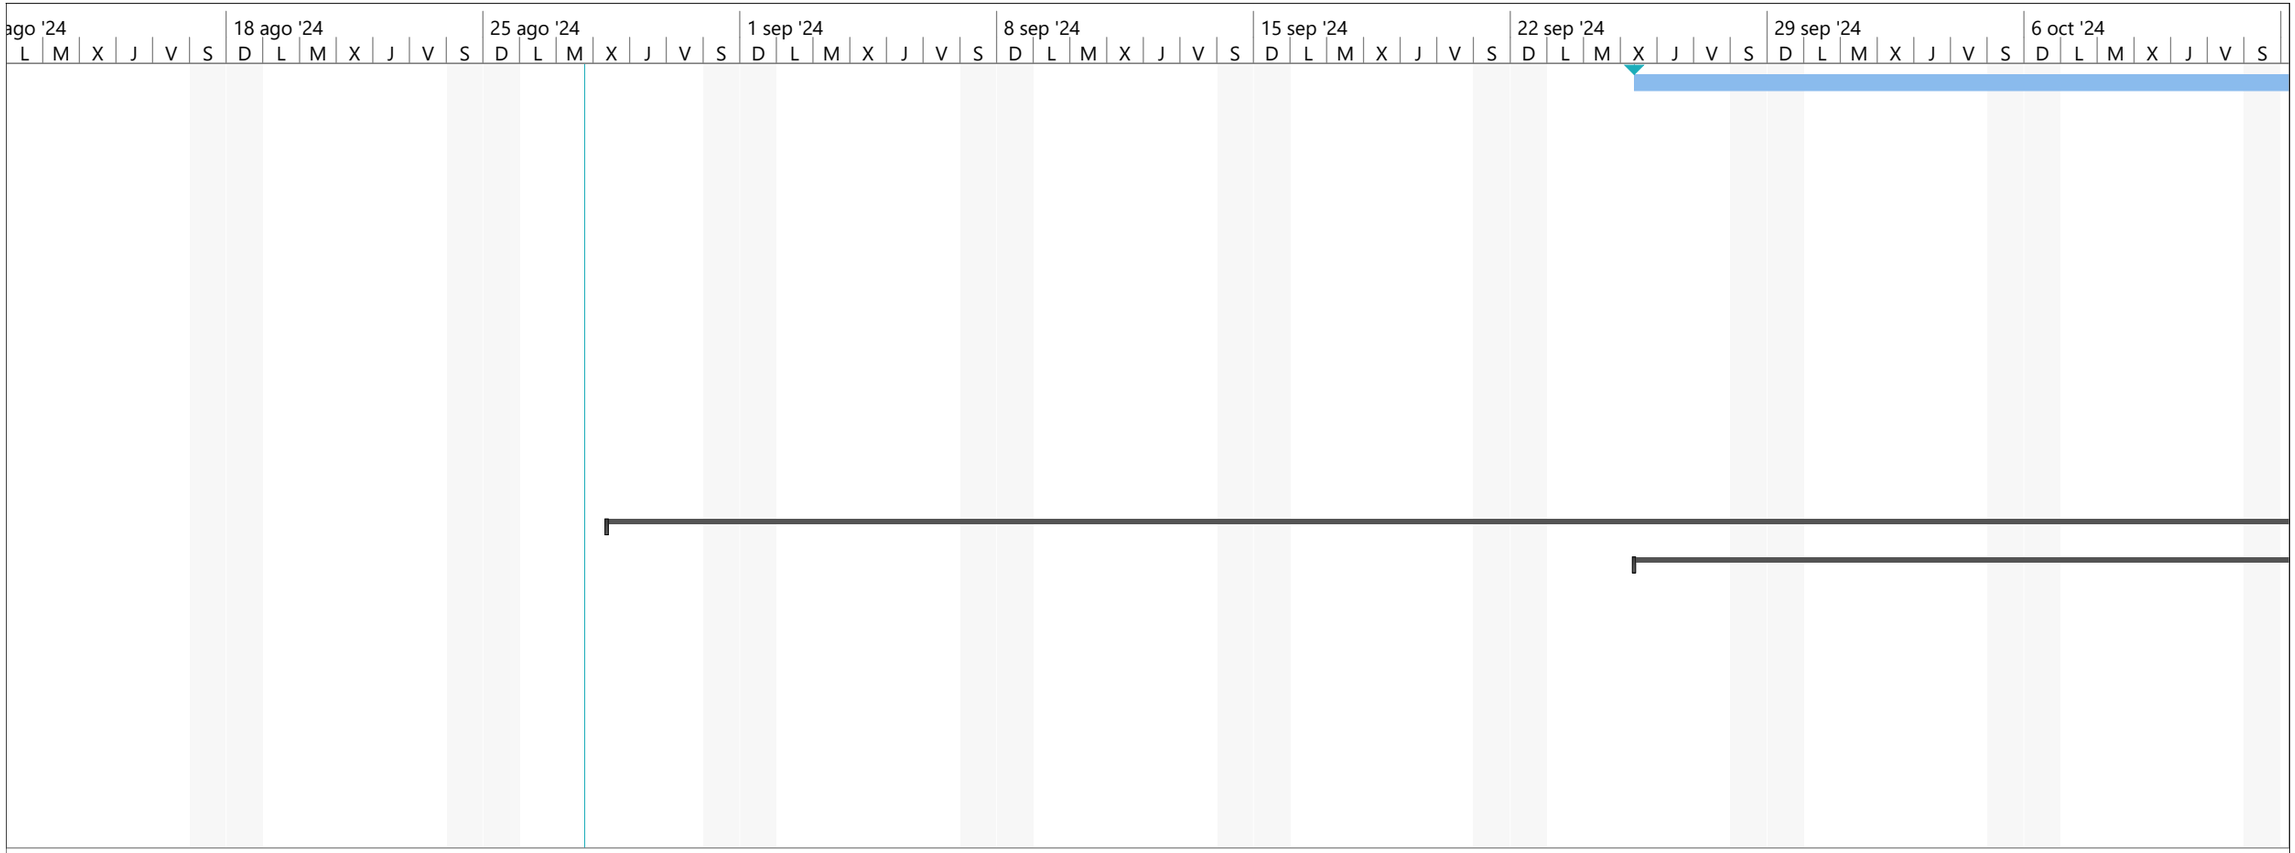


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

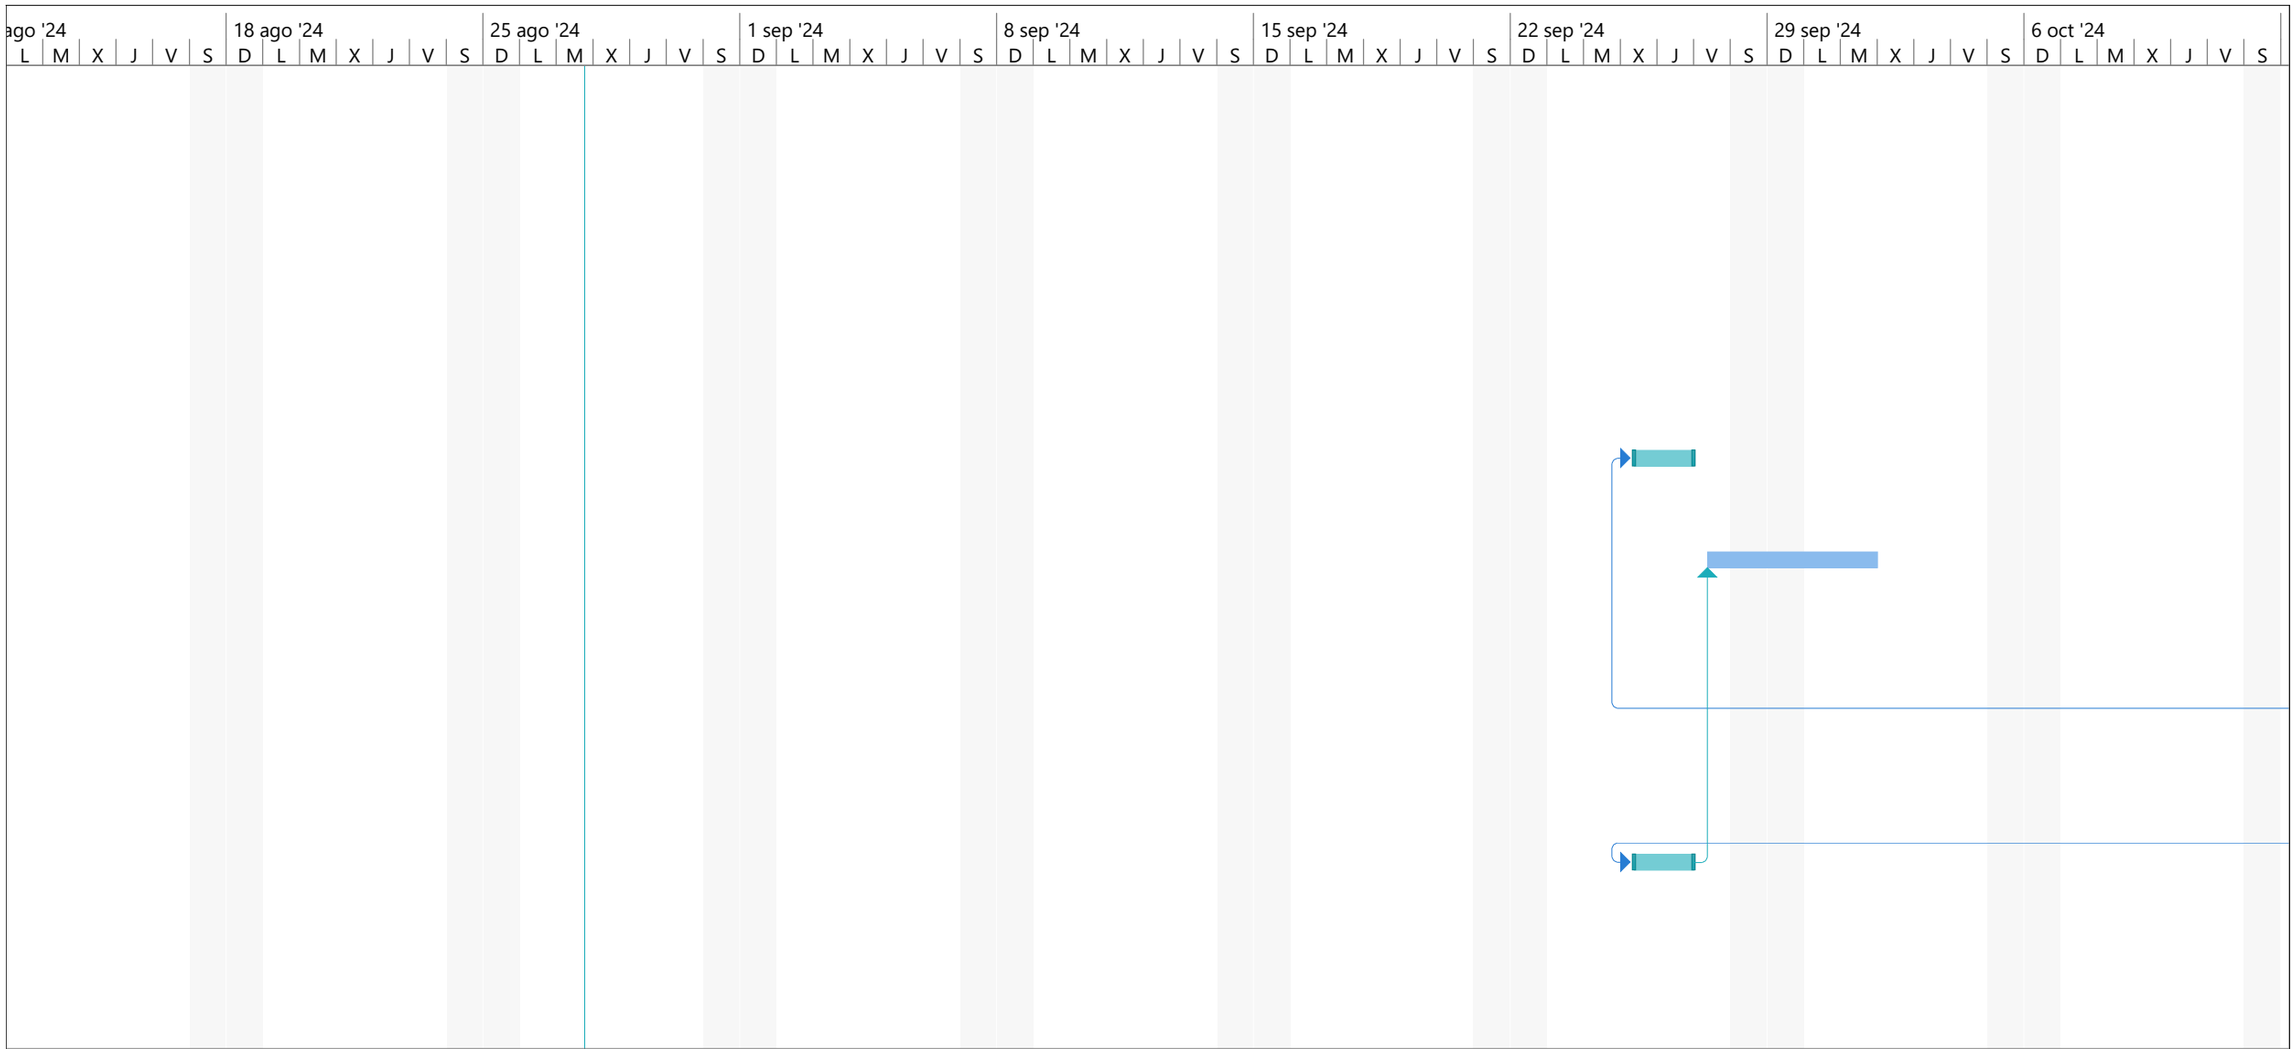


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

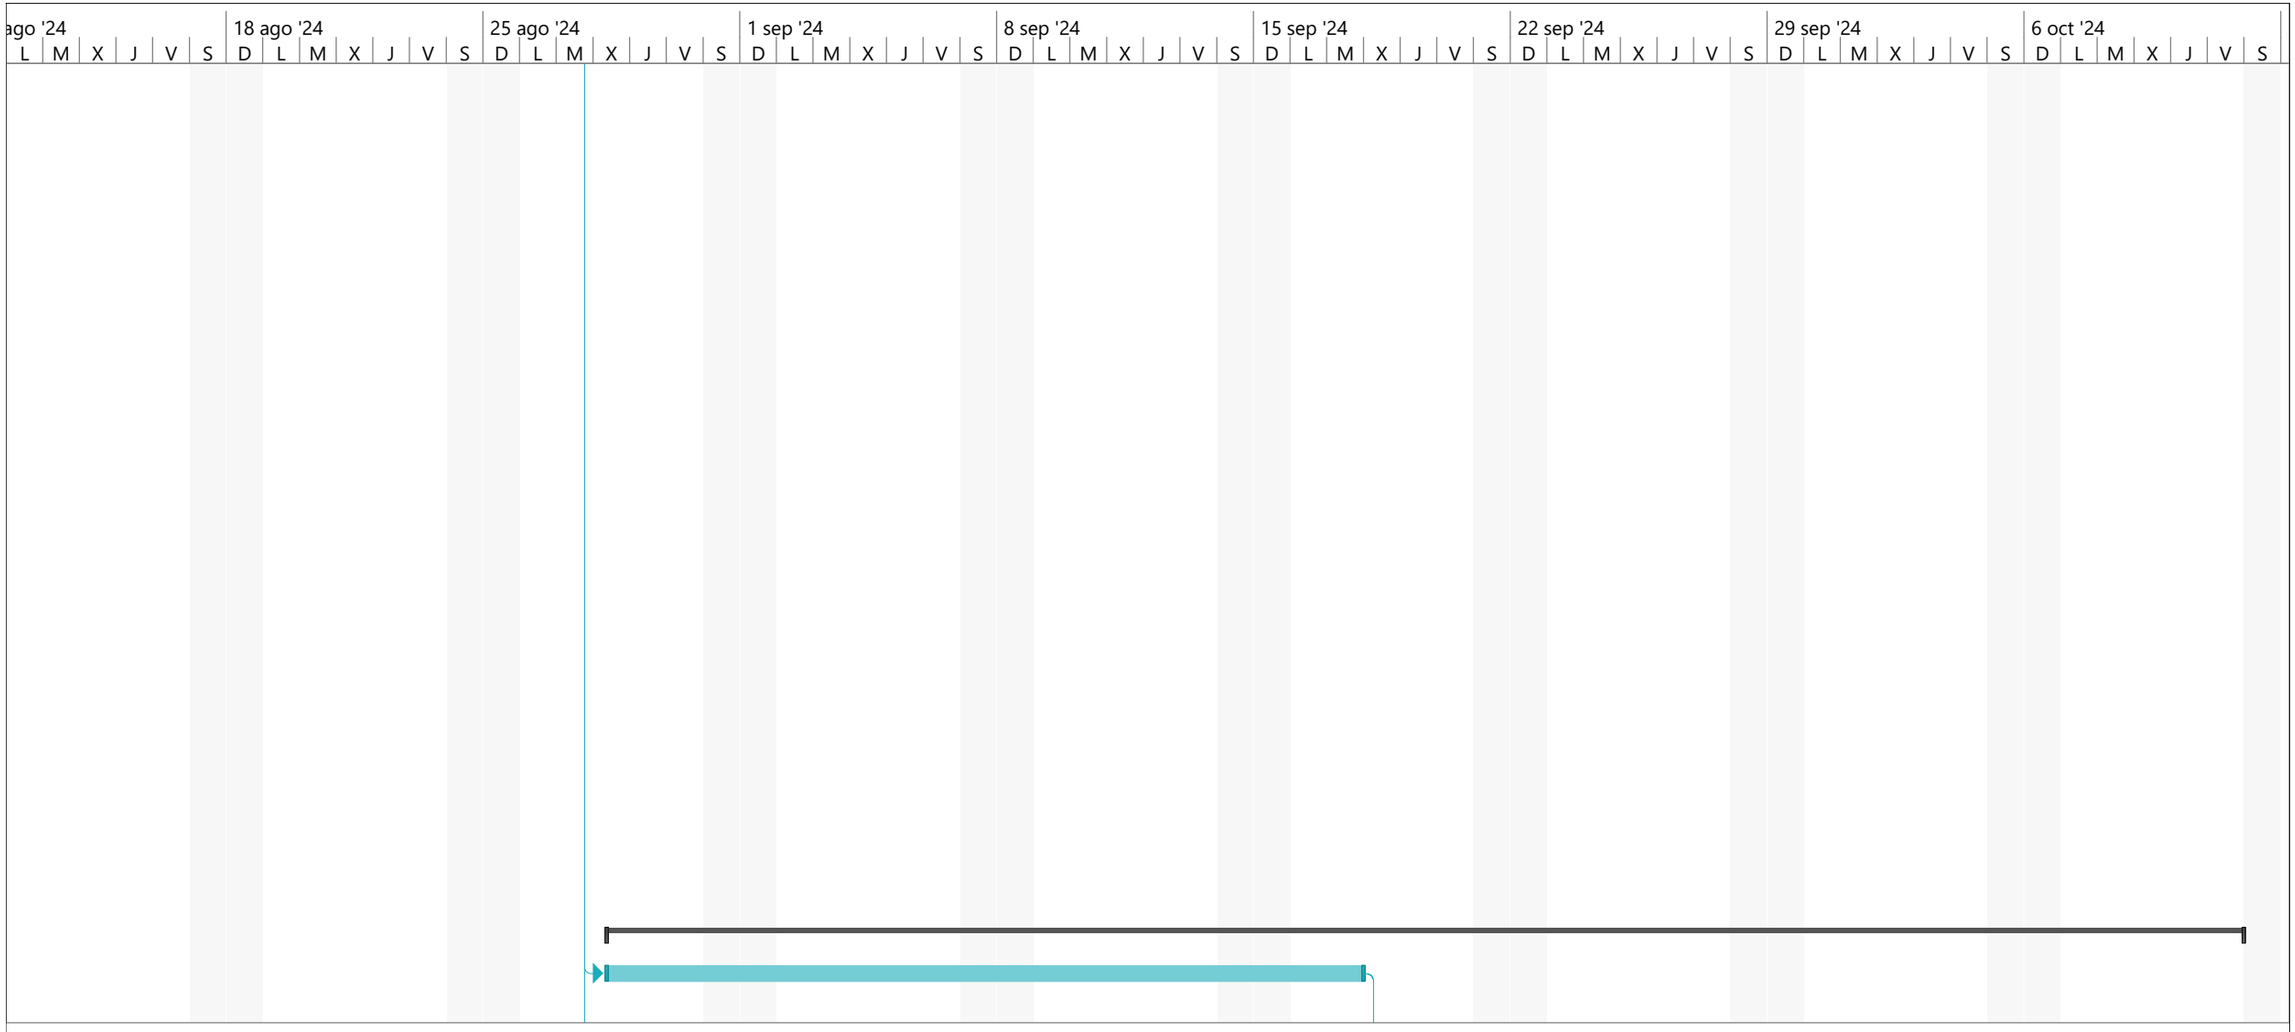


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

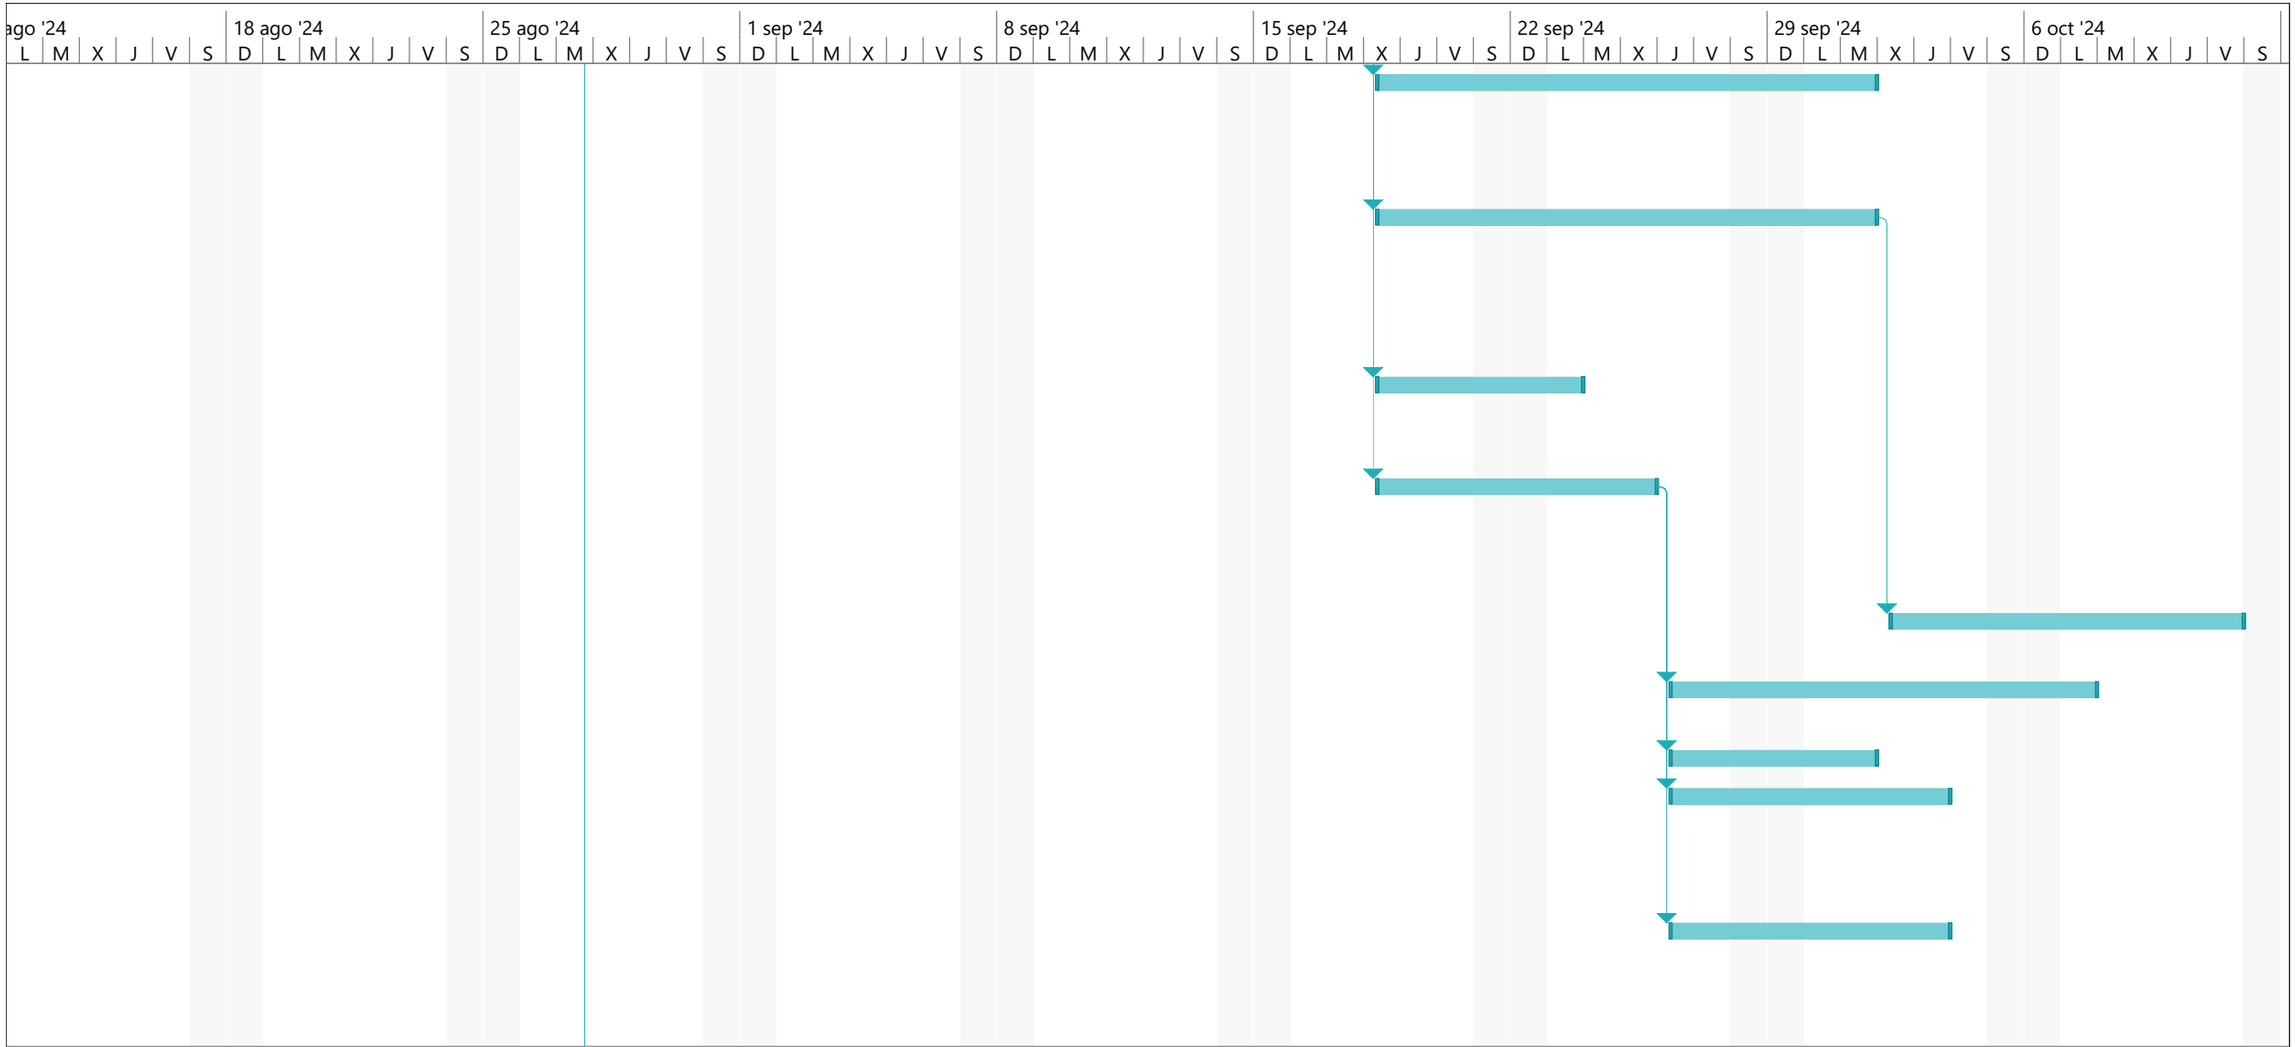


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

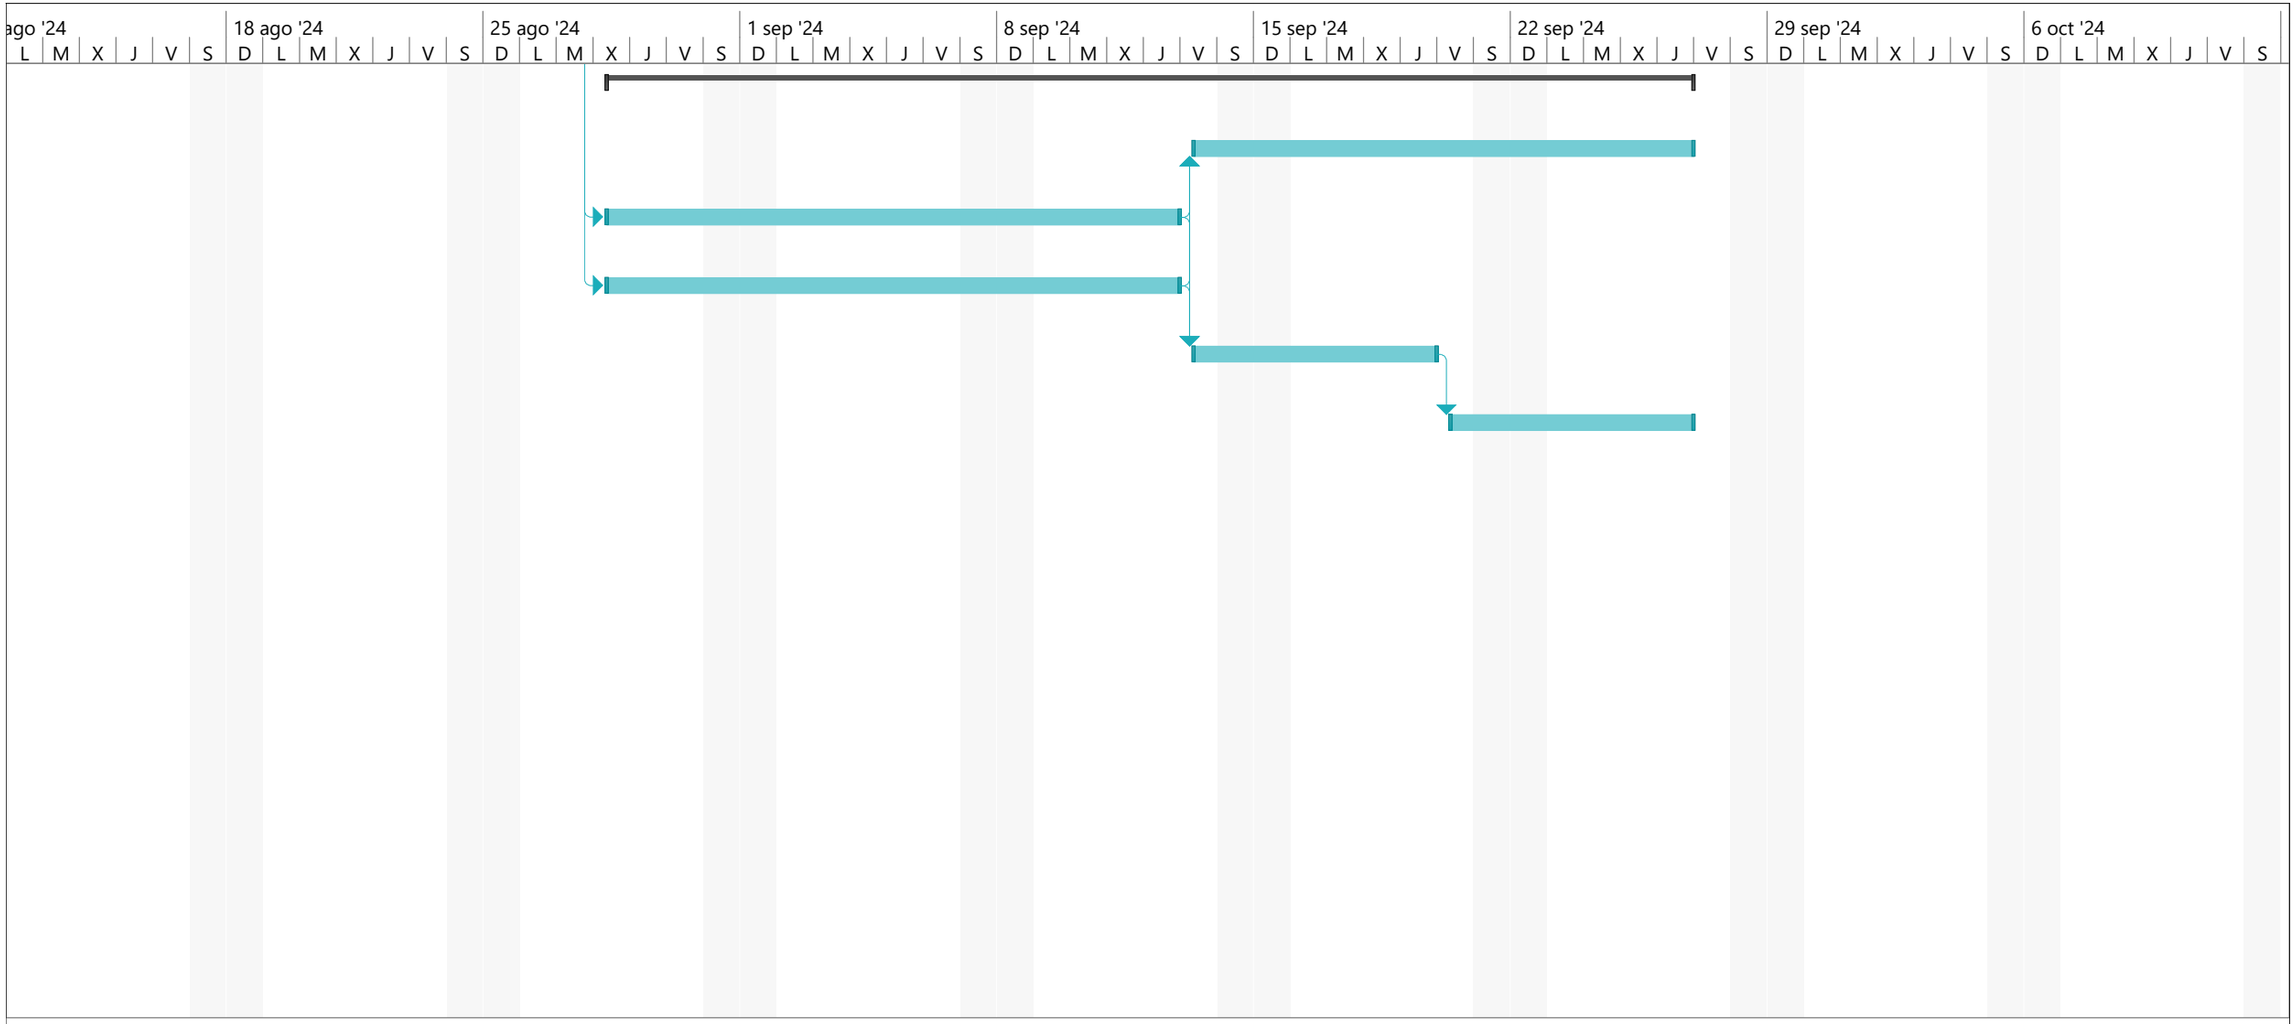


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

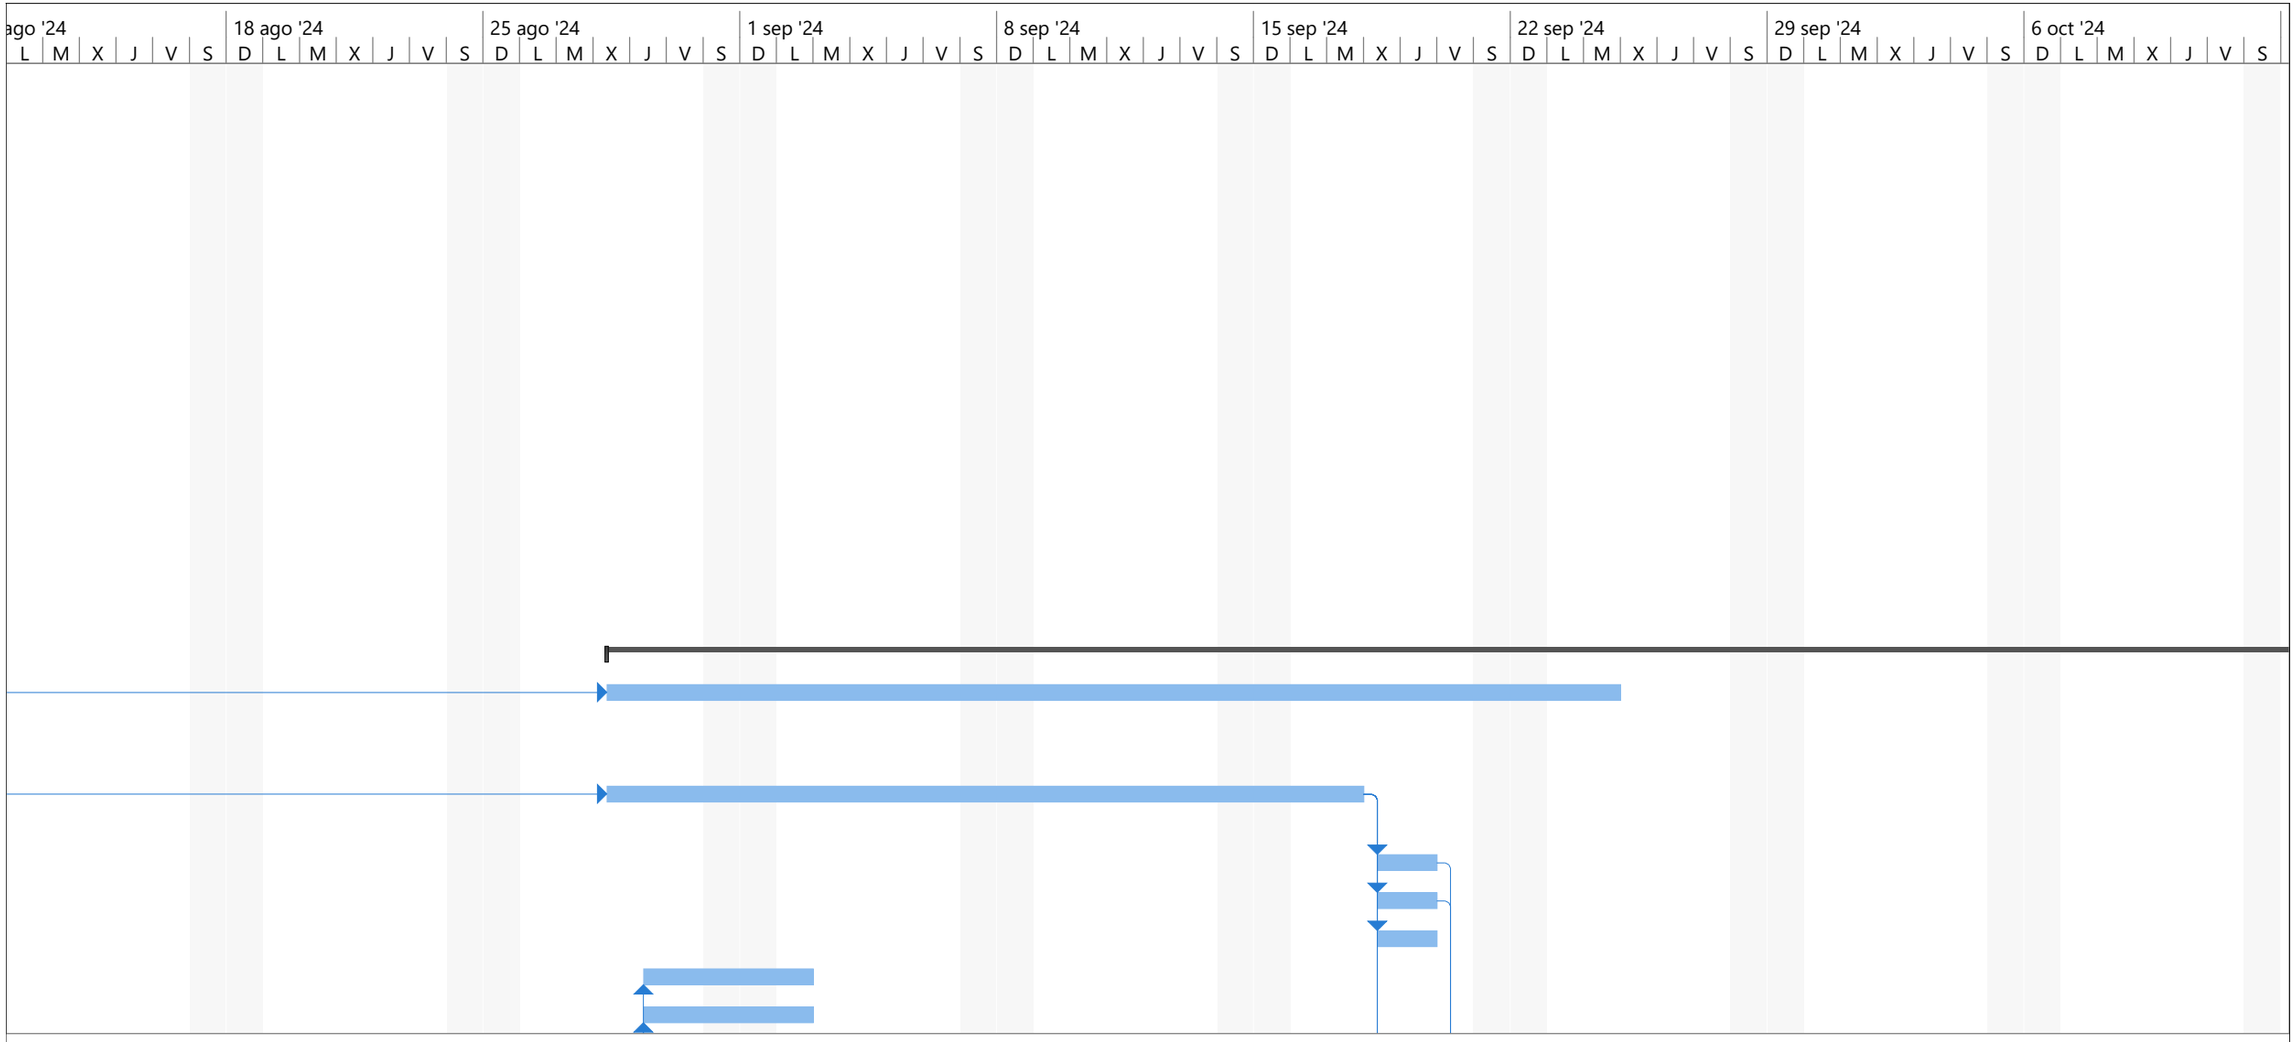


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

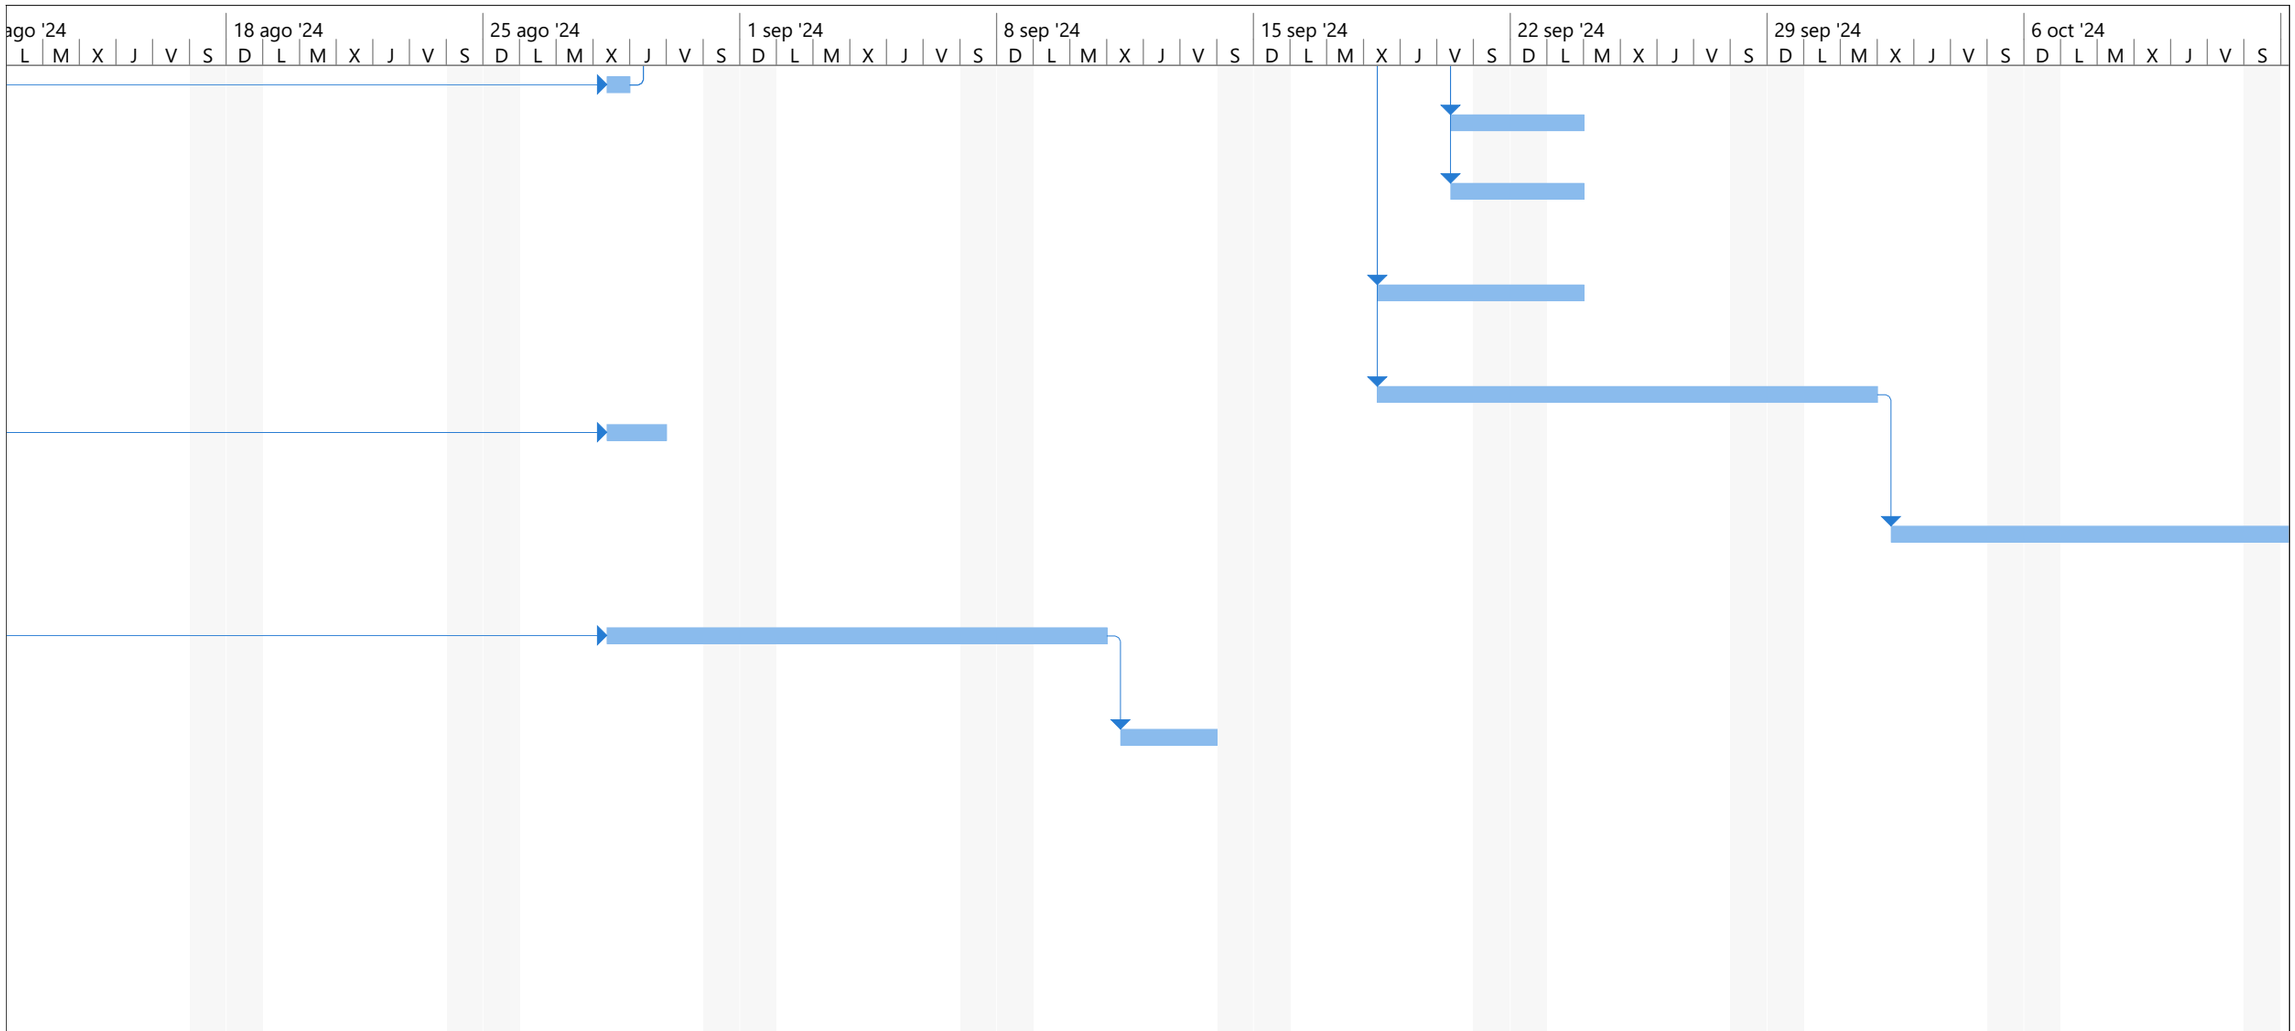


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

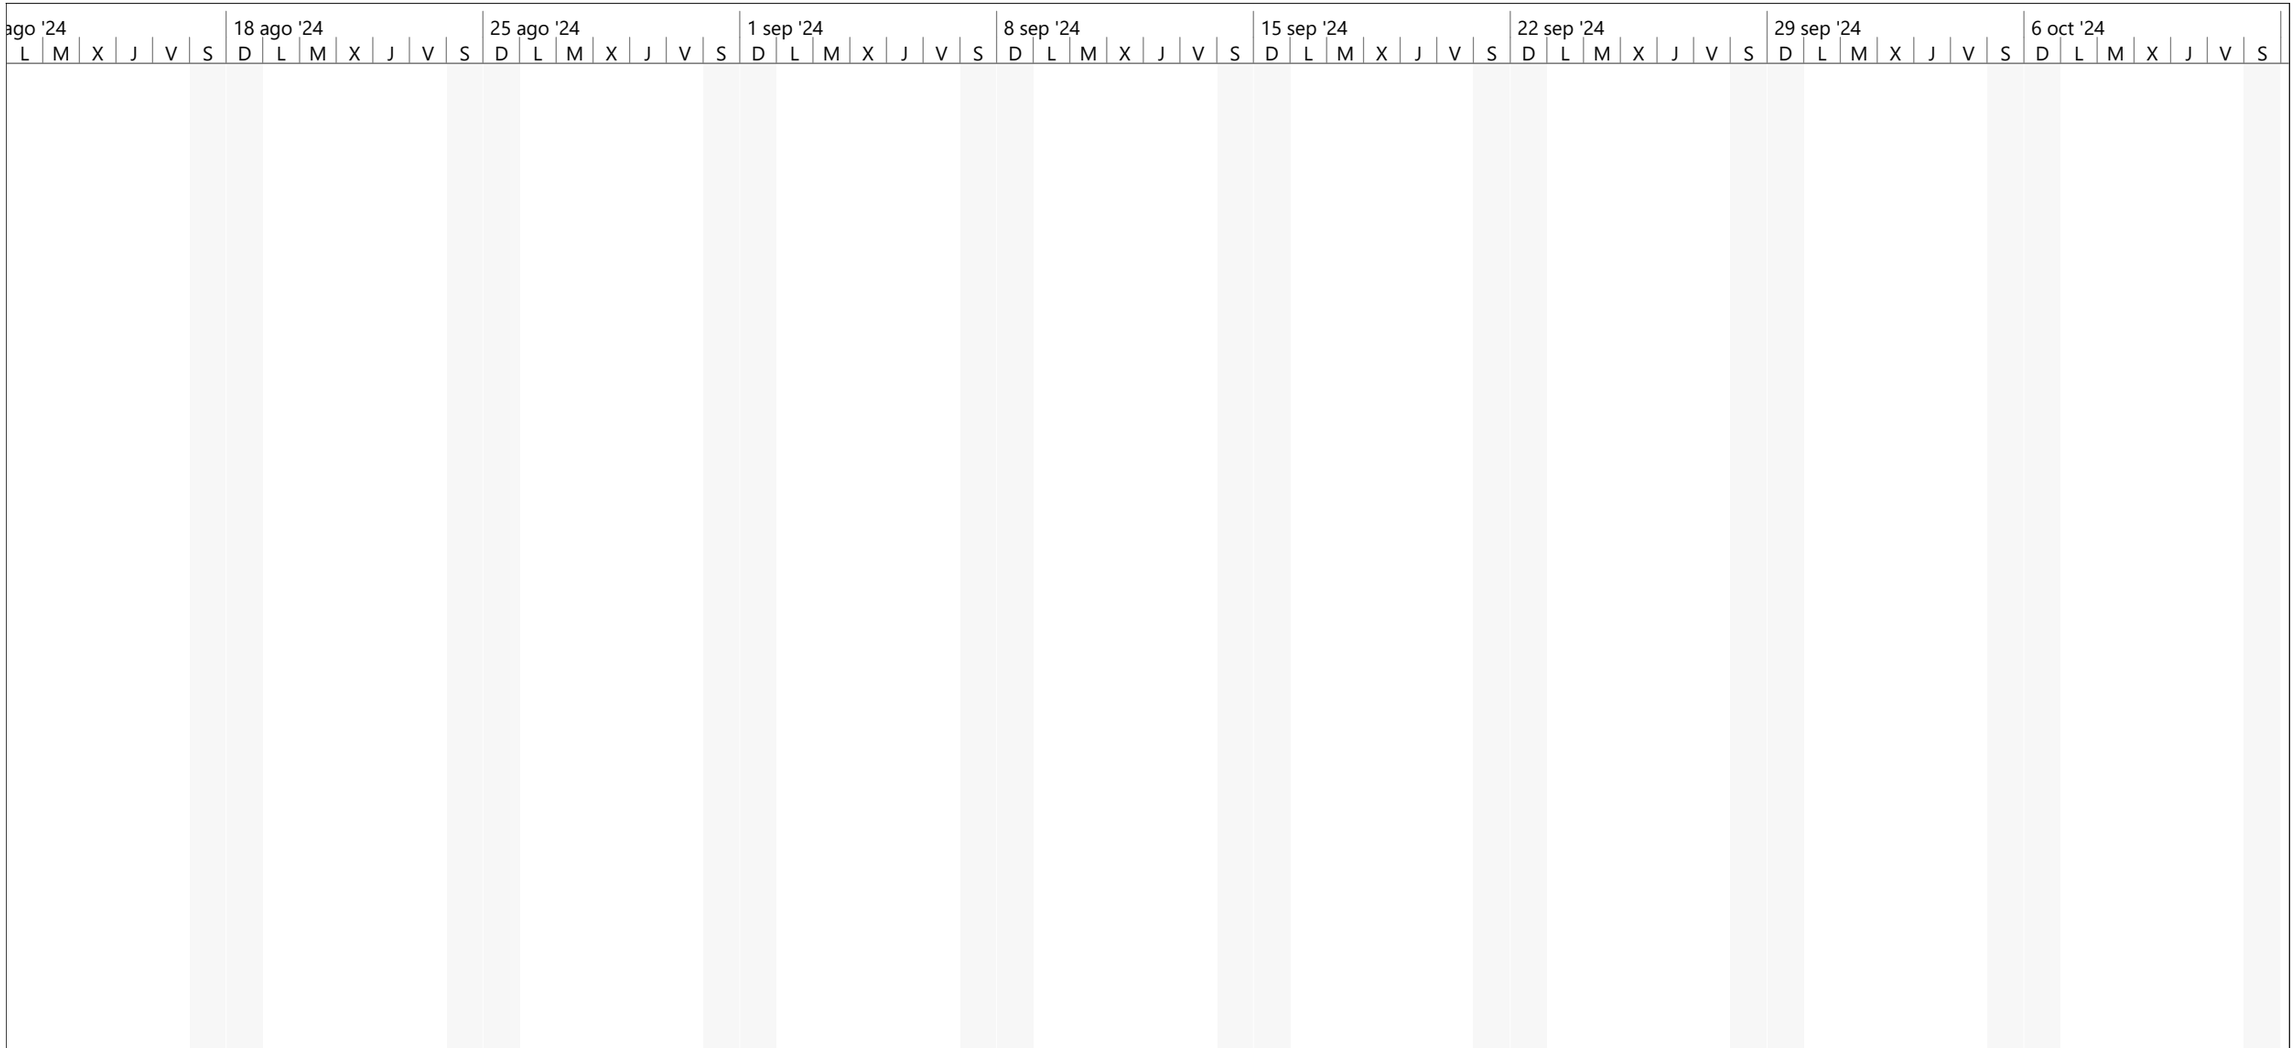


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

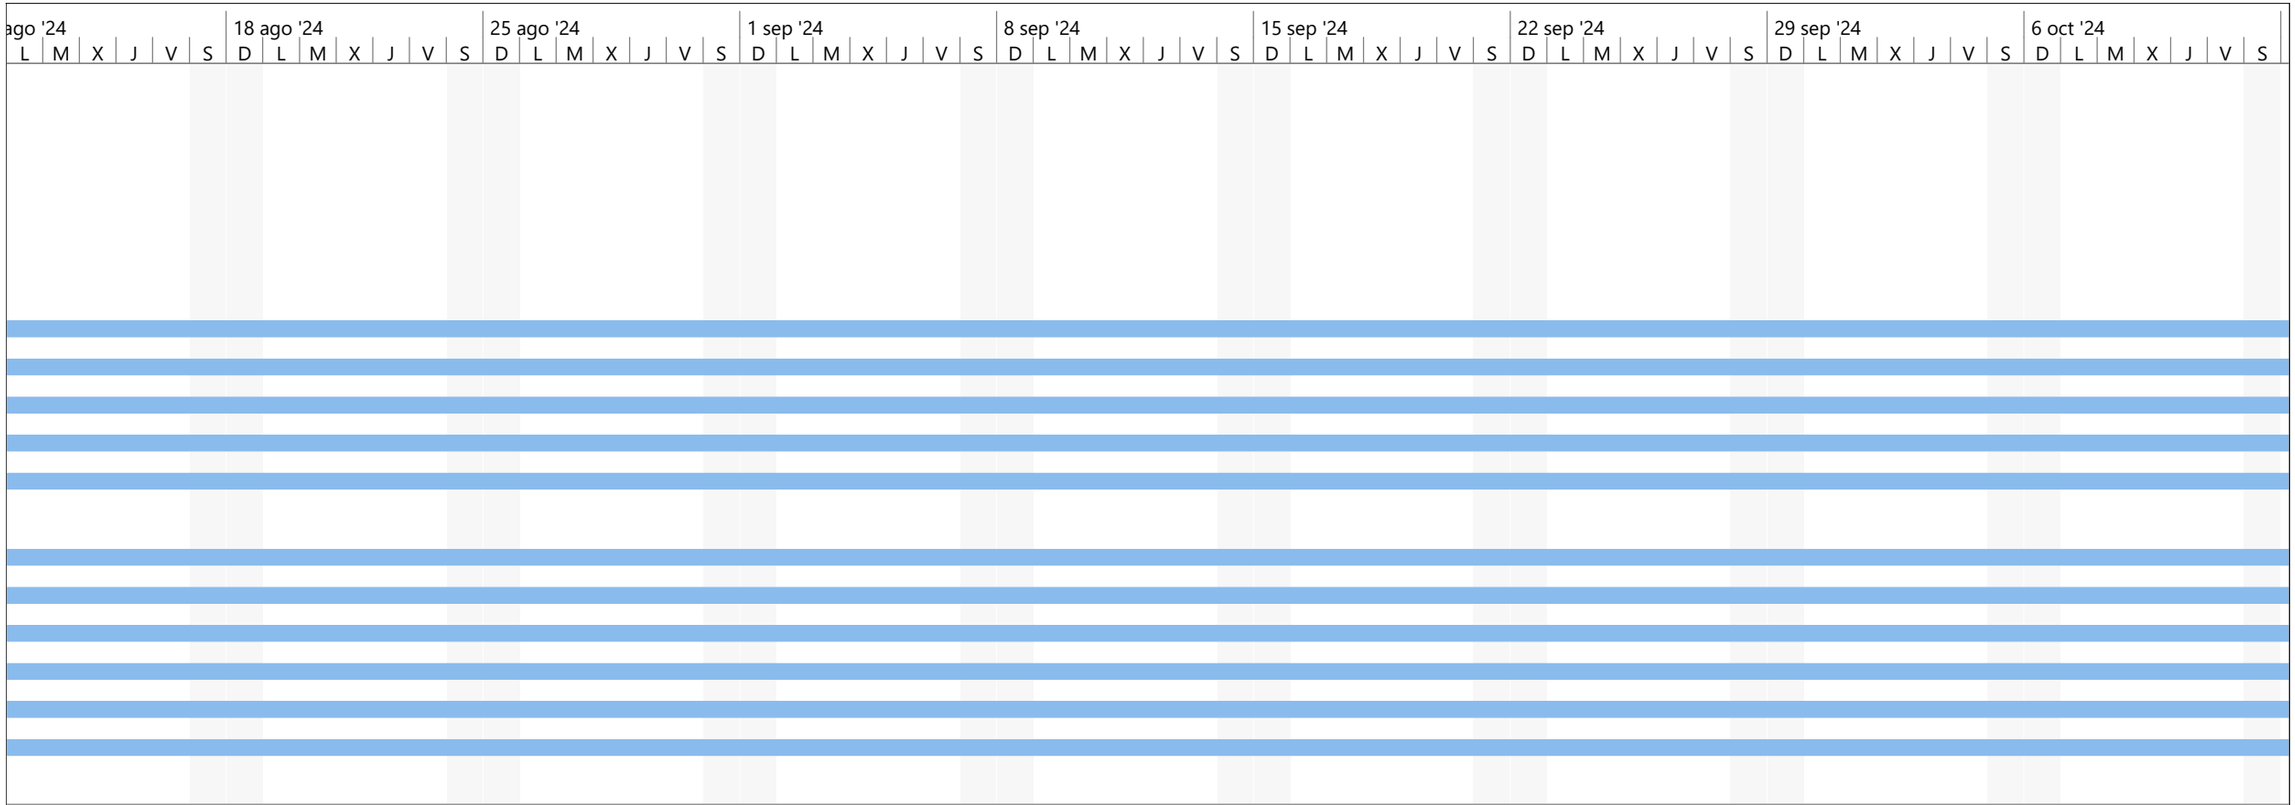


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

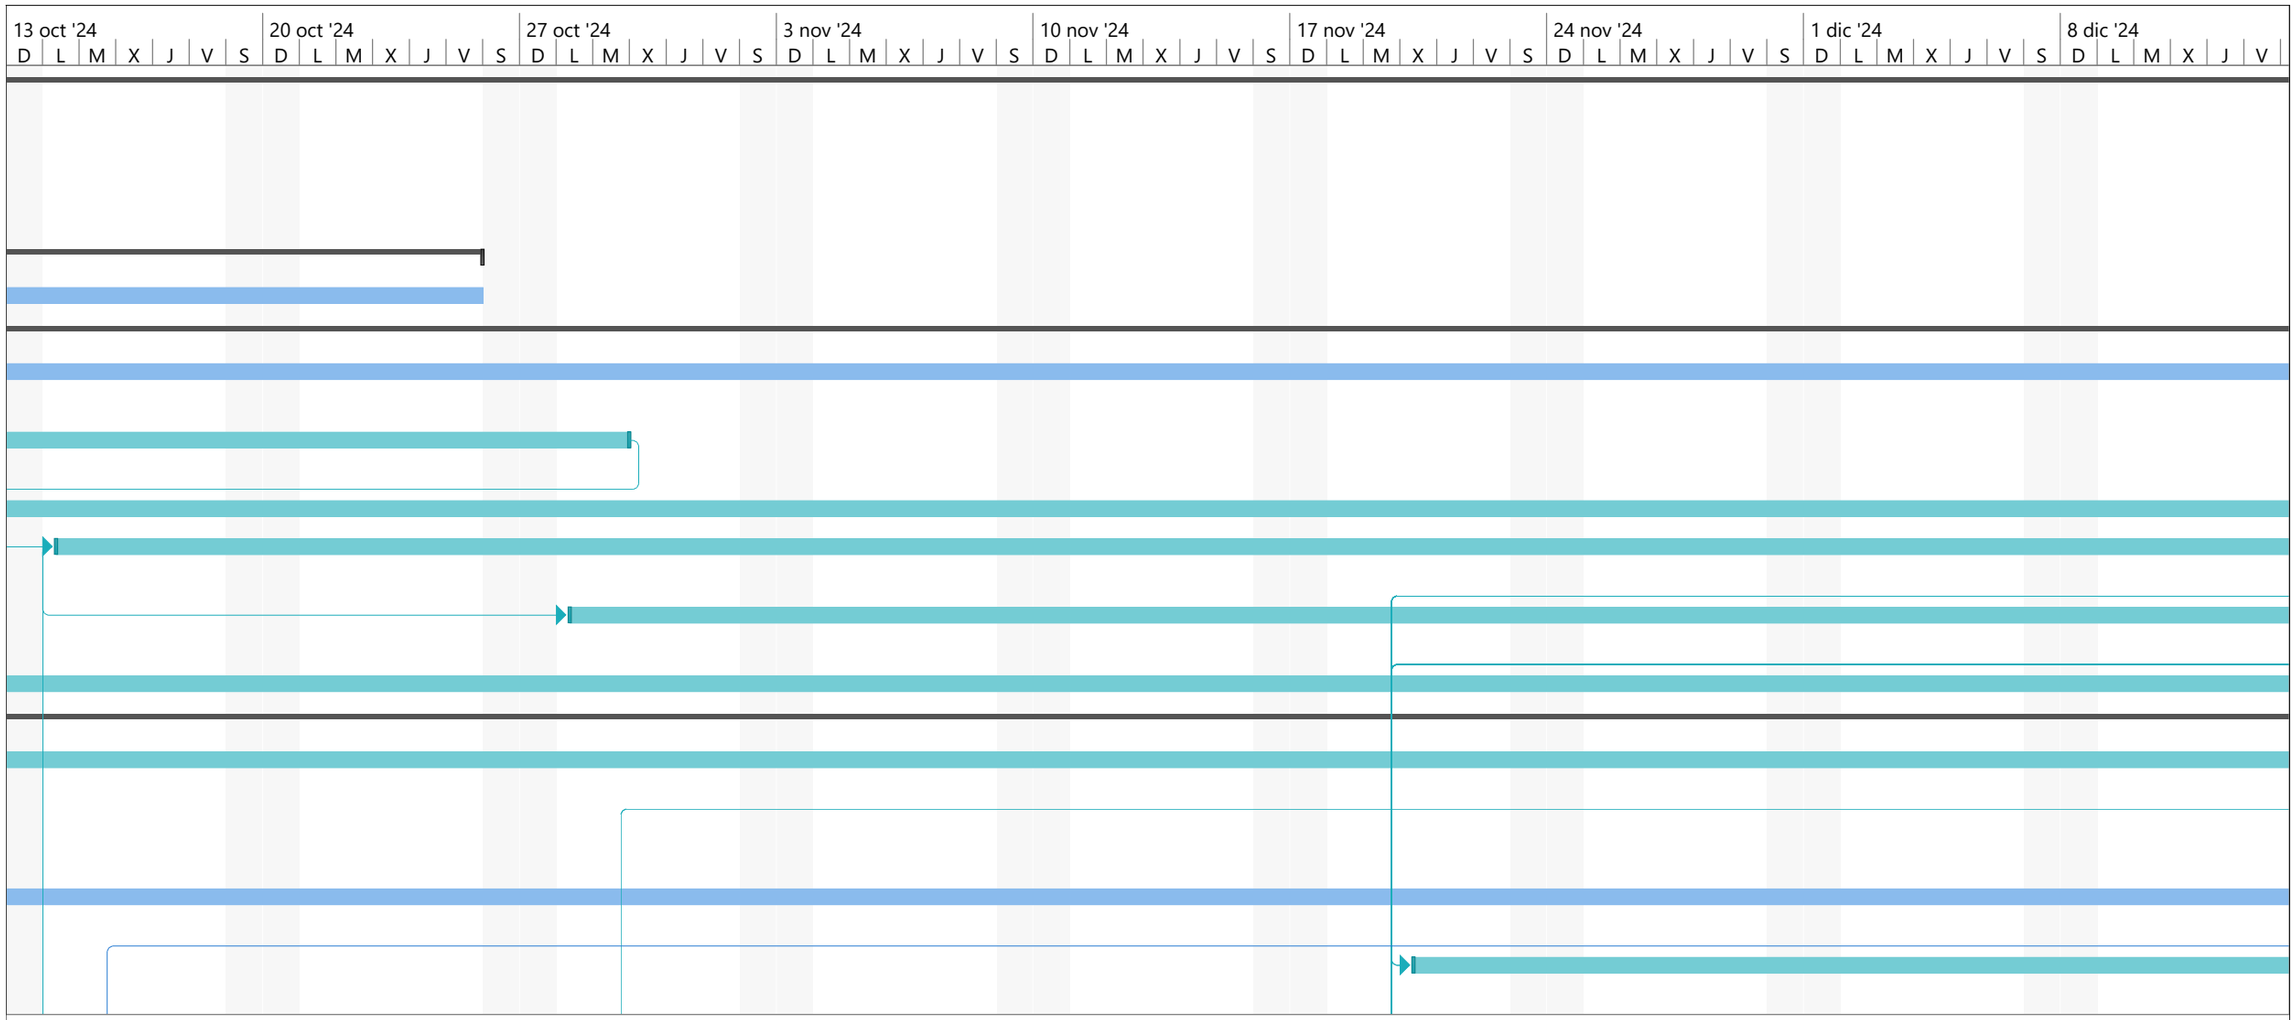


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

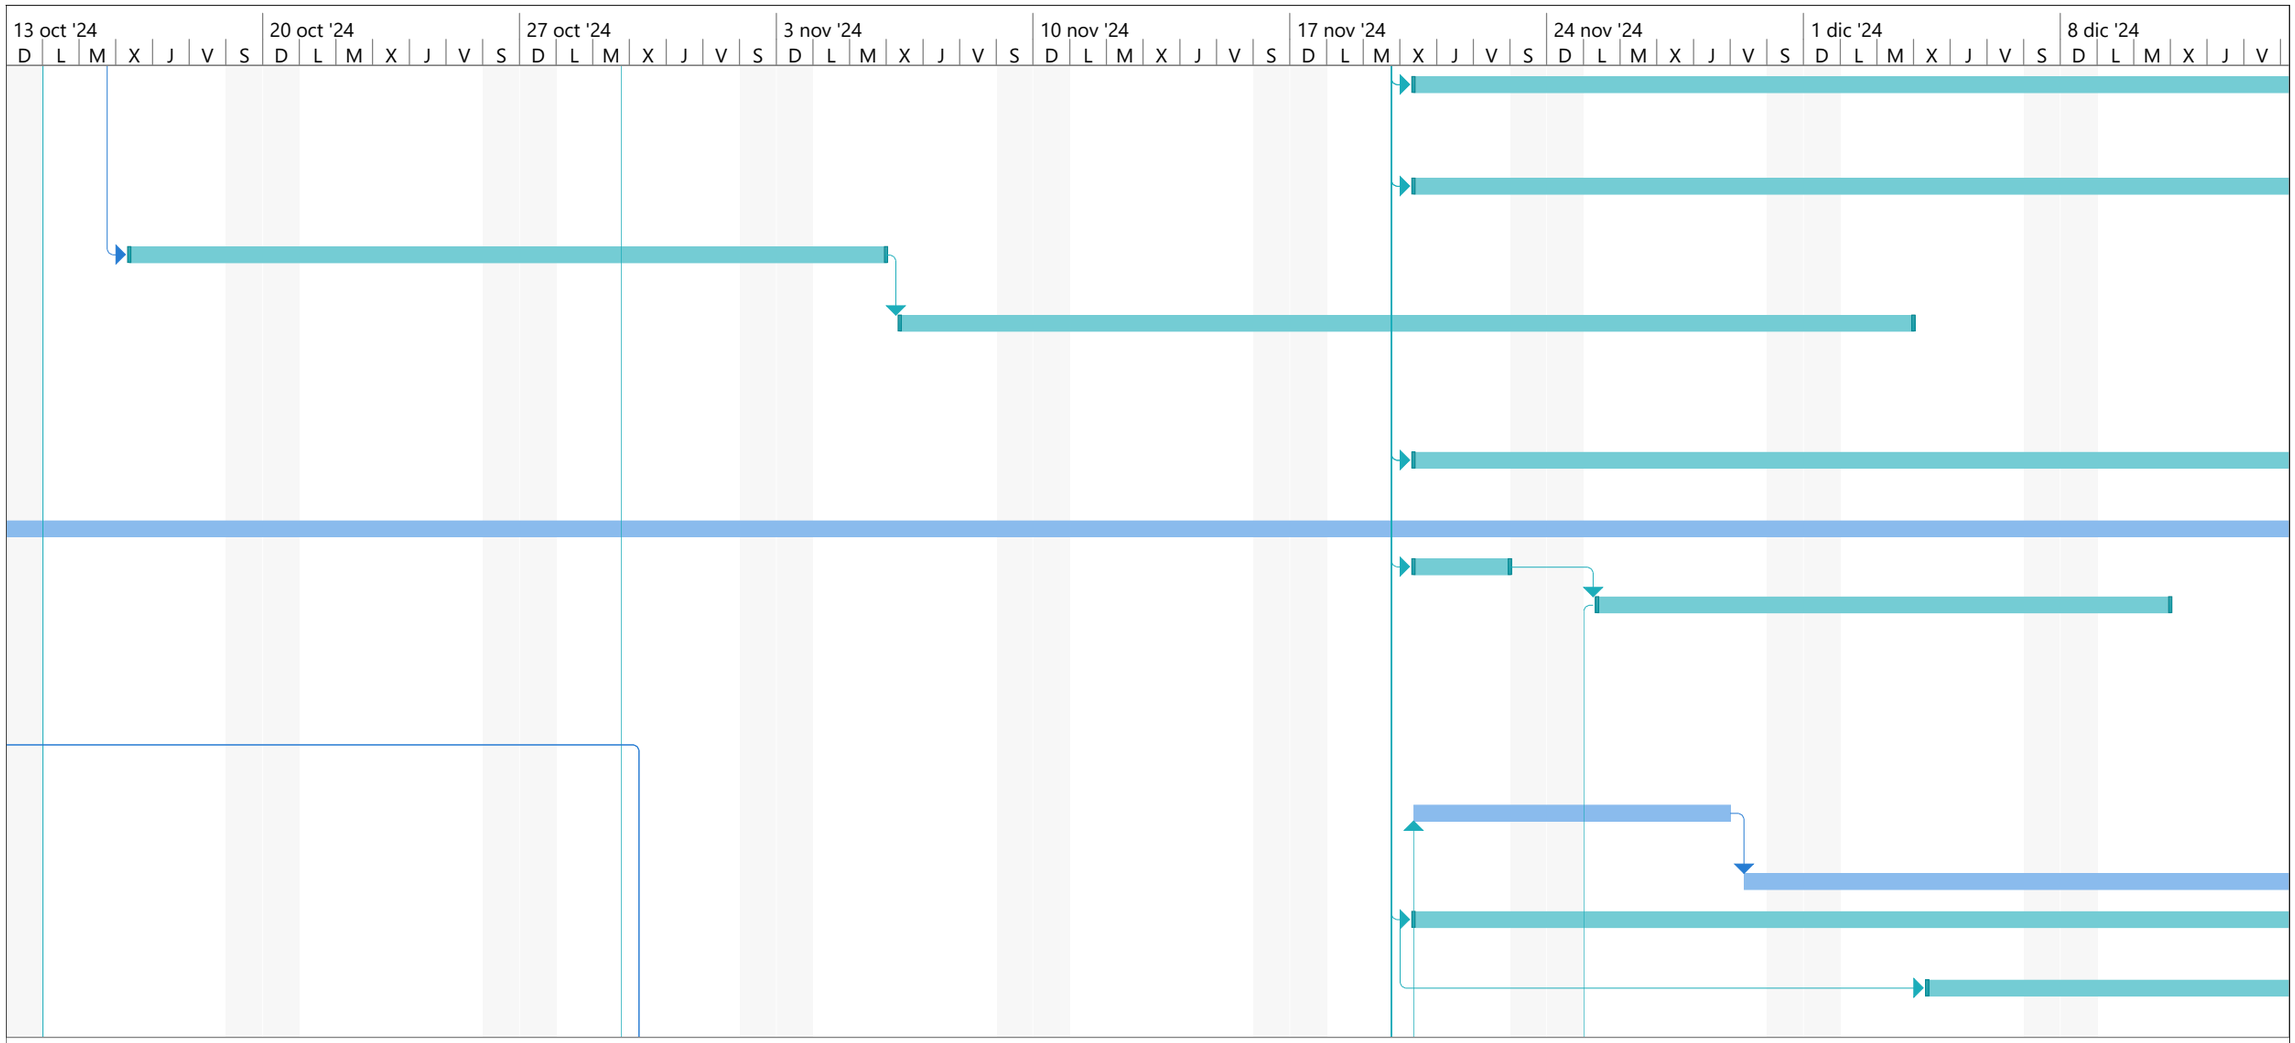


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

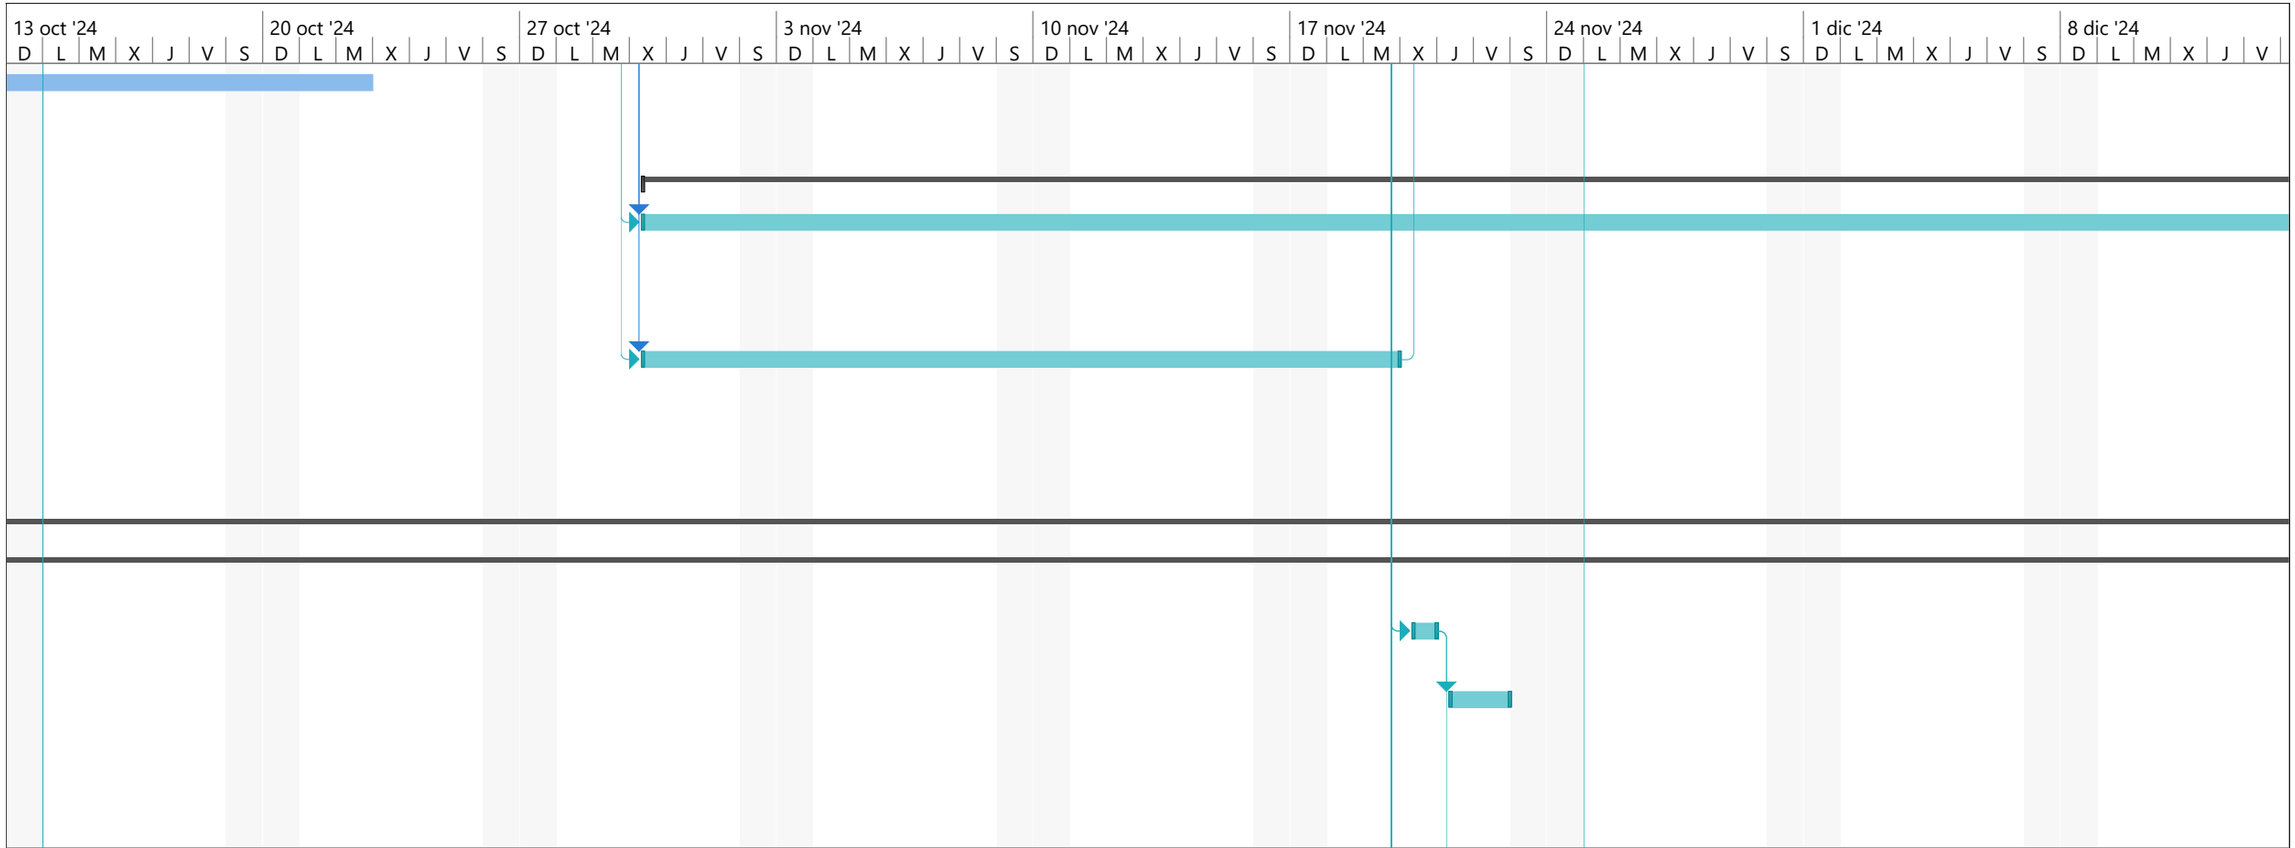


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

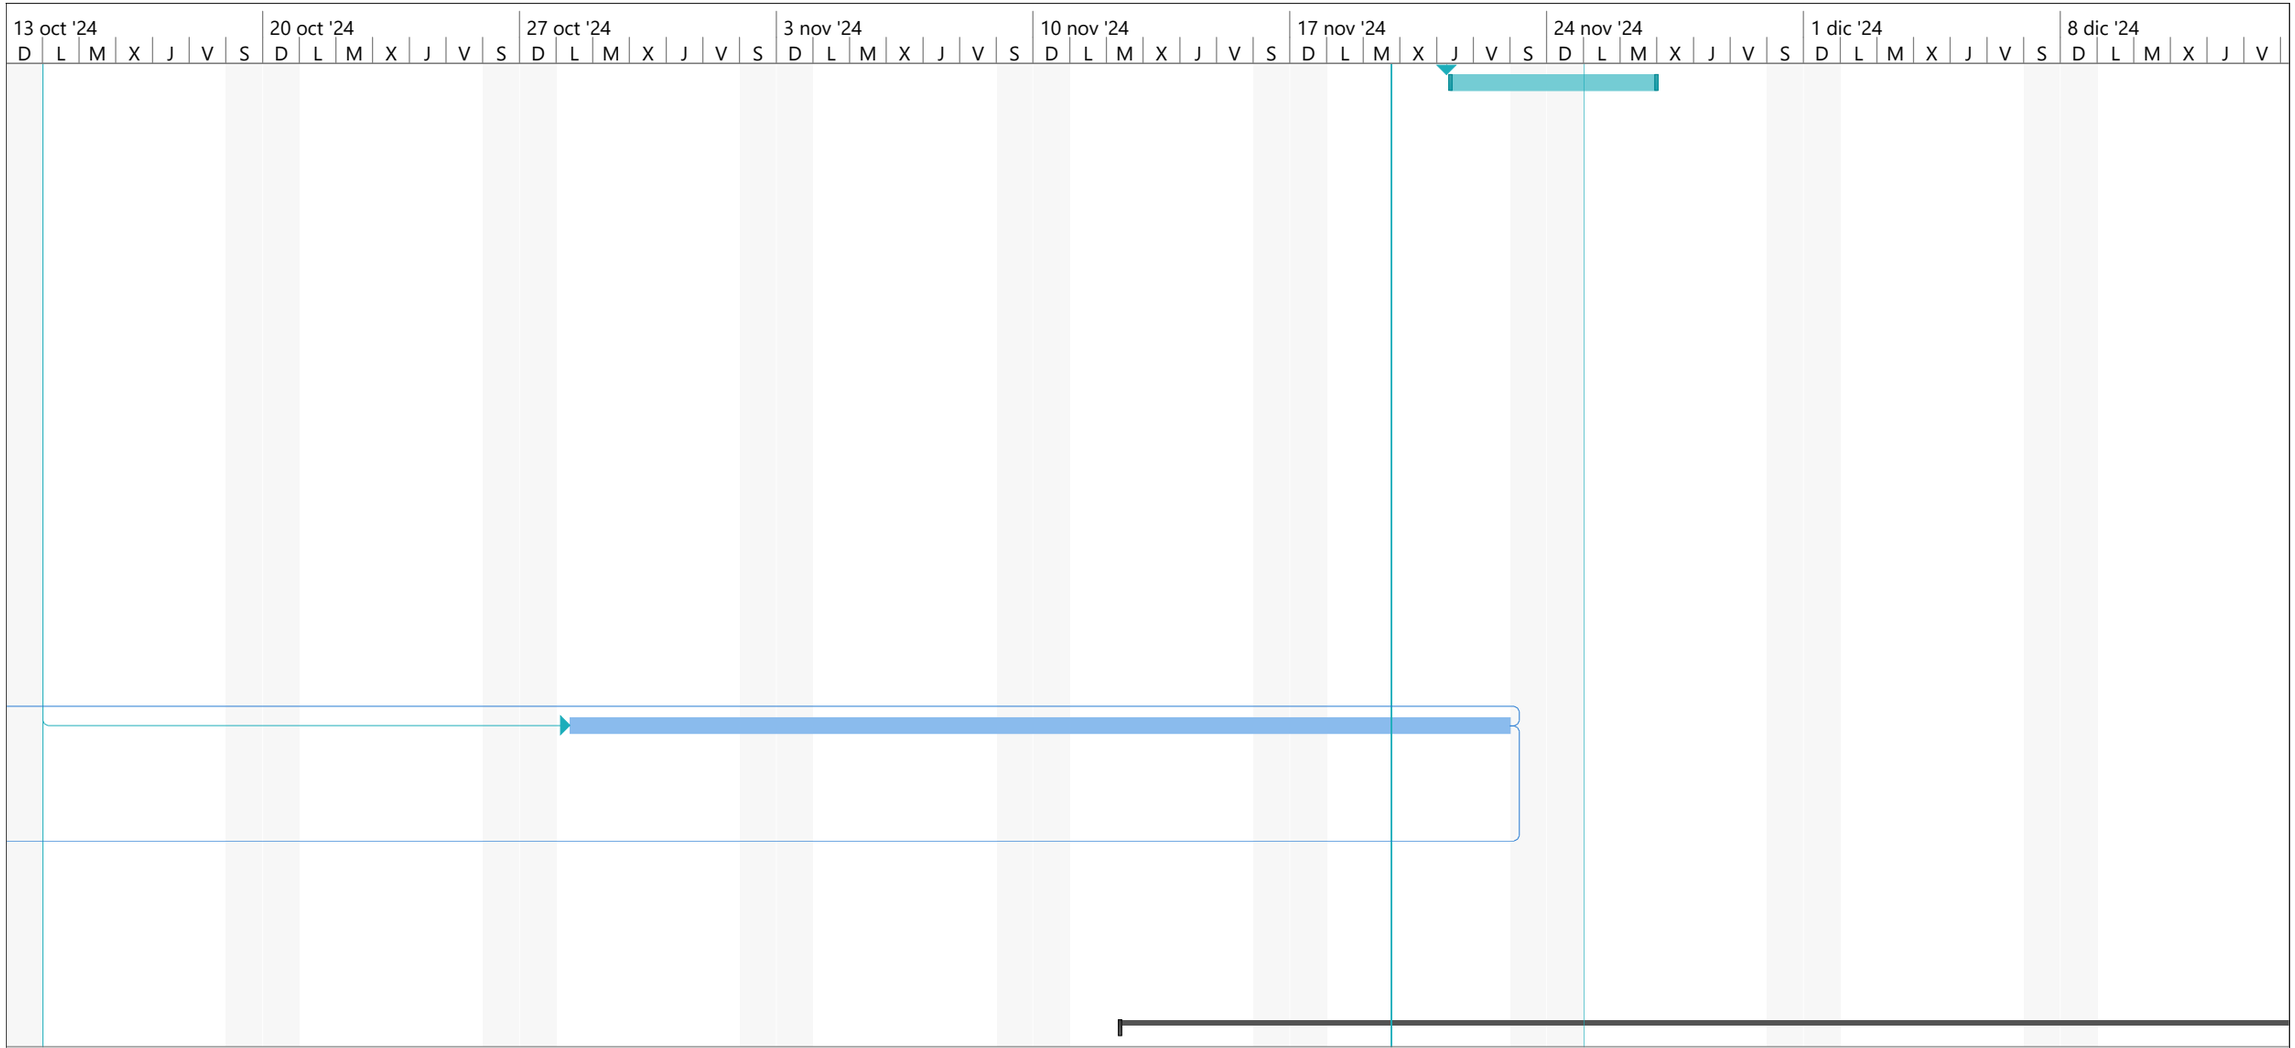

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

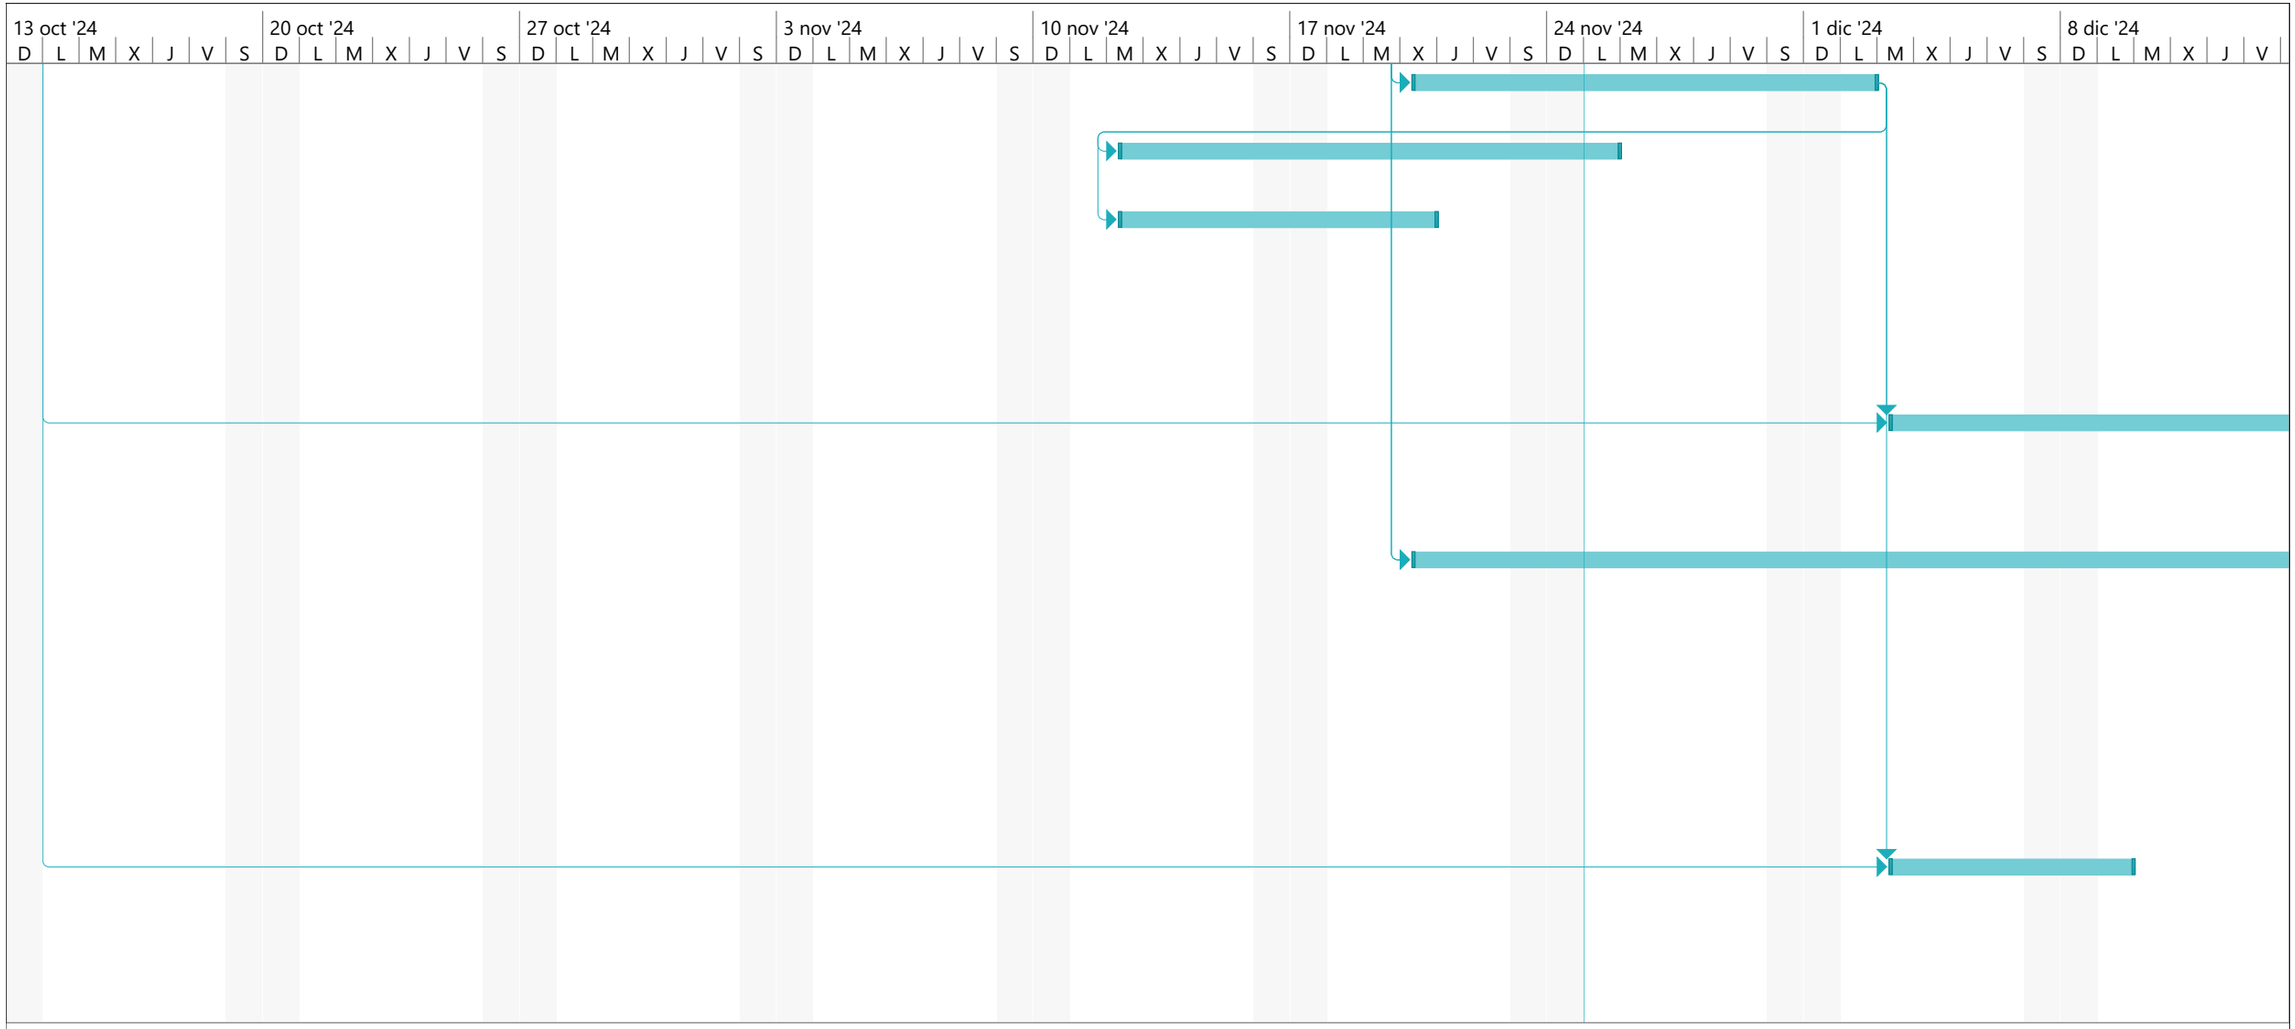


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

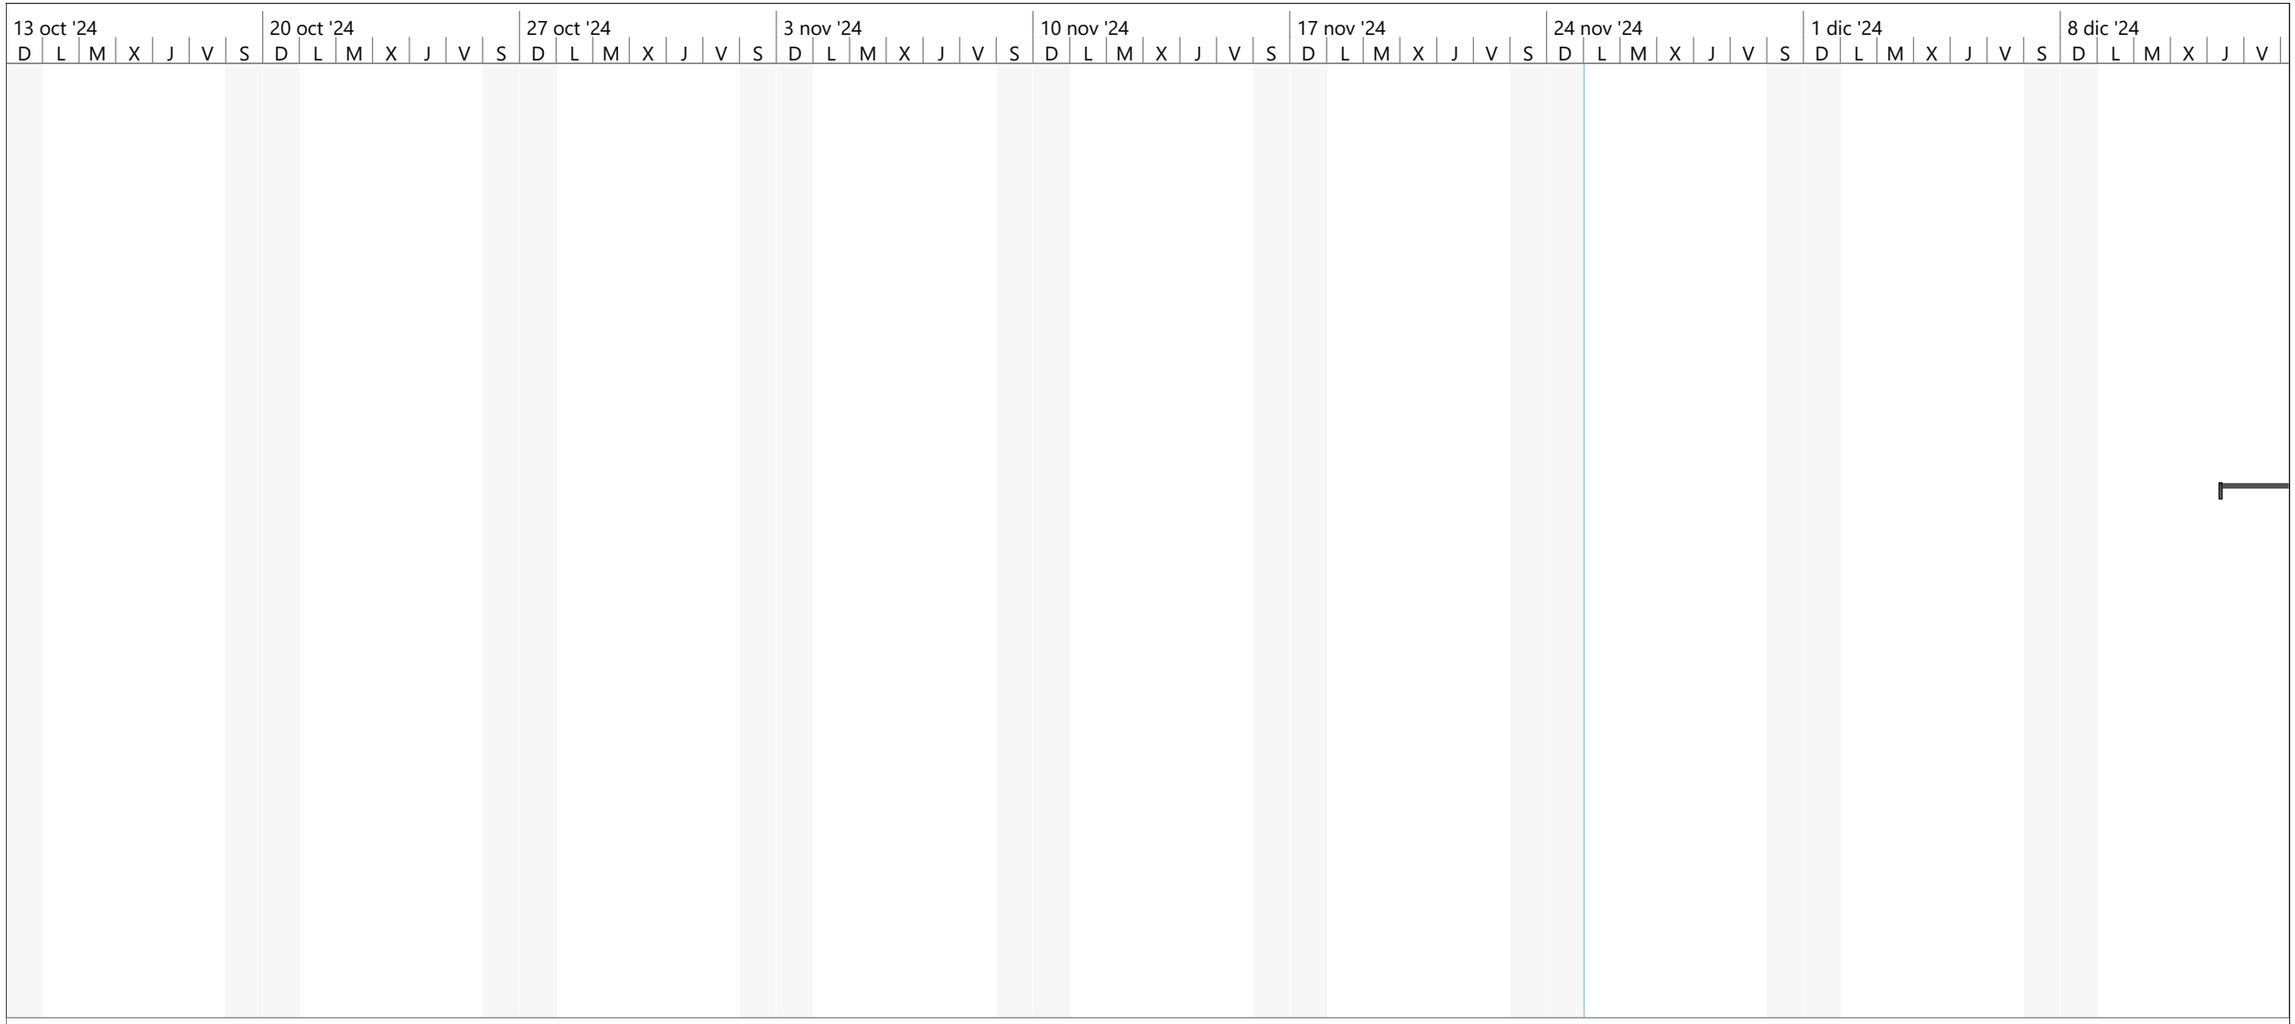


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

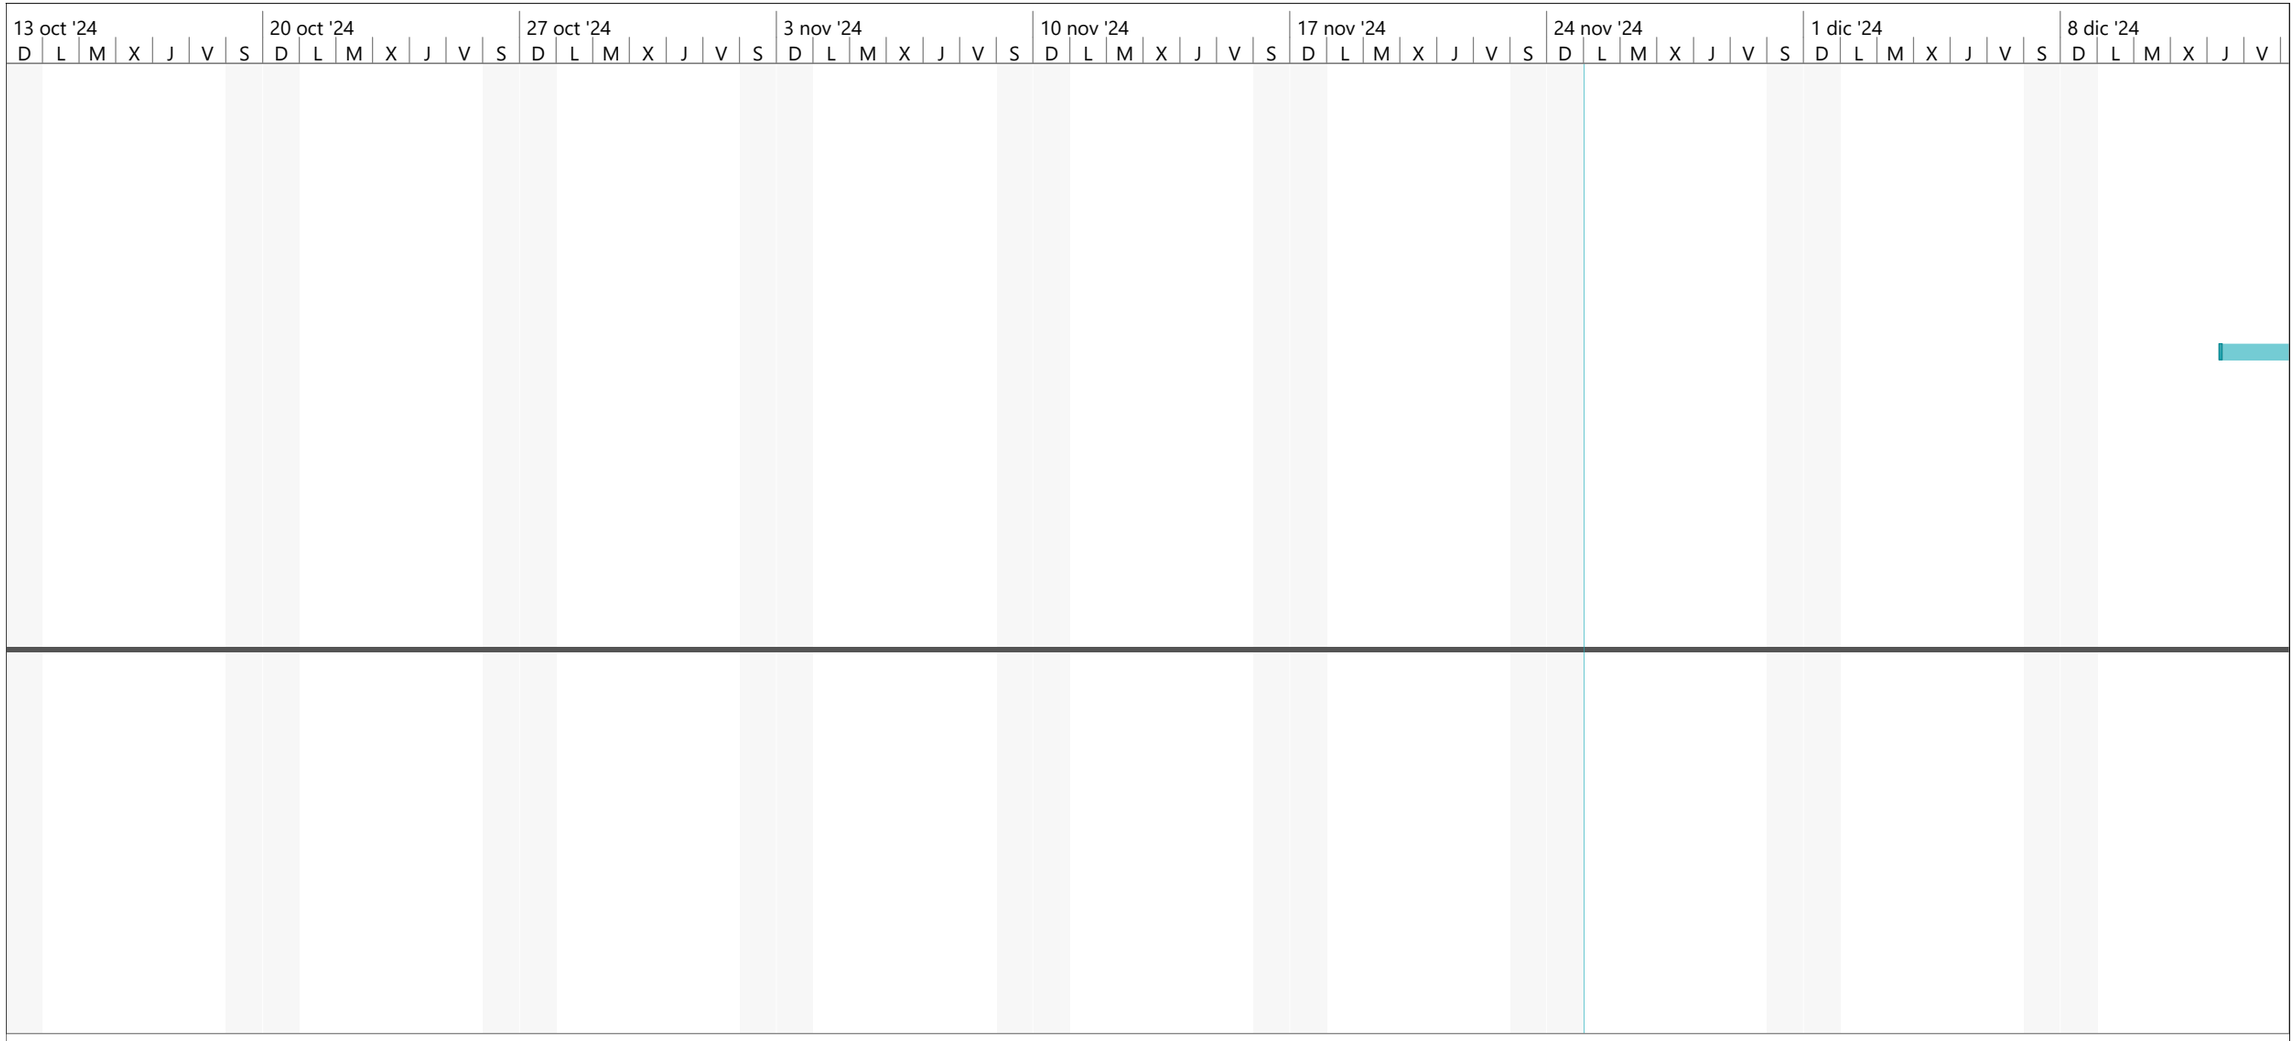

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

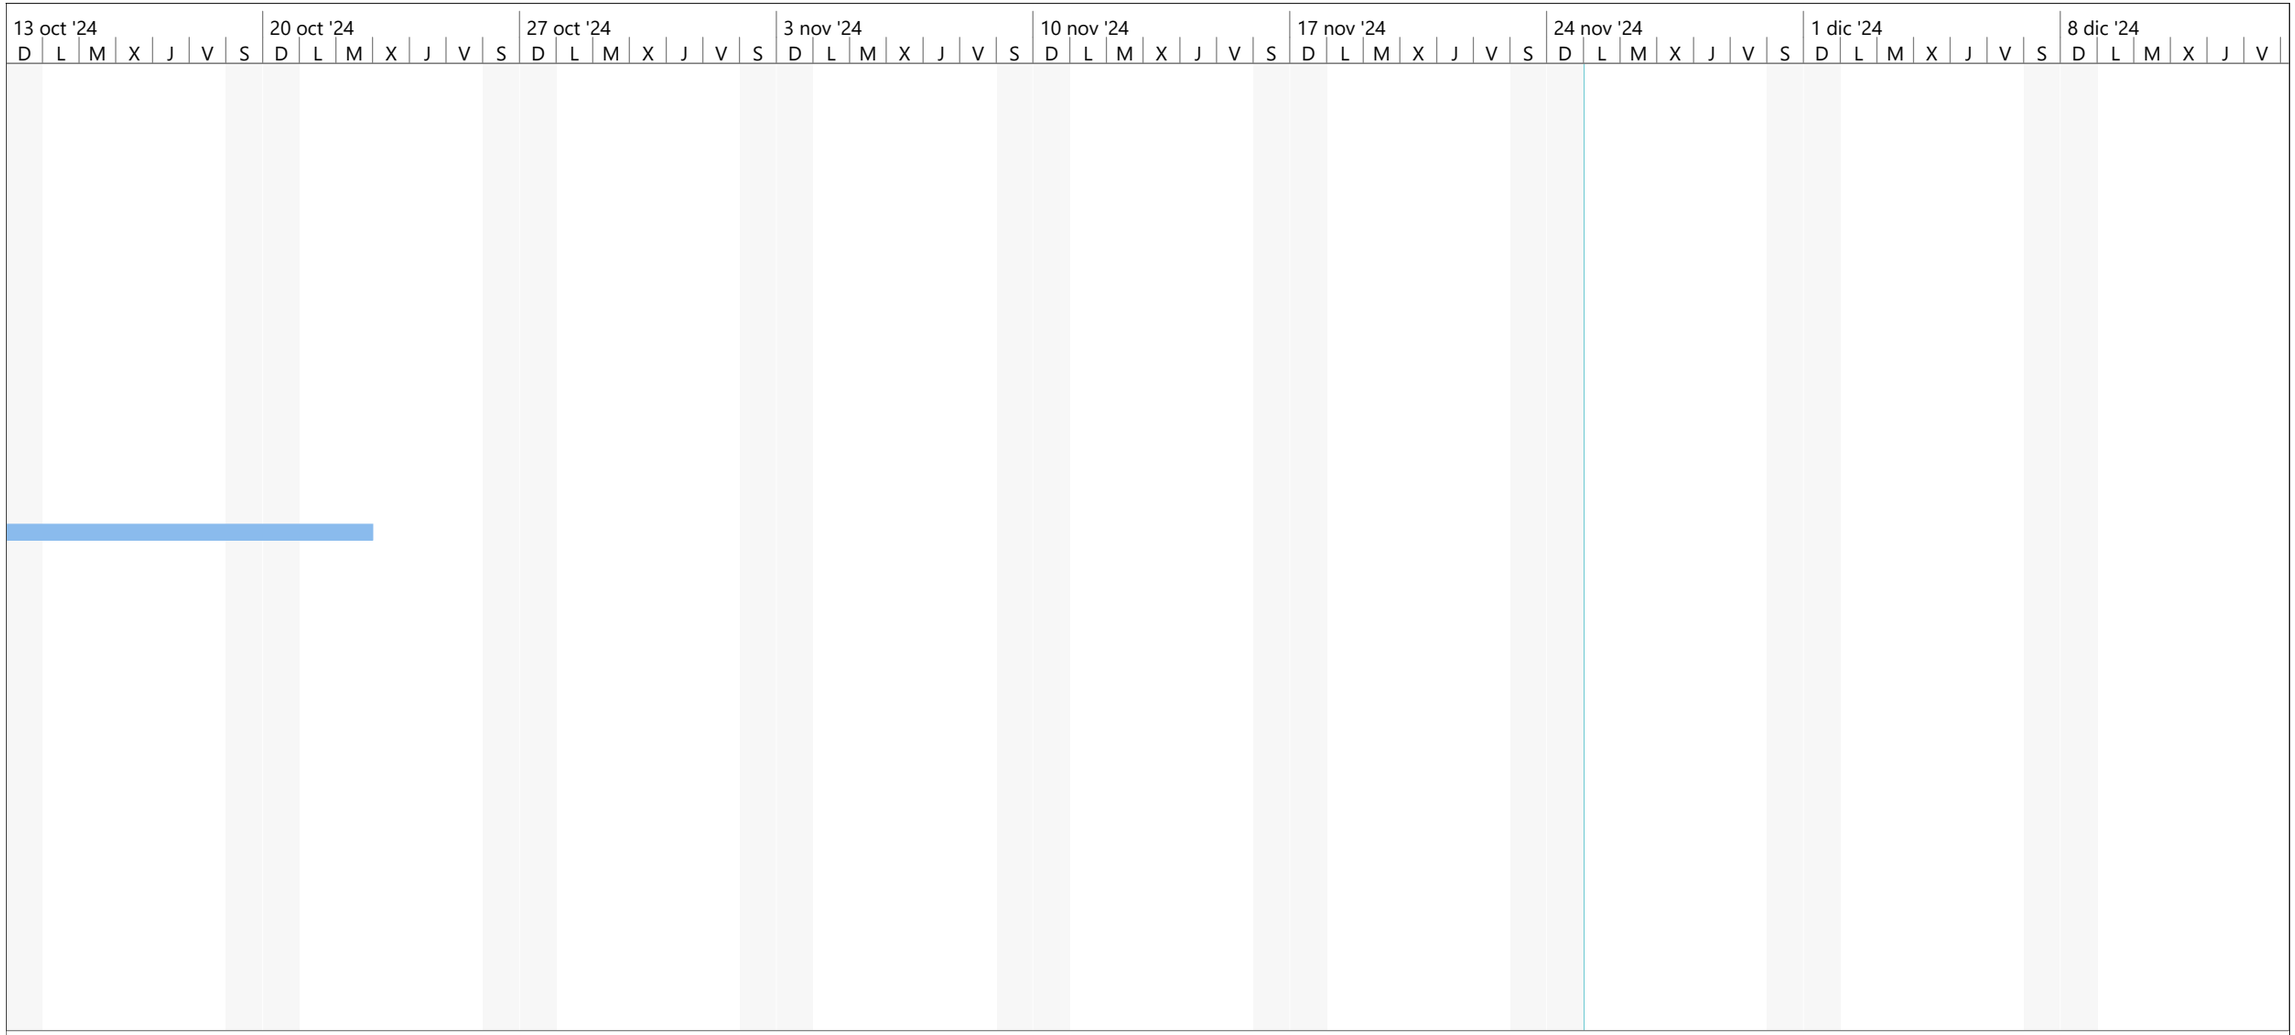


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

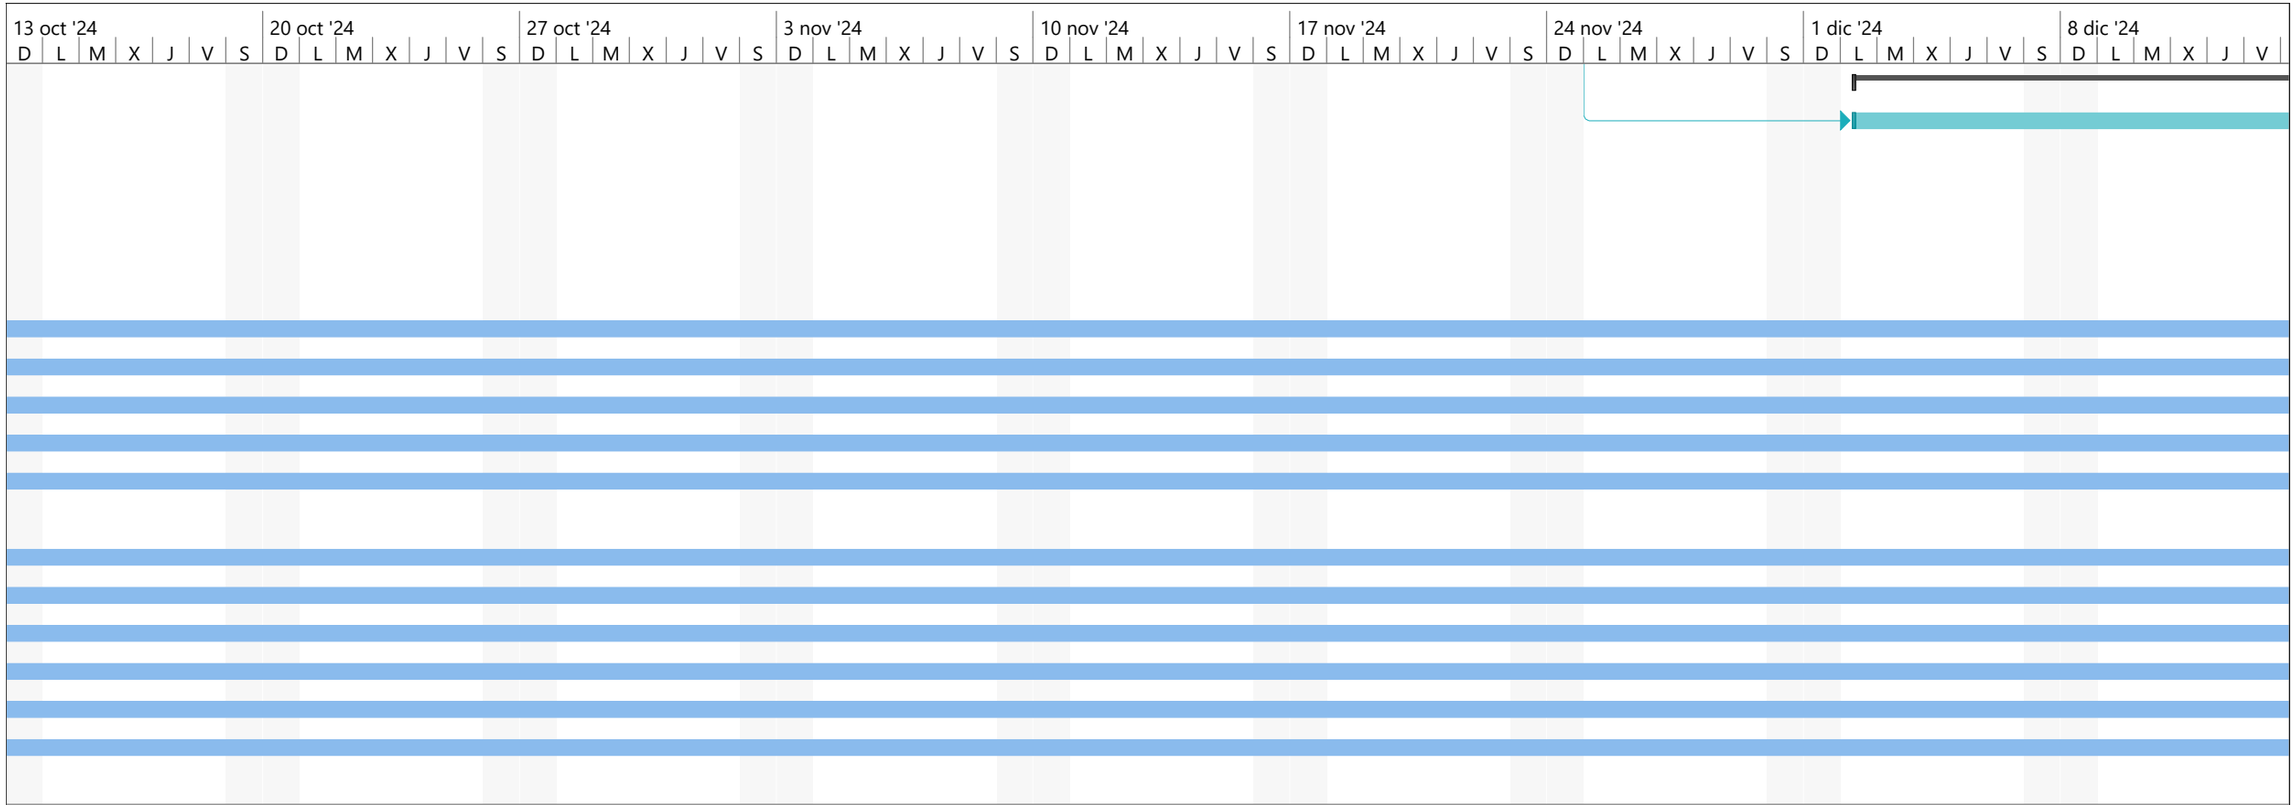


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

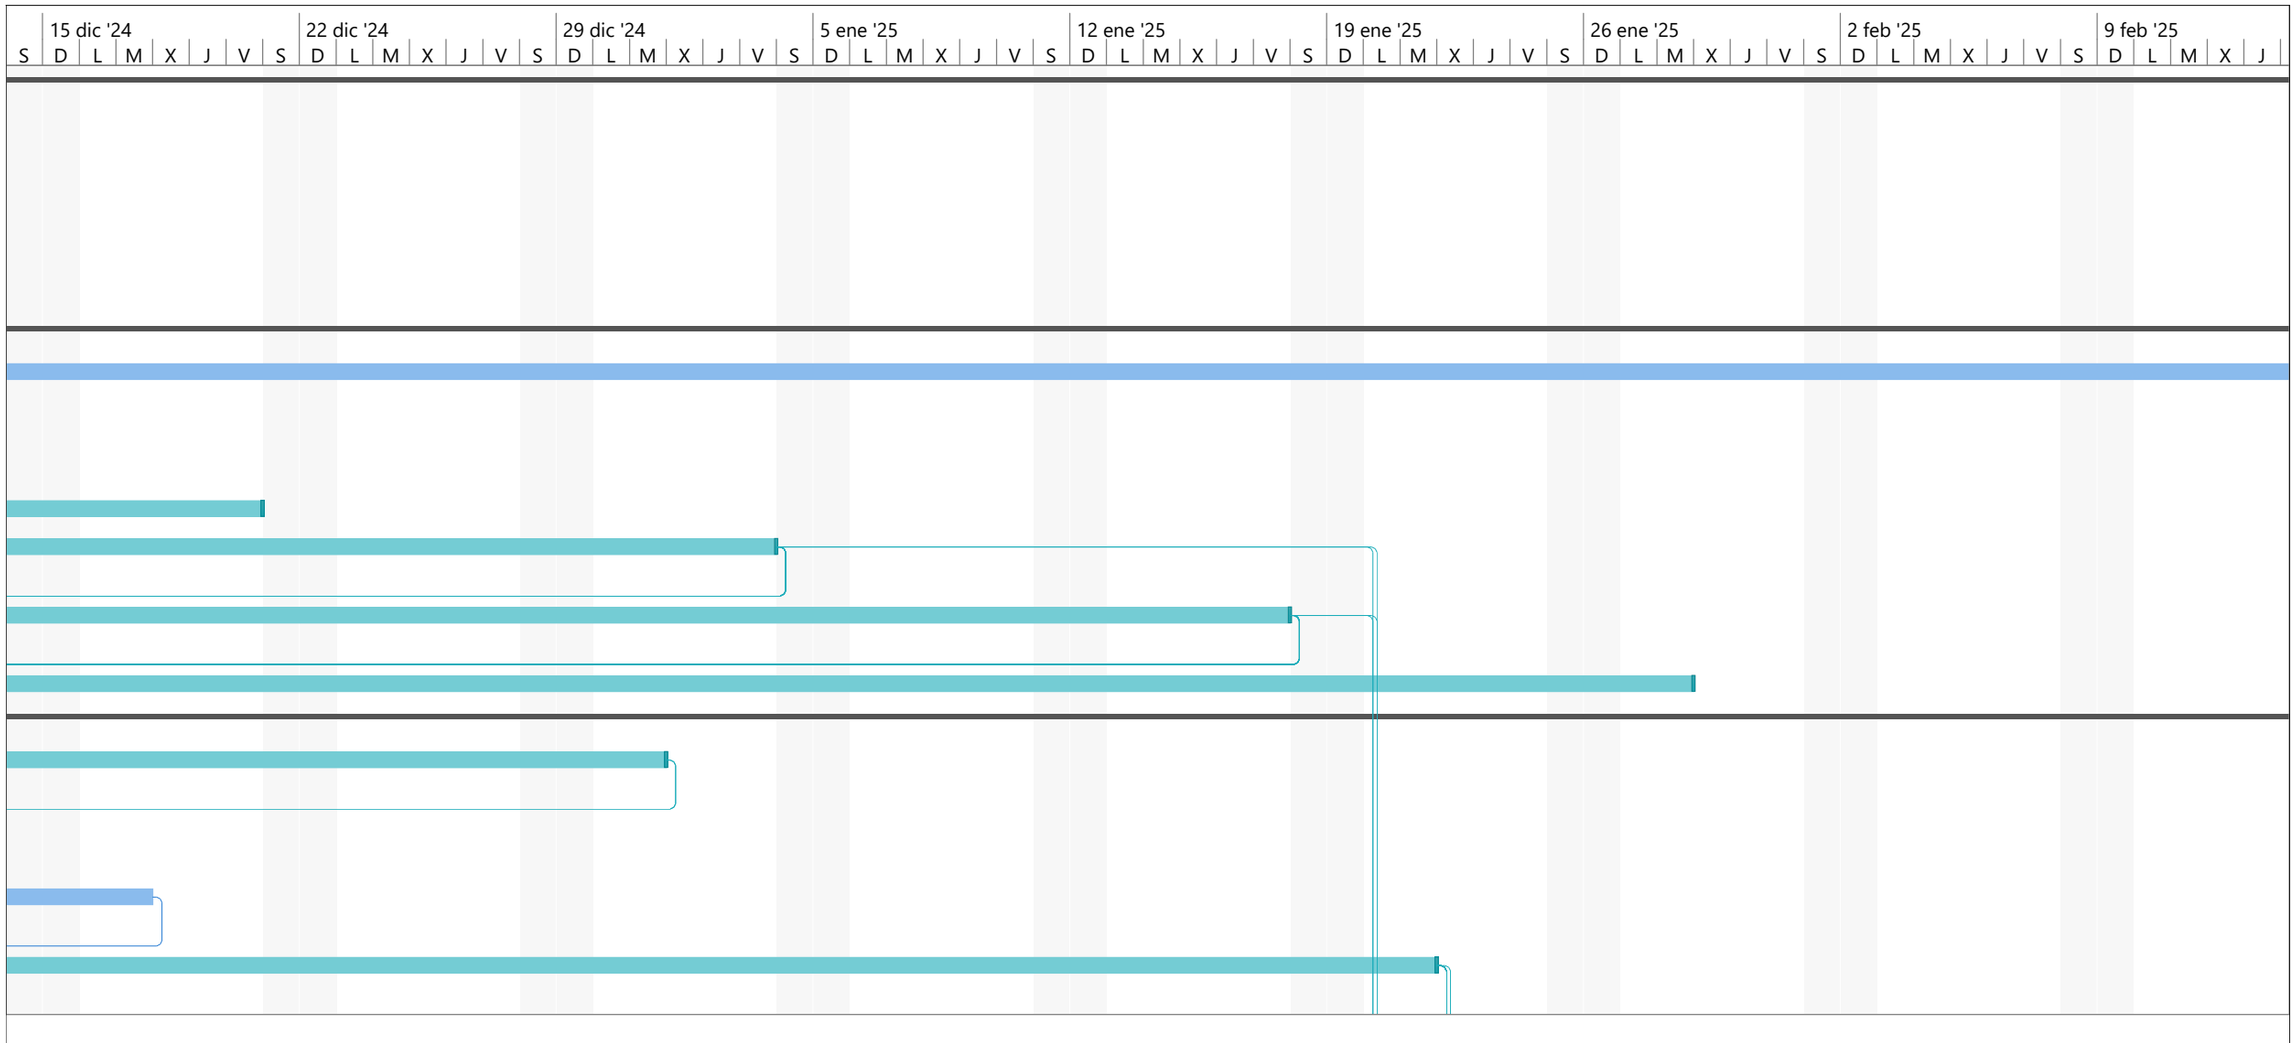


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

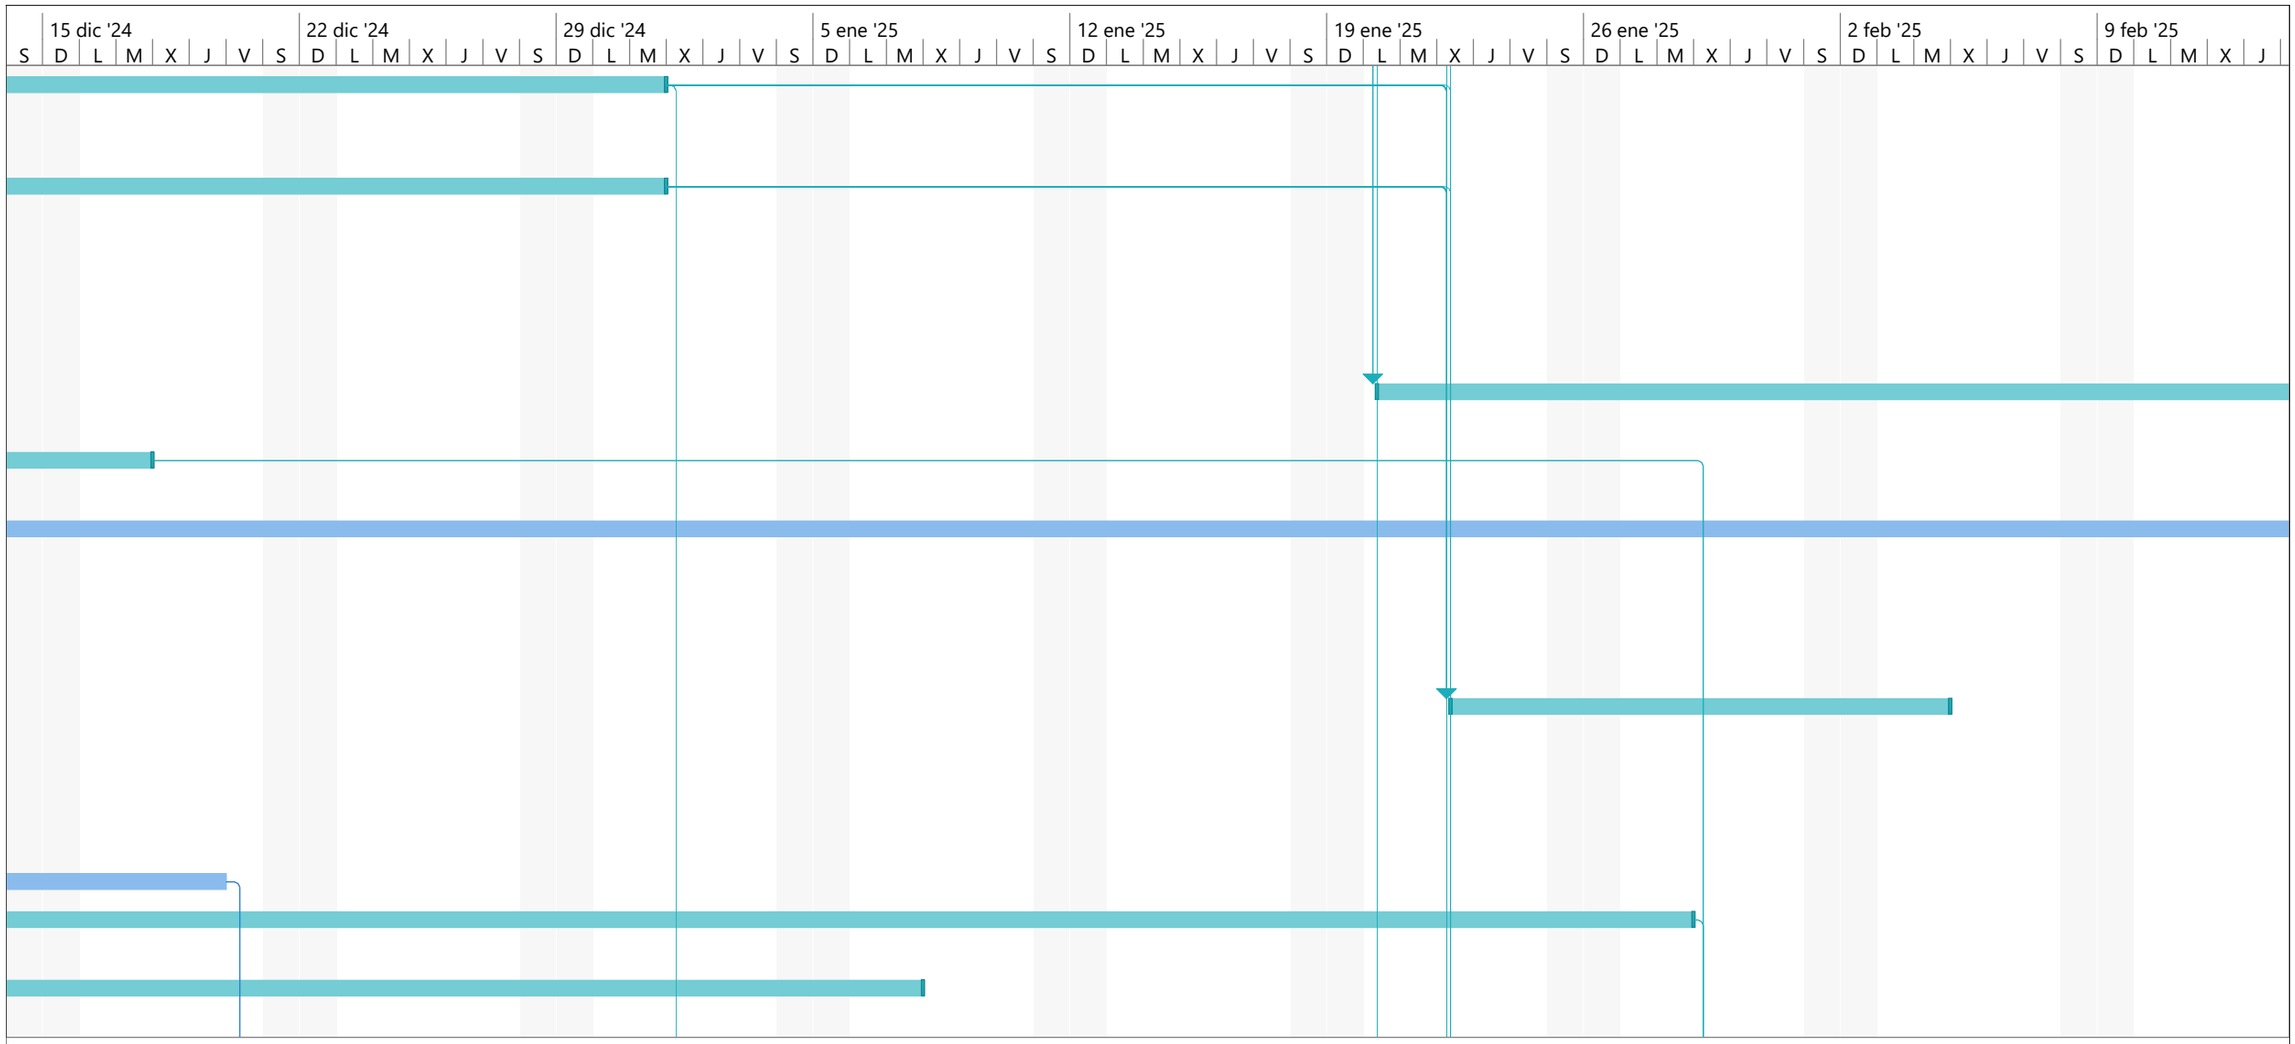


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

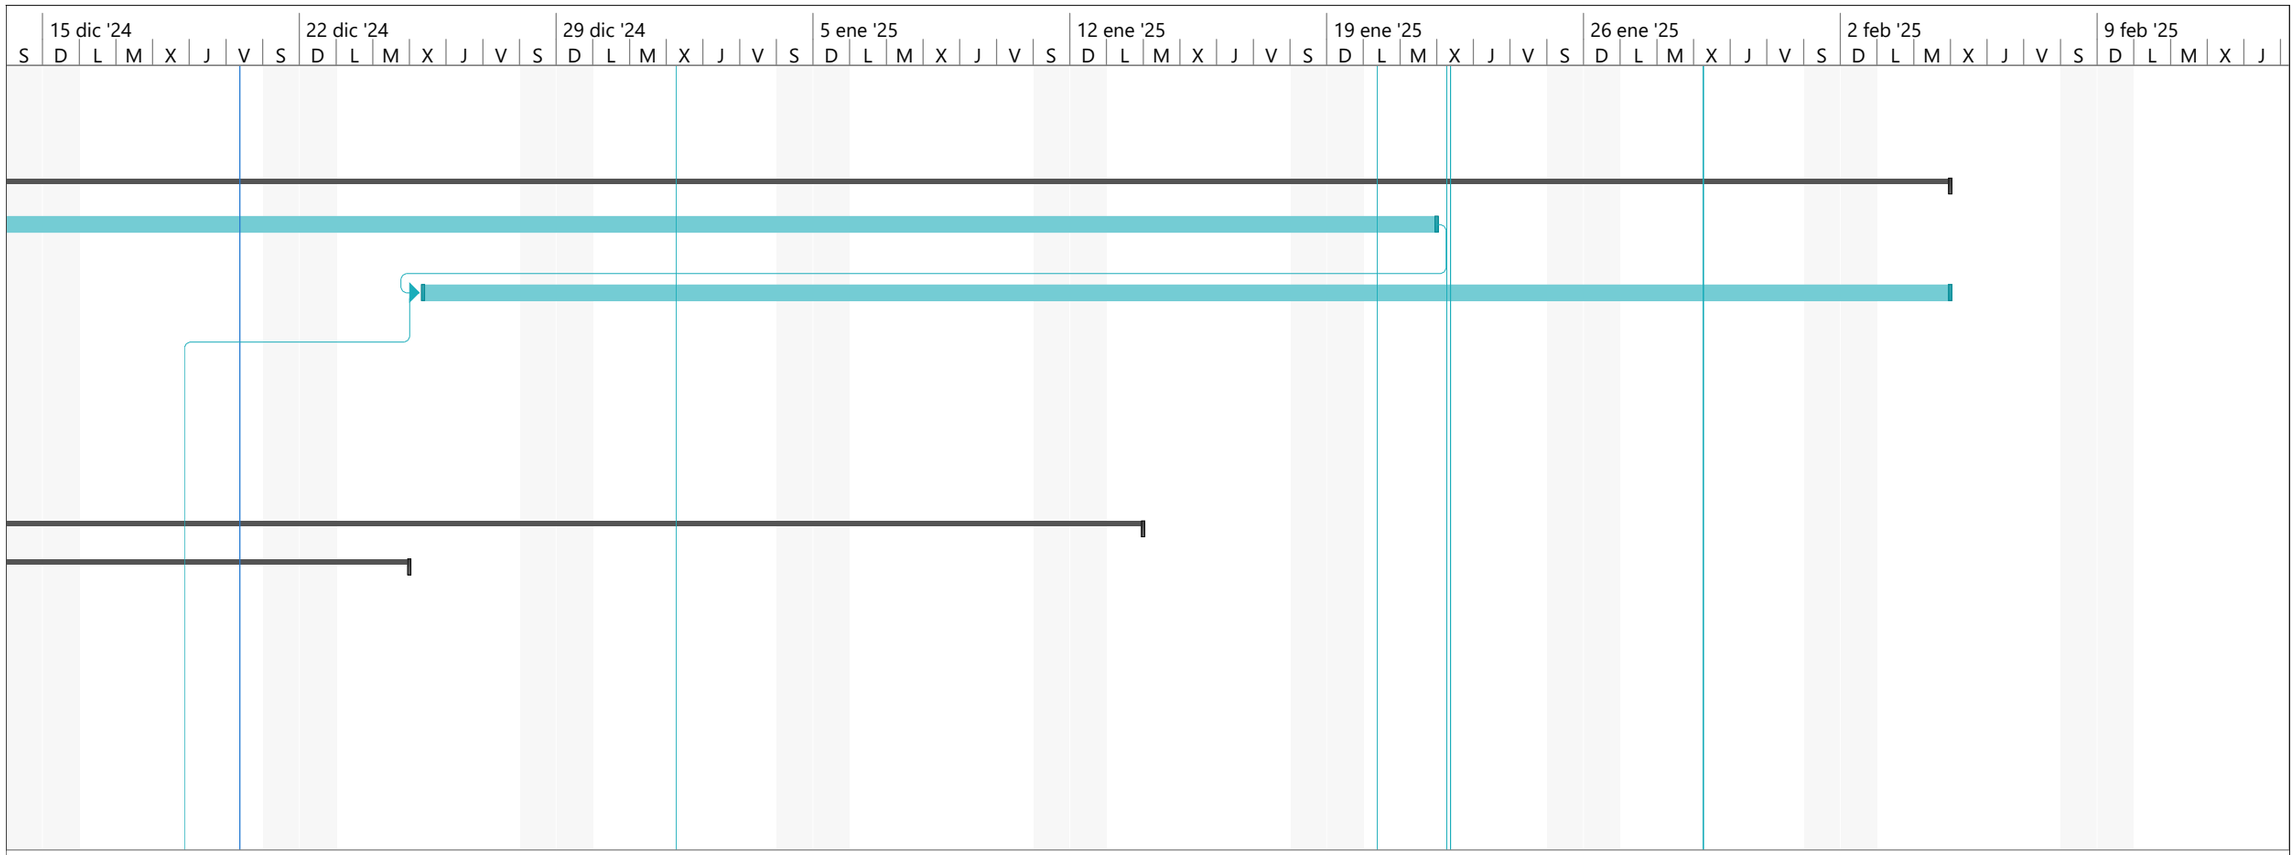


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

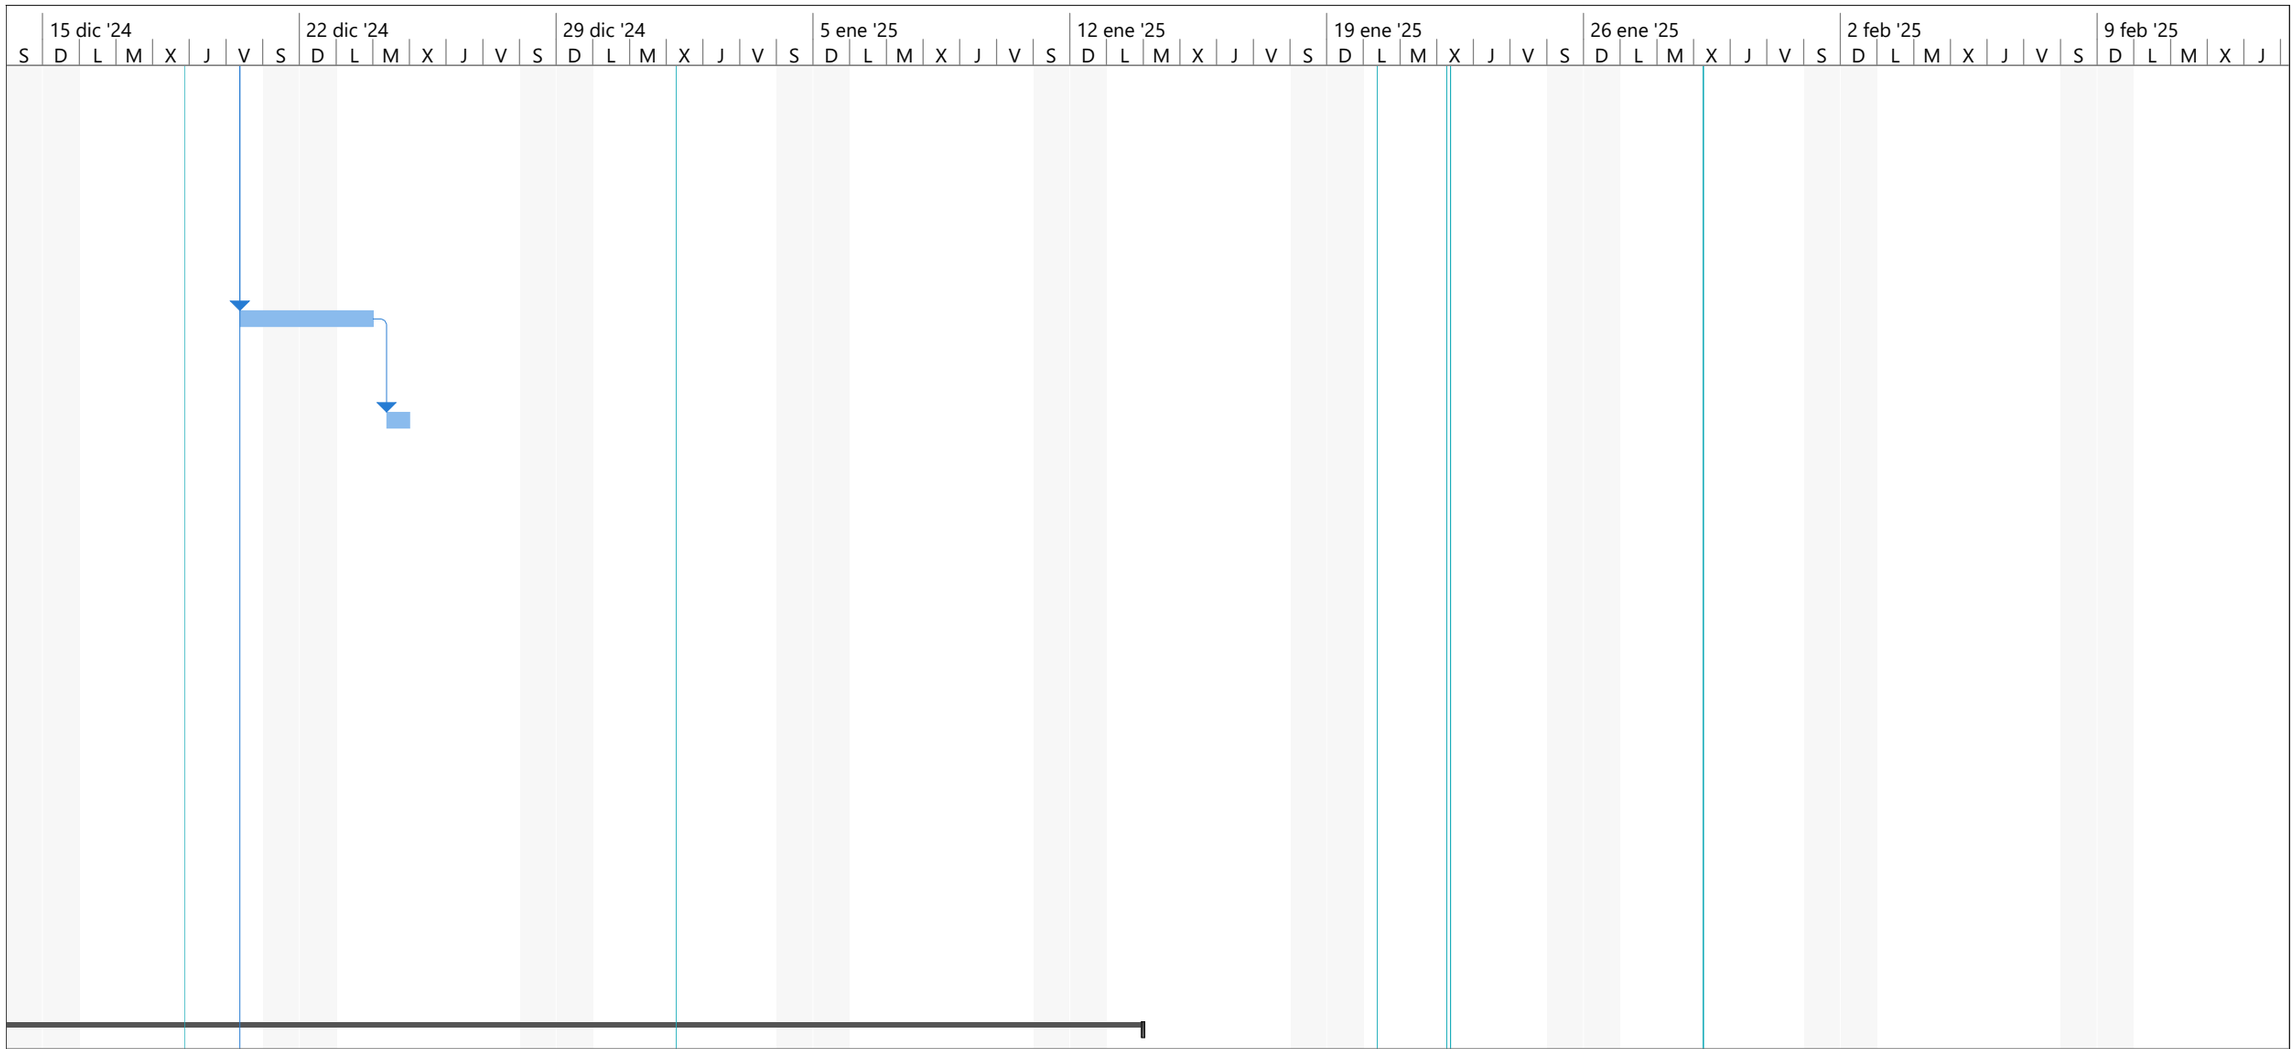


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

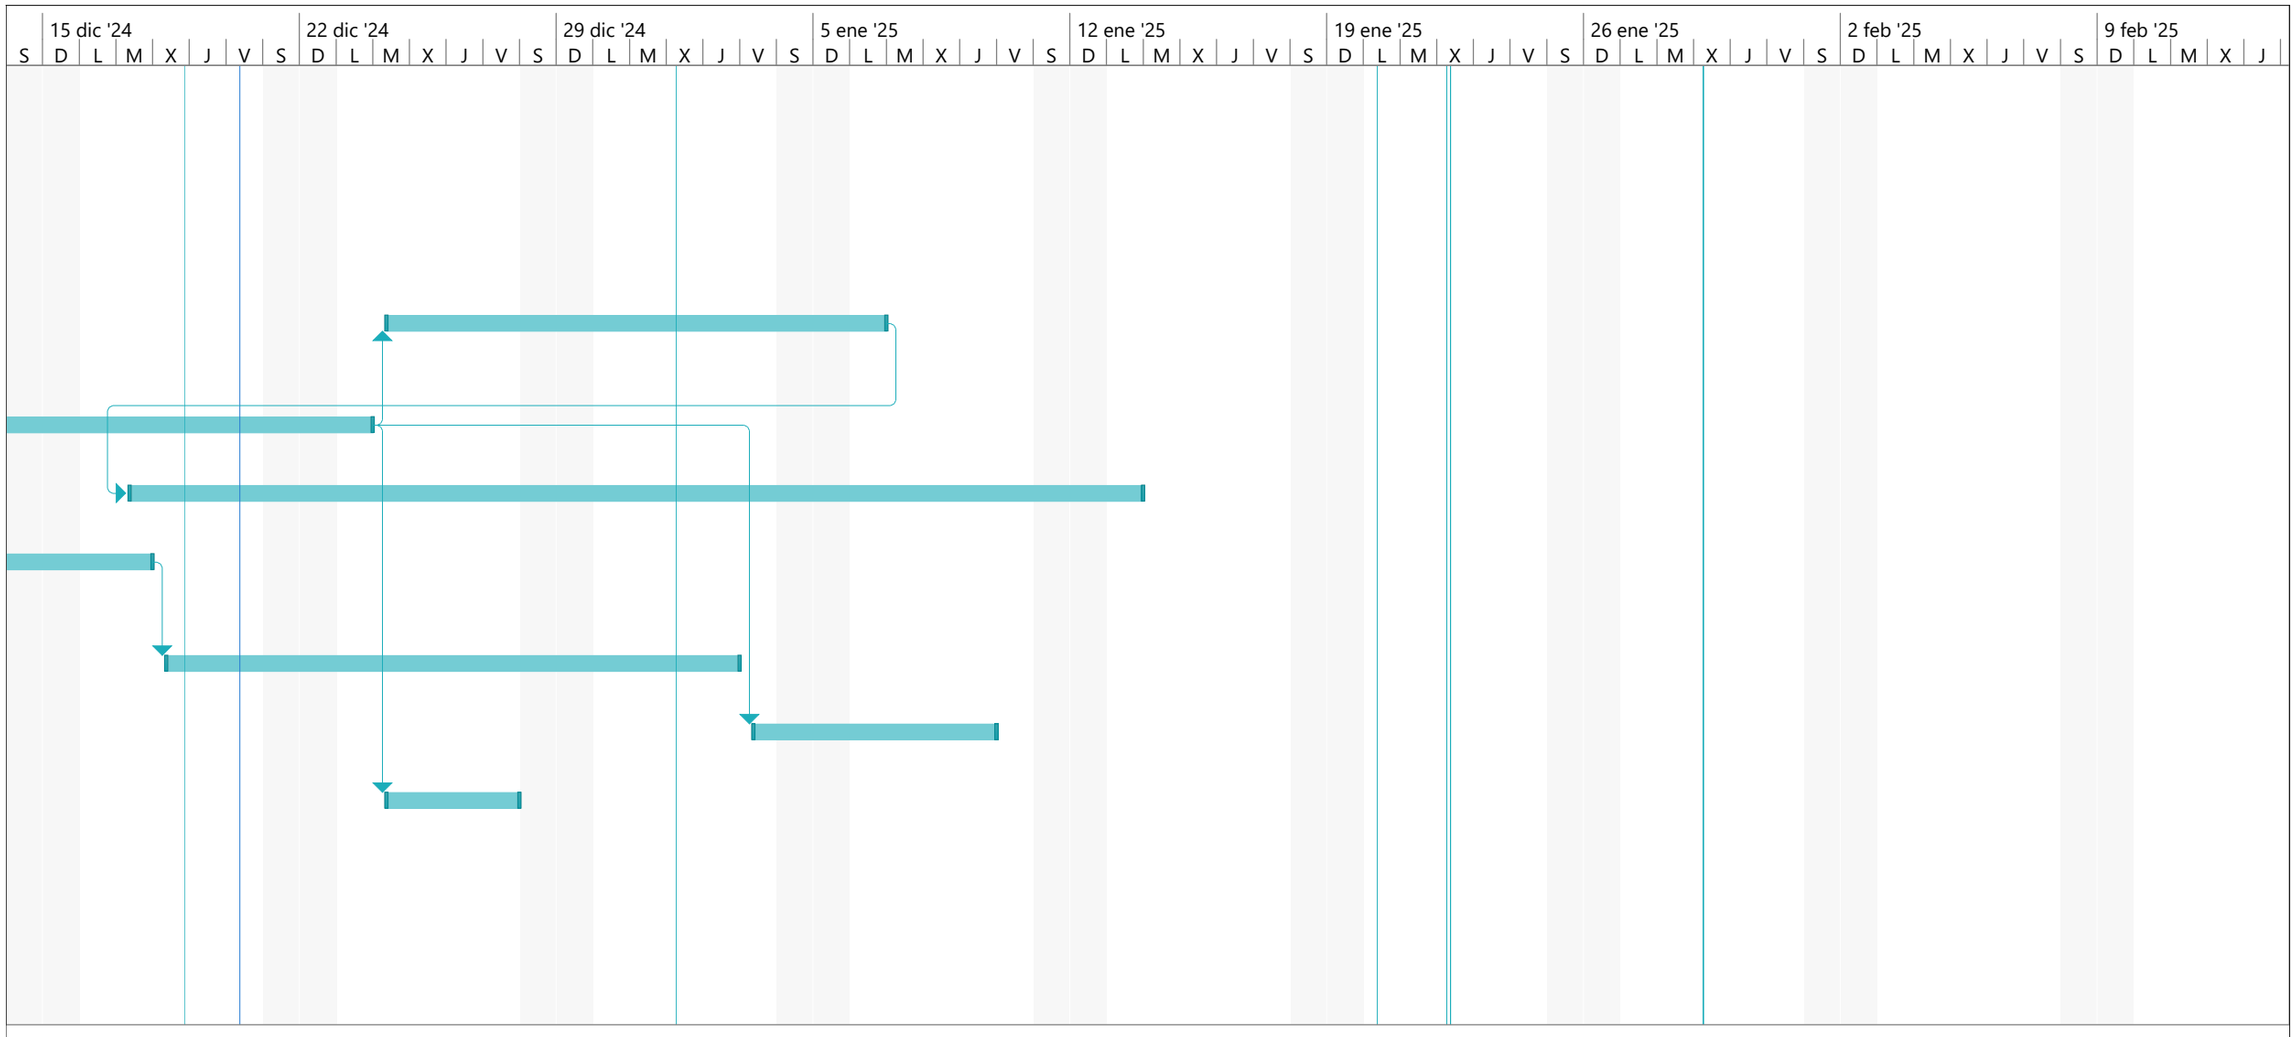


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

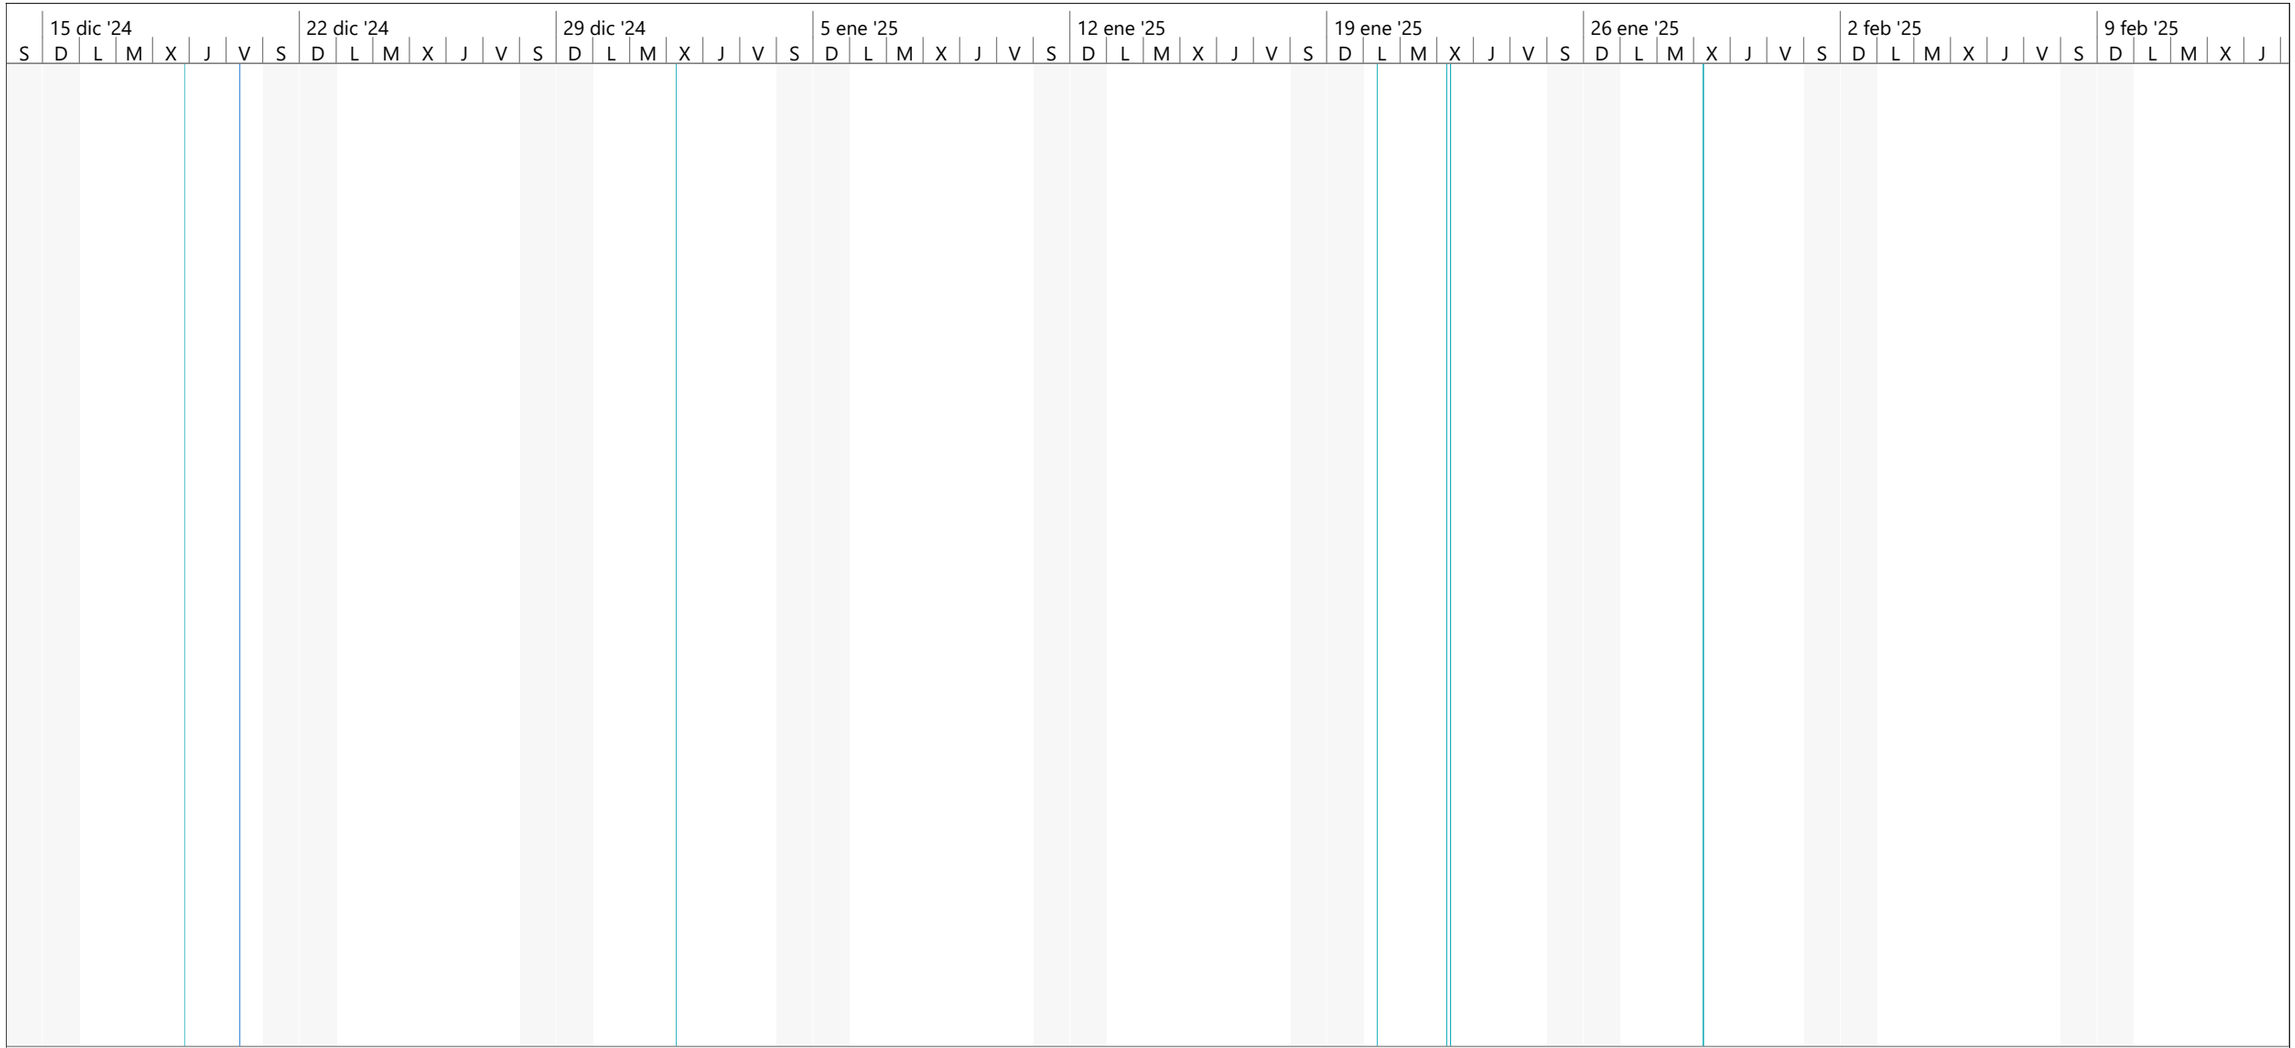


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

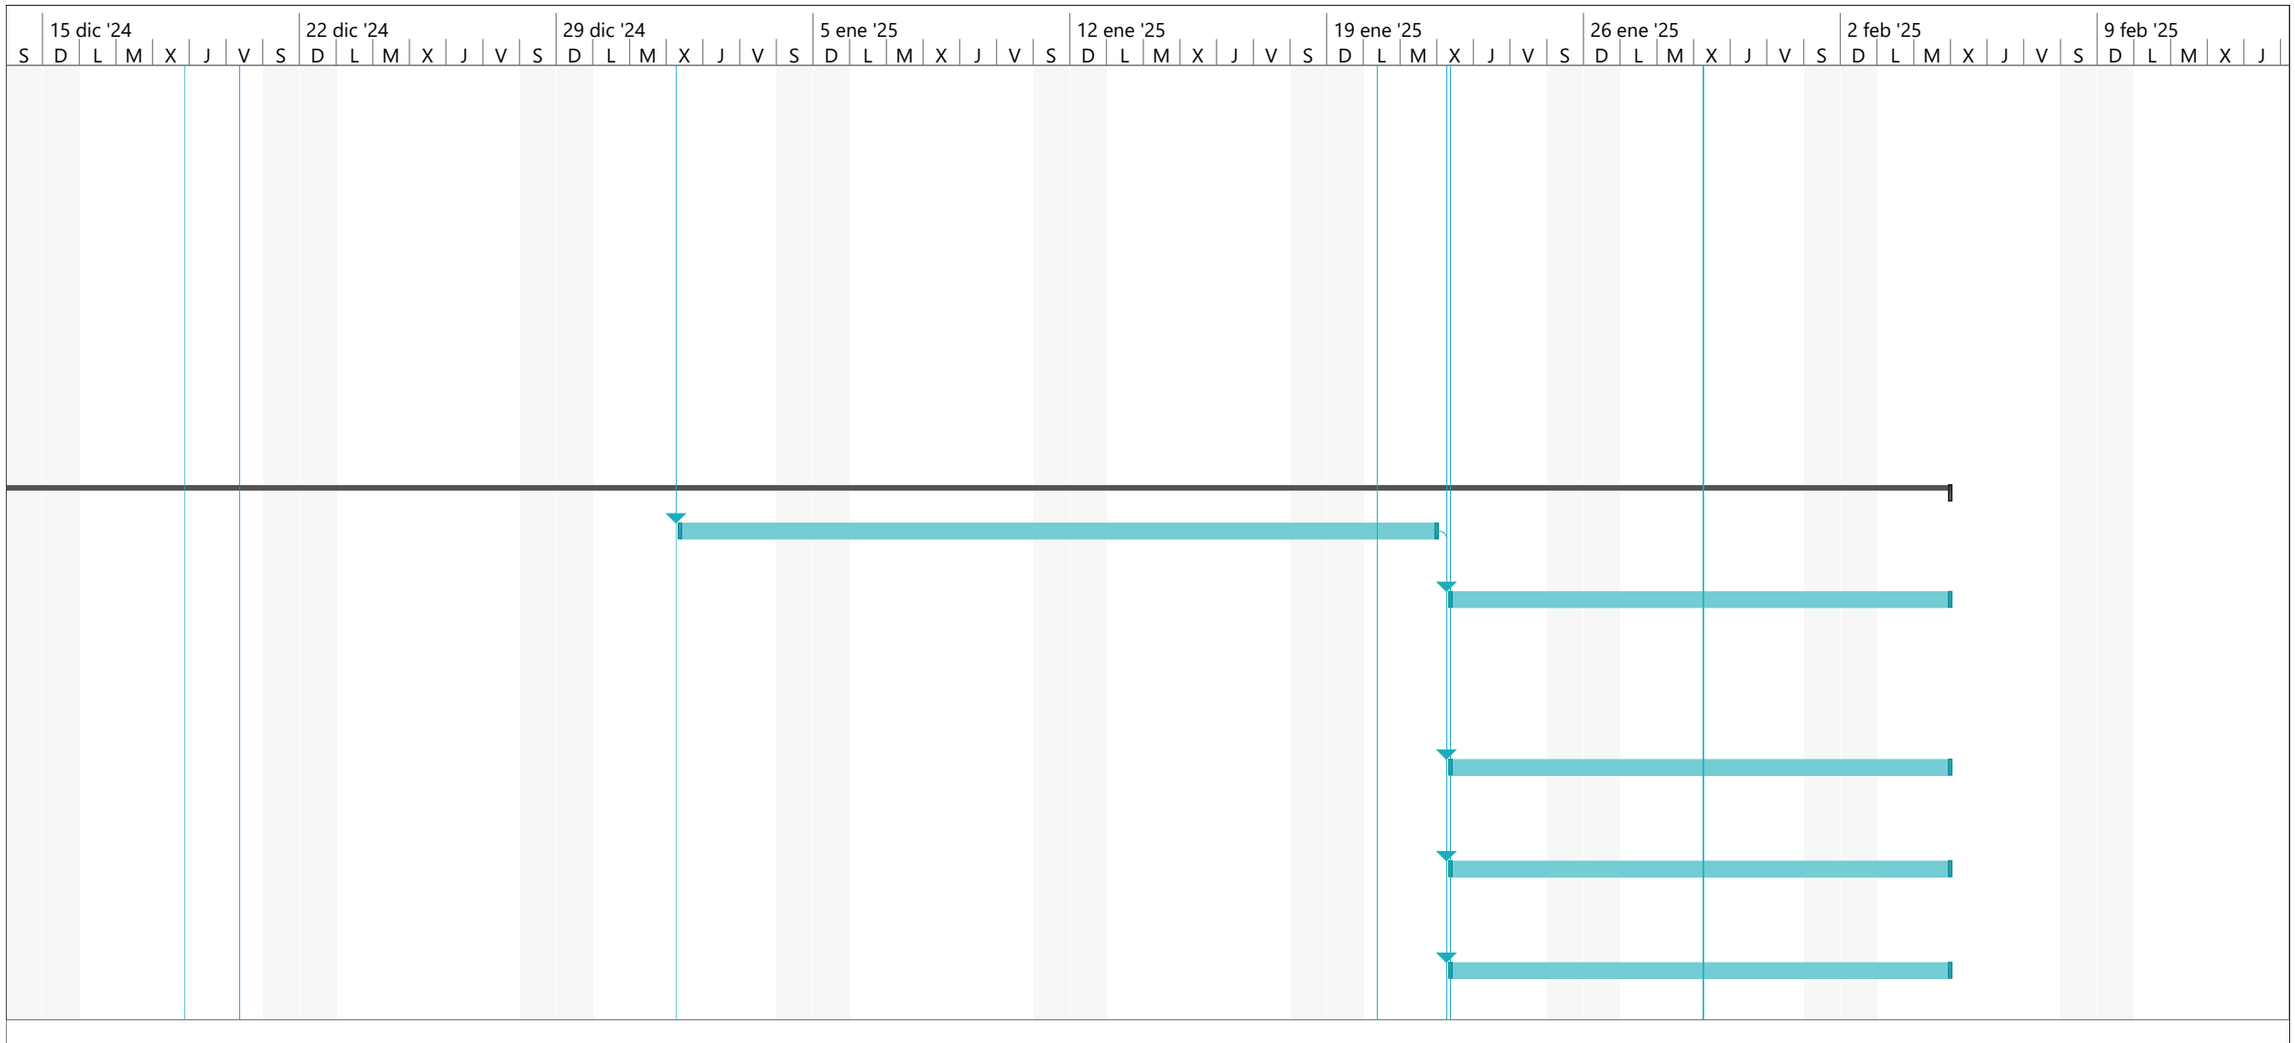


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

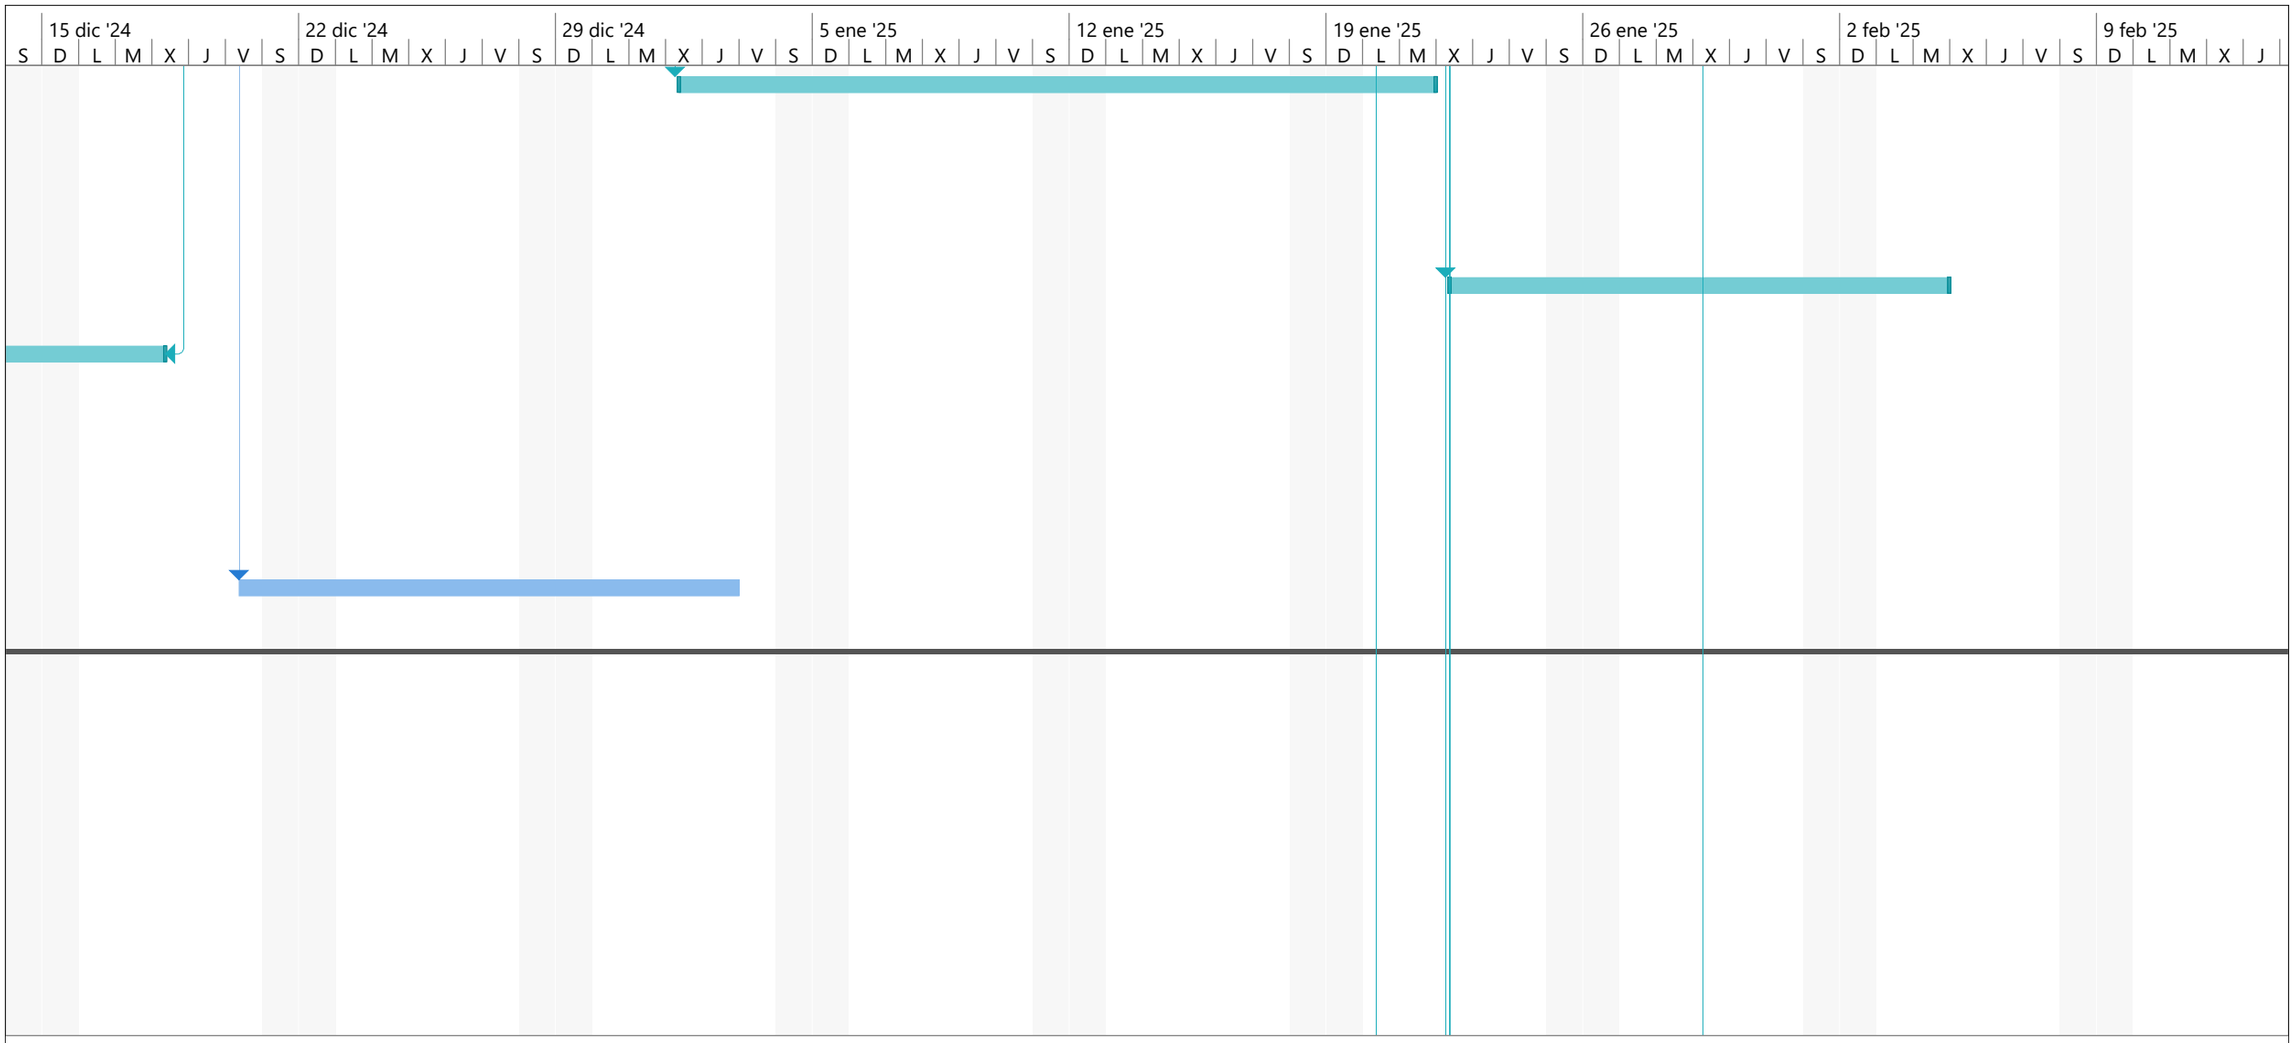


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

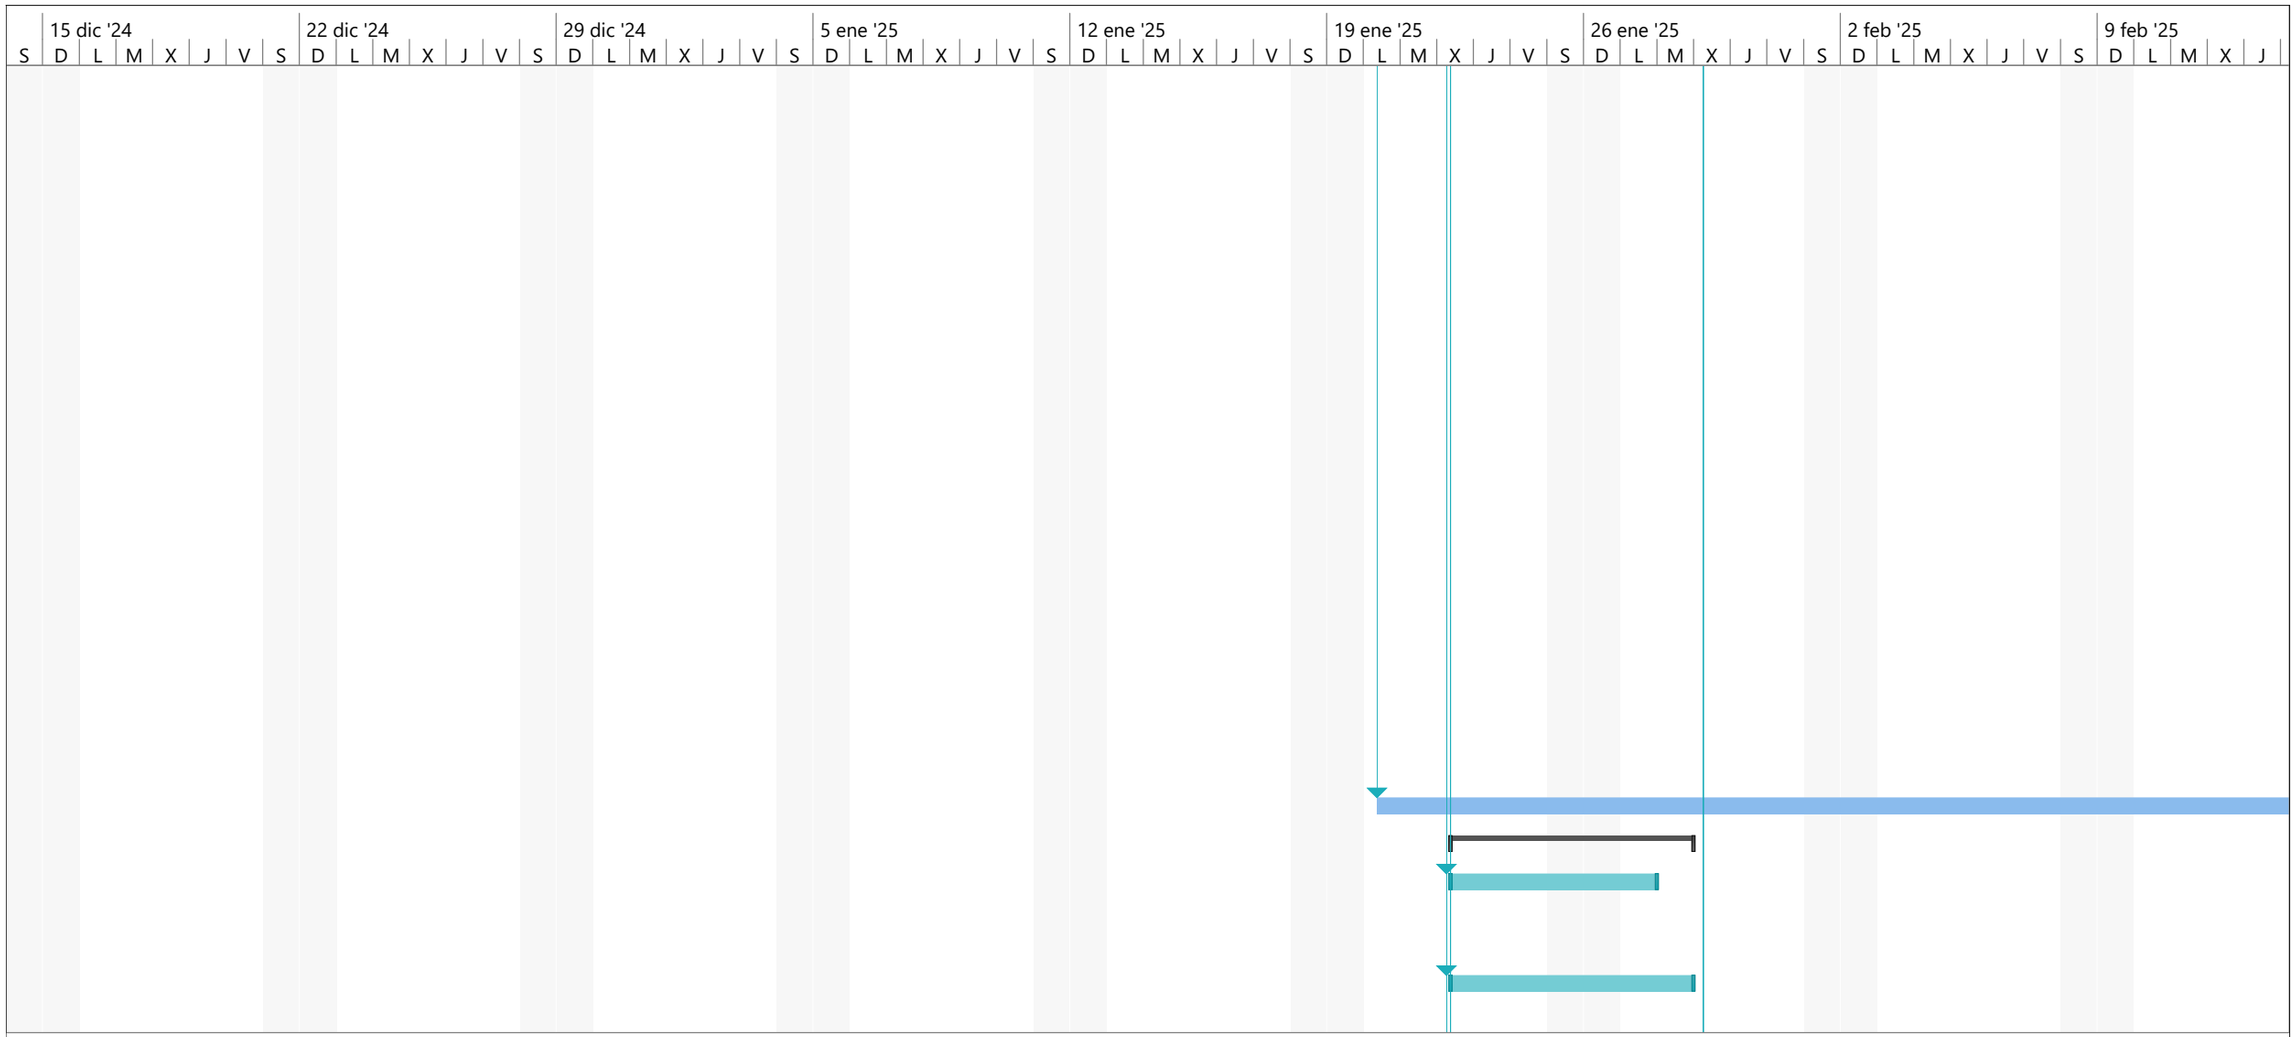


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

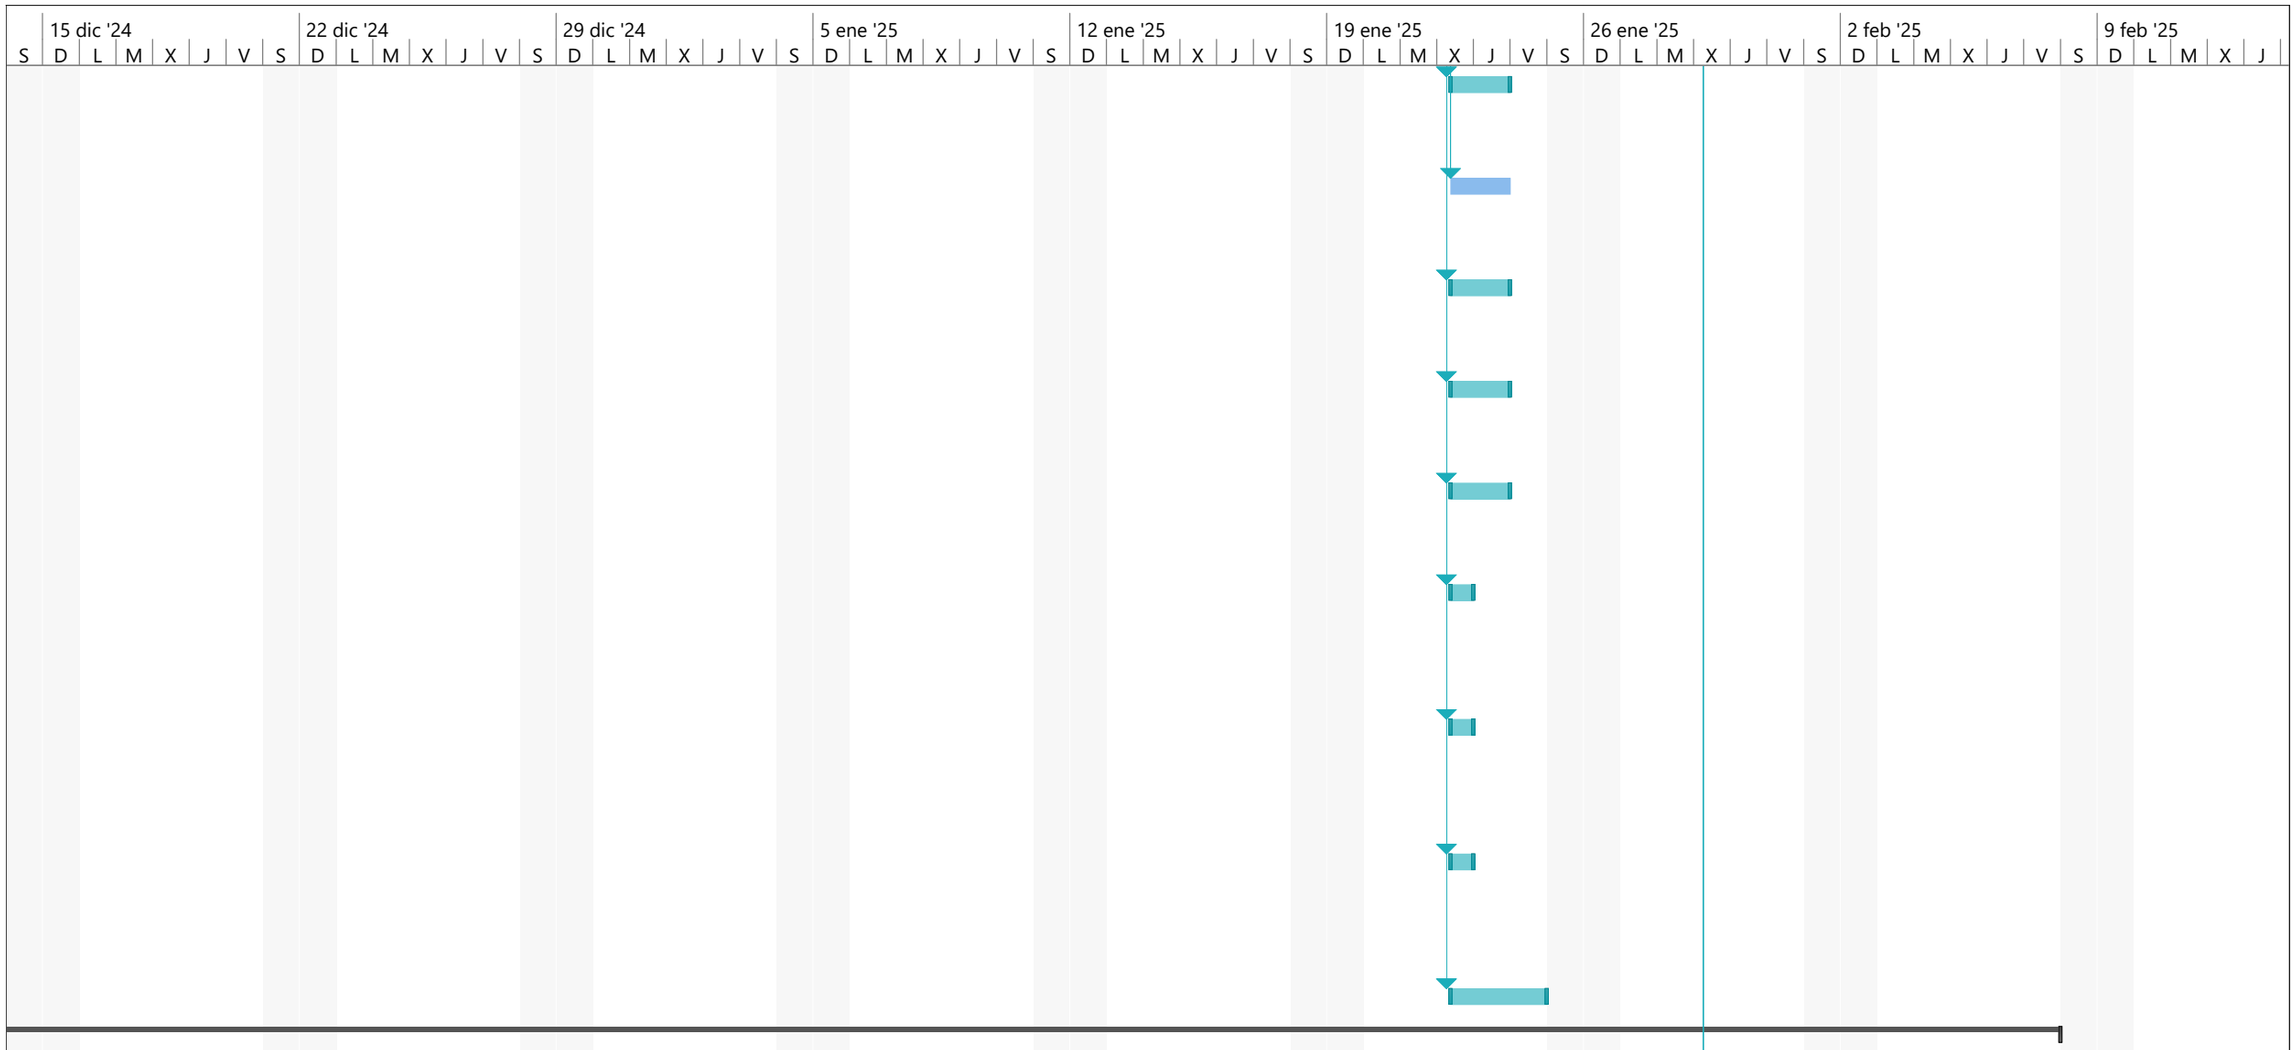


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

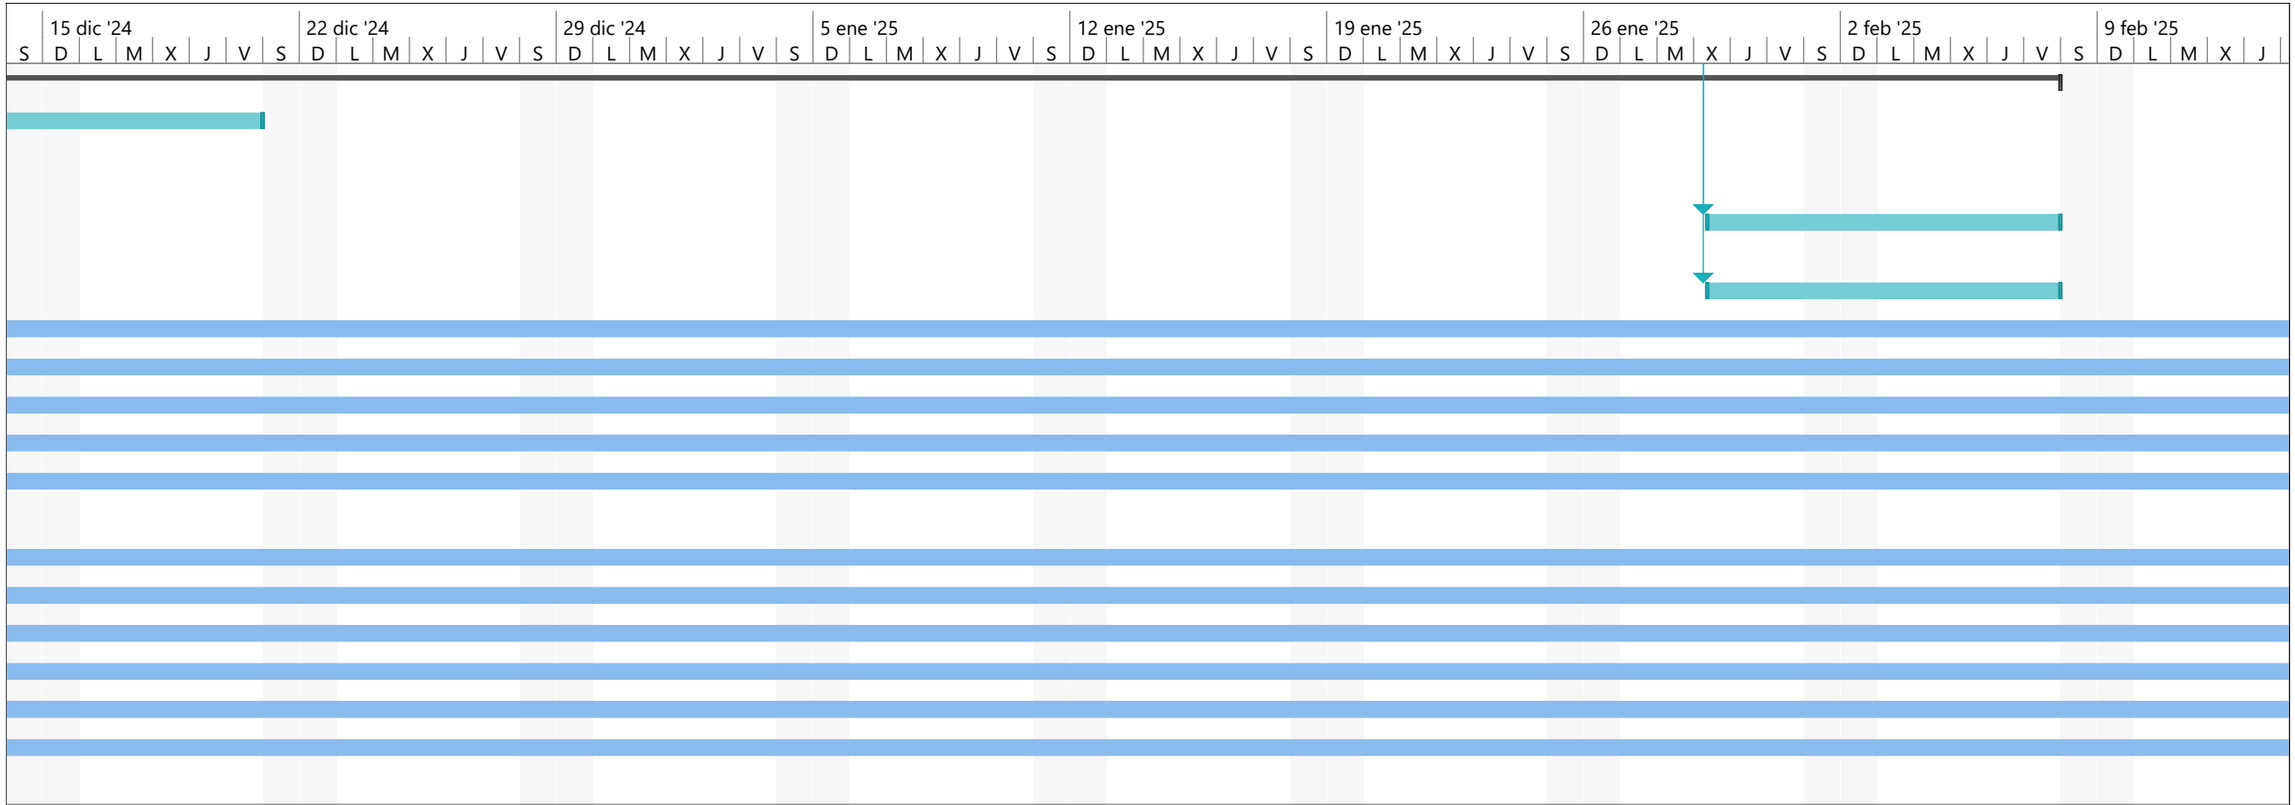


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

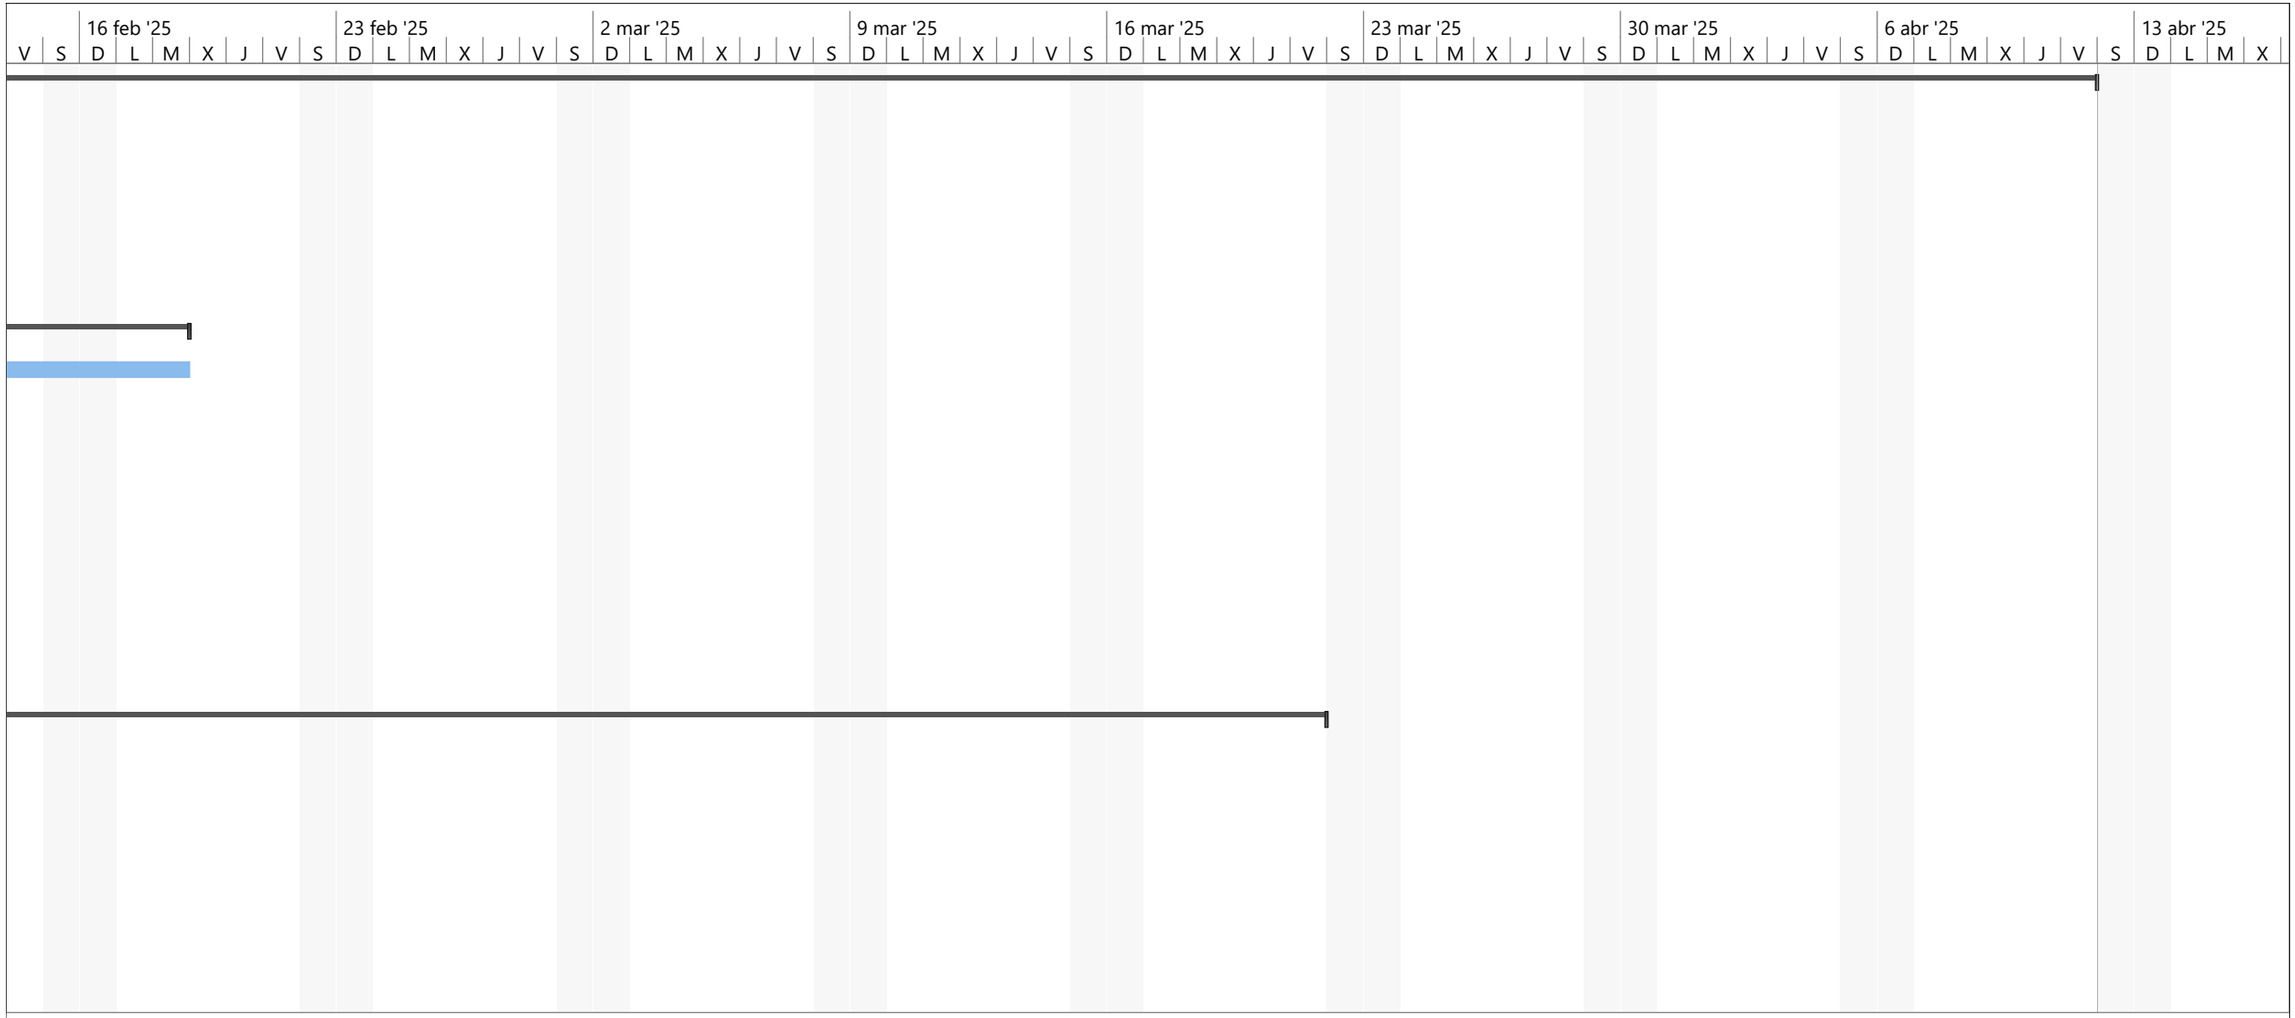


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

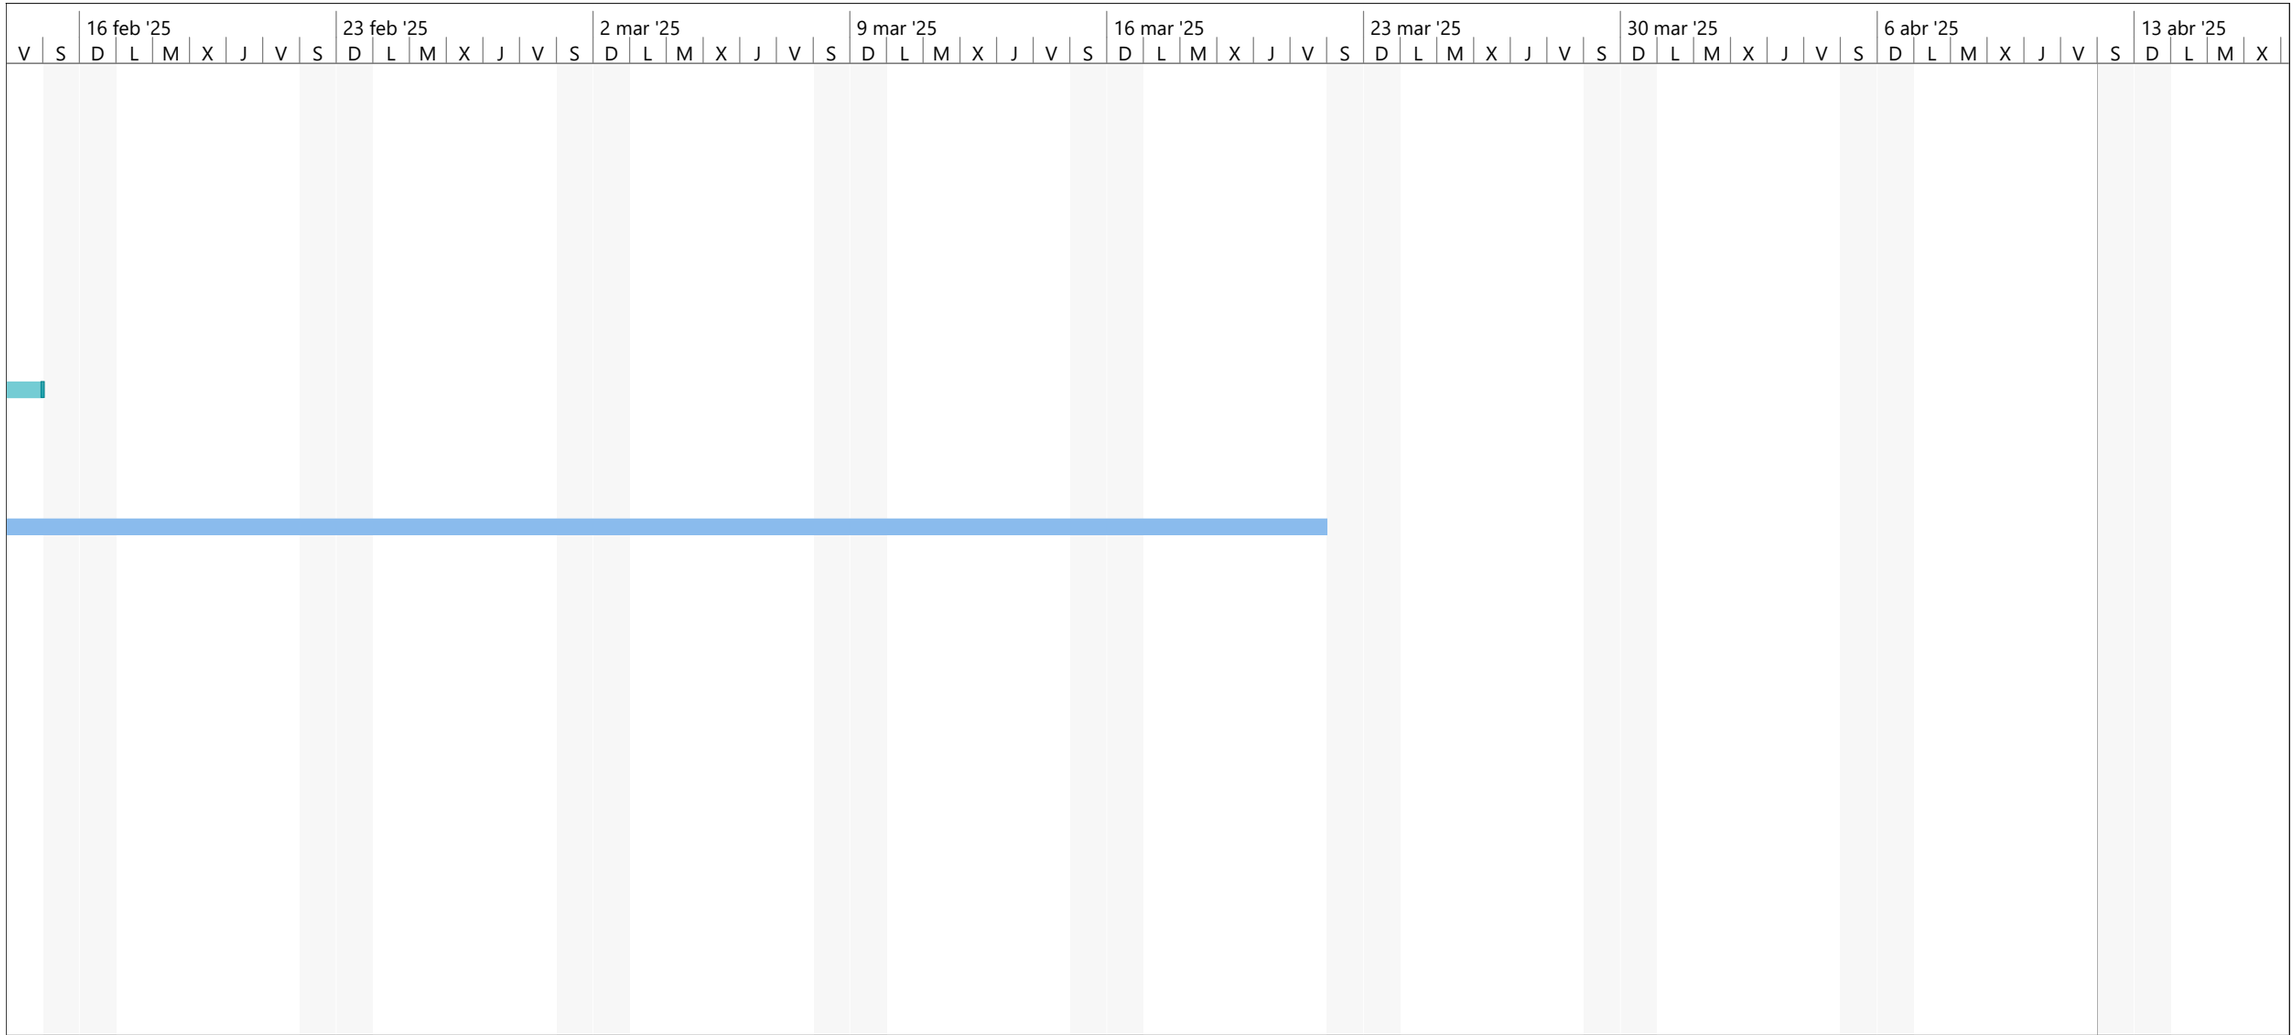


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

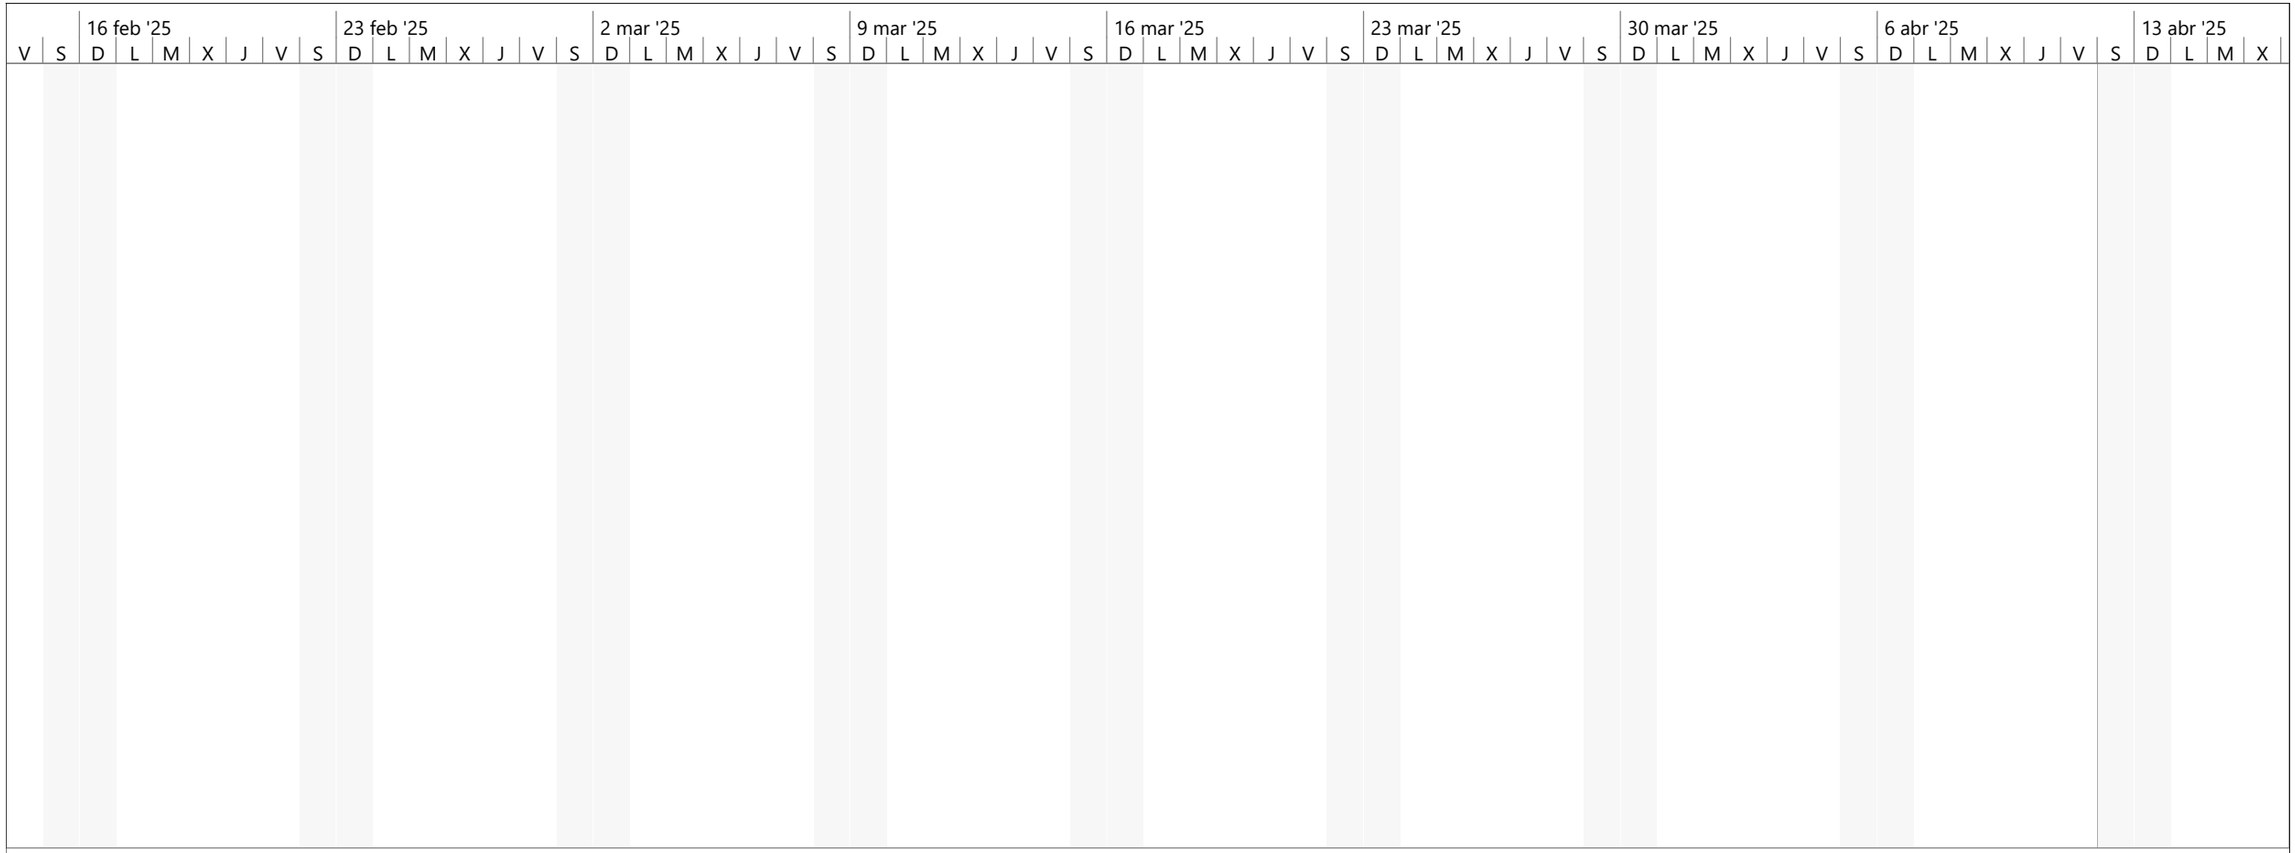

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

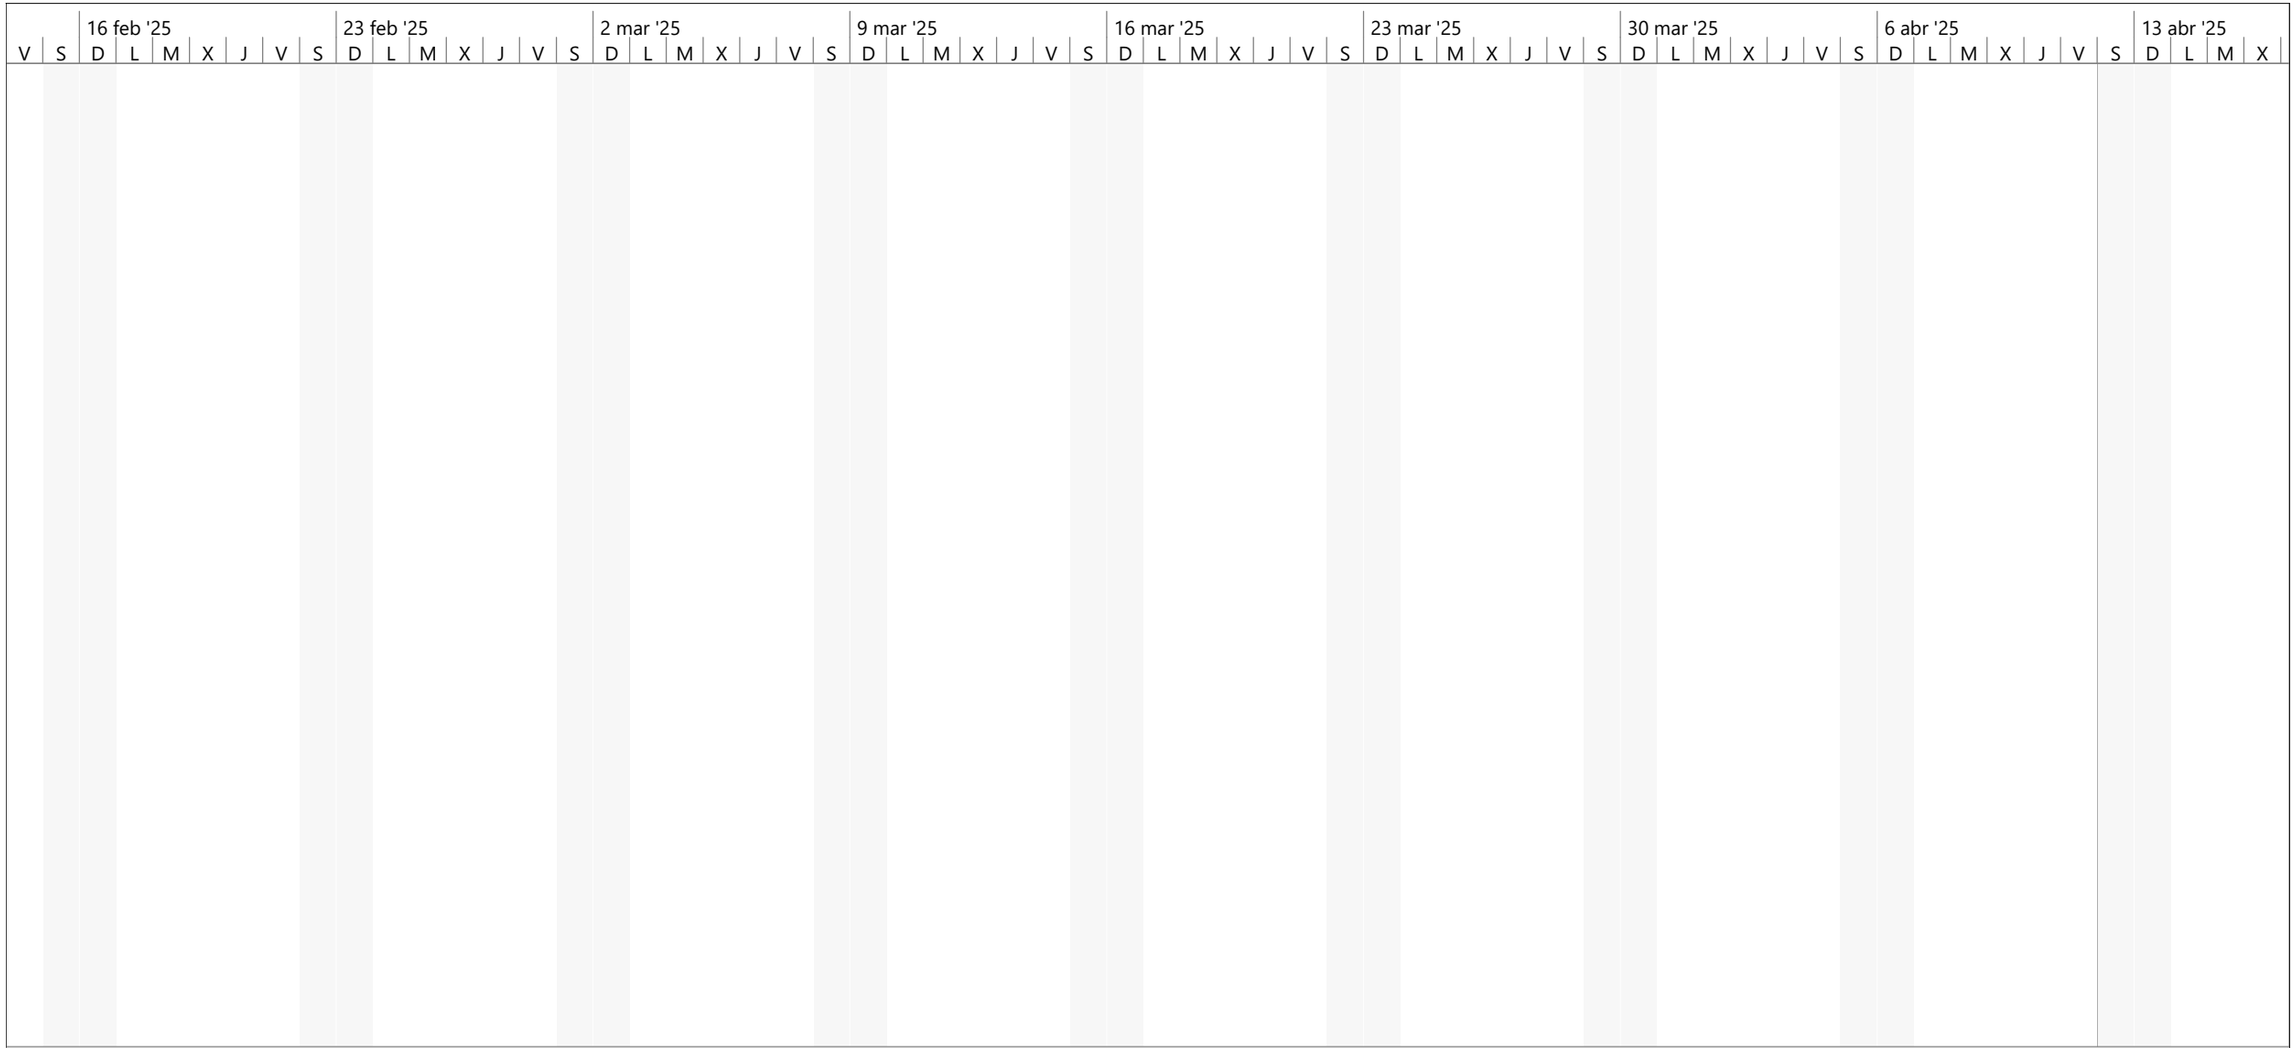


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			




Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

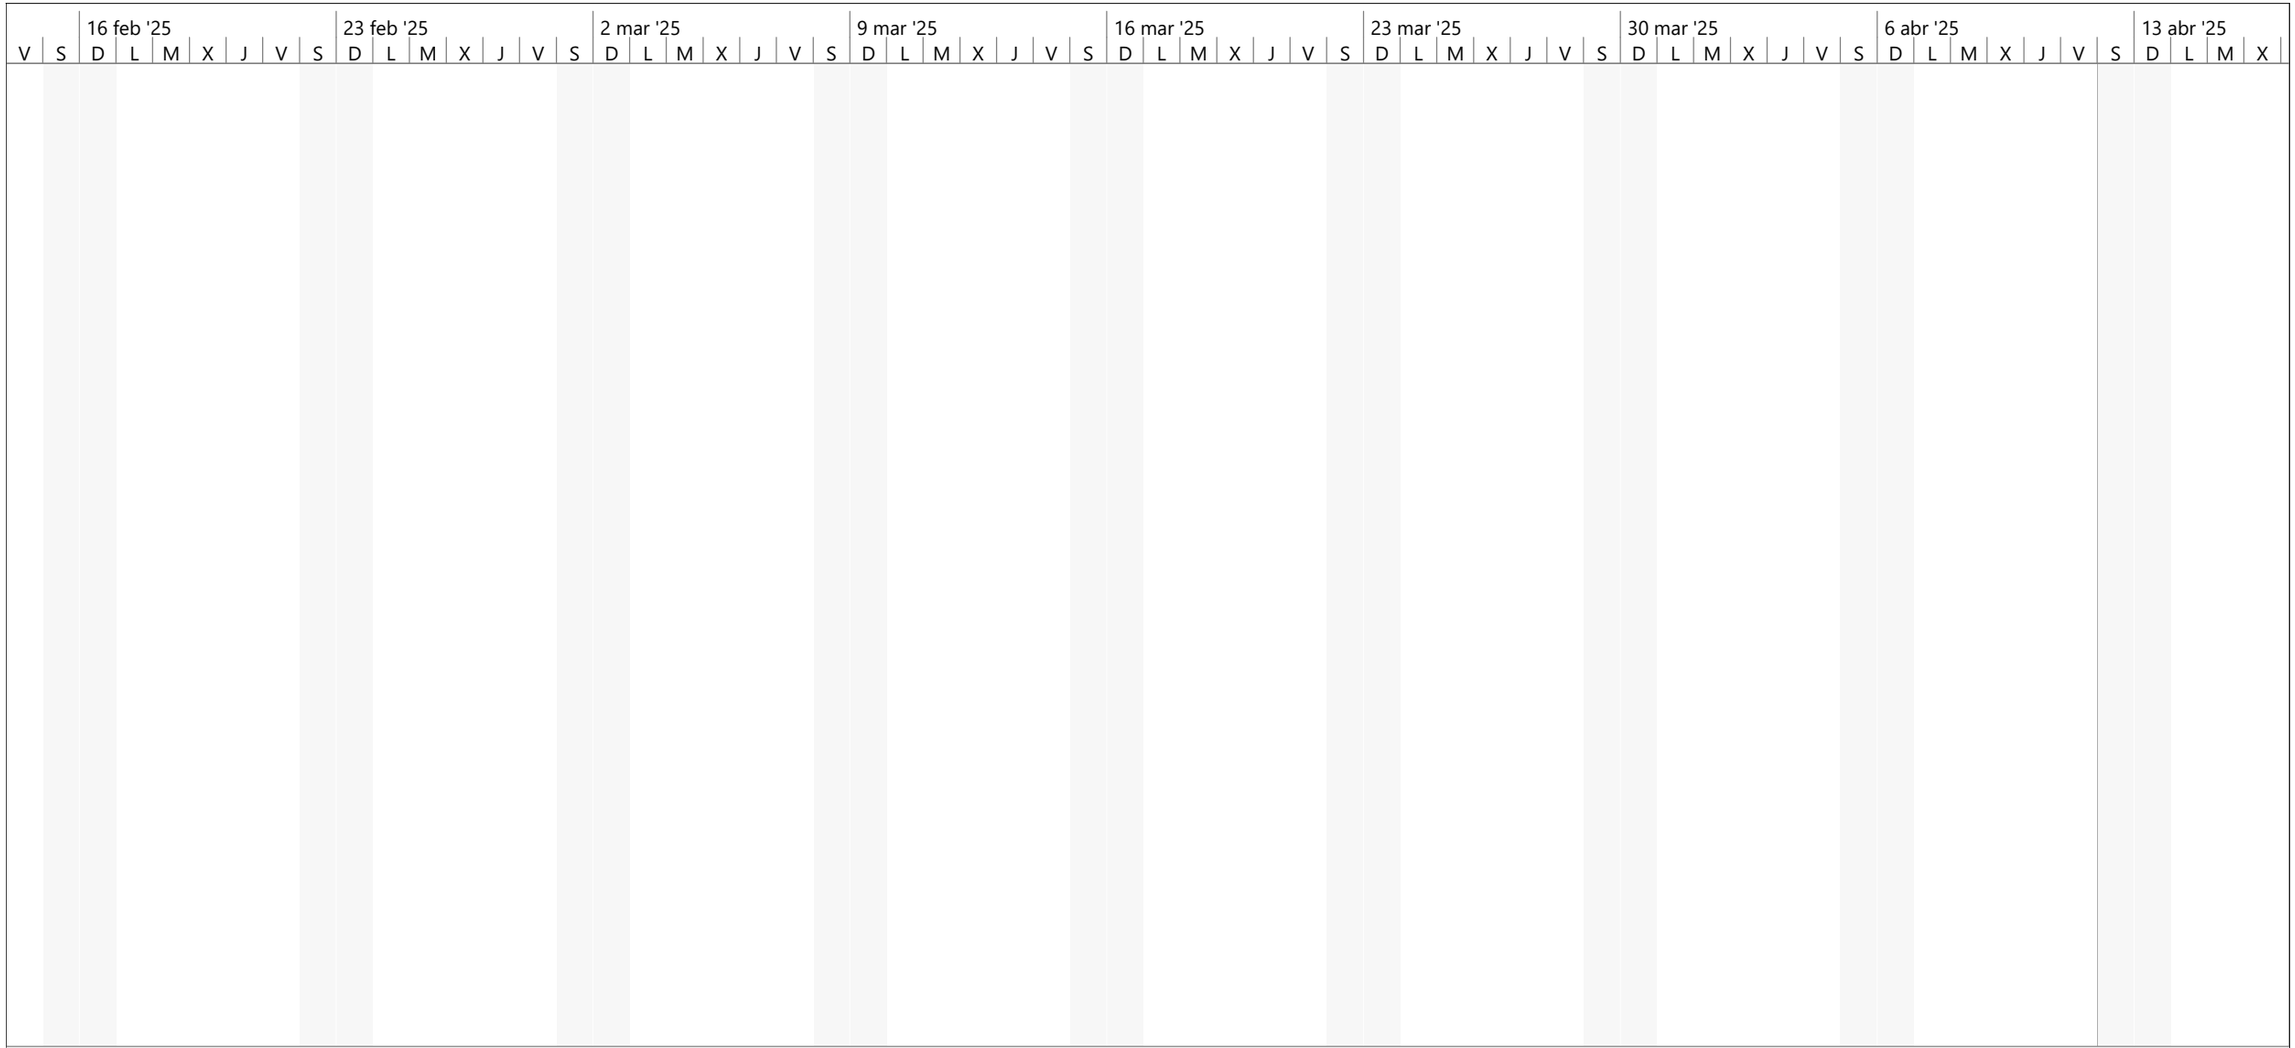


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

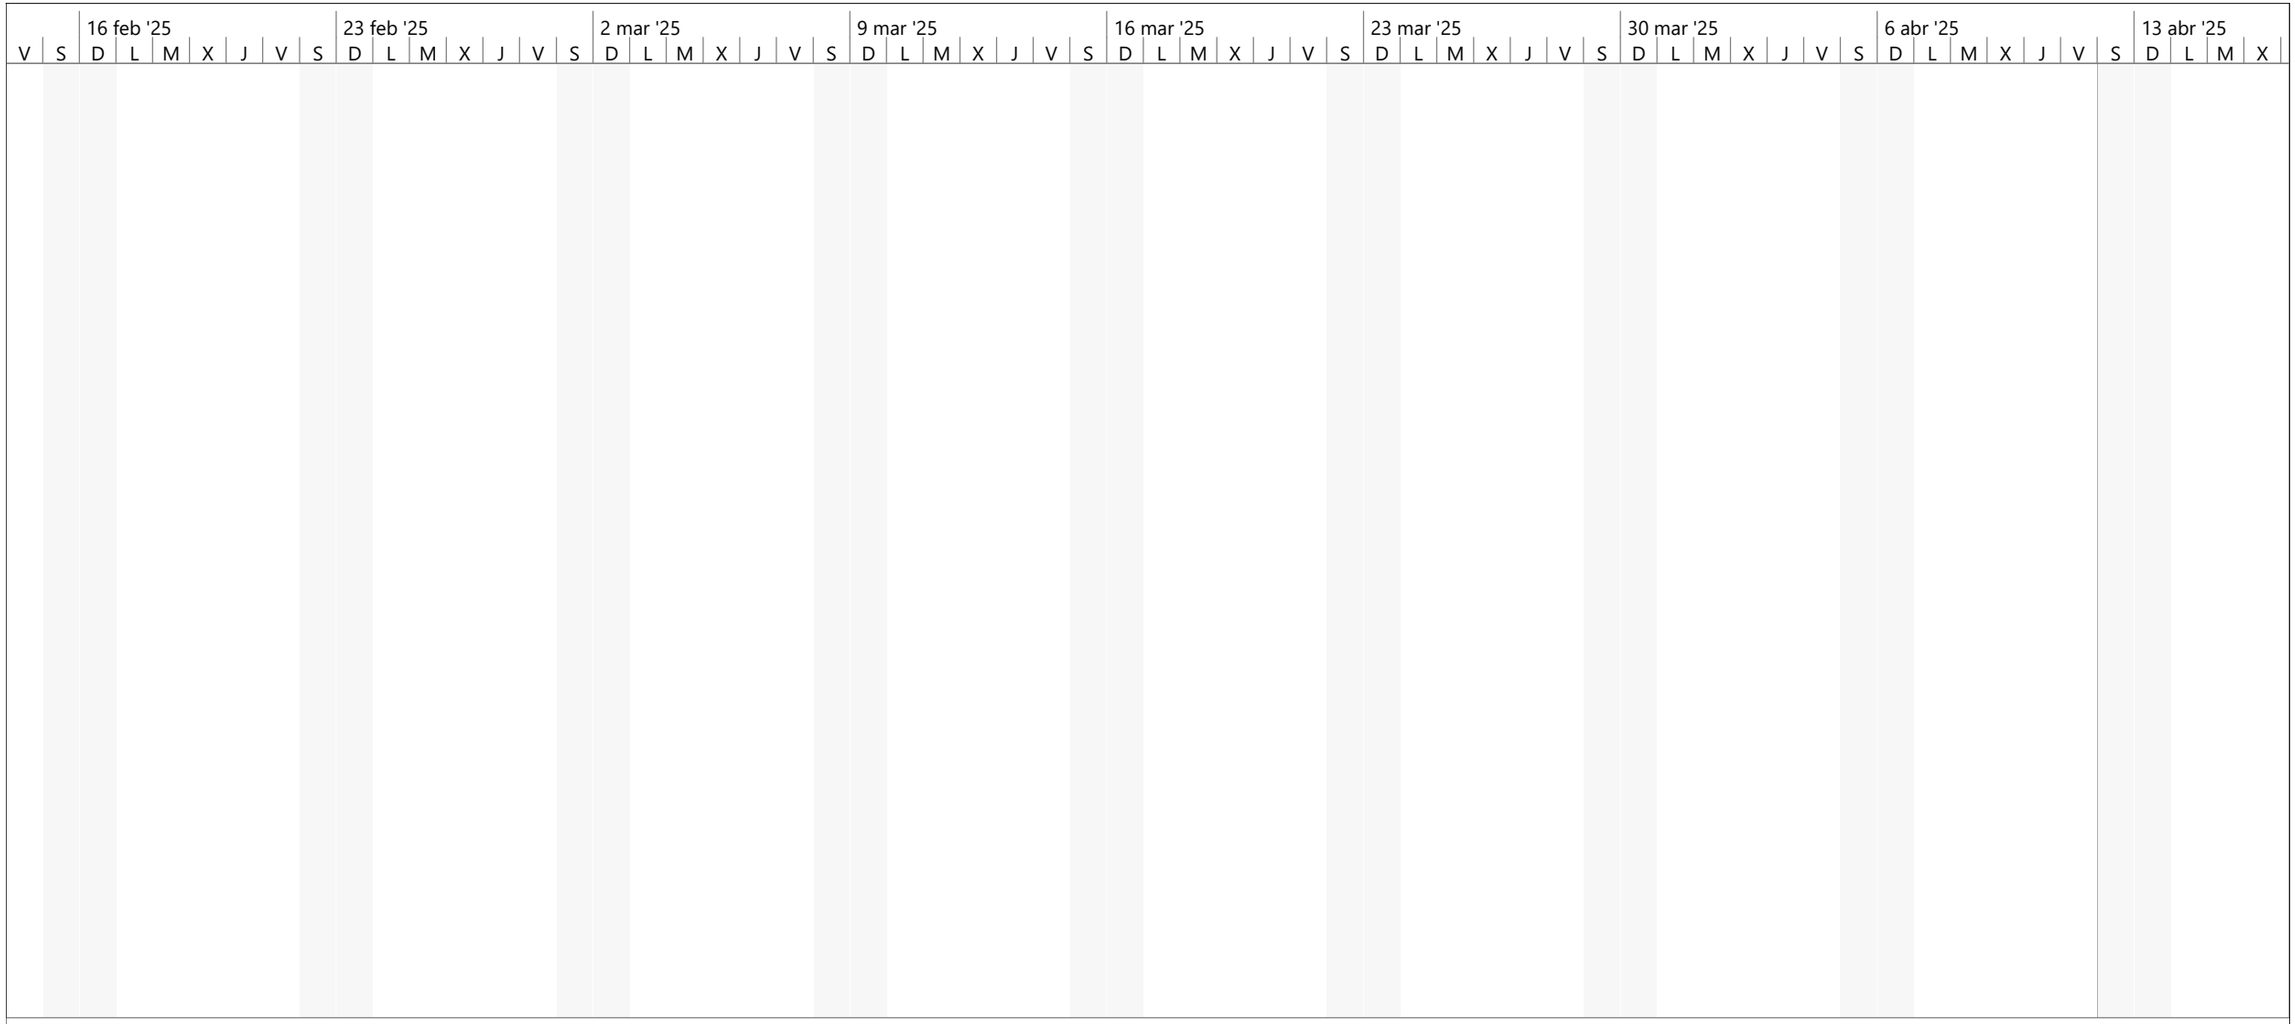


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

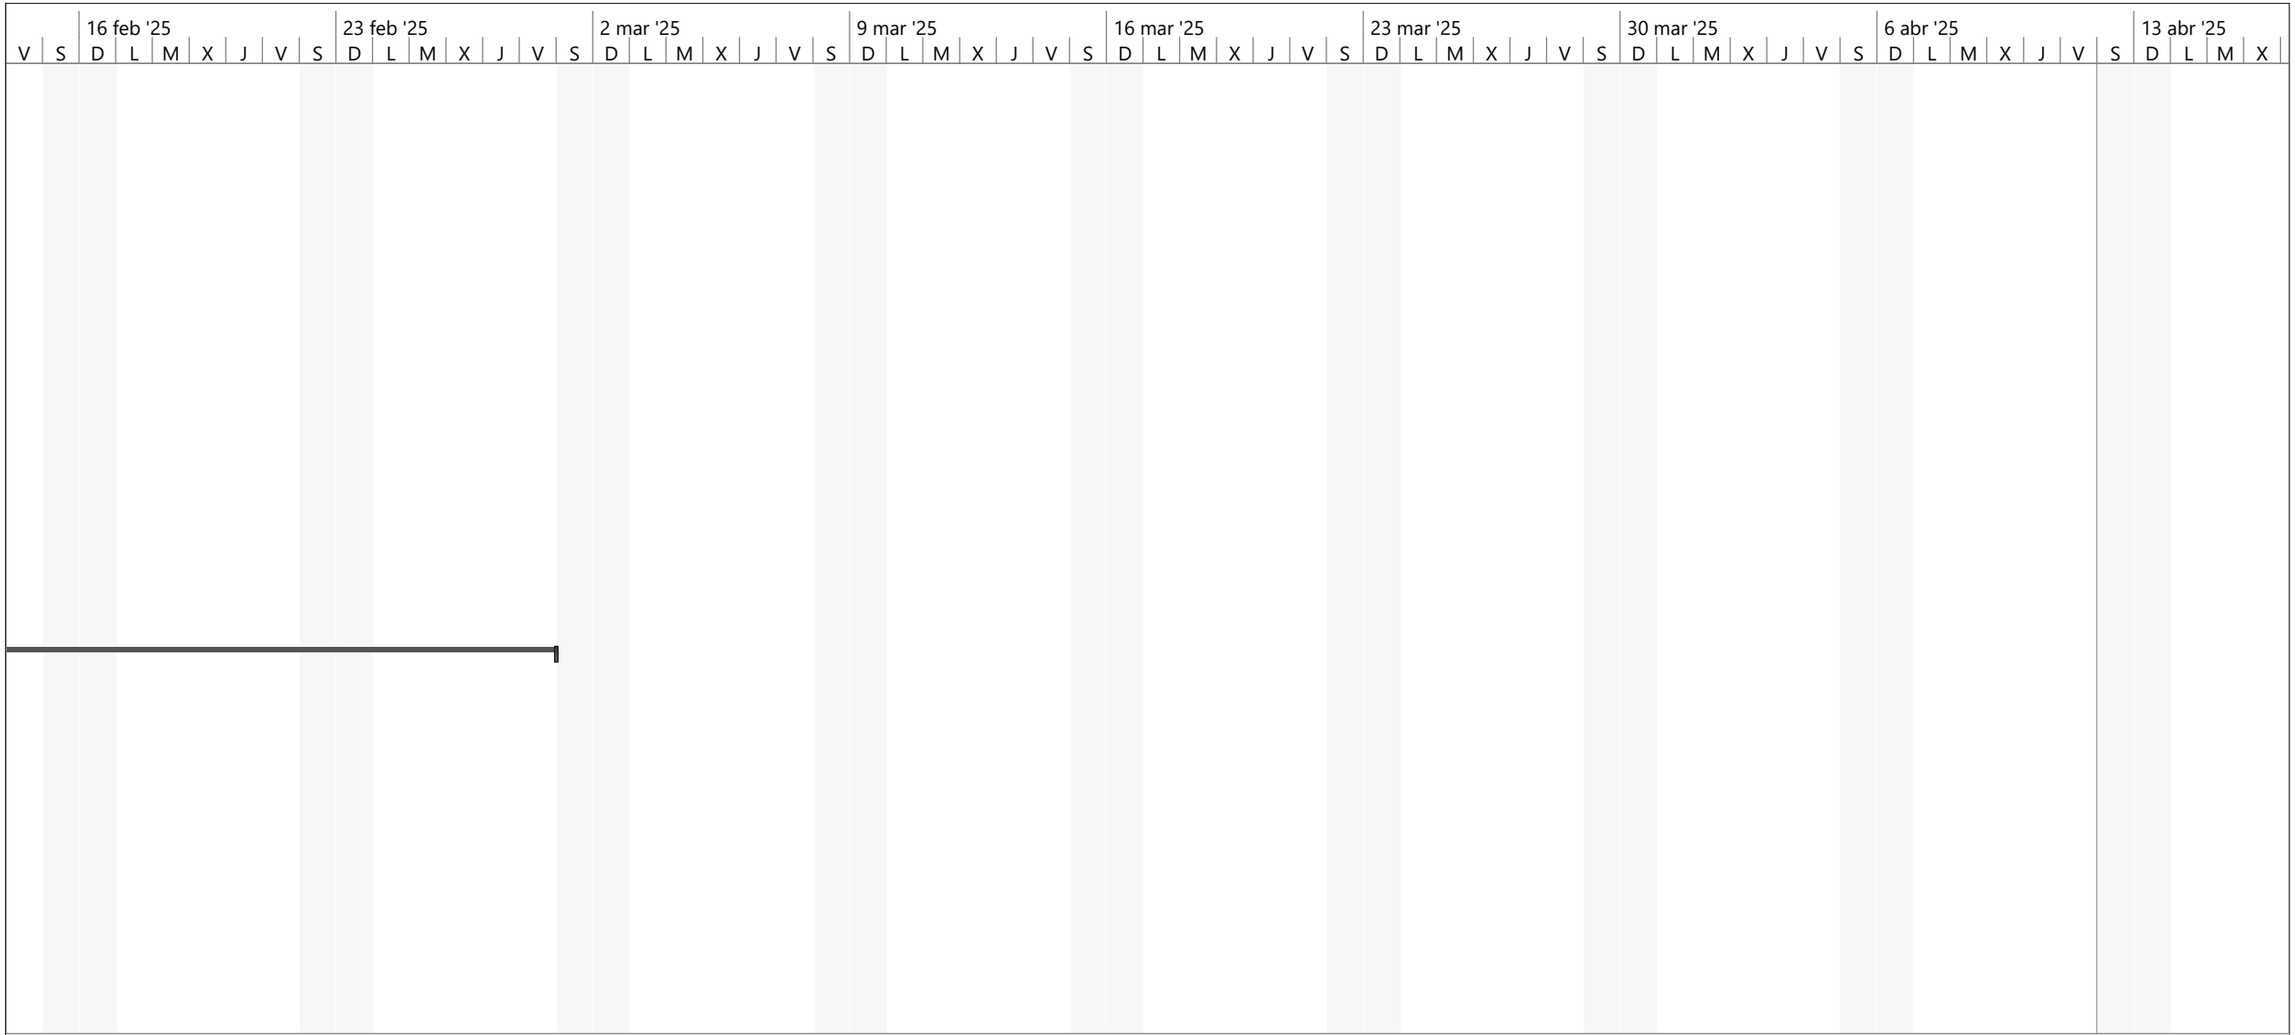


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

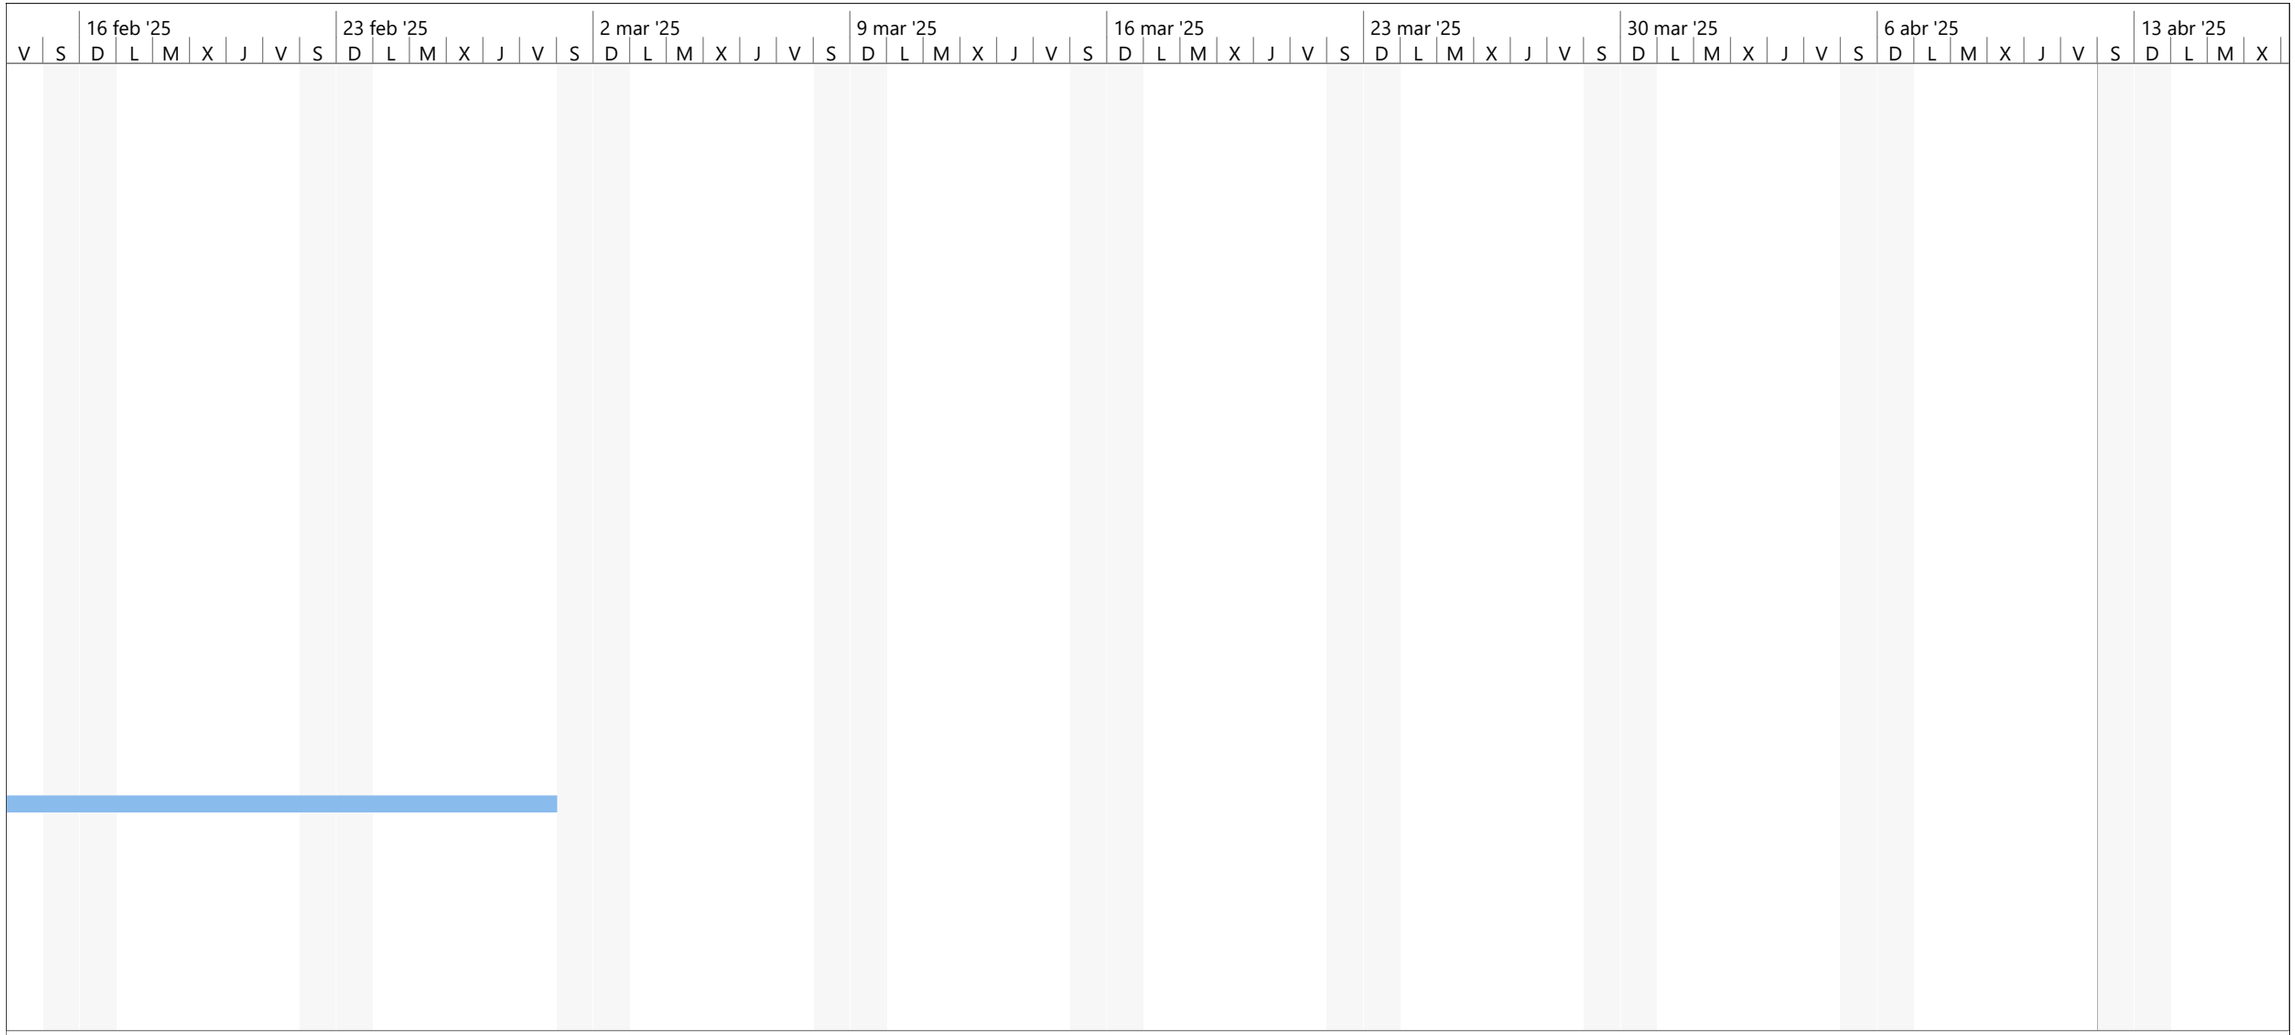


Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	

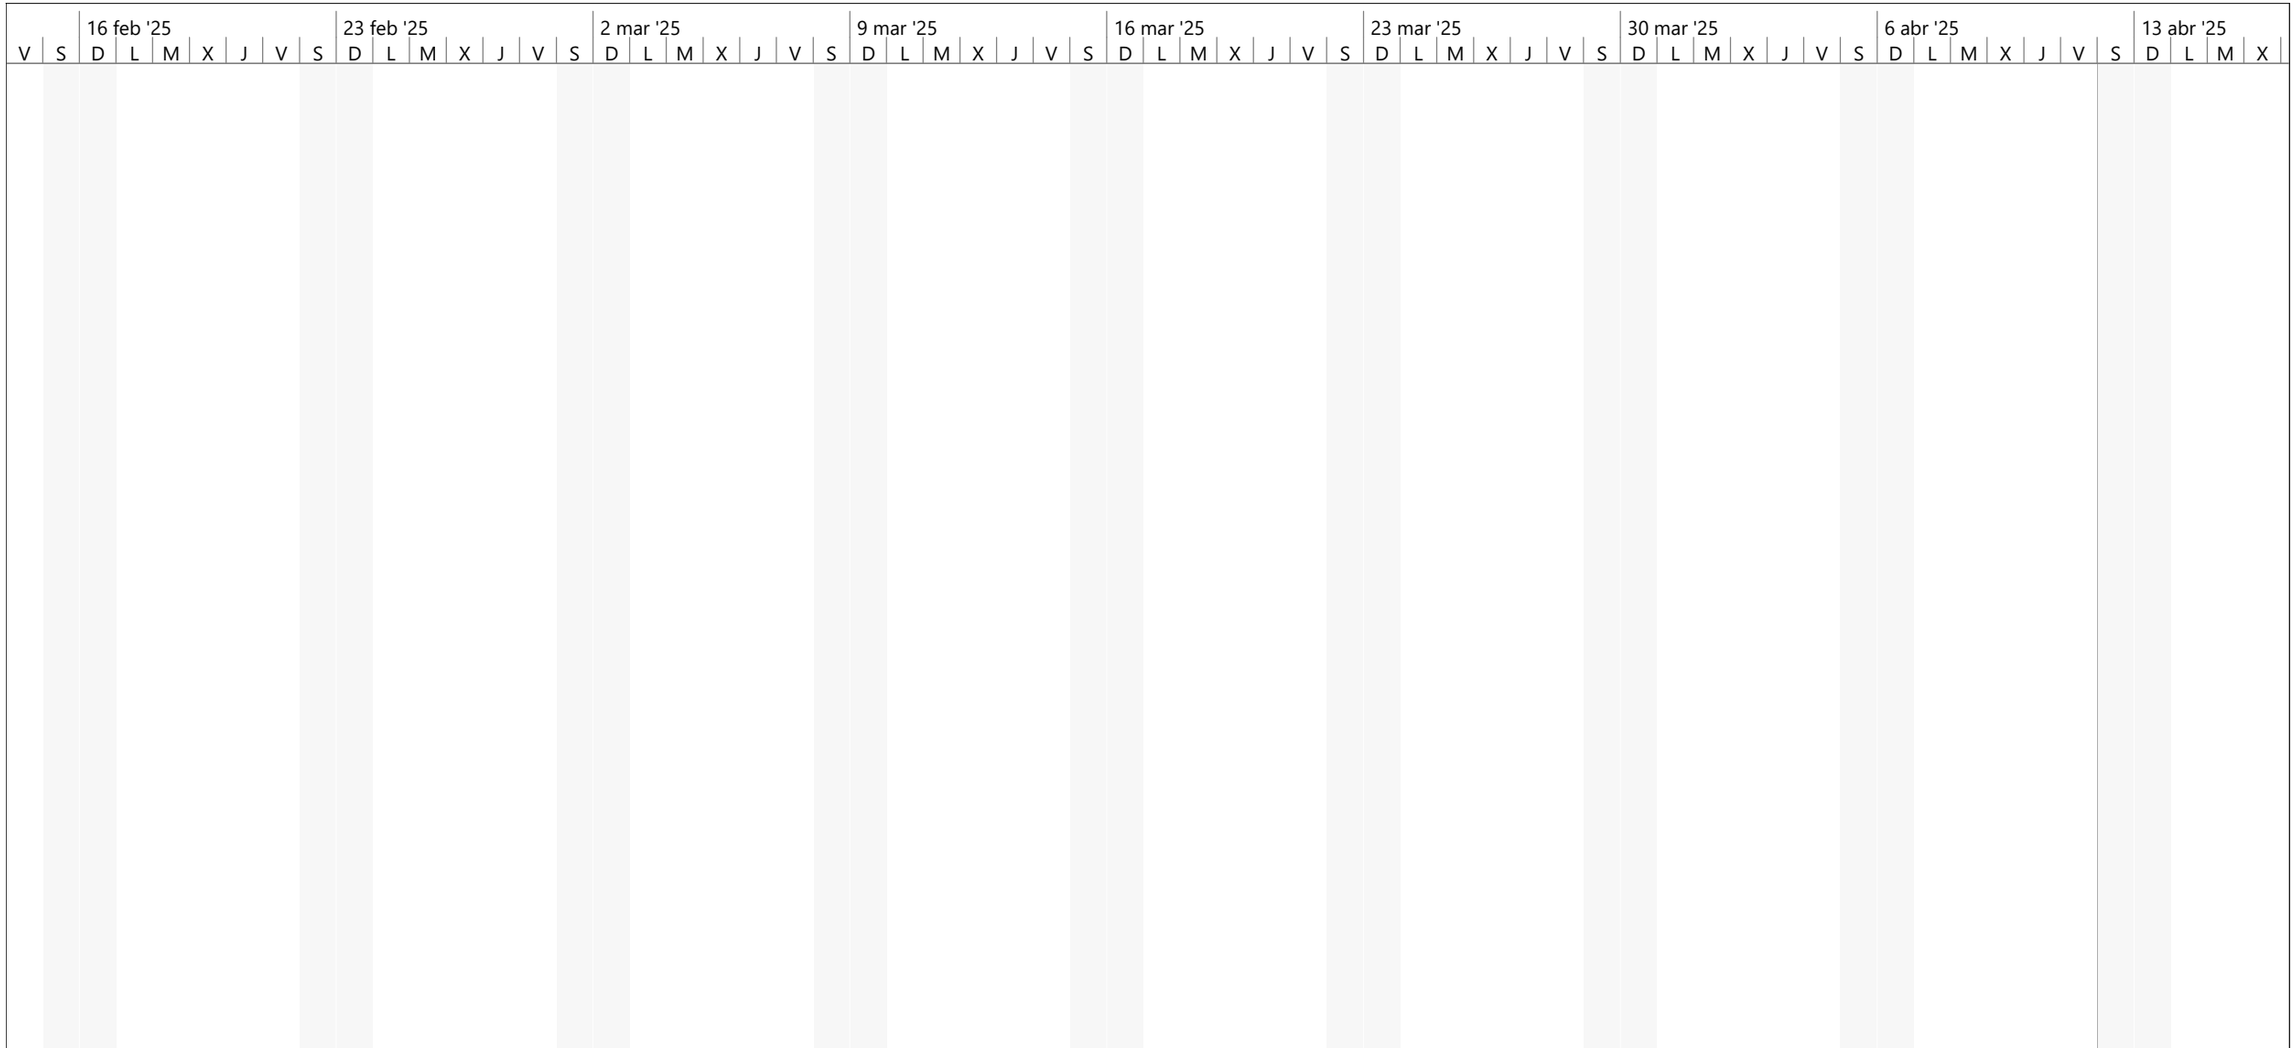

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo		
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso		
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas			

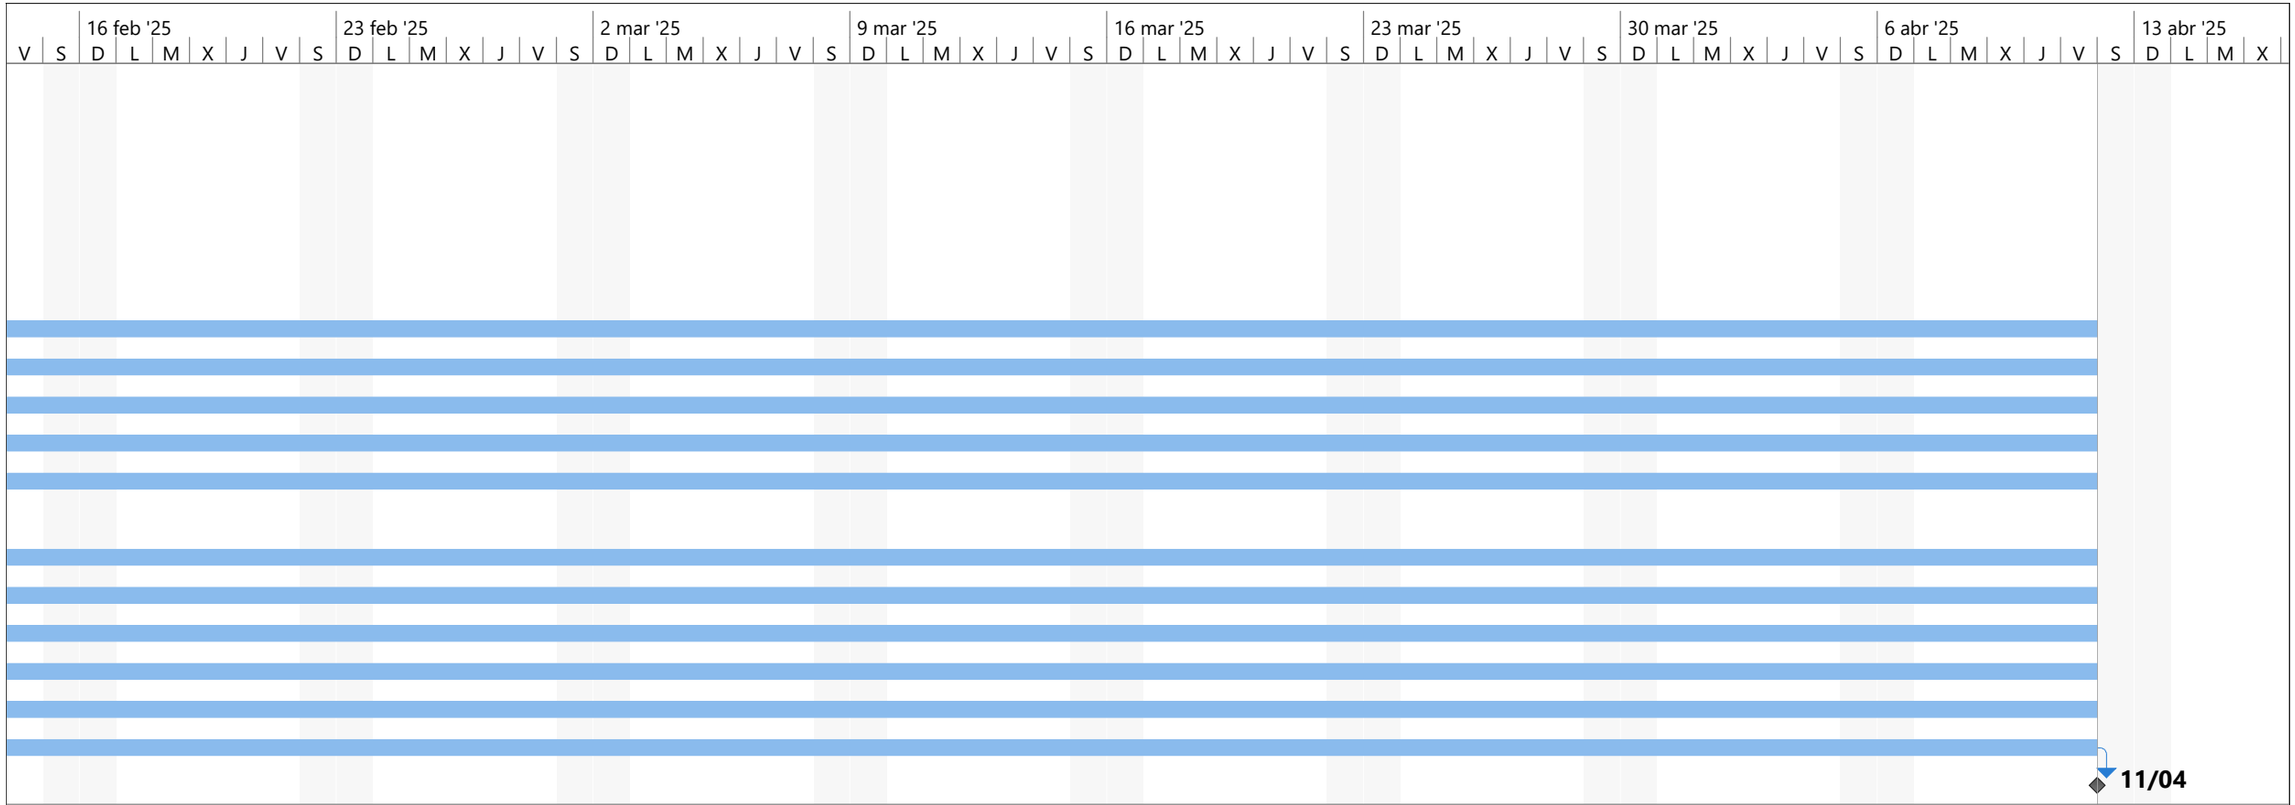

Proyecto: Programación distrito
Fecha: vie 26/07/24

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	
