ALUMBRADO PUBLICO DE BUCARAMANGA



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°138 DEL 22 DE JUNIO DEL 2023 "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA GRUPO 1 CONFORMADO POR LAS COMUNAS: 6 – 7 – 12 – 13 Y EL CORREGIMIENTO 3 Y VIADUCTO PROVINCIAL Y VÍAS PRINCIPALES."

CONSORCIO CIVING INFORME N° 8
PERIODO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2024

TABLA DE CONTENIDO

1 OBJETO DEL PROYECTO 5
1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO 6
1.2 RELACIÓN DE ACTAS 6
1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO 7
1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS 7
1.5 CONTROL DE PÓLIZAS 8
1.5.1 Pólizas de legalización contrato 8
2 CUADRO RESUMEN PERIODO 1 MAYO AL 31 MAYO DEL 2024 8
3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO 9
3.1 ESTADO ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1 9
3.2 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2 10
3.3 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3 10
3.4 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA VIADUCTO 11
3.5 CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 1 CONSORCIO CIVING 11
4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO 12
4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS 12
4.1.1 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1 12
4.1.2 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2 13
4.1.3 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3 13
4.1.4 Cantidad de materiales nuevos Grupo:1 14
4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS 14
4.2.1 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1 15
4.2.2 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2 15
4.2.3 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3 15
4.2.4 Cantidad de materiales reutilizados Grupo 1 15
5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 16
5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE 16
5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 1 16
5.1.2 Relación material utilizado cuadrilla 2 41
5.1.3 Relación material utilizado cuadrilla 3 60
5.1.4 Relación material utilizado cuadrilla Viaducto 88
5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS 89
5.2.1 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1 89
5.2.2 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2 89
5.2.3 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3 90
5.2.4 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 1 90
5.2.5 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1 91
5.2.6 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2 91
5.2.7 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3 91
5.2.8 Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 1 91
5.3 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS 91
5.4 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1 92
5.5 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2 93
5.6 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3 94

6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 94
7 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA 95
8 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL 96
8.1 NÚMERO REPORTES ATENDIDOS 96
8.2 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS) 96
8.3 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS 97
9 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO 97
9.1 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 97
9.2 MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS 98
9.3 PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL 98
10 PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS 100
10.1 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA 100
10.2 INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS 100
10.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA 101
11 INFORME HSEQ 101
11.1 ANEXOS DEL INFORME 101

ÍNDICE DE TABLAS


Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato 6
Tabla 1-2 Relación actas del contrato 7
Tabla 1-3 Desarrollo del contrato 7
Tabla 1-4 Estampillas 7
Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato 8
Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio 8
Tabla 2-1 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 138 9
Tabla 2-2 Cuadro Reportes Pendientes 1 mayo al 31 Mayo Grupo 1 9
Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1 10
Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2 10
Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3 11
Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 1 11
Tabla 3-5 Consolidado Reportes atendidos y solucionados Grupo 1 12
Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1 13
Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2 13
Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3 13
Tabla 4-4 Relación material nuevo Cuadrilla Viaducto 14
Tabla 4-5 Consolidado material nuevo Grupo 1 14
Tabla 4-6 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:1 15
Tabla 4-7 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:2 15
Tabla 4-8 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:3 15
Tabla 4-9 Cantidad Materiales Reutilizados Grupo:1 15
Tabla 7-1 Relación material menor consumido 95
Tabla 8-1 Indicador reportes atendidos Grupo 1 96
Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 1 97
Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 1 97
Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla 98

Tabla 9-3 Plan operativo de control Viaducto La Novena 100

1 OBJETO DEL PROYECTO

"Mantenimiento del Alumbrado Público en el municipio de Bucaramanga Grupo 1 conformado por las comunas: 6 – 7 – 12 – 13 y el corregimiento 3 Y Viaducto Provincial Y Vías Principales."

División Político Urbana y Rural

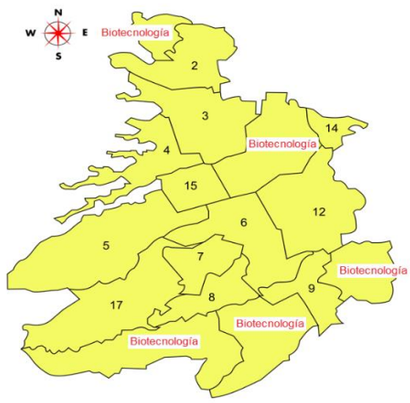

- **Comuna 5 García Rovira**
  Barrios: 1 De Mayo, Alfonso López, Campo Hermoso, Chorreras de Don Juan, La Joya, Quinta Estrella, La Estrella, Rio De Oro II, Pantano I, Pantano II, Pantano III, Rincón de la paz, 5 de Enero, Carlos Pizarro, Gallineral, José Antonio Galán.

- **Comuna 6 la conccordia**
  Barrios: la concordia, San Miguel, Candiles, la Ceiba, La Salle, La victoria, aeropuerto Gómez Niño

- **Comuna 7 Ciudadela Real De Minas**
  Barrios: Ciudadela Real De Minas

- **Comuna 12 Cabecera Del Llano**
  Barrios: Altos del Jardín, Bolarqui, Cabecera Del Llano, Campestre, Conucos, Jardín, Los Anaya, Los Cedros, Mercedes, Nuevo Sotomayor, Pan de Azúcar, Puerta del Sol, Sotomayor, Terrazas, La Floresta.

- **Comuna 13 Mutis**
  Barrios: Los pinos, San Alonso, Galán, La Aurora, Las Américas, El Prado, Mejoras Publicas, Antonia Santos, Bolívar, Álvarez, estadio y Batallón

- **Corregimiento 3**

  Veredas: Santabárbara 10 de mayo, Gualilo alto, Gualilo bajo, la malaña, el pedregal, retiro chiquito, retiro grande, san José, Chitota, Los Cuadros, Miramanga, El Porvenir, Alto de Los Padres, Santa bárbara, Los Anaya, Granjitas.

  - **Vías Principales:** Avenida Gonzales Valencia, Carrera 15 desde la puerta el sol hasta el caí la Virgen, Carrera 27 desde la puerta el sol hasta la UIS, transversal metropolitana, calle 105 desde las orejas de Provenza hasta el barrio el roció, transversal el porvenir, calle 56 desde la cra 36 hasta Marsella real, Calle 61 desde la arrera 15 hasta ciudad Bolívar.

1.1 DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Objeto: Mantenimiento del alumbrado público del municipio de Bucaramanga. Grupo 1, conformado por las comunas: 4-5-7-12-17 y el corregimiento 3 y Viaducto Provincial y Vías Principales.	
Número y fecha del contrato:	COP 138 del 22 de junio del 2023
Valor del contrato:	$ 1.122.746.611,00
Contratista:	CONSORCIO CIVING
	NIT 901719756-5
Representante legal:	Gabriel Acuña Llanes
	C.C 13.847.467
Interventor:	HCR INGENIEROS SAS
	NIT 900.602.753-6
Representante legal:	Carlos Augusto Reyes Morales
	C.C 91.080.211
Supervisor inicio:	Arquitecto Jorge Alejandro García
Fecha de inicio:	24 de julio del 2023
Fecha de suspensión:	29 de diciembre del 2023
Fecha de reinicio:	15 de febrero del 2024
Fecha de terminación 1:	23 de febrero del 2024
Fecha de terminación 2:	11 de abril del 2024
Duración inicial contractual:	Siete (9) meses
Numero de Solicitud C.D.P	61095 del 26 de enero de 2024
Certificado de disponibilidad:	00000515 del 26 de enero de 2024
Numero de Solicitud R.P.	89549
Registro presupuestal:	00007917 del 29 de junio del 2023

Tabla 1-1 Datos Generales del Contrato

Ver anexo 1 CDP – RP

1.2 RELACIÓN DE ACTAS

En la presente tabla se relacionan las actas elaboradas durante la ejecución del contrato incluyendo el periodo del presente informe así: *Ver anexo 2 Relación de actas*

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de Aprobación Garantías	7/03/24	$1.122.746.611,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con fecha anterior de la presentación de este informe por ser un documento indispensable para la legalización del contrato e inicio de actividades.
Acta de Inicio	24/07/2023	$1.122.746.611,00	Luego de haber cumplido con los requerimientos establecidos por el Municipio para este acto administrativo, se realiza acta de inicio contrato.
Acta de Aprobación Garantías Modificación Fecha Inicio	20/09/2023	$1.122.746.611,00	Se realiza Acta de aprobación de pólizas con Modificación De Fecha De Inicio presentación de este informe por ser un documento indispensable para la legalización del contrato e inicio de actividades.
Acta de Pago Parcial No.1	27/09/2023	$158.925.654,22	Acta de Recibo Parcial No.1 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 24 julio al 31 agosto 2023.
Acta de Pago Parcial No.2	23/10/23	$125.615.568,87	Acta de Recibo Parcial No.2 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 30 septiembre 2023.
Acta de Pago Parcial No.3	24/11/23	$131.320.655,04	Acta de Recibo Parcial No.3 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 31 octubre 2023.
Acta de Pago Parcial No.4	19/12/23	$148.830.843,32	Acta de Recibo Parcial No 4 del Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de junio de 2023, comprendido entre el período de 01 a 30 de noviembre 2023
Acta de reinicio	15/02/2024	$1.122.746.611,00	Se realiza acta de Reinicio del contrato. Luego de haber cumplido con los requerimientos establecidos por el Municipio para este acto administrativo, dando a lugar al acta de reinicio.
Acta de pago parcial No. 5	08/04/2024	$142.830.025,62	Acta de Recibo Parcial No 5 del Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de junio de 2023, comprendido entre el período de 01 a 28 de diciembre de 2023 – 15 al 16 de febrero de 2024

Descripción	Fecha	Valor	Observaciones
Acta de pago parcial No. 6	23/05/2024	$205262328,44	Acta de Recibo Parcial No 6 el Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de junio de 2023, comprendido entre el período del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024
Acta de pago parcial No. 7	27/06/2024	$149.064.347,24	Acta de Recibo Parcial No 7 del Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de junio de 2023, comprendido entre el período de 01 de abril al 30 abril de 2024

Tabla 1-2 Relación actas del contrato

Ver anexo 2 RELACIÓN DE ACTAS

1.3 DESARROLLO DEL CONTRATO

Se refleja las actas ejecutadas desde el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2024, así:

Descripción	Fecha	Valor	Valor	Observación
Valor total del contrato	22/06/2023	$ 1.122.746.611,00		Inicio del contrato 138 del 22 de junio del 2023
Acta de Pago Parcial No.1	27/09/2023		$ 158.925.654,22	Acta de Recibo Parcial No.1 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 24 julio al 31 agosto 2023.
Acta de Pago Parcial No.2	23/10/2023		$ 125.615.568,87	Acta de Recibo Parcial No.2 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 30 septiembre 2023.
Acta de Pago Parcial No.3	24/11/2023		$ 131.320.655,04	Acta de Recibo Parcial No.3 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 31 octubre 2023.
Acta de Pago Parcial No.4	19/12/2023		$ 148.830.843,32	Acta de Recibo Parcial No.4 del contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023, comprendido entre el período del 1 al 30 noviembre 2023.
Acta de pago parcial No. 5	08/04/2024		$142.830.025,62	Acta de Recibo Parcial No 5 del Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de junio de 2023, comprendido entre el período de 01 a 28 de diciembre de 2023 – 15 al 16 de febrero de 2024
Adicional No 1	10/04/2024	$320.784.746,00		Se realiza adicional al contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023
Acta de pago parcial No. 6	23/05/2024		$205262328,44	Acta de Recibo Parcial No 6 el Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de junio de 2023, comprendido entre el período del 17 de febrero al 31 de marzo de 2024
Adicional No 2	28/05/2024	$240.588.559,50		Se realiza adicional al contrato de Obra Pública No.138 del 22 junio del 2023
Acta de pago parcial No. 7	27/06/2024		$149.064.347,24	Acta de Recibo Parcial No 7 del Contrato de Obra Pública No. 138 del 22 de junio de 2023, comprendido entre el período de 01 de abril al 30 abril de 2024
Valor total de obra ejecutado		**$ 1.684.119.916,50**	$ 1.061.849.422,75	
Valor total de obra pendiente por ejecutar			$ 622.270.493,75	
Sumas iguales		**$ 1.684.119.916,50**	**$ 1.684.119.916,50**	

Tabla 1-3 Desarrollo del contrato

1.4 CONTROL DE ESTAMPILLAS

A continuación, se presenta tabla, la cual relaciona los pagos de estampillas, en cumplimiento a lo pactado en clausula trigésima séptima de la minuta del contrato 138 como requisitos de legalización del contrato.

Estampilla	No.	Valor
Pro- Hospital	2502400298128	$4.300
Ordenanza 012	2502400160263	$430

Tabla 1-4 Estampillas

1.5 CONTROL DE PÓLIZAS

1.5.1 Pólizas de legalización contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia. NIT. 860.524.654-6. Recibo de pago de la póliza de Cumplimiento Estatal No 465-47-994000007839, por un valor de $ 561.373.305,50. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías de legalización de Contrato la cuál ampara las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007839	Cumplimiento del contrato	$ 224.549.322,20	22/06/2023	11/08/2024
465-47-994000007839	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	112.274.661,10	22/06/2023	11/08/2024
465-47-994000007839	Estabilidad y calidad de la obra	224.549.322,20		

Tabla 1-5 Pólizas de Legalización del Contrato

1.5.2 Pólizas ajustadas al acta de inicio del contrato

Aseguradora: Aseguradora Solidaria de Colombia Nit. 860.524.654-6. A continuación, se relaciona cuadro de pólizas de garantías ajustadas al Acta de Inicio que amparan las obligaciones contractuales contraídas por el contratista.

Nº Póliza	Concepto del amparo	Valor Asegurado	Vigencia	
			Desde	Hasta
465-47-994000007839-1	Cumplimiento del contrato	$ 224.549.332,20	22/06/2023	23/06/2024
465-47-994000007839-1	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 112.274.661,10	22/06/2023	23/02/2027
465-47-994000007839-1	Calidad de servicio	$ 224.549.332,20	22/06/2023	23/06/2024
465-74-994000002174-3	Responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	15/09/2023	23/02/2024
465-74-994000002174	Predios labores y operaciones	$ 232.000.000,00	22/06/2023	23/06/2024
465-74-994000002174	Vehículos propios y no propios	$ 232.000.000,00	23/02/2023	23/04/2024
465-74-994000002174	Responsabilidad civil extracontractual	$ 2600.000.000,00	24/07/2023	11/06/2024
465-47-994000007839	Cumplimiento del contrato	$288.706.271,40	22/06/2023	11/10/2024
465-74-994000002174	Responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	11/04/2024	11/06/2024
465-47-994000007839	Cumplimiento del contrato	$ 224.549.332,20	22/06/2023	11/08/2024

Tabla 1-6 Póliza Ajustada al Acta de Inicio

Ver anexo 3 RELACIÓN DE PÓLIZAS

2 CUADRO RESUMEN PERIODO 1 MAYO AL 31 MAYO DEL 2024

El siguiente cuadro presenta la relación de actividades realizadas por el Grupo:1 Consorcio CIVING.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MAYO G1							
DESCRIPCION		**C1**		**C2**		**C3**	
ITEM	**TIPO DE MANTENIMIENTO**	**CANT C1**	**TIE 1**	**CANT C2**	**TIE C2**	**CANT C3**	**TIE C3**
1	Zona sin iluminacion	3	4	20	29,3	22	14
2	Luminaria apagada	35	18	9	14,5	63	32,7
3	Circuito apagado	0	0	0	0	0	0

4	Luminatia Intermitente	0	0	1	1,75	1	0,5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	0	0	3	1,5
6	Luminaria Directa	0	0	0	0	0	0
7	Podas	0	0	0	0	0	0
8	Daño infraestrutura	2	5	0	0	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0	0	0	0	0
10	Riesgo electrico	1	3	0	0	0	0
11	Robo infraestrutura	0	0	0	0	0	0
12	Reposicion de redes	0	0	0	0	0	0
13	Telegestión	0	0	0	0	0	0

Tabla 2-1 Cuadro Resumen Actividades Contrato No. 138

G1C1			
OT	**REPORTE**	**ESTADO**	**RAZON**
9801	106270	pendiente	horario, es zona de alto índice de inseguridad
9832		pendiente	horario, es zona de alto índice de inseguridad
G1C2			
OT	**REPORTE**	**ESTADO**	**RAZON**
9973	107882	pendiente	por fin de mes
G1C3			
OT	**REPORTE**	**ESTADO**	**RAZON**
9980	107545	pendiente	REPORTE PENDIENTE POR FALTA DE MATERIAL
	106808	pendiente	REPORTE PENDIENTE POR FALTA DE MATERIAL

Tabla 2-2 Cuadro Reportes Pendientes 1 mayo al 31 Mayo Grupo 1

3 CUADRO MENSUAL DEL ESTADO DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Durante el periodo correspondido del 1 de mayo al 31 de maya 2024, se ejecutaron las ordenes de trabajo asignadas a las cuadrillas del grupo 1.

3.1 ESTADO ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 1

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MAYO**	**9801**	2	0	0	0	0	0	1
2	**MAYO**	**9919**	1	1	0	0	0	0	0
3	**MAYO**	**9803**	0	0	0	0	1	0	0
4	**MAYO**	**9832**	29	0	0	0	1	0	0
5	**MAYO**	**9923**	13	13	0	0	0	0	0
6	**MAYO**	**9937**	19	19	0	0	0	0	0
7	**MAYO**	**9946**	1	1	0	0	0	0	0
8	**MAYO**	**9944**	5	4	1	0	0	0	0
9	**MAYO**	**9958**	3	2	1	0	0	0	0
10	**MAYO**	**9965**	1	1	0	0	0	0	0

11	**MAYO**	**10007**	10	7	1	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**11**	**84**	**48**	**3**	**0**	**2**	**0**	**1**
			100,00%	**57,14%**	**3,57%**	**0,00%**	**2,38%**	**0,00%**	**1,19%**

A	Asignados	E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios
B	Ejecutados	F	No ejecutados por falta de material
C	Repetidos o ya ejecutados	G	No ejecutados por otros motivos
D	No ejecutados por falta de información	**Cuadrilla 1**	

Tabla 3-1 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 1

3.2 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 2

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MAYO**	**9920**	1	1	0	0	0	0	0
2	**MAYO**	**9922**	1	1	0	0	0	0	0
3	**MAYO**	**9856**	33	18	10	0	2	0	0
4	**MAYO**	**9848**	5	4	1	0	0	0	0
5	**MAYO**	**9953**	2	1	1	0	0	0	0
6	**MAYO**	**9964**	2	2	0	0	0	0	0
7	**MAYO**	**9969**	2	2	0	0	0	0	0
8	**MAYO**	**9973**	6	0	1	0	0	0	0
9	**MAYO**	**10005**	5	3	1	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**9**	**57**	**32**	**14**	**0**	**2**	**0**	**0**
			100,00%	**56,14%**	**24,56%**	**0,00%**	**3,51%**	**0,00%**	**0,00%**

A	Asignados	E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios
B	Ejecutados	F	No ejecutados por falta de material
C	Repetidos o ya ejecutados	G	No ejecutados por otros motivos
D	No ejecutados por falta de información	**Cuadrilla 2**	

Tabla 3-2 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 2

3.3 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA 3

Estado reportes en las ordenes de trabajo									
Ítem	**Periodo**	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**MAYO**	**9926**	15	6	8	0	1	0	0
2	**MAYO**	**9931**	8	8	0	0	0	0	0
3	**MAYO**	**9980**	53	39	7	0	4	0	1
4	**MAYO**	**9939**	6	5	0	0	0	0	1
5	**MAYO**	**9966**	1	1	0	0	0	0	0
6	**MAYO**	**9993**	15	13	0	0	0	1	1
7	**MAYO**	**9974**	1	1	0	0	0	0	0
8	**MAYO**	**9976**	1	1	0	0	0	0	0
9	**MAYO**	**9985**	1	1	0	0	0	0	0
10	**MAYO**	**10013**	14	14	0	0	0	0	0
11	**MAYO**	**10015**	74	74	0	0	0	0	0
12	**MAYO**	**10016**	2	1	1	0	0	0	0
Cantidad ordenes		**12**	**191**	**164**	**16**	**0**	**5**	**1**	**3**

		100,00%	**85,86%**	**8,38%**	**0,00%**	**2,62%**	**0,52%**	**1,57%**

A	Asignados	E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios
B	Ejecutados	F	No ejecutados por falta de material
C	Repetidos o ya ejecutados	G	No ejecutados por otros motivos
D	No ejecutados por falta de información	**Cuadrilla 3**	

Tabla 3-3 Estado ordenes de trabajo Cuadrilla 3

3.4 ESTADO DE ORDENES DE TRABAJO CUADRILLA VIADUCTO

Durante el periodo de diciembre se realiza mantenimiento e instalación de 180 mts de cable utp, 5 fuentes de 9v, 12 fuentes de 48v, se gastan 70 conectores uy Y 2 inyectores POE, se realiza la revisión de parámetros eléctricos dentro de las subestaciones y mantenimiento a luces laterales viales.

3.5 CONSOLIDADO DE ORDENES GRUPO 1 CONSORCIO CIVING

Estado ordenes de trabajo								
Cuadrilla	**OT**	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
1	**11**	84	48	3	0	2	0	1
		100%	57%	4%	0%	2%	0%	1%
2	**9**	57	32	14	0	2	0	0
		100%	56%	25%	0%	4%	0%	0%
3	**12**	191	164	16	0	5	1	3
		100%	86%	8%	0%	3%	1%	2%
VIADUCTO	**1**	1	1	0	0	0	0	0
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%
Cantidades	**32**	333	245	33	0	9	1	4
Porcentaje de ejecución		**100,00%**	**73,57%**	**9,91%**	**0,00%**	**2,70%**	**0,30%**	**1,20%**

A	Asignados	E	No ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios
B	Ejecutados	F	No ejecutados por falta de material
C	Repetidos o ya ejecutados	G	No ejecutados por otros motivos
D	No ejecutados por falta de información	**GRUPO 1**	

Tabla 3-4 Consolidado ordenes de trabajo Grupo 1

Ordenes		**Cantidad de reportes atendidos**						
		A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**
Cuadrilla 1	11	84	48	3	0	2	0	1
Cuadrilla 2	9	57	32	14	0	2	0	0
Cuadrilla 3	12	191	164	16	0	5	1	3
VIADUCTO	1	1	1	0	0	0	0	0
Total grupo 1	**33**	**333**	**245**	**33**	**0**	**9**	**1**	**4**

A	# Reportes Asignados	**E**	# Reportes no ejecutados por depender de otros entes u operadores de servicios.

B	# Reportes ejecutados	**F**	# Reportes no ejecutados por falta de material
C	# Reportes repetidos o ya ejecutados	**G**	# Reportes no ejecutados por otros motivos
D	# Reportes no ejecutados por falta de información		

Tabla 3-5 Consolidado Reportes atendidos y solucionados Grupo 1

4 RELACIÓN DE MATERIALES SUMINISTRADOS POR LA OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO

Se relacionan los materiales nuevos y usados suministrados por la oficina de Alumbrado Público a las cuadrillas del grupo 1 para realizar las actividades asignadas por el supervisor del contrato, durante la ejecución del presente periodo.

4.1 RELACIÓN DE MATERIALES NUEVOS RETIRADOS

Listado de materiales nuevos suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2024.

Ver anexo 5 Salida de material nuevo y devolución material

4.1.1 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 1

Relación material nuevo Cuadrilla 1											
Material	**Und**	**2/05/2024**	**3/05/2024**	**8/05/2024**	**10/05/2024**	**16/05/2204**	**17/05/2024**	**20/05/2024**	**23/05/2024**	**28/05/2024**	**Cantidad final**
Base Fotocelda	Und				1						1
Borneras	Und									4	4
Cable Aluminio # 6	Ml			500		500		550		400	1950
Cable encauchetado 3*14	Ml			40				40			80
Collarín 6-7"	Und							7			7
Conector penetración	Und							20		30	20
Contactor	Und				2						2
Fotocelda	Und				26						26
Luminaria Deltaled 123W	Und	10	20								30
Luminaria Deltaled 37W	Und								5		5
Luminaria Deltaled 44W	Und								5		5
Luminaria DX-PRO 60W	Und			12							12
luminaria de 92 W, celcia	Und							20	3		23
Reflector DX-PRO 90W	Und					6					6
Luminaria Sepialed II 111W	Und						15				15
Protección automática 2*32 A	Und				1						1
Protección automática 2*40 A	Und				1						1

Tabla 4-1 Relación material nuevo Cuadrilla 1

4.1.2 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 2

Material	Und	3/05/2024	8/05/2024	14/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	Cantidad final
Aislador tipo carrete	Und	5					3	8
Brazo galvanizado 1 mt	Und				2			2
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	5	1				6	12
Cable Aluminio # 6	Ml		200				200	400
Collarín 4-5"	Und				2			2
Collarín 6-7"	Und	10					10	20
Conector penetración	Und					30		30
Contactor	Und			1				1
Luminaria DX-PRO 60W	Und					16	5	21
Percha 1 puestos	Und	5					3	8
Protección automática 2*20 A	Und			4				4
Protección automática 2*40 A	Und		1					1
Timer	Und			1				1

Tabla 4-2 Relación material nuevo Cuadrilla 2

4.1.3 Cantidad de materiales nuevos Cuadrilla 3

Material	Und	2/05/2024	8/05/2024	14/05/2024	16/05/2024	17/05/2024	23/05/2024	24/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	30/05/2024	Cantidad final
Aislador tipo carrete	Und					1			1		4	6
Brazo galvanizado 1 mt	Und				1							1
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und			6			2			10		18
Cable Aluminio # 6	Ml			50	50	200			70		200	570
Cable encauchetado 3*14	Ml			50					50			100
Collarín 4-5"	Und					2	4					6
Collarín 6-7"	Und			4						12		16
Conector penetración	Und					20		50				70
Luminaria DX-PRO 60W	Und		10	5		10				10		35
Reflector DX-PRO 90W	Und	1		3	1	2	2	10				19
Luminaria Sepialed II 106W	Und									7		7
Luminaria Sepialed II 111W	Und				3					3		6
Percha 1 puestos	Und					1			1		4	6
Timer	Und			1								1

Tabla 4-3 Relación material nuevo Cuadrilla 3

Durante el periodo del mes de mayo, para el viaducto la novena no se solicitó material del almacén del alumbrado público de Bucaramanga.

Relación material nuevo Cuadrilla 1							
Material	**Und**						**Cantidad final**
Aislador tipo carrete	Und						0

Tabla 4-4 Relación material nuevo Cuadrilla Viaducto

4.1.4 Cantidad de materiales nuevos Grupo:1

Relación Material Nuevo Grupo:1					
Material	**UND**	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	GRUPO 1
Aislador tipo carrete	Und	0	8	6	14
Base Fotocelda	Und	1	0	0	1
Borneras	Und	4	0	0	4
Brazo galvanizado 1 mt	Und	0	2	1	3
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	0	12	18	30
Cable Aluminio # 6	Ml	1950	400	570	2920
Cable encauchetado 3*14	Ml	80	0	100	180
Collarín 4-5"	Und	0	2	6	8
Collarín 6-7"	Und	7	20	16	43
Conector penetración	Und	20	30	70	120
Contactor	Und	2	1	0	3
Fotocelda	Und	26	0	0	26
Luminaria Deltaled 123W	Und	30	0	0	30
Luminaria Deltaled 37W	Und	5	0	0	5
Luminaria Deltaled 44W	Und	5	0	0	5
Luminaria DX-PRO 60W	Und	12	21	35	68
luminaria de 92 W, celcia	Und	23	0	0	23
Reflector DX-PRO 90W	Und	6	0	19	25
Luminaria Sepialed II 106W	Und	0	0	7	7
Luminaria Sepialed II 111W	Und	15	0	6	21
Percha 1 puestos	Und	0	8	6	14
Protección automática 2*20 A	Und	0	4	0	4
Protección automática 2*32 A	Und	1	0	0	1
Protección automática 2*40 A	Und	1	1	0	2
Timer	Und	0	1	1	2

Tabla 4-5 Consolidado material nuevo Grupo 1

4.2 RELACIÓN DE MATERIALES REUTILIZADOS RETIRADOS

A continuación, se relaciona las cantidades de materiales reutilizados suministrados a las cuadrillas, durante el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2024.

Ver anexo 6 Salida de material reutilizado

4.2.1 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 1

Durante este periodo no se utiliza material de segunda.

Relación material reutilizado Cuadrilla 2									
Material	**Und**								**cantidad final**
Poste metálico	Und	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 4-6 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:1

4.2.2 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 2

Durante este periodo se utiliza posteria de segunda. En dos lugares diferentes para un total de 5 postes

Relación material reutilizado Cuadrilla 2									
Material	**Und**								**cantidad final**
Poste metálico	Und	1	4	0	0	0	0	0	5

Tabla 4-7 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:2

Durante este periodo se utiliza posteria de segunda. En dos lugares diferentes para un total de 5 postes

4.2.3 Cantidad de materiales reutilizados Cuadrilla 3

Relación material reutilizado Cuadrilla 3									
Material	**Und**	**9939**	**9939**						**cantidad final**
Poste metálico	Und	3	2	0	0	0	0	0	5

Durante este periodo no se utiliza material de segunda.

Tabla 4-8 Relación Material Reutilizado Cuadrilla:3

4.2.4 Cantidad de materiales reutilizados Grupo 1

Durante este periodo se utiliza postes de segunda. Para atender las solicitudes de los usuarios de AP

Material	Und	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	TOTAL
Poste metálico	Und	0	5	5	10
tapa plastica	Und	0	0	0	0

Tabla 4-9 Cantidad Materiales Reutilizados Grupo:1

5 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

5.1 RELACIÓN MATERIAL UTILIZADO, ESPECIFICANDO ORDEN DE TRABAJO Y REPORTE

A continuación, se relacionan las ordenes de trabajo y reportes ejecutadas por las cuadrillas, donde se especifica el sitio y los materiales utilizados en la ejecución de las actividades durante el periodo del 1 de mayo al 31 de mayo del 2024.

5.1.1 Relación material utilizado cuadrilla 1

OT	9801	Atención			Estado reporte									Estado Punto luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W
106977	LA FORTUNACALLE 38 CARRERA 33 AL BORDE DE LA CARRETERA	8		U	1						1		es un acentamiento								
106270	REGADERO NORTEsector desde la entrada norte club tiburones ll hasta la etapa ll parte baja	2		U	1							1	por horario no recomendado realizar la labor								
Cantidades			0		2	0	0	0	0	0	1	1	0	Material nuevo	0	0	0	0	0	0	0

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #:		9801	
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-1 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9801

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N°8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024

OT	9919	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 127W	Luminaria Deltaled 135W	Luminaria Deltaled 144W	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
107520	CARRERA 10D CON 68 EN LA ESCUELA DEL BARRIO, PABLO VI	2	1	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA116724	1						
													cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA116542	1						
Cantidades			1	U	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Material nuevo**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #:	9919		
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminación	0	0	**8**	Daño infraestructura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	1	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0

4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-2 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9919

OT	**9803**	**Atención**			**Estado reporte**									**Estado Punto Luminoso**	**Material nuevo**												
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana O Rural**	**A- asignado**	**B-Solucionado**	**C-Repetido**	**D-Falta de información**	**E-Otros Entes**	**F-Falta de material**	**G-Otros Motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo /**	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 4
106164	CARRERA 16 CON CALLE 15B HASTA LA CALLE 15EALTOS DEL PROGRESO	2		U	1				1				podas														
102890	VARIAS DIRECCIONESALTOS DEL PROGRESO	2		U	1								se requiere 45 luminarias peatonales														
Cantidades			0		**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 9803**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-3 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9803

OT	9832	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras
107367	TEJAR NORTECALLE 15 A LA 22 ENTRE CRA 6 Y 8	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107351	TEJAR NORTECALLE 21 NO- M-10	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107277	VILLA ROSACANCHA FUTBOL ESTACION DE BUSES	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107269	VILLA ROSACANCHA COSMOS Y ESTACION DE BUSES	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107224	LA FORTUNABARRIO LA FORTUNA	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									

107188	COLORADOSCALLE 56 19-28 SECTOR EL ROSAL COLORADOS	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107187	DIVINO NIÑOCASA 21	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107186	DIVINO NIÑOBODEGA 5	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107185	DIVINO NIÑOCASA 29	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107184	DIVINO NIÑOPEATONAL 5 ESQUINA	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107183	DIVINO NIÑOKM 5 CASA 31	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107182	VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA IIPARQUE LINEAL	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107175	VILLA CARMELOCARRERA 11 34 52	7		U	1				1				por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107168	ALTOS DEL PROGRESOCARRERA 16 # 13-17	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
107143	URB. TEJAR NORTE IIC 17N K 10D 26	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								

107132	VILLA ROSACALLE 20 #19-63 MANZANA 36	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107131	VILLA ROSACALLE 21N CON 28 MANZANA 40	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107108	BETANIACLL 30 B9 TORRE 14 APT 304 B/ ALTOS DE BETANIA	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107094	VILLA ROSACALLE 21 CON CRA 20	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107092	CAFE MADRIDPARQUE COLINDANTE CANCHA FUTBOL AMERICO MONTANNI	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107075	VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA IIENTRADA DEL BARRIO HASTA EL PARQUE -ESTACIÓN DE BUSES	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107073	VILLA ROSACALLE 9B # 19-30 MANZANA 25	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107071	CAMPO MADRID_ ETAPA-1 Y ETAPA -2CRA 10 DN NO.24-40 TORRE 18	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									
107020	VILLAS DE SAN IGNACIO_SAN IGNACIO REAL BAVARIA IIsector brisas del prado alrededor de Bavaria ll via chimita	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria									

107013	CAFE MADRIDCAR 3 NO. 44N -208 EL TUNEL	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
106889	VILLA ROSAESTACION DE BUSES BAJANDO HACIA LA MZ 39	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
105731	COLORADOScalle 54n 21-02	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
105617	COLORADOSCALLE 57N CON CARRERA 23-61 SECTOR PATIO BONITO	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
105474	COLORADOSK 26 # 55- 96	2		U	1							1	por seguridad no se puede realizar trabajos en este horaria								
Cantidades			0		**29**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**28**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #:**		**9832**	
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	29	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	28
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0

3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-4 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9832

OT	**9923**	**Atención**			**Estado reporte**									**Estado Punto Luminoso**	**Material nuevo**									
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana O Rural**	**A- asignado**	**B-Solucionado**	**C-Repetido**	**D-Falta de información**	**E-Otros Entes**	**F-Falta de material**	**G-Otros Motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo /**	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Cable encauchetado 3*14	Luminaria Deltaled 123W	Proyector Acroled 12W	Proyector Celsa Led 150W	Proyector Led 200w	Proyector Led 600W
107536	TERMINAL DE TRANPORTESTODA LA PRINCIPAL	1	1	U	1	1							se realiza ajuste de conexiones en el bajante de alimentación principal habilitando la red en el sector	BA121704										

107211	QUINTA ESTRELLACALLE 45 BAJANDO HASTA LLEGAR AL BARRIO RESERVA DE LA INMACULADA DOS	2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA117104					41	1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA117108						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	ba 156906						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA116669						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA116916						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA116915						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA115608						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA115762						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA116643						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA115248						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA117076						1				
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria quemada se instala celsa led de 123w	BA117177						1				
Cantidades		**7**			**13**	**13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #:**		**9923**	
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	1	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	12	6	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	12	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	6,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	12	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	6,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**####**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-5 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9923

OT	9937	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed II 111W
107908	SAN MARTIN Quebrada la iglesia Calle 73 con 29A	10	3	U	1	1							se retira poste de concreto de 8mt y se lleva a la hormiga, se reubica dos reflectores de la cancha a los postes del frente todo provisional hasta que terminen la obra											
107818	PABLO VI CARRERA 10E HASTA LA 65	2	0,5	U	1	1							INSTLACION DE LUMINARIAS DE 111W CELSA BA 114855	BA 114855										1
		2	0,5	U	1	1							INSTLACION DE LUMINARIAS DE 111W CELSA BA 114441	BA 114441										1
		2	0,5	U	1	1							INSTLACION DE LUMINARIAS DE 111W CELSA BA 117477	BA 117477										1
		2	0,5	U	1	1							INSTLACION DE LUMINARIAS DE 111W CELSA BA 114825	BA 114825										1
		2	0,5	U	1	1							INSTLACION DE LUMINARIAS DE 111W CELSA BA 114274	BA 114274										1
107420	SAN GERARDO IICALLE 63 # 13-67	2	0,5	U	1	1							instalación de luminaria dx-pro de 60w BA 178836	ba 178836								1		
		2	0,5	U	1	1							luminaria de 111w vehicular BA 115612	ba 115612										1
106811	LOS LAURELESCALLE 64 # 15-24	2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA181875	BA 180875								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA179007	BA 179007								1		

		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA178862	BA 178862								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA178727	BA 178727								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA179001	BA 179001								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA180359	BA 180359								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA179102	BA 179102								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA179827	BA 179827								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA180851	BA 180851								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA180066	BA 180066								1		
		2	0,5	U	1	1							INSTALACION DE LUMINARIA DX-PRO DE 60W BA180805	BA 180805								1		
Cantidades			12	U	**19**	**19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**	**6**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**				**% DE ATENCIÓN OT #:**	**9937**		
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**		
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0		
2	Luminaria apagada	18	9	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	16	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	9,0		

3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	1	3	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	16	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	9,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**####**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-6 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9937

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

OT	9946	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo											
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Brazo galvanizado 2 mts	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 4	Cable Aluminio # 6	Cable cobre # 10
107635	CALLE 114 CON CARRERA 22B, provenza	8	3	U	1	1							se realiza cableado subterráneo para habilitar 6 luminarias de 58w												12	
Cantidades			3		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #:		9946	
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	1	3	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0

3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-7 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9946

OT	9944	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Luminaria Deltaled 101W	Luminaria Deltaled 123W	Luminaria Deltaled 127W	Luminaria Deltaled 135W
107688	calle 45, campo hermoso	8	2	U	1	1							se recoge posta metálico que un bus urbano estrello y tumbo en el sitio no se encontraron luminarias ni cableado ya lo habían hurtado	BA 116601									
107649	cancha diamante 1	1		U	1		1						se revisa sitio y se encuntra normal										
107634	la pedragosa, Cr 34 # 90	2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria se instala celsa led de 123w	BA116544							1		
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria se instala celsa led de 123w	BA116744							1		
		2	0,5	U	1	1							cambio de luminaria se instala celsa led de 123w	BA124030							1		
Cantidades			3,5		**5**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA							CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #:		9944	
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	1	2	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	3	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	3	1,5	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	3	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1,5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1,5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**150,0 %**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-8 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9944

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

OT	9958	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Contactor	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W	Luminaria Sepialed II 140W	Protección automática 3*100 A	Protección automática 3*60 A
107707	CALLE 96 CON CARRERA 13A ESQUINASAN LUIS	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla										
107698	calle 70 #17 y 18 parque del barrioNUEVA GRANADA	2	0,5	U	1	1							se instala luminaria de 111 w							1			
107689	CAFE VIA CHIMITA - GIRONCAFE MADRID	1	2	U	1	1							se realiza cambio de control se instala un contactor de 50 amperios y queda en normal funcionamiento se habilita tramo 4					1					1
Cantidades			2,5		**3**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 0**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	2	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	3	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	0,5	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	2	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	2,5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	2	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	2,5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**####**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-9 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9958

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

OT	9965		Atención		Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W
107712	villa rosa cancha cosmos	1	1	U	1	1							se realiza cambio de horario en la cancha cosmos de villa rosa instrucciones dadas por el in Javier de AP								
Cantidades			1		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #:	9965		
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminacion	1	1	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0

5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-10 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 9965

OT	**10007**	**Atención**			**Estado reporte**									**Estado Punto Luminoso**	**Material nuevo**														
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana O Rural**	**A- asignado**	**B-Solucionado**	**C-Repetido**	**D-Falta de información**	**E-Otros Entes**	**F-Falta de material**	**G-Otros Motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo /**	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Conector penetración	Conector transversal	Luminaria Deltaled 44W	Luminaria Deltaled 80W	Luminaria Koreled 40W	Luminaria Microled 32W	Luminaria Microled 39W	Luminaria Microled 50W	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	luminaria de 92 W, celcia	Luminaria Sepialed II 88W	Manguera corrugada 3/4"
108004	CRA 60A NO 65-48 CANCHASLOS CANELOS	3	4	U	1	1							realizaron el cambio de linea neutro con tierra, para habilitar luminarias																		
108003	CALLE 69#10C-73 BARRIO PABLO VIPABLO VI	2		U	1							1	pendiente por fin de mes																	
108000	CRA 10B #66-11PABLO VI	2	1	U	1	1							se realiza ajuste de conexiones y se habilitan dos luminarias	BA 1788222			2													

107999	CRA 10 64A 13 PEATONAL CORDONCILLO	2		U	1							1	pendiente por fin de mes																
107996	CALLE 63 10 04LOS CANELOS	2		U	1		1						solucionado con el reporte 107660																
107947	PARQUE CANELOSLOS CANELOS	2	0,5	U	1	1							se soluciona, pero la ESSA debe realizar intervencion																
107814	Carrera 6 No. 65A-02LOS CANELOS	2	0,5	U	1	1							Luminaria Celsa 58W BA114952 se reemplaza por DxPro 90W BA178430	BA178430												1				
		2	0,5	U	1	1							Luminaria fuera de servicio Celsa 55W BA114983 cambiada por Celsa 88 W con BA063645	BA063645														1		
107660	carrera 2a# 65b -23LOS CANELOS	2	0,5	U	1	1							se habilitan 5 luminarias habilitadas por red aunque la luminaria BA114465 no encendió de tal manera que la cambiaron por Celsa 88W ? con BA063646	BA063646														1		
107614	CARRERA 5 # 65B-34LOS CANELOS	4	0,5	U	1	1							Realizan cambio de luminaria reportada intermitente Celsa 58W P2-1 por Celsa 44W ?, conservaron la misma demarcación BA114980 apoyo 143813	BA114980						1										
Cantidades			7,5		**10**	**7**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**2**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**2**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA							**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 0**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	9	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2
2	Luminaria apagada	5	3	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	6	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	3,5
3	Circuito apagado	1	4	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	1	0,5	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	6	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	3,5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**75,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-11 Reporte total material utilizado Cuadrilla 1 OT 10007

5.1.2 Relación material utilizado cuadrilla 2

OT	9920	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Cable Aluminio # 4	Cable Aluminio # 6	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
107525	QUEBRADASECA CARRERA 15 HASTA LA 18CENTRO	1	0,5	U	1	1							SE REALIZA VISITE TECNICA ENCONTRANDO SECTOR APAGADO SE REVISA TEBLERO ENCONTRANDO PROTECCIONES DISPARADA					108				
Cantidades			0		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**108**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**% DE ATENCIÓN OT #:**	**9920**		
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	0,5	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo eléctrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminaria Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestructura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposición de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-12 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9920

OT	9922	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo							
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Brazo galvanizado 2 mts	Cable encauchetado 3*12	Cable encauchetado 3*14	Collarín 5-6"	Collarín 6-7"	Luminaria DX-PRO 50W
107527	CALLE 59 #10B-07 ENTRADA NOGAL 2EL NOGAL	1	2	U	1	1							SE INSTALA LUMINARIA DE 50W DX PRO	BA181434		1			7,5		2	1
													PUNTO NUEVO DE INSTALA BRAZO COLLARINES CONECTORES 35 MTS DE CABLE DUPLEX 50 DXPRO	BA181301		1					2	1
													PUNTO NUEVO 50 DX PRO	BA180989		1					2	1
													PUNTO NUEVO DE 50 W DX PRO	BA181083		1					2	1
Cantidades			2	U	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**4**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**	**4**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**% DE ATENCIÓN OT #:**		**9922**	
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	2	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-13 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9922

OT	9856	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo										
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Conector Ap2	Driver 100w	Esparrago 5/8*12	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	Luminaria Microled 55W	Luminaria Sepialed 58W
107608	CALLE 103 BIS CON CRA 16 KIOSCOVILLA ALICIA	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla													
107601	CALLE 117 CON 20 VEHICULAR PRINCIPALPROVENZA	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla													
107391	SECTOR CRISTAL BAJOEL CRISTAL	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla													
107373	OREJA PUENTE PROVENZA AL SUR	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla													
107218	PEATONAL ENTRE LA MANZA F, Y E.BRISAS DEL PARAISO	2	0,5	U	1	1							se retira de 111 se instala de 90 w DX pro	BA178691									1		
107181	CALLE 109 NO.15-67 URB VILLAREAL	2	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 50 w DX pro	BA181285								1				
		2	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 60 w DX pro	BA178972									1		
107176	JUNTA DE ACCION COMUNAL PUNTA PARAISO	7		U	1				1				se requiere cuadrilla de podas													
107172	CALLE 104F - 15-21 BARRIO VILLA CANDADOVILLA CANDADO	7		U	1				1				se requiere cuadrilla de podas													

107165	VARIAS DIRECCIONES PROVENZA	1	0,5	U	1	1							se realiza cambio de driver	BA052477					1						
107154	CALLE 117 CON 20 COMULTRASAN ETAPA 5GRANJAS DE PROVENZA	2		U	1							1	red de media tensión cerca												
107142	CRA 11C NO. 104B - 08MANUELA BELTRAN	1	0,5	U	1	1							se retira de 55 w se instala de 50 w DX pro	BA181280							1				
107105	CALLE 125 CRA 19 BIS -01EL CRISTAL	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla												
107098	EN TODO EL SECTOR LUZ DESALVACION	1	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 60 w DX pro	BA183919								1			
		1	0,5	U	1	1							se retira de 40 w se instala de 60 w DX pro	BA183960								1			
		1	0,5	U	1	1							se retira de 40 w se instala de 55 w	BA122680									1		
		1	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 60 w DX pro	BA179161											1
		1	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 58 w led	BA122668											1
		1	0,5	U	1	1							se realiza conexión de red reventada	BA122711				2							
		1	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 60 w DX pro	BA178838								1			
		1	0,3	U	1	1							se realiza cambio de foto celda	BA122730						1					
		1	0,5	U	1	1							se retira de 67 w se instala de 60 w DX pro	BA178908								1			
		1	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 60 w DX pro	BA183914								1			
107074	CALLE 89 NO. 21-66DIAMANTE II	2	0,5	U	1	1							se retira de 80 w se instala de 90 w DX pro	BA178308									1		

		2	0,5	U	1	1							se retira de 80 w se instala de 90 DX pro	BA178584									1		
107066	CRA. 24 #7934, LA VICTORIADIAMANTE II	1		U	1							1	se realiza visita técnica encontrando sector apagado por red la alimentación proviene del 3 carril pendiente por contratista												
107025	PARTE BAJA PEATONAL 2 CASA 50 LUZ DESALVACION	2	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 50 w DX pro	BA181296								1			
107007	SECTOR E PEATONAL 3 AL LADO DE LA CASA 43 LUZ DESALVACION	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla												
107003	CARRERA 23C #107-24PROVENZA	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla												
107002	PEATONAL 8 CASA 118 SECTOR DE LUZ DESALVACION	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla												
106994	LUZ DE SALVACION 2 PEATONAL 3 SECTOR C - CASA 19LUZ DESALVACION	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla												
106993	CALLE 100 #23-17PROVENZA	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla												
106964	Conjunto Residencial Multifamiliar Ciudad Neptuno - Diamante 2 (Cra 24 No. 80-12)	1		U	1							1	se realiza visita técnica encontrando sector apagado por red la alimentación proviene del 3 carril pendiente por contratista												
Cantidades			8,8		**33**	**18**	**10**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**1**	**3**	**6**	**3**	**1**	**2**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**% DE ATENCIÓN OT #: 9856**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	12	5,8	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	22	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	3
2	Luminaria apagada	6	3	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	15	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	7,3
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	15	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	7,3
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	10	**% DE CUMPLIMIENTO**	**125,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-14 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9856

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

OT	9848	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable encauchetado 3*14	Collarín 6-7"	Fotocelda	Luminaria DX-PRO 50W	Percha 1 puestos	Arrancador 70W	Arrancador 150/400W
107711	parque luis calle 89a y 89b #17bSAN LUIS	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla										
107642	SECTOR DE COCACOLA APAGADOBUCARAMANGA	10	32	U	1	1							SE REALIZA VISITA TECNICA ENCONTRANDO SECTOR CON REDES EN CORTO CIRCUITO SE PROCEDE A SU REVICION MAYO 16,17,20, Y 21										
107639	PUENTE DE PROVENZABRISAS DE PROVENZA	1	16	U	1	1							se realiza visita técnica encontrando red en corto circuito mayo 6y 7 se retira poste metálico se instala punto nuevo de iluminación se programa timer		1	1	6	2	1	1	1		
107637	CRISTAL BAJO SECTOR 3 MZ B FRENTE CASA 16EL CRISTAL	2	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 50 w DX pro	BA181050						1			
		2	0,5	U	1	1							se retira de 58 w se instala de 50 w DX pro	BA181457						1			
Cantidades			0	U	**5**	**4**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Material nuevo**	**1**	**1**	**6**	**2**	**1**	**3**	**1**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**% DE ATENCIÓN OT #: 9848**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	16	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	2	1	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	4	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	49,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	1	32	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	4	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	49,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**133,3 %**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-15 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9848

OT	9953	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo					
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo / Observación	Aislador tipo carrete	Protección automática 2*40 A	Protección automática 3*100 A	Protección automática 3*60 A	Arrancador 70W	Arrancador 150/400W
107706	PARQUE LA CEIBALA CEIBA	8	2	U	1	1							se realiza visita técnica encontrando red encorto circuito se realiza organizado de tablero y inspección de cajas dejando breker de 40 amp			1				
107662	ENTRADA PROVINCIA DE SOTO 2EL PORVENIR	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla							
Cantidades			2		**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA

% DE ATENCIÓN OT #: 9953

Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	1	2	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0

4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-16 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9953

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

OT	9964	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo										
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Fotocelda	Fusible 5A	Fusible de vidrio	Fusible tipo hilo 2 Amp	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"	Arrancador 70W	Arrancador 150/400W
107730	CANCHA - GRANJA 55GRANJAS DE JULIO RINCON	1	1,5	U	1	1							SE REALIZA VISITA TECNICA ENCONTRANDO CANCHA APAGADA SE REALIZA REVISION ENCONTRANDO RED REVENTEDA	BA153874		1										
107708	cancha basketballCAMPO HERMOSO	1	4,5	U	1	1							SE REALIZA VISITA TECNICA ENCONTRANDO RED REVENTADA SE REALIZA excavación para encontrar el daño	BA064105										
Cantidades			4,5		**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Material nuevo**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**% DE ATENCIÓN OT #: 9964**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	2	6	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-17 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9964

OT	**9969**	**Atención**			**Estado reporte**									**Estado Punto Luminoso**	**Material nuevo**								
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana O Rural**	**A- asignado**	**B-Solucionado**	**C-Repetido**	**D-Falta de información**	**E-Otros Entes**	**F-Falta de material**	**G-Otros Motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo /**	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Brazo galvanizado 2,5 mts	Cable Aluminio # 1/0	Cable Aluminio # 4	Cable Aluminio # 6
107775	cancha micro kenidy	1	2	U	1	1							se realiza visita técnica encontrando cancha apagada por red reventada										24

107719	cancha maria paz	1	1,5	U	1	1							se realiza visita técnica encontrando cancha apagada encontrando falla en la micro SD	apoyo 8660417								
	Cantidades		3,5		**2**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA										**% DE ATENCIÓN OT #: 9969**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**		**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	2	3,5	**8**		Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**		Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1,5
3	Circuito apagado	0	0	**10**		Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**		Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1,5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**		Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,5**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**		Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**					Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-18 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9969

CONSORCIO CIVING
NIT 901719756-5

INFORME N°8

MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1

DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024

OT	9973	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable encauchetado 3*14	Conector penetración	Conector transversal	Conector tubular #2	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria Sepialed 58W M4-1	Varilla cobre 2.4*5/8"
107882	PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO SAN LUIS CALLE 89A Y 89B CON CRA 17B Y 17CSAN LUIS	1		U	1							1	por fin de mes										
107741	CANCHA BARRIO SANTANDER .. CANCHA PRINICPALGIRARDOT	2		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla										
107739	CAFE VIA CHIMITA - GIRONCAFE MADRID	1	1	U	1								se realiza visita técnica encontrando breaker disparado se normaliza										
107685	CARRERA 21B #115 CASA 29GRANJAS DE PROVENZA	1	8	U	1								MAYO 23 Y 24 SE REALIZA VISITA TECNICA ENCONTRANDO SECTOR CON POCA LUMINOSIDAD SE INSTALA POSTE Y PUNTO NUEVO	BA181252		1	6	2			1		
107684	CALLE 104 CON 8 FRENTE A LA IGLESIAEL PORVENIR	1		U	1								SE REALIZA AJUSTE DE CONEXION	BA119258									
		4	1	U	1								SE RETIRA DE 58 W SE INSTALA DE 58 W LED	BA120174								1	
Cantidades			10		**6**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**		**Material nuevo**	**0**	**1**	**6**	**2**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**% DE ATENCIÓN OT #:**		**9973**	
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	5	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	1
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-19 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 9973

OT	10005	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Borneras	Brazo galvanizado 1 mt	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 6-7"	Conector penetración	Luminaria DX-PRO 60W	Percha 1 puestos	Varilla cobre 2.4*5/8"
107983	CRA 30 CON CALLE 101LAS CASITAS	1	1,5	U	1	1							se encuentra luminaria intermitente se realiza conexión	BA154440											
107910	PARQUE CRA 15 Y 16 CON 119BRISAS DEL PARAISO	1		U	1		1						solucionado en otra orden												
107904	CRA 11 D # 104A - 21MANUELA BELTRAN	4	1,75	U	1	1							se cambia luminaria por DX PRO de 60 W	BA178895									1		
107819	CARRERA 16 ,17, 20WLA GRAN LADERA	2	0,5	U	1	1							se cambia luminaria por DX PRO de 60 W	BA177311									1		
107773	CALLE 104F CON 8EL PORVENIR												se realiza conexión de red conectores quemados									2			
107623	CRA 15 W NO. 66-53LA GRAN LADERA	1	20	1	1								se instala punto nuevo poste metálico cable luminaria de 60 w DX pro	BA178742	1	1		1	156	14	2	2	1	1	
													se instala punto nuevo poste metálico cable luminaria de 60 w DX pro	BA183893	1			1			2		1	1	
													se instala punto nuevo poste metálico cable luminaria de 60 w DX pro	BA178886	1			1			2	2	1	1	
													se instala punto nuevo poste metálico cable luminaria de 60 w DX pro	BA183905	1			1			2		1	1	

												se instala punto nuevo poste metálico cable luminaria de 60 w DX pro	BA179782	1			1			2	2	1	1	
												se instala punto nuevo poste metálico cable luminaria de 60 w DX pro	BA179034	1			1			2		1	1	
Cantidades			23,8		**5**	**3**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Material nuevo**	**6**	**1**	**0**	**6**	**156**	**14**	**12**	**8**	**8**	**6**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA									**% DE ATENCIÓN OT #: 10005**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	1	1,5	**8**	Daño infraestrutura	0	0	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	6	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	0,5	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	3	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	3,8
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	1	1,75	**11**	Robo infraestrutura	0	0	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	3	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	3,8
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**60,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-20 Reporte total material utilizado Cuadrilla 2 OT 10005

5.1.3 Relación material utilizado cuadrilla 3

OT	9926	Atención			Estado reporte									Estado Punto Luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W	Borneras
107566	PARQUE DEL CACIQUE LAGOS DEL CACIQUE	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla										
107565	CANCHA SAN GERARDO II	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla										
107564	CALLE 103 NO. 21-27PROVENZA	7		U	1				1				se requiere podas										
107563	CALLE 35 NO. 12-31GARCIA ROVIRA	1	0,5	U	1	1							circuito disparado ,,,,,solucionado										
107562	TABLERO TTT	1	0,5	U	1	1							circuito disparado ,,,,,solucionado										
107561	AP PARQUE BRUNO BATELLO R7MUTIS	1	0,5	U	1	1							circuito disparado										
107560	QUEBRADA SECA CRA 15 CENTRO	1		U	1	1							circuito disparado ,,,,,solucionado										
107559	CALLE DE LOS ESTUDIANTES CIUDADE LA REAL DE MINAS	1		U	1	1							circuito disparado ,,,,,solucionado										
107557	PARQUE MORRO RRICOMORRORICO	1		U	1	1							luminarias encendidas sin ningún problema										
107556	TANQUE CABECERA CABECERA DEL LLANO	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla										

107555	PARQUE DEL BOSQUE ENCANTADOALVAREZ	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla								
107554	PARQUE LA FLORA TERRAZAS	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla								
107553	CANCHA CRISTO REYCO MUNEROS	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla								
107552	A.P. PASEO DEL COMERCIO CRA 13 CON 34CENTRO	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla								
107551	CANCHA PIZARRO LA ULTIMAGALAN	1		U	1		1						solucionado por otra cuadrilla								
Cantidades			1,5	U	**15**	**6**	**8**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**		**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #:**		**9926**	
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	6	1,5	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	15	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	6	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	1,5
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	6	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	1,5
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	8	**% DE CUMPLIMIENTO**	**85,7%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-21 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9926

OT	9931	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo													
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable encauchetado 3*14	Collarín 6-7"	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Proyector Led 600W	Socket Bipin G12	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
107580	CALLE 55 CON CRA 1 Y 2LOS LAURELES	1		U	1	1							luminarias encienden con normalidad, usuario pide se le instale mas luminarias.															
107575	CARRERA 19 CON 61A ESQUINAPRADOS DEL MUTIS	1	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led 111w BA131833 por Dxpro 50w BA181564	BA181564					1									
	cra 19 #61-01 esq. barrio Prados del Mutis	1	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led 111w BA131827 por Dxpro 50w BA181177	BA181177					1									
		1	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led 111w BA132191 por Dxpro 50w BA181418	BA181418					1									
107574	cra 3w 57-47 centro de salud barrio Mutis	2	0,5	U	1	1							se instaló luminaria nueva Dxpro 50w 181590	BA181590		1	3	2										
	cra 3w 57-21 centro de salud barrio Mutis	2	0,5	U	1	1							se instalo luminaria nueva Dxpro 50w 181471	BA 181471		1	3	2										
	cra 3w 57-21 centro de salud barrio Mutis	2	0,5	U	1	1							se instalo luminaria nueva Dxpro 50w 181590, se gasto cra 3w 57-21 centro de salud barrio Mutis	BA 181590		1	3											
107521	CALLE 70 ENTRE 28A , 29 , 29A,30 Y 31ANTONIA SANTOS SUR	1		U	1	1							se hace un recorrido por la dirección indicada y podemos ver que las luminarias están todas encendidas y con buena intensidad															
Cantidades			3		**8**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Material nuevo**	**0**	**3**	**9**	**4**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 9931**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	5	1,5	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	3	1,5	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-22 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9931

OT	9980	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo												
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 6-7"	Luminaria DX-PRO 50W	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	luminaria de 92 W, celcia	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed 16W	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
107545	parque de granjas de Provenza GRANJAS DE PROVENZA	2		U	1							1	cambio de luminarias, pero no hay de esas luminarias	BA063452													
107500	CALLE 96 CON CARRERA 13ACONQUISTADORES	2		U	1		1						reporte repetido con reporte 107281														
107499	CARRERA 3W 57 MUTIS CENTROMUTIS	2		U	1		1						ya se soluciono con la OT 9931 reporte 107574														
107455	CRA 11B CON 104 CANCHAMANUELA BELTRAN	2	1	U	1	1							timer desconfigurado, se configura y se programa a las 6 pm hasta las 10 pm														
107440	CANCHA DE SOFTBOLLMUTIS	2		U	1		1						reporte ya solucionado														
107413	cll 59 cra 25w barrio Manzanares	2	0,3	U	1	1							se revisa luminaria, funciona correctamente BA131346	BA131346													
	Dir. cll 59 cra 27w barrio Manzanares	2	0,3	U	1	1							se revisa luminaria, se ajustan conectores BA133054	BA133054													
	Dir. cll 59 cra 30w barrio Manzanares	2	0,3	U	1	1							se revisa luminaria, funciona correctamente BA132231	BA132231													
	Dir. cll 60 cra 26w barrio Manzanares	2	0,3	U	1	1							se direcciona luminaria BA133176	BA133176													
107409	CALLE 85 # 58-04 DIAMANTE	2		U	1				1				se requiere poda														

107403	Avenida 88 Transversal 23D N° 87 - 28, Barrio Diamante IIDIAMANTE II	2		U	1				1				se requiere poda													
107315	CARRERA 15 #92-164 UNICO ACCESO AL CONJUNTO NUEVA FORESTACIUDAD VENECIA	2		U	1				1				obra no se ha entregado a AP por autorización de interventoría no se puede intervenir													
107281	CANCHA TIERRA CIUDAD VENECIACIUDAD VENECIA	1	2	U	1	1							luminaria sin red del poste #121787 hasta el poste #119833	#121787 al #119833			38									
	Dir. cll 94 #14a-42 barrio Ciudad Venecia.	1	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led intermitente 49w BA122214 por Dxpro 60w	BA180441						1						
	cancha de tierra barrio Ciudad Venecia.	1	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led intermitente 55w BA122211 por Dxpro 60w BA179110	BA179110						1						
	cll 96 cra 13a Ciudad Venecia.	1	0,5	U	1	1							linea rota del poste #119855 al poste #119879 se habilita una luminaria	#119855 al #119879			2									
107256	CALLE 104F - 15-21 BARRIO VILLA CANDADO VILLA	7		U	1				1				se requiere poda													
107245	ENTRADA POR BRISAS A LUZ DESALVACIÓN PARTE ALTALUZ DESALVACION	2	2	U	1	1							linea robada, se gasta 47mt aluminio desde el poste #9979140 hasta el poste 4057716	#9979140 al 4057716			47									
		2	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led 58w BA122716 por baja intensidad por Dxpro 60w BA17967	BA17967						1						
		2	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led 58w BA122712 por baja intensidad por Dxpro 60w BA179384	BA179384						1						
107222	CARRERA 22D A LA 24 ENTRE 107 Y 108BRISAS DE PROVENZA	1		U	1						1		no se encontró luminaria de sodio y el usuario no contesto													

107214	CALLE 89 A # 17 C - 61 B. SAN LUISSAN LUIS	2	0,5	U	1	1							se realiza reemplazo de luminaria con baja intensidad lumica Celsa 58w BA 118198 por Dxpro de 60w BA 178883	BA 178883							1						
		2	0,5	U	1	1							se remplaza reflector Silvania 200w BA 146178 por reflector Dxpro 90w BA182328	BA182328										1			
		2	0,5	U	1	1							se remplaza reflector Silvania 200w BA 145878 por reflector Dxpro 90w BA181888	BA181888										1			
		2	0,5	U	1	1							se remplaza reflector Silvania 200w BA 145828 por reflector Dxpro 90w BA182237	BA182237										1			
		2	0,5	U	1	1							se realiza traslado de poste metálico 8mt para instalación de punto nuevo con luminaria Dxpro 60w BA179442	BA179442				16			1						
		2	0,5	U	1	1							se cambia luminaria sodio 70w BA036973 por Dxpro 60w BA179109,	BA179109		1		3	2		1						
		2	0,5	U	1	1							se cambia luminaria sodio 70w BA06255 por Dxpro 60w BA17888	BA178888		1		3			1						
		2	0,5	U	1	1							se instala reflector 90w BA182219	BA182219				6						1			
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w BA 118213 por Dxpro 60w BA 178856	BA 178856							1						
107137	barrio cristal AltoEL CRISTAL	2	0,5	U	1	1							se cambia led 55w BA 121034 dañada por Dxpro 50w BA 181479	BA 181479						1							

		2	0,5	U	1	1							se cambia led 55w BA 121061 dañada por Dxpro 50w BA 181431	BA 181431						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w BA 120932 dañada por Dxpro 50w BA 181152	BA 181152						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w BA 121051 dañada por Dxpro 50w BA 181287	BA 181287						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w BA 121038 por Dxpro 50w BA 181592	BA 181592						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w BA 121071 por Dxpro 50w BA 181599	BA 181599						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w BA 121075 por Dxpro 50w BA 180938	BA 180938						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w BA 121074 por Dxpro 50w BA 181080	BA 181080						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 80w 061657 por Dxpro 50w BA 181326	BA 181326						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w 061657 por Dxpro 50w BA181639	BA181639						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w 121071 por Dxpro 50w BA181250	BA181250						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w 121081 por Dxpro 50w BA 181801	BA 181801						1							
		2	0,5	U	1	1							se cambia led 58w 120946 por Dxpro 50w BA 181112	BA 181112						1							
106808	parque diagonal al CAI de ciudad Venecia CIUDAD VENECIA	2		U	1							1	se hace visita técnica usuario pide la instalación de mas luminarias, pero no hay postes ni brazos en AP														

106548	CALLE 107 CON CARRERA 23DPROVENZA	2	0,5	U	1	1							se cambia ornamental sodio 70w BA 039571 por led Celsa 16w BA 172440	BA 172440											1		
	Dir. cra 23C #107-24 barrio Provenza.	2	0,5	U	1	1							se cambia ornamental sodio 70w BA 039580 por led Celsa 16w BA 172441	BA 172441											1		
	Dir. cra 24 #107-40 barrio Provenza.	2	0,5	U	1	1							se cambia ornamental sodio 70w BA 045589 por led Celsa 16w BA 172442	BA 172442											1		
	Dir. cra 24 #107-24 barrio Provenza.	2	0,5	U	1	1							15/05 se cambia ornamental sodio 70w BA 045585 por led Celsa 16w BA172443	BA172443											1		
106509	CARRERA 24A #117-18PROVENZA	2	0,5	U	1	1							se cambio luminaria de sodio 70w BA038140 por led Celsa 16w BA172444	BA172444											1		
105886	CASA 11GRANJAS DE JULIO RINCON	2		U	1		1						solucionado														
105714	C 105 # 15BIS - 25DANGON	2		U	1		1						repetido con reporte 105713														
105713	C 105 # 15BIS - 25DANGON	2		U	1		1						solucionado														
86773	AP Cristal bajoEL CRISTAL	2		U	1		1						solucionado														
Cantidades			22		**53**	**39**	**7**	**0**	**4**	**0**	**1**	**2**		**Material nuevo**	**0**	**2**	**87**	**28**	**2**	**13**	**9**	**0**	**0**	**4**	**5**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 9980**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	4	3,5	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	16	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	2
2	Luminaria apagada	35	18,7	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	34	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	22,2
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	34	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	22,2
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	7	**% DE CUMPLIMIENTO**	**####**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-23 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9980

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

OT	9939	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo											
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 6-7"	Conector penetración	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria DX-PRO 90W	luminaria de 92 W, celcia	Reflector DX-PRO 90W	Percha 1 puestos	Varilla cobre 2.4*5/8"
107626	CALLE 70 #63-15ASENTAMIENTO JUAN XXIII	1		U	1						1		no se pudo instalar el reflector ya que el dueño de la casa no dio el permiso.													
107217	EN LA ESCUELAASENTAMIENTO JUAN XXIII	1	2	U	1	1							se instala 1 poste metálico de 6mt , se gasta 1 luminaria Dxpro 60w BA 179160	BA 179160	1	1	42	3	2	2	1				1	
		1	0,5	U	1	1							se cambia led intermitente 55w BA 114823 por Dxpro 60w BA178818	BA178818							1					
		1	0,5	U	1	1							se instala 1 poste metálicos de 8mt, se gasta 1 Dxpro 60w BA 178770	BA 178770		1	40	3	2	2	1					
		1	2	U	1	1							se instala 1 poste metálicos de 8mt, se gasta 1 Dxpro 60w BA 178998	BA 178998		1	45	3	2	2	1					
		1	1	U	1	1							se instala reflector 90w BA 182059	BA 182059				3						1		
Cantidades			6	U	6	5	0	0	0	0	1	0		**Material nuevo**	**1**	**3**	**127**	**12**	**6**	**6**	**4**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 9939**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	5	6	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	5	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	6,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	5	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	6,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**####**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-24 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9939

OT	9966	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Luminaria DX-PRO 60W
107713	diag. 19 callé 123a Barrio Luz de Salvación parte alta	4	0,5	U	1	1							se cambia led 50w BA120923 por Dxpro 60w BA178713	BA178713							1
Cantidades			0,5		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9966			
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminacion	0	0	8	Daño infraestrutura	0	0	A	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	9	Deterioro infraestructura	0	0	B	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	10	Riesgo electrico	0	0	C	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	1	0,5	11	Robo infraestrutura	0	0	D	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	12	Reposicion de redes	0	0	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	13	Telegestión	0	0	F	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	14				G	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-25 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9966

OT	9993	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo												
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (h)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 2*1	Collarín 6-7"	Conector penetración	Fusible 5A	Luminaria DX-PRO 60W	Reflector DX-PRO 90W	Luminaria Sepialed II 90W	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
107906	CARRERA 19W #60-03PRADOS DEL MUTIS	2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050153, por reflector Dxpro 90w BA 182242	BA 182242										1			
		2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050154, por reflector Dxpro 90w BA 182256	BA 182256										1			
		2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050152, por reflector Dxpro 90w BA 18212	BA 18212										1			
		2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050300, por reflector Dxpro 90w BA 182033	BA 182033										1			
		2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050304, por reflector Dxpro 90w BA 182261	BA 182261										1			
		2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050303, por reflector Dxpro 90w BA 181968	BA 181968										1			

		2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050302, por reflector Dxpro 90w BA 182282	BA 182282									1			
		2	1	U	1	1							se cambia reflector de sodio 150w BA 050301, por reflector Dxpro 90w BA 184372	BA 184372									1			
107872	CARRERA 33 #86-76 CONJUNTO CONDOMINIO CACIQUESAN MARTIN	2		U	1						1		el condominio no permite que se le instale cableado aéreo por el frente del conjunto por tal razón no se ejecuta labor													
107821	CANCHA FUTBOLESTORAQUES	2	1	U	1	1							se instala poste metálico de 10mt segunda, 2 reflectores 90w.		1		44	2		2			2	1		
		2	1	U	1	1							se instala poste metálico de 10mt segunda, 2 reflectores 90w.		1		52	3		2			2	1		
107819	CARRERA 16 ,17, 20WLA GRAN LADERA	2		U	1					1			Queda pendiente por material													
107817	CALLE 59 ENTRE 28 Y 30MANZANARES	2	1	U	1	1							se instala luminaria nueva Dxpro 60w BA178804	BA178804		1		5	2	2		1				
		2	1	U	1	1							se ajusta conexión luminaria led 16w BA 146469	BA 146469							2					
		2	1	U	1	1							se instalo luminaria Dxpro 60w BA 179066	BA 179066		1	22	3	2	2						
Cantidades			7	U	**15**	**13**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**2**	**118**	**13**	**4**	**8**	**2**	**1**	**12**	**2**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9993			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	5	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	13	6,5	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-26 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9993

OT	9974	Atención			Estado reporte								Estado punto luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
107742	Girardot calle 23 13 29	2	1	U	1	1							lampara desconectada										
Cantidades			1	U	1	1	0	0	0	0	0	0		Material nuevo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9974			
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminacion	0	0	8	Daño infraestrutura	0	0	A	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	0,5	9	Deterioro infraestructura	0	0	B	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	10	Riesgo electrico	0	0	C	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	11	Robo infraestrutura	0	0	D	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	12	Reposicion de redes	0	0	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	13	Telegestión	0	0	F	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	14				G	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-27 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9974

OT	9976	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W
107744	parque del barrio San Luis	1	1	U	1	1							circuito disparado se hace la verificación de lugar y se soluciona. habilitándose 9 luminarias								
Cantidades			1		**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 9976			
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminacion	1	1	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-28 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9976

OT	9985	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W
107843	monte redondo	1	0,5	U	1	1							adición de carga a circuito 7y 8 solucionado								
Cantidades			0,5	U	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**Material nuevo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA

Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)
1	Zona sin iluminacion	1	0,5	**8**	Daño infraestrutura	0	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0
7	Podas	0	0	**14**			

CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES

Estados	Descripción
A	Reportes Asignados
B	Reportes Solucionados
C	Reportes repetidos o ya ejecutados
D	Reportes no ejecutados por falta de información
E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes
F	Reportes no ejecutados por falta de material
G	Reportes no ejecutados por otros motivos

% DE ATENCIÓN OT #: 9985

Descripción	Cant	Descripción	Cant
# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
Observaciones:			

Tabla 5-29 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 9985

OT	10013	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo								
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 6-7"	Conector penetración	Luminaria DX-PRO 60W	Percha 1 puestos	Varilla cobre 2.4*5/8"
107964	Dir. 69 #10 oc-36 barrio 20 de julio	5	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led de 58w baja intensidad BA 114780 por Dxpro 60w BA 178884	BA 178884		1					1		
		5	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led de 58w baja intensidad BA 114793 por Dxpro 60w BA 178726	BA 178726							1		
		5	0,5	U	1	1							se cambia luminaria led de 58w baja intensidad BA 115455 por Dxpro 60w BA 179053	BA 179053		1					1		
		2	0,5	U	1	1							se instalan luminaria Dxpro 60w BA 178822	BA 178822		1	70	3	2	2	1		
		2	0,5	U	1	1							se instalan luminaria Dxpro 60w BA 179009	BA 179009		1		3		2	1		
		2	0,5	U	1	1							se instalan luminaria Dxpro 60w BA 178774,	BA 178774		1		3			1		
		2	0,5	U	1	1							se instala Dxpro 60w BA 179392	BA 179392		1		6	2		1		
		2	0,5	U	1	1							se instala Dxpro 60w BA 179388	BA 179388		1	51	3	2	2	1		
		2	0,5	U	1	1							se instala Dxpro 60w BA 179062	BA 179062		1		3	2	2	1		
		2	0,5	U	1	1							se instala Dxpro 60w BA 179283	BA 179283	1	1		3			1	1	
		2	0,5	U	1	1							se ajusta conexión BA 179062		1			4		2		1	
		2	0,5	U	1	1							cambio led 58w 114776 por Dxpro 60w BA 179692	BA 179692		1				2	1		
		2	0,5	U	1	1							cambia led 58w 114802 por Dxpro 60w BA 178748	BA 178748		1		6	2	2	1		
		2	0,5	U	1	1							cambio led 50w 114816 por Dxpro 60w BA 179592	BA 179592		1				2	1		
Cantidades			7		**14**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**2**	**12**	**121**	**34**	**10**	**16**	**13**	**2**	**0**

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA							CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 10013			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	11	5,5	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	0	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	0,0
5	Luminaria con baja intensidad	3	1,5	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**0,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-30 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10013

OT	10015	Atención			Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo									
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Brazo galvanizado 1,5 mts	Cable Aluminio # 6	Cable encauchetado 3*14	Collarín 6-7"	Collarín 7-8"	Conector penetración	Luminaria DX-PRO 60W	Luminaria Sepialed II 106W	Luminaria Sepialed II 111W
107301	TODA LA VEREDAVEREDA SAN CAYETANO	1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 041598 por Celsa 106w BA 172445	BA 172445		1		3	2		2		1	
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 16017 por Celsa 106w BA 172446	BA 172446		1		3	2		2		1	
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 049021por Celsa 106w BA 179557	BA 179557		1		3	2		2		1	
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 049021por Celsa 111w BA 169558	BA 169558		1		3	2		2			1
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 049022 por Celsa 106w BA 169559	BA 169559		1		3	2		2		1	
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 049023 por Celsa 111w BA 169560	BA 169560		1		3	2		2			1
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w sin BA por Celsa 106w BA 169561	BA 169561		1		3	2		2		1	
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 16015 por Dxpro 60w BA 180544 gasta	BA 180544		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 16014 por Dxpro 60w BA 180760	BA 180760		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 038862 por Dxpro 60w BA 180710	BA 180710		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 041595 por Dxpro 60w BA 180705	BA 180705		1		3	2		2	1		

		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 16013por Dxpro 60w BA 180293	BA 180293		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 16012 por Dxpro 60w BA 180772	BA 180772		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 16011 por Dxpro 60w BA 180602	BA 180602		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambiamos sodio 70w BA 049024 por Dxpro 60w BA 180680	BA 180680		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							modern. sodio 70w BA 049025 por Dxpro 60w BA 180759	BA 180759		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se modern. sodio 70w BA por Dxpro 60w BA 180624 gasta	BA 180624		1	57	3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 049028 por Dxpro 60w BA 180766	BA 180766		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 049061 por Dxpro 60w BA 180594	BA 180594		1		3	2		2	1		
105819	varios sectores VEREDA SAN CAYETANO	1	0,5	R	1	1							se modern. sodio 70w BA 049030 por Dxpro 60w BA 180817	BA 180817		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se modern. sodio 70w BA 16010 por Dxpro 60w BA 179425	BA 179425		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se modern. sodio 70w BA 041680 por Dxpro 60w BA 180897	BA 180897		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se modern. sodio 70w BA 041682 por Dxpro 60w BA 180657	BA 180657		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se modern. sodio 70w BA 041678 por Celsa M2-1 111w BA 16952	BA 16952		1		3	2		2			1
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 16009 por Dxpro 60w BA 179418	BA 179418		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 16008 por Dxpro 60w BA 179423	BA 179423		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w sin BA por Dxpro 60w BA 179436	BA 179436		1	38	3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 12050 por Dxpro 60w BA 179416	BA 179416		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w BA 047524 por Dxpro 60w BA 180392	BA 180392		1		3	2		2	1		

105696	Está dañada las de la cancha en la escuelaVEREDA SAN CAYETANO	1	0,5	R	1	1							cambio 1 sodios 70w BA 042018,por Dxpro 60w BA 180499	BA 180499		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio 1 sodios 70w BA 04159,por Dxpro 60w BA 179490	BA 179490		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio 1 sodios 70w BA 033883,por Dxpro 60w BA 180448	BA 180448		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio 1 sodios 70w BA 041600,por Dxpro 60w BA 180487	BA 180487		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio Celsa 80w M3-1 BA 152842 por Dxpro 60w BA 180491	BA 180491							1	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w sin BA por Dxpro 60w BA 180842	BA 180842		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 030095 por Dxpro 60w BA 179873	BA 179873		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w sin BA por Dxpro 60w BA 179471	BA 179471		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 030107 por Dxpro 60w BA 179465	BA 179465		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 049032 por Dxpro 60w BA 179477	BA 179477		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 030110 por Celsa M3-2 106w BA 169563	BA 169563				3			2		1	
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 030109 por Celsa M3-2 106w BA 169564	BA 169564				3	2				1	
		1	0,5	R	1	1							se ha cambio sodio 70w BA 041679 por Dxpro 60w BA 180692	BA 180692		1	73	3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se ha instalado punto nuevo Dxpro 60w BA 180801	BA 180801		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se ha cambio sodio 70w BA 049037 por Dxpro 60w BA 180797	BA 180797		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se ha cambio sodio 70w BA 049034 por Dxpro 60w BA 180328	BA 180328		1	86	3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se ha cambio sodio 70w BA 049026 por Dxpro 60w BA 180641	BA 180641		1		3	2		2	1		
		1	0,5	R	1	1							se ha cambio sodio 70w BA 16004 por Dxpro 60w BA 180312	BA 180312		1		3	2		2	1		

		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 049027por Dxpro 60w BA 179456	BA 179456				3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w BA 049031 por Dxpro 60w BA 180451	BA 180451				3			2	1		
105607		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 049050 por Dxpro 60w BA 180882	BA 180882		1		3		2	2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 049049 por Dxpro 60w BA 179420	BA 179420		1		3		2	2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 049029 por Dxpro 60w BA 180902	BA 180902				3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 041606por Dxpro 60w BA 180662	BA 180662		1	40	3		2	2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 01608por Dxpro 60w BA 179411	BA 179411		1		3		2	2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 16003 por Dxpro 60w BA 183947	BA 183947			108	3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 041609 por Dxpro 60w BA 180494	BA 180494			60	3				1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 16002, por Dxpro 60w BA 179417	BA 179417			120	3				1		
		1	0,5	R	1	1							21/06 cambio sodio 70w 049047por Dxpro 60w BA 179291	BA 179291			36	3				1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w 049048 por Dxpro 60w BA 180450	BA 180450			86	3				1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w 049046 por Dxpro 60w BA 179975	BA 179975				3				1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w 041613 por Dxpro 60w BA 180735	BA 180735				3				1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w 041612 por Dxpro 60w BA 180305	BA 180305			20	3				1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70w 041610 por Dxpro 60w BA 180485	BA 180485				3				1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 041611 por Dxpro 60w BA 179448	BA 179448			68	3				1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 16001 por Dxpro 60w BA 179902	BA 179902			116	3				1		

		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 16000 por Dxpro 60w BA 180207	BA 180207				3				1		
		1	0,5	R	1	1							se cambio sodio 70w 049033 por Dxpro 60w BA 180213	BA 180213				3				1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70 049035 por Dxpro 60w BA180673	BA180673				3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70 12948 por Dxpro 60w BA 180301	BA 180301			252	3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70 049041 por Dxpro 60w BA 179435	BA 179435			70	3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70 030509 por Dxpro 60w BA 179481	BA 1794812				3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70 049038 por Dxpro 60w BA 180482	BA 180482			306	3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70 0834 por Dxpro 60w BA 180008	BA 180008				3			2	1		
		1	0,5	R	1	1							cambio sodio 70 041234por Dxpro 60w BA 180011	BA 180011				3			2	1		
Cantidades		37		**74**	**74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**48**	**1536**	**219**	**90**	**8**	**121**	**64**	**7**	**3**	

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #:**		**10015**	
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	74	37	**8**	Daño infraestrutura	0	0	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	4	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0

3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	74	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	37,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	74	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	37,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**####**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-31 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10015

OT	**10016**	**Atención**			**Estado reporte**									**Estado punto luminoso**	**Material nuevo**									
Reporte	**Dirección**	**Tipo de Falla**	**Tiempo de Atención (H)**	**Urbana O Rural**	**A- asignado**	**B-Solucionado**	**C-Repetido**	**D-Falta de información**	**E-Otros Entes**	**F-Falta de material**	**G-Otros Motivos**	**Pendiente**	**Descripción del pendiente u Observación**	**Código BA / Apoyo /**	Aislador tipo carrete	Cable Aluminio # 6	Conector Ap2	Conector penetración	Socket E27	Socket E40	Timer	Tuberia IMC	Tuberia PVC	Varilla cobre 2.4*5/8"
107952	DESDE ENTRADA BARRIO LOS SOLES HACIA CARRETERA ANTIGUA FRENTE PARQUE LA FLORALOS SOLES	2		R	1		1						reporte repetido con el reporte 107812											
107812	CALLE 71D CON CARRERA 31ALOS SOLES	8	2	R	1	1							red rota desde poste # 1338901 hasta poste con el BA 112078			48		2						
Cantidades			**2**		**2**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Material nuevo**	**0**	**48**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Alcaldía de Bucaramanga	**CONSORCIO CIVING** **NIT 901719756-5** **INFORME N°8** **MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA CONTRATO 138 DE 2023 - GRUPO 1** **DE 17 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2024**	CONSORCIO CIVING

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								**CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES**		**% DE ATENCIÓN OT #: 10016**			
Tipo de falla	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Tipo de falla**	**Descripción**	**Cant**	**Tiempo de Atención (H)**	**Estados**	**Descripción**	**Descripción**	**Cant**	**Descripción**	**Cant**
1	Zona sin iluminacion	0	0	**8**	Daño infraestrutura	1	2	**A**	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	2	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	0	0	**9**	Deterioro infraestructura	0	0	**B**	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	0,0
3	Circuito apagado	0	0	**10**	Riesgo electrico	0	0	**C**	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	2,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	**11**	Robo infraestrutura	0	0	**D**	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	2,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	**12**	Reposicion de redes	0	0	**E**	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	1	**% DE CUMPLIMIENTO**	**####**
6	Luminaria Directa	0	0	**13**	Telegestión	0	0	**F**	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	**14**				**G**	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-32 Reporte total material utilizado Cuadrilla 3 OT 10016

5.1.4 Relación material utilizado cuadrilla Viaducto

OT	9608		Atención		Estado reporte									Estado punto luminoso	Material nuevo						
Reporte	Dirección	Tipo de Falla	Tiempo de Atención (H)	Urbana O Rural	A- asignado	B-Solucionado	C-Repetido	D-Falta de información	E-Otros Entes	F-Falta de material	G-Otros Motivos	Pendiente	Descripción del pendiente u Observación	Código BA / Apoyo /	Aislador tipo carrete	Arrancado 70/400	Balasto 250w doble salida	Base Fotocelda	Bombillo Bipin MH 150W	Bombillo Bipin MH 70W	Bombillo Na 150W
Cantidades					0	0	0	0	0	0	0	0	0	Material nuevo	0	0	0	0	0	0	0

CANTIDADES Y TIEMPOS DE ATENCIÓN POR TIPO DE FALLA								CARACTERIZACION ESTADO DE LOS REPORTES		% DE ATENCIÓN OT #: 0			
Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Tipo de falla	Descripción	Cant	Tiempo de Atención (H)	Estados	Descripción	Descripción	Cant	Descripción	Cant
1	Zona sin iluminacion	0	0	8	Daño infraestrutura	0	0	A	Reportes Asignados	# REPORTES. ASIGNADOS	1	# REPORTES NO SOLUCIONADOS	0
2	Luminaria apagada	1	160	9	Deterioro infraestructura	0	0	B	Reportes Solucionados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA URBANA	1	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA URBANA EN HORAS	160,0
3	Circuito apagado	0	0	10	Riesgo electrico	0	0	C	Reportes repetidos o ya ejecutados	# REP. SOLUCIONADOS EN LA ZONA RURAL	0	TIEMPO DE ATENCIÓN EN LA ZONA RURAL EN HORAS	0,0
4	Luminatia Intermitente	0	0	11	Robo infraestrutura	0	0	D	Reportes no ejecutados por falta de información	# TOTAL DE REP SOLUCIONADOS	1	TIEMPO TOTAL DE ATENCIÓN EN HORAS	160,0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0	12	Reposicion de redes	0	0	E	Reportes no ejecutados por depender de otros entes	# REPORTES REPETIDOS	0	**% DE CUMPLIMIENTO**	**100,0%**
6	Luminaria Directa	0	0	13	Telegestión	0	0	F	Reportes no ejecutados por falta de material	Observaciones:			
7	Podas	0	0	14				G	Reportes no ejecutados por otros motivos				

Tabla 5-33 Reporte total material utilizado Cuadrilla Viaducto OT 9857

5.2 RELACIÓN DE MATERIALES GASTADOS Y REINTEGRADOS

Durante el periodo correspondiente del 1mayo al 31 de mayo de 2024, se relacionan cuadros de materiales nuevos y reutilizados gastados y reintegrados por las cuadrillas del grupo 1. *Ver anexo 8 Reintegro de material nuevo*

5.2.1 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

Orden de trabajo		9801		9919		9803		9832		9923		9937		9946		9944		9958		9965		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Cable Aluminio # 6	Ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0
Contactor	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Luminaria Deltaled 123W	Und	0	0	2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	17	0
Luminaria DX-PRO 60W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Luminaria Sepialed II 111W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0
Protección automática 3*60 A	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Tabla 5-34 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.2 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

Orden de trabajo		9920		9922		9856		9848		9953		9964		9969		9973		10005		0		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	7	0
Borneras	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	12	0
Cable Aluminio # 6	Ml	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	0	264	0
Cable 3*14	Ml	0	0	8	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	14	0	0	0	34	0
Collarín 6-7"	Und	0	0	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	22	0
Conector Ap1	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Conector penetración	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	8	0	0	0	10	0
Driver 100w	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Fotocelda	Und	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Luminaria DX-PRO 50W	Und	0	0	4	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	0
Luminaria DX-PRO 60W	Und	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	14	0
Luminaria DX-PRO 90W	Und	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Luminaria Microled 55W M4-1	Und	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Luminaria Sepialed 58W M4-1	Und	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
Percha 1 puestos	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	7	0
Protección automática 2*40 A	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Tabla 5-35 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.3 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

Orden de trabajo		9926		9931		9980		9939		9966		9993		9974		9976		9985		10013		Cantidades	
Material	Und	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R	G	R
Aislador tipo carrete	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	0
Brazo galvanizado 1,5 mts	Und	0	0	3	0	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	12	0	22	0
Cable Aluminio # 6	Ml	0	0	0	0	87	0	127	0	0	0	118	0	0	0	0	0	0	0	121	0	453	0
Cable encauchetado 3*14	Ml	0	0	9	0	28	0	12	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	34	0	96	0
Collarín 6-7"	Und	0	0	4	0	2	0	6	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	10	0	26	0
Conector penetración	Und	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	16	0	30	0
Fusible 5A	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Luminaria DX-PRO 50W	Und	0	0	3	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
Luminaria DX-PRO 60W	Und	0	0	0	0	9	0	4	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	28	0
Reflector DX-PRO 90W	Und	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0
Luminaria Sepialed 16W	Und	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Luminaria Sepialed II 88W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Percha 1 puestos	Und	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0

Tabla 5-36 Relación material nuevo gastado y reintegrado cuadrilla 3

5.2.4 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado grupo 1

Relación material nuevo		Cuadrilla 1					Cuadrilla 2					Cuadrilla 3					Grupo 1			
Material	Und	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Inicio	Sumi	Gast	Devo	Disp	Sumi	Gast	Devo	Disp
Luminaria DX-PRO 50W	Und	0	0	0	0	0	14	0	11	3	0	16	0	16	0	0	30	27	3	0
Luminaria DX-PRO 90W	Und	0	0	0	0	0	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4	3	1	0
luminaria de 92 W, celcia	Und	0	23	0	0	23	0	0	0	9	-9	0	0	0	0	0	23	0	9	14
Luminaria Sepialed 82W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	0	0	1	-1
Luminaria Sepialed II 106W	Und	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	7	0	0	7	8	0	1	7

Tabla 5-37 Consolidado material nuevo gastado y reintegrado Grupo 1

5.2.5 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

Material	Und	7/03/2024							cantidad final
Arrancador 70W	Und	O	0	0	0	0	0	0	0
Arrancador 150/400W	Und	O	0	0	0	0	0	0	0
Luminaria tipo Cartagena led vertical	Und	O	0	0	0	0	0	0	0
tapa plastica	und	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabla 5-38 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 1

5.2.6 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

Material	Und								cantidad final
Arrancador 70W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Balasto 70W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Poste metalico	Und	1	4	0	0	0	0	0	5

Tabla 5-39 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 2

5.2.7 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Material	Und								cantidad final
Arrancador 70W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrancador 150/400W	Und	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta metálico	Und	2	3	0	0	0	0	0	5

Tabla 5-40 Relación material reutilizado gastado y reintegrado cuadrilla 3

Ver anexo 9 Reintegro de material reutilizado

5.2.8 Consolidado material reutilizado gastado y reintegrado grupo 1

Material	Und	CUADRILLA 1	CUADRILLA 2	CUADRILLA 3	TOTAL
Poste metálico	Und	0	5	5	10
tapa plastica	Und	1	0	0	1

Tabla 5-41 Relación material reutilizado gastado y reintegrado Grupo 1

Ver anexo 10 Entrada de material

5.3 INDICADOR TIEMPO DE RESPUESTA A REPORTES ASIGNADOS

A continuación, se describe el tiempo de respuesta a los reportes asignados al grupo 1, durante el periodo comprendido del 1 de mayoo al 31 de mayo de 2024.

5.4 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 1

Los tiempos están dentro el rango de atención, a pesar de los trabajos ejecutados fueron daños de infraestructura.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MAYO G1C1			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	3	4
2	Luminaria apagada	35	18
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminaria Intermitente	0	0
5	Luminaria con baja intensidad	0	0
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	0	0
8	Daño infraestructura	2	5
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	1	3
11	Robo infraestructura	0	0
12	Reposición de redes	0	0
13	Telegestión	0	0

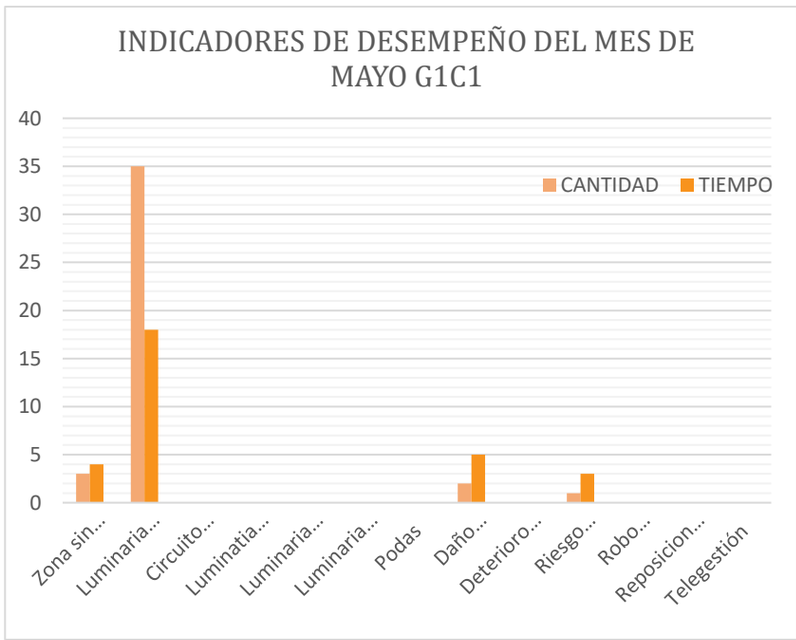


Tabla 5-42 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 1

5.5 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 2

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MAYO G1C2			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	20	29,3
2	Luminaria apagada	9	14,5
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminaria Intermitente	1	1,75
5	Luminaria con baja intensidad	0	0
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	0	0
8	Daño infraestructura	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	0	0
11	Robo infraestructura	0	0
12	Reposición de redes	0	0
13	Telegestión	0	0

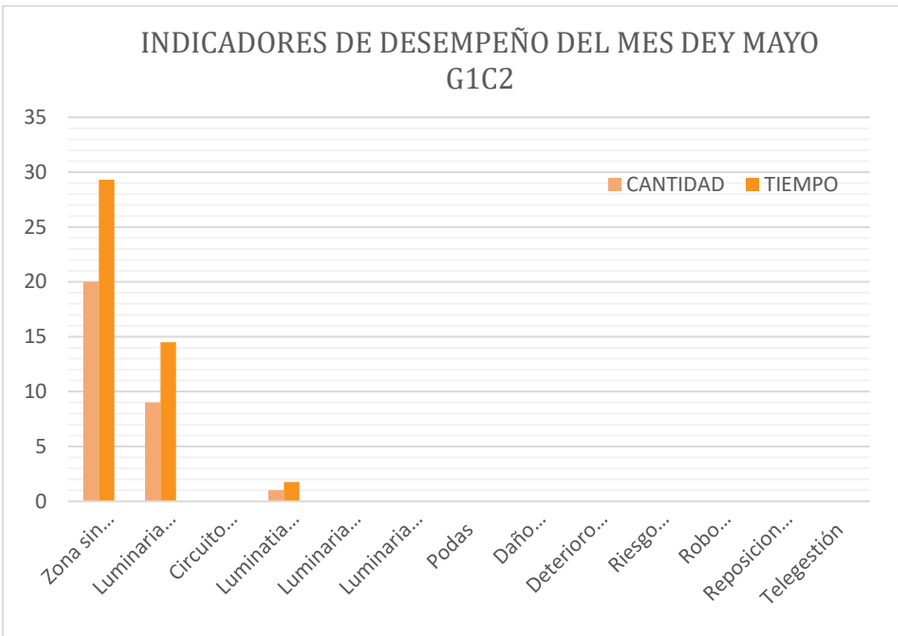


Tabla 5-43 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 2

5.6 TIEMPO DE RESPUESTA CUADRILLA 3

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL MES DE MAYO G1C3			
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO
1	Zona sin iluminación	22	14
2	Luminaria apagada	63	32,7
3	Circuito apagado	0	0
4	Luminaria Intermitente	1	0,5
5	Luminaria con baja intensidad	3	1,5
6	Luminaria Directa	0	0
7	Podas	0	0
8	Daño infraestructura	0	0
9	Deterioro infraestructura	0	0
10	Riesgo eléctrico	0	0
11	Robo infraestructura	0	0
12	Reposición de redes	0	0
13	Telegestión	0	0

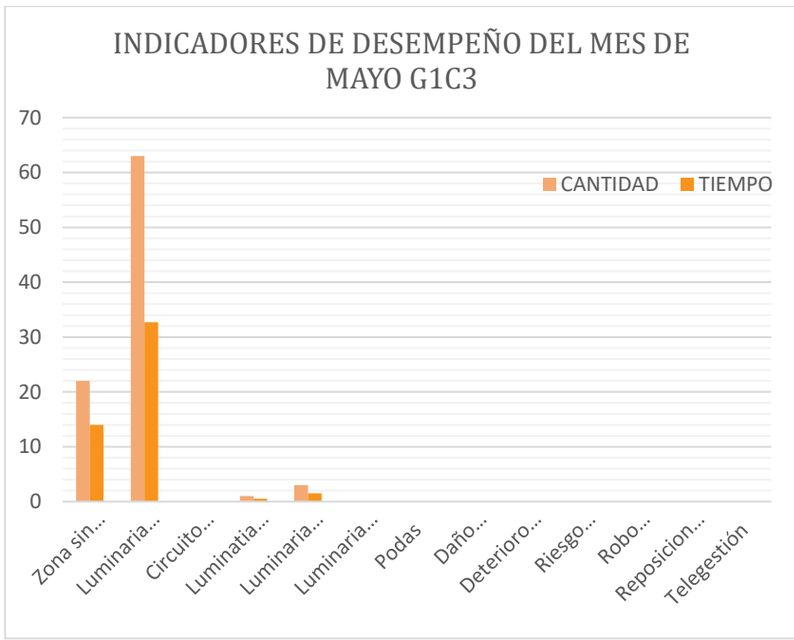


Tabla 5-44 Relación del tiempo atención de reportes urbano cuadrilla 3

6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Durante el presente periodo se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, en los laureles, juan XXIII,el nogal, san cayetano,San Luis, la calle 45, lagos del cacique, centro cra 15 entre calles 33 a la 36, corregimiento 3, mutis, quebrada seca

7 MATERIAL SUMINISTRADO POR EL CONTRATISTA

En la siguiente tabla se relacionan los materiales menores que el contratista suministra para la ejecución de las actividades asignadas durante el presente periodo, así:

Suministro de material Grupo 1 – CONSORCIO CIVING								
Material a suministrar	Unidad	Periodo 1				Total Suministrado	Valor unitario	Valor pendiente por causar
		C 1	C2	C3	VIADUCTO			
Cinta aislante en diferentes colores	Rollo	10	10	10	0	30	$ 3.346	$ 100.380,00
Cinta bandit 3/4"	Ml	0	0	0	0	0	$ 3.695,33	$ -
Hebilla bandit 3/4"	UND	8	0	0	0	8	$ 923	$ 7.386,64
Chazos metalico expansivo 5/16 con tornillo	UND	8	0	4	0	12	$ 6.787,00	$ 81.444,00
disco de corte para metal	UND	5	5	5	0	15	$ 5.699,00	$ 85.485,00
Conector UY-2 Relleno	UND	0	0	0	0	0	$ 349,54	$ -
Conector tipo resorte 3M (Rojo - Amarillo)	UND	0	0	0	0	0	$ 673,33	$ -
Adaptador De Voltaje 24V1A	UND	0	0	0	0	0	$ 28.000,00	$ -
INYECTOR POE	UND	0	0	0	0	0	$ 125.000,00	$ -
Cable FTP Cat. 5e Tipo Exterior	ML	0	0	0	0	0	$ 3.429,80	$ -
Broca metálica de 1/4	und	1	1	0	0	2	$ 6.533,00	$ 13.066,00
Cinta Aufundente	Unidad	1	1	1	0	3	$ 55.317	$ 165.951,00
Valor causado del 1 de mayo al 31 mayo del 2024								$ 935.102,64

Tabla 7-1 Relación material menor consumido

8 INDICADORES DE GESTIÓN MENSUAL

8.1 NÚMERO REPORTES ATENDIDOS

Se obtiene la cantidad y estado de los reportes atendidos por las cuadrillas del grupo 1 durante el presente periodo. *Ver anexo 11 Indicador estado de reportes*

Relación puntos luminosos atendidos									
Cuadrilla 1			Cuadrilla 2			Cuadrilla 3			Consorcio Electrico	
OT	Reparadas	Habilitadas	OT	Reparadas	Habilitadas	OT	Reparadas	Habilitadas	Reparadas	Habilitadas
9801	2	0	9920	1	1	9926	15	6	18	7
9919	1	1	9922	14	0	9931	8	8	23	9
9803	0	0	9856	0	0	9980	53	39	53	39
9832	0	0	9848	0	0	9939	6	5	6	5
9923	13	13	9953	0	0	9966	1	1	14	14
9937	19	19	9964	0	0	9993	15	13	34	32
9946	1	1	9969	0	0	9974	1	1	2	2
9944	0	0	9973	0	0	9976	1	1	1	1
9958	0	0	10005	0	0	9985	1	1	1	1
9965	0	0	0	0	0	10013	14	14	14	14
						10015	74	74	74	74
Total	36	34	Total	15	1	Total	189	163	240	198

Tabla 8-1 Indicador reportes atendidos Grupo 1

8.2 LONGITUD DE RED REPARADA DE A.P (EN METROS)

Para este periodo se instaló aluminio calibre No 6 suministrado por la oficina de alumbrado público de la siguiente forma:

Cantidad de red instalada y reparada				
Ejecutado	OT	Reporte	Cantidad (ml)	Observación
Cuadrilla 1	9646	107635	12	Aluminio #6 s-8000 BA:
Total aluminio (ml)			12	
Cuadrilla 2	9920	107525	108	Aluminio #6 s-8000 BA:
Cuadrilla 2	9969	107775	24	Aluminio #6 s-8000 BA:
Cuadrilla 2	10005	107623	156	Aluminio #6 s-8000 BA:
Total aluminio (ml)			288	
Cuadrilla 3	9980	107281	40	Aluminio #6 s-8000 BA:
Cuadrilla 3		107245	47	Aluminio #6 s-8000 BA:
Cuadrilla 3	9939	107217	127	Aluminio #6 s-8000 AP:
Cuadrilla 3	9993	107821	96	Aluminio #6 s-8000 BA:
Cuadrilla 3		107817	22	Aluminio #6 s-8000
Cuadrilla 3	10013	107964	121	Aluminio #6 s-8000 BA:

Cuadrilla 3	10015	107301	57	Aluminio #6 s-8000 BA:
Cuadrilla 3		105819	38	Aluminio #6 s-8000 BA:
		105696	159	Aluminio #6 s-8000 BA:
		105607	1286	Aluminio #6 s-8000 BA:
Total aluminio (ml)			**1993**	
VIADUCTO				
Total aluminio (ml)			**0**	
Grupo 1			**2293**	**Cantidad aluminio instalado**

Tabla 8-2 Relación aluminio reparado e instalado por el Grupo 1

8.3 CANTIDAD DE APOYOS HINCADOS Y APLOMADOS

Durante este periodo se utiliza 12 postes de 8 m por parte CONSORCIO CIVING suministrado por alumbrado público para ser instalado pablo VI bajo la orden 9937 cuadrilla 1, 6 en la gran ladera bajo la orden 10005 por la cuadrilla 2 y 4 en juan XXIII bajo la orden 9939,1 bajo la orden 10013 en san cayetano

9 ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA CALIDAD DEL PROYECTO

9.1 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la tabla se muestra los equipos de medición utilizados por las cuadrillas que conforman el Grupo 1 durante el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de myo del 2024

.

EQUIPOS DE MEDICIÓN							
CONSORCIO CIVING							
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO			CANTIDAD DE EQUIPOS DISPONIBLES	ÚLTIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	PRÓXIMA FECHA DE CALIBRACIÓN	CONDICIONES GENERALES DEL EQUIPO	NOVEDADES
EQUIPO	FABRICANTE	SERIE					
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	SONEL	CM0458	1 UND	08/08/2022	8/08/2023	CERTIFICADO	
PINZA PATRON	FLUKE	2860042WS	1 UND	02/08/2022	02/08/2023	CERTIFICADO	
CUADRILLA 1							
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C220952325	1 UND	22/12/2023	7/03/2024	CONTRASTACIÓN	
PINZA VOLTIAMPERIMETRIC	UNI-T	C220952331	1 UND	22/12/2023	7/03/2024		
CUADRILLA 2							
PINZA VOLTIAMPERIMETRIC	UNI-T	C210776903	1 UND	22/12/2023	7/03/2024	CONTRASTACIÓN	
PINZA VOLTIAMPERIMETRIC	UNI-T	C210245233	1 UND	22/12/2023	7/03/2024		
CUADRILLA 3							
PINZA VOLTIAMPERIMETRIC	UNI-T	C210245210	1 UND	22/12/2023	7/03/2024	CONTRASTACIÓN	
PINZA VOLTIAMPERIMETRIC	KYORITSU	E8148879	1 UND	22/12/2023	7/03/2024		
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTÁN CALIBRADAS DE ACUERDO CON EL EQUIPO PATRÓN NOMBRADO.						

Tabla 9-1 Relación equipos de medición Grupo 1

Ver anexo 13 Certificado de equipos

9.2 MUESTREO DE MATERIALES INSTALADOS POR LAS CUADRILLAS

Para el presente periodo, se realiza verificación de materiales instalados por las cuadrillas del grupo 1.

Realizado	Código Reporte	Barrio	Materiales utilizados	Codigo BA
C1	105540	corregimiento 3, retiro chiquito	1 LUMINARIA LED 60 W DX PR	BA 179973
C1	116604	CLL 33 A 42 CON CRA 15	1 LUMINARIA LED 92W sepiled	BA 172470
C1	106769	retiro chiquito	luminaria de 111 W sepiled	BA169549
C2	107527	av quebrada seca	luminaria DX PRO de 50	BA 181457
C2	107639	puente de provenza oreja de provenza	luminaria DX PRO de 50	BA 178308
C2	107074	diamante II	1 LUMINARIA LED 90W DX PRO	BA 178972
C3	1067592	2 · 55 - 07 mutis	1 LUMINARIA LED 60 W DX PRO	BA 181047
C3	107575	cra 19 con calle 61 A prados del mutis	LUMINARIA DE 50 W DX PRO	BA 178774
C3	107964	cra10F # 69B-22 Barrio 20 de Julio.	1 LUMINARIA LED 50 W DX PRO	BA 181590
Hallazgo		**Se encuentra a satisfacción**		

Tabla 9-2 Muestreo de materiales instalados por Cuadrilla

Ver anexo 14 Revisión muestreo de materiales

9.3 PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL

PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL					
ACTIVIDAD REALIZADA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EQUIPO DE VERIFICACIÓN**	**CANTIDAD A VERIFICAR DE ACUERDO A REPORTES**	**CANTIDAD REALMENTE VERIFICADA**	**OBSERVACIONES**
Mantenimiento a puntos luminosos de diferentes potencias y tecnologías	Verificar los Parámetros nominales eléctricos de los puntos luminosos	Pinza Voltiamperimétrica	1	128	Se realiza limpieza de tablero eléctrico, Ups, toma de parámetros eléctricos en tableros y luminarias vehiculares y baldplast, toma de parámetros eléctricos, programación Timer.

PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL					
ACTIVIDAD REALIZADA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EQUIPO DE VERIFICACIÓN**	**CANTIDAD A VERIFICAR DE ACUERDO A REPORTES**	**CANTIDAD REALMENTE VERIFICADA**	**OBSERVACIONES**
	Verificar orientación horizontal y vertical de los puntos luminosos	Nivel	1	43	Se realizó inspección y mantenimiento a la iluminación de los costados vehicular.
	Verificar la limpieza del conjunto óptico	N.A	1	43	Se realizó la limpieza del conjunto óptico de las luminarias peatonales y vehiculares.
	Verificar la correcta fijación y seguridad de la luminaria	N.A	1	128	Se realizó inspección a la iluminación de los costados y vehicular.
Mantenimiento de redes de media y baja tensión subterráneas	Verificar que las redes estén energizadas correctamente	Pinza Voltiamperimétrica	1	12	Se realizaron medidas eléctricas de los tableros del tunel ubicados en el puente.
	Verificar aislamiento y puesta a tierra	Telurometro	0	0	No se realizaron actividades con este equipo.
Mantenimiento red de datos	Verificación continuidad de la señal	OTDR SMART JACK Software Quick-Pro	2	2	EL software de mantenimiento QuickPro reconoce todos los elementos de comunicaciones instalados para iluminación como muestra del buen funcionamiento de la red de datos. Se realizó medición de parámetro FO con el OTDR.
Mantenimiento a Tableros de baja tensión de Alumbrado público	Verificar potencia y control	Pinza Voltiamperimétrica	2	31	Se midieron parámetros eléctricos en los dos tableros
	Verificar aislamiento y puesta a tierra	Telurometro	0	0	No se realizaron actividades con este equipo.
Mantenimiento de RACK y UPS	Verificación de conexiones, actualización y limpieza	OTDR Multímetro	0	0	Según las actividades de recuperación de señal de las tarjetas controladoras se requiere verificar con el equipo OTDR la continuidad de la fibra óptica en la caja 79A.
Mantenimiento CCTV	Verificación de señal	OTDR Multímetro Software	0	0	Se verificó funcionamiento de la cámara norte. Se daño un disco duro de la NVR y no permite acceder a la cámara.
Mantenimiento aire acondicionado	Verificación parámetros eléctricos	Pinza Voltiamperimétrica	1	1	Se toman parámetros eléctricos en los A/C en subestaciones norte y sur.

PLAN OPERATIVO DE CONTROL DE INSPECCIÓN MANTENIMIENTO VIADUCTO PROVINCIAL					
ACTIVIDAD REALIZADA	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**EQUIPO DE VERIFICACIÓN**	**CANTIDAD A VERIFICAR DE ACUERDO A REPORTES**	**CANTIDAD REALMENTE VERIFICADA**	**OBSERVACIONES**
	Verificación de filtros de AC	N.A	1	1	Se realiza el lavado de los filtros del aire acondicionado en las subestaciones sur y norte.
	Verificar temperatura	Termómetro	1	1	Se instalaron aires acondicionados nuevos. Temperatura promedio de cuartos en 21°.
Mantenimiento de subestaciones en bóveda	Verificar cargabilidad del transformador	Pinza Voltiamperimétrica	0	0	No se realizaron actividades en transformadores
	Verificación de parámetros eléctricos	Pinza Voltiamperimétrica	0	0	No se realizaron actividades en transformadores
	Verificar aislamiento y puesta a tierra	Telurometro	0	0	No se realizaron actividades en transformadores
	Niveles freático	N.A	2	2	La subestación norte presenta humedad y filtraciones en la placa que cae directamente sobre el transformador.
Mantenimiento túnel de servicio	Verificación de parámetros eléctricos	Multímetro Pinza Voltiamperimétrica	2	2	Se realizaron verificaciones de parámetros en el tablero de distribución en el tunel del puente.
	Verificación continuidad de la señal	OTDR	2	2	verificar continuidad fibra óptica
		SMART JACK			Se realiza instalación de cable UTP para restablecer comunicación de las controladoras.

Tabla 9-3 Plan operativo de control Viaducto La Novena

10 PUNTOS LUMINOSOS INSTALADOS E IDENTIFICADOS

10.1 CAMBIO DE LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA LED EN GARANTÍA

La siguiente tabla contiene la información de las luminarias de tecnología led nuevas instaladas o cambiadas por las cuadrillas del grupo 1 en el presente periodo.

- La cuadrilla: 1 del Grupo:1, realiza el cambio de 36 luminarias:
- La cuadrilla: 2 del Grupo:1, realiza el cambio de 15 luminarias
- La cuadrilla: 3 del Grupo:1, realiza el cambio de 189 luminarias
-

10.2 INSTALACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN PUNTOS NUEVOS

En periodo del mes de mayo por parte del grupo 1 Cuadrilla 1 instalo 12 luminarias de 60 W DX PRO en el reporte 107420, 5 celcia de 111W en el reporte 107818.

Cuadrilla 2 instalaron 4 luminarias de 50 W DX PRO bajo el reporte 107527, 6 luminarias de 60 DX PRO en el reporte 107623.

La cuadrilla 3 instalaron 3 DX PRO de 50 W en el reporte 103574, 12 DX PRO de 60 W bajo los reportes 107214,10796,105696, 4 reflectores de 90 W DX PRO en los reportes 107214,107217,107964; todo lo anterior son puntos Nuevo, se realiza la modernización de 60 luminarias de sodio y cambio de 189 luminarias por garantía Consorcio Civing.

10.3 CAPACITACIÓN TÉCNICA

Para el presente periodo se realiza la capacitación en el cuidado en operación de canasta grúa, riesgo mecánico y eléctrico.

11 INFORME HSEQ

El presente informe corresponde al periodo del 1de mayo al 31 de mayoo del 2024. En la ejecución de los trabajos ejecutados se están cumpliendo con las normas y requisitos establecidos por Alumbrado Público.

11.1 ANEXOS DEL INFORME

- CDP-RP
- Relación actas del contrato
- Pólizas del contrato
- Planilla pago de seguridad social
- Salida de material nuevo
- Salida de material reutilizado
- Registro fotográfico
- Reintegro de material nuevo
- Reintegro de material reutilizado
- Entrada de material
- Indicador estado de reportes
- Indicador estado de puntos luminosos
- Certificados de equipos
- Revisión muestreo de materiales
- Informe HSEQ

En constancia del anterior informe se firma por quien lo realizo:



NIXON BARÓN SUÀREZ
C.C. 74.187.074 de Sogamoso Boyacá
Ingeniero Residente Consorcio CIVING

INFORME HSEQ Nº08

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD O CONTRATO:

NOMBRE EMPRESA CONSORCIO CIVING
INFORME DEL **EL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2024**
PROFESIONAL HSEQ  **DIANA MILENA JOYA ACUÑA** **Elaboró**

CONTENIDO **Pág.**

1. OBJETO DEL CONTRATO 4
2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS 4
2.1 RECURSOS HUMANOS 4
2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS 9
2.2.1 RECURSOS LOGÍSTICO 9
2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES 11
3. PLAN DE CALIDAD 12
3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS 12
VER ANEXO 3 CALIDAD 15
3.2 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 15
3.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 16
Grafica Nº1 Tabulación Total de Encuestas de Satisfacción al Cliente COP 138 2023 GRUPO 1..... 18
4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 19
4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 19
VER ANEXO 4. AMBIENTAL 20
5. PMT 20
5. 1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO 20
5.2 SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES 22
VER ANEXO 5. PMT 23
6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 23
6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS 24
6.2. PLAN DE EMERGENCIAS 24
6.3 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 1 26
6.3.1 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS: 26
6.3.2. BOTIQUÍN: 27
6.3.3. EXTINTOR: 27
6.3.4 UBICACIÓN DEL MEDEVAC 28
6.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 1 28
6.4.2 INDICADORES DE AUSENTISMO 28
6.4.2. AUSENTISMO 29
6.4.2.3 RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA 29
7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS 29
7.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO 29
7.2 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS 30
7.3 PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS 31
7.4 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA. 32
7.5 ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP 33
7.5.1 ENTREGA DE DOTACIÓN 33
8. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL. 34
8.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 36
9. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO 37

9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS 40
10. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DE PERSONAL 41
11. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ 42
11. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 42
12. COPASST. 43
13. COMITÉ CONVIVENCIA. 44

Tabla 1 Personal Profesional 5
Tabla 2 Personal Cuadrilla 1 6
Tabla 3 Personal Cuadrilla 2 6
Tabla 4 Personal Cuadrilla 3 7
Tabla 5 Personal Viaducto 8
Tabla 6 Histórico de Personal Retirado 9
Tabla 7 Certificación de Vehículos 11
Tabla 8 Inspección Preoperacional de Vehículos 11
Tabla 9 Plan de mantenimiento de Vehículos/ Equipos 15
Tabla 10 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición 16
Tabla 11 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente 17
Tabla 12 Plan de Gestión Ambiental Residuos Consorcio CIVING 20
Tabla 13 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas. 22
Tabla 14 Seguimiento Reuniones PMT 23
Tabla 15 Elementos de Emergencia 25
Tabla 16 Conformación de Brigadas de Emergencias 26
Tabla 17 Inspección de Camilla Grupo 1 26
Tabla 18 Inspección de Botiquines Grupo 1 27
Tabla 19 Inspección de Extintores Grupo 1 28
Tabla 20 Ausentismo por causa Externa 29
Tabla 21 Análisis de Trabajo Seguro 30
Tabla 22 Permisos de Trabajo en Alturas 31
Tabla 23 Izaje de Cargas 32
Tabla 24 Entrega de Dotación 33
Tabla 25 Entrega de Dotación viaducto 33
Tabla 26 Afiliaciones a Seguridad Social 36
Tabla 27 Afiliaciones a Seguridad Social Personal Viaducto 36
Tabla 28 Histórico de Pagos Seguridad Social 37
Tabla 29 Exámenes Médicos 39
Tabla 30 Exámenes Médicos Personal Viaducto 40
Tabla 31 Exámenes Psicosensométricos 41
Tabla 32 Inducción 42
Tabla 33 Inducción Personal Viaducto 42
Tabla 34 Cronograma de Actividades 43
Tabla 35 COPASST 44
Tabla 36 Convivencia 45

INFORME Nº08

1. OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1. HORARIO 2 - COMUNAS 2 - 17 - 7 - 13 Y EL CORREGIMIENTO UNO. Dentro de estas comunas se encuentran incluido el viaducto Provincial. El tipo de contrato es de obra pública como resultado del proceso de selección mediante licitación SI-SI-LP-001-2023. Legalizado el día 24 de julio de 2023 con número de contrato 138 de 2023.

2. RECURSOS HUMANOS Y LOGISTICOS

Para el proyecto de mantenimiento de alumbrado público del municipio de Bucaramanga**, EL CONSORCIO CIVING** cuenta con 3 jefes de cuadrillas 6 técnicos electricistas divididos en 3 cuadrillas, 1 supernumerario, 1 ingeniero residente, 1 profesional HSEQ y además cuenta con el personal que realiza mantenimiento al viaducto provincial para el desarrollo del proyecto de Mantenimiento de Alumbrado Público Grupo 1, organizados de la siguiente manera; 1 ingeniero electrónico, 1 un tecnólogo de cámaras y un tecnólogo de telecomunicaciones.

2.1 RECURSOS HUMANOS

Vea a detalle en las siguientes tablas los nombres, apellidos, cargos y certificaciones del personal profesional y operativo que está dispuesto para el COP 138 del 2023, y para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024.**

PERSONAL PROFESIONAL CONSORCIO CIVING									
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA**	**VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS**	**FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS**	**CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)**	**VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL**		**OBSERVACIONES**
							INICIO	**FINAL**	
Joya Acuña	Diana Milena	Profesional HSEQ	N/A	N/A	05/04/2023	N/A	15/07/2020	15/07/2030	

PERSONAL PROFESIONAL CONSORCIO CIVING									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Manosalva Pimiento	Jerson	Supernumerario	N/A	21/12/2024	8/07/2023	MTE-1102361055-29629	02/06/2024	02/08/2024	
Baron	Nixon	Ing. Residente	N/A	N/A	07/05/2023	N/A	21/10/2016	N/A	

Tabla 1 Personal Profesional

PERSONAL CONSORCIO CIVING CUADRILLA 1									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO OPERADOR DE GRÚA	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA CURSO COORDINADOR EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Camargo Flórez	Duván Jesús	Jefe de Cuadrilla	26/06/2024	29/12/2024	04/07/2023	MTE 1095925779-61405 A1	03/06/2024	03/08/2024	. **VER ANEXO 1 PERSONAL**
López Maldonado	Daniel Alexander	Técnico Electricista	N/A	21/12/2024	26/09/2022	MTE 1098784128-63430 A1	03/06/2024	03/08/2024	
Prada Vélez	Fabian Ricardo	Técnico Electricista	N/A	02/06/2025	03/05/2023	MTE 91181946-85987	03/06/2024	03/08/2024	

Tabla 2 Personal Cuadrilla 1

PERSONAL CONSORCIO CIVING CUADRILLA 2									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Moreno Murillo	Javier Humberto	Jefe de Cuadrilla	14/07/2024	21/12/2024	16/08/2023	MTE 79530432-30060	03/06/2024	03/08/2024	VER ANEXO 1 PERSONAL
Villamizar Anaya	Jorge Armando	Técnico Electricista	N/A	21/12/2024	16/08/2022	MTE 91515821-49250	03/06/2024	03/08/2024	
Hurtado Córdoba	Luciano	Técnico Electricista	N/A	21/12/2024	24/03/2023	MTE 79832439-04145	03/06/2024	03/08/2024	
Cala Castillo	German Alirio	Técnico Electricista	N/A	18/05/2025	01/06/2023	MTE-91528645-106560	03/06/2024	03/08/2024	

Tabla 3 Personal Cuadrilla 2

PERSONAL CONSORCIO CIVING CUADRILLA 3									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS (T5)	ecVIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Velásquez Daza	Mauricio de Jesús	Jefe de Cuadrilla	31/08/2024	02/03/2025	12/09/2023	MTE 1098629229-88789	05/04/2024	05/10/2024	VER ANEXO 1 PERSONAL
González Rivera	Johan Eduardo	Técnico Electricista	N/A	08/01/2025	----	MTE 1095825298-82840	05/04/2024	05/10/2024	
Bermudez Figueroa	Israel	Técnico Electricista	N/A	12/09/2025	----	MTE 91287160-37374	29/04/2024	29/10/2024	

Tabla 4 Personal Cuadrilla 3

PERSONAL VIADUCTO									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Oliveros Acosta	Rachid	Ingeniero electrónico	N/A	N/A	N/A	CN206-71340	09/08/2023	NA	VER ANEXO 1 PERSONAL

PERSONAL VIADUCTO									
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	VENCIMIENTO CURSO CONDUCCIÓN GRÚA Y BRAZO	VENCIMIENTO CURSO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	FECHA REALIZACIÓN CURSO COORDINADOR TRABAJO EN ALTURAS	CERTIFICADO ESTUDIOS ELÉCTRICOS	VIGENCIA TARJETA Y/O MATRICULA PROFESIONAL		OBSERVACIONES
							INICIO	FINAL	
Diaz	Luis	Tecnólogo de cámaras	N/A	N/A	N/A	CPNTEL 3839 -54777534	22/07/2011	NA	
Buitrago Gutiérrez	Jonathan Fernando	Tecnólogo de telecomunicación	N/A	14/05/2025	N/A	CPNTEL 18198-1090930728	12/12/2023	NA	
Gómez Zapata	Luis Felipe	Auxiliar de comunicaciones	N/A	28/04/2025	01/05/2023	CPNTEL 30290-1095930728	31/01/2024	NA	

Tabla 5 Personal Viaducto

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	NOMBRES	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	OBSERVACIÓN
Pabón Pabón	Alexander	Jefe de cuadrilla	25 julio de 2023	24 de agosto 2023	Se anexa de carta de Renuncia

HISTORICO DE PERSONAL RETIRADO					
APELLIDOS	**NOMBRES**	**CARGO**	**FECHA DE INGRESO**	**FECHA DE RETIRO**	**OBSERVACIÓN**
Diaz Gaitán	Carlos Humberto	Técnico electricista	25 julio de 2023	28 de noviembre 2023	Se anexa de carta de Renuncia
Uribe Espitia	Gabriel Enrique	Profesional HSEQ	24 de julio 2024	28 de Diciembre 2023	Terminacion de contrato
Rodríguez Barón	Ludwing Fernando	Ingeniero Residente	24 de julio 2024	17 de Febrero 2024	Se anexa de carta de Renuncia
Fuentes Muñoz	Juan Guillermo	Técnico electricista	25 de julio 2024	9 de marzo del 2024	Se anexa de carta de Renuncia
Chacon Rodriguez	Ricardo	Tecnólogo de cámaras	10 de agosto 2023	29 de febrero del 2024	Terminacion de contrato

Tabla 6 Histórico de Personal Retirado

VER ANEXO 1 PERSONAL

2.2 CERTIFICACIONES DE LA GRÚA Y VEHÍCULOS
2.2.1 RECURSOS LOGÍSTICO

Se relacionan a continuación los vehículos usados por el contratista del grupo 1 para la realización del contrato **138 de 2023.**
Vea en la siguiente tabla 7 el cuadro y en medio magnético los documentos de los vehículos dispuestos para el contrato COP 138 del 2023.

GRÚA	WOK 754	WOK 554	ESO 861	KGU 416	WDG-478	LIX 665
VENCIMIENTO SOAT	21/11/2023 21/11/2024	31/08/2024	18/01/2025	03/08/2024	24/11/2024	24/11/2024
VENCIMIENTO PÓLIZA	24/11/2023 24/11/2024	25/07/2024	21/04/2025	02/08/2024	01/03/2025	25/11/2024
VENCIMIENTO REVISIÓN TEC. MÉCANICA	22/11/2023 22/11/2024	01/12/2024	13/06/2024	22/03/2025	23/11/2024	N/A
N° CERTIFICACIÓN BRAZO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N° CERTIFICACIÓN GRÚA	CC&S-2023 -1331	CC&S-2023 -1228	CC&2-2022 -1079	N/A	GOOD-CC- 051-24	N/A
N° CERTIFICACIÓN VASO LINER	225586-001	RI 5539-001	235447-001	N/A	N/A	N/A
VENCIMIENTO INSPECCIÓN. GRÚA	02/09/2024	21/06/2024	15/03/2025	N/A	02/03/2025	N/A
VENCIMIENTO DE CERTI VASO LINER	01/09/2024	17/06/2024	21/07/2024	N/A	N/A	N/A
PROPIA	X	X	X	X		X
ALQUILADA						
VENCIMIENTO OPERADOR DE LA GRÚA	26/06/2024	31/08/2024	14/07/2024	N/A	N/A	N/A
VENCIMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCCIÓN	12/07/2026 D.C	01/10/2024 M.V.	06/02/2029 J.M.	06/02/2029 J.MA. 02/02/2031 L.R. 01/10/2024 M.V.	01/10/2024	06/02/2029 J.MA. 02/02/2031 L.R. 01/10/2024 M.V.

GRÚA	WOK 754	WOK 554	ESO 861	KGU 416	WDG-478	LIX 665
				12/07/2026 D.C. 10/07/2026 J.M		12/07/2026 D.C. 10/07/2026 J.M

Tabla 7 Certificación de Vehículos

VER ANEXO 2 VEHÍCULOS-PREOPERACIONALES

2.2.2. INSPECCIONES PREOPERACIONALES

Véase la siguiente tabla 8 los vehículos utilizados a los cuales se les realizo inspecciones preoperacionales para los periodos del **1 al 31 de mayo del 2024** así como la cantidad específica de inspecciones según el vehículo, el número de días trabajados y el estado en general de los mismos para ese periodo estipulado.

CUADRILLA	PERIODO	INSP. PRE OPERACIONALES REALIZADAS	No. DÍAS TRABAJADOS	ESTADO DE LOS VEHÍCULOS	OBSERVACIONES
CUADRILLA 1	1 AL 31-05-2024	25	25	Bueno	
CUADRILLA 2	1 AL 31-05-2024	25	25	Bueno	
CUADRILLA 3	1 AL 31-05-2024	25	25	Bueno	
TOTAL POR LAS CUADRILAS		**75**	**75**		

Tabla 8 Inspección Preoperacional de Vehículos

VER ANEXO 2 VEHÍCULOS-PREOPERACIONALES

3. PLAN DE CALIDAD

Durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** el plan de calidad se enmarco a través de los seguimientos en las estadísticas y de como se venía cubriendo el cumplimiento de los reportes hechos por la comunidad, de esta manera el control en el mejoramiento del servicio y una respuesta cada vez mejor, además las estadísticas que se presentaron a través del periodo de vigencia, lo anterior se refleja en el informe del periodo en la parte técnica del contrato 138 de 2023, para la vigencia del corte se midió por medio de encuestas de satisfacción la interpretación de los usuarios al servicio prestado en relación al mantenimiento, expansión y cambio de luminarias, lo cual se ve reflejado en la tabla 11 y la gráfica 1, las cuales serán actualizadas de forma mensual y se realizaran comparativos de mes para dar seguimiento al buen servicio y opiniones de la comunidad.

3.1 PLAN DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS / EQUIPOS

Para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024**, se realizaron los mantenimientos en los vehículos y herramientas a disposición del CONSORCIO CIVING para la ejecución del COP **138 del 2023**.

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
WOK 764	Cambio de mangueras de Calefacción	OMAR BLANCO	05/09/2023	05/09/2023	Manguera Abrazaderas Pasador cambio		
	Cambio de aceite y filtros	KAOMAR	22/09/2023	22/09/2023	Aceite y filtros	83.931	
	Sondeo Radiador	EL MONO LA 17	25/09/2023	25/09/2023	Radiador	84.002	
	Cambio de Batería	KAOMAR	27/09/2023	27/09/2023	Batería	84.112	
	Mtto Muelle	Mtto Muelle	06/10/2023	06/10/2023	Muelle, bujes, tornillos	84.670	
	Cambio correa Motor	OMAR BLANCO	19/10/2023	19/10/2023	Correa		
	Mto de Clusth	ELECTRO BOOSTER SAS	27/10/2023	27/10/2023	Retenedor, Collarin, balinera	85.425	
	Cambio correa motor	ELECTRO BOOSTER SAS	02/11/2023	02/11/2023	Correa	85.574	
	Arreglo de Prensa, calibrada	CLINICA DEL CLUTCH’S	11/12/2023	11/12/2023	Prensa, empaque del disco	86.000	
	Instalación de Guaya del Toma Fuerza	TECH- MACHINES LTDA	28/12/2023	28/12/2023	Guaya	86500	
	Estabilizador izquierdo no	TECH- MACHINES LTDA	06/03/2024	06/03/2023	Pin de seguridad	87000	

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
	baja						
	Bandas de freno	UNIFRENOS	09/03/2024	09/03/2024	Graduar bandas de freno	88700	
WOK 764	Remocion del trapecio, re-instalar articulación de la canasta y del pasador . Desmontar estabilizador para rectificar montaje y puesta en funcionamiento	TECH- MACHINES LTDA	14/03/2024	14/03/2024	Suministro e instalacion de manguera . Suministro y aplicación de aceite hidraulico en galones	88813	
WOK 764	Desmosntar bomda del Hidraulico	CORREAS Y ACCESORIOS	23/04/2024	23/04/2024	Cambio de empaquetadura	89986	
VEHÍCULO O EQUIPO	**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO**	**FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO**	**FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO**	**RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO**	**KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
WOK 554	Mantenimiento General del sistema Mecánico del Vehículo	OMAR BLANCO	27/07/2023	27/07/2023	Kit de embrague Cable Cinta reflectiva Fusibles Remaches Lámparas licuadora		TODO MUELLES
	Cambio de Guaya de Cambios	OMAR BLANCO	05/09/2023	05/09/2023	Vaso bomba de agua Guaya cambios Tanque auxiliar	112.800	
	Compra bomba Clutch	AGROTRANS AUTOMOTRIZ SA	10/10/2023	10/10/2023	Bomba del Clutch		
	Cambio de Batería	KAOMAR	13/10/2023	13/10/2023	Batería		
	Mtto. Clutch	ELECTRO BOOSTER SAS	17/10/2023	17/10/2023	Bandas Balinera clutch Bujes		
	Arreglo punto de apoyo del brazo articulado de la canasta	TECH- MACHINES LTDA	20/12/2023	20/12/2023	Fabricación nuevo punto de apoyo para canasta		
	Cambio de aceite hidraulico	RAMON F.	28/02/2024	28/02/2023	Aceite hidraulico		

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
	Lubricacion del sistema mecanico Canasta	EDWIN ACEVEDO ,HEXON DURAN	22/02/2024	23/02/2024	Engrasante	114157	
	Suministro e inst. de adaptadores en mal estado . Perforar y acondicionar canasta a base punto de apoyo de brazo	TECH- MACHINES LTDA	14/03/2024	14,25/03/2024	Adaptadores	114810	
WOK 554	Reconstruir guayas y hacer bujes . Inst. freno de ahogo	CORREAS Y ACCESORIOS	26/04/2024	26/04/2024	Bujes del trapecio y reconstrucción de guayas de los cambios . Instal. Freno de ahogo		
WOK 554	Reparar trasmición	CORREAS Y ACCESORIOS	21/05/2024	21/05/2024	Retenedor , silicona, galon de Valvulina , Corona speed de trasmición		
VEHÍCULO O EQUIPO	**DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO**	**TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO**	**FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO**	**FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO**	**RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO**	**KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
ESO 861	Cambio de aceite	KAOMAR	01/09/2023	01/09/2023	Aceite, filtros, grasa, refrigerante	85.168	
	Graduación de frenos traseros	LA ESTRELLA	15/09/2023	15/09/2023	Bandas	85.850	
	Graduación de frenos, rectificar campana	ELECTRO BOOSTER SAS	20/09/2023	20/09/2023	Juego de banda de mano, campana	86.060	
	Mto Clusth	ELECTRO BOOSTER SAS	24/11/2023	24/11/2023	Tornillos, retenedor, aceite, balineras	88.899	
	Cambios de bombillos	JAVIER MORENO	8/03/2024	8/03/2024	Bombillos		
	Mantenimiento y suministro Hidraulico	TECH MACHINE	11/03/2024	13/03/2024	Retenedores, desarmada y puesta en funcionamiento		
ESO 861	Reemplazo de tornillos para ejes	SOLDADURAS ESPECIALES Y TORNO SOLANO	12/03/2024	14/03/024	Tornillos para ejes	91.200	
ESO 861	Graduacion de frenos	UNIFRENOS	29/04/2024	29/04/2024	Graduacion de frenos a las 4 ruedas		
ESO 861	Empaque bomba vacia	HORACIO AGUIRRE	30/04/2024	02/05/2024	Empaque de tapa valvula		
ESO 861	Cambio de Cilindros y de pastillas	UNIFRENOS	27/05/2024	27/05/2024	Cilindros y pastillas		

VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
VEHÍCULO O EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO	TALLER DONDE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO	FECHA PREVENTIVA DEL MANTENIMIENTO	FECHA EJECUTADA DEL MANTENIMIENTO	RELACIÓN MATERIAL CAMBIADO	KILOMETRAJE DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	OBSERVACIONES
KGU 416	Cambio de Esparrago de rueda	OMAR BLANCO	28/08/2023	28/08/2023	Esparrago Tuerca		
	Mtto. general Calibrada y rectificada de embrague	OMAR BLANCO	08/09/2023	08/09/2023	Kit del cluth, amortiguadores, pastillas delanteras, retenedores, esféricas, soporte de mando		
	Cambio de Aceite	KAOMAR	26/09/2023	26/09/2023	Aceite	242883	
	Cambio de llantas	KAOMAR	07/10/2023	07/10/2023	Llantas	243298	
	Arreglo Planta y alternador	CENTRO ELECTRICO	21/10/2023	21/10/2023	Alternador, planta	243835	
	Cambio de Batería	KAOMAR	22/10/2023	22/10/2023	Batería		
	Arrego defensa latonería y pintura . Desmontada, suspeción completa y tren delantero	SINCRONIZACIONES NC	**27/02/2024**	9/03/2024	Arreglo Bases persianas .	247935	

Tabla 9 Plan de mantenimiento de Vehículos/ Equipos

VER ANEXO 3 CALIDAD

3.2 CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

En la siguiente tabla se indican los elementos de medición, las referencias, ultima fechas de calibración, próxima fecha de calibración y condiciones generales de los dispositivos referentes a las cuadrillas uno, dos y tres.

CONSORCIO CIVING				
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	CANTIDAD DE	ÚLTIMA FECHA DE	PRÓXIMA FECHA DE	CONDICIONES GENERALES

EQUIPO	FABRICANTE	SERIE	EQUIPOS DISPONIBLES	CALIBRACIÓN	CALIBRACIÓN	DEL EQUIPO
TELUROMETRO O MEDIDOR DE TIERRA	SONEL	CM0458	1 UND	29/08/2023	29/08/2024	En buen Estado
PINZA PATRON	FLUKE	2860042WS	1 UND	29/08/2023	29/08/2024	En buen Estado
CUADRILLA 1						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C220952325	1 UND	22/08/2023	22/10/2023	Se compra Pinza Nueva el 6-3-24 con el serial C2210344418
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C220952331	1 UND	22/08/2023	22/10/2023	
CUADRILLA 2						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C221754693	1 UND	NUEVA		Se anexa factura de compra de Pinzas
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C221754623	1 UND	NUEVA		
CUADRILLA 3						
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	UNI-T	C221754690	1 UND	NUEVA:06-03-24		La E8148879 se remplaza por la pinza nueva .Se anexa factura de compra de Pinzas
PINZA VOLTIAMPERIMETRICA	KYORITSU	E8148879	1 UND	22/08/2023		
OBSERVACIÓN	LAS PINZAS VOLTIOAMPERIMETRICAS UTILIZADAS PARA REALIZAR LAS MEDICIONES EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS ESTÁN CALIBRADAS DE ACUERDO CON EL EQUIPO PATRÓN NOMBRADO.					

Tabla 10 Control de dispositivos de Seguimiento y Medición

VER ANEXO 3. CALIDAD


3.3 ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Para el contrato COP 138 del 2023, se realizaron **32** encuestas que fueron realizadas por las cuadrillas del CONSORCIO CIVING con la comunidad. Estas encuestas denotan el nivel de satisfacción de los clientes con respecto al trabajo realizado durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024,** en la cual arrojo en el siguiente resultado el 100% satisfecho, 0% poco satisfecho, 0% insatisfecho y 0% no aplica.

ENCUESTAS SATISFACCION

Tabla 11 Consolidado de Tabulación de Encuestas de Satisfacción al Cliente

ENCUESTAS SATISFACCIÓN 1 AL 31 DE MAYO 2024																														
	SATISFECHO								POCO SATISFECHO								INSATISFECHO								NO APLICA					
ASPECTO A EVALUAR	C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL		C - 1		C - 2		C - 3		TOTAL	
	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%	UND	%
Calidad de Servicios desarrollados	0	0%	4	100%	28	100%	32	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tiempo de ejecución de los trabajos	0	0%	4	100%	28	0%	32	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La obra mejoro la seguridad y el bienestar de la comunidad del sector	0	0%	4	100%	28	0%	32	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cuál es el Grado de satisfacción General con las de Alumbrado Público desarrolladas.	0	0%	4	100%	28	0%	32	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Actividad realizada cumple con la seguridad y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	0	0%	4	100%	28	0%	32	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	0	0%	4	100%	28	0%	32	100%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PROMEDIO DE SATISFACCIÓN	0%		100%		17%		39%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	
ENCUESTAS	**CUADRILLA 1**				**0**				**CUADRILLA 2**				**4**				**CUADRILLA 3**				**28**				**TOTAL ENCUESTAS**				**32**			

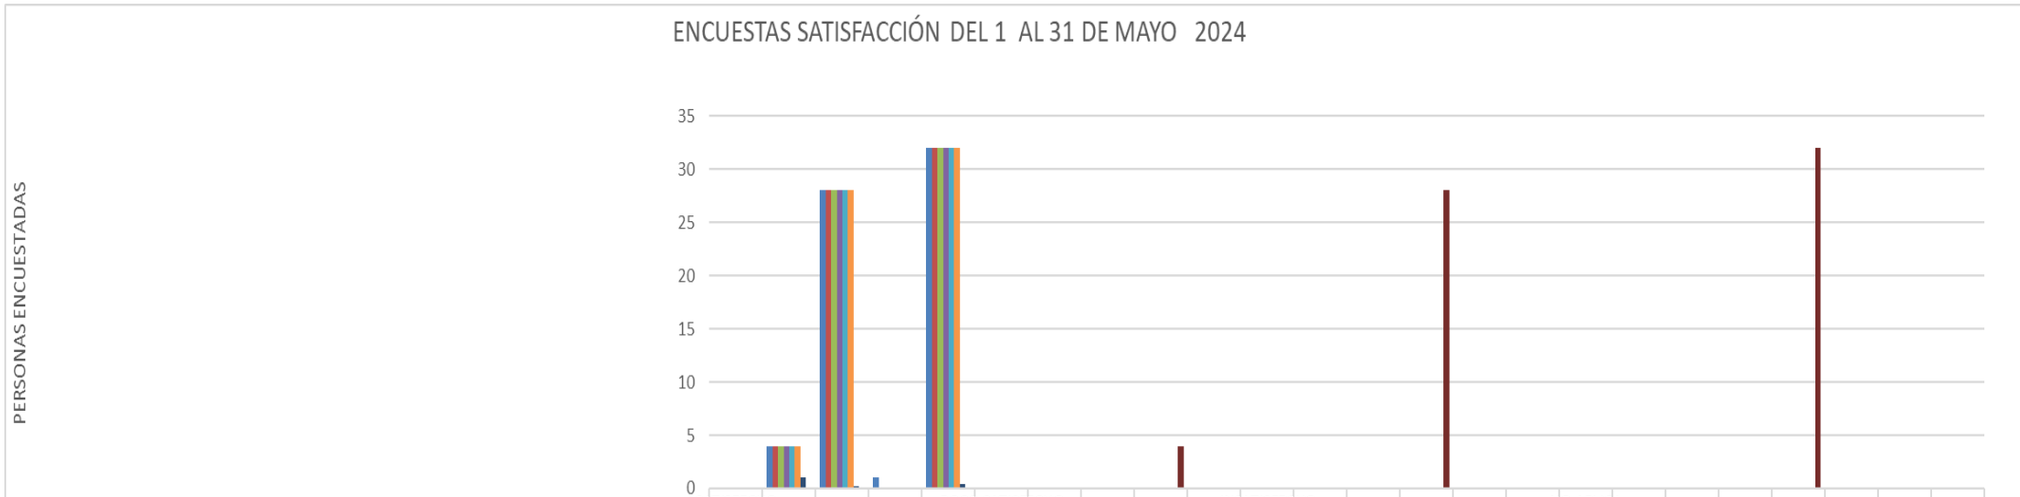

	SATISFECHO				POCO SATISFECHO				INSATISFECHO							NO APLICA								
Calidad de Servicios desarrollados	0	4	28	100%	32	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Tiempo de ejecución de los trabajos	0	4	28	0%	32	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La obra mejoro la seguridad y el bienestar de la comunidad del sector	0	4	28	0%	32	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Cuál es el Grado de satisfacción General con las de Alumbrado Público desarrolladas.	0	4	28	0%	32	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Actividad realizada cumple con la seguridad y protección de los usuarios en la zona de trabajo.	0	4	28	0%	32	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
La Ejecución de la labor se encuentra organizada sin residuos que puedan dañar el medio ambiente producto del trabajo.	0	4	28	0%	32	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PROMEDIO DE SATISFACCIÓN	0%	100%	17%		39%	0%	0%		0%	0%	0%		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
ENCUESTAS	0		0			0			4		0			28			0				32			

Grafica Nº1 Tabulación Total de Encuestas de Satisfacción al Cliente COP 138 2023 GRUPO 1

VER ANEXO 3. CALIDAD.

4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Para el contrato COP 138 del 2023 El plan de gestión ambiental se enfoca más en el manejo de los residuos sólidos, ya que es el aspecto ambiental más relevante que se generó durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024**, no obstante, fueron pocas cantidades las que fueron registradas y en mayor medida con la gestión del manejo de residuos sólidos que realizo alumbrado público en la disposición final de los elementos de devolución que entrego el grupo 1.
EL CONSORCIO CIVING está comprometido para dar cumplimiento a las exigencias del plan de gestión ambiental, por lo tanto, en el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024**, se realizan inspecciones mensuales en el formato **HSEQ-F-18**, con respecto a los residuos sólidos e inspección de seguimiento a las prácticas ambientales en el formato **HSEQ-F-16**, en las instalaciones de esta misma, y evidenciar la debida clasificación de residuos en cada una de sus respectivas fuentes.

4.1 DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)									
	AÑO: 2023-2024	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
APROVECHABLES: papel, cartón, metal, plástico, vidrios		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORGANICOS: Cáscaras de frutas o verduras, restos de comida, desechos agrícolas		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NO APROVECHABLES: papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESIDUOS	CANTIDAD (PESO KG)									
	AÑO: 2023-2024	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
DESECHOS PELIGROSOS: EPPS contaminados, envases productos químicos, bolsas de cemento, residuos generados del protocolo de bioseguridad por COVID-19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**

Tabla 12 Plan de Gestión Ambiental Residuos Consorcio CIVING

VER ANEXO 4. AMBIENTAL

5. PMT

El Plan de Manejo de Tráfico es una herramienta técnica, que plantea las estrategias y alternativas necesarias para minimizar el impacto en la movilización en las vías, brindando un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, ciclistas, peatones, vecinos del lugar y el personal de las cuadrillas.
EL CONSORCIO CIVING se compromete a dar cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito causado por la ejecución del contrato 138 de 2023 cuyo objeto es Mantenimiento de Alumbrado Público.
Para la gestión del PMT se contrató una persona externa idóneo para este trámite, se radico el 10 de agosto de 2023 en la dirección de tránsito de Bucaramanga con un valor de $ 526.930 por un plan de implantación de mediano impacto; fue aprobado el 25 agosto de 2023 con oficio N° 550-2023.

5. 1 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE ÁREAS DE TRABAJO

Para la señalización y demarcación del área de trabajo se cuenta, 10 conos reflectivos por cuadrilla, con una altura de 70 cm o 90cm respectivamente, cinta de seguridad, 2 paletas de pare/siga y 2 señales luminosas cada por cuadrilla, se evidencia a través de los registros fotográficos, las señalizaciones del área de trabajo y vehiculares realizadas con el fin de restringir el paso de personal ajeno y anunciar situaciones de peligro.

DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 1			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización	Ninguno	0	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	0	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 1 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas	Ninguno	0	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 2			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización
Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas
DIFICULTADES ENCONTRADAS PARA SEÑALIZAR ÁREAS CUADRILLA 3			
HALLAZGOS PRESENTADOS	**No. DE HALLAZGOS**	**No. REPORTE EN QUE SE PRESENTA LA DIFICULTAD**	**ACCIÓN TOMADA**
Acceso difícil para transportar señalización.	Ninguno	**0**	En este periodo no se presentó dificultad para transportar la señalización

Conos con deficiente cinta fotoluminiscente	0	**0**	Las cintas foto luminiscentes de conos los de la cuadrilla 2 se encuentra en buen estado.
Otra ¿Cuál? Calles demasiado estrechas.	Ninguna	**0**	En este periodo no se presentaron trabajos de mantenimiento en calles estrechas

Tabla 13 Dificultades encontradas para la señalización de las cuadrillas.

ANEXO 16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

5.2 SEGUIMIENTO AL PMT, REUNIONES

Para este periodo se radico y se hizo el pago de la solicitud para la reunión de comité de tránsito el día 26 de febrero y el 3 de abril del 2024.

FECHA DE REUNIÓN	TEMAS DE REUNIÓN	NOMBRES ASISTENCIA
04 de diciembre de 2023 15 de diciembre de 2023	Se menciona la importancia de informar en los comités de tráfico aspectos de temas relacionados con el contrato. Informar a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga sobre actuaciones administrativas requeridas para Suspensiones, Prorrogas y/o Cierres al PMT. Informar cuando se realiza la suspensión del contrato 138 para realizar la respectiva radicación a la dirección de tránsito.	Gabriel Enrique Uribe Espitia Ludwing Fernando Rodríguez Barón Ruth Stella Reyes Morales Osvaldo Ariza Castillo
22 de febrero del 2024 03 de Abril del 20224	El 26 de Febrero del 2024 se realiza reunión del quinto 5 comité de transito, Informes, solicitud de reinicio y seguimiento al PMT aprobado mediante oficio N 550 -2023 para la obra 138 .Se cancela	Diana Joya Acuña

20 de mayo del 2024	Permisos de cargue y descargue . De igual forma nos reunimos el 03 de abril para seguimiento del PMT. El 17 de abril se cancela el seguimiento y la prorroga del PMT.. Se realiza reunión de seguimiento del PMT con Acta 7 y 8 con alcance hasta el 22 de mayo del 2024 .	Ruth Stella Reyes Morales Osvaldo Ariza Castillo

Tabla 14 Seguimiento Reuniones PMT.

VER ANEXO 5. PMT

6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST, tiene como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Involucrando a los trabajadores para que se dé un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud de todos que participan en la cadena de valor de una empresa.

El plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST para el trabajo en Alumbrado público, consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que incluyo la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

Para su efecto, EL CONSORCIO CIVING gestiona la prevención de los accidentes de trabajo, enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basaron en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar). El desarrollo articulado de estos elementos permitirá cumplir con los propósitos del plan SST. Además de los planes que la complementaron para que el plan SST sea íntegro y cumpla con las necesidades de todas las partes interesadas.

6.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

Vea en el anexo 6 matriz de identificación de peligros evaluación y valoración de riesgo.

VER ANEXO 6. SST

6.2. PLAN DE EMERGENCIAS

Durante el periodo del **1 al 31 de Mayo del 2024**, se realizaron algunas charlas con relación al plan de emergencia como una de las actividades que alimenta el plan de emergencia, dando como resultado un mejor entendimiento para los temas en el plan de respuesta ante las emergencias.
También se realizaron las inspecciones de los elementos de primeros auxilios “botiquín, camilla y extintor”, ubicados en las grúas, encontrándolos en buen estado, vigentes, de fácil acceso, a disposición del personal de mantenimiento del **CONSORCIO CIVING**.
Se realizó socialización del Medevac al personal indicándoles el protocolo a seguir en caso de accidentes.

ELEMENTOS DE EMERGENCIA		
GRUPO UNO	**ELEMENTO DE EMERGENCIA**	**CANTIDAD**
CUADRILLA 1	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 2	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1
CUADRILLA 3	BOTIQUÍN	1
	EXTINTOR	1
	CAMILLA	1

Tabla 15 Elementos de Emergencia

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

En el siguiente cuadro se especifica a detalle la conformación de la brigada de emergencias para el COP 138 del 2023.

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
Diana Joya Acuña	Brigadista	1,2,3	3184317177
Nixon Barón	Brigadista	1,2,3	315474208
Jerson Manosalva Pimiento	Brigadista	1,2,3	3174902545
Duván Jesús Camargo Flórez	Brigadista	1	3203488657
Daniel Alexander López Maldonado	Brigadista	1	3023417638
Fabian Ricardo Prada Vélez	Brigadista	1	3182168610
Javier Humberto Moreno Murillo	Brigadista	2	3204426078
Jorge Armando Villamizar Anaya	Brigadista	2	3213457798
Luciano Hurtado Córdoba	Brigadista	2	3158388803
German Cala	Brigadista	2	3173935118
Mauricio de Jesús Velásquez Daza	Brigadista	3	3112752901

CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EMERGENCIA			
NOMBRE	**CARGO**	**CUADRILLA**	**TELÉFONO**
Israel Bermudez	Brigadista	3	3125455347
Johan Eduardo González Rivera	Brigadista	3	3013141012
Luis Felipe Gómez Zapata	Brigadista	Viaducto	3003155775

Tabla 16 Conformación de Brigadas de Emergencias

VER ANEXO 6. SST

6.3 INSPECCIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA GRUPO 1

Durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** del COP 138 del 2023 se realizó inspección de los equipos de emergencias.

6.3.1 CAMILLA DE PRIMEROS AUXILIOS:

Para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** se realizaron las inspecciones de las camillas correspondientes a las cuadrillas, evaluando aspectos como: ubicación, señalización y estado general, los cuales fueron encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS				
GRUPO UNO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	24-05-2024	N/A	1 UND	
CUADRILLA 2	25-05-2024	N/A	1 UND	
CUADRILLA 3	24-05-2024	N/A	1 UND	

Tabla 17 Inspección de Camilla Grupo 1

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.2. BOTIQUÍN:

Para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** se realizaron las inspecciones de los botiquines correspondientes a las cuadrillas uno, dos y tres, evaluando aspectos como: cantidad, fecha de caducidad y estado general, encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en la siguiente tabla.

INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN				
GRUPO UNO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**FECHA DE TERMINACIÓN VIDA ÚTIL**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	25-05-2024	N/A	1 UND	
CUADRILLA 2	11-05-2024	N/A	1 UND	
CUADRILLA 3	25-05-2024	N/A	1 UND	

Tabla 18 Inspección de Botiquines Grupo 1

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.3. EXTINTOR:

Para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** realizaron las inspecciones de los extintores de las cuadrillas uno, dos y tres encontrados en estado óptimo como se puede verse a detalle en el siguiente cuadro.

INSPECCIÓN EXTINTORES						
GRUPO UNO	**FECHA DE INSPECCIÓN**	**TIPO DE EXTINTOR**	**CAPACIDAD**	**VENCIMIENTO**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
CUADRILLA 1	11 -05- 2024	ABC	10 LB	06/04/2025	1	
CUADRILLA 2	11 -05- 2024	ABC	10 LB	31/09/2024	1	
CUADRILLA 3	11 -05- 2024	ABC	10 LB	30/09/2024	1	
KGU 416	11 -05- 2024	ABC	5 LB	31/08/2024	1	

Tabla 19 Inspección de Extintores Grupo 1

VER ANEXO 6. SST
VER ANEXO 16 REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.3.4 UBICACIÓN DEL MEDEVAC

En el Periodo del **1 al 31 de mayo del 2024**, se mantuvo activo el MEDEVAC de manera explícita para los trabajadores y de fácil acceso en los vehículos. Se presentaron (0) incidentes, y no se presentan accidentes con lesiones orgánicas y económicas.
El Medevac reposa en una carpeta donde se encuentran relacionados los datos de todo el personal de las cuadrillas uno, dos y tres. El Medevac fue socializado.
VER ANEXO 6. SST

6.4 INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMOS DEL GRUPO 1

Para este periodo no se presentaron accidentes de trabajo.

VER ANEXO 6. SST

6.4.2 INDICADORES DE AUSENTISMO

6.4.2. AUSENTISMO

6.4.2.3 RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA

RELACIÓN DE AUSENCIA POR CAUSA EXTERNA							
Identificación	**Nombres y Apellidos**	**Motivo Relación de ausentismo por Causa Externa**	**Días Ausentismo**	**Fecha Inicio**	**Fecha Final**	**Nombre Entidad si aplica**	**Observaciones**
91512821	Jorge Villamizar	Enfermedad General	31	01-05-24	31-05-24		

Tabla 20 Ausentismo por causa Externa

VER ANEXO 6. SST

7. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO Y VERIFICACIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

Los análisis y la verificación de trabajo “ATS-VTA” anexados en el informe HSEQ presentado por el CONSORCIO CIVING son autorizaciones “por escrito”, que garantizan que los trabajadores a ejecutar la actividad han sido evaluados en todos sus riesgos y que se han tomado las medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de forma segura. Además, tanto la o las personas que van a ejecutarlo y la persona que emitió el permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello firman el respectivo permiso.

7.1. ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Véase en la tabla 21 el detalle los ATS diligenciados en periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** para el COP 138 de 2023 Grupo 1.

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS POR CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES

CUADRILLA	PERIODO	DÍAS LABORADOS POR CUADRILLA	No. DE ATS REALIZADOS	CONTROLES PRINCIPALES	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	1 al 31-05 -2024	25	131	Están contemplados en el formato HSEQ-F-11 (ATS)	Sin novedad de reporte
Cuadrilla 2	1 al 31-05 -2024	25	70	Están contemplados en el formato HSEQ-F-11 (ATS)	Sin novedad de reporte
Cuadrilla 3	1 al 31-05 -2024	25	83	Están contemplados en el formato HSEQ-F-11 (ATS	Sin novedad de reporte
TOTAL		75	284		

Tabla 21 Análisis de Trabajo Seguro

VER ANEXO 7. ATS

7.2 VERIFICACIÓN DE TRABAJO EN ALTURAS

Véase en la siguiente tabla 22 el número de permisos de trabajos en alturas diligenciados en el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024**.

GRUPO 1					
GRUPO	No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS	CONSECUTIVOS PERMISOS DE ALTURAS POR HOJAS	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PA	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	131	131	192-216 (25) 1 al 31 de mayo 2024	Duván Camargo Daniel López Fabian Prada	Trabajos en alturas realizados en total normalidad

GRUPO 1					
GRUPO	**No: PERMISOS VERIFICACIÓN DE ALTURAS**	**No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN TRABAJO EN ALTURAS**	**CONSECUTIVOS PERMISOS DE ALTURAS POR HOJAS**	**PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PA**	**OBSERVACIONES**
Cuadrilla 2	**70**	**70**	**183-206 (23) 1 al 31 de mayo 2024**	Javier Moreno Luciano Hurtado Jerson Manosalva German Cala	Trabajos en alturas realizados en total normalidad
Cuadrilla 3	**83**	**83**	**189- 211 (23) 1 al 31 de mayo 2024**	Mauricio Velásquez Johan Gonzales Israel Bermudez	Trabajos en alturas realizados en total normalidad
TOTAL	**284**	**284**			

Tabla 22 Permisos de Trabajo en Alturas

VER ANEXO 8. ALTURAS E IZAJE

7.3 PERMISOS DE TRABAJO IZAJE DE CARGAS

Para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** se realizaron manejos de carga manual que para este mes fueron por el movimiento de luminarias de reposición, pero catalogadas como “Izaje de carga no critica”. En el siguiente cuadro se detalla el Izaje de carga critica como postes y otros elementos, pero lo que para este periodo aplico.

CUADRILLA	No: PERMISOS DE IZAJE	No. ACTIVIDADES QUE REQUIEREN IZAJE	PERSONAS QUE AUTORIZAN LOS PTI	OBSERVACIONES
Cuadrilla 1	0	0		VER ANEXO 8. IZAJE
Cuadrilla 2	0	0		
Cuadrilla 3	1	1		
TOTAL	**1**	**1**		

Tabla 23 Izaje de Cargas

VER ANEXO 8. ALTURAS E IZAJE

7.4 VERIFICACIÓN EQUIPOS DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS Y HERRAMIENTA MÍNIMA POR CUADRILLA.

Para el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** se cuenta EPCC para cada cuadrilla con fechas vigentes de certificación, dispuestos para El CONSORCIO CIVING, como puede registrarse en el Excel anexo, donde se indica el tipo de equipo, cantidad, lote, serie, fecha de fabricación, fecha de certificación y estado general de los elementos.
Se realiza inspección diaria de los equipos por parte de los técnicos

Durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** se realiza inspección de herramientas y equipos de las cuadrillas sin modificaciones ergonómicas y en buen estado como se refleja en anexo.

Durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** se realiza inspección de los guantes dieléctricos diariamente, como puede registrarse en el Excel anexo.
Se realiza inspección diaria de los guantes por parte de los técnicos.

ANEXO 9. ACTIVIDADES HSEQ

7.5 ENTREGA DE DOTACION, REPOSICIÓN DE EPP

7.5.1 ENTREGA DE DOTACIÓN

En el siguiente cuadro los se relacionan la dotación entregada con respectiva fecha, trabajador, cantidades, y elementos entregados al personal del COP 138 del 2023.

Tabla 24 Entrega de Dotación Civing

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP PERSONAL					
ELEMENTO INSP.	**FECHA**	**TRABAJADOR**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**MOTIVO**	**TOTAL, MES**
Camisas ignifugas, Pantalón Jeans ignifugo Botas dialécticas Gafas claras Gafas oscuras Guantes de vaqueta, Guantes de precisión, Casco Barbuquejo, Capuchón ignifugo	31-05-2024	Daniel Lopez	2 Und. Camisas ignifugas, 2 Und. Pantalón ignifugo **1 Und. Botas Dialécticas** 1 Und. Gafas claras 1 Und. Gafas oscuras 1 Und. Guantes de vaqueta, 1 Und. Guantes de precisión 1 Und. Casco Tipo II 1 Und. Barbuquejo 1 Und. Capuchón ignifugo	Entrega de Dotaciín	unidad por persona

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP PERSONAL					
ELEMENTO INSP.	**FECHA**	**TRABAJADOR**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**MOTIVO**	**TOTAL, MES**

ENTREGA DE DOTACIÓN Y EPP PERSONAL					
ELEMENTO INSP.	**FECHA**	**TRABAJADOR**	**CANTIDAD ENTREGADA**	**MOTIVO**	**TOTAL, MES**
Camisas ignifugas, Pantalón Jeans ignifugo Botas dialécticas Gafas claras Gafas oscuras Guantes de vaqueta, Guantes de precisión, Casco Barbuquejo,	01-06-2024	Luis Gomez	1 Und. Camisa ignifuga 1 Und. Pantalón ignifugo 1Und. Botas Dialécticas 1 Und. Gafas claras 1 Und. Gafas oscuras 1 Und. Guantes de vaqueta, 1 Und. Guantes de precisión 1 Und. Casco Tipo II	Entrega de segunda Dotacion	2 unidad por persona

Tabla 25 Entrega de Dotación Viaducto

ANEXO 9. ACTIVIDADES HSEQ
ANEXO 16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

8. VERIFICACIÓN DE AFILIACIONES, PAZ Y SALVOS Y SEGURIDAD SOCIAL.

Se realiza las respectivas afiliaciones al personal del CONSORCIO CIVING y se adjuntan planillas de pago correspondiente a **1 al 31 de Mayo del 2024**.

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO CIVING								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**E.P.S.**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**	**OBSERVACIONES**
1	GERMAN CALA	91528645	TECNICO ELETRICISTA	SANITAS	COLFONDOS	SURA	CAJASAN	
2	DUVÁN JESÚS CAMARGO FLORÉZ	1.095.925.779	JEFE DE CUADRILLA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	CAJASAN	
3	DANIEL ALEXANDER LÓPEZ MALDONADO	1.098.784.128	TÉCNICO ELECTRICISTA	SALUD MIA	PORVENIR	SURA	CAJASAN	
4	FABIAN RICARDO PRADA VÉLEZ	91.181.946	TÉCNICO ELECTRICISTA	COOSALUD	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
5	JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO	79.530.432	JEFE DE CUADRILLA	NUEVA EPS	PROTECCIÓN	SURA	CAJASAN	
6	JORGE ARMANDO VILLAMIZAR	91.515.821	TÉCNICO ELECTRICISTA	SALUD MIA	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
7	LUCIANO HURTADO CÓRDOBA	79.832.439	TÉCNICO ELECTRICISTA	SANITAS	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
8	MAURICIO DE JESÚS VELÁSQUEZ DAZA	1.098.629.229	JEFE DE CUADRILLA	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	
9	ISRAEL BERMUDEZ	91287160	TÉCNICO ELECTRICISTA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
10	JOHAN EDUARDO GONZÁLEZ RIVERA	1.095.825.298	TÉCNICO ELECTRICISTA	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	CAJASAN	
11	JERSON MANOSALVA PIMIENTO	1.102.361.055	SUPERNUMERARIO	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	
12	DIANA MILENA JOYA A	63505364	SUPERVISOR HESQ	SALUD MIA	COLPENSIONES	SURA	CAJASAN	

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL CONSORCIO CIVING								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	E.P.S.	PENSIÓN	ARL	CCF	OBSERVACIONES
13	NIXON BARON	74187074	ING . RESIDENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	CAJASAN	

Tabla 26 Afiliaciones a Seguridad Social

AFILIACIONES A SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL VIADUCTO								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	E.P.S.	PENSIÓN	ARL	CCF	OBSERVACIONES
1	RACHID OLIVEROS ACOSTA	88.158.166	ING. ELECTRONICO	SANITAS	SKANDIA	POSITIVA	COMFAORIENTE	
2	LUIS DIAZ	5.477.534	TECNOLOGO DE CAMARAS DE SEGURIDAD	NUEVA EPS	COLFONDOS	POSITIVA	COMFAORIENTE	
3	JONATHAN FERNANDO BUITRAGO GUTIERREZ	1.090.466.708	TECNOLOGO DE COMUNICACIÓN	COMPENSAR	PROTECCIÓN	POSITIVA	COMFAORIENTE	
4	LUIS FELIPE GÓMEZ ZAPATA	1.095.930.728	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	SALUD TOTAL	PROTECCIÓN	POSITIVA	CAJASAN	

Tabla 27 Afiliaciones a Seguridad Social Personal Viaducto

ANEXO 10. AFILIACIONES Y PLANILLAS

8.1. HISTORICO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL				
AÑO	MES	NÚMERO DE PLANILLA	CARLOS LÓPEZ	NÚMERO DE PLANILLA VIADUCTO
2023	JULIO	27360965	27269072	9454702466
2023	AGOSTO	27578759	27578734	9455955499
2023	SEPTIEMBRE	27799320	27800718	9457405641
2023	OCTUBRE	28083086	28082730	9458730962
2023	NOVIEMBRE	28386676	28385568	9460076371
2023	DICIEMBRE	28704199	28705307	9461330113
2024	ENERO	28873804	28876608	9462667849
2024	FEBRERO	29248186	29247292	9464098425
2024	MARZO	29482453	29504843	9465244699
2024	ABRIL	29804292	29801846	9466816652
2024	MAYO	30029603	30031962	9468144186

Tabla 28 Histórico de Pagos Seguridad Social

ANEXO 10. AFILIACIONES Y PLANILLAS

9. EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO PERIODICO Y/O EGRESO

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSORCIO CIVING								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
1	LUDWING FERNANDO RODRIGUEZ BARON	1.098.692.767	ING. RESIDENTE	EGRESO	18/02/2024	25/07/2023	Examen médico ocupacional de Egreso	No se presento al Examen .

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSORCIO CIVING								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
2	GABRIEL ENRIQUE URIBE ESPITIA	13.741.476	SUPERVISOR HSEQ	EGRESO	28/03/2024	25/07/2023	Examen médico ocupacional de Egreso	No se presento al Examen .
3	DUVÁN JESÚS CAMARGO FLORÉZ	1.095.925.779	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
4	DANIEL ALEXANDER LÓPEZ MALDONADO	1.098.784.128	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
5	CARLOS HUMBERTO DIAZ GAITAN	91.477.786	TÉCNICO ELECTRICISTA	EGRESO	28/11/2023	25/07/2023	Examen médico de Egreso	No se presentó al examen
6	FABIAN RICARDO PRADA VÉLEZ	91.181.946	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	01/12/2023	04/12/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar.
7	JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO	79.530.432	JEFE DE CUADRILLA	INGRESO	14/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
8	JORGE ARMANDO VILLAMIZAR	91.515.821	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
9	LUCIANO HURTADO CÓRDOBA	79.832.439	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar con Recomendaciones
10	MAURICIO DE	1098629229	JEFE DE	INGRESO	28/08/2023	04/09/2023	Examen médico ocupacional	Apto para Laborar

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES CONSORCIO CIVING								
N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	TIPO DE EXAMEN	FECHA DEL EXAMEN	FECHA DE INGRESO	ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)	OBSERVACIONES
	JESÚS VELÁSQUEZ DAZA		CUADRILLA				con énfasis osteomuscular y en alturas	
11	JUAN GUILLERMO FUENTES MUÑOZ	1.095.926.446	TÉCNICO ELECTRICISTA	EGRESO	09/03/2024	25/07/2023	Examen médico ocupacional de Egreso	No se presento al Examen .
12	JOHAN EDUARDO GONZÁLEZ RIVERA	1.095.825.298	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	08/07/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
13	JERSON MANOSALVA PIMIENTO	1.102.361.055	SUPERNUMERARIO	INGRESO	13/06/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
14	DIANA JOYA ACUÑA	63505364	SUPERVISOR HSE	INGRESO	13/02/2024	15/02/2024	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
15	NIXON BARON	74187074	ING. RESIDENTE	INGRESO	19/02/2024	20/02/2024	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
16	ISRAEL BERMUDEZ	91287160	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	11/02/2024	12/02/2024	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar
17	GERMAN CALA	91528645	TÉCNICO ELECTRICISTA	INGRESO	15/11/2023	16/04/2024	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	Apto para Laborar

Tabla 29 Exámenes Médicos

ANEXO 11. EXAMENES MEDICOS Y PSICOSENSOMÉTRICOS

EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES PERSONAL VIADUCTO								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
1	RACHID OLIVEROS ACOSTA	88.158.166	ING. ELECTRONICO	INGRESO	08/07/2023	25/07/2023	Examen médico osteomuscular	
2	RICARDO CHACÓN RODRÍGUEZ	1.090.484.113	TECNOLOGO DE CAMARAS	EGRESO	29/02/2023	25/07/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular	No se presento al examen
3	LUIS CARLOS SANDOVAL CALDERON	1.098.668.582	TECNOLOGO DE COMUNICACIÓN	EGRESO	26/11/2023	17/10/2023	Examen médico de Egreso	No se presentó al examen
4	JONATHAN FERNANDO BUITRAGO GUTIERREZ	1.090.466.708	TECNOLOGO DE COMUNICACIÓN	INGRESO	11/12/2023	12/12/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	
5	LUIS FELIPE GÓMEZ ZAPATA	1.095.930.728	AUXILIAR DE COMUNICACIONES	INGRESO	23/10/2023	25/10/2023	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular y en alturas	
6	LUIS DIAZ	5.477.534	TECNOLOGO DE CAMARAS	PERIODICO	23/05/2023	23/04/2024	Examen médico ocupacional con énfasis osteomuscular	

Tabla 30 Exámenes Médicos Personal Viaducto

ANEXO 11. EXAMENES MEDICOS Y PSICOSENSOMÉTRICOS

9.1. EXÁMENES PSICOSENSOMÉTRICOS

En el siguiente cuadro se relaciona los conductores de las grúas y camionetas dispuestas para el COP 138 del 2023.

EXAMENES PSICOSENSOMÉTRICO								
N°	**NOMBRE**	**CÉDULA**	**CARGO**	**TIPO DE EXAMEN**	**FECHA DEL EXAMEN**	**FECHA DE INGRESO**	**ENFASIS EXAMÉN MÉDICO (DESCRIPCIÓN)**	**OBSERVACIONES**
1	DUVÁN JESÚS CAMARGO FLORÉZ	1.095.925.779	JEFE DE CUADRILLA	PSICOSENSOMÉTRICO	06/07/2023	25/07/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar
2	JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO	79.530.432	JEFE DE CUADRILLA	PSICOSENSOMÉTRICO	14/06/2023	25/07/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar
3	MAURICIO DE JESÚS VELÁSQUEZ DAZA	1098629229	JEFE DE CUADRILLA	PSICOSENSOMÉTRICO	28/08/2023	04/09/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar
4	JERSON MANOSALVA PIMIENTO	1.102.361.055	TÉCNICO ELECTRICISTA	PSICOSENSOMÉTRICO	13/06/2023	25/07/2023	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar
5	NIXON BARON	74187074	ING. RESIDENTE	PSICOSENSOMÉTRICO	19/02/2024	20/02/2024	Coordinación Motriz y Test Psicológico	Apto para Laborar

Tabla 31 Exámenes Psicosensométricos

ANEXO 11. EXÁMENES MÉDICOS Y PSICOSENSOMÉTRICOS

10. REGISTRO DE INDUCCIÓN HSEQ DE PERSONAL

A partir del día **1 al 31 de mayo 2024** se realizaron inducción a el personal del CONSORCIO CIVING, el cual se encuentra vigente hasta la fecha.

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
---		100 %	INDUCCIONES

Tabla 32 Inducción

FECHA	ASISTENCIA	% COBERTURA (Asistentes/personal que requiere)	OBSERVACIONES
---		100%	INDUCCIONES

Tabla 33 Inducción Personal Viaducto

ANEXO 12. INDUCCIÓN

11. REGISTRO DE CHARLAS Y CAPACITACIÓN EN HSEQ

En el anexo 13 se encuentra un formato Excel con las charlas y capacitaciones realizadas durante el periodo del **1 al 31 de mayo del 2024** de las cuadrillas del grupo1, también se evidencia con registro fotográfico y formato de asistencia.

ANEXO 13. CHARLAS Y CAPACITACIONES
ANEXO 16. REGISTRO FOTOGRÁFICO

11. 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el siguiente cuadro se detallan las actividades realizadas durante el periodo del **1 al 31 de Mayo del 2024.**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES HSEQ GRUPO 1			
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	**EJECUTADO**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES**
Inspección de EPP	SI	100%	Ver registro en el anexo 14
Inspección de Herramientas	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Reposición de EPPS	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Inspección de Guantes Dieléctricos	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Inspección de EPCC	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Inspección HSEQ	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Inspección de Orden y Aseo en Vehículos	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
Paz y Salvo	SI	100%	Ver registro en el anexo 14.
% CUMPLIMIENTO TOTAL		**100%**	
OBSERVACIONES			

Tabla 34 Cronograma de Actividades

ANEXO 14. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES

12. COPASST.

Para el presente periodo, se realizó reunión del COPASST el día **31 de mayo del 2024**.

COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

JAVIER HUMBERTO MORENO MURILLO						
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS						
ASHLEY SARAY ARIAS						
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COPASST						
ACTIVIDAD A REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
Reunión Copasst	Diana Joya	31 de mayo del 2024	31 de mayo del 2024	31 de mayo 2024	ACTIVO	

Tabla 35 COPASST

ANEXO 15. COPASST Y CONVIVENCIA

13. COMITÉ CONVIVENCIA.

Para el presente periodo, se realizó reunión del Comité de Convivencia para el día 31 de Mayo 2024

COMITÉ DE CONVIVENCIA						
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES						
DUVAN JESÚS CAMARGO FLOREZ						
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOR						
NIXON BARÓN						
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COMITÉ						
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**


COMITÉ DE CONVIVENCIA						
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES						
DUVAN JESÚS CAMARGO FLOREZ						
REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOR						
NIXON BARÓN						
SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES DEL COMITÉ						
ACTIVIDAD PARA REALIZAR	**RESPONSABLE**	**FECHA PROPUESTA DE EJECUCIÓN**	**FECHA DE EJECUCIÓN**	**SEGUIMIENTO**	**ESTADO DE LA ACTIVIDAD**	**OBSERVACIONES**
Reunión Comité	Diana Joya	29 de Julio del 2024	---	29 de julio del 2024	ACTIVO	

Tabla 36 Convivencia

ANEXO 15. COPASST Y CONVIVENCIA

Presentado por:

CONSORCIO CIVING



_____

ESP . DIANA MILENA JOYA ACUÑA
PROFESIONAL HSEQ
CONSORCIO CIVING
