INFORMACIÓN DEL CONTRATO 1432 DEL 10/04/2024			
OBJETO:	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN CON LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
PERIODO DEL INFORME:	13 de agosto de 2024 – 11 de septiembre de 2024	**FECHA DEL INFORME:**	16 de septiembre de 2024

AVANCE

Estimación Actual		Realidad Actual		% Avance a la fecha	
Inicio (DD/MM/AA)	**Fin (DD/MM/AA)**	**Inicio (DD/MM/AA)**	**Fin (DD/MM/AA)**	**Avance Estimado**	**Avance Real**
13/08/2024	**11/09/2024**	**15/04/2024**	**11/10/2024**	**83.32%**	**83.32%**

Observaciones:

ETAPAS	Estimación Actual		Realidad Actual		% Avance a la fecha		
	Inició (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Avance Estimado	Avance Real	Observaciones
1. Ejercer apoyo a la supervisión de convenios y (o contratos que le sean asignados en el área de bienes y servicios de la secretaria de educación departamental, según las disposiciones legales vigentes	**13/08/2024**	**11/09/2024**	**15/04/2024**	**14/10/2024**	**83.32%**	**83.32%**	Se asigno mediante la resolución No.2870 del 10/05/2024 el apoyo a la supervisión de los siguientes contratos: Contrato No 1833 de 2023, cuyo objeto es: "Contratar la consultoría para el ajuste a diseños e implantación para la sede principal de la I.E Playa Rica de Palocabildo y la sede Dos Quebradas de la I.E Normal Superior de Icononzo". - Está en revisión productos de la consultoría.se

Powered by CamScanner

2. Participar en los comités de evaluación de los procesos precontractuales del área de bienes y servicios en los que sea designado mediante acto administrativo por parte del ordenador del gasto, para el cumplimiento de las metas de infraestructura educativa de la vigencia y acorde con el plan de adquisiciones.	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	No se asignó para el presente periodo
3. Proyectar la revisión, emitir conceptos y/o avales de subproyectos del macroproyecto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA", presentados o desarrollados por la secretaria de educación en concordancia con la normatividad vigente NTC-4595, NSR-10, RAS 2000 y demás que le sean aplicables de acuerdo con las exigencias de las posibles fuentes de financiación.	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	Se apoya en la estructuración del subproyecto para el mejoramiento de la sede educativa San Luis Gonzaga, para ajustar en estudio de diseños para mejoramiento. Se apoya en la estructuración del subproyecto para el diseño de la sede del ITFIP del municipio de Espinal para ajustar en estudio de diseños, se apoya en revisión y cambio para el proyecto de IE bolívar del municipio de santa Isabel. Se apoyo revisión de estudios y diseños de santa rosa de lima en Suarez.
4.Elaborar informes de ejecución y/o seguimiento a las metas del plan de desarrollo en concordancia con el macroproyecto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	Realizo informe para proyección de restaurante IE francisco Sáez de Icononzo. Ajuste a planimetría del restaurante de la IE nuestra señora de del

Powered by CamScanner

EDUCATIVA" así como la presentación de reportes y registros para el ministerio de educación nacional, sistema general de regalías, secretaria de planeación y TICs, entes de control.							Carmen del Líbano para mejoramiento a cocina.
5. Elaborar, presentar y/o revisar documentos técnicos tales como diagnósticos, certificaciones, cantidades de obra, análisis de precios unitarios y presupuestos, que se requieran para la actualización o estructuración de subproyectos del macroproyecto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	se revisó diseños hidráulicos y eléctrico enviando observaciones para el Proyecto CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUAREZ - TOLIMA" Revisión proyecto I.E SAN LUIS GONZAGA MUNICIPIO DE SAN LUIS -TOLIMA, esquema básico para la construcción de mega colegio evidenciando que no sean realizado ajustes socializados en reunión anteriores.
6. Asistir a reuniones y/o visitas con el fin de atender requerimientos de infraestructura educativa y presentar los informes y/o diagnósticos correspondientes al área de bienes y servicios de la secretaria de educación departamental.	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	Se realizó vista con el PAE a municipio de palocabildo, a las instituciones Playa rica y IE Leopoldo García. Se realizó acompañamiento a la IE nuestra señora del Líbano, se presenta propuesta de adecuación de restaurante. Se apoya a la logística en entrega de materiales para mejoramiento de las EI del municipio del Líbano

Powered by CamScanner

7.Prestar apoyo a los profesionales del área de bienes y servicios de la secretaria de educación departamental con las respuestas de PQRS originados del SAC y/o la presentación de informes cuando le sean solicitados por el supervisor del contrato.	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	ESTA ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA PARA EL PRESENTE PERIODO
8.Organizar y responder por la documentación, archivos físicos y magnéticos del área de bienes y servicios que estén a su cargo para el cumplimiento del contrato.	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	Se mantiene el archivo y la documentación en carpetas digitales.
9. Cargar la información de los proyectos SGR a la plataforma del GESPROY y de las demás plataformas que se requieran del área de bienes y servicios.	13/08/2024	11/09/2024	15/04/2024	14/10/2024	83.32%	83.32%	ESTA ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA PARA EL PRESENTE PERIODO

Powered by CamScanner

EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD N°1

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
Secretaría de Educación

@gobertolima
www.tolima.gov.co

RESOLUCION No. 2870
30 MAY 2024

"Por medio del cual se asigna el apoyo a la supervisión de contratos y convenios del Área de Bienes y Servicios - Recursos Físicos de la Secretaría de Educación del Tolima"

**LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Departamental No. 0159 del 1 de marzo de 2024 y el literal O del numeral 2.1 del manual de contratación adoptado mediante Decreto Departamental No. 0810 del 21 de julio 2017.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
Secretaría de Educación

@gobertolima
www.tolima.gov.co

RESOLUCION No. 2870
30 MAY 2024

"Por medio del cual se asigna el apoyo a la supervisión de contratos y convenios del Área de Bienes y Servicios - Recursos Físicos de la Secretaría de Educación del Tolima"

LA SECRETARIA DE EDUCACION
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Departamental No. 0159 del 1 de marzo de 2024 y el literal O del numeral 2.1 del manual de contratación adoptado mediante Decreto Departamental No. 0810 del 21 de julio 2017.

Powered by CamScanner

ACTIVIDAD N° 2

GOBERNACION DEL TOLIMA
NIT. 800113672-7
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. 8777

Vigencia: 2 024 Fecha de Compromiso: 3 de septiembre de 2024

Beneficiario ASCENCIO MONTENEGRO JEFFRY ALEJANDRO Nit: 1110497519 - 8
No. C.D.P. : 2615 Fecha de Expedición del C.D.P.: 26 de abril de 2024 Con Formalidades Plenas
Tipo de Compromiso CONTRATO DE OBRA
Contrato: 2245 Fecha: 2/08/2024 Vence: 31/12/2024
Objeto: MEJORAMIENTO DE LAS SEDES MARCO MANUEL RUIZ DE LA I.E FRANCISCO MIRANDA Y SEDE LA ESPERANZA DE LA I.E LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA- DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO. CM EP2MP40
Cta.Utilidad : SECRETARIA DE EDUCACION

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Inversión Sección Central - Tolima, Tierra De Inclusión Y Bienestar 03 - 311110 - 2 3 2 02 02 005 - 7709	Construcción y servicios de la construcción Clasificadores 22512203052-13709-2021004730109-1-1 3 2 3 1 3 4 9 0 01706-0 47 551 007,00	47.551.007,00

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT 800 113 6722
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURIDICOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	2245 Fecha: 2 / 08 / 2024
Programa No.	VIGENCIA 2024
Unidad Contratante	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT	800113672-7
Contratista	JEFFRY ALEJANDRO ASCENCIO MONTENEGRO
Cedula	1 110 497 519
Representante Legal	JEFFRY ALEJANDRO ASCENCIO MONTENEGRO
N° de Registro	52001-2024
Régimen Tributario	NO RESPONSABLE DE IVA
Cuenta Bancaria	CUENTA AHORROS N° [redacted] BANCO BANCOLOMBIA

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT 800113672-7 representada por GERMAN PATRICIO ARBOLEDA GARCIA S.A. identificado con cedula de ciudadanía N° 16.792.782 en calidad de Secretario de Desarrollo Económico con constancia con el Decreto N° 0004 de enero de 2024, delegado por la Gobernadora para suscribir la Licencia de Ocupación del Suelo, en concordancia con el Departamento del Tolima, de conformidad con el Decreto N°0100 de 27 de marzo de 2024, quien en adelaante se denominara EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra JEFFRY ALEJANDRO ASCENCIO MONTENEGRO identificado con cedula de ciudadanía N° 1.110.497.519 quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA y hacen que tiene capacidad para celebrar este contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes acordando celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

1. Objeto:	MEJORAMIENTO DE LAS SEDES MARCO MANUEL RUIZ DE LA I.E FRANCISCO MIRANDA Y SEDE LA ESPERANZA DE LA I.E LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE ROVIRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
2. Plazo:	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO contados a partir de la firma del acta de inicio previa cumplimiento de los requisitos de legalización, ejecución y perfeccionamiento.
3. Lugar de ejecución:	Municipio de Rovira, Departamento del Tolima
4. Obligaciones de contratista y del Departamento:	OBLIGACIONES GENERALES 1. Cumplir con el objeto del contrato. 2. Firmar las actas de inicio, suspensión, terminación, modificación o adición y terminación y que haya lugar de conformidad con el suscripción. 3. Presentar informes solicitados por el supervisor. 4. Guardar la confidencialidad, reserva sobre la información que se entregue en el desarrollo de las actividades contractuales. 5. Realizar la actualización en el sistema Unico de la Plataforma SECOP II respecto al cargue de los informes con los anexos que soporten el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. 6. En caso que se suscite y presentes una emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia del coronavirus COVID-19.

3 | 8

ACTIVIDAD N 3

PLANIMETRIA COMPLETA - MEGA COLEGIO SAN LUIS

CONSORCIO MEGACOLEGIO

Cordial saludo

Por medio de la presente hacemos entrega de la planimetría "definitiva" de todo el proyecto de la referencia para su respectiva revisión.

Las plantas arquitectónicas se encuentran en un nivel de estudio final, los cortes y las fachadas también tienen un nivel de detalle final para carecen de información tal como especificaciones y textos sobre los cuales se seguirá avanzando y se presentarán en la entrega final.


La información contenida está organizada de la siguiente manera:

- Bloque A: Plantas, Cortes y Fachadas
- Bloque B: Plantas, Cortes y Fachadas
- Bloque C: Plantas, Cortes y Fachadas
- Aulas TIC: Plantas, Cortes y Fachadas
- Biblioteca: Plantas, Cortes y Fachadas
- Laboratorio de Física: Plantas, Cortes y Fachadas
- Laboratorio de Química y ciencias en: Plantas, Cortes y Fachadas
- Polideportivo: Plantas, Cortes y Fachadas
- Porteria/Cafeteria/C. Tecnicos: Plantas, Cortes y Fachadas
- Unidad Materna: Plantas, Cortes y Fachadas
- Urbanismo: Plantas Piso 1 y 2 + DWG


Cada paquete contiene los archivos en DWG y en PDF, los archivos DWG son los extraidos del Revit por lo que se recomienda revisar la información en Revit para ver la expresión gráfica real o en su defecto en los PDFS.

Se anexa el archivo de RVT en el que está contenido todo la información del proyecto, organizada por cada bloque con los avances hasta la fecha.

PLANIMETRIA MEGACOLEGIO SL 24.rar

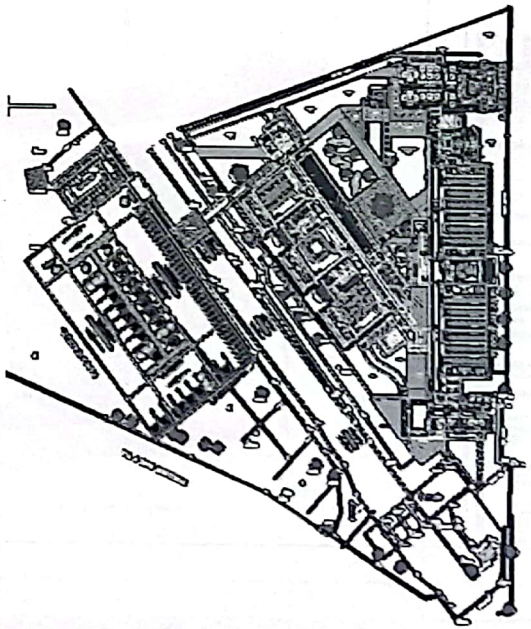


Powered by CamScanner

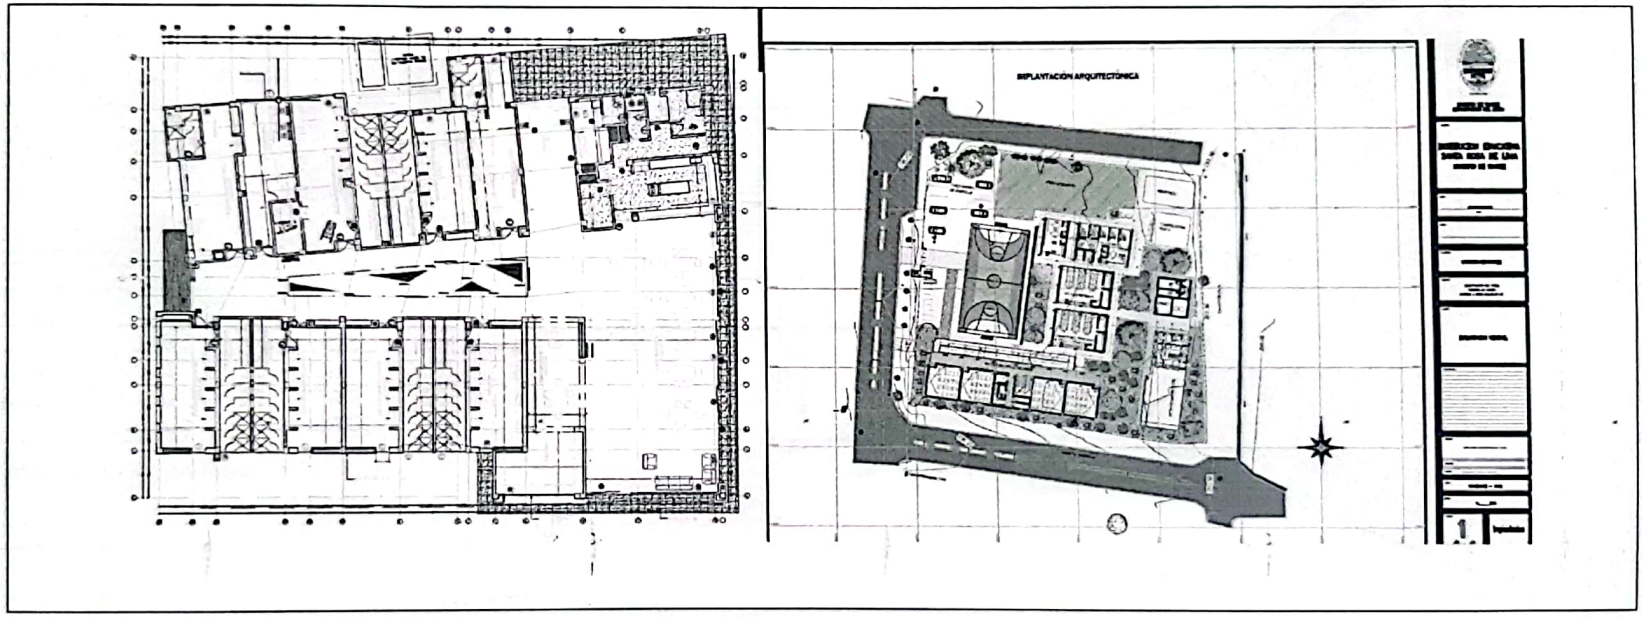


Powered by CamScanner

Actividad N° 4:

	GOBERNACION DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 04
	MACROPROCESO:	GESTION ESTRATEGICA	Pág. 4 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 06/11/2021

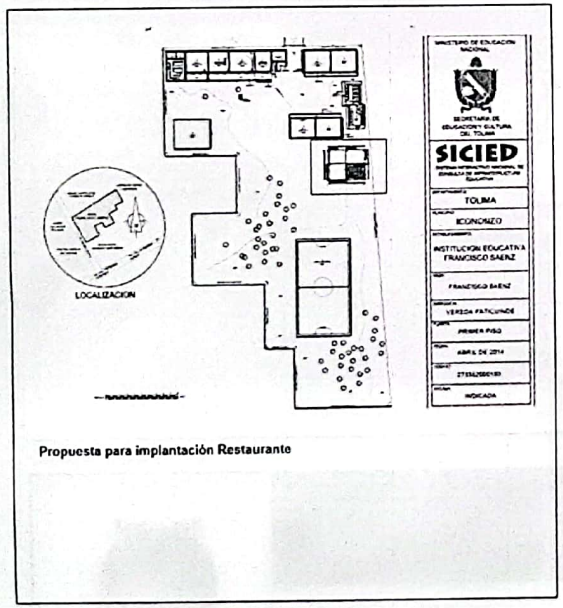

Propuesta para implantación Restaurante

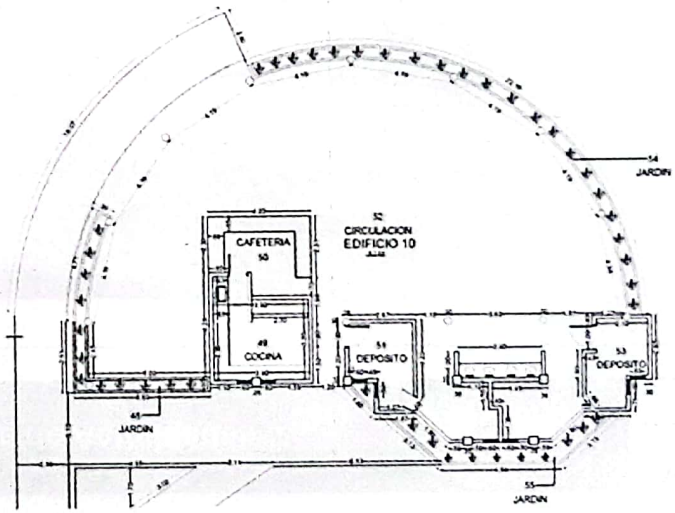

Powered by CamScanner

Actividad N° 5:

AJUSTE OBSERVACIONES RECIBIDAS

Ocultar historial de mensajes

De: Secretaria De Planeacion, Obras Publicas Y Agricultura Suarez Tolima <planeacion@suarez-tolima.gov.co>
Enviado el: jueves, 5 de septiembre de 2024 7:50 a. m.
Para: LIDA ALEXANDRA DIAZ CLAVIJO <Lida.Diaz@sedtolima.gov.co>
Asunto: AJUSTE OBSERVACIONES RECIBIDAS

PROYECTO CON AJUSTE.rar


Cordialmente,

Secretario De Planeacion, Obras Publicas y Desarrollo Agropecuario
Suarez Tolima

Powered by CamScanner


Actividad N° 6:




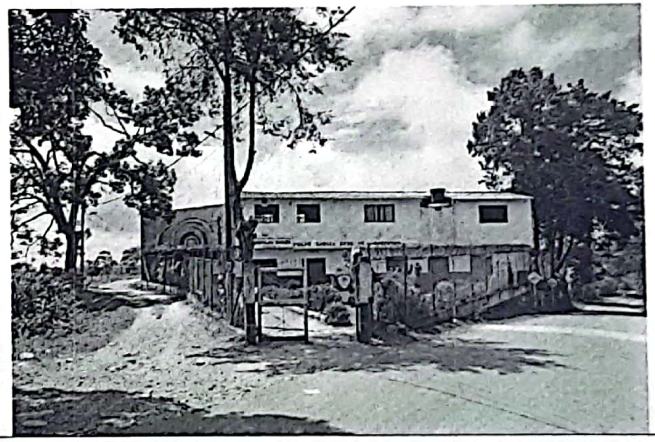

Powered by CamScanner

Informe de Actividades 5

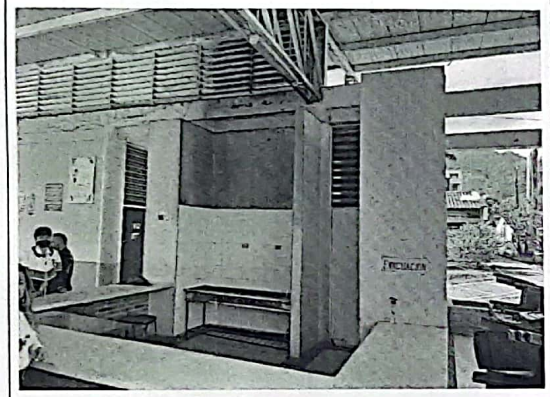

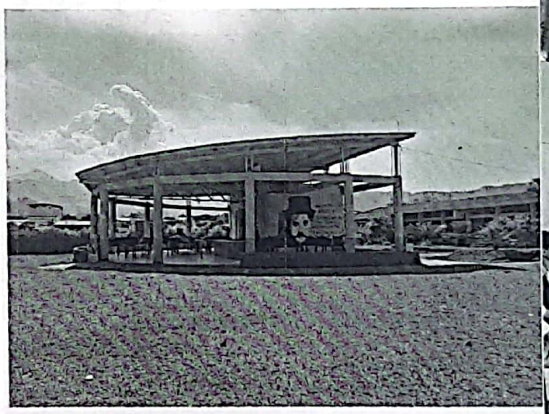




Actividad N° 7:

ESTA ACTIVIDAD NO FUE REQUERIDA PARA EL PRESENTE PERIODO

Powered by CamScanner

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:
Nombres y apellidos	ALBERTO ALEXANDER GIRALDO VILLALBA Contratista	ELIZABETH ARCINIEGAS SÁNCHEZ SUPERVISORA
Firmas		

Powered by CamScanner
