FECHA DEL INFORME:	21 DE AGOSTO DE 2024

DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA:	LUIS ALFONSO PALOMARES ROMERO
IDENTIFICACION:	C.C. 3.199.222 de Tenjo
NUMERO CONTRATO:	005-CMNC-2024
FECHA DE INICIO	25 de Julio de 2024
FECHA DE FINALIZACION:	25 de Noviembre de 2024
SUPERVISOR:	JESUS REINALDO SANCHEZ AMAYA


PERIODO:	DESDE	25 de Julio de 2024	HASTA:	21 de Agosto de 2024
ANEXOS DEL INFORME:		REGISTRO FOTOGRAFICO PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL		

ACTIVIDADES REALIZADA

Para el periodo de Julio- Agosto del 2024 se realizaron trabajos en cada uno de los ítems propuestos en el cronograma de actividades dentro del contrato que tiene por objeto "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CUARTO DE BOMBAS Y CUARTO ELÉCTRICO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI (HUELLAS BELEMITAS), DEL MUNICIPIO DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES – CAQUETÁ**", en el presente informe se evidencia lo elementos a los cuales se les hizo el mantenimiento preventivo o reparación según lo requiriera.

1-Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de inyección a presión de agua potable con bomba elevadora hidroflot.

Se realiza con el fin de que las bombas a presión no se deterioren ya que es la encarga de suministrar el agua para uso de Lava mano y Lava platos.

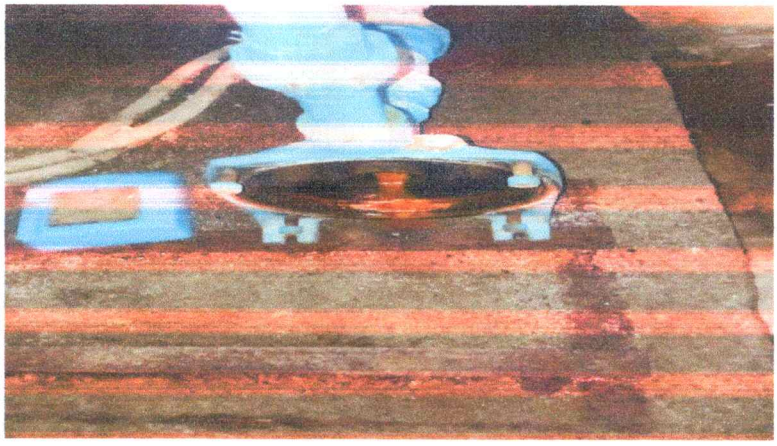





2- Mantenimiento preventivo y correctivo de electrobombas y adecuación eléctrica del sistema contra incendios.







3- Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema integrado de reutilización de aguas lluvias.

Se Realiza con el fin de suministrar el agua a los inodoros, lava traperos, riego y cuarto de aseo.




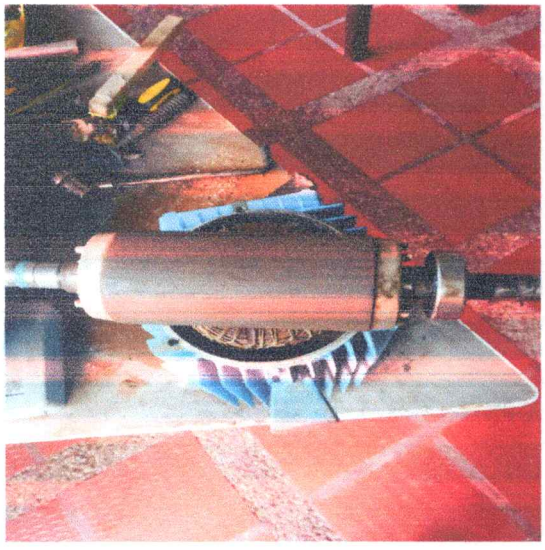


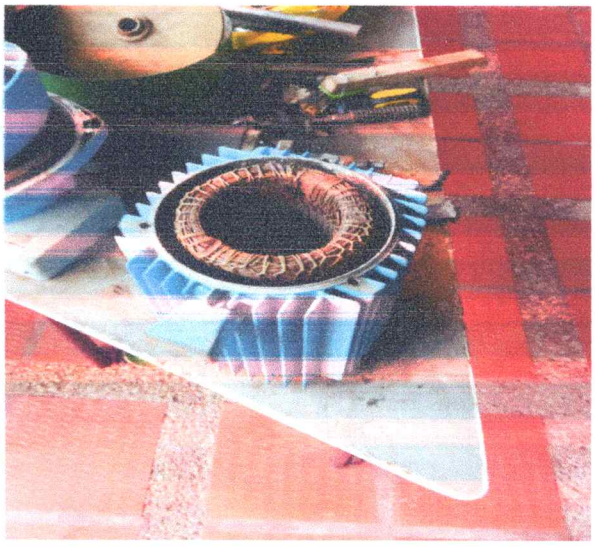

4- Mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de bombas sumergibles de secado de pozo de desagüe principal.


Se realiza para recoger las aguas lluvias para su posterior reutilización y evitar la inundación del cuarto de maquinas.

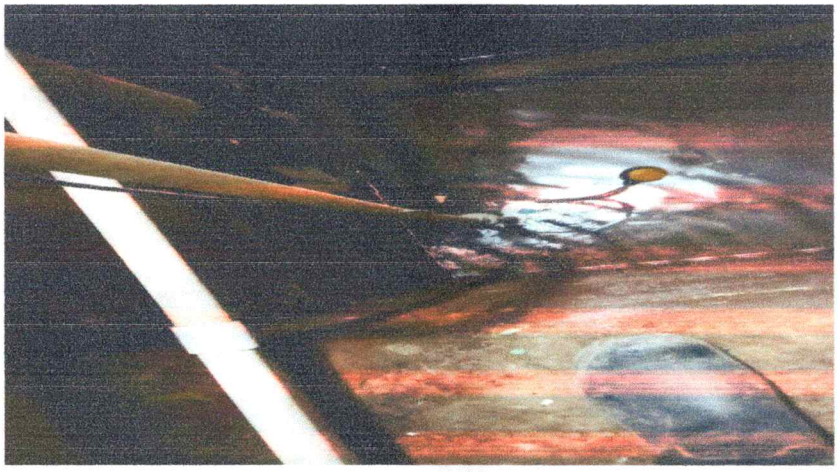

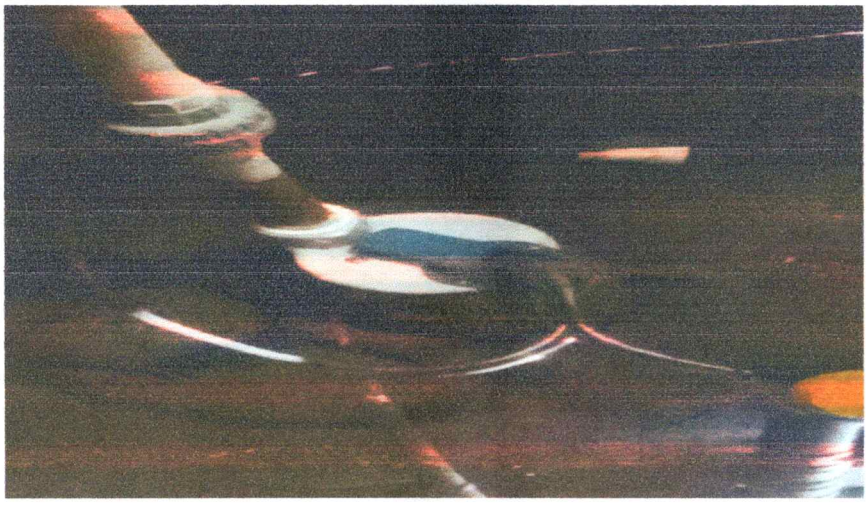

5- Adecuación y mantenimiento de tableros eléctricos y automatización de bombas.

Se realiza el mantenimiento y adecuación del sistema para el control eléctrico de las electrobombas (Cambio de guardamotores)

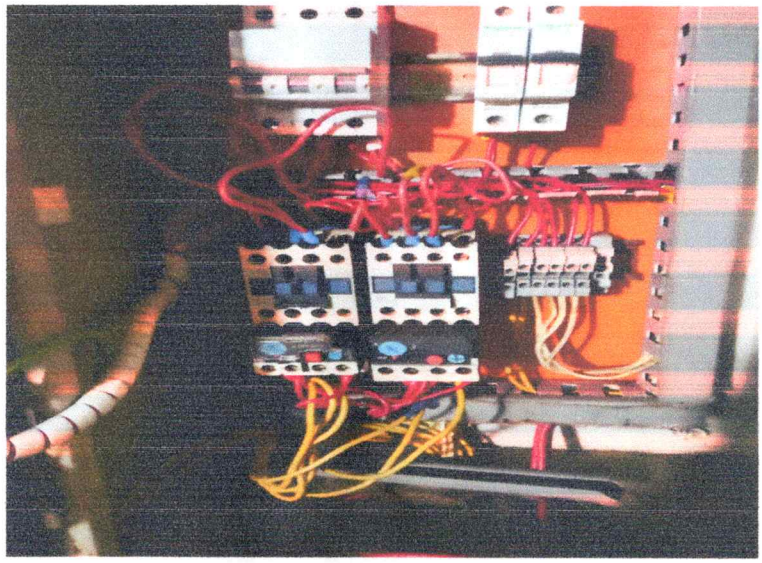





6- Mantenimiento y recuperación de tablero de contactores de entrada principal y transferencia automática incluye (sistema de refrigeración).

Se realiza el mantenimiento para que la planta eléctrica este en funcionamiento cuando no hay servicio de energía en el municipio encendido automático.



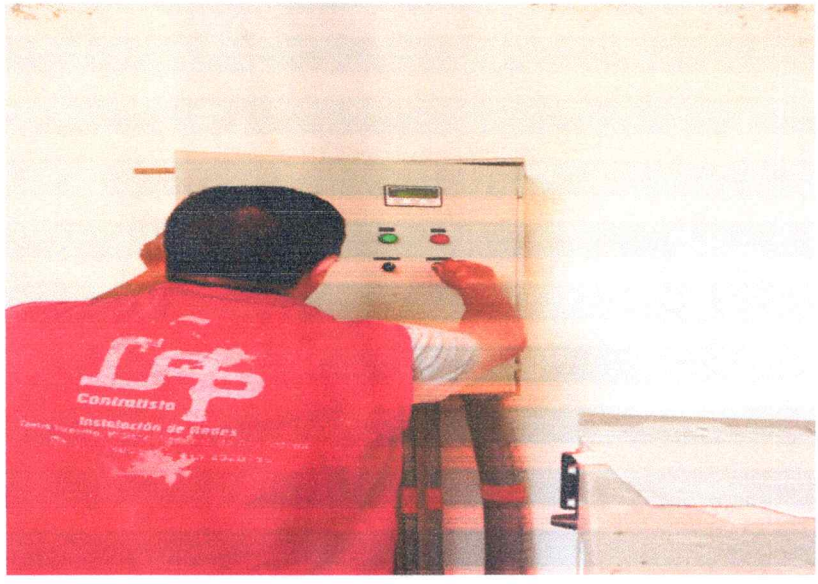

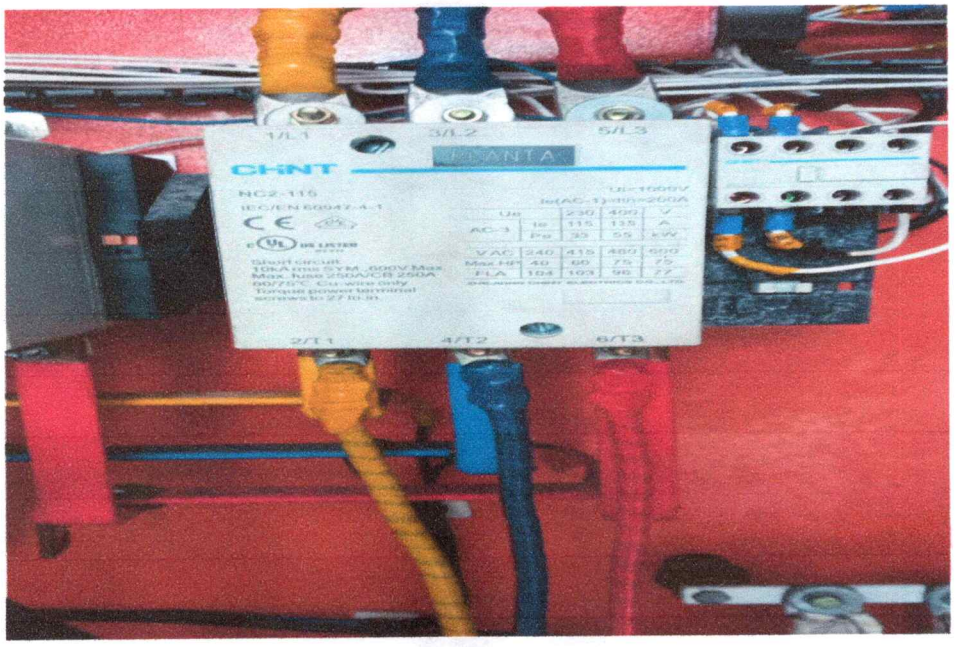

RECOMENDACIONES:
Se realizó el proceso cumpliendo las exigencias que en él se estipulaban, cualquier anomalía e inquietud estaré presto cuando la administración lo requiera, la firma tanto del supervisor como del ordenador del gasto **NO** me exime de cualquier responsabilidad.

LUIS ALFONSO PALOMARES ROMERO
C.C. 3.199.222 de Tenjo
