Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
1,1	Desmonte y montaje de mobiliario de la sala del tribunal superior (estrado , stan secretario, stan abogado y stan defensa) , y almacenarlo en lugar de disposición que se le indique interventoría mienratrs de reinstala, tal y como estaba.	Und	1,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Sala de tribunal				1	1,00
				Subtotal	1,00
				CANTIDAD TOTAL	1,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO







Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
2,1	Restauración de sillones y mesa ubicados en sala plena. Incluye: tapizado donde sea necesario, espuma de poliuretano donde sea necesario, lijado, pintura, barnizado, apliques y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	Und	20,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Sala Plena				20	20,00
			Subtotal		20,00
			CANTIDAD TOTAL		20,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO







Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		**CONTRATISTA DE OBRA**	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
2.2	Fabricación y replica de sillones ubicados en sala plena. iIncluye: espuma de poliuretano,tapizado, lijado, pintura, barnizado, apliques y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento	Und	4,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Sala Plena				4	4,00
			Subtotal		4,00
			CANTIDAD TOTAL		4,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO





Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
2,3	Restaurar puerta entamborada dos alas en madera ubicada a entrada en la sala del tribunal superior, lijar, barnizar, pintar y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento	Und	1,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Sala de tribunal				1	1,00
			Subtotal		1,00
			CANTIDAD TOTAL		1,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO







SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
3,1	Suministro e instalación de vidrio transparente liso 5mm para ventana en aluminio ubicada en sala del tribunal superior	m2	2,08

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Sala de tribunal		1,18	1,76	1	2,08
				Subtotal	2,08
				CANTIDAD TOTAL	2,08

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO



Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
4,1	Diseño, suministro e instalación púerta en vidrio templado y alumino para entreda principal y salida de emergencia. Incluye desmonte de la anterior, chapa de seguridad, tronilleria rieles fijacion etc y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m2	16,34

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Puerta principal		4,64	2,33	1	10,81
Puerta de emergencia		1,99	2,78	1	5,53
				Subtotal	16,34
				CANTIDAD TOTAL	16,34

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO




Leidy G. Copete Córdoba	Olga María Borja R.
SUPERVISOR DE CONTRATO	CONTRATISTA DE OBRA
NOMBRE: LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE: OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO: ING. SUPERVISORA	CARGO: ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
4,2	Diseño, suministro e instalación reja de seguridad en acero inoxidable corrediza dos o tres piezas, para entrada principal y salida de emergencia. Incluye chapa de seguridad, tronilleria rieles fijacion etec y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	m2	16,34

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Reja principal		4,64	2,33	1	10,81
Reja de emergencia		1,99	2,78	1	5,53
				Subtotal	16,34
				CANTIDAD TOTAL	16,34

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO

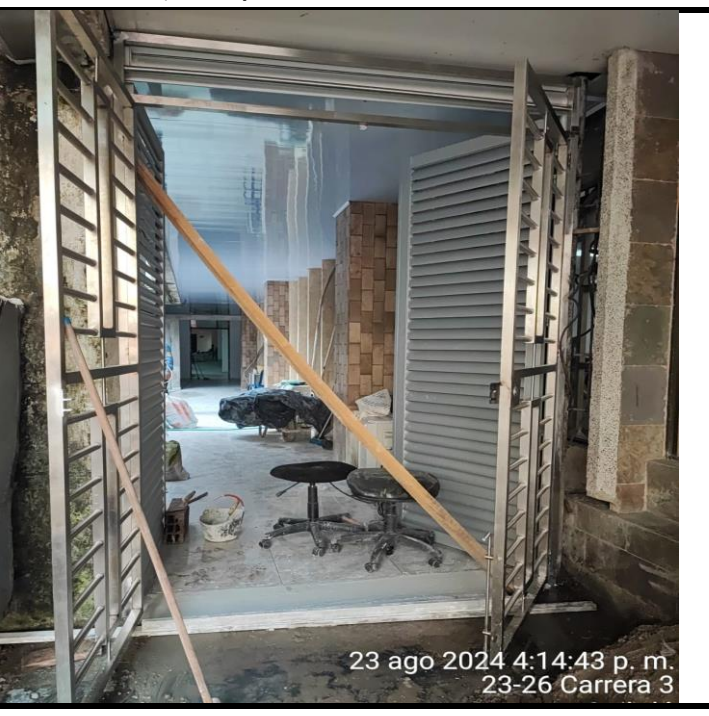

Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
4,3	Demolición, Suministro e instalación de enchape de piso en cerámica Laika Beige Multitono (60cm x 60cm). Incluye mortero de nivelación, pega cerámica, lechada; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	119,10

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Tramo 1	15,50	2,50		1	38,75
Tramo 2	5,68	4,56		1	25,90
Tramo 3	6,00	1,42		1	8,52
Tramo 4	10,87	8,45	2	1	45,93
			Subtotal		119,10
			CANTIDAD TOTAL		119,10

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO





Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
4,4	Construcción de rampa interna para personas con limitaciones, pendiente mínima de 10%, incluye barandas, y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	m2	10,80

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Rampa	6,00	1,80		1	10,80
				Subtotal	10,80
				CANTIDAD TOTAL	10,80

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO




Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
5,1	Restaurar puerta entamborada dos alas en madera ubicada a entrada en la sala del tribunal superior, lijar, barnizar, pintar y todos los elementos necesario para su correcto funcionamiento	m2	177,38

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	m2 Puerta		
SALA DE TRIBUNAL					
Pared 1	8,02	2,13		1	17,07
Pared 2	5,65	0,95		1	5,37
Pared 3	8,03	2,13		1	17,10
Pared 4	2,07	2,13		1	4,42
Pared 5	1,05	2,13		1	2,24
Pared 6	4,98	2,13		1	10,61
Pared 7	4,98	2,13		1	10,61
Sala de tribunal (Exterior)					24,14
SALA PLENA					
Pared 1	6,14	2,40		1,00	14,74
Pared 2	10,33	2,40		1,00	24,79
Pared 3	6,42	1,00		1,00	6,42
Pared 4	4,20	2,40		1,00	10,08
Pared 5	6,42	2,40	1,93	1,00	13,48
Pared 6	1,25	2,40	1,93	1,00	1,07
Columnas					5,62
DESPACHO 1					
Pared 1	6,22	0,83		1,00	5,16
Pared 2	4,93	2,46		1,00	12,13
Cielo	6,22	1,20		1,00	7,46
DESPACHO 2					0,00
Pared 1	6,19	0,83		1,00	5,14
Pared 2	4,93	2,46		1,00	12,13
Pared 3	4,93	2,55		1,00	12,57
Cielo	6,19	1,20		1,00	7,43
				Subtotal	177,38
				CANTIDAD TOTAL	177,38


ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO

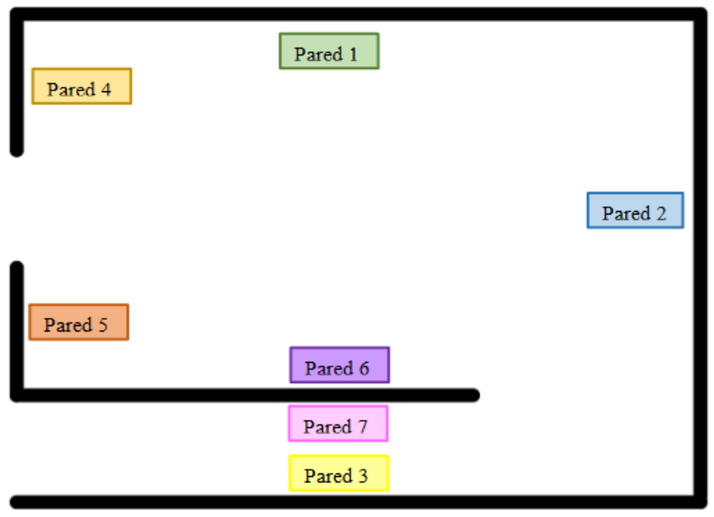







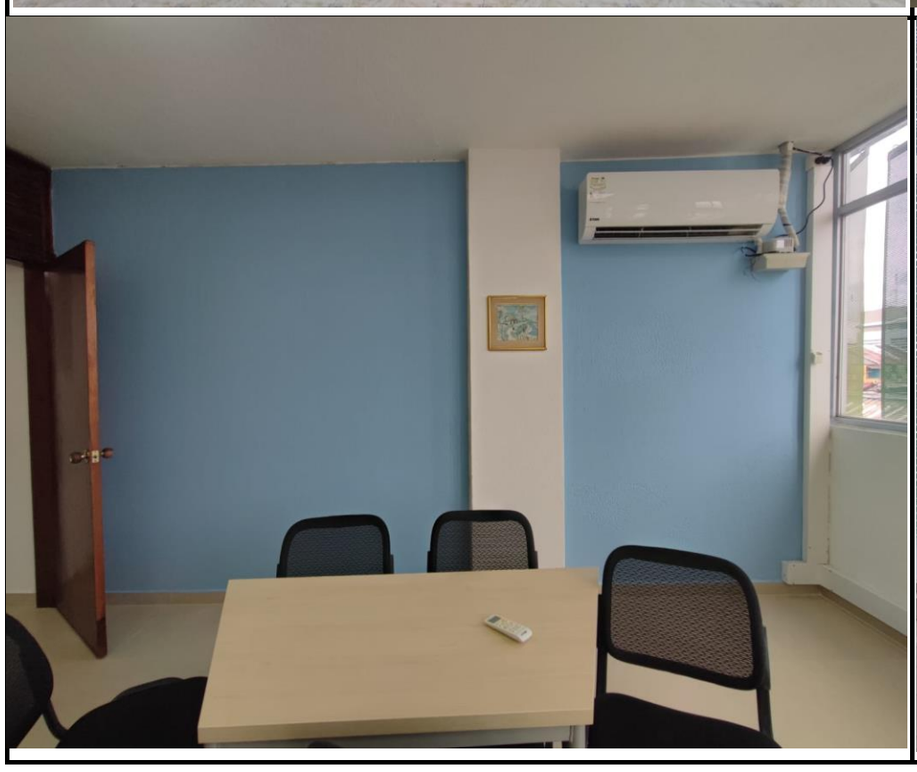



Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
5,2	Impermeabilización de alfajía superior ubicada en fachada occidental, emulsion asfáltico, barrera de vapor, adhesivo asfaltico, sellante, reparador elástico o similar	ml	33,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Alfjía	33,00			1	33,00
				Subtotal	33,00
				CANTIDAD TOTAL	33,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO




Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
7,1	Remoción, Suministro e instalación de enchape de piso en Pizarra negra 30cm x 60cm. Incluye mortero de nivelación, pega, lechada; y los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	Und	38,03

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Enchape Exterior					
Tramo 1	2,00	1,45		1	2,90
Tramo 2	1,80	1,60		1	2,88
Tramo 3	0,90	2,92		1	2,63
Tramo 4	0,63	1,50		1	0,95
Tramo 5	0,63	1,18		1	0,74
Tramo 6	3,10	2,41		1	7,47
Tramo 7	2,70	2,41		1	6,51
Tramo 8	1,35	2,41		1	3,25
Tramo 9	4,44	2,41		1	10,70
			Subtotal		38,03
			CANTIDAD TOTAL		38,03

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO



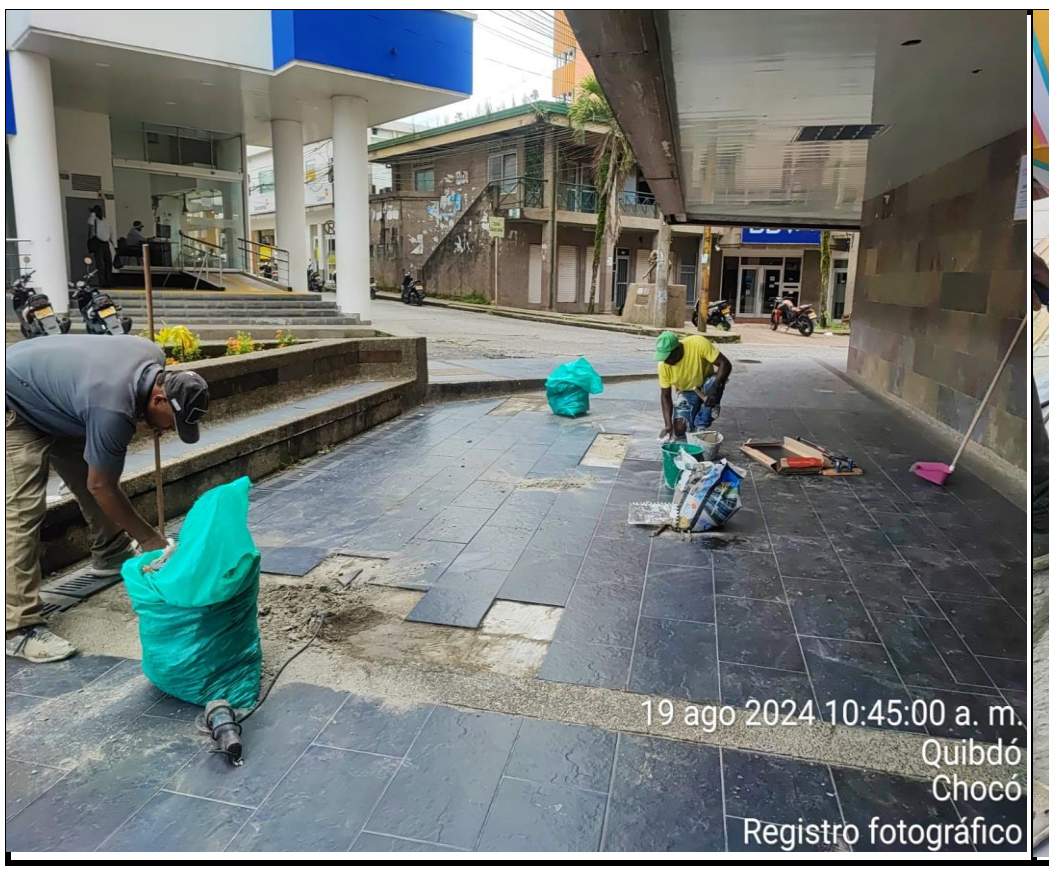




Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
6,2	Suministro e instalación de paisajismo no artificial (material vegetal y ornamental altura menos de 60 cm.en materas interiores y exteriores. Y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamineto	m2	29,85

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Paisajismo interior y exterior				1	29,85
			Subtotal		29,85
			CANTIDAD TOTAL		29,85


ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO



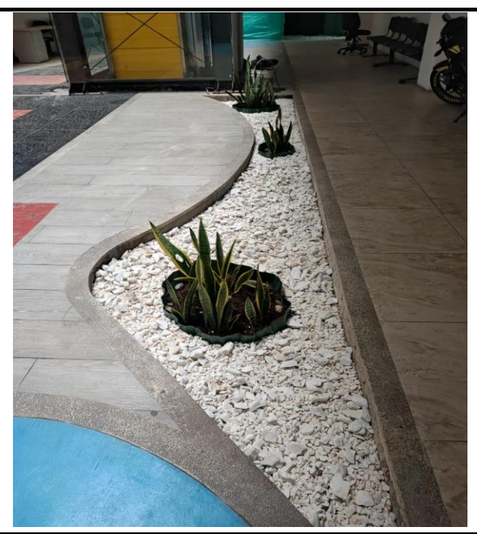





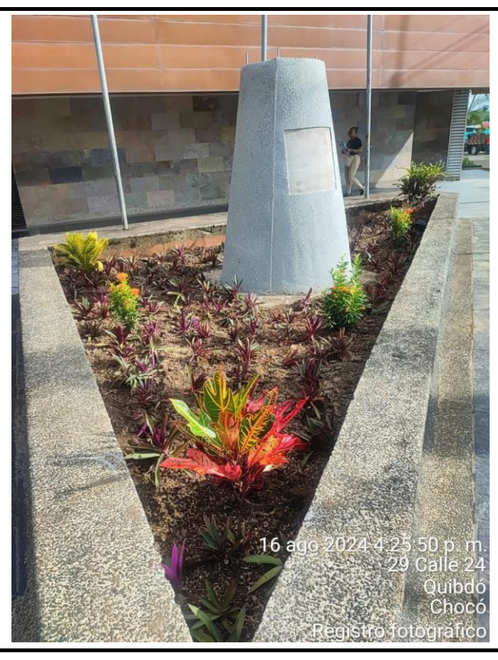

Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
7,1	La señalización de evacuación fue propuesta en base a la nsr-10, ntc 1461, ntc 1931, ntc 6047, nfpa 101 y nfpa 170. las señales se deben fabricar en materiales robustos y deben ser fáciles de cambiar, limpiar y reparar o reemplazar. estos materiales pueden ser pvc, acrílico o pla (impresión 3d). instalado con cinta doble faz paredes pintadas tesa o 3m 19 mm. Ruta de evacuacion	Und	10,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Ruta de evacuación				10	10,00
				Subtotal	10,00
				CANTIDAD TOTAL	10,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO







Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
7,2	La señalización de evacuación fue propuesta en base a la nsr-10, ntc 1461, ntc 1931, ntc 6047, nfpa 101 y nfpa 170. las señales se deben fabricar en materiales robustos y deben ser fáciles de cambiar, limpiar y reparar o reemplazar. estos materiales pueden ser pvc, acrílico o pla (impresión 3d). instalado con cinta doble faz paredes pintadas tesa o 3m 19 mm. Ruta de evacuacion, Salida de emergencia	Und	2,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Salida de emergencia				2	2,00
				Subtotal	2,00
				CANTIDAD TOTAL	2,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO



Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
7,2	La señalización de evacuación fue propuesta en base a la nsr-10, ntc 1461, ntc 1931, ntc 6047, nfpa 101 y nfpa 170. las señales se deben fabricar en materiales robustos y deben ser fáciles de cambiar, limpiar y reparar o reemplazar. estos materiales pueden ser pvc, acrílico o pla (impresión 3d). instalado con cinta doble faz paredes pintadas tesa o 3m 19 mm. Ruta de evacuacion, Salida de emergencia	Und	1,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL	ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO
	Largo	Ancho	Alto			
Punto de encuentro				1	1,00	
				Subtotal	1,00	
				CANTIDAD TOTAL	1,00	

Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad total
8,1	Limpieza general y retiro de sobrantes	Und	1,00

LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANTIDAD	TOTAL
	Largo	Ancho	Alto		
Limpieza				1	1,00
				Subtotal	1,00
				CANTIDAD TOTAL	1,00

ESQUEMA /REGISTRO FOTOGRAFICO



Leidy G. Copete Córdoba		Olga María Borja R.	
SUPERVISOR DE CONTRATO		CONTRATISTA DE OBRA	
NOMBRE:	LEIDY GISELA COPETE CÓRDOBA	NOMBRE:	OLG MARÍA BORJA ROBLEDO
CARGO:	ING. SUPERVISORA	CARGO:	ARQ. RESIDENTE
